
ANEXO 2 PROGRAMACIÓN DE OBRA


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
1			**MANTENIEMIENTO GRUPO 4**	**55 dí**	**lun 09/12/24**	**vie 21/02/25**	**$ 1.600.208.175,82**
2			ACTA DE INICIO	0 días	lun 09/12/24	lun 09/12/24	$ 0,00
3			DIAGNOSTICOS	8 días	lun 09/12/24	mié 18/12/2	$ 0,00
4			APROBACION ALCANCE	16 dí	jue 19/12/24	jue 09/01/25	$ 0,00
5			**INTERV. JARDINES**	**31 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 793.934.493,27**
6		**S1**	**CAMPO VERDE**	**16 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 69.495.305,32**
7			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
8		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VI	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 6.542.059,35
9		1.3	DEMOLICIÓN DE ACABADO	3 días	lun 13/01/25	mié 15/01/2	$ 3.198.423,29
10		3.2	RESANE DE FISURAS EN MU	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/2	$ 1.090.997,97
11		7.1	ALISTADO DE PISOS EN MO	5 días	lun 13/01/25	vie 17/01/25	$ 4.826.052,20
12		13.	PAÑETE MURO 1:4 IMPERM	2 días	mié 15/01/2	jue 16/01/25	$ 813.881,60
13		13.	PINTURA REPELENTE DE HU	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	$ 911.951,81
14		14.	CIELORASO EN LAMINA DE	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	$ 2.088.094,36
15		17.	MANTO MORTER PLAS AL -	10 dí	lun 20/01/25	vie 31/01/25	$ 15.931.795,18
16		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	2 días	mar 21/01/2	mié 22/01/2	$ 1.856.187,33
17		NP	DESMONTE, INSTALACION	15 dí	lun 13/01/25	vie 31/01/25	$ 32.235.862,23
18			FIN INTERV.	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00
19		**S2**	**TORITO FELIZ**	**17 dí**	**jue 30/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 55.871.942,89**
20			INICIO INTERV.	0 días	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00
21		1.2.	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN	1 día	jue 30/01/25	jue 30/01/25	$ 2.795.751,86

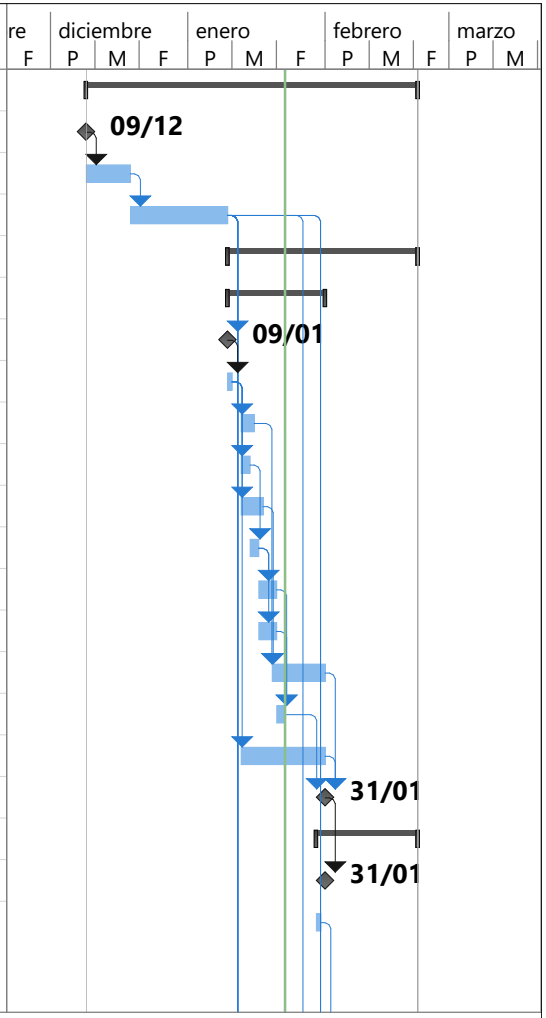

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
22		1.3.	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA,	2 días	vie 31/01/25	lun 03/02/25	$ 4.112.944,99
23		8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO	2 días	mar 04/02/25	mié 05/02/25	$ 1.589.212,34
24		9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE,	1 día	jue 06/02/25	jue 06/02/25	$ 853.339,04
25		13.2	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE	2 días	vie 07/02/25	lun 10/02/25	$ 333.258,68
26		17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO	10 días	mar 04/02/25	lun 17/02/25	$ 31.413.906,75
27		17.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	2 días	mar 04/02/25	mié 05/02/25	$ 2.542.425,67

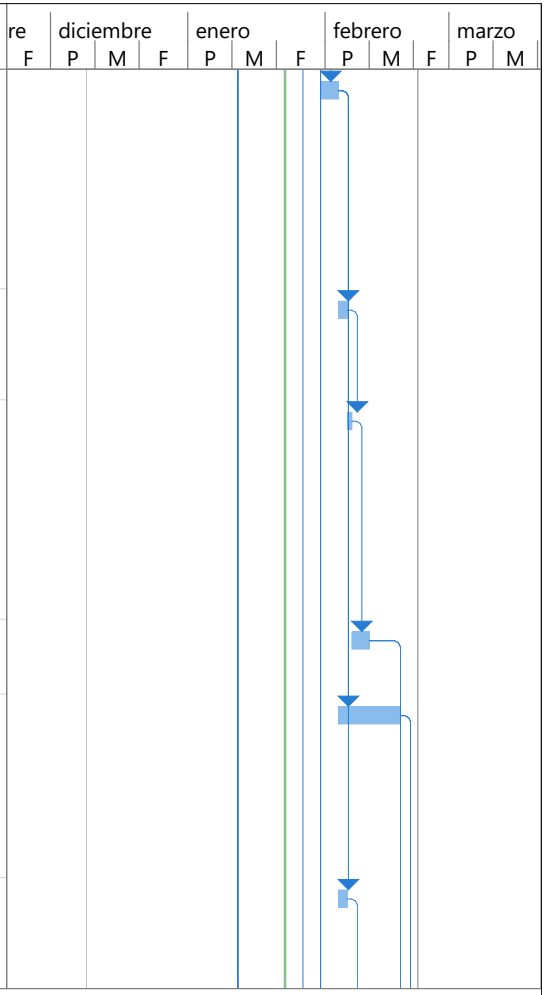

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
28		17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	2 días	jue 06/02/25	vie 07/02/25	$ 2.845.179,36
29		17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	4 días	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$ 8.500.346,06
30		20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIE	2 días	mar 18/02/25	mié 19/02/25	$ 885.578,14
31			FIN INTERV	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
32		**S3**	**OJOS DE PERDIZ**	**31 día**	**jue 09/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 230.971.177,48**
33			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
34		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 2.795.751,86
35		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O	15 días	mar 14/01/25	lun 03/02/25	$ 21.978.239,75
36		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO,	1 día	lun 13/01/25	lun 13/01/25	$ 2.493.380,88
37		1.3	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 941.364,74

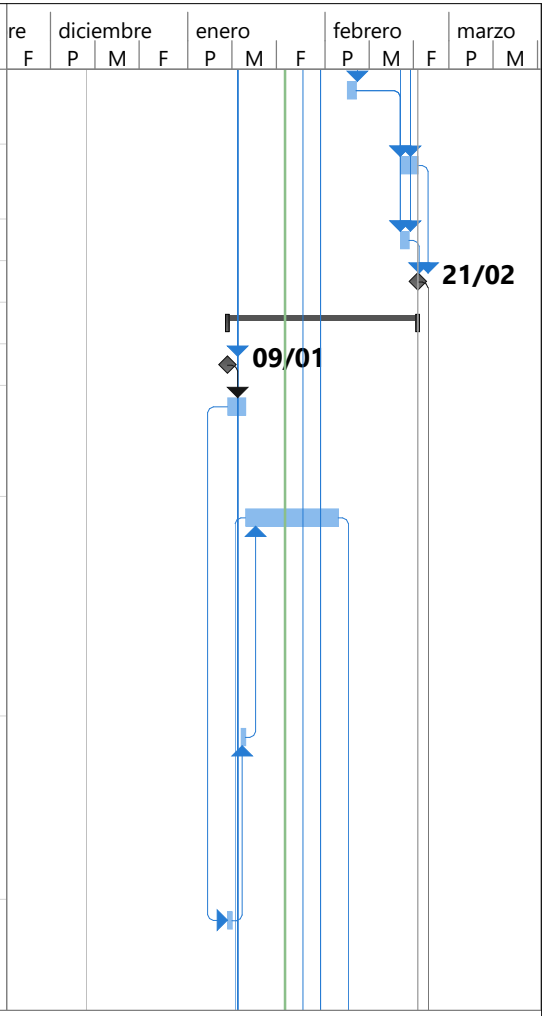

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
38		3.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE	2 días	mar 04/02/25	mié 05/02/25	$ 1.678.458,41
39		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE	5 días	mié 05/02/25	mar 11/02/25	$ 6.431.261,11
40		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE	2 días	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 534.453,64
41		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 716.769,62
42		13.	VINILO TIPO 1 A TRES MAN	2 días	mar 04/02/25	mié 05/02/25	$ 833.262,94
43		14.	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	8 días	vie 24/01/25	mar 04/02/25	$ 21.132.947,42
44		17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	12 días	vie 17/01/25	lun 03/02/25	$ 167.865.696,08
45		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	4 días	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$ 3.569.591,03

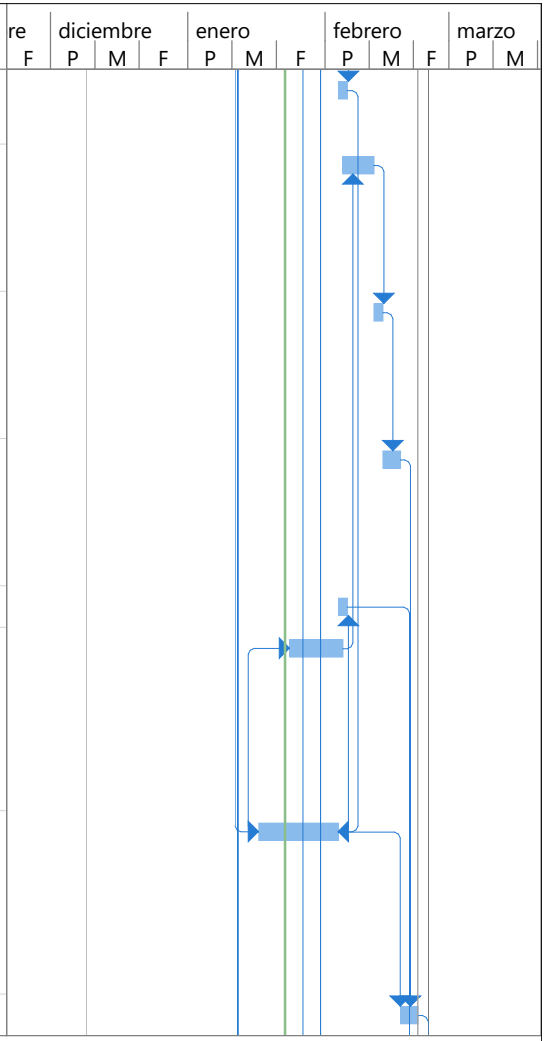

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
46			FIN INTERV.	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
47		**S4**	**PORVENIR**	**25 día**	**jue 09/01/25**	**jue 13/02/25**	**$ 139.581.745,10**
48			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
49		1.2.	CERRAMIENTO EN LONA VE	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 3.354.902,23
50		1.3.	DESMONTE DE SALIDAS ELÉ	2 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	$ 458.613,59
51		1.3.	RETIRO DE MANTO DE ALU	5 días	lun 13/01/25	vie 17/01/25	$ 10.839.898,13
52		3.2.	RESANE DE FISURAS EN TE(	2 días	lun 03/02/25	mar 04/02/2	$ 3.121.722,21
53		5.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	1 día	mar 11/02/2	mar 11/02/2	$ 18.016.513,82
54		7.1.	ALISTADO DE PISOS EN MO	10 día	jue 16/01/25	mié 29/01/2	$ 22.344.375,01
55		13.	ESTUCO IMPERMEABILIZAD	2 días	mié 05/02/2	jue 06/02/25	$ 2.703.783,00
56		13.	PINTURA EPOXICA A DOS M	2 días	vie 07/02/25	lun 10/02/25	$ 2.142.448,68
57		17.	MANTO MORTER PLAS AL -	8 días	jue 30/01/25	lun 10/02/25	$ 73.763.397,37
58		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	2 días	mié 12/02/2	jue 13/02/25	$ 2.836.091,06
59			FIN INTERV.	0 días	jue 13/02/25	jue 13/02/25	$ 0,00
60		**S5**	**RINCON DE LAS ARDILLAS**	**12 día**	**mié 05/02/2**	**vie 21/02/25**	**$ 52.031.087,14**
61			INICIO INTERV.	0 días	mié 05/02/2	mié 05/02/2	$ 0,00
62		1.2.	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	1 día	jue 06/02/25	jue 06/02/25	$ 559.150,37
63		1.3.	DEMOLICIÓN DE ACABADO	2 días	vie 07/02/25	lun 10/02/25	$ 2.452.124,53
64		1.3.	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	4 días	vie 07/02/25	mié 12/02/25	$ 676.363,00

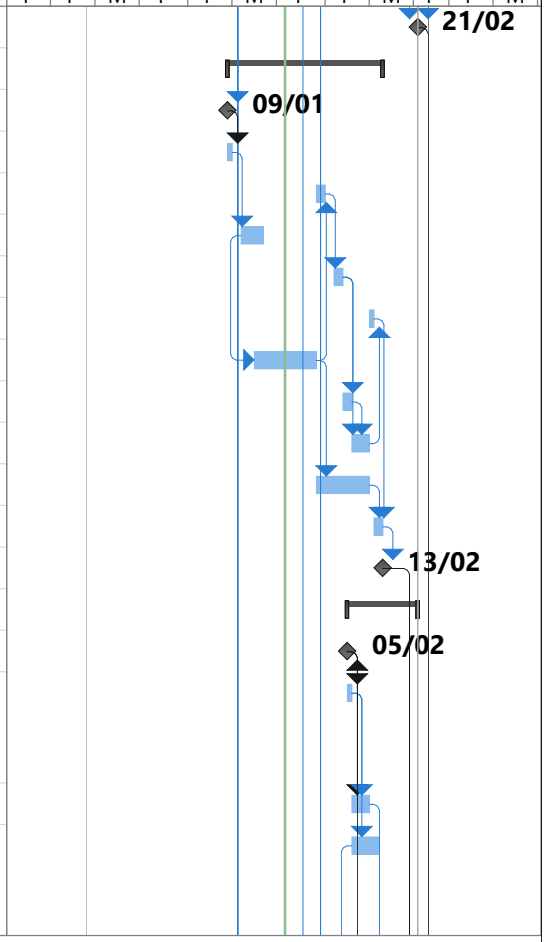

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
65		7.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	$ 1.394.192,86
66		7.1	PENDIENTADO PARA TERR/	7 días	mar 11/02/2	mié 19/02/2	$ 34.119.808,21
67		7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	5 días	mié 12/02/2	mar 18/02/2	$ 7.873.370,07
68		17.	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO	5 días	vie 14/02/25	jue 20/02/25	$ 4.602.518,61
69		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 353.559,49
70			FIN INTERV.	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
71		**S6**	**TUNJUELITO**	**19 dí**	**jue 09/01/25**	**mié 05/02/2**	**$ 158.386.711,46**
72			INICIO INTERV	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
73		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VI	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 2.404.346,60
74		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO	3 días	lun 13/01/25	mié 15/01/2	$ 7.828.439,68
75		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	$ 2.088.817,61
76		1.3	DESMONTE DE SALIDAS ELI	2 días	mié 15/01/2	jue 16/01/25	$ 506.888,71
77		1.3	MANTENIMIENTO DE CUBI	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/2	$ 10.220.049,20
78		2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	3 días	jue 16/01/25	lun 20/01/25	$ 22.800.108,66
79		2.5	ACERO DE REFUERZO DE 6(	3 días	jue 16/01/25	lun 20/01/25	$ 3.085.901,03
80		3.2	RESANE DE FISURAS EN MU	1 día	mar 21/01/2	mar 21/01/2	$ 2.461.739,00
81		5.1	REINSTALACIÓN DE LAMPA	2 días	vie 31/01/25	lun 03/02/25	$ 547.622,04
82		13.	VINILO TIPO 1 A TRES MAN	2 días	mié 22/01/2	jue 23/01/25	$ 1.222.118,97
83		14.	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	5 días	vie 24/01/25	jue 30/01/25	$ 30.027.704,92
84		17.	FLANCHE EN LÁMINA GALV	2 días	mar 28/01/2	mié 29/01/2	$ 3.490.669,70
85		17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	3 días	mar 21/01/2	jue 23/01/25	$ 59.792.162,22
86		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	2 días	mar 04/02/2	mié 05/02/2	$ 2.325.333,58

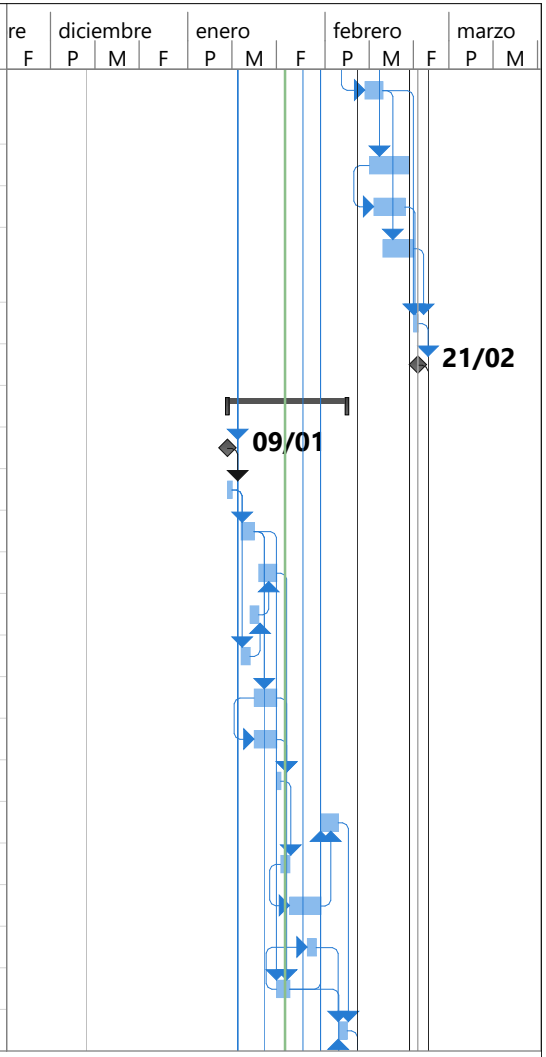

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
87		20.	RETIRO DE MATERIAL SOBF	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	$ 9.584.809,54
88			FIN INTERV.	0 días	mié 05/02/25	mié 05/02/25	$ 0,00
89		**S7**	**ESTRELLAS DEL MAÑANA**	**17 día**	**jue 09/01/25**	**lun 03/02/25**	**$ 10.602.670,31**
90			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
91		1.2.	CERRAMIENTO EN LONA VE	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 866.683,08
92		13.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN	2 días	mar 28/01/25	mié 29/01/25	$ 2.157.571,94
93		13.	ESMALTE SOBRE PUERTAS `	1 día	jue 30/01/25	jue 30/01/25	$ 140.684,68
94		17.	IMPERMEABILIZACIÓN INTI	6 días	lun 20/01/25	lun 27/01/25	$ 4.635.066,62
95		17.	TRATAMIENTO DE FISURAS	5 días	lun 13/01/25	vie 17/01/25	$ 741.463,29
96		19.	PRUEBA DE PRESION Y EST/	2 días	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 1.880.885,36
97		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	2 días	vie 31/01/25	lun 03/02/25	$ 180.315,34
98			FIN INTERV.	0 días	lun 03/02/25	lun 03/02/25	$ 0,00
99		**S8**	**YANACONA MUYU KAWSAY**	**20 días**	**lun 27/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 76.993.853,57**
100			INICIO INTERV.	0 días	lun 03/02/25	lun 03/02/25	$ 0,00
101		1.2.	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	$ 4.920.523,27
102		1.3.	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE	1 día	mar 28/01/25	mar 28/01/25	$ 482.751,15
103		5.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	2 días	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 4.763.897,12
104		8.1.	MURO EN LÁMINA FIBRO -	4 días	lun 10/02/25	jue 13/02/25	$ 9.440.582,68

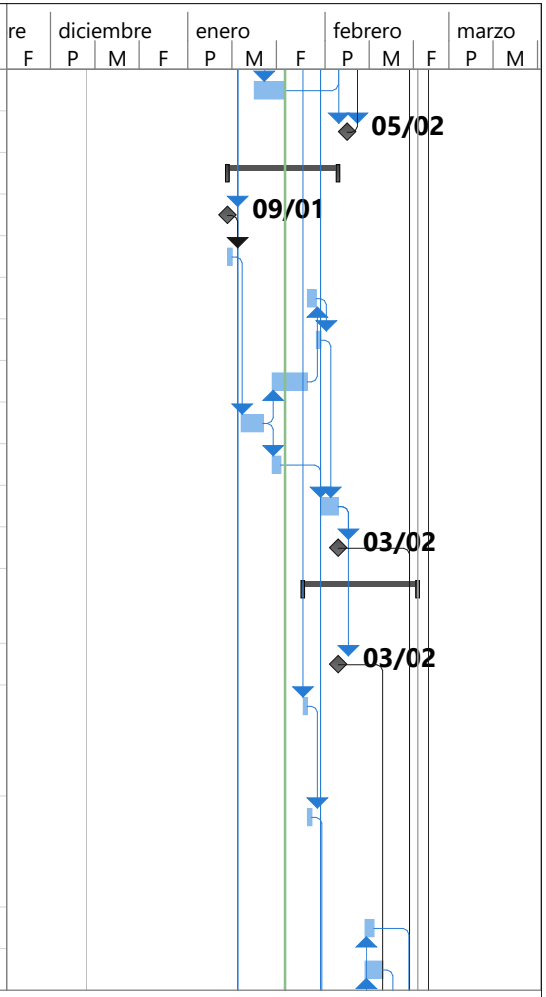

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
105		13.	ESTUCO IMPERMEABILIZADO	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 1.893.482,09
106		13.	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A	2 días	mar 18/02/25	mié 19/02/25	$ 1.576.313,58
107		17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	8 días	mié 29/01/25	vie 07/02/25	$ 49.956.831,15
108		17.	SUMINISTRO E INSTALACIÒ	2 días	lun 10/02/25	mar 11/02/2	$ 2.436.447,03
109		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	2 días	jue 20/02/25	vie 21/02/25	$ 1.523.025,50
110			FIN INTERV.	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
111			**INTERV CASAS DE SABIDURIA**	**31 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 806.273.682,55**
112		**S9**	**SIERRA MORENA**	**31 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 186.080.631,83**
113			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
114		1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 2.270.502,77
115		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	1 día	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 2.068.856,38
116		1.3	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA,	2 días	lun 03/02/25	mar 04/02/25	$ 4.833.172,98

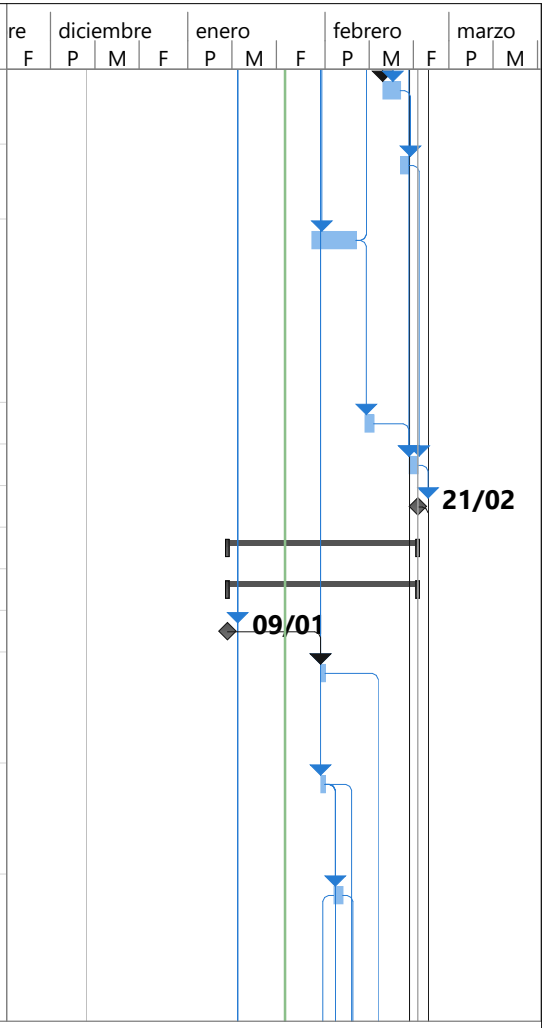

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
117		1.3.	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS,	1 día	mié 05/02/25	mié 05/02/25	$ 324.317,81
118		1.3.	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y	1 día	mar 04/02/25	mar 04/02/25	$ 42.172,37
119		1.3.	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,	1 día	lun 03/02/25	lun 03/02/25	$ 1.074.982,02
120		1.3.	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS.	1 día	mié 05/02/25	mié 05/02/25	$ 181.490,80
121		1.3.	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO,	1 día	jue 06/02/25	jue 06/02/25	$ 1.509.962,13
122		1.3.	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE	2 días	vie 07/02/25	lun 10/02/25	$ 1.424.115,89

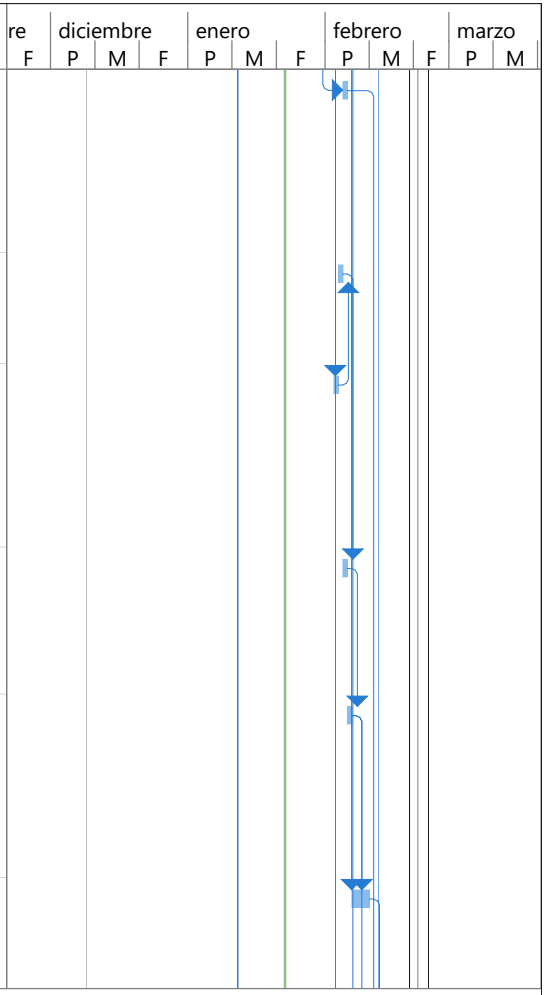

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
123		3.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE	4 días	lun 03/02/25	jue 06/02/25	$ 22.094.107,51
124		3.2	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR	2 días	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 8.695.105,71
125		4.1	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS	2 días	jue 13/02/25	vie 14/02/25	$ 11.386.242,81
126		5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 3.503.640,52
127		7.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3	3 días	mié 05/02/25	vie 07/02/25	$ 7.292.701,10
128		7.2	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS,	3 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	$ 12.456.937,38
129		8.1	ENCHAPE 25 X 35	2 días	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 3.535.975,21
130		11.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR	2 días	mar 18/02/25	mié 19/02/25	$ 16.400.464,90
131		11.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 9.558.402,99
132		13.	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	2 días	vie 07/02/25	lun 10/02/25	$ 2.215.792,67
133		13.	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE	5 días	mar 11/02/25	lun 17/02/25	$ 10.968.517,78

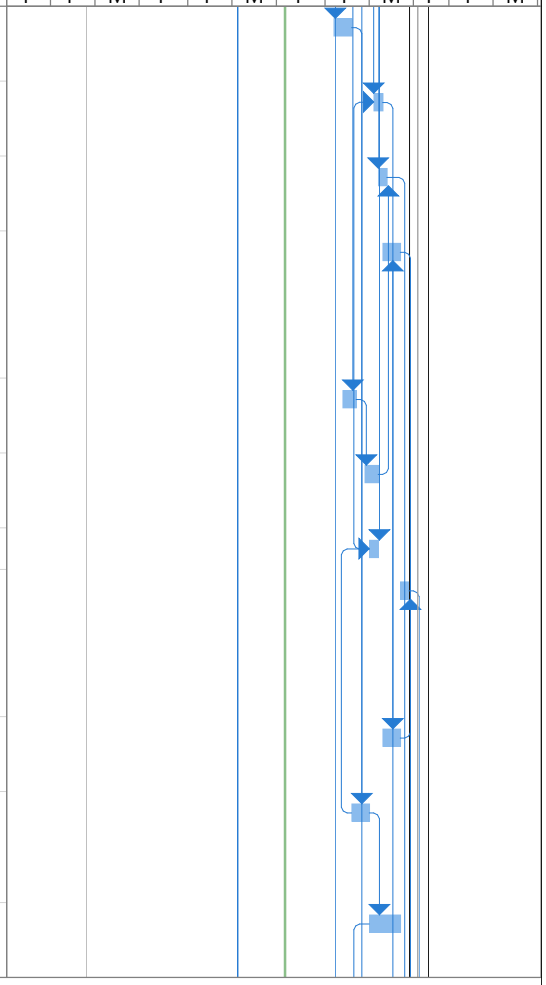

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
134		13.	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE	3 días	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$ 25.618.988,20
135		14.	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo	5 días	vie 07/02/25	jue 13/02/25	$ 10.662.347,61
136		15.	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 1.468.653,97
137		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	$ 603.838,82
138		NP(	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE TODO	12 días	lun 03/02/25	mar 18/02/25	$ 25.889.341,50
139			FIN INTERV.	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
140		**S10**	**BELLA FLOR**	**11 día**	**vie 07/02/25**	**vie 21/02/25**	**$ 110.202.880,73**
141			INICIO INTERV.	0 días	vie 07/02/25	vie 07/02/25	$ 0,00
142		1.1	LOCALIZACION Y REPLANTE	1 día	vie 07/02/25	vie 07/02/25	$ 14.186.436,70
143		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	1 día	vie 07/02/25	vie 07/02/25	$ 2.292.516,53
144		3.1	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A	5 días	mié 12/02/25	mar 18/02/25	$ 4.897.260,57
145		3.2	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON	5 días	mié 12/02/25	mar 18/02/25	$ 7.277.242,81
146		3.2	RESANE DE FISURAS EN MU	3 días	lun 10/02/25	mié 12/02/25	$ 22.317.507,53
147		8.1	MURO EN DRYWALL DOBLE	1 día	lun 10/02/25	lun 10/02/25	$ 1.291.775,67

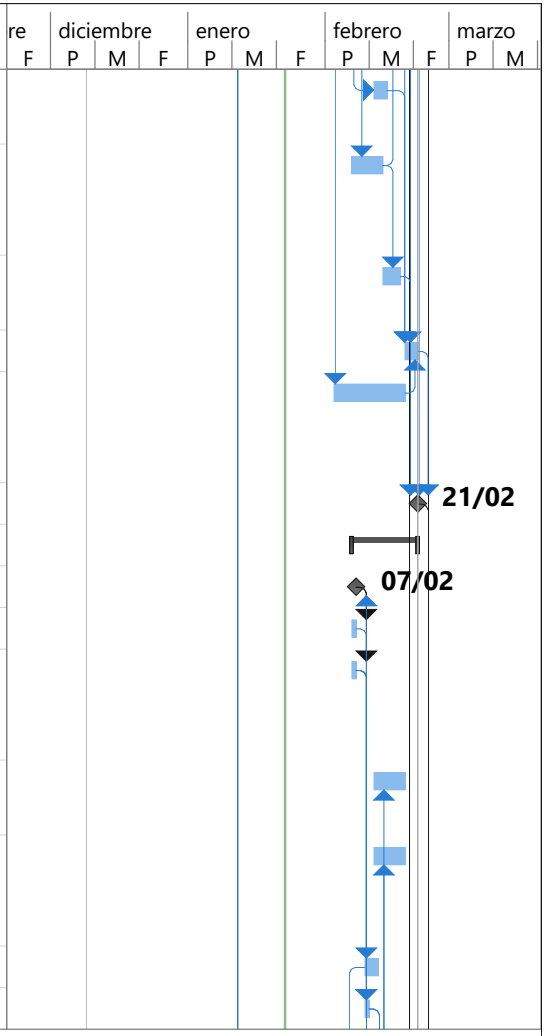

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
148		9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	2 días	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 716.804,79
149		9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	5 días	mar 11/02/2	lun 17/02/25	$ 272.236,00
150		10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	4 días	mar 11/02/2	vie 14/02/25	$ 5.707.143,98
151		13.	ESTUCO IMPERMEABILIZAL	5 días	mar 11/02/2	lun 17/02/25	$ 11.627.834,80
152		13.	VINILO TIPO 1 A TRES MAN	5 días	jue 13/02/25	mié 19/02/2	$ 6.238.693,76
153		13.	PINTURA TIPO KORASA O S	2 días	jue 13/02/25	vie 14/02/25	$ 9.680.109,45
154		13.	PINTURA EN ESMALTE (DO	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	$ 15.562.302,47
155		17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓ	4 días	mié 12/02/2	lun 17/02/25	$ 1.024.915,35
156		17.	SUMINISTRO Y MONTAJE D	2 días	lun 10/02/25	mar 11/02/2	$ 3.337.226,19
157		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	3 días	mar 18/02/2	jue 20/02/25	$ 3.772.874,13
158			FIN INTERV.	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
159		**S11**	**ACACIAS**	**31 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 185.673.826,31**
160			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
161		1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 18.918.725,89
162		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 2.795.751,86

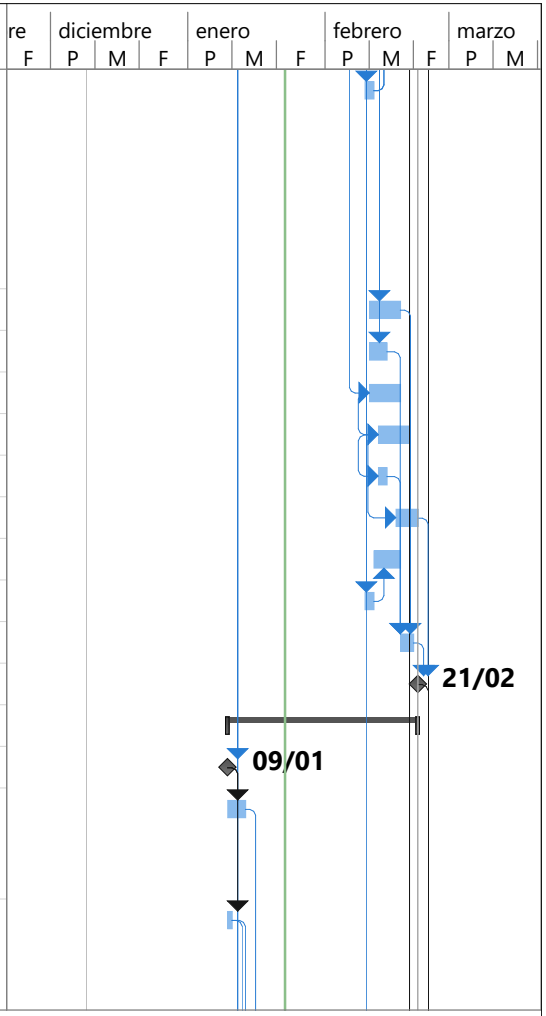

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
163		1.3	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA,	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	$ 1.739.942,27
164		1.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y	1 día	jue 16/01/25	jue 16/01/25	$ 69.674,65
165		1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	$ 303.992,51
166		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO,	1 día	jue 16/01/25	jue 16/01/25	$ 655.123,60
167		1.3	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE	2 días	lun 13/01/25	mar 14/01/25	$ 3.004.872,70
168		3.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE	15 días	vie 17/01/25	jue 06/02/25	$ 27.026.956,90
169		7.1	ALISTADO DE PISOS EN MO	4 días	mié 15/01/25	lun 20/01/25	$ 8.819.342,28
170		7.2	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS,	4 días	mar 21/01/25	vie 24/01/25	$ 4.484.497,46
171		8.1	ENCHAPE 25 X 35	4 días	vie 31/01/25	mié 05/02/25	$ 10.473.987,18

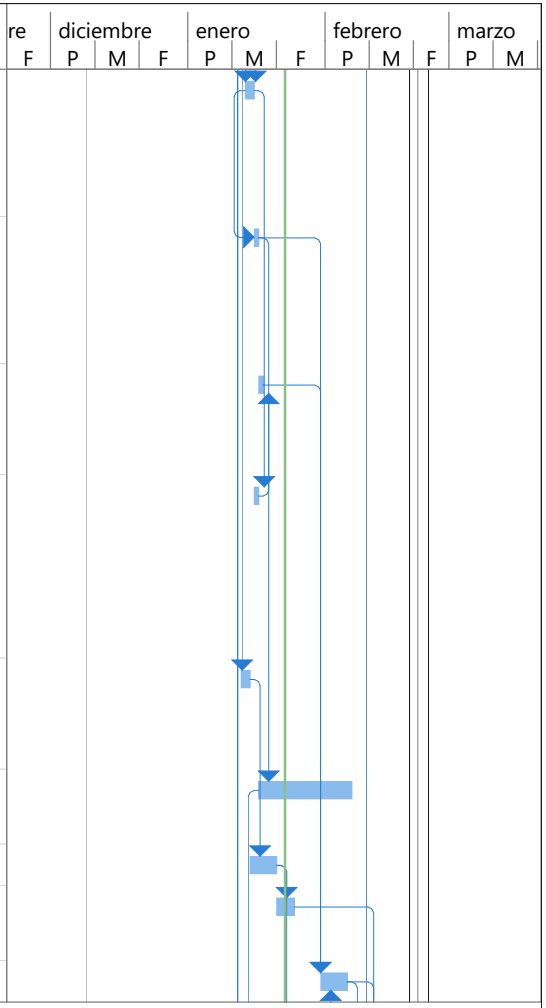

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
172		9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON	2 días	jue 06/02/25	vie 07/02/25	$ 889.988,20
173		13.	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	5 días	vie 24/01/25	jue 30/01/25	$ 6.104.112,04
174		13.	ESTUCO IMPERMEABILIZADO	3 días	vie 31/01/25	mar 04/02/25	$ 2.064.282,44
175		13.	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE	11 días	mié 05/02/25	mié 19/02/25	$ 10.689.513,57
176		13.	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A	5 días	vie 07/02/25	jue 13/02/25	$ 26.831.073,22
177		13.	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE	5 días	mié 12/02/25	mar 18/02/25	$ 22.433.664,86
178		14.	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 5.552.578,34
179		17.	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO	4 días	mar 21/01/25	vie 24/01/25	$ 20.447.574,01
180		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	$ 3.850.898,60

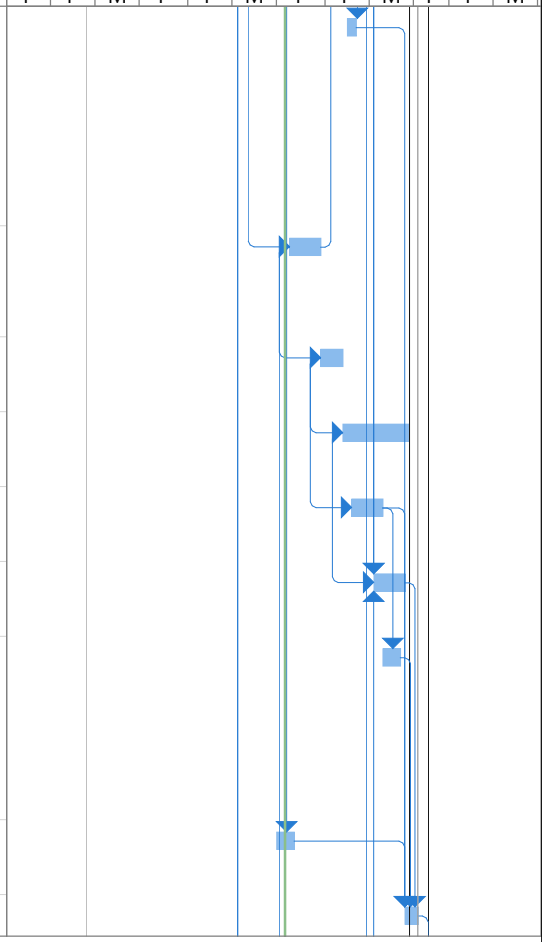

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
181		NP-	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION,	6 días	vie 31/01/25	vie 07/02/25	$ 8.517.273,73
182			FIN INTERV.	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00
183		**S12**	**CARLOS GAVIRIA**	**21 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 07/02/25**	**$ 182.474.089,23**
184			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
185		1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25	$ 13.057.755,74
186		1.2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL	1 día	lun 13/01/25	lun 13/01/25	$ 1.677.451,12
187		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	$ 627.949,71
188		1.3	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO,	3 días	mar 14/01/25	jue 16/01/25	$ 3.008.190,70

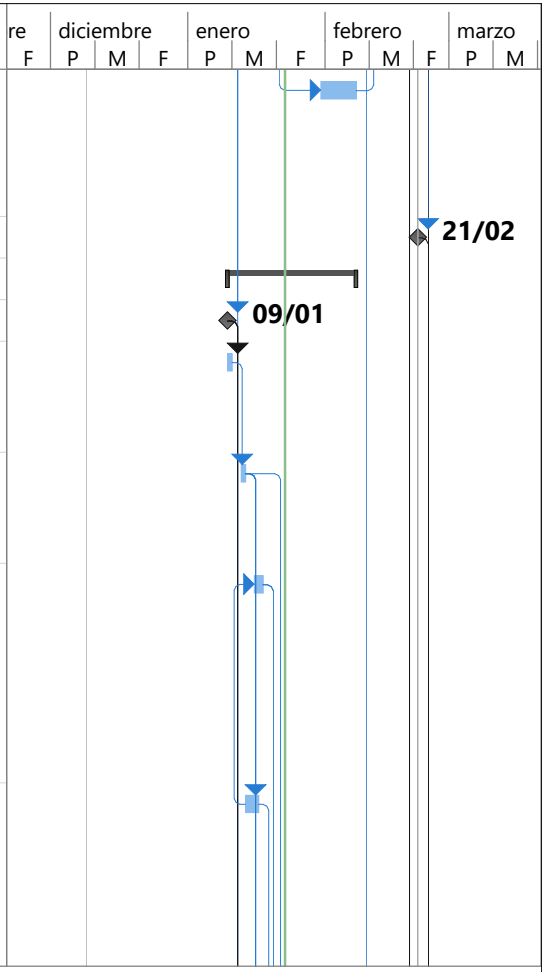

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
189		1.3	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO	15 días	mar 14/01/25	lun 03/02/25	$ 23.202.273,86
190		2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE	5 días	vie 24/01/25	jue 30/01/25	$ 5.559.838,59
191		2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE	2 días	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 3.953.776,07
192		2.5	ACERO DE REFUERZO DE 60	5 días	vie 24/01/25	jue 30/01/25	$ 2.476.115,99
193		3.1	MURO DIVISORIO BLOQUE	10 día	mié 22/01/25	mar 04/02/25	$ 2.800.988,49
194		3.2	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE	3 días	mar 14/01/25	jue 16/01/25	$ 4.755.632,16
195		7.1	ALISTADO DE PISOS EN MO	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	$ 4.866.269,30
196		7.2	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45,	5 días	jue 16/01/25	mié 22/01/25	$ 11.176.844,23
197		8.1	ENCHAPE 25 X 35	4 días	mar 21/01/25	vie 24/01/25	$ 10.130.617,69
198		8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	$ 8.263.904,15
199		13.	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y	5 días	vie 17/01/25	jue 23/01/25	$ 11.078.963,35
200		13.	ESTUCO IMPERMEABILIZADO	2 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	$ 1.551.214,18

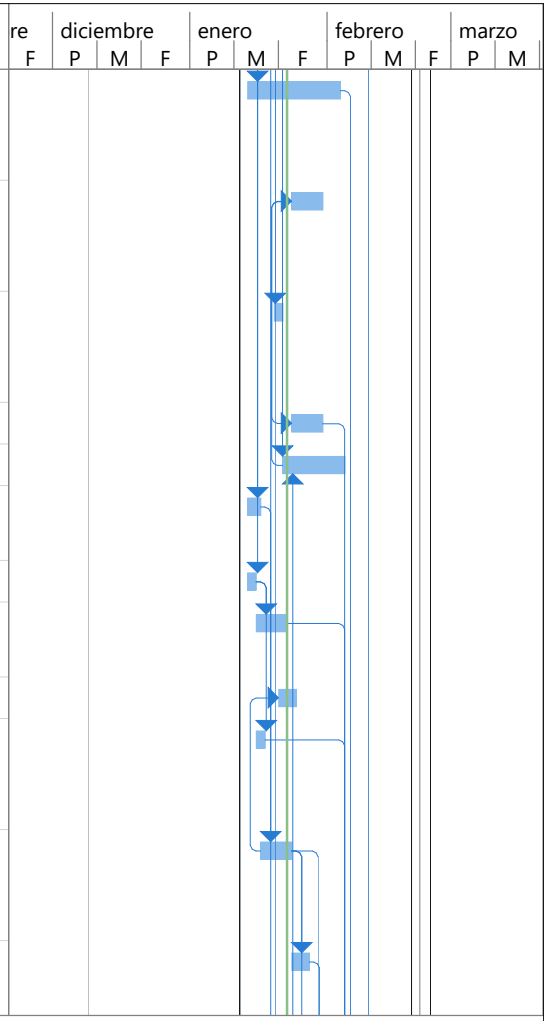

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
201		13.	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA	3 días	vie 17/01/25	mar 21/01/25	$ 3.028.074,72
202		13.	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE	2 días	mar 28/01/25	mié 29/01/25	$ 645.778,78
203		13.	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A	2 días	jue 30/01/25	vie 31/01/25	$ 4.721.164,69
204		14.	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	7 días	vie 24/01/25	lun 03/02/25	$ 25.496.279,50
205		17.	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	2 días	lun 03/02/25	mar 04/02/25	$ 2.013.847,90
206		17.	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 3.131.477,12
207		17.	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25	$ 460.368,60
208		17.	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 7.210.160,30
209		17.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO	5 días	vie 10/01/25	jue 16/01/25	$ 24.106.450,16
210		20.	ASEO GENERAL FINAL Y LIM	3 días	mié 05/02/25	vie 07/02/25	$ 3.472.702,13
211			FIN INTERV.	0 días	vie 07/02/25	vie 07/02/25	$ 0,00
212		**S13**	**TEJEDORES DE SUEÑOS**	**21 dí**	**jue 09/01/25**	**vie 07/02/25**	**$ 141.842.254,45**

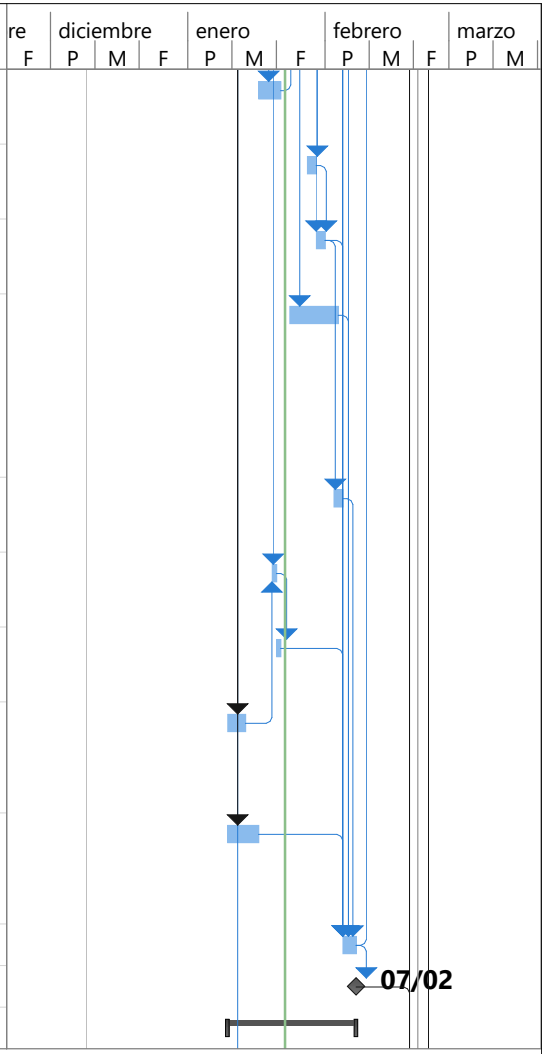

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
213			INICIO INTERV.	0 días	jue 09/01/25	jue 09/01/25	$ 0,00
214		1.1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE	2 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 8.428.757,68
215		1.2.	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN	1 día	mar 14/01/25	mar 14/01/25	$ 1.677.451,12
216		1.3.	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	2 días	mar 14/01/25	mié 15/01/25	$ 426.456,44
217		1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	1 día	mar 14/01/25	mar 14/01/25	$ 418.047,88
218		1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 162.158,90
219		1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	1 día	jue 16/01/25	jue 16/01/25	$ 137.818,21
220		1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	$ 181.609,27

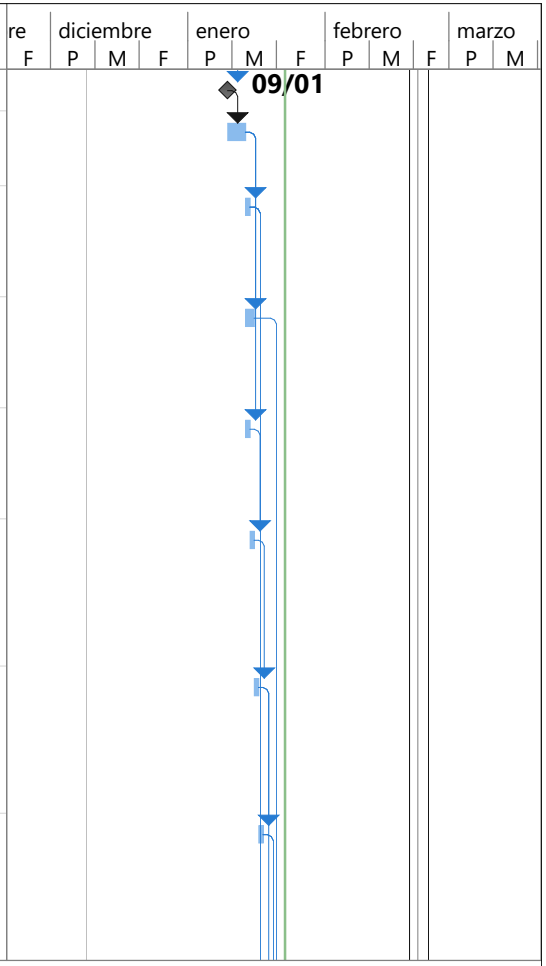

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
221		1.3.1	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	2 días	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 370.941,74
222		1.3.1	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	1 día	vie 17/01/25	vie 17/01/25	$ 645.345,64
223		1.3.1	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	1 día	lun 20/01/25	lun 20/01/25	$ 217.238,02
224		1.3.3	DESMONTE DE CANALETA MET	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25	$ 145.121,08
225		1.3.4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	15 días	mié 15/01/25	mar 04/02/25	$ 18.213.133,11
226		2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	$ 117.186,03
227		2.4.1	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12	1 día	mar 21/01/25	mar 21/01/25	$ 857.631,65
228		3.2.1	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	10 días	mié 15/01/25	mar 28/01/25	$ 11.117.213,32
229		3.2.1	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	2 días	lun 20/01/25	mar 21/01/25	$ 4.347.552,86

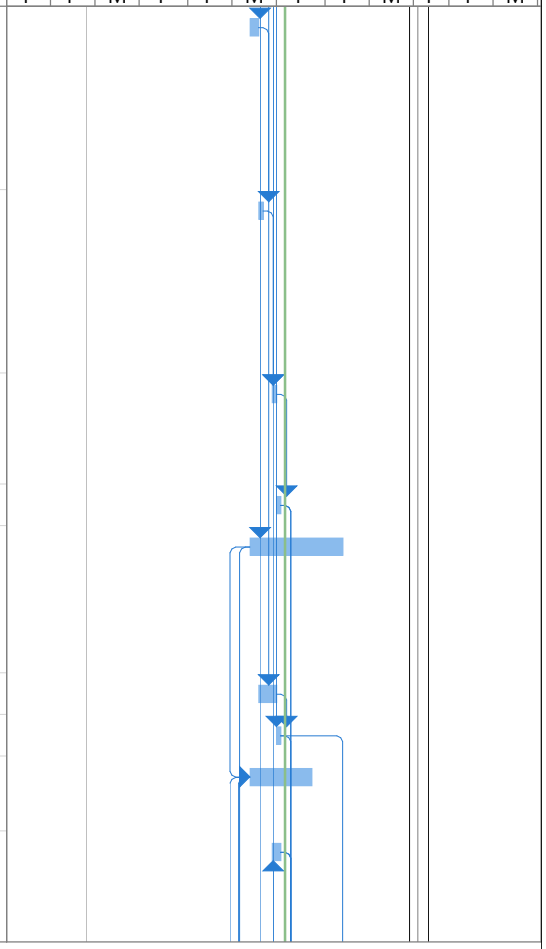

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
230		5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 3.197.365,64
231		5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8. INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 2.844.712,71
232		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	$ 118.767,48
233		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	$ 238.923,21
234		5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25	$ 1.235.805,23

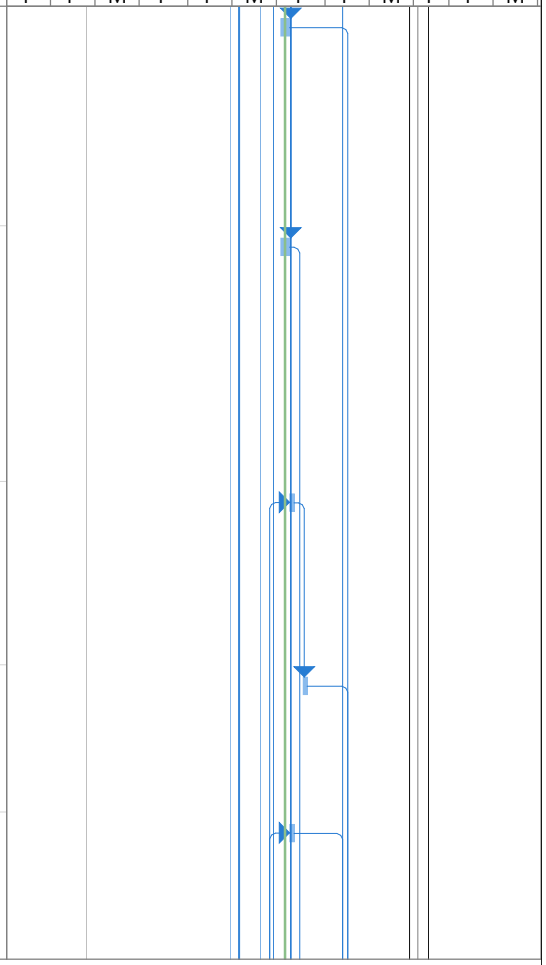

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		


Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
235		7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO <	2 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	$ 3.624.856,49
236		7.2.1	PISO EN VINISOL TRÁFICO PES	2 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	$ 1.157.394,00
237		7.2.1	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 549.570,77
238		8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	2 días	jue 16/01/25	vie 17/01/25	$ 4.286.030,56
239		8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO	3 días	vie 24/01/25	mar 28/01/25	$ 3.496.267,14
240		9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR	4 días	lun 20/01/25	jue 23/01/25	$ 4.959.799,71
241		11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 4.555.684,69
242		11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	2 días	vie 24/01/25	lun 27/01/25	$ 2.655.111,94
243		12.1	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	7 días	mié 22/01/25	jue 30/01/25	$ 24.724.069,96

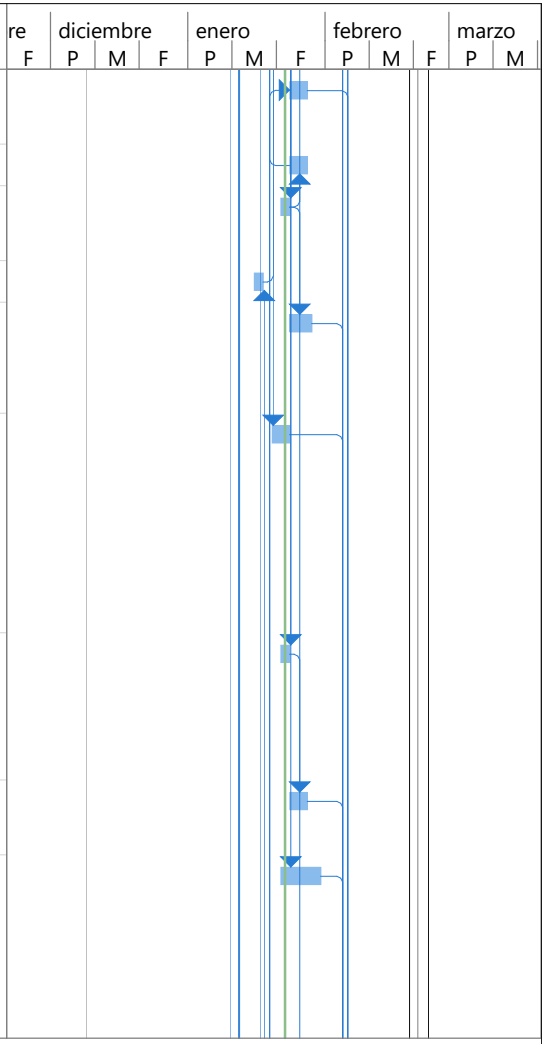

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Text	Nombre de tarea	Duraci	Comienzo	Fin	Costo
244		13.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO	1 día	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 977.308,79
245		13.2	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	vie 17/01/25	jue 30/01/25	$ 5.519.089,28
246		13.2	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	10 días	mié 22/01/25	mar 04/02/25	$ 15.794.587,13
247		14.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS	3 días	vie 24/01/25	mar 28/01/25	$ 5.469.704,04
248		17.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	$ 2.349.489,22
249		17.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	3 días	mié 15/01/25	vie 17/01/25	$ 1.029.682,40
250		17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	5 días	lun 20/01/25	vie 24/01/25	$ 3.352.748,18
251		20.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIE	3 días	mié 05/02/25	vie 07/02/25	$ 2.241.622,93
252			FIN INTERV.	0 días	vie 07/02/25	vie 07/02/25	$ 0,00
253			FIN PROYECTO	0 días	vie 21/02/25	vie 21/02/25	$ 0,00

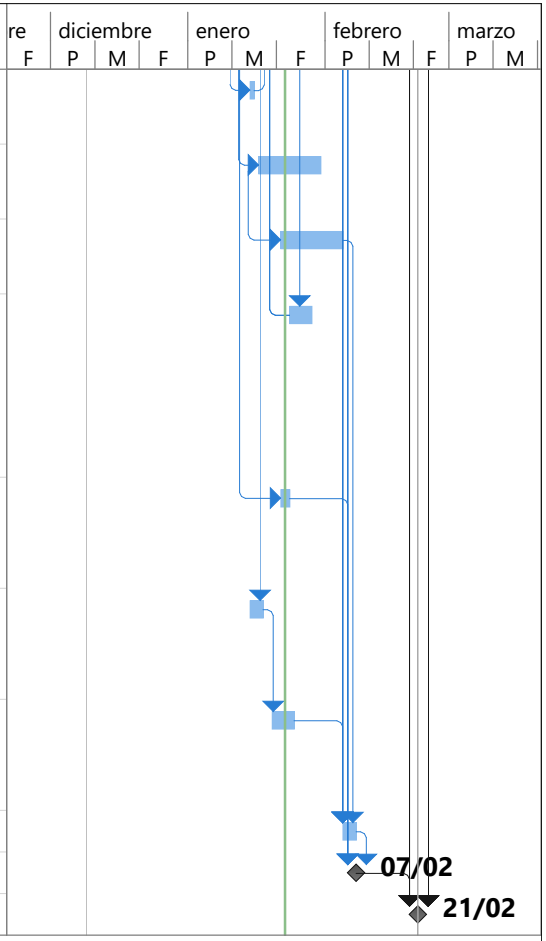

Proyecto: CRONOGRAMA DISC
Fecha: jue 23/01/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		
