ACTA N° 1

ACTA N°	1	FECHA INICIO	12-dic-24	FECHA FINAL	27-feb-25
PROYECTO	"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"				
CONTRATISTA	INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT		900902081-3	
CONTRATANTE	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE	NIT		890105497-0	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRATO INICIAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No1		ACTA No2		ACUMULADO FINAL	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VR. PARCIAL
	1. EXPANSIÓN REDES DE 2" SECTOR ESCUELA VÍA HACIA GRANADA				$ 51.073.231,79								
	1. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES				$ 51.073.231,79								
1.1	Excavaciones en material comun de (0-2m)	m3	744,00	$ 43.224,32	$ 32.158.851,70	388,43	$ 16.788.775,58	104,00	$ 4.495.329,95	260,00	$ 11.238.322,37	364,00	$ 15.723.691,33
1.2	llenos y compactación con material de la excavación	m3	744,00	$ 25.422,50	$ 18.914.380,09	388,00	$ 9.863.932,54	104,00	$ 2.643.940,00	260,00	$ 6.609.850,00	364,00	$ 9.253.790,00
	2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS				$ 57.373.360,45								
2.1	Suministro e instalación de tubería PVC Presión RDE 21 de 2"	ml	2050	$ 27.987,01	$ 57.373.360,45	1500,00	$ 41.980.507,65	300,00	$ 8.396.101,53	1.100,00	$ 30.785.705,61	1400,00	$ 39.181.807,14
	3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS				$ 5.420.182,52								
3.1	Suministro e instalación de Unión de reparación PVC RDE 21 de 2"	un	5,00	$ 58.783,50	$ 293.917,50	5,00	$ 293.917,50	-	$ -	5,00	$ 293.917,50	5,00	$ 293.917,50
3.2	Suministro e instalación de codo PVC Presión RDE 21 Unión mecánica de 45 grados de 2"	un	22,00	$ 112.532,58	$ 2.475.716,76	5,00	$ 562.662,90	-	$ -	5,00	$ 562.662,90	5,00	$ 562.662,90
3.3	Suministro e colca.de tapon soldado de 2" (un)	un	1,00	$ 17.505,30	$ 17.505,30	1,00	$ 17.505,30	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.4	Suministro e instalación de tapa válvula tipo chonite en hierro ductil, incluye caja	un	1,00	$ 647.121,30	$ 647.121,30	1,00	$ 647.121,30	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.5	Suministro, transporte e instalación de Válvula de compuerta de 2"	un	2,00	$ 992.965,03	$ 1.985.921,66	2,00	$ 1.985.921,66	-	$ -	1,00	$ 992.965,03	1,00	$ 992.960,83
	4. ATRAQUES EN CONCRETO				$ 1.200.055,00								
4.1	Atraque en concreto f'c=21Mpa/cm2	m3	4,00	$ 1.040.011,00	$ 4.160.044,00	4,00	$ 4.160.044,00	-	$ -	4,00	$ 4.160.044,00	4,00	$ 4.160.044,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA				$ 49.264.373,93								
5.1	Excavación y transporte	día	2,00	$ 360.676,00	$ 721.352,00	0,00	$ 721.352,00	0,00	$ 721.352,00	-	$ -	0,00	$ 721.352,00
5.2	Descapote y limpieza (0-0,3)	m2	18,00	$ 19.010,42	$ 288.158,54	10,0	$ 360.208,22	20,00	$ 360.208,22	-	$ -	20,00	$ 360.208,20
5.3	Excavación manual en material común apco 0-2m	m3	8,4	$ 43.224,32	$ 370.648,52	29,98	$ 1.295.648,90	29,98	$ 1.295.648,90	-	$ -	29,98	$ 1.295.648,90
5.4	Cargue,retiro, y botada de material sobrante de la excavación	m3	8,6	$ 76.176,93	$ 653.217,17	29,98	$ 2.283.403,48	29,98	$ 2.283.403,48	-	$ -	29,98	$ 2.283.403,48
5.5	solado en concreto pobre(F'c = 140 kg/cm2) e=5 cm	m2	12,25	$ 45.304,88	$ 554.984,78	19,95	$ 903.832,36	19,95	$ 903.832,36	-	$ -	19,95	$ 903.832,36
5.6	Entresuelo en piedra diametro menor de 4" e = 20 cm	m2	12,25	$ 80.908,33	$ 991.127,04	19,95	$ 1.614.121,18	19,95	$ 1.614.121,18	-	$ -	19,95	$ 1.614.121,18
5.7	Concreto fc= 210 kg/cm2 para losa de apoyo	m3	6,1	$ 1.040.011,00	$ 6.370.067,38	6,0	$ 6.266.066,28	6,03	$ 6.266.066,28	-	$ -	6,03	$ 6.266.066,28
5.8	Acero de refuerzo fy=60.000 y 40.000 psi (incluye figuración) NORMA ASTM 1562	kg	612,5	$ 14.250,00	$ 8.728.125,00	680	$ 9.690.000,00	680,00	$ 9.690.000,00	-	$ -	680,00	$ 9.690.000,00
5.9	Suministro, transporte e instalación de tanque para almacenamiento de Agua. Fabricado en Polester reforzado con Fibra de vidrio. PRFV- Cilindrico vertical de fondo plano,(VOL.=20 m3. Diametro 2,7 m, Altura libre = 3,50 m), incluye escalera externa, Mh lateral y superior para inspección válvulas y accesorios.	un	1,00	$ 23.049.412,50	$ 23.049.412,50	1,00	$ 23.049.412,50	1,00	$ 23.049.412,50	-	$ -	1,00	$ 23.049.412,50
5.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Poste metálico en HG H=2,8 m con galfanizo calibre 14 (ML)	mt	20,00	$ 344.782,50	$ 6.895.650,00	20,00	$ 6.895.650,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
5.11	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12. CUO.5, L= 2.0 m y POSTE EN HG, DIAMETRO 2" CALIBRE 14, DE 2,80 x 2,00	un	1,00	$ 1.192.662,50	$ 1.192.662,50	1,00	$ 1.192.662,50	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
				Subtotal	$ 168.351.203,49								
	6. EXPANSIÓN REDES DE 1-1/2" SECTOR LA SONADORA PARTE ALTA				$ 3.295.049,61								
	1. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES				$ 3.295.049,61								
6.1.1	Excavaciones en material comun de (0-2m)	m3	48,00	$ 43.224,32	$ 2.074.768,61	48,00	$ 2.074.768,61	48,00	$ 2.074.768,61	-	$ -	48,00	$ 2.074.768,61
6.1.2	Llenos y compactación con material de la excavación.	m3	48,00	$ 25.422,50	$ 1.220.280,00	48,00	$ 1.220.280,00	48,00	$ 1.220.280,00	-	$ -	48,00	$ 1.220.280,00
	2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS				$ 3.695.833,33								
6.2	Suministro e instalación de tubería PVC Presión RDE 21 de 1-1/2"	ml	150,00	$ 24.638,89	$ 3.695.833,33	150,00	$ 3.695.833,33	150,00	$ 3.695.833,33	-	$ -	150,00	$ 3.695.833,33
	3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS				$ 1.468.897,07								
6.3.1	Suministro e instalación de Unión de PVC Presión RDE 21 de 1-1/2"	un	20,00	$ 9.616,00	$ 192.320,00	20,00	$ 192.320,00	20,00	$ 192.320,00	-	$ -	20,00	$ 192.320,00
6.3.2	Suministro e instalación de codo PVC Presión RDE 21 de 1-1/2"	un	10,00	$ 17.261,00	$ 172.610,00	2	$ 34.522,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
6.3.3	Suministro e instalación de tapa válvula tipo chonite en hierro ductil, incluye caja	un	1,00	$ 647.121,30	$ 647.121,30	1,00	$ 647.121,30	1,00	$ 647.121,30	-	$ -	1,00	$ 647.121,30
6.3.4	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1-1/2"	un	1,00	$ 486.836,67	$ 486.836,67	1,00	$ 486.836,67	1,00	$ 486.836,67	-	$ -	1,00	$ 486.836,67
	4. ATRAQUES EN CONCRETO				$ 312.003,30								
6.4.1	Atraque en concreto f'c=21Mpa/cm2	m3	0,30	$ 1.040.011,00	$ 312.003,30	0,30	$ 312.003,30	-	$ -	-	$ -	0,30	$ 312.003,30
				Subtotal	$ 8.861.776,21								
	DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO												
	1. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES				$ 4.118.858,01								
R.1.1	Excavaciones en material comun de (0-2m)	m3	60,00	$ 43.224,32	$ 2.593.459,01	60,00	$ 2.593.459,01	60,00	$ 2.593.459,01	-	$ -	60,00	$ 2.593.459,01
R.1.2	Llenos y compactación con material de la excavación	m3	60	$ 25.422,50	$ 1.525.350,00	60	$ 1.525.350,00	60,00	$ 1.525.350,00	-	$ -	60,00	$ 1.525.350,00
	2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS				$ 4.309.565,07								
R.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC Presión X 500 lbs de 1/2"	mt	300,00	$ 9.463,00	$ 2.838.900,00	300,00	$ 2.838.900,00	300,00	$ 2.838.900,00	-	$ -	300,00	$ 2.838.900,00
R.2.2	Suministro e instalación de Union PVC Presión X 500 lbs de 1/2"	un	50,00	$ 2.049,71	$ 102.485,30	50,00	$ 102.485,30	50,00	$ 102.485,30	-	$ -	50,00	$ 102.485,30
R.2.3	Collar de 1-1/2" x 1/2"	un	3,00	$ 30.444,00	$ 91.332,00	3,00	$ 91.332,00	3,00	$ 91.332,00	-	$ -	3,00	$ 91.332,00
R.2.4	Medidor de 1/2"	un	3,00	$ 179.219,17	$ 537.657,51	3,00	$ 537.657,51	3,00	$ 537.657,51	-	$ -	3,00	$ 537.657,51
R.2.5	válvula de corte de 1/2"	un	3,00	$ 45.539,38	$ 136.618,14	3,00	$ 136.618,14	3,00	$ 136.618,14	-	$ -	3,00	$ 136.618,14
R.2.6	caja para medidor, incluye tapa	un	3,00	$ 167.524,04	$ 502.572,12	3,00	$ 502.572,12	3,00	$ 502.572,12	-	$ -	3,00	$ 502.572,12
				Subtotal	$ 8.328.374,07								
ITEMS N.P	1. ITEM NO PREVISTOS				-								
	TUBERIA DE 3"												
1	1. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES				$ -								
1.1	Excavación de material común de (0-2m)	m3		$ 43.224,32		152	$ 6.570.096,64	152,00	$ 6.570.096,64	-	$ -	152,00	$ 6.570.096,64
1.2	Llenos y compactación de material de la excavación.	m3		$ 25.422,50		152	$ 3.864.220,00	152,00	$ 3.864.220,00	-	$ -	152,00	$ 3.864.220,00
2	2. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 3"				$ -								
2.1	Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE21 de 3"	ml		$ 42.500,00		475	$ 20.187.500,00	475,00	$ 20.187.500,00	-	$ -	475,00	$ 20.187.500,00
3	3. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS				$ -								
3.1	Suministro e instalación de unión de reparación PVC presión RDE 21 de 3"	un		$ 84.970,00		2	$ 169.940,00	2,00	$ 169.940,00	-	$ -	2,00	$ 169.940,00
3.2	Suministro e instalación de codo 45° de PVC presión RDE 21 unión mecánica de 3"	un		$ 225.000,00		2	$ 450.000,00	2,00	$ 450.000,00	-	$ -	2,00	$ 450.000,00
3.3	Suministro e instalación de Tee en hierro dúctil junta hidráulica de 3"	un		$ 417.000,00		1	$ 417.000,00	1,00	$ 417.000,00	-	$ -	1,00	$ 417.000,00
3.4	Suministro e instalación de válvula ventosa nylon STOMO 3/4.	un		$ 189.000,00		12	$ 2.268.000,00	6,00	$ 1.134.000,00	-	$ -	6,00	$ 1.134.000,00
3.5	Suministro e instalación de registro de incorporación en bronce 3/4"	un		$ 25.800,00		10	$ 258.000,00	6,00	$ 154.800,00	-	$ -	6,00	$ 154.800,00
3.6	Suministro e instalación de tapa válvula tipo chonite en hierro ductil, incluye caja.	un		$ 647.121,47		2	$ 1.294.242,94	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -
3.7	Suministro e instalación de válvula tipo en hierro ductil de 3"	un		$ 963.575,64		2	$ 1.927.151,28	2,00	$ 1.927.151,28	-	$ -	2,00	$ 1.927.151,28
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 185.481.351,98	$	185.480.929,60	$	112.708.618,78	$	55.995.477,01	$	168.704.096,29
TOTAL ADMINISTRACION				20,0%	$ 37.096.270,39	$	37.096.185,90	$	22.541.723,76	$	11.199.095,50	$	33.740.819,26
UTILIDAD				5,00%	$ 9.274.067,59	$	9.274.046,94	$	5.635.430,94	$	2.799.773,88	$	8.435.204,81
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)					$ 231.851.690,95	$	231.851.162,35	$	140.885.773,48	$	69.994.346,39	$	210.880.120,36

RESUMEN CONTRATO ACTUALIZADO		PAGO ANTICIPADO	ACTA #1	ACTA #2	TOTAL A PAGAR #2
VALOR COSTO DIRECTO + ITEMS N.P	$ 185.480.929,60	$ 92.740.675,94	$ 112.708.618,78	$ 55.995.477,01	$ 55.995.477,01
ADMINISTRACIÓN 20%	$ 37.096.185,90		$ 22.541.723,76	$ 11.199.095,50	$ 11.199.095,50
UTILIDAD 5%	$ 9.274.046,95		$ 5.635.430,94	$ 2.799.773,88	$ 2.799.773,88
TOTAL CONTRATO + ITEMS N.P	$ 231.851.162,35	$ 92.740.675,94	$ 140.885.773,48	$ 69.994.346,88	$ 69.994.346,88

DIANA YISED FLOR VARGAS
Secretaria de Medio ambiente municipio de Guatape.

JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO
Gerente Empresa Autonoma de Guatape

ELKIN ALDUBER PAMPLONA GIRALDO
Residente de Obra

EDUARDO RAFAEL GUTIERREZ TERNERA
Director de obra

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"						
ITEM	1.1	Excavaciones en material comun de (0-2m)				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m3	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	260	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA	1.000,00	0,4	0,65	260,00	260
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					**260**









Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"						
ITEM	1.2	llenos y compactaciòn con material de la excavaciòn				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m3	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	260	**PERIODO DE ACTA**	115 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PAL	1000	0,4	0,65	260	260
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					260





Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"						
ITEM	2.1	Suministro e instalaciòn de tuberia PVC Presiòn RDE 21 de 2"				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	ml	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	1000	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA	1000	0	0	0	1000
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					1000







Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"						
ITEM	3.1	Suministro e instalaciòn de Uniòn de reparaciòn PVC RDE 21 de 2"				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	un	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	5	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA	0	0	0	5	5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					5



Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	“EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA”						
ITEM	3.2	Suministro e instalaciòn de codo PVC Presiòn RDE 21 Uniòn mecànica de 45 grados de 2"				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	dia	**ACTA DE AVANCE No**	1		**ACUMULADO** 5	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA	0	0	0	5	5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					5







Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	“EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA”						
ITEM	3,5	Suministro, transporte e instalaciòn de Vâlvula de compuerta de 2”				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m3	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	1	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA	0	0	0	1	1
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					1





Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	“EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA”						
ITEM	4,1	Atraque en concreto fc=210kg/cm2				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m3	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	5	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA	0	0	0	5	5
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					5



Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"						
ITEM	ll 4,1	Atraque en concreto fc=210kg/cm2				**MUNICIPIO**	GUATAPE
UNIDAD	m3	**ACTA DE AVANCE No**	1	**ACUMULADO**	0	**PERIODO DE ACTA**	15 de enero al 30 de enero 2025

UBICACIÒN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**CANT.**	
VEREDA SONADORA SECTOR LA PALMA				0	0
TOTAL EJECUTADO PRESENTE CORTE					0





Elkin Pamplona.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR EAG

"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA"



INFORME DE OBRA

No 2

Periodo de informe

16 de enero 2025 al 29 de enero 2025

1. INTRODUCCIÒN

El presente documento contiene **EL INFORME DE GESTIÒN DE LA OBRA No 2,** correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de enero 2025 al 29 de enero de 2025. Elaborado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **OC-053 de 2024,** suscrito entre la **Empresa Autónoma de Guatape** y la empresa **INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con **NIT, 900963551-3,** representada legalmente por **SANDRA YULIETH PAMPLONA GIRALDO,** identificada con cedula de ciudadanía **No 1.037.236.609,** el cual tiene por objeto: **"EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA**".

En el siguiente informe se incluyen se incluyen los avances, desarrollo y aspectos más relevantes del contrato de obra pública **OC 053 de 2024** entre el 16 de enero 2025 al 29 de enero 2025 en el cual se explicarán las actividades y si es el caso, afectaciones que se presentaron de manera que le permitan a la Empresa Autónoma de Guatapè o a quien lo consulte, tener una visión general de los trabajos que se ejecutaron.

Se incluirá el avance de la obra en el tiempo señalada de acuerdo con lo previsto en la programación de obra e incluyendo el registro fotográfico que sustente las actividades realizadas.

INVERSIONES
CONSULTORÍAS Y CONSTRUCCIONES

2. LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO

El municipio Guatapé, localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Alejandría, por el este con el municipio de San Rafael, por el sur con Granada y por el Oeste con El Peñol. Su cabecera dista 75 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extension de 69 kilómetros cuadrados, fue llamado asi en honor al cacique Guatape.



Figura 1: *Ubicación del municipio de guatape.*

La zona de intervención se localiza en la vereda la sonadora del municipio, específicamente en el sector la palma y donde aranzo parte alta. Dicho proyecto tendrá una expansión del acueducto aproximadamente de 1.950 mtl en tubería de 2” y 3”, y la instalación de un tanque de almacenamiento de 20.000 m3 aproximadamente.

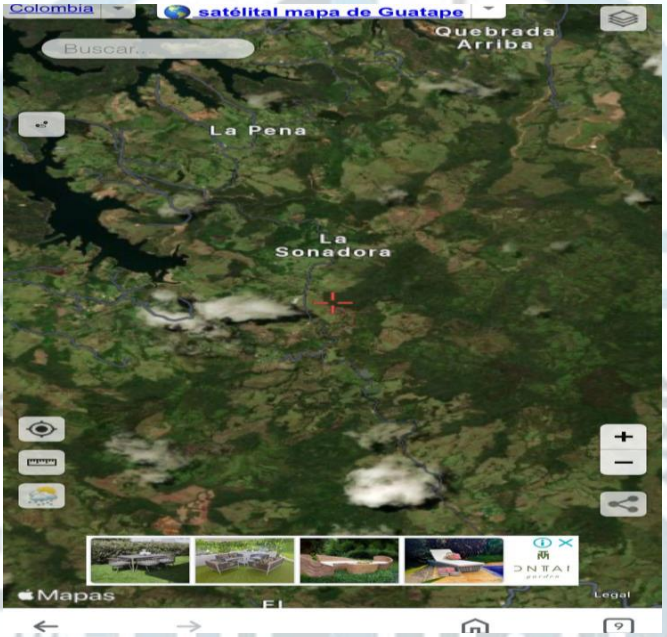


Figura 2: *ubicación de la ejecución del proyecto.*

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. INFORMACIÒN BASICA DEL CONTRATO

TABLA 1. *Contrato de Obra.*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No OC 053 DE 2024	
CONTRATISTA	INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900963551-3
VALOR DEL CONTRATO	$ 231.851.689,85
DURACIÒN	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE 2024
SUPERVISIÒN	EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE (EAG)

3.2. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

En la vereda de la sonadora existe la necesidad de realizar la ampliación del acueducto existente, esto debido al gran crecimiento que se viene teniendo en las partes altas de la vereda sector la palma debido a la insuficiente capacidad hidráulica de las redes de acueducto existente, para hacer frente y darle solución a esta necesidad se origina este proyecto y así poder dar cobertura del servicio en dicho sector y así mejorar la calidad de vida y las condiciones higiénico-sanitarias de esta población.

Partiendo de esta necesidad se celebra el contrato de obra **No OC 053 2024,** otorgado a la empresa **INVERSIONES, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S,** para la ejecución del proyecto y la supervisión estará a cargo de la **EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE (EAG).**

4. AVANCES DEL CONTRATO

En el periodo reportado entre el 16 de enero de 2025 al 29 de enero de 2025, se tiene un avance físico real del 92,7% y un avance financiero del 61%, lo cual representa un avance positivo de las actividades ejecutadas, es de mencionar que en la zona al inicio del proyecto existieron dificultades, debido a la temporada invernal que se presento en el mes de diciembre lo que dificulto las excavaciones, y el ingreso de material al sitio de la ejecución.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

5.1 DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto consiste en la ampliación del acueducto multiveredal de la vereda la sonadora, con el cual se pretende dar la solución a la insuficiente capacidad hidráulica que se viene presentando y poder garantizar una la calidad de vida y las condiciones higiénico-sanitarias de esta población.

5.1.1. PERSONAL

PERSONAL CONTRATISTA

La empresa contratista cuenta con personal administrativo de conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones y en la propuesta económica con la cual fue adjudicado el contrato, como se muestra en el registro mostrado a continuación.

Tabla 4. *Personal administrativo contratista.*

CARGO	NOMBRE	DEDI.MIN
Director de Obra	Eduardo Rafael Gutiérrez Ternera	20%
Residente de obra	Elkin Alduber Pamplona Giraldo	100%
Auxiliar SSt	Jennifer Andrea Castrillón Vargas	50%

Cabe mencionar que también se cuenta con personal en obra para le realización de las actividades contractuales y se lleva un registro diario de asistencia de los trabajadores.

5.1.2. BITÀCORA

El libro de obra o bitácora de obra se está manejando de forma escrita- física con el debido registro diario de las actividades ejecutadas, novedades, particularidades, solicitudes, recomendaciones y respuestas que se manifiestan en obra, esto con el fin de llevar el correspondiente seguimiento de obra.

5.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo del presente informe se contó con los equipos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales tales como, mezcladora, vibrador de concreto tipo agua, cortador y figurador de acero de refuerzo, planta eléctrica, codales y demás elementos y herramientas de los cuales se realizó el respectivo seguimiento y control.

5.1.4. CONTROL DEL TIEMPO

Durante el periodo de tiempo transcurrido del presente informe, entre el 16 de enero de 2025 al 29 de enero de 2025, se realizó el control correspondiente del tiempo para llevar un seguimiento de las posibles afectaciones y retrasos que se puedan presentar en obra relacionadas con estas eventualidades.

5.1.5. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

A la fecha del presente informe se cuentan con los materiales requeridos para la ejecución de las actividades programadas en obra tales como cemento, acero de los calibres correspondiente, material de playa, tubería, tanque y demás. Dichos materiales cuentan con su ficha técnica y certificados de calidad.

5.1.6. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La obra cuenta con una profesional encargada del área de seguridad y salud en el trabajo para realizar el seguimiento a las actividades que se están ejecutando de acuerdo a las buenas prácticas de seguridad en obra, llevando controles respecto al uso de los elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades, por otro lado, en el presente corte se realizaron inducciones y reinducciones al Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo para el personal nuevo contratado, pausas activas, capacitaciones y socialización de políticas del sistema de Gestión SST. Se anexa informe correspondiente a esta área.

6. LEGALIZACIÒN Y APROBACIÒN DE ACTAS DE OBRA

6.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA

A la fecha, el contratista se encuentra en el proceso de elaboración del acta parcial No.2 de acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo transcurrido desde el 15 de enero 2025 hasta el 30 de enero de 2025, esta acta será presentada para revisión y aprobación de la supervisión y la entidad contratante.

6.2 CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRA

A continuación, se enuncia de manera general el seguimiento de las actividades ejecutadas en obra durante el plazo del presente informe.

SEMANA 1: 15 de enero de 2025 al 30 de enero 2025

Durante este periodo se continuo con la excavación para la instalación de tubería de 2” en el sector la palma , se instalaron ventosas en los tramos requeridos, se instalo valvula de paso de 2”



figura 5. Excavación manual sector la palma



figura 6. Excavación manual sector la palma



figura 7. Instalación de tubería.



figura 8. Instalación de unión de reparación



figura 9. Instalación de tubería de 2”



figura 10. Instalación de tubería de 2”



figura 11. Instalación de tubería de 2”



figura 11. Instalación de tubería de 2”

6.3. CONTROL DE PAGOS A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Se adjunta planilla de seguridad social del mes de diciembre y los certificados de afiliación del personal de obra.

6.4. REUNIONES Y/O COMITES DE OBRA

Durante el periodo del presente informe se realizó un recorrido en obra por los lugares donde se va ejecutar el proyecto.



Elkin Alduber Pamplona Giraldo.
RESIDENTE DE OBRA
Elaboro.

INFORME N.2 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO

“EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA”

FECHA DE INICIO PROYECTO: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA REALIZACION INFORME: 15 AL 30 DE ENERO 2025

RESPONSABLE

JENNIFER CASTRILLON VARGAS

AUXILIAR SST

MUNICIPIO DE GUATAPE

1.DATOS DE OBRA: “EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA SONADORA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ANTIOQUIA”

FECHA DE EJECUCION: 2 MESES Y MEDIO

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

INTRODUCCION: El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como objetivo documentar las acciones realizadas en el marco del proyecto de ampliación del acueducto en la vereda La Sonadora, iniciado el 12 de diciembre de 2025. Este proyecto cuenta con un equipo de 6 trabajadores, quienes han recibido capacitaciones e inducciones en SST para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección.

Durante el desarrollo del proyecto, se han implementado medidas de prevención y control de riesgos laborales, logrando hasta la fecha la ausencia de incidentes o accidentes de trabajo. Este informe recopila los avances realizados, las medidas implementadas y las recomendaciones necesarias para continuar promoviendo un ambiente laboral.

OBJETIVO: Garantizar la protección y promoción de la salud y seguridad de los trabajadores durante la ejecución del proyecto de ampliación del acueducto en la vereda La Sonadora, a través de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, el cumplimiento de las normativas de SST vigentes. y la implementación de acciones preventivas y correctivas que promuevan un ambiente laboral seguro.

ALCANCE: Este informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) abarca las actividades desarrolladas en el proyecto de ampliación del acueducto en la vereda La Sonadora desde su inicio el 12 de diciembre de 2024. Incluye la gestión de riesgos laborales para los 6 trabajadores asignados al proyecto, las capacitaciones e inducciones realizadas, el monitoreo de condiciones de seguridad, y las medidas preventivas implementadas para garantizar el cumplimiento de las normativas legales aplicables.

El informe también considera las acciones futuras previstas para mitigar riesgos y mantener un ambiente laboral seguro durante la ejecución del proyecto.

MARCO LEGAL

El desarrollo del presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) vigentes en Colombia, las cuales establecieron los lineamientos para la prevención de riesgos laborales y la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables. A continuación, se detallan las principales disposiciones legales aplicables:

Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales, ampliando su cobertura y fortaleciendo las obligaciones de los empleadores en la prevención de riesgos.

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que establece los lineamientos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en todas las empresas.

Resolución 0312 de 2019: Definir los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo los requisitos específicos para empresas de diferentes tamaños y niveles de riesgo.

Código Sustantivo del Trabajo: Especialmente los artículos relacionados con la seguridad, higiene y condiciones de trabajo.

Normas técnicas aplicables: Tales como la **NTC-OHSAS 18001** y la **ISO 45001**, que orientan la gestión de la SST en proyectos de construcción.

Resolución 1409 de 2012: Regula el trabajo seguro en alturas, aplicable a las actividades de construcción que requieran este tipo de tareas.

Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional, establece las disposiciones generales en materia de salud ocupacional y protección ambiental en el trabajo.

Decreto 614 de 1984: Reglamenta la salud ocupacional y la obligación de las empresas de implementar programas de prevención de riesgos laborales.

Resolución 2400 de 1979: Establece el Reglamento General de Higiene y Seguridad Industrial, con disposiciones sobre las condiciones locativas y operativas de los centros de trabajo.

Ley 769 de 2002: Código Nacional de Tránsito Terrestre, en lo relativo al transporte y movilización segura de materiales y equipos.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

"La empresa INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCCIONES SAS se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados, contratistas y visitantes. Para ello, nos comprometemos a cumplir con la normativa legal vigente, identificar y controlar los riesgos laborales, promover una cultura de seguridad en todas nuestras operaciones, y fomentar la capacitación continua en temas de seguridad. Nuestro objetivo es prevenir accidentes y enfermedades laborales, garantizando la protección de la integridad física y mental de todos los trabajadores, así como la mejora continua de nuestros procesos. de seguridad."

ANALISIS DE RIESGOS Y PELIGROS DETECTADOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Análisis de Riesgos y Peligros Caídas y resbalones

Riesgo: Las caídas o resbalones pueden ocurrir cuando los trabajadores realizan tareas en lugares elevados sin las medidas de protección necesarias. En el proyecto de ampliación de acueducto, esto puede ocurrir durante las actividades de excavación, o el caminar por partes elevadas

Posibles consecuencias: Lesiones graves como fracturas, traumatismos craneales, lesiones en la columna vertebral, e incluso fatalidades.

Medidas preventivas: Uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP) adecuados. Implementación de barreras de protección en zonas de altura. Inspección regular de las condiciones de trabajo.

Esfuerzo físico sobre esfuerzo.

Riesgo: Los esfuerzos excesivos pueden ocurrir cuando los trabajadores realizan movimientos repetitivos, levantamiento de cargas pesadas o trabajos de fuerza sin la técnica adecuada, lo cual es común en tareas de excavación, manipulación de materiales pesados y otras actividades del proyecto.
Posibles consecuencias: Lesiones musculares, distensiones, esguinces, hernias discales y problemas articulares.
Medidas preventivas: Capacitación sobre técnicas de levantamiento adecuadas de cargas. Uso de herramientas mecánicas para manipular cargas pesadas cuando sea posible. Rotación de tareas para evitar la sobrecarga física prolongada. Implementación de pausas activas para descanso y estiramiento.

Malas posturas

Riesgo : Las malas posturas durante la ejecución de tareas como excavado, trabajo en espacios reducidos, uso incorrecto de herramientas o equipos de trabajo pueden generar lesiones a largo plazo, especialmente en la columna vertebral, cuello y extremidades.
Posibles consecuencias: Dolor crónico en la espalda, contracturas musculares, lesiones en las cervicales y la columna vertebral.
Medidas preventivas: Promover el uso de posturas ergonómicas durante las actividades laborales. Proveer de equipos y herramientas adaptadas para evitar posturas forzadas. Realizar entrenamientos en técnicas adecuadas de trabajo, incluyendo posturas correctas. Revisión y ajuste de los puestos de trabajo y herramientas según las necesidades del trabajador.

Picaduras de insectos (como abejas, avispas, mosquitos)

Riesgo: La exposición a insectos puede provocar picaduras que generan reacciones alérgicas o infecciones. Este riesgo es común en áreas rurales o en proyectos de construcción al aire libre, como el de ampliación del acueducto.

Posibles consecuencias: Reacciones alérgicas severas, infecciones, enfermedades transmitidas por insectos (como dengue o malaria).
Medidas preventivas: Uso de repelentes de insectos. Provisión de ropa de manga larga y pantalones largos para reducir la exposición. Colocación de vallas protectoras en áreas de descanso y comida. Disponibilidad de kits de primeros auxiliares para tratar picaduras y reacciones alérgicas.

Exposición al sol (golpe de calor, deshidratación)

Riesgo : La exposición prolongada al sol puede generar golpes de calor, deshidratación, quemaduras solares y otros problemas relacionados con el calor, especialmente en trabajos al aire libre, como en el proyecto de ampliación de acueducto . **Posibles consecuencias:** Golpes de calor, quemaduras de piel, agitación, deshidratación y accidentes relacionados con la fatiga extrema. Medidas preventivas: Proveer de agua potable en todo momento para garantizar la hidratación de los trabajadores. Establecer horarios de trabajo que eviten las horas de mayor exposición al sol. Uso de ropa adecuada, sombreros y protector solar. Establecer pausas regulares en zonas sombreadas o interiores frescos para evitar la exposición continua.

Exposición a la lluvia (resbalones, enfermedades respiratorias)

Riesgo: La exposición a condiciones meteorológicas adversas, como la lluvia, puede generar superficies resbaladizas y aumentar el riesgo de caídas o accidentes. También puede llevar a problemas de salud como resfriados o enfermedades respiratorias.
Posibles consecuencias: Lesiones por resbalones y caídas, enfermedades respiratorias o infecciones por mojarse.
Medidas preventivas: Uso de botas antideslizantes y ropa impermeable adecuada para evitar resbalones. Proveer de espacios cubiertos para descansar en caso de lluvia intensa. Establecer medidas de seguridad para trabajar en condiciones de lluvia, como la reducción de tareas en superficies mojadas. Controlar el tiempo de exposición al aire libre durante la lluvia para evitar enfermedades relacionadas con la humedad.

	CRONOGRAMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)		
CRONOGRAMA DE CHARLAS			
TEMA	SEMANAS PROGRAMADAS		
	13- 18 DICIEMBRE	19-23 DICIEMBRE	07-09 ENERO
Accidentalidad en obra durante el mes			
Uso de protección personal			
Golpe de sol			
Riesgos existentes en la manipulación de herramientas			
ATS			
Preoperacionales de volquetas			
Uso adecuado de las gafas			
Primeros auxilios			
Golpes por o contra objetos y maquinaria			

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES MENSUALES 2025	
TEMA	MES
Prevención de las Lesiones de Columna	ENERO
Prevención de accidentes laborales	FEBRERO
Agotamiento por Calor	MARZO
Riesgo psicosocial	ABRIL
Uso de EPP	MAYO

ITEM	TEMA	FECHA	RESPONSABLE	HORAS
1	PREVENCION LECCIONES DE COLUMNA	13/01/2025	AUXILIAR SST	1
TOTAL				1

CHARLAS CORTAS: En el mes de enero se realizaron 5 charlas en este plazo se implementaron 1 y 30 minutos en capacitación en estas charlas se abarcan temas asignados en el cronograma de charlas y capacitaciones.

INDUCCIONES: INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS realiza inducción al personal que ingresa a desarrollar actividades con la empresa, en esta brinda educación sobre los riesgos que poseen las actividades a ejecutar en obra, sobre las medidas preventivas que se deben adoptar, y los estándares en general que componen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nota: En el mes de enero no hubo ingresos de trabajadores por lo tanto en el cuadro anterior no se evidencia ingresos ni inducciones al personal

INGRESO DE PERSONAL EN EL MES	PERSONAL DE INGRESO QUE RECIBIO INDUCCIÓN	CANTIDAD DE TRABAJADORES CON INDUCCIÓN EN EL MES	HORAS INDUCCIÓN
0	0	0	0

CUADRO ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES

DESCRIPCION	NÚMERO DE CHARLAS/CAPACITACIONES	TOTAL, MINUTOS
CHARLAS SEMANALES	5	5 MINUTOS POR CHARLA
INDUCCIÓN	0	1 HORA POR INDUCCION
RE INDUCCIÓN	0	0
CAPACITACIÓN PROGRAMADA	1	1 HORA POR CAPACITACION

PERSONAL CAPACITADO

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CAPACITACIÓN
DIEGO ALEXANDER ZULUAGA	OFICIAL	CHARLA SEMANAL 5 MIN –CAAPCITACION 1 HORA
LUIS CARLOS RAMIREZ	AYUDANTE CONSTRUCCION	CHARLA SEMANAL 5 MIN –CAAPCITACION 1 HORA
GUILLERMO ANTONIO VERGARA CEBALLOS	AYUDANTE CONSTRUCCION	CHARLA SEMANAL 5 MIN –CAAPCITACION 1 HORA
JUAN RAUL GOMEZ HOYOS	AYUDANTE CONSTRUCCION	CHARLA SEMANAL 5 MIN –CAAPCITACION 1 HORA
ELKIN PAMPLONA GIRALDO	RESIDENTE OBRA	CHARLA SEMANAL 5 MIN –CAAPCITACION 1 HORA

MEDIDAS DE PREVENCION, CORRECCION Y MITIGACION

Como medidas de prevención **INVERSIONES** opta por brindar una capacitación compuesta por las actividades que se ejecutaran en el transcurso de la obra, así mismo como sus riesgos y medidas a tomar en caso de algún accidente.


Como medidas correctivas **INVERSIONES** posee personal capacitado y medidas estipuladas para enfrentar las posibles emergencias que se puedan generar en el día a día laboral.

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDADES LABORALES

Resultados finales

Indicador	Resultado
Índice de Frecuencia	0
Índice de severidad	0
Índice de accidentalidad	0%
Índice de Enfermedades Laborales	0%

PIRÁMIDE DE LA ACCIDENTALIDAD

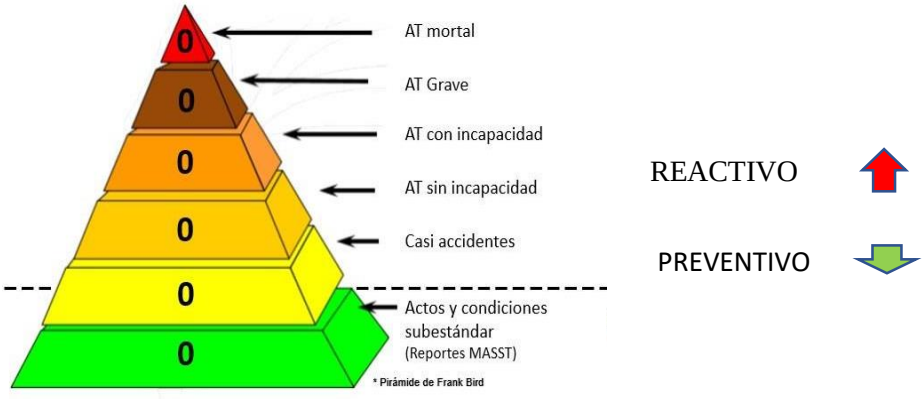

CONCLUSIONES:

El desarrollo del proyecto de ampliación del acueducto en la vereda La Sonadora ha demostrado un compromiso significativo con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciado en la implementación de medidas preventivas y de control orientadas a minimizar los riesgos asociados a la obra. A través de capacitaciones y programas de inducción, se ha fortalecido la cultura de seguridad entre los trabajadores, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento de la normativa vigente.

Hasta la fecha, no se han registrado accidentes laborales, lo que refleja la eficacia de las estrategias implementadas y el compromiso del equipo con la prevención. Sin embargo, es fundamental continuar con el monitoreo constante de las condiciones de trabajo, reforzar la identificación de peligros y evaluar periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los trabajadores en cada fase del proyecto.

Asimismo, es importante mantener una comunicación activa con el personal, fomentar la participación en la identificación de riesgos y asegurar que las lecciones aprendidas en este proceso sean aplicadas en futuros proyectos. De esta manera, se logrará no solo la culminación exitosa de la obra, sino también la consolidación de una gestión de seguridad eficaz y sostenible en el tiempo.

ARCHIVO FOTOGRAFICO



FIGURA 1: VISITA TECNICA DE LOS DIRECTIVOS DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA SONADORA



FIGURA 2: LIMPIEZA E INSTALACION DE LA TUBERIA



FIGURA 3: INSTALACION DE TUBERIA Y CONEXIÓN DE ACCESORIOS

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900963551-3

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CL 31 B 24 53 AP 302

Guatape, Antioquia - Colombia

Tel.3146556893

invconycon@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4290

Cliente: EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

NIT ó CC: 800105497-0 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CALLE 31 # 30 - 04

CIUDAD: Guatape, Antioquia - Colombia

CORREO: empresa-autonoma@hotmail.com

TELEFONO: 3193978543

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura electrónica de Venta **ICC23**

Fecha Creación: 2025-01-30 16:28

Fecha Validación: 2025-01-30 16:29

Fecha Vencimiento: 2025-01-30 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:00b5e9b79206ccb837b6e6204031e2c7e608bbc88e9b57df314aa10faa8b6675fccfdb1b1076b763f72e52c9573bbeb4

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764065096631 desde ICC1 hasta ICC100 Vigencia: 2024-02-06 al 2025-02-06

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	001	Contrato de obra no gravado (ACTA DE AVANCE #2 AMPLIACON DE ACUEDUCTO VEREDA LA SONADORA GUATAPE ANTIOQUAI)	1.0	$ 69,994,346.88	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 69,994,346.88

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 88/100 PESOS M/CTE

Base no gravada

$ 69,994,346.88

SUBTOTAL	$ 69,994,346.88
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 69,994,346.88
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 69,994,346.88**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Certificación Bancaria

Bancolombia

El Peñol, 21 de Febrero de 2024

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVERSIONES CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S identificado (a) con NIT: 900963551 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	334-641919-21	2024/02/21	ACTIVA

Atentamente,


Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

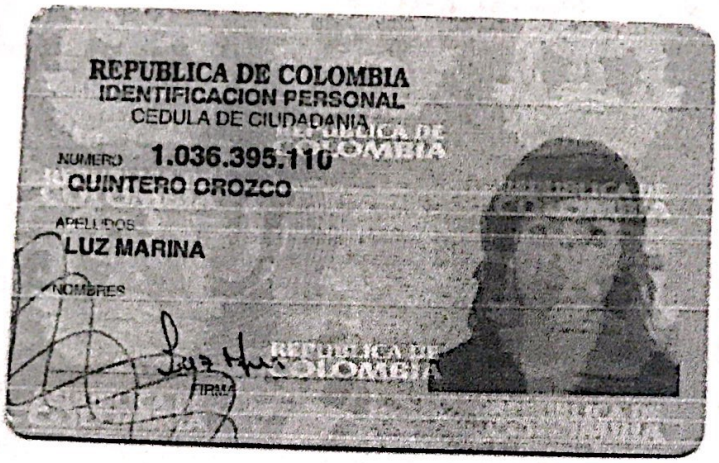


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.395.110
QUINTERO OROZCO

APELLIDOS
LUZ MARINA

NOMBRES

FIRMA

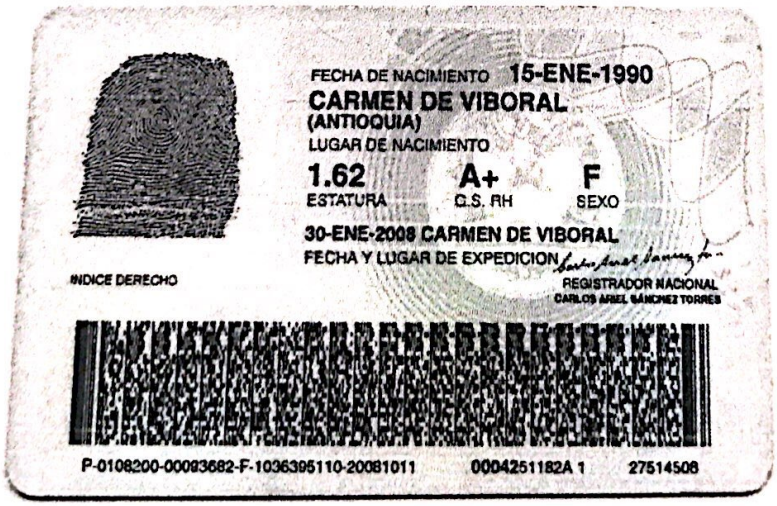

FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1990
CARMEN DE VIBORAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

30-ENE-2008 CARMEN DE VIBORAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0108200-00093682-F-1036395110-20081011 0004251182A 1 27514508

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

253283-T



LUZ MARINA
QUINTERO OROZCO
C.C. 1036395110
RES. INSCRIPCION 43 DEL 04/02/2019
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261371 282552

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8502ADE34922DB30

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MARINA QUINTERO OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036395110 de EL CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 253283-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

El Carmen de Viboral (ANT), 21 de Agosto 2025

Asunto: Certificado Parafiscales

LA empresa INVERSIONES, CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS con NIT 900963551, representada legalmente por la señora Sandra Yulieth Pamplona Giraldo con c.c 1.037.236.609 y la suscrita contadora Publica con c.c 1036395110 y tarjeta profesional 253283-T, certificamos que la empresa en mención se encuentra al día por todoconcepto en los aportes de seguridad social y parafiscales de todos sus empleados. La empresa no se encuentra obligada a realizar aportes a SENA Y ICBF art 114- 1 ET, adicional no cuenta con empleados que devenguen más de 10 SMLV.

Sandra Yulieth Pamplona Giraldo
c.c 1.037.236.609
Representante legal

Luz Marina Quintero Orozco
c.c 1.036.395.110
Contadora Publica

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-24, 11:46:39 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75603245

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 14/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERSIONES CONSULTORIAS Y CONTRUCCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	OPERATIVA 1	**Código Sucursal**	001
Documento	NI900963551	**Dirección**	CL 31B #24 - 53		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5435796		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUATAPE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PAMPLONA GIRALDO SANDRA YULIET	**Identificación**	CC 1037236609		
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037236044	DIEGO ALEXANDER RINCON ZULUAGA	01	00	X				X												0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 650.000	$ 104.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1037237357	ELKIN ALDUBER PAMPLONA GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 3497002	LUIS CARLOS RAMIREZ RAMIREZ	01	03	X				X												0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.300
CC 6481859	JUAN RAUL GOMEZ HOYOS	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 650.000	$ 104.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 70952130	GUILLERMO ANTONIO VERGARA CEBALLOS	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
PT 6751279	GUSTAVO EMIGDIO IRAUSQUIN BALBUENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.550.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 728.000	$ 208.000	$ 362.200	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.506.200	$ 0	$ 1.506.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
