

Imagen 7. Colocación de tubería conduit eléctrica subterránea - Excavación de zanjas para tuberías



Imagen 8. Tubería conduit y metálica en bodega - Construcción de registros eléctricos.

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Imagen 9. Demolición de estructuras existentes en concreto.



Imagen 10. Instalación de malla eslabonada - Preparación de superficie para instalación de adoquines

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

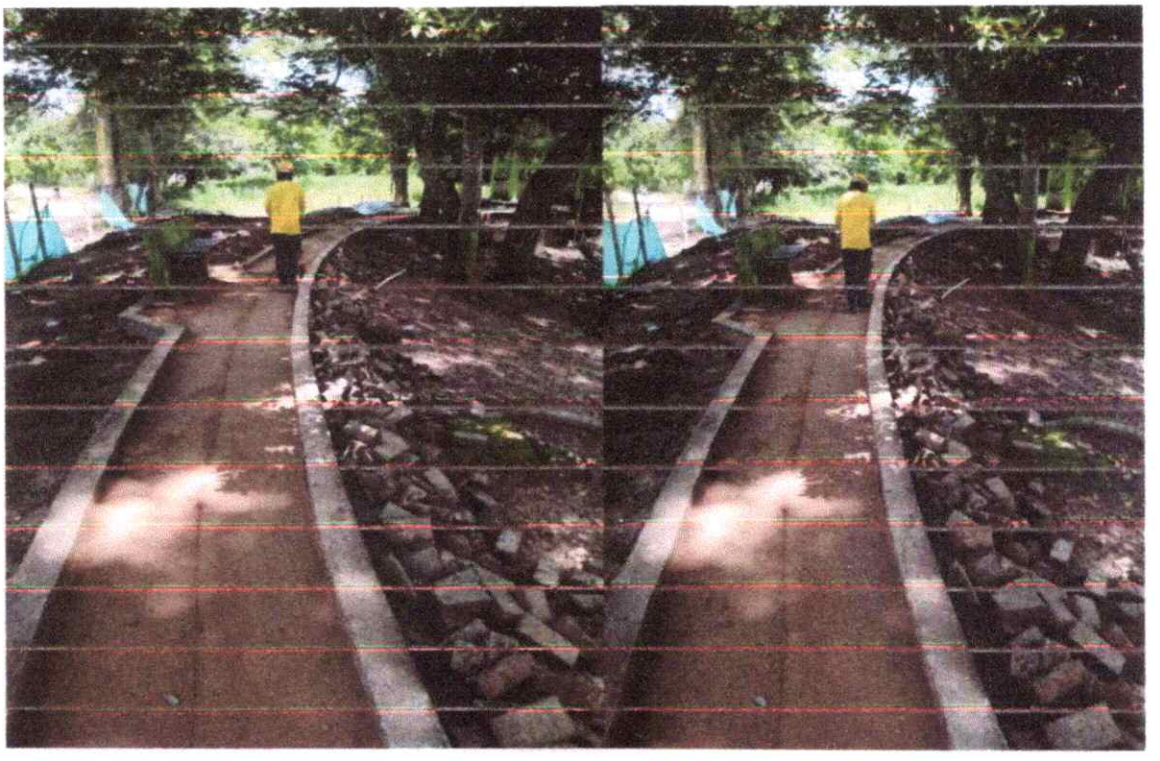


Imagen 11. Superficie en base granular compactada para instalación de adoquines.



Imagen 12. Desmonte de cubiertas metálicas de salón comunal

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Imagen 13. Desmonte de cubierta existente - Instalación de malla eslabonada



Imagen 14. Instalación de tubería eléctrica - Instalación de alambre púa

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Imagen 15. Desmonte de tejas de cubierta de salón comunal - Construcción de registros eléctricos



Imagen 16. Instalación de malla eslabona con marcos -- Instalación de tubería conduit subterránea

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Imagen 17. Levante de muros en salón comunal



Imagen 18. Desmonte de adoquines en mal estado de senderos peatonales

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

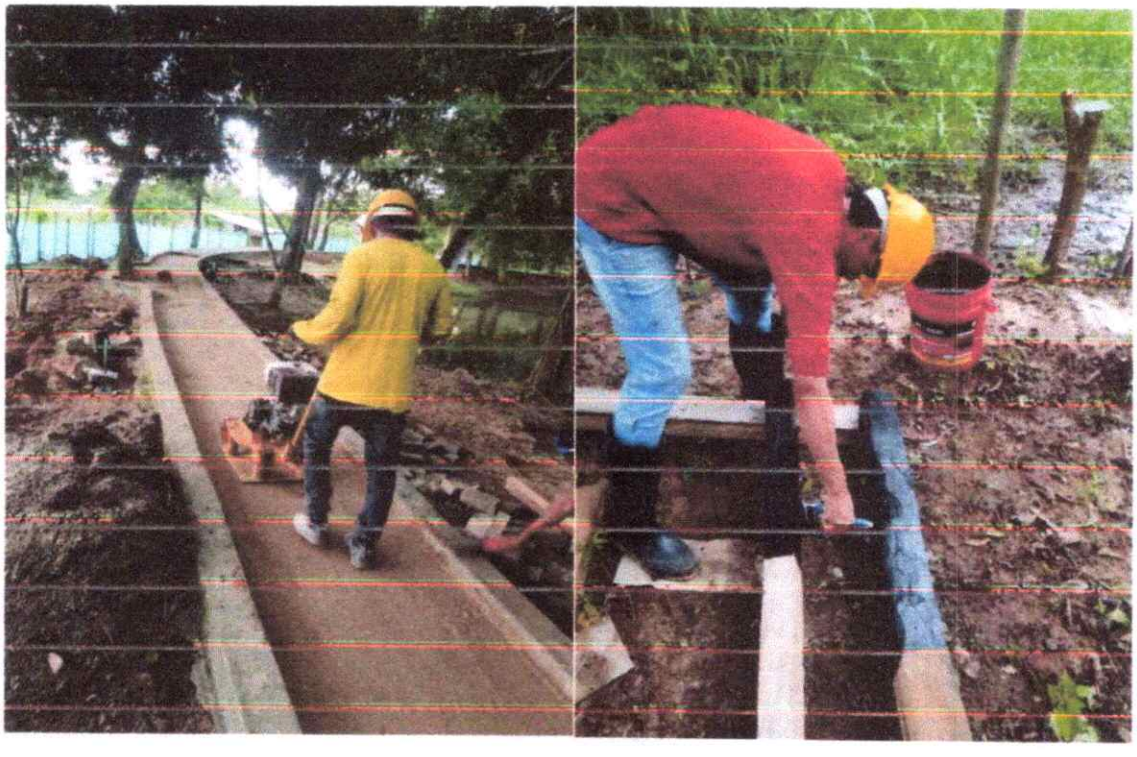


Imagen 19. Preparación superficie para instalación de adoquines - Pintura de bordillos.



Imagen 20. Construcción de registros eléctricos - Maquina para mezclar concreto

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

CONCLUSIONES

Las obras se han ejecutado desde el acta de inicio y se han desarrollado de la mejor forma a pesar de las condiciones climáticas adversas de lluvias de los últimos días. La obra se encuentra en un avance del 43.30%, lo que indica que el proyecto se esté materializando dentro de la programación prevista.

Las actividades que se han ejecutado durante este periodo comprenden actividades de limpieza, rocería, demolición, retiro de material sobrante, instalaciones eléctricas, limpieza de adoquín y baldosas, instalación de adoquín, entre otras definidas con más claridad en la parte de gestión técnica del presente informe comprendido en el periodo anteriormente mencionado

Finalmente, en el proyecto se está llevando a cabo un balance de obras que aún no se ha terminado para definir las mayores y menores cantidades.

ANEXOS

La bitácora de obra, seguridad social y copia de pólizas.

Se radica el presente informe a los diecisiete (17) días del mes de Julio de 2024

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
C.C. 1.103.100.955 de Corozal
INTERVENTORIA DE OBRA

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
RIONEGRO, 11 DE JULIO DE 2024	0960219-4	01314011100

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	201194	2655	11011100

TOMADOR	NIT
ARCA MEGAPROYECTOS SAS	9014740951

ASEGURADO	NIT
ARCA MEGAPROYECTOS SAS	9014740951

BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 38 # 22 - 03 BRR FLORENCIA	SINCELEJO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 38 # 22 3	SINCELEJO	SUCRE	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	260.000.000,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NUMERO DIAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
18-JUN-2024	17-SEP-2024	91	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
18-JUN-2024	17-SEP-2024	1	$260.000.000,00	$0,00	$260.000.000,00

DOCUMENTO DE:
DESCUENTO COMERCIAL TARIFA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACION	MONEDA
013	AGS	2655	1001009	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE LA PRIMA SOLO SERA ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
201194	DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	0

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 43 #54 139 L212 CC SAN NICO
RIONEGRO

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
RIONEGRO, 11 DE JULIO DE 2024	0960219-4	01314011100

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	201194	2655	14011100

TOMADOR	NIT
ARCA MEGAPROYECTOS SAS	9014740951

ASEGURADO	NIT
ARCA MEGAPROYECTOS SAS	9014740951

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 38 # 22 - 03 BRR FLORENCIA	SINCELEJO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003907877. NO. DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA N? LP-002-2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 260,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA N° LP-002-2023.
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
RIONEGRO, 11 DE JULIO DE 2024	3907877-7	15820864

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	201194	2655	01215820864

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
9014740951	ARCA MEGAPROYECTOS SAS

Dirección	Ciudad	Teléfono
CR 38 # 22 - 03 BRR FLORENCIA	SINCELEJO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014740951	ARCA MEGAPROYECTOS SAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8230024119	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE INDERSUCRE

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-JUN-2024	17-SEP-2024	115.491.811,00	0,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17-SEP-2024	17-SEP-2029	115.491.811,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-JUN-2024	18-JUN-2027	115.491.811,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-JUN-2024	17-SEP-2029	1917	18-JUN-2024	17-SEP-2029	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$773.795	$346.475.433,00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2655	1001009	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
201194	DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA N° LP-002-2023.
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 09:49:22 -05:00

Código de Seguridad: M/Wdt+DGzuGEBIMBE+rTFg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 7, 11 Y 12 BOGOTA
TELEFONO (601) 3387000 FAX 2851420 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA CRC-100018621 **No. ANEXO** 2 **No. CERTIFICADO** 350040375 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 08/07/2024 **SUC. EXPEDIDORA** CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 19/09/2024	24:00 Horas Del 15/09/2029	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE	**No. DOC. IDENTIDAD**	1.103.100.955
DIRECCIÓN	SINCELEJO	**TELÉFONO**	3127565465
ASEGURADO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN	**No. DOC. IDENTIDAD**	823.002.411-9
DIRECCIÓN	CALLE 14 N. 17A-202, LA FORD SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO**	2805700
BENEFICIARIO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN	**No. DOC. IDENTIDAD**	823.002.411-9
DIRECCIÓN	CALLE 14 N. 17A-202, LA FORD SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO**	2805700

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LA VIGENCIAS DE INICIO DE LA POLIZA ARRIBA EN MENCION DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO.
SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE INICIO DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDDRS-CMA-001-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERAPARA EL PROYECTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/06/2024	24:00 Horas Del 20/03/2025	8.527.861,50	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/06/2024	24:00 Horas Del 20/09/2027	4.263.930,75	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/08/2024	24:00 Horas Del 15/09/2029	8.527.861,50	6.666,67

TOTAL ASEGURADO $ 21.319.653,75

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2029

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - **VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO**
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. POLIZA	CRC-100018621	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350040375	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/05/2024	24:00 Horas Del	15/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARAN CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
GRAN CONTRIBUYENTE
IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASARELAPSE

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100018621** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN / INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN** , expedida por la Compañia en **08/07/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **08** días del mes **JULIO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 350040375

Fecha de Facturación	08/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CRC-100018621
Periodo Facturado	19/05/2024 — 15/09/2029

Fecha Limite de Pago	07/08/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	20.000,01
IVA	3.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	23.800,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE
SINCELEJO	1103100955
Intermediario	JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente

1. [illegible] UNICAMENTE [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] 07/08/2024
4. [illegible] PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS

www.segurosmundial.com.co

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 350040375

Fecha de Facturación	08/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CRC-100018621
Periodo Facturado	19/05/2024 — 15/09/2029

Fecha Limite de Pago	07/08/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	20.000,01
IVA	3.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	23.800,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE
SINCELEJO	1103100955
Intermediario	JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)000003500403 75(3900)000000023800(96)20240807

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229903500403 75(3900)000000023800(96)20240807

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago disponibles:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · eveq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO

Tu compañía siempre

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103130966
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 19 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PARQUE PELIKU
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7934979545	TIPO DE PLANILLA:				E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO		2024
DIAS DE MORA:		24					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/05	NUMERO AUTORIZACIÓN				620012911

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 0	$ 280.000	$ 5.100	$ 285.100
230301	230301-PORVENIR	2	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 520.000	$ 9.400	$ 529.400
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 14.500**	**$ 814.500**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS012	EPS012-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 78.000	$ 1.500	$ 0	$ 79.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 122.000	$ 2.200	$ 0	$ 124.200
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 3.700**	**$ 0**	**$ 203.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 348.100	$ 348.100	$ 6.300	$ 0	$ 354.400
SUBTOTALES:									**$ 348.100**	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 354.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	3	$ 200.000	$ 3.600	$ 203.600
SUBTOTALES:			**$ 200.000**	**$ 3.600**	**$ 203.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	NOVEDADES: AUTORIZA TRIBUTARIA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1103130966	PEREZ ROJA ESTEFAN	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			02																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 110.031.096	$ 121.800	30	$ 1.750.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 92534908	MONTERROSA OTERO MARCELA PATRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			02																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 110.031.096	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 92538650	CARRILLO QUEVEDO ALVARO RAFAEL	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			02																230301-PORVENIR	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS012-SALUD TOTAL	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.950.000	$ 110.031.096	$ 135.800	30	$ 1.950.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.576.200

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103100955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 10 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PARQUE PELINKU
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7934979545**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		24			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		820012911

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 285.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 529.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 814.500**
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 124.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 79.500
		SUBTOTAL:	3	**$ 203.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
892200015	CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	3	$ 203.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 203.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
		NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 354.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 354.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.548.100**
VALOR MORA:	**$ 28.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.576.200**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22 APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78753823	TOTAL A PAGAR	
					$1.342.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	15.600	0		0		0	0	0	0	15.600	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.200	0		0		0	0	0	0	57.200	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	12.200	0		0		0	0	0	0	12.200	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	332.800	0	0	0	0	0	0		332.800	5
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	152.600	0	0	0	0	0	0		152.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	301.900				301.900	0	0	301.900			3.019	301.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fiar Sucre	892200015-5	173.400	0	0	173.400	10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22 APTO 301	2762763	yelissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU / PELINKU	SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78753823	$1.342.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	173.400	173.400
Pensión	3	693.400	693.400
Riesgos Laborales	1	301.900	301.900
CCF	1	173.400	173.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.342.100	1.342.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INDER SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2023 | CONTRATISTA: ARCA MEGA PROYECTOS SAS | FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2024

ACTA PARCIAL 01

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE

VALOR CONTRATO: $ 1.154.918.106,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES CANT	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL	MODIFICACIONES "+/-"	MODIFICACIONES CANT	MODIFICACIONES VALOR	ACTA 01 OBRAS EJECUTADAS CANT	ACTA 01 OBRAS EJECUTADAS VR. UNITARIO	ACTA 01 OBRAS EJECUTADAS VR. TOTAL	EJECUCIÓN TOTAL CANT	EJECUCIÓN TOTAL VR. PARCIAL	EJECUCIÓN TOTAL %
1	**PRELIMINARES**													
1,1	Limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetral.	M2	520,00	$ 16.236,00	$ 8.442.720,00				510,00	$ 16.236,00	$ 8.280.360,00			98%
1,2	Desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente.	ML	520,00	$ 9.557,00	$ 4.969.640,00				510,00	$ 9.557,00	$ 4.874.070,00			98%
1,3	Demolición de plantilla existente	M2	51,00	$ 21.498,00	$ 1.096.398,00				48,00	$ 21.498,00	$ 1.031.904,00			94%
1,4	Roceria del área externa de cuerpos de agua	M2	1.800,00	$ 10.555,00	$ 18.999.000,00				1.710,00	$ 10.555,00	$ 18.049.050,00			95%
1,5	Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua	M2	1.670,00	$ 10.555,00	$ 17.626.850,00				1600,00	$ 10.555,00	$ 16.888.000,00			96%
1,6	Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza	M3	175,00	$ 39.799,00	$ 6.964.825,00				148,75	$ 39.799,00	$ 5.920.101,00			85%
	SUBTOTAL				$ 58.099.433,00						$ 55.043.488,00			95%
2,00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS.**													
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOMETIDA, ALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EN BAJA TENSIÓN													
2,1	Suministro e instalación de Acometida principal desde punto de conexión bujes de baja transformador existente hasta Gab. Ppal en 2xNo.2/0F+1xNo.2/0N+1xNo.4T Aluminio S8000	ML	25,0	$ 92.656,00	$ 2.316.400,00				0,0	$ 92.656,00	$ -			
2,02	Suministro e instalación de Bajante acometida en tuberia imc 2", incluye capacete y cinta de acero inoxidable	UN	1,0	$ 1.132.685,00	$ 1.132.685,00				0,0	$ 1.132.685,00	$ -			
2,03	Suministro e instalación de Canalización subterránea acometida en tuberia PVC 2"	ML	25,0	$ 46.447,00	$ 1.161.175,00				23,00	$ 46.447,00	$ 1.068.281,00			92%
2,04	Construcción de caja de Registro de inspección 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	UN	2,0	$ 1.079.943,00	$ 2.159.886,00				2,0	$ 1.079.943,00	$ 2.159.886,00			100%
2,05	Construcción de caja de Registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	UN	2,0	$ 854.557,00	$ 1.709.114,00				2,0	$ 854.557,00	$ 1.709.114,00			100%
2,06	Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,8 m con marco y borde tapa metálicos	UN	47,0	$ 633.142,00	$ 29.757.674,00				35,00	$ 633.142,00	$ 22.159.970,00			74%
2,07	Suministro e instalación de Gabinete Principal GAB PPAL tipo exterior con breakers industriales para alimentadores y control de iluminación acorde a diagrama unifilar, incluye DPS	UN	1,0	$ 20.250.207,00	$ 20.250.207,00				0	$ 20.250.207,00	$ -			
2,08	Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD1	ML	45,0	$ 31.645,00	$ 1.424.025,00				43,00	$ 31.645,00	$ 1.360.735,00			96%
2,09	Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	ML	124,0	$ 31.645,00	$ 3.923.980,00				110,00	$ 31.645,00	$ 3.480.950,00			89%
2,10	Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea ramales de iluminación	ML	662,0	$ 31.645,00	$ 20.948.990,00				615,00	$ 31.645,00	$ 19.461.675,00			93%
2,11	suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000	ML	45,0	$ 50.651,00	$ 2.279.295,00				0	$ 50.651,00	$ -			
2,12	suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000	ML	124,0	$ 50.651,00	$ 6.280.724,00				0	$ 50.651,00	$ -			
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CIRCUITOS RAMALES INTERNOS)													
2,13	suministro e instalación de ramales de iluminación desde Tablero de iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000. Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación	ML	662,0	$ 40.441,00	$ 26.771.942,00				615,0	$ 40.441,00	$ 24.871.215,00			93%
2,14	Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto	UN	49,00	$ 2.627.794,00	$ 128.761.906,00				35,00	$ 2.627.794,00	$ 91.972.790,00			71%
2,15	Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto	UN	4,00	$ 4.751.532,00	$ 19.006.128,00				2,00	$ 4.751.532,00	$ 9.503.064,00			50%
2,16	Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	UN	49,00	$ 433.177,00	$ 21.225.673,00				38,00	$ 433.177,00	$ 16.460.726,00			78%

2.17	Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores	UN	4,00	$ 502.196,00	$ 2.008.784,00				3,00	$ 502.196,00	$ 1.506.588,00			75%
2.18	Suministro e instalación de proyector led 200w, color o luz blanca	UN	4,00	$ 597.678,00	$ 2.390.712,00				3,00	$ 597.678,00	$ 1.793.034,00			75%
2.19	Suministro e instalación de luminaria led soporte vertical de 40w acorde a diseño luminico	UN	49,00	$ 1.846.819,00	$ 90.494.131,00				25,00	$ 1.846.819,00	$ 46.170.475,00			51%
	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS (ILUMINACION, TOMAS Y ESPECIALES)													
2.20	Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elemeotos de fijación	UN	22,00	$ 187.504,00	$ 4.125.088,00				0	$ 187.504,00	$ -			
2.21	Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	UN	4,00	$ 266.175,00	$ 1.064.700,00				0	$ 266.175,00	$ -			
2.22	Suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	UN	77,00	$ 171.019,00	$ 13.168.463,00				0	$ 171.019,00	$ -			
2.23	Suministro e instalación switch o interruptor manual sencillo de encendido iluminación en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	UN	6,00	$ 133.316,00	$ 799.896,00				0	$ 133.316,00	$ -			
2.24	Suministro e instalación switch o interruptor manual doble de encendido iluminación en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	UN	7,00	$ 153.611,00	$ 1.075.277,00				0	$ 153.611,00	$ -			
2.25	Suministro e instalación de Tablero bifásico 12 circuitos, incluye sus protecciones	UN	2,00	$ 813.927,00	$ 1.627.854,00				0	$ 813.927,00	$ -			
2.26	Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar	UN	18,00	$ 68.844,00	$ 1.239.192,00				0	$ 68.844,00	$ -			
2.27	Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar	UN	13,00	$ 73.101,00	$ 950.313,00				0	$ 73.101,00	$ -			
2.28	Suministro e instalación de ventiladores de techo	UN	11,00	$ 509.286,00	$ 5.602.146,00				0	$ 509.286,00	$ -			
2.29	Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w	UN	12,00	$ 262.318,00	$ 3.147.816,00				0	$ 262.318,00	$ -			
2.30	Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse	UN	15,00	$ 209.849,00	$ 3.147.735,00				0	$ 209.849,00	$ -			
2.31	Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	UN	7,00	$ 228.040,00	$ 1.596.280,00				5,00	$ 228.040,00	$ 1.140.200,00			71%
2.32	Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	UN	12,00	$ 383.541,00	$ 4.602.492,00				10,00	$ 383.541,00	$ 3.835.410,00			83%
2.33	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado, incluye suministro aire 18000 btu	UN	1,00	$ 3.718.772,00	$ 3.718.772,00				0	$ 3.718.772,00	$ -			
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
2.34	Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo # 1/0 a 0.5 mts de profundidad. conductor de malla a tierra	ML	25,00	$ 72.937,00	$ 1.823.425,00				0	$ 72.937,00	$ -			
2.35	Construcción Registro de inspección de 0.4x0.4x0.6 m con marco y borde tapa metálicos	UN	1,0	$ 633.142,00	$ 633.142,00				0	$ 633.142,00	$ -			
2.36	Suministro e instalación de varila coopperweld 5/8"x2.4 mts	UN	4,00	$ 350.053,00	$ 1.400.212,00				0	$ 350.053,00	$ -			
2.37	Suministro e instalación de soldadura exotérmica 115 g para SPT	UN	5,00	$ 83.689,00	$ 418.445,00				0	$ 83.689,00	$ -			
	SUBTOTAL				**$ 434.142.859,00**					**$ -**	**$ 248.884.913,09**			**57%**
3	**ACABADOS**													
3,1	Pintura vinilo muros (3 manos)	M2	1.420,00	$ 21.464,00	$ 30.478.880,00				0	$ 21.464,00	$ -			
3,2	Mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura aticorrosiva	UNO	8,00	$ 242.732,00	$ 1.941.856,00				0	$ 242.732,00	$ -			
3,3	Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas metalicas. incluye desmonte y reinstalación	M2	339,21	$ 60.859,00	$ 20.643.877,00				222,85	$ 60.859,00	$ 13.562.426,00			66%
3,4	Suministro e intalacion de cielo raso en Drywall	M2	101,91	$ 91.598,00	$ 9.334.294,00				0	$ 91.598,00	$ -			
3,5	Mantenimiento de fachada existente en SUPERBOARD	ML	18,00	$ 170.635,00	$ 3.071.430,00				0	$ 170.635,00	$ -			
3,6	Pintura acrilica de marcacion continua para bordillo (linea perimetral ancho 15 cm, altura 15 cm)	ML	1.264,00	$ 14.688,00	$ 18.565.632,00				0	$ 14.688,00	$ -			
3,7	Pintura acrilica de demarcación	M2	117,30	$ 26.255,00	$ 3.079.712,00				0	$ 26.255,00	$ -			
3,8	Suministro e instalación de ventanas en aluminio	M2	12,60	$ 638.537,00	$ 8.045.566,00				0	$ 638.537,00	$ -			
3,9	Suministro e instalación de baranda en tubería galvanizada de 2" incluye pintura	ML	16,00	$ 271.249,00	$ 4.339.984,00				0	$ 271.249,00	$ -			

3,10	Mantenimiento de baranda existente de 2"	ML	16,60	$ 99.912,00	$ 1.658.539,00				0	$ 99.912,00	$ -					
	SUBTOTAL				**$ 101.158.570,00**					**$ -**	**$ 13.883.428,00**					**13%**
4	**ELEMENTOS URBANOS PREFABRICADOS**									$ -						
4,1	Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base	M2	206,00	$ 183.472,00	$ 37.795.232,00				202,00	$ 183.472,00	$ 37.061.344,00					98%
	SUBTOTAL				**$ 37.795.232,00**					**$ -**	**$ 37.061.344,00**					**98%**
5	**MOBILIARIO URBANO**									$ -						
5,1	Caneca de basura en acero inoxidable. Color: Satinado. Incluye instalación 75 Lts	UND	6,00	$ 1.725.579,00	$ 10.353.474,00				0	$ 1.725.579,00	$ -					
5,2	Suministro e instalación de banca en concreto tipo MD30	UND	3,00	$ 2.518.753,00	$ 7.556.259,00				0	$ 2.518.753,00	$ -					
5,3	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - cintura surf 003-PB	UND	1,00	$ 4.549.279,00	$ 4.549.279,00				0	$ 4.549.279,00	$ -					
5,4	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Esqui de Fondo 002-PB	UND	1,00	$ 4.795.660,00	$ 4.795.660,00				0	$ 4.795.660,00	$ -					
5,5	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Pony 001-PB	UND	1,00	$ 4.377.530,00	$ 4.377.530,00				0	$ 4.377.530,00	$ -					
5,6	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - caminador aereo 005-PB	UND	1,00	$ 4.880.675,00	$ 4.880.675,00				0	$ 4.880.675,00	$ -					
5,7	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - bicicleta 012-PB	UND	1,00	$ 5.717.511,00	$ 5.717.511,00				0	$ 5.717.511,00	$ -					
5,8	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - volante 013 PB	UND	1,00	$ 4.524.790,00	$ 4.524.790,00				0	$ 4.524.790,00	$ -					
5,9	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Elliptica 004-PB	UND	1,00	$ 4.672.050,00	$ 4.672.050,00				0	$ 4.672.050,00	$ -					
5,10	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB	UND	1,00	$ 4.739.530,00	$ 4.739.530,00				0	$ 4.739.530,00	$ -					
5,11	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Fondos 010-PB	UND	1,00	$ 3.873.297,00	$ 3.873.297,00				0	$ 3.873.297,00	$ -					
5,12	Suministro e instalación de parque infantil	UND	1,00	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00				0	$ 28.500.000,00	$ -					
	SUBTOTAL				**$ 88.540.055,00**					**$ -**	**$ -**					**0%**
6	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**									$ -						
6,1	Alambre de púa para cerramiento 8 hileras	ML	228,71	$ 63.106,00	$ 14.432.973,00				225,71	$ 63.106,00	$ 14.243.655,00					99%
6,2	Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación	M2	351,29	$ 165.473,00	$ 58.128.679,00				345,29	$ 165.473,00	$ 57.135.841,00					98%
6,3	Arbustos (limoncillo) para cerca viva	UND	1.170,96	$ 14.966,00	$ 17.524.587,00				624,80	$ 14.966,00	$ 9.350.757,00					53%
	SUBTOTAL				**$ 90.086.239,00**					**$ -**	**$ 80.730.253,00**					**90%**
7	**FITOTECTURA PARQUE PELINKU**									$ -						
7,1	Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp)	M2	186,00	$ 15.442,00	$ 2.872.212,00				0	$ 15.442,00	$ -					
7,2	Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores	UND	120,00	$ 27.615,00	$ 3.313.800,00				0	$ 27.615,00	$ -					
7,3	Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajistico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación	UND	25,00	$ 184.856,00	$ 4.621.400,00				0	$ 184.856,00	$ -					
7,4	Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp.	M3	58,78	$ 87.415,00	$ 5.137.904,00				0	$ 87.415,00	$ -					
	SUBTOTAL				**$ 16.945.316,00**					**$ -**	**$ -**					**0%**
8	**PISOS**									$ -						
8,1	Limpieza de sendero peatonal en adoquin	M2	486,00	$ 12.719,00	$ 6.181.434,00				480,00	$ 12.719,00	$ 6.105.120,00					99%
8,2	Limpieza y mantenimiento de baldosa existente	M2	295,49	$ 14.636,00	$ 4.324.718,00				289,49	$ 14.636,00	$ 4.236.902,00					98%
8,3	Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado	M3	39,46	$ 98.636,00	$ 3.892.177,00				33,46	$ 98.636,00	$ 3.300.361,00					85%
8,4	Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	M2	117,30	$ 166.577,00	$ 19.539.482,00				51,00	$ 166.577,00	$ 8.495.427,00					43%
8,5	Concreto para viga cimiento anden de 0,20 x 0,20m de 3000 psi incluye refuerzo 60000 psi (4 var 1/2" y aros de 3/8" cada 20cm)	ML	28,00	$ 139.216,00	$ 3.898.048,00				0	$ 139.216,00	$ -					
8,6	Suministro e instalación de estructura metalica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tuberia de soporte con pilotes, correas en tuberia cuadrada 2x1 galvanizada y pintura	M2	42,00	$ 711.419,00	$ 29.879.598,00				0,00	$ 711.419,00	$ -					
8,7	Suministro e instalación de estructura metalica para puente en perfil en C 160x60 encajonado galvanizado calibre 16" Incluye pintura	M2	65,00	$ 754.180,00	$ 49.021.700,00				44,00	$ 754.180,00	$ 33.183.920,00					68%
8,8	Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota	M2	107,00	$ 720.911,00	$ 77.137.477,00				0	$ 720.911,00	$ -					

8,9	Suministro e instalacion de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota	ML	87,00	$ 604.356,00	$ 52.578.972,00				0	$ 604.356,00	$ -			
	SUBTOTAL				$ 248.483.606,00					$ -	$ 58.321.730,00			23%
9	ADECUACION SALON MULTIPLE									$ -				
9,1	Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	M2	59,52	$ 99.836,00	$ 5.942.239,00				35,52	$ 99.836,00	$ 3.546.175,00			60%
9,2	Pañete allanado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores	M2	150,04	$ 36.117,00	$ 5.418.995,00				0,00	$ 36.117,00	$ -			
9,3	Enluco para muros interiores y exteriores del aula	M2	150,04	$ 25.324,00	$ 3.799.613,00				0	$ 25.324,00	$ -			
9,4	Pintura vinilo muros (3 manos)	M2	379,04	$ 21.464,00	$ 8.135.715,00				0	$ 21.464,00	$ -			
9,5	Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall	M2	191,53	$ 91.596,00	$ 17.543.765,00				0	$ 91.596,00	$ -			
9,6	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio	M2	21,96	$ 675.661,00	$ 14.837.518,00				0	$ 675.661,00	$ -			
9,7	Suministro e instalacion de puerta de acceso en aluminio, incluye marco	M2	4,16	$ 615.824,00	$ 2.562.244,00				0	$ 615.924,00	$ -			
	SUBTOTAL				$ 58.240.087,00						$ 3.546.175,00			4%
	COSTO DIRECTO				$ 1.130.462.197,00						$ 493.918.525,00			
	PGIO			1,50%	$ 13.756.909,00						$ 6.189.199,45			
	CERTIFICACION RETIE				$ 4.500.000,00									
	CERTIFICACION RETILAP				$ 6.200.000,00									
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 1.154.918.106,00						$ 500.108.727,00			43,30%
	VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 1 SON; QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICIETE PESOS MCTE										$ 500.108.727,00			

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron en el Municipio de Galeras. Sucre a los 17 dias del mes de Julio del año 2024

YUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ
ARCA MEGA PROYECTOS SAS
CONTRATISTA

JOSE CASTRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

ALEX GIL COVILLA
ING. SUPERVISOR - INDER SUCRE

Reviso: Jorge M. Diaz	Cargo: Arq. Deportes/Infraestructura deportiva	Firma:
Reviso: Samuel Álvarez León	Cargo: Director INDER-SUCRE	Firma:

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS		CALLE 21 N 13BIS-22 APTO 301	2782763	yelssbarreto24@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78753823	$1.342.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suspensión	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005418712	BEJARANO SIERRA ANGIE MILETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.800	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1005424804	GALE JIMÉNEZ KEVIN ANDRÉS	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS048	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
3	CC	1130550820	MARTINEZ NAVARRO JOSE DAVID	1	0			S	X	X															230301	390.000	62.400	0	0	0	0	CCFC33	390.000	15.600	14-23	390.000	5	27.200	CCF41	390.000	15.600	0	0	0	0	0
4	CC	92097262	HERNANDEZ HERAZO JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.800	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	18858099	ARRIETA POLANCO YONIS ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
6	CC	92097880	SEVERICHE LARA DAVID ANTONIO	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
7	CC	92099037	MEJIA LOPEZ JAIME ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
8	CC	92099291	MARTINEZ BARRAGAN DANIEL MESAD	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
9	CC	92099665	MARTINEZ SEVERICHE SALVADOR ELIAS	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
10	CC	1005425906	DIAZ ANAYA DANIEL ALBERTO	1	0			S	X	X															25-14	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS048	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF41	173.334	7.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-1:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	424	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	230.983.621,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	230.983.621,00	**Saldo x Ordenar:**	230.983.621,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	16.168.853,00	**Valor Neto:**	214.814.768,00	**Nro. Compromiso:**	324	**Nro. Cdp:**	723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	11		

TERCERO

Identificacion:	901474095	**Razon Social:**	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	3412393661	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	624	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-08-12				
					Total:	230.983.621,00	0,00	230.983.621,00	230.983.621,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-08-14	Generada	230.983.621,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-1:53 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	230.983.621,00	2,000 %	4.619.672,00	4.619.672,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 899999090	MINISTERIO DE HACIENDA	230.983.621,00	5,000 %	11.549.181,00	11.549.181,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-1:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	524	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	269.125.106,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	269.125.106,00	**Saldo x Ordenar:**	269.125.106,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	18.838.757,00	**Valor Neto:**	250.286.349,00	**Nro. Compromiso:**	324	**Nro. Cdp:**	723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12		

TERCERO

Identificacion:	901474095	**Razon Social:**	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	3412393661	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	724	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-08-12				
					Total:	269.125.106,00	0,00	269.125.106,00	269.125.106,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-08-14	Generada	269.125.106,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-1:53 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.125.106,00	2,000 %	5.382.502,00	5.382.502,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 899999090	MINISTERIO DE HACIENDA	269.125.106,00	5,000 %	13.456.255,00	13.456.255,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-1:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	524	**Fecha Registro:**	2024-08-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	269.125.106,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	269.125.106,00	**Saldo x Ordenar:**	269.125.106,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	18.838.757,00	**Valor Neto:**	250.286.349,00	**Nro. Compromiso:**	324	**Nro. Cdp:**	723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12		

TERCERO

Identificacion:	901474095	**Razon Social:**	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	3412393661	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	724	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-08-12				
					Total:	269.125.106,00	0,00	269.125.106,00	269.125.106,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-08-14	Generada	269.125.106,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-12-1:44 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.125.106,00	2,000 %	5.382.502,00	5.382.502,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 899999090	MINISTERIO DE HACIENDA	269.125.106,00	5,000 %	13.456.255,00	13.456.255,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENERIOS DEPORTIVOS

CERTIFICA

Que, el contrato de obra con la siguiente ficha técnica se encuentra en ejecución.

CONTRATO N°.	LP-002-2023
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE EDEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
CONTRATISTA:	ARCA MEGAPROYECTOS SAS
NIT: **REPRESENTANTE LEGAL**	9014740951 YUSNEIDI MARIA OROZCO MARQUEZ
C.C.	1.045.306.356
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	25/04/2024
FECHA DE FIRMA ACTA DE INICIO	18/06/2024
FECHA FINALLIZACIÓN:	17/09/2024
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES
N° DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL (SURAMERICANA)	3907877-7
N° DE POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SURAMERICANA)	0960219-4
N° DE CDP	723 – Fecha 10/10/2023
N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL	324 – Fecha 29/04/2024
VALOR TOTAL INICIAL	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE. ($1.154.916.107)
SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA

CARGO:	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS
FECHA DE ASIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	14/06/2024
PORCENTAJE DE AVANCE:	43.3 %
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCIÓN

Que, como contratista **ARCA MEGA PROYECTOS SAS**, con NIT No 9014740951, representada legalmente por la señora **YUSNEIDI MARIA OROZCO MARQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.045.306.356, una vez verificadas y certificadas las condiciones contractuales y/u obligaciones técnicas, administrativas, financieras, juridicas y ambientales, por parte de la supervisión, se evidencia que el contratista de obra está cumpliendo a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato de obra pública **No. LP-002-2023**, cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE**.; según las condiciones señaladas en el **ACTA PARCIAL No. 1**, bajo las siguientes condiciones contractuales:

1. CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

2. DATOS ACTA PARCIAL No. 1-

VALOR INICIAL CONTRATO INCLUYE AIU	**100%**	**$1.154.916.107**
VALOR ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN	**0%**	**0**
VALOR FACTURA		**$ 500.108.727,00**
VALOR NETO A PAGAR	**43.3%**	**$ 500.108.727,00**
SALDO POR FACTURAR		**$654.807.380,00**

Nota 2: Se aclara que el porcentaje cobrado en el acta final se calculó bajo las condiciones iniciales del proyecto.

3. DATOS DE FACTURACIÓN

N°	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR
1	FEV 37	ACTA PARCIAL No.1- DEL CONTRATO No. LP-002-2023, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.	**$ 500.108.727,00**

La presente certificación se firma en Sincelejo a los siete 24 días del mes de julio de 2024.

ALEX GIL COVILLA
P.U. Área De Fomento y Desarrollo Deportivo
/Infraestructura y Escenarios Deportivos
Supervisor

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	KATHERIN CHAMORRO	Ing. Deportes/Infraestructura Deportiva	
Revisó	JORGE M. DIAZ	Arq. Deportes/Infraestructura Deportiva	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes			

INFORME DEL SUPERVISOR

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SU ERVISION	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIA . N°. 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEX DEL COVILLA	U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACION	24/07/2024

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	LP-002-2023.
Objeto:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PEUNKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE
Contratista:	ARCA MEGAPROYECTOS SAS
C.C. / NIT:	9014748951
Valor nicial:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE
Valor Inicial:	$1.154.916.107,00
Valor Adicional:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Anticipo (le):	N/A
Plazo nicial:	TRES (3) MESES
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial):	723 FECHA: 10/10/2023
N° De Registro Presupuestal - RP (Inicial):	824 FECHA: 29/04/2024
Fecha acta de Inicio:	18/6/2024
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024
Fecha de Terminación Actualizada:	17/9/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato:	IDDRS CMA-001-2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PEUNKU, MUNICIPIO DE GALERA"
Interventor:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
C.C. / NIT:	1.103.100.955
Valor Inicial:	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS
Valor Inicial:	$85.276.615,00
Valor Adicional:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Anticipo (30%):	N/A
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial):	623 FECHA: 30/10/2023
N° De Registro Presupuestal (Inicial):	824 FECHA: 29/04/2024
Fecha acta de Inicio:	18/6/2024
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024
Fecha de Terminación Actualizada:	17/9/2024

POLIZAS

CONTRATO DE OBRA

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$ 115.491.811,00	10/4/2024	10/7/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y la idad de Obra	$ 115.491.811,00	10/4/2024	10/7/2029
		Prestaciones sociales	$ 115.491.811,00	10/4/2024	10/7/2027

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$ 115.491.811,00	14/6/2024	17/9/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y la idad de Obra	$ 115.491.811,00	17/9/2024	17/9/2029
		Prestaciones sociales	$ 115.491.811,00	14/6/2024	13/6/2027

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

				desde	hasta
SURAMERICANA	3960219-4	Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000,00	14/6/2024	17/9/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS MUNDIAL		Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
		Calidad Del Servicio	N/A	N/A	N/A

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS MUNDIAL	100018821	Cumplimiento	$ 8.527.861,50	18/6/2024	20/3/2025
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	$ 4.263.930,75	18/7/2024	20/9/2024
		Calidad Del Servicio	$ 8.527.861,50	15/8/2024	15/9/2025

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA , DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	28/06/2024	HASTA	1/07/2024	SUPERVISOR	ALEXIS GIL COVILLA	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

AVANCE DE LA OBRA

CONTRATO DE OBRA

OBRA PROGRAMADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	32.78%	0.00%
Valor de la Obra programada	$378.362.195	$0

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Ejecutada (%)	43.30%	43.30%
Valor de la Obra ejecutada	$500.108.728	$500.108.728

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBRA PROGRAMADA


	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	33.00%	0.00%
Valor de la Obra Ejecutada	$28.14 .943	$0

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	43.30%	43.30%
Valor de la Obra Ejecutada	$36.925.640	$36.925.640


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	32.78%	0.00%	43.30%
Durante el periodo	32.78%	43.30%	
Acumulado actual	0.00%	43.30%	





GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%REPROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	32.78%	0.00%	43.08%
Durante el periodo	33.00%	43.30%	
Acumulado actual	0.22%	43.30%	



ACTIVIDADES REALIZADAS

	CONTRATO DE OBRA	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
1	PRELIMINARES			
1.1	Limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetral.	 Se observa la ejecución de la actividad de limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetra	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las Se realiza actividad de limpieza manual	



Se identifica por la Interventoria la localización del parque Pelinkú y las áreas a intervenir

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA_ DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°: 1	ACTA PARCIA_ N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEXIS OLIVELLA	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

1.2	Desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente.	  Se observa la ejecución de la actividad de desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Desmonte de alambre de pua en mal estado en cerramiento existente.	
1.3	Demolición de plantilla existente	  Se observa la ejecución de la actividad de Demolición de plantilla existente	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Ejecucion de la actividad Demolición de plantilla existente	
1.4	Roceria del área externa de cuerpos de agua	  Se observa la ejecución de la actividad de Roceria del área externa de cuerpos de agua	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Roceria del área externa de cuerpos de agua	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIA . N° 1	PERIODO DE	18/04/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEX GALCOVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024



1.5	Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua	  Se observa la ejecución de la actividad de Limpieza de maleza del área interria de cuerpos de agua	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua	
1.6	Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza	 Se observa la ejecución de la actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza	
	INSTALAC ONES ELÉCTRICAS (CIRCUITOS RAMALES INTERNOS)			
2.03	Suministro e instalación de Canalización subterránea acometida en tubería PVC 2"	 Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de Canalización subterránea acometida en tubería PVC 2"	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de impieza manual de maleza y desmonte de material orgánico zona perimetra	

Gobernación de Sucre | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIA . N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	12/07/2024	SUPERVISOR	ALEXIS GALVILLO	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACION	24/07/2024


2.04	Construcción de caja de Registro de inspección 0,8x0,3x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	  Se observa la ejecución de la actividad de 'Construcción de caja de Registro de inspección 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Construcción de caja de Registro de inspección	
2.05	Construcción de caja de Registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	  Se observa la ejecución de la actividad de 'Construcción de caja de Registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Construcción de caja de Registro de inspección	
2.06	Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0.6 m con marco y borde tapa metálicos	 Se observa la ejecución de la actividad de 'Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Construcción de caja de Registro de inspección	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA_ DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023											
INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/06/2024	HASTA	1/07/2024	SUPERVISOR	ALEJANDRO VILLA	FICHA FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

2.08	Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD1	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD1	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC	
2.09	Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	
2.10	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB	 Se observa la ejecución de la actividad uministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de uministro e instalacion de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB	


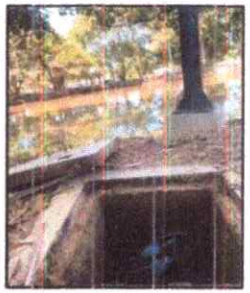

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEJANDRO COVILLA	TIPO A: FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELABORACIÓN	24/07/2024

2.13	Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000. Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de Iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000. Correspor de al cableado de cada circuito de iluminación	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de Iluminacion en GAB	
2.14	Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto	
2.15	Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023											
INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEJANDRO OVILLA	FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELABORACIÓN	24/7/2024



2.16	Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	
2.17	Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores	 Se observa la ejecución de la actividad de Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores	
2.18	Suministro e instalación de proyector led 200w, color o luz blanca	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023											
INFORME DE SUPERVISION	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIA . N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL TOVILLA	FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024


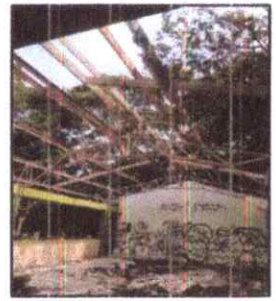
2.19	Suministro e instalación de luminaria led soporte vertical de 40w acorde a diseño lumínico	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecucion de las obras. Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	
2.31	Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	   Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	
2.32	Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	 Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023											
INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1:	PERÍODO DE:	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

3.3	Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas matalicas, incluye desmonte y reinstalación	  Se observa la ejecución de la actividad de Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas matalicas, incluye desmonte y reinstalación	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas matalicas, incluye desmonte y reinsta ación	
4	ELEMENTOS URBANOS PREFABRICADOS			
4.1	Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0.10 metros Color: Gris. Incluye material de base	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalacion de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL			
6.1	Alambre de púa para cerramiento 8 hileras.	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023											
INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	2/07/2024	SUPERVISOR	ALEXIS GALCOVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACION	24/07/2024
6.2	Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación	  Se observa la ejecución de la actividad de Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación					La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras Actividad de Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación				
6.3	Arbustos (limoncillo) para cerca viva.	  Se observa la ejecución de la actividad de Arbustos (limoncillo) para cerca viva					La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Arbustos (limoncillo) para cerca viva				
8	PISOS										
8.1	Limpieza de sendero peatonal en adoquin	  Se observa la ejecución de la actividad Limpieza de sendero peatonal en adoquin					La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Limpieza de sendero peatonal en adoquin				



Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/06/2024	HASTA	17/07/2024	SUPERVISOR	ALEXIS COVILLA	PLAN FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

8.2	Limpieza y mantenimiento de baldosa existente	   Se observa la ejecución de la actividad Limpieza y mantenimiento de baldosa existente	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Limpieza y mantenimiento de baldosa existente	
8.3	Relleno con material seleccionaco compactado a rana 95% proctor modificado	  Se observa la ejecución de la actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado	
8.4	Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	  Se observa la ejecución de la actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTA. DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°: 1	ACTA PARCIAL N°: 1	PERÍODO DE	18/06/2024	HASTA	12/07/2024	SUPERVISOR	ALEX DE COVILLA	SUB. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

8.6	Suministro e instalación de estructura metalica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tuberia de soporte con pilotes, correas en tuberia cuadrada 2x1 galvanizada y pintura	 Se observa la ejecución y terminación de la actividad de Suministro e instalación de estructura metalica para puente en perfil en C 160x60 encajonado galvanizado calibre 16" incluye pintura	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	
9	ADECUACION SALON MULTIPLE			
9.1	Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	 Se observa la ejecución de la actividad de Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	

ANOTACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA:
Se evidencia el cumplimiento de PGIO. Se cumple con la seguridad social del personal en obra. Se cumple con los registros fotograficos y videos. Se cumple con el seguimiento del cronograma de trabajo en obra. Se cumple con la bitácora diriamente. Se ejecutan lasdferentes actividades bajo el requerimiento técnico contructual

GESTIONES AMBIENTALES POR E. CONTRATISTA DE OBRA
En el periodo de este informe, las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades, por lo cual las lluviasno han causado mayor impacto en la ejecuciónde las actividades, sin embargo, por lo cue las tareas se han llevado a cabo segun lo programado y con contratiempos mínimos. Cube anotar que el contratista de obra tiene medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas si es del caso

GESTIONES TECNICAS POREL CONTRATISTA DE OBRA:
Las actividades desarrolladas han sido varias entre las cuales está la limpieza manuela de maleza y desmonte de material orgánico en zona perimetral, desmonte de alambre púa, demolición de plantilla existente, rocería y limpieza interna y externa de los cuerpos de agua, retiro de material sobrante. En la parte eléctrica, se avanzó en la canalización subterránea en tubería pvc de 2", además la construcción de cajas de registros, el suministro e instalación de tubería conduit de 1. ½", instalación de ramales de iluminación desde tablero, suministro e instalación de postes, instalación de salidas para luminarias, así como la instalación de proyector y luminarias.
Se avanzó en el mantenimiento de la cubierta, el suministro e instalación de adoquines, la instalación de alambre púa, cerramiento en malla eslabunada, instalación de limoncillos, limpieza de senderos y baldosas existentes, construcción de plantilla en concreto, avance en el suministro e instalación de estructura metálica para el muelle y el levante en bloque del muro del salón comunal.

ANOTACIONES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORIA:
1. Se evidencia el cumplimiento de Mantener al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores. 2. Se Cumple con la presentación de comités de interventoria y obra en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad. 3.Se evidencia el cumplimiento de Llevar un Registro fotografico y de video. 4. Se hace por parte de la interventoria la verificación de la situación actual antes del inicio de la obra. 5. Se evidencia en obra el cronograma de trabajo. 6. Se verifica por parte de la interventoria la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar para la ejecucion de las obras. 7. Se verifica el cumplimiento de la ejecución de controles tecnicos con el seguimiento acompañamiento y vigilancia en la obra.

GESTIONES AMBIENTALES POR LA INTERVENTORIA:
En el periodo en el cual se está presentando este informe, se puede resaltar que las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades dentro del proyecto, motivado al momento coyuntural que está viviendo el país en cuanto a la época de invierno, por lo cual las lluvias han sido moderadas en este periodo, sin embargo, todas las tareas planificadas se han llevado a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos relacionados con el clima. Lo anterior ha permitido que el proyecto avance sin inconvenientes, independientemente de las condiciones atmosféricas que han prevalecido en este periodo, el contratista de obra tiene unas medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas

GESTIONES TECNICAS POR LA INTERVENOTRIA
Las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto en el periodo mencionado se pueden resaltar que han sido varias entre las cuales está la limpieza manuela de maleza y desmonte de material orgánico en zona perimetral, desmonte de alambre púa, demolicion de plantilla existente, rocería y limpieza interna y externa de los cuerpos de agua, retiro de material sobrante.

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INST TUTO DE DEPARTAMENTA . DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

INFORME DE SUPERVISION	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIA N° 1	PERIODO DE	18/06/2024	HASTA	17/7/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	24/07/2024

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIEFO:
Se realiza, conjuntamente con la interventoria el anál sis semanal el avance financiero de las obras, a fin de prever, con anticipac ón evertuales necesidades de modificaciones del contrato.
GESTIÓN DE CARACTER JURIDICO:
N/A

Por otro lado, en cuanto a la parte eléctrica, se avanzó en la canalización subterránea en tube ía pvc de 2", además la construcción de cajas de registros, el suministro e instalación de tubería condu t de 1. ½", instalación de ramales de iluminación desde tablero, suministro e instalación de postes, instalación de salidas para luminarias, así como la instalación de proyector y luminarias.
Se avanzó en el mantenimiento de la cubierta, el suministro e instalación de adoquines, la instalación de alambre pua, cerramiento en malla eslabonada, insta ación de bimoncillos, limpieza de sende os y baldosas existentes, construcción de plantilla en concreto, avance en el suministro e instalación de estructura metálica para el muelle, y el levante en bloque del muro del salón comunal.
GESTION CONTABLE Y FINANCIERO:
Se realiza, por parte de la interventoria el anál sis semanal del avance financiero de las obras , a fin de prever, con anticipacion posibles necesidades de modificaciones del contrato.
GESTIÓN DE CARACTER JURIDICO:
NO se requiere solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumpli miento, otorgándole un plazo prudencial para e lo, siempre que resulte procedente.

EVENTUALIDADES PRESENTADAS

A pesar quese han presentado fuertes l uvias, al la presente fecha no se han generado atrasos en la construccion y ejecución de los trabajo.

OBSERVACIONES

Se adjunta informe mensual No.1, del con tratista de obra especificando las actividades ejecutadas y verificación mediante registros fotográficos, y acta numérica y literal de acta parcial No.1, correspondiente al pe ríodo del 18 de junio al 17 de julio de 2024.

Se adjunta informemensual No.1 del contratista de interventoria, el cual especifica el control y vigilancia sobre las actividades ejecutadas en el periodo del 18 de junio al 17 de ju lio de 2024

La supervisión ha realizado varias visitas al sitio de las obras, con el fin de verificar la ejecución de las actividades contractuales

FIRMAS

ALEX GIL COVILLA

P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Supervisor

	NOMBRE	CARGO	
Revisó:	Jorge W. Diaz Del Toro	Arq. Fiscal Asesor Infraestructura Deportiva	
	Katerin Charrasquiel	Arq. Supervisora Infraestructura deportiva	

Con esta firma los declarantes que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la ley y a los requerimientos técnicos vigentes y por lo tanto hacemos responsables ante la entidad para la firma de la supervisión de escenarios deportivos del INDER Sincelejo.

INGENIERO CIVIL

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA 1

PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA N° IDDRS-CMA-001-2024.

OBJETO CONSULTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

ENTIDAD CONTRATANTE: INDERSUCRE

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

AÑO 2024

Tabla de contenido

ASPECTOS GENERALES 3
INTRODUCCION 3
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL. 4
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 4
JUSTIFICACION 5
LOCALIZACION DEL PROYECTO 6
GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR LA INTERVENTORIA 7
ASPECTOS CONTRACTUALES 7
INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
INFORMACION DE POLIZAS DE CONTRATO INTERVENTORIA 7
INFORMACION CONTRATO DE OBRA 8
INFORMACION DE POLIZAS DE CONTRATO OBRA 8
GESTIONES AMBIENTALES POR LA INTERVENTORIA 9
CONDICIONES CLIMATICAS EN LA OBRA 9
GESTIONES TECNICAS POR LA INTERVENOTRIA 9
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA 9
SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 10
GESTIONES FINANCIERRAS POR LA INTERVENTORIA 12
SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 12
REGISTRO FOTOGRAFICO 14

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de la interventoría comprendida entre el 18 de junio y el 17 de julio de 2024, cumpliendo con las obligaciones contractuales de seguimiento del proyecto de obras:

Contrato: CONTRATO No LP-002-2023

Objeto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE."

Contratista: ARCA MEGAPROYECTOS SAS

Este proyecto se planteó para dar solución a la problemática existente por la dificultad que presentan los miembros de la comunidad del barrio Pelinku y la comunidad general municipio de Galeras para acceder a espacios recreativos adecuados para realizar la correcta práctica de actividades recreativas.

Inicialmente en el informe se describen las acciones desarrolladas por el Contratista de obra **ARCA MEGAPROYECTOS SA**, enmarcadas dentro del contrato N° –LP-002-2023, así como también aquellas realizadas por la Interventoría a cargo de **JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA**, dentro de las cuales se incluye el diagnóstico y seguimiento realizado, con relación a cada una de las actividades contratadas, determinando su avance y evaluando la forma de ejecución de estas.

Por último, se muestra el registro fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas en el periodo que ocupa este informe y que hacen parte integral del mismo.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Realizar seguimiento y control al desarrollo de las actividades correspondientes a la "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE."

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Realizar seguimiento técnico en el desarrollo de las actividades derivadas del proyecto "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE."

- Evaluar ambientalmente el desarrollo de las actividades civiles enmarcadas dentro del contrato en mención.

- Velar por el buen uso de los recursos dispuesto para la ejecución del contrato "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE."

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

JUSTIFICACION

El barrio Pelinku del municipio de Galeras se ve afectado actualmente por deficiencias en la oferta de espacio público destinado a las actividades de recreación y esparcimiento, siendo este el principal factor de deterioro social de la población del municipio en general, por lo tanto, esta comunidad se ha visto afectada por distintas problemáticas como consecuencia de la baja actividad de esparcimiento y ocio que realizan sus habitantes.

La insuficiencia de espacios para la realización de actividades lúdicas de recreación, la poca gestión e inversión de recursos públicos para la construcción de infraestructura deportiva en la zona y el bajo nivel de impulso a los programas de fomento deportivo y aprovechamiento del tiempo libre, se convierten en los elementos detonantes para el deterioro de la calidad de vida de la población de dicho municipio, manifestándose estas de manera indirecta en los niños y jóvenes, pues es muy bajo su interés en las actividades recreativas y de esparcimiento optando por actividades de degradación social como el tabaquismo y el consumo de sustancias psicoactivas. De igual forma esta situación incide en la salud de sus habitantes, puesto que los malos hábitos desarrollados traen consigo problemas de salud asociados con el sedentarismo, obesidad, alcoholismo entre otros.

Una porción de la población que ejerce actividades deportivas se ven frecuentemente afectadas debido a que deben realizar estas actividades en espacios improvisados e inapropiados, es el caso de predios baldíos utilizados como espacios deportivos, pero que deben ser compartidos con poblaciones de animales como el ganado, equinos, porcinos entre otros, o el traslado a localidades vecinas poniendo en riesgo su seguridad, debido a que deben exponerse a zonas de movilidad en su mayoría deficientes.

Los argumentos antes mencionados permiten dimensionar el impacto que tiene el proyecto en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio Pelinku del municipio y de la comunidad en general, por ende, el desarrollo socioeconómico para el departamento de sucre.

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

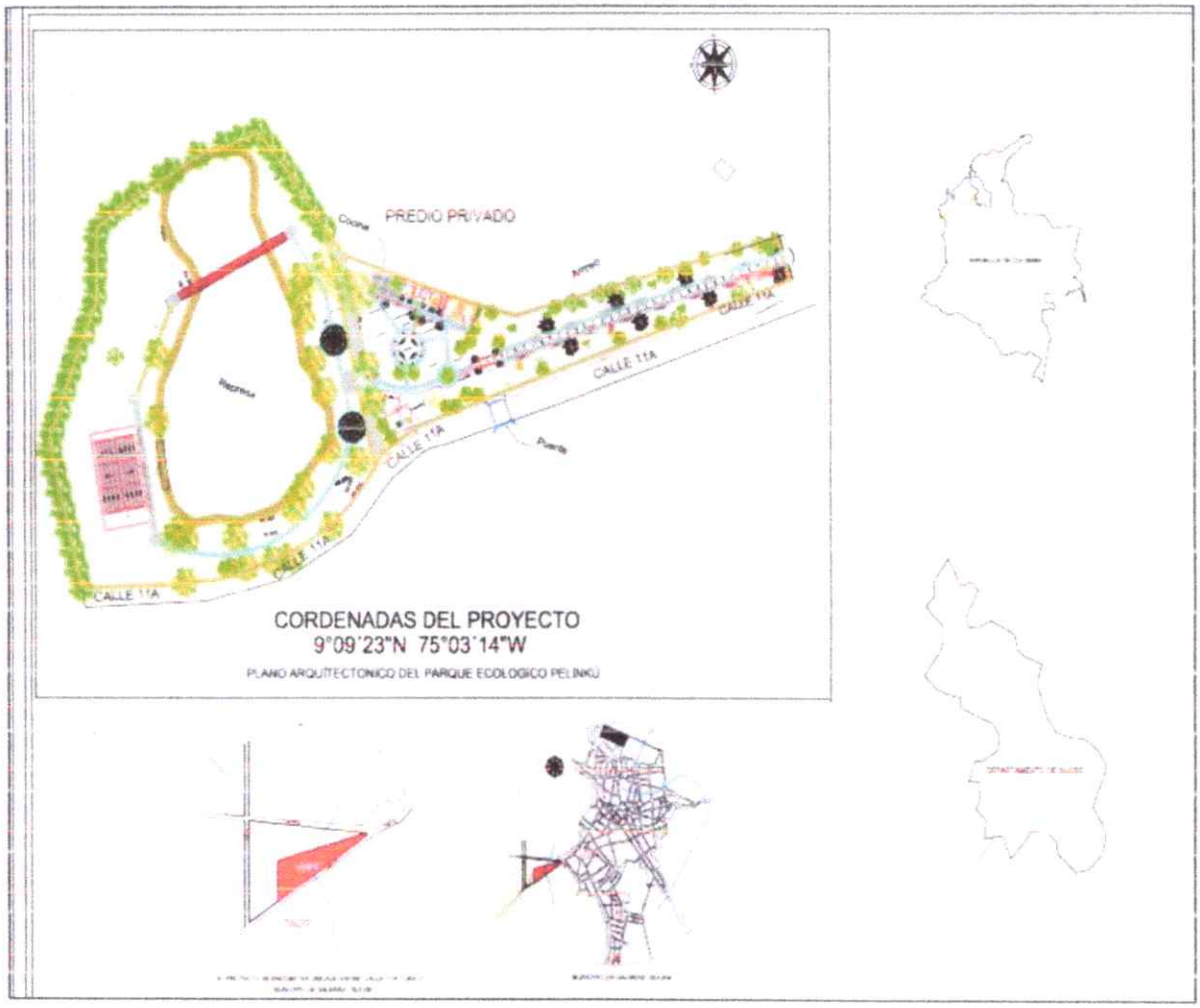
CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.", se encuentra localizado en el barrio Pelinku del municipio de Galeras, en el departamento de Sucre.



DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR LA INTERVENTORIA

ASPECTOS CONTRACTUALES

CONTRATO No.	**IDDRS-CMA-001-204**
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
CONTRATISTA	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR CONTRATO INTERVENTORIA: OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($ 85.278.615)
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	18 DE JUNIO DE 2024
FECHA FINAL OBRA:	17 DE SEPTIEMBRE 2024
SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION DE POLIZAS DE CONTRATO INTERVENTORIA

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
CRC- N° **100018621 – ANEXO 2**	08-07-2024	Cumplimiento	18/06/2024	20/03/2025	8.527.861,50
		Prest. sociales	18/06/2024	20/09/2027	4.263.930,75
		Calidad del servicio	15/08/2024	15/09/2029	8.527.861,50

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

CONTRATO No. LP-002-2023

CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE

CONTRATISTA ARCA MEGAPROYECTOS SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE. ($1.154.916.107.oo)

PLAZO: TRES (03) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2024

FECHA FINAL OBRA: 17 DE SEPTIEMBRE 2024

SUPERVISOR ALEX GIL COVILLA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA

INFORMACION DE POLIZAS DE CONTRATO OBRA

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
N° 3907877-7	11-07-2024	Cumplimiento	18/06/2024	17/09/2024	115.491.811
		Estabilidad/Calidad	17/09/2024	17/09/2029	115.491.811
		Pago Salarios	18/06/2024	18/06/2027	115.491.811

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

GESTIONES AMBIENTALES POR LA INTERVENTORIA

CONDICIONES CLIMATICAS EN LA OBRA

En el periodo en el cual se está presentando este informe, se puede resaltar que las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades dentro del proyecto, motivado al momento coyuntural que está viviendo el país en cuanto a la época de invierno, por lo cual las lluvias han sido moderadas en este periodo, sin embargo, todas las tareas planificadas se han llevado a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos relacionados con el clima. Lo anterior ha permitido que el proyecto avance sin inconvenientes, independientemente de las condiciones atmosfericas que han prevalecido en este periodo, el contratista de obra tiene unas medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas. Sin embargo, las lluvias han afectado en cuanto el arroyo que pasa por el parque, el cual ha aumentado de nivel y se ha desbordado, lo que ha causado que estas aguas arrastren en su escorrentía materiales pétreos que se encontraba acopiados cerca del arroyo, ocasionando un imprevisto para el contratista.

GESTIONES TECNICAS POR LA INTERVENOTRIA

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto en el periodo mencionado se pueden resaltar que han sido varias entre las cuales está la limpieza manuela de maleza y desmonte de material orgánico en zona perimetral, desmonte de alambre púa, demolición de plantilla existente, rocería y limpieza interna y externa de los cuerpos de agua, retiro de material sobrante.

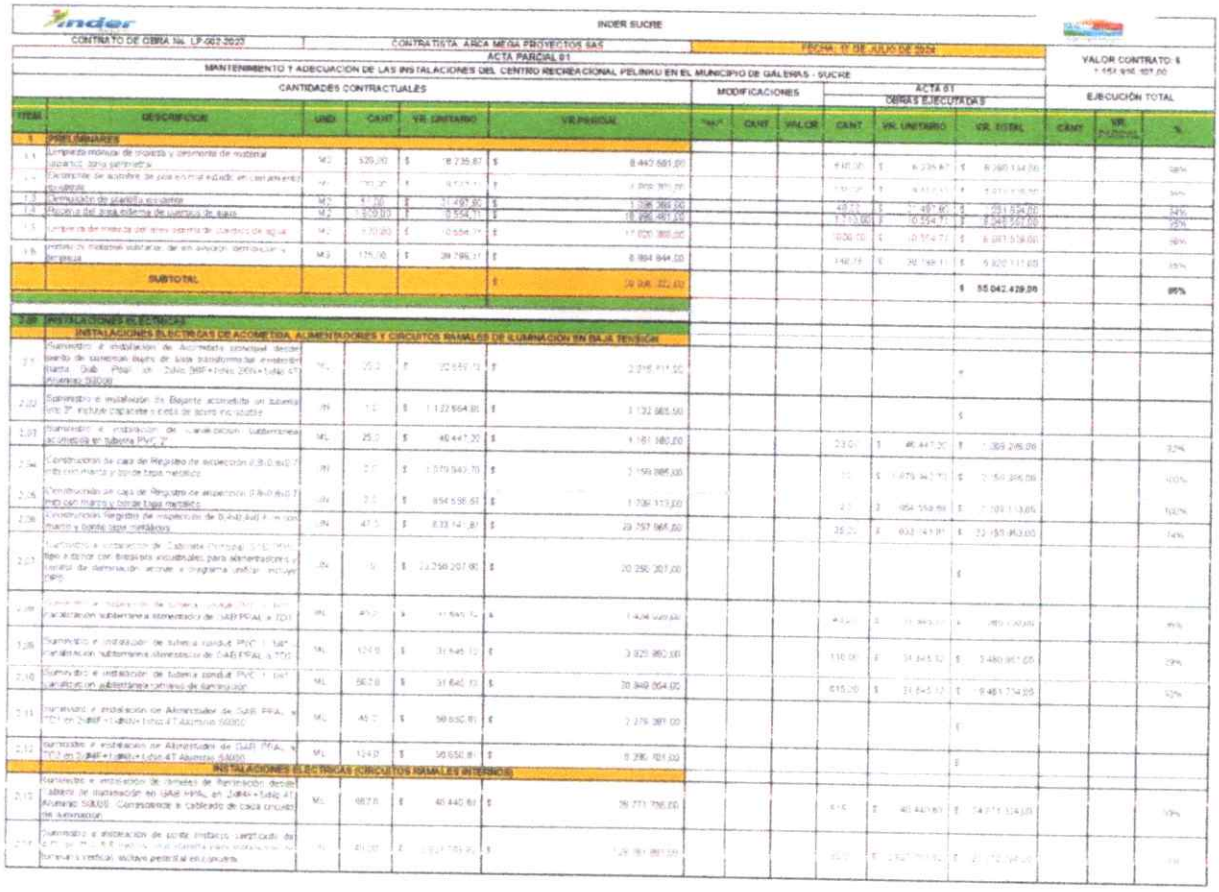
Por otro lado, en cuanto a la parte eléctrica, se avanzó en la canalización subterránea en tubería pvc de 2", además la construcción de cajas de registros, el suministro e instalacion de tubería conduit de 1. ½", instalación de ramales de iluminación desde tablero, suministro e instalación de postes, instalación de salidas para luminarias, así como la instalación de proyector y luminarias.

Se avanzó en el mantenimiento de la cubierta, el suministro e instalacion de adoquines, la instalación de alambre púa, cerramiento en malla eslabonada, instalación de limoncillos, limpieza de senderos y baldosas existentes, construcción de plantilla en concreto, avance

en el suministro e instalación de estructura metálica para el muelle, y el levante en bloque del muro del salón comunal.

SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

En cuanto al avance general del proyecto se puede inferir que, al último día del periodo en estudio, es decir, hasta el día 17 de Julio de 2024 se presenta un avance del 43.30%, el cual se ve reflejado en las actividades ejecutadas según el presupuesto del contrato.



INDER SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2023	CONTRATISTA: ARCA MEGA PROYECTOS SAS	FECHA: 17 DE JULIO DE 2024	VALOR CONTRATO: $ 1.651.906.107,00

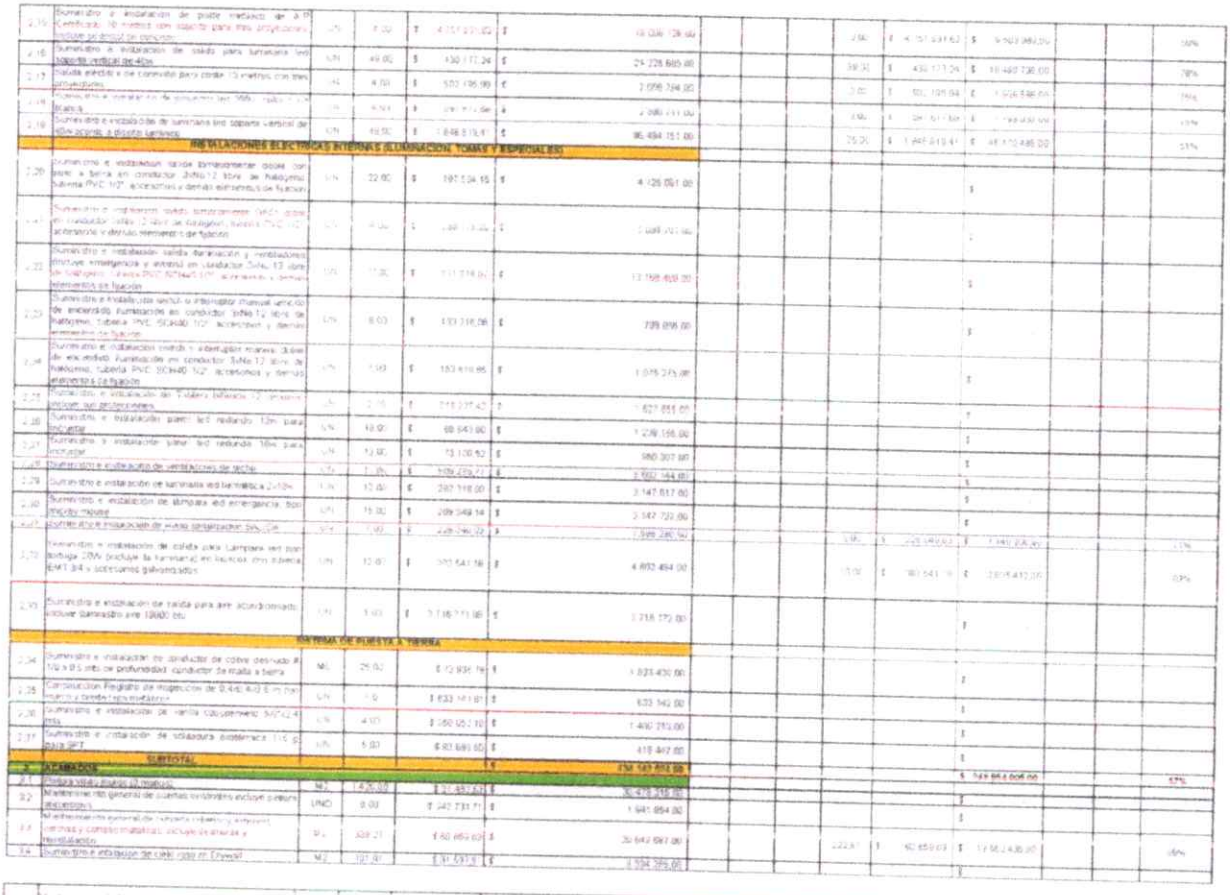
ACTA PARCIAL 01

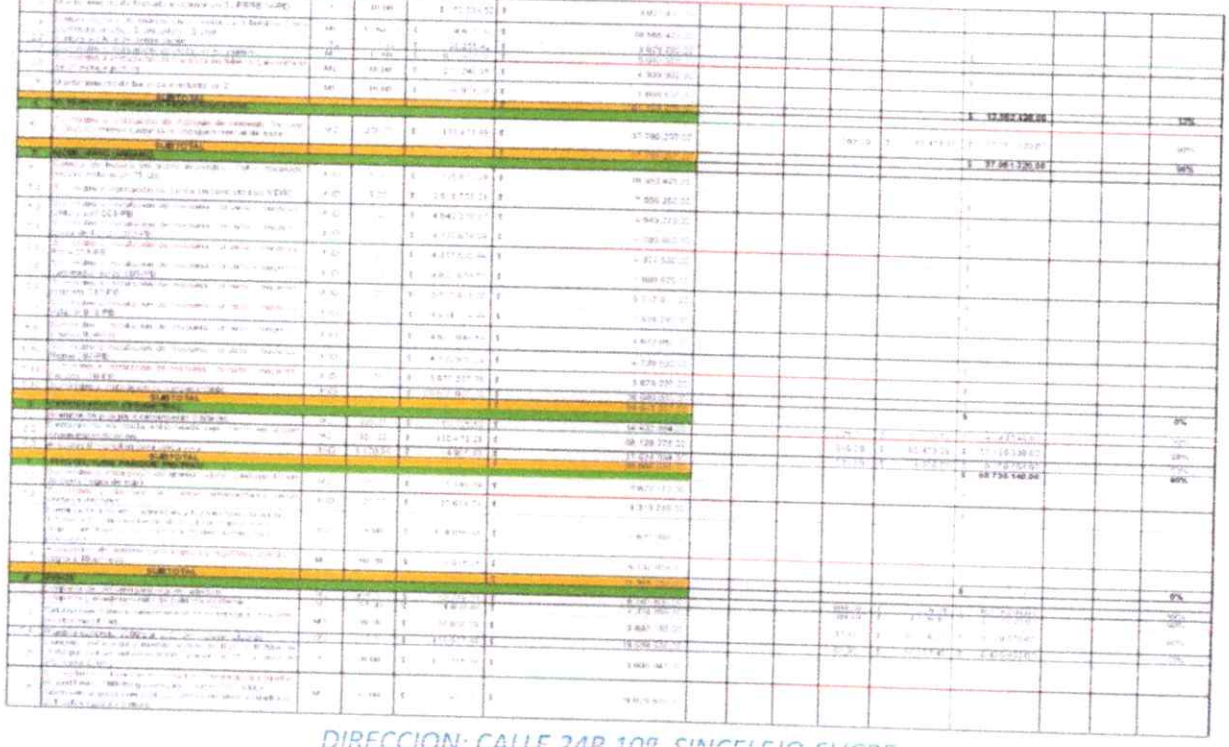
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE

		CANTIDADES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES			ACTA 01 OBRAS EJECUTADAS			EJECUCIÓN TOTAL		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	"+/-"	CANT	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	%
1	PRELIMINARES													
1.1	Limpieza manual de maleza y cesmonte de material vegetal, zona permeable	M2	539,00	$ 16.735,87	$ 8.442.681,00				539,00	$ 16.735,87	$ 8.442.681,00			100%
1.2	Excavación de suelos de cualquier calidad en cualquier equipo	M3	70,20	$ 47.017,00	$ 3.300.391,00				70,20	$ 47.017,00	$ 3.300.391,00			100%
1.3	Demolición de pared o cerramiento	M2	47,80	$ 31.497,80	$ 1.505.368,00				47,80	$ 31.497,80	$ 1.505.368,00			100%
1.4	Rejilla de piso externa de cuenca de agua	M2	1.939,00	$ 9.554,71	$ 18.526.481,69				1.939,00	$ 9.554,71	$ 18.526.481,69			100%
1.5	Limpieza de malezas del area exterior de cuenca de agua	M2	1.700,00	$ 10.554,71	$ 17.943.807,00				1.700,00	$ 10.554,71	$ 17.943.807,00			100%
1.6	Retiro de material sobrante de excavación demolición y escombros	M3	175,00	$ 39.796,31	$ 6.964.854,50				140,00	$ 39.796,31	$ 5.571.483,60			80%
	SUBTOTAL				$ 56.948.322,69						$ 55.042.429,09			95%
2.00	INSTALACIONES ELECTRICAS													
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOMETIDA, ALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACION EN BAJA TENSION													
2.01	Suministro e instalación de Acometida subterránea desde punto de suministro hasta el tablero general (Hasta Dos Pozos de Inspección) en tubería PVC 3"	ML	70,0	$ 32.640,75	$ 2.285.852,50						$ -			
2.02	Suministro e instalación de Bajante acometida en tubería pvc 3" incluye capacete y cinta de acero inoxidable	UN	1,0	$ 1.122.664,00	$ 1.122.664,00						$ -			
2.03	Suministro e instalación de canalización subterránea en tubería PVC 2"	ML	25,0	$ 46.447,20	$ 1.161.180,00				23,0	$ 46.447,20	$ 1.068.285,60			92%
2.04	Construcción de caja de Registro de inspección 0.8x0.8x0.7 en concreto de 3000 psi, con marco y tapa metálica	UN	2,0	$ 1.579.943,70	$ 3.159.887,40				2,0	$ 1.579.943,70	$ 3.159.887,40			100%
2.05	Construcción de caja de Registro de inspección 0.6x0.6x0.7 en concreto de 3000 psi, con marco y tapa metálica	UN	2,0	$ 854.556,85	$ 1.709.113,69				2,0	$ 854.556,85	$ 1.709.113,69			100%
2.06	Construcción Registro de inspección de 0.4x0.4x0.4 en concreto de 3000 psi, con marco y tapa metálica	UN	47,0	$ 633.141,81	$ 29.757.965,50				35,0	$ 633.141,81	$ 22.159.963,50			74%
2.07	Suministro e instalación de Gabinete Centro de Medición tipo 4 para 2 contadores incluidos, para alimentadores y circuito de iluminación exterior, completamente instalado	UN	1,0	$ 22.258.207,00	$ 20.258.207,00						$ -			
2.08	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4" para canalización subterránea alimentador de UMP PPAL a TD1	ML	40,0	$ 11.845,70	$ 1.434.109,00				40,0	$ 11.845,70	$ 473.828,00			33%
2.09	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4" para canalización subterránea alimentador de CAB PPAL a TD1	ML	124,0	$ 31.845,70	$ 3.929.992,00				110,0	$ 31.845,70	$ 3.480.961,00			89%
2.10	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4" para salidas en subterránea circuitos de iluminación	ML	967,0	$ 31.845,70	$ 30.949.954,00				615,0	$ 31.845,70	$ 9.481.734,00			32%
2.11	Suministro e instalación en Alimentador de CAB. PPAL a TD1 en 2#8AWG+1#8N+1#10 ETAluminio (5000)	ML	45,0	$ 50.650,89	$ 2.279.291,00						$ -			
2.12	Suministro e instalación de Alimentador de CAB. PPAL a TD1 en 2#4AWG+1#6N+1#10 ETAluminio (5000)	ML	124,0	$ 50.650,89	$ 6.280.701,00						$ -			
	INSTALACIONES ELECTRICAS (CIRCUITOS RAMALES INTERNOS)													
2.13	Suministro e instalación de Tomacos de Intemperie dentro cableado de instalación en tubo metálico, en 2#8AWG+1#8G ETAluminio (5000). Comprende la cableado de caja circuito de iluminación	ML	987,0	$ 40.440,60	$ 39.771.706,00				615,0	$ 40.440,60	$ 24.871.134,00			63%
2.14	Suministro e instalación de punto interior, centro de [illegible]	UN	81,00	$ [illegible]	$ [illegible]				[illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]			[illegible]

Ilustración 1. Esquema del porcentaje ejecutado por cada actividad.

INGENIERO CIVIL





DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

8.7	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta (en perfil en C 100x50 encerrado) galvanizado calibre 18 incluye pintura	M2	65.30	$ 754.180,21	$ 49.621.714,88				44,00	$ 754.180,21	$ 33.183.929,05			67%
8.8	Suministro e instalación de madera plastica IMPC 70% poliresina 30% fibra natural resistente a la intemperie para muebles y puertas, color terracota	M2	107,00	$ 720.911,17	$ 77.137.495,00						$ -			
8.9	Suministro e instalación de pasamanos en polipropileno para escalera y pulamanos, resistente a la intemperie para muebles y puertas, color terracota	ML	57,00	$ 564.338,23	$ 32.167.319,00						$ -			
	SUBTOTAL				$ 349.494.127,00						$ 65.322.875,00			20%
9	ADECUACION SALON MULTIPLE													
9.1	Levante en bloque 2 (5 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento	M2	69,45	$ 38.724,86	$ 6.643.220,00				14,00	$ 38.724,86	$ 1.646.164,00			6%
9.2	Pañete afinado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores	M2	150,34	$ 36.117,14	$ 5.418.618,00						$ -			
9.3	Enlucir para muros interiores y exteriores con agua	M2	150,34	$ 25.124,05	$ 3.780.181,00						$ -			
9.4	Pintura vinilo mate (2 manos)	M2	376,04	$ 21.400,53	$ 8.045.237,00						$ -			
9.5	Suministro e instalacion de cielo raso en Drywall	M2	109,00	$ 91.637,93	$ 17.543.749,00						$ -			
9.6	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio	M2	21,98	$ 678.681,48	$ 14.037.526,70						$ -			
9.7	Suministro e instalacion de puerta de acceso en aluminio color marron	M2	4,15	$ 616.623,77	$ 2.582.243,00						$ -			
	SUBTOTAL				$ 58.299.972,00						$ 1.646.164,00			6%
	COSTO DIRECTO				$ 1.130.480.196,00						$ 483.819.848,00			
	POIO			1,50%	$ 13.755.906,00						$ 9.180.194,67			
	CERTIFICACION RETE				$ 4.500.000,00									
	CERTIFICACION RETEAP				$ 6.200.000,00									
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				$ 1.154.916.107,00						$ 500.106.727,00			43,29%

VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 1 SON: QUINIENTOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE | $ 500.106.727,00

De acuerdo con la información mencionada anteriormente del avance del proyecto, en la próxima grafica se puede evidenciar de forma visual la situación de la obra.

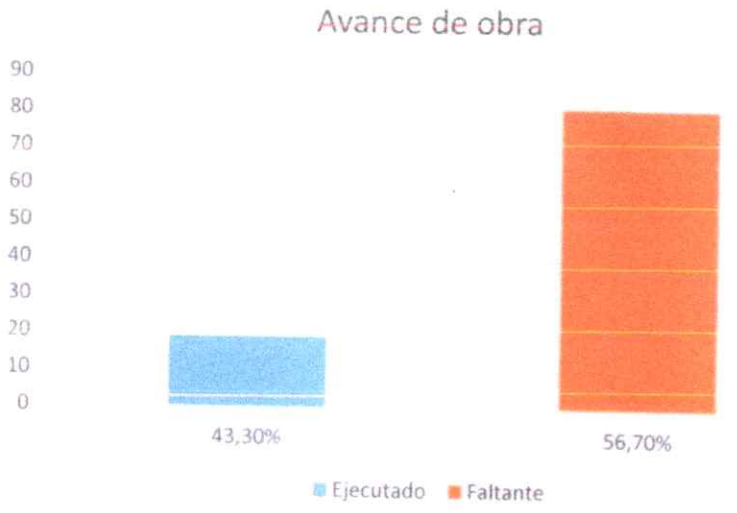


Ilustración 2. Avance de la obra del parque San Martin en el municipio de Galeras

GESTIONES FINANCIERRAS POR LA INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO

El Contrato de Obra **N° LP-002-2023** tiene un valor de **$** 1.154.916.107 suma que proviene de los aportes del sistema general de regalías para la ciudad de Sincelejo y que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.**

Para el periodo que ocupa este informe, en obra se alcanzó un porcentaje de ejecución correspondiente al **43.30%,** lo que equivale en monto presupuestal a **QUINIENTOS MILLONES CIENTO OCHO MIL SETESCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MCTE ($ 500.108.727,00)** faltando por ejecutar un **56,7%.** Representado gráficamente de la siguiente manera:

En el siguiente grafico se muestra la información financiera del proyecto, y el estado del consumo de los recursos en el periodo referenciado.

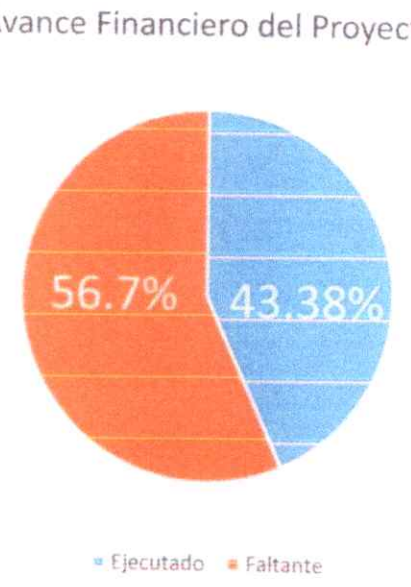


Ilustración 3. Estado de la situación financiera del Proyecto en cuanto a la inversión de los recursos.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen 1. Limpieza externa e interna de los cuerpos de agua y zonas perimetrales



Imagen 2. Instalación en malla eslabonada con marco de ángulos.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Imagen 3. Instalación de malla eslabonada y pintura de postes.



Imagen 4. Construcción de registros eléctricos e instalación de tubería subterráneas.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Imagen 5. Instalación tubería eléctrica subterráneas.



Imagen 6. Materiales en bodega - Construcción de registros eléctricos

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

ORIGINALES DE ACTAS PARCIALES NUMERAL Y LITERAL

ACTA PARCIAL No1, DE INTERVENTORIA.
CONTRATO INTERVENTORÍA No. IDDRS - CMA-001-2024.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
CONTRATISTA:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
C.C.	1.103.100.955
CONTRATO No.	IDDRS - CMA-001-2024
OBJETO CONTRACTUAL:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERAS – SUCRE.
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES.
PLAZO ADICIONAL:	UN (1) MES.
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES.
VALOR:	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($85.278.615,00)

En Sincelejo, a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la sede principal del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – INDERSUCRE, los señores **ALEX FRANCISCO GIL COVILLA**, identificado con cédula de ciudadanía **No 92507076**; calidad de Supervisor por parte del INDERSUCRE y **JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.103.100.955**, en calidad de Contratista Interventor, con el fin de revisar, aprobar y firmar el acta parcial de Interventoría No.1 correspondiente al período del 16 de junio de 2024 al 17 de septiembre de 2024, del contrato IDDRS - CMA-001-2024, cuyo objeto es; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-9:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1124	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	421.382.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	421.382.900,00	**Saldo x Ordenar:**	421.382.900,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	8.427.658,00	**Valor Neto:**	412.955.242,00	**Nro. Compromiso:**	324	**Nro. Cdp:**	723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	25		

TERCERO

Identificacion:	901474095	**Razon Social:**	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	341239366	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1224	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-09-10				
					Total:	421.382.900,00	0,00	421.382.900,00	421.382.900,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-09-12	Generada	421.382.900,00

SPGR

Obligacion Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHifortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema	2024-09-10-9:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1124	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	421.382.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	421.382.900,00	**Saldo x Ordenar:**	421.382.900,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00	**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00		
Valor Deducciones:	8.427.658,00	**Valor Neto:**	412.955.242,00	**Nro. Compromiso:**	324	**Nro. Cdp:**	723		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	25		

TERCERO

Identificacion:	901474095	**Razon Social:**	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	341239366	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	1224	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	-	**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-09-10				
					Total:	421.382.900,00	0,00	421.382.900,00	421.382.900,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-09-12	Generada	421.382.900,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-9:25 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	421.382.900,00	2,000 %	8.427.658,00	8.427.658,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema	2024-09-10-9.25 a. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	421.382.900,00	2,000 %	8.427.658,00	8.427.658,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

Contrato No	LP-002-2023		
Objeto	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.		
Contratista	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	NIT	901474951
Representante Legal	YUSNEIDY MARIA OBOZCO MARQUEZ	C.C.	1.045.306.356
Valor inicial	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE.		
Valor Inicial	$1.154.916.107,00		
Valor Adicional	N/A		
Valor Actualizado	N/A		
Anticipo (%)	N/A		
Plazo Inicial	TRES (3) MESES		
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	723	FECHA:	10/10/2023
N° De Registro Presupuestal - RP (Inicial)	324	FECHA:	29/04/2024
Fecha acta de Inicio	18/6/2024		
Fecha de Terminación Inicial	17/9/2024		
Fecha de Terminación Actualizada	17/9/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato:	IDDRS-CMA-001-2024		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA"		
Interventor:	JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA		
C.C. / NIT:	1.103.100.955		
Valor Inicial:	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS		
Valor Inicial:	$85.278.615,00		
Valor Adicional:	N/A		
Valor Actualizado:	N/A		
Anticipo (30%)	N/A		
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES		
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	623	FECHA:	10/10/2023
N° De Registro Presupuestal (Inicial)	424	FECHA:	29/04/2024
Fecha acta de Inicio:	18/6/2024		
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024		
Fecha de Terminación Actualizada:	17/9/2024		

POLIZAS

CONTRATO DE OBRA

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$ 115,491,811.00	10/4/2024	10/7/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y calidad de Obra	$ 115,491,811.00	10/4/2024	10/7/2029
		Prestaciones sociales	$ 115,491,811.00	10/4/2024	10/7/2027

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$ 115,491,811.00	18/6/2024	17/9/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y calidad de Obra	$ 115,491,811.00	17/9/2024	17/9/2029
		Prestaciones sociales	$ 115,491,811.00	18/6/2024	18/6/2027

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

				desde	hasta
SURAMERICANA	0960219-4	Predios, labores y operaciones	$ 260,000,000.00	18/6/2024	17/9/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS MUNDIAL		Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
		Calidad Del Servicio	N/A	N/A	N/A

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
SEGUROS MUNDIAL	100018621	Cumplimiento	$ 8,527,861.50	18/6/2024	20/3/2025
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	$ 4,263,930.75	18/7/2024	20/9/2024
		Calidad Del Servicio	$ 8,527,861.50	15/8/2024	15/9/2029

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N°. 1-	PERÍODO DE:	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

AVANCE DE LA OBRA

CONTRATO DE OBRA

OBRA PROGRAMADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	38.35%	43.30%
Valor de la Obra programada	$442,911,094	$500,108,727

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Ejecutada (%)	36.49%	79.79%
Valor de la Obra ejecutada	$421,382,900	$921,491,627.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBRA PROGRAMADA


	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	38.35%	43.30%
Valor de la Obra Ejecutada	$32,704,349	$36,925,640.30

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	36.49%	79.79%
Valor de la Obra Ejecutada	$36,925,640	$68,043,807


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	33.33%	43.30%	8.11%
Durante el periodo	38.35%	36.49%	
Acumulado actual	71.68%	79.79%	


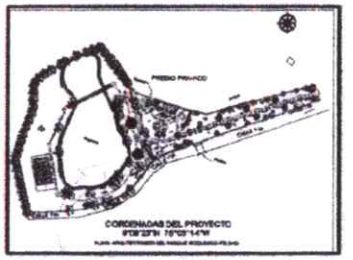


GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	33.33%	43.30%	8.11%
Durante el periodo	38.35%	36.49%	
Acumulado actual	71.68%	79.79%	



ACTIVIDADES REALIZADAS

	CONTRATO DE OBRA	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONTRATO DE INTERVENTORIA	
1	PRELIMINARES			
1.1	Limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetral.	 Se observa la ejecución de la actividad de limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetra. Ejecutado 98%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las Se realiza actividad de limpieza manual	
				 Se identifica por la interventoria la localización del parque Pelinkú y las áreas a intervenir.

Gobernación de Sucre





Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A: FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

1.2	Desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente.	  Se observa la ejecución de la actividad de desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente	
1.3	Demolición de plantilla existente	  Se observa la ejecución de la actividad de Demolición de plantilla existente. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Ejecución de la actividad Demolición de plantilla existente	
1.4	Roceria del área externa de cuerpos de agua	  Se observa la ejecución de la actividad de Roceria del área externa de cuerpos de agua, Ejecutado 95%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Roceria del área externa de cuerpos de agua	

Gobernación de Sucre





Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N°. 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX DE COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

1.5	Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua	  Se observa la ejecución de la actividad de Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua	
1.6	Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza	 Se observa la ejecución de la actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza. Ejecutado 97%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza.Ejecutado 97%	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CIRCUITOS RAMALES INTERNOS)			
2.03	Suministro e instalación de Canalización subterránea acometida en tubería PVC 2"	  Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de Canalización subterránea acometida en tubería PVC 2" Ejecutaado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras Se realiza la actividad de impieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetra	

Gobernación de Sucre



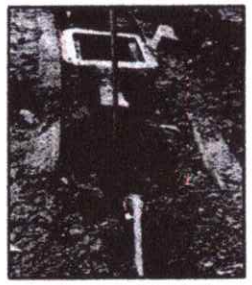

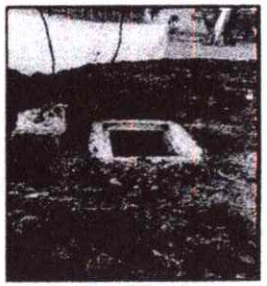

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N° 1-	ACTA PARCIAL N° 1-	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

2.04	Construcción de caja de Registro de inspección 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	  Se observa la ejecución de la actividad de 'Construcción de caja de Registro de inspección 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico. Ejecutaado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Construcción de caja de Registro de inspección	
2.05	Construcción de caja de Registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico	  Se observa la ejecución de la actividad de 'Construcción de caja de Registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico. Ejecutaado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Construcción de caja de Registro de inspección	
2.06	Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos	 Se observa la ejecución de la actividad de 'Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos. Ejecutaado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Construcción de caja de Registro de inspección	

Gobernación de Sucre


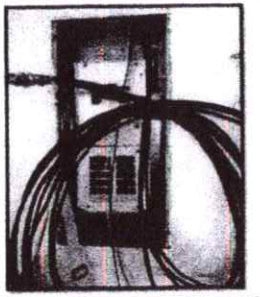


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1:	PERIODO DE:	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U.E.Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

2.11	suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000	Se observa la ejecución de la actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutaado 78%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutaado 78%	
2.12	suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000	  Se observa la ejecución de la actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutad 81%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. la actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutad 81%	
2.13	Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de Iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000 Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de Iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000. Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. actividad de Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000. Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N°. 1-	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

2.14	Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto. Ejecutado 100%	
2.15	Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de poste metálico de A.P Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en cEjecutado 100%oncreto.	
2.16	Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	 



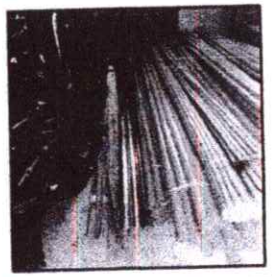


Gobernación de Sucre | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N. 1	ACTA PARCIAL N°. 1-	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	10/08/2024

2.08	Suministro e instalación de tuberiaconduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD1	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD1	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se realiza la actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC	
2.09	Suministro e instalación de tuberiaconduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2.Ejecutaado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	
2.10	Suministro e instalación de tuberiaconduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea ramales de iluminación	 Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea ramales de iluminaciónTD2. Ejecutaado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea ramales de iluminaciónTD2. Ejecutaado 100%	

Gobernación de Sucre



Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N°. 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIR COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024



2.17	Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores	 Se observa la ejecución de la actividad de Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores. Ejecutado 100%	
2.18	Suministro e instalación de proyector led 200w, color o luz blanca	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	
2.19	Suministro e instalación de luminaria led soporte vertical de 40w acorde a diseño luminico	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N°: 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS (ILUMINACIÓN, TOMAS Y ESPECIALES)				
2.20	Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	  Se observa la ejecución de la Actividad de Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 64%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 64%	
2.21	Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	Se observa la ejecución de la Actividad Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación. Ejecutado 50%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación. Ejecutado 50%	
2.22	Suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 52%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 52%	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.												
INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS		FECHA DE ELAVORACIÓN	19/08/2024
2.23	Suministro e instalación switch o interruptor manual sencillo de encendido iluminación en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 33%					La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 33%					
2.24	Suministro e instalación switch o interruptor manual doble de encendido iluminación en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	Se observa la ejecucion de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 29%					La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 29%					
2.25	Suministro e instalación de Tablero bifásico 12 circuitos, incluye sus protecciones	Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 50%					La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 50%					

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023											
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.											
INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024
2.26	Suministro e instalacion panel led redondo 12w para incrustar	Se observa la ejecución de la Actividad 'Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar. Ejecutado 33%					La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Ejecución de la Actividad 'Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar. Ejecutado 33%				
2.27	Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar	Se observa la ejecución de la Actividad Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar. Ejecutado 31%					La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar. Ejecutado 31%				
2.28	Suministro e instalación de ventiladores de techo	Se observa la ejecución de la actividad de 'Suministro e instalación de ventiladores de techo. Ejecutado 45%					La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. 'Suministro e instalación de ventiladores de techo. Ejecutado 45%				


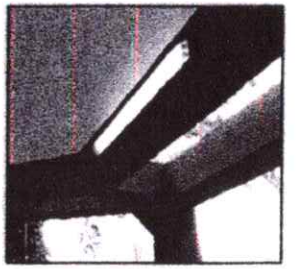
Gobernación de Sucre | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

2.29	Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w	 Se observa la ejecución de la actividad 'Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w. Ejecutado 33%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad 'Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w. Ejecutado 33%	
2.30	Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse	Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse. Ejecutado 33%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse. Ejecutado 33%	
2.31	Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	 Se observa la ejecución de la actividad de 'Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA. Ejecutado 71%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de 'Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA. Ejecutado 71%	

Gobernación de Sucre







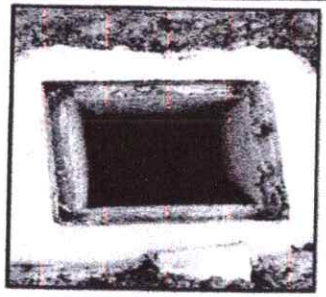
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISION	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORIACIÓN	30/08/2024

2.32	Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	 Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados. Ejecutasdo 83%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados. Ejecutasdo 83%	
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			
2.34	Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo # 1/0 a 0.5 mts de profundidad. conductor de malla a tierra	  Se observ la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo # 1/0 a 0.5 mts de profundidad. conductor de malla a tierra. Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observ la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo # 1/0 a 0.5 mts de profundidad. conductor de malla a tierra. Ejecutasdo 100%	
2.35	Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos	  Se observ la ejecución de la actividad de Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos. Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observ la ejecución de la actividad de Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos. Ejecutasdo 100%	

Gobernación de Sucre

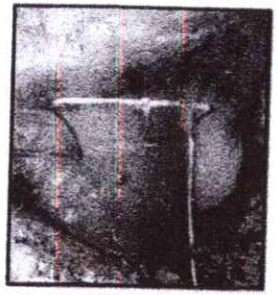






Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1 -	ACTA PARCIAL N° 1-	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEXSEL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

2.36	Suministro e instalación de varilla coopperweld 5/8"x2.4 mts	 Se observ la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de varilla coopperweld 5/8"x2.4 mts. Ejecutasdo 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de varilla coopperweld 5/8"x2.4 mts. Ejecutasdo 100%	
2.37	Suministro e instalación de soldadura exotér	  Se observ la ejecución de la actividad de 'Suministro e instalación de soldadura exotérmica 115 g para SPT. Ejecutasdo 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observ la ejecución de la actividad de 'Suministro e instalación de soldadura exotérmica 115 g para SPT. Ejecutasdo 100%	
3	ACABADOS			
3.1	Pintura vinilo muros (3 manos)	  Se observ la ejecución de la actividad de Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutasdo 30%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutasdo 30%	

Gobernación de Sucre



Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE:	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

5.2	Suministro e instalación de banca en concreto tipo MD30	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de banca en concreto tipo MD30 . Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de banca en concreto tipo MD30 . Ejecutado 100%	
5.3	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - cintura surf 003-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - cintura surf 003-PB. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - cintura surf 003-PB. Ejecutado 100%	
5.4	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Esqui de Fondo 002-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Esqui de Fondo 002-PB. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Esqui de Fondo 002-PB. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre




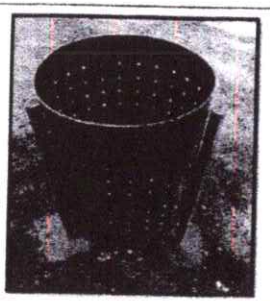
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISION	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.O. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/09/2024

3.3	Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas matalicas, incluye desmonte y reinstalación	  Se observa la ejecución de la actividad de Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas matalicas, incluye desmonte y reinstalación Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas matalicas, incluye desmonte y reinstalación. Ejecutado 100%	
4	ELEMENTOS URBANOS PREFABRICADOS			
4.1	Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base Ejecutado 98%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base Ejecutado 98%	
5	MOBILIARIO URBANO			
5.1	Caneca de basura en acero inoxidable. Color: Satinado. Incluye instalación 75 Lts	  Se observa la ejecución de la actividad de Caneca de basura en acero inoxidable. Color: Satinado. Incluye instalación 75 LtsEjecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Caneca de basura en acero inoxidable. Color: Satinado. Incluye instalación 75 LtsEjecutado 100%	

Gobernación de Sucre


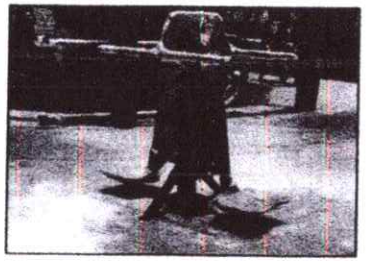
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.O. 4. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

5.5	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Pony 001-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Pony 001-PB. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Pony 001-PB. Ejecutado 100%	
5.6	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - caminador aereo 005-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - caminador aereo 005-PB. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - caminador aereo 005-PB. Ejecutado 100%	
5.7	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - bicicleta 012-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - bicicleta 012-PB. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - bicicleta 012-PB. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre


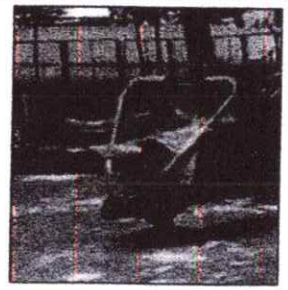
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N°. 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

5.8	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - volante 013 PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - volante 013 PB. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - volante 013 PB. Ejecutado 100%	
5.9	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Eliptica 004-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Eliptica 004-PB. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Eliptica 004-PB. Ejecutado 100%	
5.10	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Remo 007-PB. Ejecutado 100%	

Gobernacion de Sucre

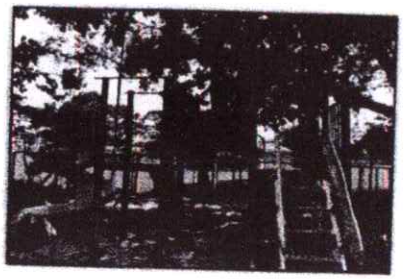

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

5.11	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Fondos 010-PB	 Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Fondos 010-PB. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores - Fondos 010-PB. Ejecutado 100%	
5.12	Suministro e instalación de parque infantil	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de parque infantil . Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de parque infantil . Ejecutado 100%	
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL			
6.1	Alambre de púa para cerramiento 8 hileras.	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre





Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

6.2	Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación	  Se observa la ejecución de la actividad de Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación. . Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo según especificación. . Ejecutado 100%	
6.3	Arbustos (limoncillo) para cerca viva.	  Se observa la ejecución de la actividad de Arbustos (limoncillo) para cerca viva. . Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Arbustos (limoncillo) para cerca viva. . Ejecutado 100%	
7	FITOTECTURA PARQUE PELINKU			
7.1	Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp)	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp). Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp). Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre





Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N°. 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/09/2024

7.2	Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores. Ejecutado 100%	
7.3	Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajistico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación	 Se observa la ejecución de la actividad de Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajistico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajistico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación. Ejecutado 100%	
7.4	Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp.	  Se observa la ejecución de la actividad de Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre



Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVOLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

8	PISOS			
8.1	Limpieza de sendero peatonal en adoquin	  Se observa la ejecución de la actividad Limpieza de sendero peatonal en adoquin. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Limpieza de sendero peatonal en adoquin. Ejecutado 100%	
8.2	Limpieza y mantenimiento de baldosa existente	   Se observa la ejecución de la actividad Limpieza y mantenimiento de baldosa existente. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Limpieza y mantenimiento de baldosa existente. Ejecutado 100%	
8.3	Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado	  Se observa la ejecución de la actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado. Ejecutado 100%	La interventoria realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctejecutado 100%tor modificado.	

Gobernación de Sucre




Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERÍODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

8.4	Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	  Se observa la ejecución de la actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo . Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo. Ejecu8tado 100%	
8.5	Concreto para viga cimiento anden de 0.20 x 0,20m de 3000 psi incluye refuerzo 60000 psi (4 var 1/2" y aros de 3/8" cada 20cm)	  Se observa la ejecución de la actividad Concreto para viga cimiento anden de 0.20 x 0,20m de 3000 psi incluye refuerzo 60000 psi (4 var 1/2" y aros de 3/8"	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Concreto para viga cimiento anden de 0.20 x 0,20m de 3000 psi incluye refuerzo 60000 psi (4 var 1/2" y aros de 3/8" cada 20cm) . Ejecutado 100%	
8.6	Suministro e instalación de estructura metalica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tuberia de soporte con pilotes, correas en tuberia cuadrada 2x1 galvanizada y pintura	 Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de estructura metalica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tuberia de soporte con pilotes, correas en tuberia cuadrada 2x1 galvanizada y pintura . Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo	

Gobernación de Sucre





Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N° 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.T.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

8.7	Suministro e instalación de estructura metalica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tuberia de soporte con pilotes, correas en tuberia cuadrada 2x1 galvanizada y pintura	 Se observa la ejecución y terminación de la actividad de Suministro e instalación de estructura metalica para puente en perfil en C 160x60 encajonado galvanizado calibre 16" incluye pintura. Ejecutodo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de estructura metalica para puente en perfil en C 160x60 encajonado galvanizado calibre 16" incluye pintura. Ejecutodo 100%	
8.8	Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota	 Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota Ejecutado 65%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 65%	
8.9	Suministro e instalacion de pasamanos en polipropilero fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalacion de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 65%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalacion de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 65%	

Gobernación de Sucre



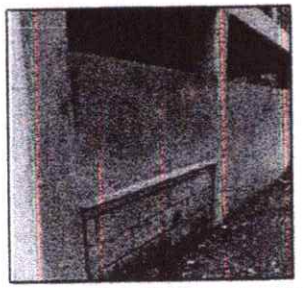


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN	MENSUAL N°: 1	ACTA PARCIAL N°: 1	PERÍODO DE	19/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVELLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

9	ADECUACION SALON MULTIPLE			
9.1	Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	 Se observa la ejecución de la actividad de Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Levante en bloque 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento.	
9.2	Pañete allanado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores	 Se observa la ejecución de la actividad Pañete allanado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores . Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad Pañete allanado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores . Ejecutado 100%	
9.3	Estuco para muros interiores y exteriores del aula	 Se observa la ejecución de la actividad de Estuco para muros interiores y exteriores del aula . Ejecutado 50%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Estuco para muros interiores y exteriores del aula . Ejecutado 50%	


Gobernación de Sucre | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE:	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U.A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	30/08/2024

9.4	Pintura vinilo muros (3 manos)	 Se observa la ejecución de la actividad Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutado 53%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutado 53%	

ANOTACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA:
Se evidencia al cumplimiento del PGIO. Se cumple con la seguridad social del personal en obra. Se cumple con los registros fotograficos y videos. Se cumple con el seguimiento del cronograma de trabajo en obra. Se cumple con la bitácora diriamente. Se ejecutan lasdiferentes actividades bajo el requerimiento técnico contractual.
GESTINOES AMBIENTALES POR EL CONTRATISTA DE OBRA:
En el periodo de este informe, las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades, por lo cual las lluviasno han causado mayor impacto en la ejecucióride las actividades, sin embargo, por lo que las tareas se han llevado a cabo según lo programado y con contratiempos minimos. Cabe anotar que el contratista de obra tiene medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas si es del caso.
GESTIONES TECNICAS POREL CONTRATISTA DE OBRA:
Limpieza manual de maleza y desmonte de material orgánico zona perimetral. Desmonte de alambre de pua en mal estado en cerramiento existente. Demolición de plantilla existente. Rocería del área externa de cuerpos de agua. Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua. Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza. Suministro e instalación de canalización subterránea acometida en tubería PVC 2". Construcción de caja de registro de inspección 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico. Construccion de caja de registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico. Construcción registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos. Suministro e instalación de tubería Conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de gab ppal a td1. Suministro e instalación de tubería Conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de gab ppal a td2. Suministro e instalación de tubería Conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea ramales de iluminación. Suministro e instalación de rameles de iluminación desde tablero de iluminación en gab ppal en 2x#4f+1xno.4t aluminio s8000. corresponde al cableado de cada circuito de iluminación.

Limpieza manual de maleza y desmonte de material orgánico zona perimetral. Desmonte de alambre de pua en mal estado en cerramiento existente. Demolición de plantilla existente. Rocería del área externa de cuerpos de agua. Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua. Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza. Suministro e instalación de canalización subterránea acometida en tubería PVC 2". Construcción de caja de registro de inspeccion 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico. Construcción de caja de registro de inspección 0,6x0,6x0,7 mts con marco y borde tapa metálico. Construcción registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos. Suministro e instalación de tubería Conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de gab ppal a td1. Suministro e instalación de tubería Conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de gab ppal a td2. Suministro e instalación de tubería Conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea ramales de iluminación. Suministro e instalación de rameles de iluminación desde tablero de iluminación en gab ppal en 2x#4f+1xno.4t aluminio s8000. corresponde al cableado de cada circuito de iluminación. Suministro e instalación de poste metálico certificado de a.p de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto. Suministro e instalación de poste metálico de a.p certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto. Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores. Suministro e instalación de proyector led 200w, color o luz blanca. Suministro e instalación de luminaria led soporte vertical de 40w acorde a diseño luminico. Suministro e instalación de aviso señalización salida. Suministro e instalación de salida para lámpara led tipo tortuga 20w (incluye la luminaria) en kioscos con tubería emt 3/4 y accesorios galvanizados. Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas metálicas, incluye desmonte y reinstalación. Suministro e instalación de adoquin de cemento sección: 0,20x0,10 metros color: gris. incluye material de base. Alambre de púa para cerramiento 8 hileras. Cerramiento en malla eslabonada con marco en Angulo según especificación. Arbustos (limoncillo) para cerca viva. Limpieza de sendero peatonal en adoquin.

ANOTACIONES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA:
1. Se evidencia el cumplimiento de Mantener al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores; 2. Se cumple con la presentación de comités de interventoria y obra en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad; 3.Se evidencia el cumplimiento de Llevar la bitácora, un ereqistro fotográfico y de video. 4. Se Hace por parte de la interventoría la verificación de la situación actual antes del inicio de la obra; 5. Se evidencia el seguimiento en obra al cronograma de trabajo, anotando que el presente peiro se bajó un poco porcentaje programado, el cual se compensa con el período anterior, que estuvo por encima de lo programado, superando así el porcentaje programado de los ods periodes hasta el momento; 6. Se verifica por parte de la interventoría la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar para la ejecución de las obras; 7. Se verifica el cumplimiento de la ejecución de controles técnicos con el seguimiento, acompañamiento y vigilancia en la obra.
GESTIONES AMBIENTALES POR LA INTERVENTORIA:
En el periodo en el cual se está presentando este informe, se puede resaltar que las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades dentro del proyecto, motivado al momento coyuntural que está viviendo el país en cuanto a la época de invierno, por lo cual las lluvias han sido verdaderas entre moderadeas e intensas en este periodo, sin embargo, todas las tareas planificadas se han llevado a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos relacionados con el clima. Lo anterior ha permitido que el proyecto avance sin mayores inconvenientes, independientemente de las condiciones atmosféricas que han prevalecido en este periodo, el contratista de obra tiene unas medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas.

GESTIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORIA:
La Interventoría dentro de sus compromisos de su contrato, prosigue con el seguimiento y control de todas las actividaes contractuales del contratista de Obra, el cual continuan con la ejecución de algunos de los items iniciados, los cuales se lleva al 100%, otros alcanzan un alto porcentaje y otros se inician avanzando un buen porcentaje, tal y como se muestra en el presente informe descrito por cada item, los que se acompañan de la evidencia fotográfica. Teniendo y considerando el informe de la interventoria correspondiente al presente perio, el supervisor anexa copia de dicho informe al presente.
GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO:
Se realiza, por parte de la interventoria el análisis semanal del avance financiero de las obras , a fin de prever, con anticipación posibles necesidades de modificaciones del contrato.
GESTIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO:
NO se requiere solicitud de aplicacion de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTYRATO DE OBRA: LP-002-2023

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE.

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°. 1	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DE	18/07/2024	HASTA	17/08/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN	10/08/2024

Limpieza y mantenimiento de baldosa existente. Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado. Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo. Suministro e instalación de estructura metálica para muelle en perfil en c 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tubería de soporte con pilotes, correas en tubería cuadrada 2x1 galvanizada y pintura. Levante en bloque 0.15 (5 mpá) 14 x 19 x 39 para cerramiento.

El porcentaje de ejecución del proyecto nos indica que hasta el día 20 de agosto de 2024 es de un avance del 79,79% el cual se ve reflejado en las actividades ejecutadas según el presupuesto del contrato y cronograma de actividades. A pesar de las variaciones climáticas que se han presentado durante este periodo, todas las tareas planificadas se llevaron a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos relacionados con el clima.

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO:

Se realiza, conjuntamente con la interventoria el análisis semanal el avance financiero de las obras, a fin de prever, con anticipación eventuales necesidades de modificaciones del contrato.

GESTIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO: N/A

EVENTUALIDADES PRESENTADAS

A pesar quese han presentado fuertes lluvias, al la presente fecha no se han generado atrasos en la construccion y ejecución de los trabajo.

OBSERVACIONES

Se adjunta informe mensual No.1. del contratista de obra especificando las actividades ejecutadas y verificación mediante registros fotograficos; y acta numérica y literal de acta parcial No.1, correspondiente al periodo del 18 de junio al 17 de julio de 2024.

Se adjunta informemensual No. 1 del contratista de interventoría, el cual especifica el control y vigilancia sobre las actividades ejecutadas en el periodo del 18 de junio al 17 de julio de 2024.

La supervisión ha realizado varias visitas al sitio de las obras, con el fin de verificar la ejecución de las actividades contractuales.

FIRMAS

ALEX GIL COVILLA

P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Jorge M. Díaz Del Toro	Arquitecto Asesor infraestructura deportiva	
	Valerin Chamorro	Ing. Asesor infraestructura deportiva	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del supervisor de escenarios deportivos del IMDER Sincelejo



Actividad de Cerramiento en malla eslabonada con marco en ángulo según especificación.



Actividad de Arbustos (limoncillo) para cerca viva.



Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp).



Se observa la ejecución de la actividad de Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores.



Siembra de árboles maderables y frutales tipo paisajístico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación.



Se observa la ejecución de la actividad de Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



Actividad Limpieza de sendero peatonal en adoquín.



Actividad de Limpieza y mantenimiento de baldosa existente.



Actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado.



Actividad de Plantilla concreto 3000 psi e:0,10m incluye refuerzo.



Actividad Concreto para viga cimiento anden de 0.20 x 0,20m de 3000 psi incluye refuerzo 60000 psi (4 var 1/2" y aros de 3/8" cada 20cm) .



Suministro e instalación de estructura metálica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 16" incluye tubería de soporte con pilotes, correas en tubería cuadrada 2x1 galvanizada y pintura.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



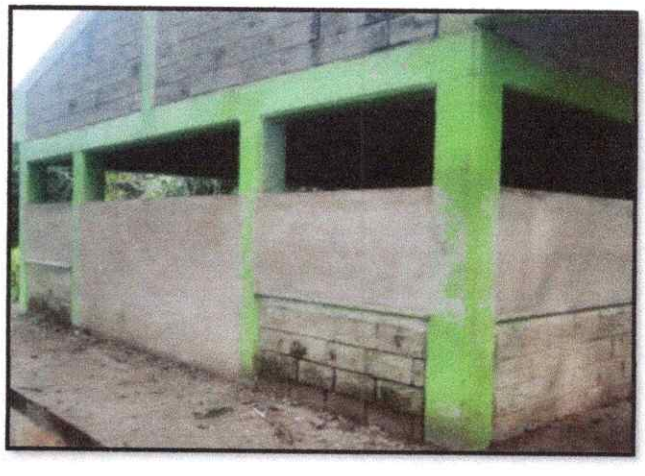
Actividad de Suministro e instalación de estructura metálica para puente en perfil en C 160x60 encajonado galvanizado calibre 16" incluye pintura.



Actividad Suministro e instalación de madera plástica WPC 70% polímero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota.



Actividad Suministro e instalación de madera plástica WPC 70% polímero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota.



Se observa la ejecución de la actividad Pañete allanado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores.



Se observa la ejecución de la actividad de Estuco para muros interiores y exteriores del aula.



Se observa la ejecución de la actividad Pintura vinilo muros (3 manos).

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura anticorrosiva.



suministro e instalación de cielo raso en drywall



mantenimiento de fachada existente en superboard



pintura acrílica de demarcación



relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado



suministro e instalación de baranda en tubería galvanizada de 2" incluye pintura

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



mantenimiento de baranda existente de 2"



suministro e instalación de ventanas en aluminio

CAPÌTULO V. EVALUACIÒN DE LA EJECUCIÒN.

7. EVALUACIÒN TÈCNICA.

Para la ejecución del proyecto inicialmente se realizaron actividades preliminares comenzando así por la colocación de una valla informativa con las características que definió la interventoría, cerramiento perimetral y colocación de señales de seguridad ubicadas en puntos estratégicos y visibles para prevenir accidentes al personal adscrito a la obra y terceros. Respetando las normas y procedimientos de seguridad se le hizo revisión constante al cumplimiento de herramientas de protección como cascos, gafas de protección, guantes, botas y cualquier otro elemento que garantice la seguridad de los trabajadores.

Para la ejecución de las actividades programadas en el cronograma se tuvieron en cuenta cada una de las especificaciones técnicas de construcción llevando así una buena ejecución en actividades de demolición, excavación, retiro del material, relleno y compactación del suelo.

Todas estas actividades descritas anteriormente se desarrollaron de acuerdo con las especificaciones técnicas y usando los equipos adecuados para cada actividad.

CAPÌTULO VI. DIAGNÒSTICO Y EVALUACIÒN DEL PROYECTO.

8. GESTIONES AMBIENTALES POR LA INTERVENTORIA

CONDICIONES CLIMATICAS EN LA OBRA

Durante el periodo cubierto por este informe, las condiciones meteorológicas han tenido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades del proyecto, debido a la temporada invernal que atraviesa el país. Aunque las lluvias han sido constantes, estas se han mantenido en niveles moderados, lo que ha permitido que todas las tareas planificadas se realicen conforme al cronograma establecido, con contratiempos mínimos relacionados con el clima.

El avance del proyecto no ha sufrido mayores inconvenientes gracias a las medidas de contingencia implementadas por el contratista, las cuales han facilitado la continuidad de las labores, a pesar de las condiciones atmosféricas predominantes en este periodo. Esto ha asegurado un progreso constante y eficiente en la ejecución del proyecto.

8.5. CONCLUSIONES.

Durante este periodo, se logró un avance considerable en la ejecución de las actividades contratadas, cumpliendo de manera efectiva con el cronograma previsto. La eficiente administración de los recursos y la buena coordinación del equipo de trabajo facilitaron un progreso fluido, poniendo especial énfasis en los detalles y en el cumplimiento de altos estándares de seguridad en todas las tareas ejecutadas.

Como resultado de estos esfuerzos, el proyecto se completó de forma exitosa. Todas las actividades planificadas se llevaron a cabo puntualmente, lo que permitió finalizar la obra con un balance positivo y satisfactorio.

ANEXOS

Bitácora de obra, seguridad social.

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR DE OBRA.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

ANEXOS.

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
Profesión: Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción
M.P. Nº: 08202 - 097728 del Atlántico
Dir: Calle 22 # 15-54 Piso 1 Sincelejo-Sucre
Celulares: 3017018060 luiseduardoucrosfacturacion@gmail.com

CERTIFICACION

A QUINE INTERESE

Yo, LUIS EDUARDO UCROS SIERRA identificado (a) con C.C. 92032822 de Sincé - Sucre, en mi calidad de Ingeniero civil con Matrícula Profesional Nº 08202297728 ATL, Realice la revisión y supervisión a la ejecución del ítem (8.7 Suministro e instalación de estructura metálica para puente en perfil en C 160x60 encajonado galvanizado calibre 16" incluye pintura) correspondiente al contrato de obra No LP-002-2023 el cual fue elaborado de acuerdo a los requerimientos de la NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10, LEY 400 DE 1997 Y DECRETO 52 DE 2002 para el proyecto de: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO PELINKU, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GALERAS DEPARTAMENTO DE SUCRE". Dicha construcción consiste en una estructura con 3 vigas longitudinales con perfil 160x60 en C cal 16 encajonado separadas 1mts para un ancho total de 2 mts y una longitud total de 32 mts y luces de apoyo de 4mts. Para la rigidez de esta estructura se implementó riostras transversales en perfil de tubo estructural cuadrado de 70x70mm cal 16 de 2 mts de longitud, las cuales están separadas cada 30cm y servirán de soporte para la madera WPC que será el acabado final de dicha estructura.

Para constancia se firma el 15 de julio del 2024.

Atentamente,

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
ING CIVIL
M.P. 08202097728 ATL

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
Profesión: Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción
M.P. Nº: 08202 - 097728 del Atlántico
Dir: Calle 22 # 15-54 Piso 1 Sincelejo-Sucre
Celulares: 3017018060
ucrosyucrosconstructores@gmail.com

UNIVERSIDAD DEL NORTE

ACTA DE GRADO No 2003-02-03-59
LR14-REG 522 -FOLIO 132 - R 09

Barranquilla a los 8 días del mes de marzo de dos mil tres se llevó a cabo la ceremonia de graduación presidida por el Rector y las autoridades académicas, en la cual la UNIVERSIDAD DEL NORTE autorizada para el efecto según Decreto No. 263 del 22 de febrero de 1973 del Ministerio de Educación Nacional, y previo juramento reglamentario, confirió el título de :

INGENIERO CIVIL

a

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

Identificado con C.C. No. 92,032,822 de SINCE quién cumplió con los requisitos exigidos por la Universidad.

Dan fe de lo anterior: JESUS FERRO BAYONA, Rector, JAVIER PAEZ SAAVEDRA, Decano, y CARMEN HELENA JIMENEZ A., Secretaria Académica.

Firma la presente acta de grado, en la ciudad de Barranquilla a los 8 días del mes de marzo de 2003.

CARMEN HELENA JIMENEZ A.
Secretaria Académica

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Barranquilla, 8 de marzo de 2003

UNIVERSIDAD DEL NORTE

En nombre de la REPUBLICA DE COLOMBIA y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto No. 283 del 22 de Febrero de 1973, representada por el Consejo Directivo y el Rector;

teniendo en cuenta que:

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

C.C. No. 92.032.822 de Sincé

Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorga con todas las prerrogativas, obligaciones y derechos el título de:

INGENIERO CIVIL

Dado en Barranquilla, a los 8 días del mes de Marzo de 2003

Decano de División

Rector

Secretario Académico

Libro No. 09 Acta No. 2003-02-03-89 Registrado LR No. 14-522 Folio 00152

13331

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

Profesión: Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción

M.P. Nº: 08202 - 097728 del Atlántico

Dir: Calle 22 # 15-54 Piso 1 Sincelejo-Sucre

Celulares: 3017018060

ucrosyucrosconstructores@gmail.com

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

EL CONSEJO DIRECTIVO Y EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE
TENIENDO EN CUENTA QUE:

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

C.C. No. 92932.822 Exp. en Sincé (Sucre)

Curso en la Universidad del Norte, dieciocho (18) créditos académicos en el área de Análisis y Diseño de Estructuras aprobando satisfactoriamente las siguientes asignaturas:

Tópicos Selectos de Análisis Numéricos y Sistemas, Tópicos Selectos de Mecánica de Sólidos Avanzado, Análisis Estructural y Aplicaciones con el computador, Diseño de Estructuras de Hormigón Reforzado, Dinámica Estructural y Diseño Sísmico, Estructuras Metálicas.

Completando doscientos ochenta y ocho (288) horas de estudio, prácticas en computador y trabajos dirigidos en el programa Minor -Concentración de estudios- le otorga el presente Diploma de Acreditación en:

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

Para constancia firman:

UNIVERSIDAD DEL NORTE
Secretaría Académica

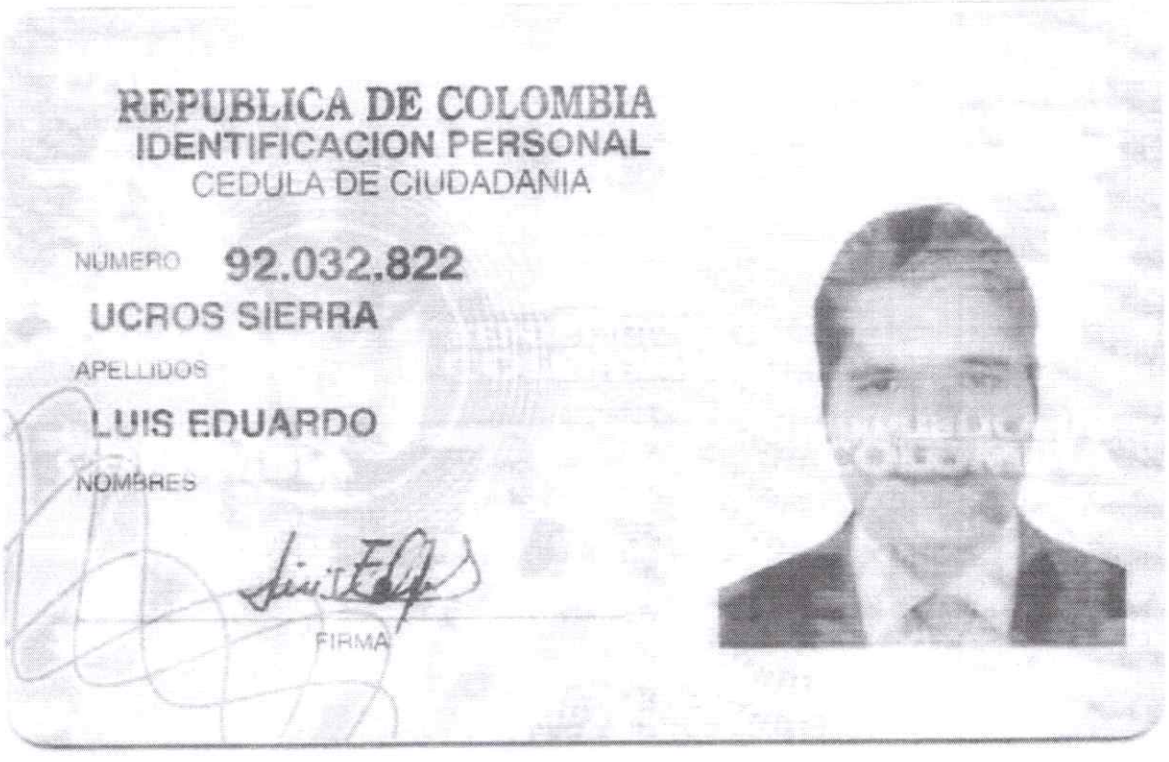
DIVISIÓN DE INGENIERIAS
Decano

Barranquilla, Marzo de 2003

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA
Profesión: Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción
M.P. Nº: 08202 - 097728 del Atlántico
Dir: Calle 22 # 15-54 Piso 1 Sincelejo-Sucre
Celulares: 3017018060
ucrosyucrosconstructores@gmail.com

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

Profesión: Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción
M.P. Nº: 08202 - 097728 del Atlántico
Dir: Calle 22 # 15-54 Piso 1 Sincelejo-Sucre
Celulares: 3017018060
ucrosyucrosconstructores@gmail.com





INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **12-ABR-1981**

SINCE
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUL-1999 SINCE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2819000-00225192-M-0092032822-20100315 **00216**37170A 1 33751590

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

Profesión: Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción
M.P. Nº: 08202 - 097728 del Atlántico
Dir: Calle 22 # 15-54 Piso 1 Sincelejo-Sucre
Celulares: 3017018060
ucrosyucrosconstructores@gmail.com



UNIVERSIDAD DEL NORTE

Vigilada Mineducación

ACTA DE GRADO INDIVIDUAL

Código de verificación: **AZHTQ44BFFJ5HJO8SFES**

El suscrito Director del Departamento de Registro, hace constar que en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, a los 28 días del mes de agosto de 2020, se llevó a cabo la ceremonia pública de graduación, en la cual la UNIVERSIDAD DEL NORTE autorizada para el efecto, según Decreto No. 263 del 22 de febrero de 1973 del Ministerio de Educación Nacional y previo juramento reglamentario, confirió el título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

a

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

Identificado(a) con CC 92.032.822 de Sincé, quién cumplió con los requisitos exigidos por la Universidad, según consta en el Acta No. 2020-18-C-211, título otorgado el 28 de agosto de 2020.

El presente certificado ha sido generado y firmado digitalmente. Puede validar la autenticidad de este documento en la página web www.uninorte.edu.co/registro, opción validar documentos con firma digital, usando el código de verificación ubicado en la parte superior.

JNIVERSIDAD DEL NORTE

En nombre de la REPUBLICA DE COLOMBIA y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto No. 263 del 22 de Febrero de 1973, representada por el Consejo Directivo y el Rector,

teniendo en cuenta que

LUIS EDUARDO UCROS SIERRA

CC No. 92.032.822 de Sincé

Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorga con todas las prerrogativas, obligaciones y derechos el título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Dado en Barranquilla, a los 28 días del mes de agosto de 2020

Alexandra Bolaño B.
Director de Especializaciones

A Merlano R.
Rector

Cristina Tornero D.
Secretario Académico

Personería Jurídica
Resolución No. 000396 del
7 de Junio de 1993

Acta No. 2020-18-C-211

Diploma firmado digitalmente. Para validar su autenticidad ingrese a www.uninorte.edu.co/registro, validar documentos con firma digital, y digite el código de verificación: B3Z6U37J6TM7M6XC6GTB

INGENIERO CIVIL

CERTIFICACIÒN AVANCE DE OBRA.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA JC.

CERTIFICA QUE:

El proyecto No. LP-002-2023, cuyo objetivo es, **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE." BPIN: 2023002700125,** *ha alcanzado un avance del 94,95 % en su ejecución física.*

Se anexa Balance físico firmado por el representante legal de interventoría.

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre; a los Veinte (20) días del mes De septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

R.L Interventoría De Obra.

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

CERTIFICACIÒN MEMORIAS DE CANTIDADES.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA JC.

CERTIFICA QUE:

Las memorias de cantidades correspondientes al proyecto No. LP-002-2023, cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE" BPIN: 2023002700125,** presentadas por **YUSNEIDI MARÍA OROZCO MÁRQUEZ,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.045.306.356**, en calidad de Representante Legal de **ARCA MEGAPROYECTOS SAS,** han sido revisadas y se encuentran conformes. Dichas memorias cumplen con los estándares requeridos y las normativas aplicables para la construcción y desarrollo del proyecto, lo que garantiza la correcta ejecución de las obras según los términos establecidos en el contrato.

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre; a los DIESISIETE (17) días del mes de septiembre 2024.

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

R.L Interventoría De Obra.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

PAGOS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU / PELINKU	SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	26/09/2024	80345599	$1.225.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	7.000	0		0		0	3	100	0	7.100	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	52.000	0		0		0	3	200	0	52.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.200	0		0		0	3	200	0	57.400	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	8.700	0		0		0	3	100	0	8.800	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	33.100	0		0		0	3	100	0	33.200	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	284.400	0	0	0	0	3	700	0	285.100	4
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	138.800	0	0	0	0	3	400	0	139.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	274.800				274.800	3	700	275.500			2.748	275.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	158.000	3	400	158.400	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	26/09/2024	80345599	$1.225.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	158.000	158.700
Pensión	3	631.200	632.800
Riesgos Laborales	1	274.800	275.500
CCF	1	158.000	158.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.222.000	1.225.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	26/09/2024	80345599	$1.225.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005418712	BEJARANO SIERRA ANGIE MILETH	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	92097252	HERNANDEZ HERAZO JUAN CARLOS	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1005424804	GALE JIMENEZ KEVIN ANDRES	1	0			S	X	X														25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
4	CC	1005425906	DIAZ ANAYA DANIEL ALBERTO	1	0			S	X	X														25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS048	216.667	8.700	14-23	216.667	5	15.100	CCF41	216.667	8.700	0	0	0	0	0
5	CC	1100550820	MARTINEZ NAVARRO JOSE DAVID	1	0			S	X	X														230301	173.334	27.800	0	0	0	0	CCFC33	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF41	173.334	7.000	0	0	0	0	0
6	CC	18858099	ARRIETA POLANCO YONIS ENRIQUE	1	0			S	X	X														230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
7	CC	92097880	SEVERICHE LARA DAVID ANTONIO	1	0			S	X	X														25-14	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
8	CC	92099037	MEJIA LOPEZ JAIME ALBERTO	1	0			S	X	X														230301	173.334	27.800	0	0	0	0	ESSC07	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF41	173.334	7.000	0	0	0	0	0
9	CC	92099291	MARTINEZ BARRAGAN DANIEL MESAD	1	0			S	X	X														25-14	173.334	27.800	0	0	0	0	ESSC07	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF41	173.334	7.000	0	0	0	0	0
10	CC	92099665	MARTINEZ SEVERICHE SALVADOR ELIAS	1	0			S	X	X														25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC07	216.667	8.700	14-23	216.667	5	15.100	CCF41	216.667	8.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	23/08/2024	79469185	$1.570.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	26.000	0		0		0	0	0	0	26.000	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	62.400	0		0		0	0	0	0	62.400	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	10.400	0		0		0	0	0	0	10.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.200	0		0		0	0	0	0	52.200	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	464.600	0	0	0	0	0	0		464.600	6
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	138.800	0	0	0	0	0	0		138.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	353.200				353.200	0	0	353.200			3.532	353.200	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	203.000	0	0	203.000	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU / PELINKU	SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	23/08/2024	79469185	$1.570.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	203.000	203.000
Pensión	3	811.400	811.400
Riesgos Laborales	1	353.200	353.200
CCF	1	203.000	203.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.570.600	1.570.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	23/08/2024	79469185	$1.570.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005418712	BEJARANO SIERRA ANGIE MILETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	92097880	SEVERICHE LARA DAVID ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
3	CC	92097252	HERNANDEZ HERAZO JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1100550820	MARTINEZ NAVARRO JOSE DAVID	1	0			S	X	X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	CCFC33	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF41	650.000	26.000	0	0	0	0	0
5	CC	92099291	MARTINEZ BARRAGAN DANIEL MESAD	1	0			S	X	X															25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	ESSC07	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF41	303.334	12.200	0	0	0	0	0
6	CC	92099665	MARTINEZ SEVERICHE SALVADOR ELIAS	1	0			S	X	X															25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	ESSC07	303.334	12.200	14-23	303.334	5	21.200	CCF41	303.334	12.200	0	0	0	0	0
7	CC	1005424805	GALE JIMENEZ KEVIN ANDRES	1	0			S	X	X															230301	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
8	CC	1005425906	DIAZ ANAYA DANIEL ALBERTO	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS048	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
9	CC	18858099	ARRIETA POLANCO YONIS ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
10	CC	92099037	MEJIA LOPEZ JAIME ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	173.334	27.800	0	0	0	0	ESSC07	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF41	173.334	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU / PELINKU	SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78753823	$1.342.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	15.600	0		0		0	0	0	0	15.600	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.200	0		0		0	0	0	0	57.200	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	12.200	0		0		0	0	0	0	12.200	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	332.800	0	0	0	0	0	0		332.800	5
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	152.600	0	0	0	0	0	0		152.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	301.900				301.900	0	0	301.900			3.019	301.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	173.400	0	0	173.400	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS		CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78753823	$1.342.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	173.400	173.400
Pensión	3	693.400	693.400
Riesgos Laborales	1	301.900	301.900
CCF	1	173.400	173.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.342.100	1.342.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474095-1	ARCA MEGAPROYECTOS SAS	CALLE 21 N 13BIS-22. APTO 301	2762763	yeissbarreto24@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PELINKU	PELINKU	SUCRE	SINCELEJO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	19/07/2024	78753823	$1.342.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005418712	BEJARANO SIERRA ANGIE MILETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1005424804	GALE JIMÉNEZ KEVIN ANDRÉS	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS048	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
3	CC	1100550820	MARTINEZ NAVARRO JOSE DAVID	1	0			S	X	X															230301	390.000	62.400	0	0	0	0	CCFC33	390.000	15.600	14-23	390.000	5	27.200	CCF41	390.000	15.600	0	0	0	0	0
4	CC	92097252	HERNANDEZ HERAZO JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF41	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	18858099	ARRIETA POLANCO YONIS ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
6	CC	92097880	SEVERICHE LARA DAVID ANTONIO	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
7	CC	92099037	MEJIA LOPEZ JAIME ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	5.200	14-23	130.000	5	9.100	CCF41	130.000	5.200	0	0	0	0	0
8	CC	92099291	MARTINEZ BARRAGAN DANIEL MESAD	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
9	CC	92099865	MARTINEZ SEVERICHE SALVADOR ELIAS	1	0			S	X	X															25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC07	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF41	260.000	10.400	0	0	0	0	0
10	CC	1005425906	DIAZ ANAYA DANIEL ALBERTO	1	0			S	X	X															25-14	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS048	173.334	7.000	14-23	173.334	5	12.100	CCF41	173.334	7.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INGENIERO CIVIL

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
RIONEGRO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3907877-7		15988358
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	201194	2655	01215988358

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9014740951	ARCA MEGAPROYECTOS SAS		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CR 38 # 22 - 03 BRR FLORENCIA		SINCELEJO	

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9014740951	ARCA MEGAPROYECTOS SAS

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8230024119	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE INDERSUCRE

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-JUN-2024	17-OCT-2024	121.821.364,70	26.659,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17-OCT-2024	17-OCT-2029	121.821.364,70	69.663,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-JUN-2024	18-JUL-2027	121.821.364,70	63.803,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
18-JUN-2024	17-OCT-2029	1856	17-SEP-2024	17-OCT-2029	$160.125	$30.424	$190.549

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$18.988.661	$816.203	$365.464.094,10

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2655	1001009	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
201194	DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	INDEPENDIENTES	100,00	160.125

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

NRO. DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA N° LP-002-2023.
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
RIONEGRO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0960219-4	01314035728

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	201194	2655	14035728

TOMADOR ARCA MEGAPROYECTOS SAS	NIT 9014740951
ASEGURADO ARCA MEGAPROYECTOS SAS	NIT 9014740951
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 38 # 22 - 03 BRR FLORENCIA	SINCELEJO	

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 38 # 22 3	SINCELEJO	SUCRE	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN	9 - 15
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	260.000.000,00	0,00	0	44.164	8.391	52.555

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
17-SEP-2024	18-OCT-2024	31	$44.164	$8.391	$52.555

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
18-JUN-2024	18-OCT-2024	1	$260.000.000,00	$0,00	$260.000.000,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

101 - NEGOCIOS ESTATALES

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2655	1001009	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
201194	DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	44.164

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	NUMERO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

VIGILADA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 43 #54 139 L212 CC SAN NICO
RIONEGRO

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO		REFERENCIA DE PAGO
RIONEGRO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0960219-4		01314035728
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
DIANA PATRICIA VASQUEZ BARRERA	201194	2655	14035728

TOMADOR ARCA MEGAPROYECTOS SAS	NIT 9014740951
ASEGURADO ARCA MEGAPROYECTOS SAS	NIT 9014740951
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CR 38 # 22 - 03 BRR FLORENCIA	SINCELEJO	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003907877. NO. DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA N? LP-002-2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 260,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
NRO. DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA N° LP-002-2023.
MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 43 #54 139 L212 CC SAN NICO
RIONEGRO

INGENIERO CIVIL

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.23 08:44:50 -05:00

Código de Seguridad: R1DFR6mrmQv51GlSo3ViLw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100018621	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	350043121	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	17/09/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/05/2024	24:00 Horas Del	15/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE	**No. DOC. IDENTIDAD**	1.103.100.955
DIRECCIÓN	SINCELEJO	**TELÉFONO**	3127565465
ASEGURADO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN	**No. DOC. IDENTIDAD**	823.002.411-9
DIRECCIÓN	CALLE 14 N. 17A-202, LA FORD SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO**	2805700
BENEFICIARIO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN	**No. DOC. IDENTIDAD**	823.002.411-9
DIRECCIÓN	CALLE 14 N. 17A-202, LA FORD SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO**	2805700

OBJETO DE CONTRATO

DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N0. 1 DE PRORROGA AL CONTRATO IDDRS-CMS-001-2024 SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN MES MAS, MODIFICANDO ASI LA PRESENTE POLIZA .
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDDRS-CMA-001-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERAPARA EL PROYECTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE
NOTA: LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARAN CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/06/2024	24:00 Horas Del 20/04/2025	8.527.861,50	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/06/2024	24:00 Horas Del 20/10/2027	4.263.930,75	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/08/2024	24:00 Horas Del 15/09/2029	8.527.861,50	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.319.653,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100018621	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	350043121	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/05/2024	24:00 Horas Del	15/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100018621** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN / INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN** , expedida por la Compañía en **17/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **23** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	350043121

Fecha de Facturación	17/09/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CRC–100018621
Periodo Facturado	19/05/2024 — 15/09/2029

Fecha Límite de Pago	17/10/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	20.000,01
IVA	3.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	23.800,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE
SINCELEJO	1103100955
Intermediario	JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **17/10/2024** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endoselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	350043121

Fecha de Facturación	17/09/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CRC–100018621
Periodo Facturado	19/05/2024 — 15/09/2029

Fecha Límite de Pago	17/10/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	20.000,01
IVA	3.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	23.800,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE
SINCELEJO	1103100955
Intermediario	JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000350043121(3900)000000023800(96)20241017

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229903500431 21(3900)000000023800(96)20241017

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 09:49:22 -05:00

Código de Seguridad: H/Wdt+DGzuGEBIMBE+rTFg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100018621	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350040375	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/05/2024	24:00 Horas Del	15/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE	**No. DOC. IDENTIDAD**	1.103.100.955
DIRECCIÓN	SINCELEJO	**TELÉFONO**	3127565465
ASEGURADO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN	**No. DOC. IDENTIDAD**	823.002.411-9
DIRECCIÓN	CALLE 14 N. 17A-202, LA FORD SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO**	2805700
BENEFICIARIO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN	**No. DOC. IDENTIDAD**	823.002.411-9
DIRECCIÓN	CALLE 14 N. 17A-202, LA FORD SINCELEJO, SUCRE	**TELÉFONO**	2805700

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADAN LA VIGENCIAS DE INICIO DE LA POLIZA ARRIBA EN MENCION DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO.
SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE INICIO DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE RECIBO FINAL
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN IGUAL, SIN MODIFICACION.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.IDDRS-CMA-001-2024 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERAPARA EL PROYECTO : MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/06/2024	24:00 Horas Del 20/03/2025	8.527.861,50	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/06/2024	24:00 Horas Del 20/09/2027	4.263.930,75	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 15/08/2024	24:00 Horas Del 15/09/2029	8.527.861,50	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.319.653,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	3.800,00
TOTAL A PAGAR	$	23.800,01

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/08/2029

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100018621	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	350040375	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/05/2024	24:00 Horas Del	15/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: LAS VIGENCIAS DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SE ACTUALIZARAN CON EL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100018621** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN / INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE IN** , expedida por la Compañía en **08/07/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **08** días del mes **JULIO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	350040375

Fecha de Facturación	08/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CRC-100018621
Periodo Facturado	19/05/2024 — 15/09/2029

Fecha Límite de Pago	07/08/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	20.000,01
IVA	3.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	23.800,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE
SINCELEJO	1103100955
Intermediario	JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **07/08/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	350040375

Fecha de Facturación	08/07/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CRC-100018621
Periodo Facturado	19/05/2024 — 15/09/2029

Fecha Límite de Pago	07/08/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	20.000,01
IVA	3.800,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	23.800,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CARRASQUILLA MONTERROZA, JOSE
SINCELEJO	1103100955
Intermediario	JESSE DEL PILAR VIDUAL SALAZAR

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000350040375(3900)000000023800(96)20240807

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990350040375(3900)000000023800(96)20240807

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

INGENIERO CIVIL

ACTA PARCIAL #3

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

CONTRATO DE OBRA: LP-002-2023		OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINEU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE																				FECHA DE ELAVORACIÓN		17/09/2024				
ACTA PARCIAL N° 3-		PERÍODO DEL	21/08/2024		HASTA	17/09/2024		SUPERVISOR		ALEX GIL COVILLA			P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS																	
CONTRATISTA		ARCA MEGA PROYECTOS SAS			NIT. 901474095-1	REPRESENTANTE LEGAL			TUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ				C.C. 1.046.304.354		VALOR CONTRATO INICIAL	$1,154,918,106.00	VALOR ADICIONAL	$63,295,841.00	VALOR TOTAL	$1,218,213,647.00								
CANTIDADES CONTRACTUALES						CANTIDADES ADICIONALES			ACUMULADO CTA 01 OBRAS EJECUTADAS			ACUMULADO ACTA 02 OBRAS EJECUTADAS			PRESENTE ACTA 03 OBRAS EJECUTADAS			EJECUCIÓN TOTAL											
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL	"+/-"	CANT	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	%									
1	PRELIMINARES																												
1.1	Limpieza manual de maleza y desmonte de materia organico zona peimetral	M2	520.00	$ 16,236.00	$ 8,442,720.00	+	445.00	$ 7,225,020.00	510.00	$ 16,236.00	$ 8,280,360.00		$ 16,236.00	$ -	455.00	$ 16,236.00	$ 7,387,380.00	965.00	$ 15,667,740.00	100%									
1.2	Desmonte de alambre de pua en mal estado en cerramiento sustente	ML	520.00	$ 9,557.00	$ 4,969,640.00			$ -	510.00	$ 9,557.00	$ 4,874,070.00	10.00	$ 9,557.00	$ 95,570.00		$ 9,557.00	$ -	520.00	$ 4,969,640.00	100%									
1.3	Demolición de plantilla existente	M2	51.00	$ 21,498.00	$ 1,096,398.00			$ -	46.00	$ 21,498.00	$ 1,001,904.00	3.00	$ 21,498.00	$ 64,494.00		$ 21,498.00	$ -	51.00	$ 1,096,398.00	100%									
1.4	Rocería de área externa de cuerpos de agua	M2	1,800.00	$ 10,555.00	$ 18,999,000.00	+	680.00	$ 7,177,401.00	1,710.00	$ 10,555.00	$ 18,049,650.00		$ 10,555.00	$ -	402.93	$ 10,555.00	$ 4,252,929.00	2,112.93	$ 22,301,979.00	65%									
1.5	Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua	M2	1,670.00	$ 10,555.00	$ 17,626,850.00			$ -	1600.00	$ 10,555.00	$ 16,888,000.00	70.00	$ 10,555.00	$ 738,850.00		$ 10,555.00	$ -	1,670.00	$ 17,626,850.00	100%									
1.6	Retiro de materia sobrante, de excavación, demolición y limpieza.	M3	175.00	$ 39,799.00	$ 6,964,825.00			$ -	148.75	$ 39,799.00	$ 5,920,101.00	13.13	$ 39,799.00	$ 522,363.00	13.13	$ 39,799.00	$ 522,486.00	175.00	$ 6,964,949.00	100%									
	SUBTOTAL				$ 58,099,433.00			$ 14,402,421.00			$ 55,043,485.00			$ 1,421,276.00			$ 12,162,795.00		$ 68,627,586.00	95%									
2.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																												
	INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACOMETIDA, ALIMENTADORES Y CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN EN BAJA TENSIÓN																												
2.1	Suministro e instalación de Acometida principal desde punto de conexión 0.4kv de baja transformador existente hasta Gab. Ppal en 2x1x6 2(6F+1x6s.2(6N+1x6s.4T Aluminio 58000	ML	25.0	$ 92,656.00	$ 2,316,400.00	+	140.00	$ 12,971,840.00	0.0	$ 92,656.00	$ -		$ 92,656.00	$ -	165.00	$ 92,656.00	$ 15,288,240.00	165.00	$ 15,288,240.00	100%									
2.02	Suministro e instalación de Bajante acometida en tubería emc 2", incluye capacete y cinta de acero inoxidable	UN	1.0	$ 1,132,665.00	$ 1,132,665.00			$ -	0.0	$ 1,132,665.00	$ -		$ 1,132,665.00	$ -	1.00	$ 1,132,665.00	$ 1,132,665.00	1.00	$ 1,132,665.00	100%									
2.03	Suministro e instalación de Canalización subterránea acometida en tubería PVC 2"	ML	25.0	$ 46,447.00	$ 1,161,175.00			$ -	23.00	$ 46,447.00	$ 1,068,281.00	2.00	$ 46,447.00	$ 92,894.00				25.00	$ 1,161,175.00	100%									
2.04	Construcción de caja de Registro de inspección 0.8x0.8x0.7 mts con marco y borde tapa metálico	UN	2.0	$ 1,079,943.00	$ 2,159,886.00			$ -	2.0	$ 1,079,943.00	$ 2,159,886.00		$ 1,079,943.00	$ -				2.00	$ 2,159,886.00	100%									
2.05	Construcción de caja de Registro de inspección 0.4x0.6x0.7 mts con marco y borde tapa metálico	UN	2.0	$ 854,557.00	$ 1,709,114.00			$ -	2.0	$ 854,557.00	$ 1,709,114.00		$ 854,557.00	$ -				2.00	$ 1,709,114.00	100%									
2.06	Construcción Registro de inspección de 0.4x0.4x0.4 m con marco y borde tapa metálicos	UN	47.0	$ 633,142.00	$ 29,757,674.00			$ -	35.00	$ 620,142.00	$ 22,159,970.00	12.00	$ 633,142.00	$ 7,597,704.00				47.00	$ 29,757,674.00	100%									
2.07	Suministro e instalación de Gabinete Principal GAB PPAL tipo exterior con breakers industriales para alimentadores y control de iluminación, acorde a diagrama Unifilar, incluye DPS	UN	1.0	$ 20,250,207.00	$ 20,250,207.00			$ -	0	$ 20,250,207.00	$ -		$ 20,250,207.00	$ -	1.00	$ 20,250,207.00	$ 20,250,207.00	1.00	$ 20,250,207.00	100%									
2.08	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4" canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD1	ML	45.0	$ 31,645.00	$ 1,424,025.00			$ -	43.00	$ 31,645.00	$ 1,360,735.00	2.00	$ 31,645.01	$ 63,290.00		$ 31,645.00	$ -	45.00	$ 1,424,025.00	100%									
2.09	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4" canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2	ML	124.0	$ 31,645.00	$ 3,923,980.00			$ -	110.00	$ 31,645.00	$ 3,480,950.00	14.00	$ 31,645.00	$ 443,030.00		$ 31,645.00	$ -	124.00	$ 3,923,980.00	100%									
2.10	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1 1/4" canalización subterránea ramales de iluminación	ML	662.0	$ 31,645.00	$ 20,948,990.00			$ -	615.00	$ 31,645.00	$ 19,461,675.00	47.00	$ 31,645.00	$ 1,487,315.00		$ 31,645.00	$ -	662.00	$ 20,948,990.00	100%									
2.11	Suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1x6s.4T Aluminio 58000	ML	45.0	$ 50,651.00	$ 2,279,295.00			$ -	0	$ 50,651.00	$ -	35.00	$ 50,651.00	$ 1,772,785.00	10.00	$ 50,651.00	$ 506,510.00	45.00	$ 2,279,295.00	100%									
2.12	Suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1x6s.4T Aluminio 58000	ML	124.0	$ 50,651.00	$ 6,280,724.00			$ -	0	$ 50,651.00	$ -	100.00	$ 50,651.00	$ 5,065,100.00	24.00	$ 50,651.00	$ 1,215,624.00	124.00	$ 6,280,724.00	100%									
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CIRCUITOS RAMALES INTERNOS)																												
2.13	Suministro e instalación de ramales de iluminación desde Tablero de iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1x6s.4T Aluminio 58000. Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación	ML	662.0	$ 40,441.00	$ 26,771,942.00			$ -	615.0	$ 40,441.00	$ 24,871,215.00	47.0	$ 40,441.00	$ 1,900,727.00				662.00	$ 26,771,942.00	100%									
2.14	Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto	UN	49.00	$ 2,627,794.00	$ 128,761,906.00			$ -	35.00	$ 2,627,794.00	$ 91,972,790.00	14.00	$ 2,627,794.00	$ 36,789,116.00				49.00	$ 128,761,906.00	100%									
2.15	Suministro e instalación de poste metálico de A.P. Certificado 10 metros con soporte para tres proyectores, incluye pedestal en concreto	UN	4.00	$ 4,751,532.00	$ 19,006,128.00			$ -	2.00	$ 4,751,532.00	$ 9,503,064.00	2.00	$ 4,751,532.00	$ 9,503,064.00				4.00	$ 19,006,128.00	100%									
2.16	Suministro e instalación de salida para luminaria sed soporte vertical de 40w	UN	49.00	$ 433,177.00	$ 21,225,673.00			$ -	38.00	$ 433,177.00	$ 16,460,726.00	11.00	$ 433,177.00	$ 4,764,947.00				49.00	$ 21,225,673.00	100%									

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

CONTRATO DE OBRA: LP-002-2023		OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE																				FECHA DE ELAVORACIÓN		17/09/2024				
ACTA PARCIAL N° 3-		PERÍODO DEL:	21/08/2024		HASTA	17/09/2024		SUPERVISOR		ALEX GIL COVILLA			P.U. 4. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS																	
CONTRATISTA		ABCA MEGA PROYECTOS SAS			NIT. 901474095-1	REPRESENTANTE LEGAL			YUBENDY MARIA OROZCO MARQUEZ				C.C. 1.045.806.354		VALOR CONTRATO INICIAL:	$1.164.918.106,00	VALOR ADICIONAL:	$63.298.841,00	VALOR TOTAL	$1.218.213.647,00								
CANTIDADES CONTRACTUALES						CANTIDADES ADICIONALES			ACUMULADO CTA 01 OBRAS EJECUTADAS				ACUMULADO ACTA 02 OBRAS EJECUTADAS				PRESENTE ACTA 03 OBRAS EJECUTADAS				EJECUCIÓN TOTAL								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL	"+/-"	CANT	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		CANT	VR. PARCIAL	%							
2.17	Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores	UN	4,00	$ 502.196,00	$ 2.008.784,00			$ -	3,00	$ 502.196,00	$ 1.506.588,00		1,00	$ 502.196,00	$ 502.196,00						4,00	$ 2.008.784,00	100%							
2.18	Suministro e instalación de proyector led 200w, color o kit fabrica	UN	4,00	$ 597.678,00	$ 2.390.712,00			$ -	3,00	$ 597.678,00	$ 1.793.034,00		1,00	$ 597.678,00	$ 597.678,00						4,00	$ 2.390.712,00	100%							
2.19	Suministro e instalación de luminaria led soporte vertical de 40w de onda o abierto lumínico	UN	49,00	$ 1.846.819,00	$ 90.494.131,00			$ -	25,00	$ 1.846.819,00	$ 46.170.475,00		24,00	$ 1.846.819,00	$ 44.323.656,00						49,00	$ 90.494.131,00	100%							
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS (ILUMINACIÓN, TOMAS Y ESPECIALES)																												
2.20	Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3x#10.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2" accesorios y demás elementos de fijación	UN	22,00	$ 187.504,00	$ 4.125.088,00			$ -	0	$ 187.504,00	$ -		14,00	$ 187.504,00	$ 2.625.056,00		8,00	$ 187.504,00	$ 1.500.032,00		22,00	$ 4.125.088,00	100%							
2.21	Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3x#10.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2" accesorios y demás elementos de fijación	UN	4,00	$ 266.175,00	$ 1.064.700,00			$ -	0	$ 266.175,00	$ -		2,00	$ 266.175,00	$ 532.350,00		2,00	$ 266.175,00	$ 532.350,00		4,00	$ 1.064.700,00	100%							
2.22	Suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y aviso) en conductor 3x#10.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2" accesorios y demás elementos de fijación	UN	77,00	$ 171.019,00	$ 13.168.463,00			$ -	0	$ 171.019,00	$ -		40,00	$ 171.019,00	$ 6.840.760,00		37,00	$ 171.019,00	$ 6.327.703,00		77,00	$ 13.168.463,00	100%							
2.23	Suministro e instalación switch o interruptor manual sencillo de encendido iluminación en conductor 3x#10.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2" accesorios y demás elementos de fijación	UN	6,00	$ 133.316,00	$ 799.896,00			$ -	0	$ 133.316,00	$ -		2,00	$ 133.316,00	$ 266.632,00		4,00	$ 133.316,00	$ 533.264,00		6,00	$ 799.896,00	100%							
2.24	Suministro e instalación switch o interruptor manual doble de encendido iluminación en conductor 3x#10.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	UN	7,00	$ 153.611,00	$ 1.075.277,00			$ -	0	$ 153.611,00	$ -		2,00	$ 153.611,00	$ 307.222,00		5,00	$ 153.611,00	$ 768.055,00		7,00	$ 1.075.277,00	100%							
2.25	Suministro e instalación de Tablero trifásico 12 circuitos, incluye sus protecciones	UN	2,00	$ 813.927,00	$ 1.627.854,00			$ -	0	$ 813.927,00	$ -		1,00	$ 813.927,00	$ 813.927,00		1,00	$ 813.927,00	$ 813.927,00		2,00	$ 1.627.854,00	100%							
2.26	Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar	UN	18,00	$ 68.844,00	$ 1.239.192,00			$ -	0	$ 68.844,00	$ -		6,00	$ 68.844,00	$ 413.064,00		12,00	$ 68.844,00	$ 826.128,00		18,00	$ 1.239.192,00	100%							
2.27	Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar	UN	13,00	$ 73.101,00	$ 950.313,00			$ -	0	$ 73.101,00	$ -		4,00	$ 73.101,00	$ 292.404,00		9,00	$ 73.101,00	$ 657.909,00		13,00	$ 950.313,00	100%							
2.28	Suministro e instalación de ventiladores de techo	UN	11,00	$ 509.286,00	$ 5.602.146,00			$ -	0	$ 509.286,00	$ -		5,00	$ 509.286,00	$ 2.546.430,00		6,00	$ 509.286,00	$ 3.055.716,00		11,00	$ 5.602.146,00	100%							
2.29	Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w	UN	12,00	$ 262.318,00	$ 3.147.816,00			$ -	0	$ 262.318,00	$ -		4,00	$ 262.318,00	$ 1.049.272,00		8,00	$ 262.318,00	$ 2.098.544,00		12,00	$ 3.147.816,00	100%							
2.30	Suministro e instalación de lámpara led emergencia tipo mickey mouse	UN	15,00	$ 209.849,00	$ 3.147.735,00			$ -	0	$ 209.849,00	$ -		5,00	$ 209.849,00	$ 1.049.245,00		10,00	$ 209.849,00	$ 2.098.490,00		15,00	$ 3.147.735,00	100%							
2.31	Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	UN	7,00	$ 228.040,00	$ 1.596.280,00			$ -	5,00	$ 228.040,00	$ 1.140.200,00			$ 228.040,00	$ -		2,00	$ 228.040,00	$ 456.080,00		7,00	$ 1.596.280,00	100%							
2.32	Suministro e instalación de salida para lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en bisco, con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	UN	12,00	$ 383.541,00	$ 4.602.492,00			$ -	10,00	$ 383.541,00	$ 3.835.410,00			$ 383.541,00	$ -		2,00	$ 383.541,00	$ 767.082,00		12,00	$ 4.602.492,00	100%							
2.33	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado incluye suministro aire 18000 btu	UN	1,00	$ 3.716.772,00	$ 3.716.772,00			$ -	0	$ 3.716.772,00	$ -			$ 3.716.772,00	$ -		1,00	$ 3.716.772,00	$ 3.716.772,00		1,00	$ 3.716.772,00	100%							
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA																												
2.34	Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo # 1/0 a 0.5 mts de profundidad, conductor de malla a tierra	ML	25,00	$ 72.937,00	$ 1.823.425,00			$ -	0	$ 72.937,00	$ -		25,00	$ 72.937,00	$ 1.823.425,00			$ 72.937,00	$ -		25,00	$ 1.823.425,00	100%							
2.35	Construcción Registro de inspección de 0.4x0.4x0.6 m con marco y tapa de tipo metálico	UN	1,00	$ 633.142,00	$ 633.142,00			$ -	0	$ 633.142,00	$ -		1,00	$ 633.142,00	$ 633.142,00			$ 633.142,00	$ -		1,00	$ 633.142,00	100%							
2.36	Suministro e instalación de varilla coppperweld 5/8"X2.4 mts	UN	4,00	$ 350.053,00	$ 1.400.212,00			$ -	0	$ 350.053,00	$ -		4,00	$ 350.053,00	$ 1.400.212,00			$ 350.053,00	$ -		4,00	$ 1.400.212,00	100%							
2.37	Suministro e instalación de soldadura exotérmica 115 g para 2Ft	UN	5,00	$ 83.689,00	$ 418.445,00			$ -	0	$ 83.689,00	$ -		5,00	$ 83.689,00	$ 418.445,00			$ 83.689,00	$ -		5,00	$ 418.445,00	100%							
	SUBTOTAL				$ 434.142.659,00			$ 12.971.840,00			$ 248.654.113,00				$ 135.915.088,00				$ 62.565.298,00			$ 447.114.499,00	100%							
3	**ACABADOS**																												
3.1	Pintura vinilo muros (3 manos)	M2	1.425,00	$ 21.464	$ 30.475.880,00			$ -	0	$ 21.464,00	$ -		420,00	$ 21.464,00	$ 9.014.880,00		420,00	$ 21.464,00	$ 9.014.880,00		840,00	$ 18.029.760,00	59%							
3.2	Mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura anticorrosivo	UND	8,00	$ 242.732	$ 1.941.856,00			$ -	0	$ 242.732,00	$ -			$ 242.732,00	$ -		8,00	$ 242.732,00	$ 1.941.856,00		8,00	$ 1.941.856,00	100%							
3.3	Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cielos y cerrería metálicas, incluye desmonte y reinstalación	M2	339,21	$ 60.859	$ 20.643.677,00			$ -	222,65	$ 60.859,00	$ 13.562.428,00		116,56	$ 60.859,00	$ 7.081.555,00						339,21	$ 20.643.961,00	100%							
3.4	Suministro e instalación de cielo raso en Drywall	M2	101,91	$ 91.598	$ 9.334.294,00			$ -	0	$ 91.598,00	$ -			$ 91.598,00	$ -		71,34	$ 91.598,00	$ 6.534.327,00		71,34	$ 6.534.327,00	70%							
3.5	Mantenimiento de fachada existente en SUPERBOARD	ML	18,00	$ 170.635	$ 3.071.430,00			$ -	0	$ 170.635,00	$ -			$ 170.635,00	$ -		9,00	$ 170.635,00	$ 1.535.715,00		9,00	$ 1.535.715,00	50%							
3.6	Pintura acrílica de marcación continua para bordillo (línea peatonal) ancho 15 cm, altura 15 cm)	ML	1.264,00	$ 14.688,00	$ 18.565.632,00	+	300,00	$ 4.406.400,00	0	$ 14.688,00	$ -			$ 14.688,00	$ -		864,00	$ 14.688,00	$ 12.690.432,00		864,00	$ 12.690.432,00	53%							
3.7	Pintura acrílica de demarcación	M2	117,30	$ 26.255,00	$ 3.079.712,00			$ -	0	$ 26.255,00	$ -			$ 26.255,00	$ -		117,30	$ 26.255,00	$ 3.079.712,00		117,30	$ 3.079.712,00	100%							
3.8	Suministro e instalación de ventanas en aluminio	M2	12,60	$ 638.537,00	$ 8.045.566,00			$ -	0	$ 638.537,00	$ -			$ 638.537,00	$ -			$ 638.537,00	$ -			$ -	0%							
3.9	Suministro e instalación de baranda en tubería galvanizada 2" incluye pintura	ML	16,00	$ 271.249,00	$ 4.339.984,00			$ -	0	$ 271.249,00	$ -			$ 271.249,00	$ -		16,00	$ 271.249,00	$ 4.339.984,00		16,00	$ 4.339.984,00	100%							
3.10	Mantenimiento de baranda existente de 2"	ML	16,60	$ 99.912,00	$ 1.658.539,00			$ -	0	$ 99.912,00	$ -			$ 99.912,00	$ -		16,60	$ 99.912,00	$ 1.658.539,00		16,60	$ 1.658.539,00	100%							

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

CONTRATO DE OBRA. LP-002-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.																									FECHA DE ELAVORACIÓN	17/09/2024	
ACTA PARCIAL Nº 3-	PERÍODO DEL	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA						F.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS																		
CONTRATISTA:	ARCA MEGA PROYECTOS SAS		NIT. 901474095-1	REPRESENTANTE LEGAL		YUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ				C.C. 1.045.804.554		VALOR CONTRATO INICIAL	$1,164,918,106.00	VALOR ADICIONAL	$63,295,841.00	VALOR TOTAL	$1,218,213,847.00											
CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES ADICIONALES			ACUMULADO CTA 01 OBRAS EJECUTADAS			ACUMULADO ACTA 02 OBRAS EJECUTADAS			PRESENTE ACTA 03 OBRAS EJECUTADAS			EJECUCIÓN TOTAL												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL	"+/-"	CANT	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	%									
	SUBTOTAL				$ 101,159,570.00			$ 4,406,400.00		$ -	$ 13,562,428.00			$ 16,096,433.00			$ 40,795,445.00												
4	ELEMENTOS URBANOS PREFABRICADOS																												
4.1	Suministro e instalación de Adoquín de cemento Seccion: 0.20x0.10 metros Color: Gris. Incluye material de base	M2	206.00	$ 183,472.00	$ 37,795,232.00	+	75.00	$ 13,760,400.00	202.00	$ 183,472.00	$ 37,061,344.00		$ 183,472.00	$ -	79.90	$ 183,472.00	$ 14,494,288.00	265.00	$ 51,555,632.00	100%									
	SUBTOTAL				$ 37,795,232.00			$ 13,760,400.00			$ 37,061,344.00			$ -			$ 14,494,288.00		$ 51,555,632.00	100%									
5	MOBILIARIO URBANO																												
5.1	Caneca de basura en acero inoxidable. Color: Natural. Incluye instalación 75 Lts	UND	6.00	$ 1,725,579.00	$ 10,353,474.00			$ -	0	$ 1,725,579.00	$ -	6.00	$ 1,725,579.00	$ 10,353,474.00				6.00	$ 10,353,474.00	100%									
5.2	Suministro e instalación de banca en concreto Tipo MD06	UND	3.00	$ 2,518,753.00	$ 7,556,259.00			$ -	0	$ 2,518,753.00	$ -	3.00	$ 2,518,753.00	$ 7,556,259.00				3.00	$ 7,556,259.00	100%									
5.3	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Cefusa surf 002-PB	UND	1.00	$ 4,549,279.00	$ 4,549,279.00			$ -	0	$ 4,549,279.00	$ -	1.00	$ 4,549,279.00	$ 4,549,279.00				1.00	$ 4,549,279.00	100%									
5.4	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Pivot de Fuerza 002-PB	UND	1.00	$ 4,795,660.00	$ 4,795,660.00			$ -	0	$ 4,795,660.00	$ -	1.00	$ 4,795,660.00	$ 4,795,660.00				1.00	$ 4,795,660.00	100%									
5.5	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Pony 001-PB	UND	1.00	$ 4,377,530.00	$ 4,377,530.00			$ -	0	$ 4,377,530.00	$ -	1.00	$ 4,377,530.00	$ 4,377,530.00				1.00	$ 4,377,530.00	100%									
5.6	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Caminador pierna 000-PB	UND	1.00	$ 4,880,675.00	$ 4,880,675.00			$ -	0	$ 4,880,675.00	$ -	1.00	$ 4,880,675.00	$ 4,880,675.00				1.00	$ 4,880,675.00	100%									
5.7	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Bicicleta 012-PB	UND	1.00	$ 5,717,511.00	$ 5,717,511.00			$ -	0	$ 5,717,511.00	$ -	1.00	$ 5,717,511.00	$ 5,717,511.00				1.00	$ 5,717,511.00	100%									
5.8	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Volante 013-PB	UND	1.00	$ 4,524,790.00	$ 4,524,790.00			$ -	0	$ 4,524,790.00	$ -	1.00	$ 4,524,790.00	$ 4,524,790.00				1.00	$ 4,524,790.00	100%									
5.9	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Bipirica 004-PB	UND	1.00	$ 4,672,050.00	$ 4,672,050.00			$ -	0	$ 4,672,050.00	$ -	1.00	$ 4,672,050.00	$ 4,672,050.00				1.00	$ 4,672,050.00	100%									
5.10	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Remo 007-PB	UND	1.00	$ 4,739,530.00	$ 4,739,530.00			$ -	0	$ 4,739,530.00	$ -	1.00	$ 4,739,530.00	$ 4,739,530.00				1.00	$ 4,739,530.00	100%									
5.11	Suministro e instalación de maquina - circuito - mayores Paredes 010-PB	UND	1.00	$ 3,873,297.00	$ 3,873,297.00			$ -	0	$ 3,873,297.00	$ -	1.00	$ 3,873,297.00	$ 3,873,297.00				1.00	$ 3,873,297.00	100%									
5.12	Suministro e instalación de parque infantil	UND	1.00	$ 28,500,000.00	$ 28,500,000.00			$ -	0	$ 28,500,000.00	$ -	1.00	$ 28,500,000.00	$ 28,500,000.00				1.00	$ 28,500,000.00	100%									
	SUBTOTAL				$ 88,540,055.00			$ -		$ -	$ -			$ 88,540,055.00					$ 88,540,055.00	100%									
6	CERRAMIENTO PERIMETRAL																												
6.1	Alambre de púa para cerramiento 8 hilera.	ML	228.71	$ 63,106.00	$ 14,432,973.00			$ -	225.71	$ 63,106.00	$ 14,243,655.00	3.00	$ 63,106.00	$ 189,318.00				228.71	$ 14,432,973.00	100%									
6.2	Cerramiento en malla eslabonada con marco en angulo segun especificación	M2	351.29	$ 165,473.00	$ 58,128,679.00			$ -	345.29	$ 165,473.00	$ 57,135,841.00	6.00	$ 165,473.00	$ 992,838.00				351.29	$ 58,128,679.00	100%									
6.3	Arbustos (limoncillo para cerca viva)	UND	1,170.96	$ 14,966.00	$ 17,524,587.00			$ -	624.80	$ 14,966.00	$ 9,350,757.00	546.80	$ 14,966.00	$ 8,183,469.00				1,171.60	$ 17,534,226.00	100%									
	SUBTOTAL				$ 90,086,239.00			$ -		$ -	$ 80,730,253.00			$ 9,365,625.00					$ 90,095,878.00	100%									
7	PROTECTURA PARQUE PELINKÚ																												
7.1	Suministro e instalación de grama natural (incluye 10 cm de tierra negra de esp)	M2	186.00	$ 15,442.00	$ 2,872,212.00			$ -	0	$ 15,442.00	$ -	93.00	$ 15,442.00	$ 1,436,106.00	93.00	$ 15,442.00	$ 1,436,106.00	186.00	$ 2,872,212.00	100%									
7.2	Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores	UND	120.00	$ 27,615.00	$ 3,313,800.00			$ -	0	$ 27,615.00	$ -	60.00	$ 27,615.00	$ 1,656,900.00	60.00	$ 27,615.00	$ 1,656,900.00	120.00	$ 3,313,800.00	100%									
7.3	Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajistico 1.5 mts x 2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 25 km). suministro y plantación	UND	25.00	$ 184,856.00	$ 4,621,400.00			$ -	0	$ 184,856.00	$ -		$ 184,856.00	$ -	17.00	$ 184,856.00	$ 3,142,552.00	17.00	$ 3,142,552.00	68%									
7.4	Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra q 10 cm esp	M3	58.78	$ 87,415.00	$ 5,137,904.00			$ -	0	$ 87,415.00	$ -	34.20	$ 87,415.00	$ 2,989,593.00	24.58	$ 87,415.00	$ 2,148,311.00	58.78	$ 5,137,904.00	100%									
	SUBTOTAL				$ 15,945,316.00			$ -		$ -	$ -			$ 6,082,599.00			$ 8,383,869.00		$ 14,466,468.00	91%									
8	PISOS																												
8.1	Limpieza de sendero peatonal en adoquín	M2	486.00	$ 12,719.00	$ 6,181,434.00			$ -	480.00	$ 12,719.00	$ 6,105,120.00	6.00	$ 12,719.00	$ 76,314.00				486.00	$ 6,181,434.00	100%									
8.2	Limpieza y mantenimiento de baloseo existente	M2	295.49	$ 14,636.00	$ 4,324,718.00			$ -	289.49	$ 14,636.00	$ 4,236,902.00	6.00	$ 14,636.00	$ 87,816.00				295.49	$ 4,324,718.00	100%									
8.3	Relleno con material seleccionado compactado a raiz 95% proctor modificado	M3	39.46	$ 98,636.00	$ 3,892,177.00	+	180.00	$ 17,754,480.00	33.46	$ 98,636.00	$ 3,300,361.00		$ 98,636.00	$ -	186.00	$ 98,636.00	$ 18,346,296.00	219.46	$ 21,646,657.00	100%									
8.4	Plantilla concreto 3000 psi e:0.10m incluye refuerzo	M2	117.30	$ 166,577.00	$ 19,539,462.00			$ -	51.00	$ 166,577.00	$ 8,495,427.00	66.30	$ 166,577.00	$ 11,043,885.00				117.30	$ 19,539,316.00	100%									
8.5	Concreto para viga cimiento ancden de 0.20 x 0.20m de 3000 psi incluye refuerzo 60000 psi (4 var 1/2" y ders de 3/8" cada 20cm)	ML	28.00	$ 139,216.00	$ 3,898,048.00			$ -	0	$ 139,216.00	$ -	28.00	$ 139,216.00	$ 3,898,048.00				28.00	$ 3,898,048.00	100%									
8.6	Suministro e instalación de estructura metalica para muelle en perfil en C 160x60 galvanizado calibre 14 incluye tuberia de soporte con platines, cimeta en tuberia cuadrada 2x1 galvanizado y pintura	M2	42.00	$ 711,419.00	$ 29,879,598.00			$ -	0.00	$ 711,419.00	$ -	42.00	$ 711,419.00	$ 29,879,598.00				42.00	$ 29,879,598.00	100%									
8.7	Suministro e instalación de estructura metalica para puente en perfil en C 160x60 encalgonado galvanizado calibre 14 incluye pintura	M2	65.00	$ 754,180.00	$ 49,021,700.00			$ -	44.00	$ 754,180.00	$ 33,183,920.00	21.00	$ 754,180.00	$ 15,837,780.00				65.00	$ 49,021,700.00	100%									
8.8	Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente. color terracota	M2	107.00	$ 720,911.00	$ 77,137,477.00			$ -	0	$ 720,911.00	$ -	69.55	$ 720,911.00	$ 50,139,360.00	37.45	$ 720,911.00	$ 26,998,117.00	107.00	$ 77,137,477.00	100%									
8.9	Suministro e instalación de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente. color terracota	ML	87.00	$ 604,356.00	$ 52,578,972.00			$ -	0	$ 604,356.00	$ -	56.55	$ 604,356.00	$ 34,176,332.00	30.45	$ 604,356.00	$ 18,402,640.00	87.00	$ 52,578,972.00	100%									
	SUBTOTAL				$ 246,453,606.00			$ 17,754,480.00		$ -	$ 55,321,730.00			$ 145,139,137.00			$ 63,747,053.00		$ 264,207,920.00	100%									
9	ADECUACION SALON MULTIPLE																												
9.1	Levante en bloque e:15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 para cerramiento	M2	59.52	$ 99,836.00	$ 5,942,239.00			$ -	23.52	$ 99,836.00	$ 2,348,175.00	24.00	$ 99,836.00	$ 2,394,064.00				59.52	$ 5,942,239.00	100%									
9.2	Pañete afinado 1:4 (e: 2 cm) para muros interiores y exteriores	M2	150.04	$ 36,117.00	$ 5,418,995.00			$ -	0.00	$ 36,117.00	$ -	150.04	$ 36,117.00	$ 5,418,995.00				150.04	$ 5,418,995.00	100%									
9.3	Estuco para muros interiores y exteriores del aula	M2	150.04	$ 23,324.00	$ 3,799,613.00			$ -	0	$ 25,324.00	$ -	75.00	$ 25,324.00	$ 1,899,300.00	35.04	$ 25,324.00	$ 887,353.00	110.04	$ 2,786,653.00	73%									

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

CONTRATO DE OBRA: LP 002-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PEUYEU EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE													FECHA DE ELAVORACION:	17/09/2024	
ACTA PARCIAL N° 3	PERIODO DEL	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR	ALEX GIL COVILLA		F.U. A. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS							VALOR TOTAL	$1,218,233,647.00	
CONTRATISTA:	ARCA MEGA PROYECTOS SAS	NIT: 9016740951	REPRESENTANTE LEGAL		YUSNEDY MARIA OROZCO MARQUEZ		C.C. 1.046.306.356	VALOR CONTRATO INICIAL	$1,184,918,106.00	VALOR ADICIONAL	$63,295,541.00						
CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES ADICIONALES		ACUMULADO CTA 01			ACUMULADO ACTA 02			PRESENTE ACTA 03			EJECUCION TOTAL		
							OBRAS EJECUTADAS			OBRAS EJECUTADAS			OBRAS EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR.PARCIAL	"+/-"	CANT	VALOR	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	%
3.4	[illegible]	M2	329.04	$ 21,464.00	$ 8,355,715.00			$ -	0	$ 21,464.00	$ -	200.00	$ 21,464.00	$ 4,292,800.00	80.04	$ 21,464.00	$ 1,717,379.00	280.04	$ 6,010,179.00	74%
3.5	[illegible]	M2	791.52	$ 91,598.00	$ 72,543,765.00			$ -	0	$ 91,598.00	$ -			$ -	120.52	$ 91,598.00	$ 11,040,327.00	120.52	$ 11,040,327.00	15%
3.6	[illegible]	M2	21.96	$ 675,661.00	$ 14,837,516.00			$ -	0	$ 675,661.00	$ -			$ -	21.96	$ 675,661.00	$ 14,837,516.00	21.96	$ 14,837,516.00	100%
3.7	[illegible]	M2	4.14	$ 675,724.00	$ 2,797,000.00			$ -	0	$ 675,724.00	$ -			$ -	4.14	$ 675,724.00	$ 2,797,000.00	4.14	$ 2,797,000.00	100%
3.8	[illegible]				$ 58,240,087.00			$ -			$ 5,846,175.00			$ 14,007,189.00			$ 31,046,399.00		$ 48,598,733.00	83%
	SUBTOTAL				$ 58,240,087.00			$ -			$ 493,919,628.00			$ 416,567,372.00			$ 233,174,148.00		$ 1,143,661,047.00	
	COSTO DIRECTO				$ 1,130,462,197.00			$ 63,295,541.00			$ 6,189,199.00			$ 4,615,628.00			$ 2,043,387.00		$ 13,048,114.00	95%
	FGIO			1.50%	$ 33,768,909.00			$ -												
	CERTIFICACIÓN RETIE				$ 4,800,000.00			$ -												
	CERTIFICACIÓN RETILAP				$ 4,200,000.00			$ -			$ 500,108,725.00			$ 421,382,900.00			$ 235,237,535.00		$ 1,156,729,161.00	94.99%
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 1,184,918,106.00			$ 63,295,541.00												
	VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE																$ 235,237,535.00			

Pago sometido a descuento por [illegible] Cuenta de Ahorros de Bancolombia No. [illegible]

YUSNEDY MARIA OROZCO MARQUEZ
ARCA MEGA PROYECTOS SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
COORDINADOR INTERVENTOR

ALEX GIL COVILLA
SUPERVISOR INDERSUCRE

Vº Bº SAMUEL ALVAREZ LEON
Director INDERSUCRE

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pagador	[illegible]	[illegible]	

ACTA PARCIAL No.3 DEL CONTRATO DE OBRA No IDDRS-LP-002-2023

CONDICIONES CONTRACRTUALES

Contrato No.	LP-002-2023					
Objeto:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.					
Contratista:	ARCA MEGAPROYECTOS SAS			NIT.	9014740951	
Representante Legal:	YUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ			C.C.	1.045.306.356	
Valor Inicial:	$1,154,918,106.00	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE.				
Valor Adicional:	$63.295,541.00	SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.				
Valor Actualizado:	$1,218,213,647.00	MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.				
Anticipo (%)	N/A					
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo adicional:		UN (1) MES	Plazo total:	CUARO (4) MESES
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	723	FECHA:	10/10/2023	CDP ADICIONAL	723	10/10/2023
N° De Registro Presupuestal - RP (Inicial)	324	FECHA:	29/04/2024	RP ADICIONAL	624	17/09/2024
Fecha acta de Inicio:	18/6/2024					
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024					
Fecha de Terminación Actualizada:	17/10/2024					

En el municipio de Sincelejo, a los veinte (17) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la sede principal del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE – INDERSUCRE**, los señores por parte del INDERSUCRE, como supervisor el arquitecto **ALEX FRANCISCO GIL COVILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No 92507076; calidad de Supervisor, y la señora **YUSNEIDI MARIA OROZCO MARQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.045.306.356, como representada legalmente del contratista **ARCA MEGA PROYECTOS SAS**, con NIT No 9014740951, y en su calidad de Interventor **JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.103.100.955, con el fin de

ACTA PARCIAL No.3 DEL CONTRATO DE OBRA No IDDRS-LP-002-2023

Que, de acuerdo al cuadro anexo de avance de cantidades de obra ejecutadas a la fecha, el contratista solicita y el interventor aprueba, el pago del **Acta Parcial de Obra No. 03**, con un porcentaje de **ejecución parcial del 15.16%**, equivalente a un valor de: **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. ($235,237,535.00)**, para un total acumulado del **94.95%.**

Para mayor constancia se firma el presente documento a los veinte (17) días del mes de septiembre de 2024.

ALEX GIL COVILLA
SUPERVISOR

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA
INTERVENTOR

YUSNEIDY OROZCO MARQUEZ
ARCA MEGAPROYECTO S.AS
CONTRATISTA

Reviso:	Jorge M. Diaz	Cargo: Arq. Deportes/Infraestructura Deportiva	Firma:
V°B°:	Samuel Álvarez León	Cargo: Director INDER-SUCRE	Firma:

Gobernación de Sucre


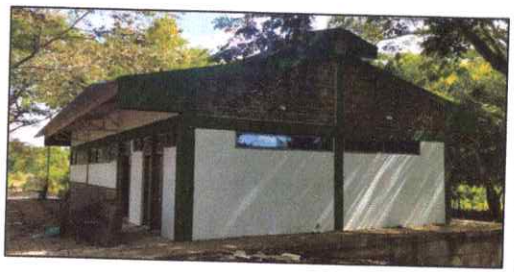
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

8.9	Suministro e instalacion de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota	 Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalacion de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalacion de pasamanos en polipropileno fibra natural + polimeros, resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 100%	
9	ADECUACION SALON MULTIPLE			
9.3	Estuco para muros interiores y exteriores del aula	 Se observa la ejecución de la actividad de Estuco para muros interiores y exteriores del aula . Ejecutado 73%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Estuco para muros interiores y exteriores del aula . Ejecutado 73%	
9.4	Pintura vinilo muros (3 manos)	 Se observa la ejecución de la actividad Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutado 74%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutado 74%	

Gobernación de Sucre

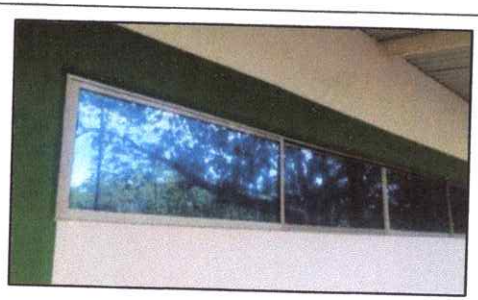
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

9.5	Suministro e intalacion de cielo raso en Drywall	 Se observa la ejecución de suministro e instalación de cielo raso en Drywall). Ejecutado 63%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución suministro e instalación de cielo raso en Drywall. Ejecutado 63%	
9.6	Suministro e instalacion de ventanas en aluminio	 Se observ la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de ventanas en aluminio Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación de ventanas en aluminio . Ejecutasdo 100%	
9.7	Suministro e instalacion de puerta de acceso en aluminio, incluye marco	  Se observ la ejecución Suministro e instalacion de puerta de acceso en aluminio, incluye marco o Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalacion de puerta de acceso en aluminio, incluye marco. Ejecutasdo 100%	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

ANOTACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA:

Se evidencia el cumplimiento del PGIO. Se cumple con la seguridad social del personal en obra. Se cumple con los registros fotograficos y videos. Se cumple con el seguimiento del cronograma de trabajo en obra. Se cumple con la bitácora diriamente. Se ejecutan lasdiferentes acticidades bajo el requerimiento técnico contractual.

GESTINOES AMBIENTALES POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

En el periodo de este informe, las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades, por lo cual las lluviasno no han causado mayor impacto en la ejecucióndne las actividades, sin embargo, por lo que las tareas se han llevado a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos. Cabe anotar que el contratista de obra tiene medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas si es del caso.

GESTIONES TECNICAS POREL CONTRATISTA DE OBRA:

•LIMPIEZA MANUAL DE MALEZA Y DESMONTE DE MATERIAL ORGANICO ZONA PERIMETRAL
•ROCERIA DEL ÁREA EXTERNA DE CUERPOS DE AGUA
•RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA.
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN BUJES DE BAJA TRANSFORMADOR EXISTENTE HASTA GAB. PPAL EN 2XNO.2/0F+1XNO.2/0N+1XNO.4T ALUMINIO S8000
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE ACOMETIDA EN TUBERÍA IMC 2", INCLUYE CAPACETE Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PRINCIPAL GAB PPAL TIPO EXTERIOR CON BREAKERS INDUSTRIALES PARA ALIMENTADORES Y CONTROL DE ILUMINACIÓN ACORDE A DIAGRAMA UNIFILAR, INCLUYE DPS
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE GAB PPAL A TD1 EN 2X#4F+1X#4N+1XNO.4T ALUMINIO S8000
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE GAB PPAL A TD2 EN 2X#4F+1X#4N+1XNO.4T ALUMINIO S8000
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EN CONDUCTOR 3XNO.12 LIBRE DE HALÓGENO, TUBERÍA PVC 1/2", ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN

•SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN CONDUCTOR 3XNO.12 LIBRE DE HALÓGENO, TUBERÍA PVC 1/2", ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN Y VENTILADORES (INCLUYE EMERGENCIA Y AVISOS) EN CONDUCTOR 3XNO.12 LIBRE DE HALÓGENO, TUBERÍA PVC SCH40 1/2", ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH O INTERRUPTOR MANUAL SENCILLO DE ENCENDIDO ILUMINACIÓN EN CONDUCTOR 3XNO.12 LIBRE DE HALÓGENO, TUBERÍA PVC SCH40 1/2", ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS D FIJACIÓN
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH O INTERRUPTOR MANUAL DOBLE DE ENCENDIDO ILUMINACIÓN EN CONDUCTOR 3XNO.12 LIBRE DE HALÓGENO, TUBERÍA PVC SCH40 1/2", ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO 12 CIRCUITOS, INCLUYE SUS PROTECCIONES
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 12W PARA INCRUSTAR
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 18W PARA INCRUSTAR
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18W
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED EMERGENCIA, TIPO MICKEY MOUSE
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SEÑALIZACIÓN SALIDA
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LÁMPARA LED TIPO TORTUGA 20W (INCLUYE LA LUMINARIA) EN KIOSCOS CON TUBERÍA EMT 3/4 Y ACCESORIOS GALVANIZADOS
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE SUMINISTRO AIRE 18000 BTU
•PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)
•MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS EXISTENTES INCLUYE PINTURA ATICORROSIVA
•SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL
•MANTENIMIENTO DE FACHADA EXISTENTE EN SUPERBOARD
•PINTURA ACRILICA DE MARCACION CONTINUA PARA BORDILLO (LINEA PERIMETRAL ANCHO 15 CM, ALTURA 15 CM)
•PINTURA ACRILICA DE DEMARCACIÓN

ANOTACIONES DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA:

1. Se evidencia el cumplimiento de Mantener al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores; 2. Se cumple con la presentación de comités de interventoría y obra en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad; 3.Se evidencia el cumplimiento de Llevar la bitácora, un eregistro fotográfico y de video. 4. Se Hace por parte de la interventoría la verificación de la situación actual antes del inicio de la obra; 5. Se evidencia el seguimiento en obra al cronograma de trabajo, anotando que el presente peíro se bajó un poco porcentaje programado, el cual se compensa con el período anterior, que estuvo por encima de lo programado, superando así el porcentaje programado de los ods períodes hasta el momento; 6. Se verifica por parte de la interventoría la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar para la ejecución de las obras; 7. Se verifica el cumplimiento de la ejecución de controles técnicos con el seguimiento, acompañamiento y vigilancia en la obra.

GESTIONES AMBIENTALES POR LA INTERVENTORIA:

En el periodo en el cual se está presentando este informe, se puede resaltar que las condiciones meteorológicas han ejercido un impacto moderado en el desarrollo y ejecución de las actividades dentro del proyecto, motivado al momento coyuntural que está viviendo el país en cuanto a la época de invierno, por lo cual las lluvias han sido veriadeas entre moderadeas e intensas en este periodo, sin embargo, todas las tareas planificadas se han llevado a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos relacionados con el clima. Lo anterior ha permitido que el proyecto avance sin mayores inconvenientes, independientemente de las condiciones atmosféricas que han prevalecido en este periodo, el contratista de obra tiene unas medidas de contingencia para manejar las condiciones climáticas.

GESTIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría dentro en cumplimiento de su contrato, prosigue con el seguimiento y control de todas las actividaes contractuales del contratista de Obra, el cual continuan con la ejecución de algunos de los ítems iniciados, los cuales se lleva al 100%, otros alcanzan un alto porcentaje y otros se incian avanzando un buen porcentaje, tal y como se muestra en el presente informe descrito por cada ítem, los que se acompañan de la evidencia fotográfica. Teniendo y considerando el informe de la interventoría correspondiente al presente perío, el supervisor anexa copia de dicho informe al presente.

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO:

Se realiza, por parte de la interventoría el análisis semanal del avance financiero de las obras , a fin de prever, con anticipación posibles necesidades de modificaciones del contrato.

CARÁCTER JURÍDICO:

GESTIÓN DE NO se requiere solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" INCLUYE PINTURA
•MANTENIMIENTO DE BARANDA EXISTENTE DE 2"
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN DE CEMENTO SECCION: 0,20X0,10 METROS COLOR: GRIS. INCLUYE MATERIAL DE BASE
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL. (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA DE ESP)
•SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES ZONAS VERDES EXTERIORES
•SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES Y FRUTALES TIPO PAISAJÍSTICO 1.5 M<H<2M (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR; TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN
•ADECUACIÓN DE TERRENO PARA ESPECIES VEGETALES CON TIERRA NEGRA A 10 CM ESP.
•RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO A RANA 95% PROCTOR MODIFICADO
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA PLASTICA WPC 70% POLIMERO 30% FIBRA NATURAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA MUELLE Y PUENTE, COLOR TERRACOTA
•SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN POLIPROPILENO FIBRA NATURAL + POLIMEROS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA MUELLE Y PUENTE, COLOR TERRACOTA
•ESTUCO PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL AULA
•PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)
•SUMINISTRO E INTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL
•SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO
•SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO

El porcentaje de ejecución del proyecto nos indica que hasta el día 17 de septiembre de 2024 es de un avance del 94.95% el cual se ve reflejado en las actividades ejecutadas según el presupuesto del contrato y cronograma de actividades.. A pesar de las variaciones climáticas que se han presentado durante este período, todas las tareas planificadas se llevaron a cabo según lo programado y con contratiempos mínimos relacionados con el clima.

GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERO:

Se realiza, conjuntamente con la interventoría el análisis semanal el avance financiero de las obras, a fin de prever, con anticipación eventuales necesidades de modificaciones del contrato.

GESTIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO: N/A

CONCLUSIONES.

Durante este periodo, se logró un avance considerable en la ejecución de las actividades contratadas, cumpliendo de manera efectiva con el cronograma previsto. La eficiente administración de los recursos y la buena coordinación del equipo de trabajo facilitaron un progreso fluido, poniendo especial énfasis en los detalles y en el cumplimiento de altos estándares de seguridad en todas las tareas ejecutadas. 2.3.

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA.

Durante este periodo, la interventoría tuvo el siguiente personal especialista, profesional y técnico.

CANTIDADCARGO

1- Director de interventoría
1- Ingeniero civil interventor
1- Profesional SISO
1- Secretaria

EVENTUALIDADES PRESENTADAS

A pesar quese han presentado fuertes lluvias, al la presente fecha no se han generado atrasos en la construccion y ejecución de los trabajo.

OBSERVACIONES

Se adjunta informe mensual No.3, del contratista de obra especificando las actividades ejecutadas y verificación mediante registros fotograficos, y acta numérica y literal de acta parcial No.3, correspondiente al período del 18 de junio al 17 de julio de 2024.

Se adjunta informemesual No.3 del contratista de interventoría, el cual especifica el control y vigilancia sobre las actividades ejecutadas en el período del 18 de junio al 17 de julio de 2024.

La supervisión ha reralizado varias visitas al sitio de las obras, con el fin de verificar la ejecución de las actividades contractuales.

En este período, se realizó el día 22 de agosto un comité técnico de obra con los contratista de Obra e Interventoría, con el fin de presentar, analizar y aprobar un acta de mayores y menores cantidades de obra, las cuales se requieren para dar un alcance del 100% a la ejecución del contrato. Actividaes que se aprobarón y se legarizarón el día 16 de septiembre del año corriente.

FIRMAS

ALEX GIL COVILLA

P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

Supervisor

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	Jorge M. Díaz Del Toro	Arquitecto Asesor infraestructura deportiva	
	Yaterin Chamorro	Ing. Asesor infraestructura deportiva	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del supervisor de escenarios deportivos del IMDER Sincelejo.

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (SEGÚN APLIQUE NORMATIVIDAD VIGENTE)

INGENIERO CIVIL

NIT 1103100955-2
EDIFICIO ANTIGUA CAJA AGRARIA OFICINA 601 - SINCELEJO
300 3397872 - 300 3397872
josecarrasquilla2107@gmail.com

29.804.876

Datos del Cliente (Adquiriente)

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE
NIT 823002411-9
SINCELEJO CL 14 CR CR 17 A 202 BRR LA FORD
2744995 2744995
indersucre@sucre.gov.co

Factura Electronica de Venta

JCFV4

Fecha 07/11/2024
Hora 3:56:46 p. m.
Vence 14/11/2024

No.	Codigo	Concepto	Cant	Valor Unitario	Dcto.	Tipo Impuesto	Impuesto	Valor Total
1	0105	ACTA PARCIAL 1 (94.95%) DEL CONTRATO CMA-001-2024 QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU	1	80.972.04	0		0	80.972.045

17 055.723 → 2224
34.111.446-2324
34.111.446 - 24-24

Observaciones

Forma de Pago

EF	$80.972.045
Recibido	$80.972.045
Cambio	$0

Subtotal	$80.972.045
Valor Exento	$80.972.045
TOTAL	$80.972.045

Representacion Grafica de Factura Electronica CUFE

08adddcd4ef020560883e9a58c8bd2c44dcd81dae96fc1692950a0a81d4c874e51dca365519b526b2ecc6a1c42b378ea

Resolucion 18764070129769 del 03/05/2024 Act. Eco. Tarifa ICA desde JCFV0001 hasta JCFV0050

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. (774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

Documento generado usando DynamiaERP
Desarrollado por: Dynamia Soluciones IT S.A.S - Nit. 900.302.344-1
www.dynamiaerp.co

Generado por Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 NIT:

Gobernación de Sucre

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
10/12/2024

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240077726

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	1103100955

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SUCRE - INDER	**NIT ENTIDAD CONTRATANTE:** 823002411
BASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 13.615.914	**NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN** IDDRS-CMA-001-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN: 10/12/2024	**FECHA VENCIMIENTO:** 24/12/2024

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	$408.500
PRO-CULTURA	2%	$272.300
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,50%	$204.200
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	$68.100
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$136.200
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	$204.200
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL	1,50%	$204.200
	TOTAL A PAGAR	**$1.497.700**

DAVIVIENDA CAJERO No. 10 H.H. 10 DIC. 2024 PROCESADO

(415)7709998557147(8020)020240401512(3900)00000000204200(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $204.200
(415)7709998837232(8020)020240401513(3900)00000000272300(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $272.300
(415)7709998463516(8020)020240401514(3900)00000000136200(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $136.200
(415)7709998473461(8020)020240401518(3900)00000000204200(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $204.200
(415)7709998426351(8020)020240401516(3900)00000000204200(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $204.200
(415)7709998806085(8020)020240401517(3900)00000000068100(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $68.100
(415)7709998587229(8020)020240401515(3900)00000000408500(96)20241224	Hasta 24/12/2024 Total: $408.500

DAVIVIENDA – BBVA – SUPERGIROS - BANCO DE BOGOTA - AVVILLAS
TRAMITES DE TESORERIA: SOLO BANCO DAVIVIENDA

LAURA PERDOMO DE LA OSSA 10/12/2024 10:47:38 AM

Convenios Banco Agrario

Pro-Universidad: **17475** Pro- Hospital: **17477** Pro- Electrificación: **17474** Pro-Cultura: **17473** Pro-Desarrollo: **17476** Adulto Mayor: **17483**

2.046.686,76
341.114,46

298.048,76

341.114,46

17.055.723 - 1824
34.111.446 → 1924
1.193.900
29.804.836 → 2024

Certificado
Bancario

Lunes, 22 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA identificado(a) con CC 1103100955, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08229066359	2014/08/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
BONO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

FECHA
27/05/2024

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240032334

Acto:	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Clase Acto:	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	1103100955

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SUCRE - INDER	**NIT ENTIDAD CONTRATANTE:** 823002411
BASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 25.583.585	**NÚMERO DEL CONTRATO** CMA-01-2024
CONTRATO DIFERIDO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** 85.278.615
FECHA SUSCRIPCIÓN: 15/05/2024	**FECHA VENCIMIENTO:** 29/05/2024

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	$767.500
PRO-CULTURA	2%	$511.700
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,50%	$383.800
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	$127.900
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$255.800
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	$383.800
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL	1,50%	$383.800
	TOTAL A PAGAR	**$2.814.300**

PAGADO

(415)7709998426351(8020)020240173264(3900)00000000383800(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $383.800
(415)7709998473461(8020)020240173265(3900)00000000383800(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $383.800
(415)7709998557147(8020)020240173266(3900)00000000383800(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $383.800
(415)7709998837232(8020)020240173270(3900)00000000511700(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $511.700
(415)7709998806085(8020)020240173268(3900)00000000127900(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $127.900
(415)7709998463516(8020)020240173269(3900)00000000255800(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $255.800
(415)7709998587229(8020)020240173267(3900)00000000767500(96)20240529	Hasta 29/05/2024 Total: $767.500

BANCO DAVIVIENDA – BBVA – SUPERGIROS - BANCO DE BOGOTA
TRAMITES DE TESORERIA: SOLO BANCO DAVIVIENDA

FRANCISCO EMIRO PEREZ JIMENEZ 29/05/2024 02:42:51 PM
PAGADO

Convenios Banco Agrario

Pro-Universidad: **17475** Pro- Hospital: **17477** Pro- Electrificación: **17474** Pro-Cultura: **17473** Pro-Desarrollo: **17476** Adulto Mayor: **17483**

Gobernación de Sucre

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
03/10/2024

NRO. LIQUIDACIÓN - 20240062187

Acto:	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Clase Acto:	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO CAJERO No. 2 03 OCT 2024 PROCESADO

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	1103100955

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SUCRE - INDER	**NIT ENTIDAD CONTRATANTE:** 823002411
BASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 46.079.116	**NUMERO DEL CONTRATO** IDDRS-CMA-*-001-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN: 03/10/2024	**FECHA VENCIMIENTO:** 17/10/2024

3. INFORMACION DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	$1.382.400
PRO-CULTURA	2%	$921.600
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,50%	$691.200
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	$230.400
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$460.800
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	$691.200
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL	1,50%	$691.200
	TOTAL A PAGAR	**$5.068.800**

(415)7709998426351(8020)02024032238(3900)0000000691200(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $691.200
(415)7709998473461(8020)02024032238?(3900)0000000691200(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $691.200
(415)7709998557147(8020)02024032238(3900)0000000691200(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $691.200
(415)7709998837232(8020)02024032239(3900)0000000921600(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $921.600
(415)7709998806085(8020)02024032239(3900)0000000230400(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $230.400
(415)7709998463516(8020)02024032239?(3900)0000000460800(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $460.800
(415)7709998587229(8020)02024032238?(3900)0000001382400(96)20241017	Hasta 17/10/2024 Total: $1.382.400

BANCO DAVIVIENDA – BBVA – SUPERGIROS - BANCO DE BOGOTA
TRAMITES DE TESORERIA: SOLO BANCO DAVIVIENDA

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SUCRE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SUCRE: 03/10/2024 10:14:34 AM

Convenios Banco Agrario

Pro-Universidad: **17475** Pro- Hospital: **17477** Pro- Electrificación: **17474** Pro-Cultura: **17473** Pro-Desarrollo: **17476** Adulto Mayor: **17483**

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN A LA ARL CON FECHA DE IMPRESIÓN ACTUALIZADA

ARL | sura

Medellín, 23 de Octubre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JC ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL SUCRE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1103100955	CARRASQUILLA ALFREDO JOSE MONTERROZA	22/10/2024		22717024	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11031009552429752040

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/10/2024 14:27:20 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.145.6, 192.230.104.8, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA

INGENIERO CIVIL

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA.

PERIODO: 21 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA:

N° IDDRS-CMA-001-2024.

OBJETO CONSULTORIA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.

CONTRATISTA INTERVENTORIA

JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

ENTIDAD CONTRATANTE: INDERSUCRE

AÑO 2024

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

CAPÌTULO I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. INTRODUCCIÒN.

El presente documento corresponde al informe final de **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE** comprendida entre el 21 de agosto al 17 de septiembre 2024, en el cual se revisa y calcula el avance financiero del contrato de obra, además del seguimiento de la ejecución de las actividades contractuales en sitio, que contiene una descripción general de las actividades desarrolladas enmarcadas, registro fotográfico, medición y el cálculo del avance porcentual de ejecución cumpliendo con las obligaciones contractuales de seguimiento del proyecto de obras:

CONTRATO: LP-002-2023.

OBJETO: ''MANTEMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE''

CONTRATISTA: ARCA MEGAPROYECTOS SAS

El proyecto se lleva a cabo con el objetivo de mejorar la infraestructura del parque, respondiendo a la necesidad de la comunidad de contar con un espacio adecuado para la realización de actividades recreativas y deportivas. La intervención busca garantizar un entorno más seguro y cómodo para los habitantes, fomentando así el bienestar y la calidad de vida en la zona.

Así mismo, el informe describe las acciones realizadas por la Interventoría a cargo de **JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA**, dentro de las cuales se incluye el diagnóstico y seguimiento realizado, con relación a cada una de las actividades contratadas, determinando su avance y evaluando la forma de ejecución de estas.

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

1.2. OBEJTIVOS.

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

- Realizar seguimiento y control al desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto, cuyo objeto es: "MANTEMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE"

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Realizar seguimiento técnico en el desarrollo de las actividades derivadas del proyecto 'MANTEMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE"

- Evaluar ambientalmente el desarrollo de las actividades civiles enmarcadas dentro del contrato en mención.

- Velar por el buen uso de los recursos dispuesto para la ejecución del contrato 'MANTEMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE".

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

1.3. JUSTIFICACIÒN.

El Centro Recreacional Pelinkú, ubicado en el municipio de Galeras, Sucre, presentaba deficiencias significativas en su infraestructura, lo que afectaba la calidad del espacio destinado para actividades de recreación, esparcimiento y convivencia social. Esta situación era uno de los principales factores que contribuían al deterioro de las dinámicas sociales de la población local. La falta de adecuación de este centro recreacional limitaba el acceso a espacios adecuados para el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas y deportivas, lo que impactaba negativamente en el bienestar físico y emocional de la comunidad.

Las carencias en infraestructura recreativa y la escasa inversión pública en el mantenimiento y adecuación de espacios, afectaban directamente a los habitantes del municipio, especialmente a niños y jóvenes. La baja disponibilidad de áreas apropiadas para la recreación derivaba en el desinterés por parte de los jóvenes en estas actividades, quienes optaban en su lugar por conductas perjudiciales como el consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas. Además, el sedentarismo y los malos hábitos desarrollados a causa de la falta de espacios adecuados contribuían al aumento de problemas de salud, como la obesidad y enfermedades asociadas con la inactividad física.

Además de los beneficios recreativos, el parque ecológico fomentará el desarrollo socioeconómico del municipio de Galeras, al convertirse en un punto de referencia para actividades de educación ambiental, turismo ecológico y eventos comunitarios, promoviendo así un uso sostenible de los recursos naturales y un mayor bienestar para todos los habitantes.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

1.4. LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO.

El proyecto: 'MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS" se encuentra localizado en el municipio de Galeras, en el departamento de Sucre.



DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

1.5. ASPECTOS CONTRACTUALES.

1.5.1. Condiciones generales del contrato de interventoría.

Contrato:	IDDRS-CMA-001-2024		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, MUNICIPIO DE GALERA".		
Interventor:	JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA		
C.C. / NIT.	1.103.100.955		
Valor Inicial:	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS.		
Valor Incial:	$85.278.615,00		
Valor Adicional:	N/A		
Valor Actualizado:	N/A		
Anticipo (30%)	N/A		
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES		
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	623	FECHA:	10/10/2023
N° De Registro Presupuestal (Inicial)	424	FECHA:	29/04/2024
Fecha acta de Inicio	18/6/2024		
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024		
Fecha de Terminación Actualizada:	17/10/2024		

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

1.5.2. INFORMACIÒN POLIZAS DE CONTRANTO INTERVENTORIA.

PÓLIZAS AL INICIO DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
SEGUROS MUNDIAL	100018621	Cumplimiento	$ 8,527,861.50	18/6/2024	20/3/2025
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	$ 4,263,930.75	18/7/2024	20/9/2024
		Calidad Del Servicio	$ 8,527,861.50	15/8/2024	15/9/2029

PÓLIZAS ACTUALIZADAS.

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
SEGUROS MUNDIAL	100018621	Cumplimiento	$ 8,527,861.50	18/6/2024	20/04/2025
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	$ 4,263,930.75	18/7/2024	20/10/2027
		Calidad Del Servicio	$ 8,527,861.50	15/8/2024	15/9/2029

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

1.5.3. Condiciones generales del contrato de obra.

CONTRATO N°.	LP-002-2023
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE EDEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
CONTRATISTA:	ARCA MEGAPROYECTOS SAS
NIT:	9014740951
REPRESENTANTE LEGAL	YUSNEIDI MARIA OROZCO MARQUEZ
C.C.	1.045.306.356
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	25/04/2024
FECHA DE FIRMA ACTA DE INICIO	18/06/2024
FECHA FINALLIZACIÓN:	17/09/2024
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES
N° DE POLIZAS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL (SURAMERICANA)	3907877-7
N° DE POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SURAMERICANA)	0960219-4
N° DE CDP	723 – Fecha 10/10/2023
N° DE CDP ADICIONAL	723 – Fecha 10/10/2023
N° DE RP INICIAL	324 – Fecha 29/04/2024
N° DE RP ADICIONAL	624 – Fecha 17/09/2024
VALOR TOTAL INICIAL	($1.154.916.107) MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE.
VALOR ADICIONAL	($63,295,541.00) SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.
VALOR TOTAL	($1,218,213,647.00) MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.
SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA
CARGO:	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:	15.16 %	**PORECENTAJE ACUMULADO:**	94.95%
ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCIÓN		

1.5.4. INFORMACIÒN POLIZAS CONTRATO DE OBRA.

PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
N° 3907877-7	26-04-2024	Cumplimiento	10/04/2024	10/07/2024	115.491.811
		Estabilidad/Calidad	10/07/2024	10/07/2029	115.491.811
		Pago Salarios	10/04/2024	10/04/2024	115.491.811

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO					
Aseguradora	**N° De Póliza**	**Amparo**	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
				desde	**hasta**
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$115,491,811.00	18/6/2024	17/9/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y calidad de Obra	$115,491,811.00	17/9/2024	17/9/2029
		Prestaciones sociales	$ 115,491,811.00	18/6/2024	18/6/2027
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
				desde	**hasta**
SURAMERICANA	0960219-4	Predios, labores y operaciones	$ 260,000,000.00	18/6/2024	17/9/2024

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

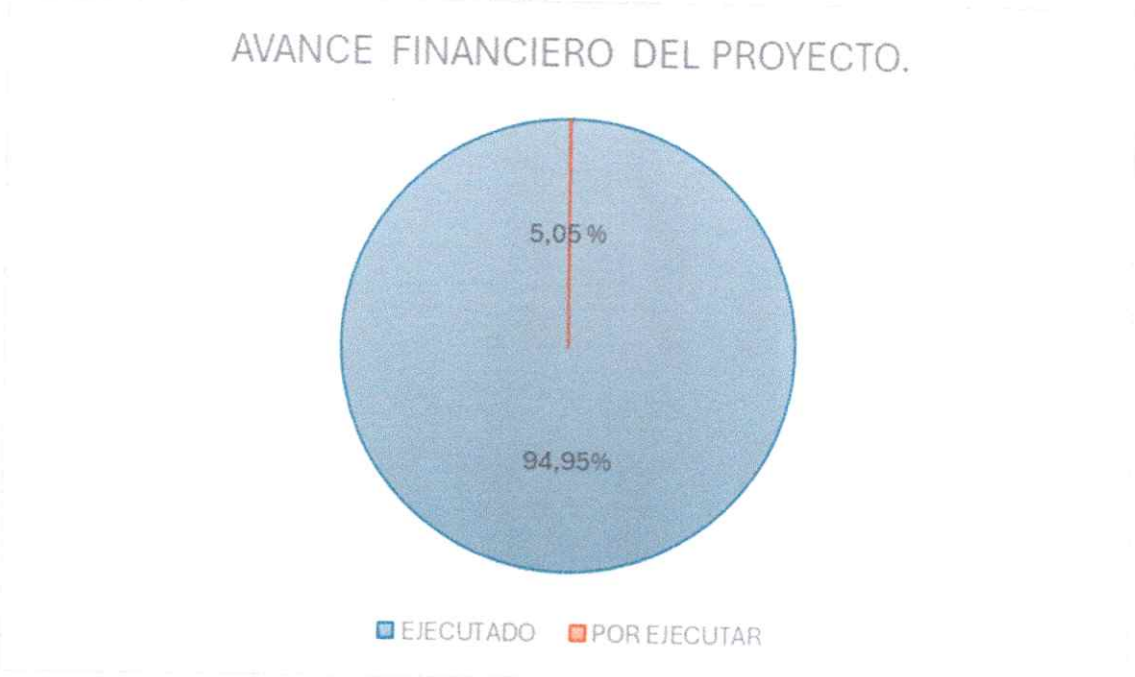
CAPITULO II. INFORMACIÒN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

2. INFORMACIÒN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA CONTRATO DE OBRA.

El Contrato de Obra N° LP-002-2023 tiene un valor inicial de ($ 1,154,918,106.00), más un valor adicional de ($63,295,541.00), para un total de ($1,218,213,647.00) , sumas que proviene de los aportes del sistema general de regalías y que tiene por objeto: "MANTEMIENTO Y ADECUACIÒN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE".

Para el periodo que ocupa este informe, en obra se alcanzó un porcentaje de ejecución correspondiente al 15.16%, equivalente al valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($235.237.535,00), para un avance acumulado a la presente fecha del 94.95%, representado gráficamente de la siguiente manera:

En el siguiente grafico se muestra la información financiera del proyecto, y el estado del consumo de los recursos en el periodo referenciado.



Grafica 1. Estado de la situación financiera del Proyecto en cuanto a la inversión de los recursos.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

2.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL TECNICO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO.

De acuerdo con la información mencionada anteriormente del avance del proyecto, en la próxima grafica se puede evidenciar de forma visual la situación de la obra.

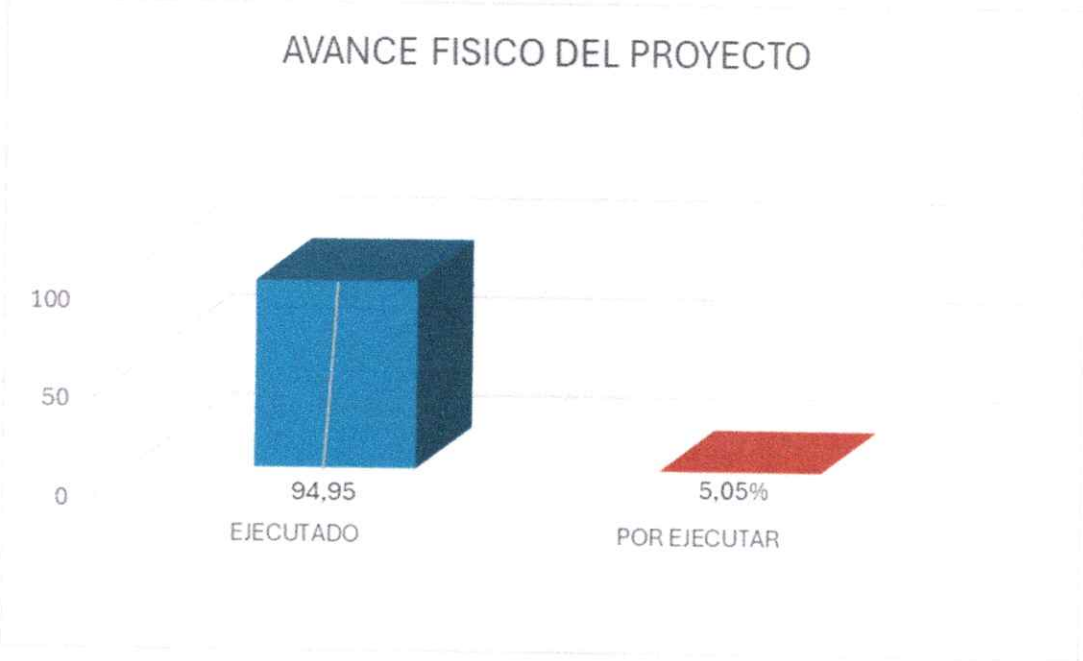


Gráfico 2. porcentaje de ejecución contrato de obra.

En cuanto al avance general del proyecto se puede inferir que para el día 17 de septiembre de 2024 se presenta un avance del 94,95 %, el cual se ve reflejado en las actividades ejecutadas según el presupuesto del contrato.

2.2. ASPECTOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

- **MITIGACIÒN DEL IMPACTO AMBIENTAL**

  El material sobrante producto de las actividades de limpieza de maleza del área externa de cuerpos de agua y el retiro de material de excavación y demolición, generado durante el periodo de ejecución de este informe, es manejado siguiendo los lineamientos ambientales establecidos. Todo el material retirado, incluyendo escombros y residuos de vegetación, es transportado a un sitio de disposición final autorizado, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

  Adicionalmente, el contratista ha implementado en la obra puntos ecológicos para la correcta recolección de residuos generados por el personal durante las labores. Estos puntos permiten la separación y manejo adecuado de

basuras, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y minimizando el impacto negativo en el entorno natural.

Todos los trabajos de mitigación están siendo coordinados con el personal ambiental de la interventoría.

- **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÒN SOCIAL DE LA OBRA.**
  El contratista ha realizado la socialización del proyecto, con lideres y comunidad en general en coordinación con la interventoría.
  Respecto a la seguridad en obra, la interventoría superviso que el contratista este cumpliendo a cabalidad con las medidas necesarias para que todo el personal dispuesto en obra utilice los elementos de protección según lo establecido en el programa de salud ocupacional, por tales razones el contratista hace charlas con el personal en obra. El personal en obra cuenta con todos los implementos para su seguridad.

- **SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**
  Las afiliaciones del personal a la seguridad social en cumplimiento de lo estipulado en el contrato han sido entregadas por el contratista y han sido requisitos exigidos para el trámite de las actas de pago parciales.

- **ASPECTOS LOGISTICOS.**

El contratista realizò las actividades en obra según el cronograma establecido para cumplir satisfactoriamente con el objeto contractual del contrato de obra.

2.3. PERSONAL DE LA INTERVENTORIA.

Durante este periodo, la interventoría tuvo el siguiente personal especialista, profesional y técnico.

CANTIDAD	CARGO
1	Director de interventoría
1	Ingeniero civil interventor
1	Profesional SISO
1	Secretaria

CAPÌTULO III. METODOLOGÌA DE TRABAJO UTILIZADO POR LA INTERVENTORIA.

Cumpliendo con las obligaciones adquiridas por la interventoría en el contrato de consultoría IDDRS-CMA-001-2024 se indica a continuación la metodología de trabajo durante la ejecución de las actividades.

- La interventoría lleva un control diario de la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones generales y/o particulares de construcción, las cuales se consignan diariamente en la bitácora de obra.
- se ha velado durante el periodo del presente informe por el cumplimiento del programa de trabajo e inversiones.
- El interventor dispone de una sede permanente de trabajo en la ciudad de Sincelejo.
- El interventor, dispone de personal, los recursos equipos e implementos, según las condiciones del contrato exigidas por el ente contratante INDERSUCRE para realizar las funciones de vigilancia y control del contrato de obra **DDRS–LP-002-2023**, desde el inicio de la obra del día 18 de junio de 2024, hasta el 17 de septiembre de 2024, fecha del presente informe.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

3. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Durante este periodo se han utilizado herramientas menores como equipos de soldadura, trompo o mezcladora de concreto.

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO S/N	TIPO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA	CUMPLE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO S/N	OBSERVACIONES
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA		X	EN OBRA	COMPACTAR MATERIAL	SI	DIARIO		SI	
VIBRADOR DE CONCRETO		X	EN OBRA	FUNDICION DEL CONCRETO	SI	DIARIO		SI	
VOLQUETA		X		SUMINISTRO Y RETIRO DE MATERIAL	SI			SI	
TROMPO/ MEZCLADORA		X	EN OBRA		SI	DIARIO		SI	
RETRO EXCAVADORA		X			SI			SI	

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

- La interventoría realizó la supervisión y el control del suministro de materiales, equipos y herramientas al sitio de trabajo por parte de los contratistas y se verificó que estos cumplieran con las especificaciones técnicas estipuladas.

- se llevó un control y seguimiento diario de todas las actividades que se ejecutaron en campo, estas fueron plasmadas en la bitácora.

- Se llevó un registro fotográfico diario del estado de las obras.

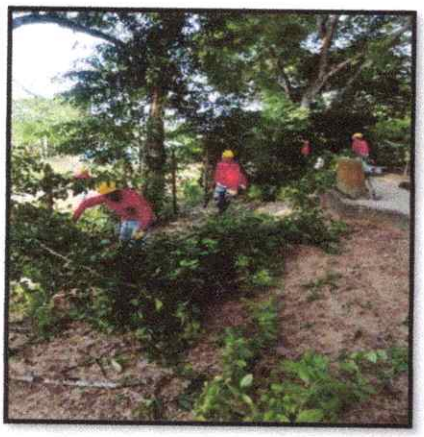
- Se Presentaron informes mensuales que contenían la ejecución de las actividades realizadas en el mes.

- Se exigió que el contratista cumpla durante toda la vigencia del contrato con las obligaciones relacionadas con la afiliación a salud, pensiones, riesgos laborales.

- se le exigió que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la seguridad, brindando así seguridad a quienes allí laboran.

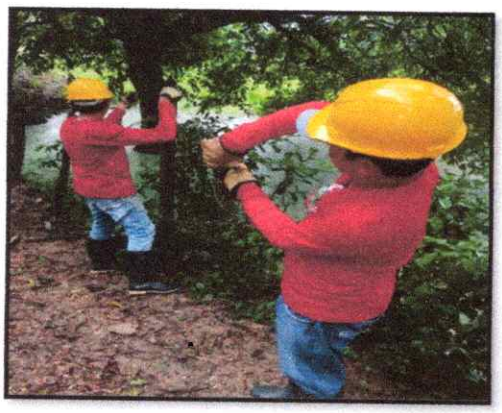
DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

4. AVANCE DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.





Actividad de Desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente.



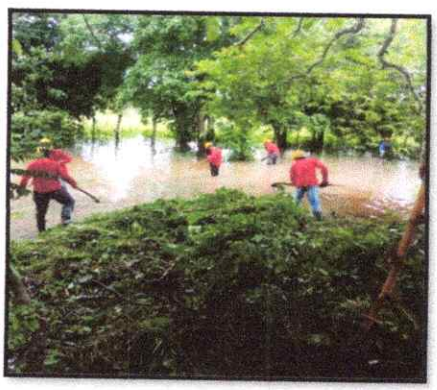
Actividad de Desmonte de alambre de púa en mal estado en cerramiento existente.



Ejecución de la actividad Demolición de plantilla existente.



Ejecución de la actividad Demolición de plantilla existente.



Actividad Limpieza de maleza del área interna de cuerpos de agua. 100%

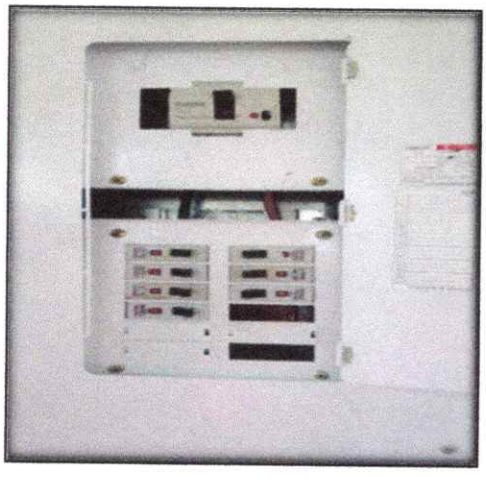
DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza.



suministro e instalación de acometida principal desde punto de conexión bujes de baja transformador



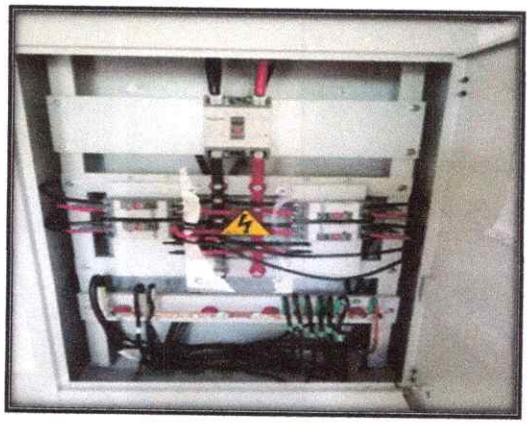
suministro e instalación de alimentador de gab ppal.



Actividad de Suministro e instalación de Adoquín de cemento Sección: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base.



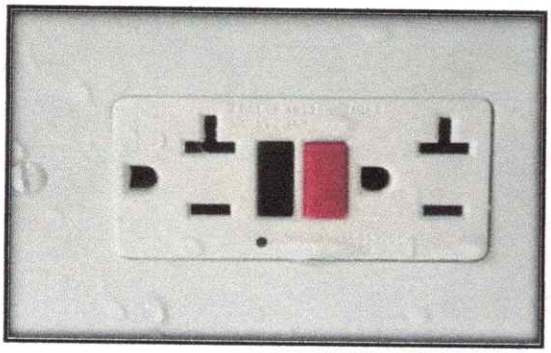
suministro e instalación de bajante acometida en tubería imc 2", incluye capacete y cinta de acero inoxidable.



suministro e instalación de gabinete principal gab ppal tipo exterior con breakers

DIRECCION: CALLE 24B 10ª, SINCELEJO-SUCRE.
CEL: 300 339 7872
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



suministro e instalación salida tomacorriente.



suministro e instalación salida iluminación y ventiladores



suministro e instalación switch o interruptor manual sencillo de encendido



suministro e instalación switch o interruptor manual doble de encendido iluminación en conductor



suministro e instalación de tablero bifásico 12 circuitos, incluye sus protecciones



suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar



suministro e instalación de ventiladores de techo



suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w



suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse



suministro e instalación de aviso señalización salida



suministro e instalación de salida para lámpara led tipo tortuga 20w

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



suministro e instalación de salida para aire acondicionado



Se realiza la actividad de limpieza manual de maleza y desmonte de material orgánico zona perimetra



actividad de 'Construcción de caja de Registro de inspección 0,8x0,8x0,7 mts con marco y borde tapa metálico.



actividad de 'Construcción Registro de inspección de 0,4x0,4x0,6 m con marco y borde tapa metálicos.



Se realiza la actividad de Suministro e instalación de tubería conduit PVC



Suministro e instalación de tuberia conduit PVC 1 1/4" - canalización subterránea alimentador de GAB PPAL a TD2.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



actividad de Suministro e instalación de rameles de iluminación desde Tablero de Iluminación en GAB PPAL en 2x#4F+1xNo.4T Aluminio S8000. Corresponde al cableado de cada circuito de iluminación.



Suministro e instalación de poste metálico certificado de A.P. de 2" y 5,5 metros, con plantilla para instalación de luminaria vertical, incluye pedestal en concreto.



Actividad de Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores.



Actividad de Salida eléctrica de conexión para poste 10 metros con tres proyectores.



Actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w.



Suministro e instalación polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

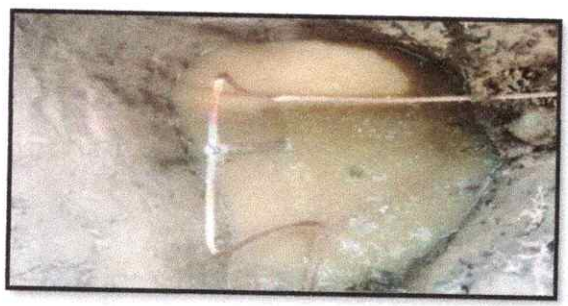
E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com



Actividad 'Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w.



Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados.



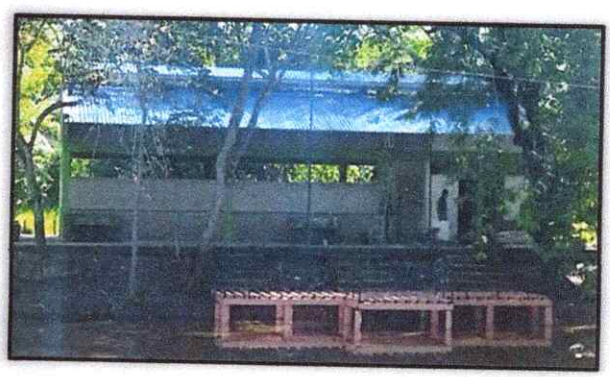
Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo # 1/0 a 0.5 mts de profundidad. conductor de malla a tierra.



Se observa la ejecución de la actividad de 'Suministro e instalación de soldadura exotérmica 115 g para SPT.



Actividad de Pintura vinilo muros (3 manos).



Actividad de Mantenimiento general de cubierta (interior y exterior), cerchas y correas metálicas, incluye desmonte y reinstalación.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

INGENIERO CIVIL



Actividad de Suministro e instalación de Adoquín de cemento Sección: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base.



Actividad de Caneca de basura en acero inoxidable. Color: Satinado. Incluye instalación 75lts.



Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de banca en concreto tipo MD30 .



Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de banca en concreto tipo MD30 y máquinas de ejercicios biosaludables.



Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de parque infantil.



actividad de Suministro e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHoehernan	OROSMAN ENRIQUE HERNANDEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-2:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188231124	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Estado:		Bajo Procesamiento		Nro Obligación:	2024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2024-12-12		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	29.804.876,00	Valor Deducciones:	2.086.341,76	Valor Neto:	27.718.534,24	Saldo x Pagar:			29.804.876,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1103100955	Razón Social:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08229066359	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE / 00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE									
	Nación	AD70000	CSF	29.804.876,00	0,00				

$80.922.015 ← $46,860,599
$34,066,446

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.788.293,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	1103100955	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	0,000 %	298.048,76		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-700006 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-12	29.804.876,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-1:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2024	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	29.804.876,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.804.876,00	**Saldo x Ordenar:**	29.804.876,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.086.341,76	**Valor Neto:**	27.718.534,24			**Nro. Compromiso:**	424	**Nro. Cdp:**	623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	46

TERCERO

Identificacion:	1103100955	**Razon Social:**	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08229066359	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	2424	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-12-10				
					Total:	29.804.876,00	0,00	29.804.876,00	29.804.876,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-12	Generada	29.804.876,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-1:20 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.804.876,00	6,000 %	1.788.293,00	1.788.293,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	Cédula de Ciudadanía 1103100955	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	0,00	0,000 %	298.048,76	298.048,76

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-2:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2424	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalias	**Nro. Compromiso:**	424	**Nro. Cdp:**	623
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	29.804.876,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	29.804.876,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	1103100955	**Razon Social:**	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Objeto.:	ACTA N.1 - IDDRS-CMA-001-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHoehernan	OROSMAN ENRIQUE HERNANDEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-2:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188230624	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Estado:		Bajo Procesamiento		**Nro Obligación:**	1924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2024-12-12		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	34.111.446,00	**Valor Deducciones:**	2.387.801,46	**Valor Neto:**	31.723.644,54	**Saldo x Pagar:**			34.111.446,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1103100955	**Razón Social:**	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08229066359	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final


ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

				VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE / 00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE									
	Nación	AD70000	CSF	34.111.446,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.046.687,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	1103100955	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	0,000 %	341.114,46		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-700006 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-12	34.111.446,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1924	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	34.111.446,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	34.111.446,00	Saldo x Ordenar:	34.111.446,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.387.801,46	Valor Neto:	31.723.644,54			Nro. Compromiso:	424	Nro. Cdp:	623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	45

TERCERO

Identificacion:	1103100955	Razon Social:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08229066359	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	2324	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-12-10				
					Total:	34.111.446,00	0,00	34.111.446,00	34.111.446,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-12	Generada	34.111.446,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-1:20 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.111.446,00	6,000 %	2.046.687,00	2.046.687,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	Cédula de Ciudadanía 1103100955	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	0,00	0,000 %	341.114,46	341.114,46

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-2:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2324	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	424	**Nro. Cdp:**	623
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	34.111.446,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	34.111.446,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	1103100955	**Razon Social:**	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Objeto.:	ACTA PARCIAL N.1-IDDRS - CMA-001-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHoehernan	OROSMAN ENRIQUE HERNANDEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-2:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188230324	Fecha Registro:	2024-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Estado:		Bajo Procesamiento		Nro Obligación:	1824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2024-12-12		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	17.055.723,00	Valor Deducciones:	1.193.900,00	Valor Neto:	15.861.823,00	Saldo x Pagar:			17.055.723,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1103100955	Razón Social:	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08229066359	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE / 00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE									
	Nación	AD70000	CSF	17.055.723,00	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.023.343,00		
2-01-05-01-98	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	1103100955	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	0,000 %	170.557,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-700006 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-12	17.055.723,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-1:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1824	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	17.055.723,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.055.723,00	**Saldo x Ordenar:**	17.055.723,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.193.900,00	**Valor Neto:**	15.861.823,00			**Nro. Compromiso:**	424	**Nro. Cdp:**	623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	44

TERCERO

Identificacion:	1103100955	**Razon Social:**	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	08229066359	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2224	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0125 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-12-10				
					Total:	17.055.723,00	0,00	17.055.723,00	17.055.723,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-12-12	Generada	17.055.723,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-1:20 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.055.723,00	6,000 %	1.023.343,00	1.023.343,00
2-01-05-01-98 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES - ICA. OTRAS CIUDADES	Cédula de Ciudadanía 1103100955	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA	0,00	0,000 %	170.557,00	170.557,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfortich	LUIS CARLOS FORTICH ARROYO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-700006	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-10-2:25 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	2224	**Fecha Registro:**	2024-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-700006 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE - INDERSUCRE		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	424	**Nro. Cdp:**	623
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.055.723,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	17.055.723,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	1103100955	**Razon Social:**	JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Objeto.:	ACTA PARCIAL N.1 - IDDRS-CMA-001-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE-INDERSUCRE	Código: IN-LV-GAF-GP-01	Fecha: 30/05/2024
	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
	GESTION DE PRESUPUESTO	Versión: 01	Pagina : 1 de 1
	LISTA DE VERIFICACION REQUISITOS DE PAGO PARA CONTRATOS		

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		**JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA**		**NIT, CC:**	**1.103.100.955**
CONTRATO No:	**IDDRS-CMA-001-2024**	**VALOR DE CONTRATO:**	**$ 85,278,615.00**	**FECHA:**	**17/09/2024**
ADICIÒN:	**$ -**	**VALOR ADICION:**	**$ -**	**FECHA:**	**-**
VALOR ANTICIPO :	**$ -**	**VALOR PAGO PARCIAL:**	**$ 80,927,045.00**	**VALOR PAGO FINAL:**	**$ 4,351,570**
No. CUENTA DE PAGO:	**001**	**PERIODO:**	**18/06/2024 - 17/09/2024**		

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO

Orden	DOCUMENTOS REQUERIDOS	SI	NO	N.A
1	Certificación de Existencia de Documentos en el Expediente del Contrato	X		
2	Certificado de Afiliacion Seguridad Social o Planilla	X		
3	RUT con Fecha de Impresión Actualizada	X		
4	Certificado de Cumplimiento-recibido a satisfacciòn (actas parciales/final)	X		
5	Informe del Supervisor	X		
6	Factura o Documento equivalente (Según Aplique Normatividad Vigente)	X		
7	Certificado de Afiliacion a la ARL con Fecha de Impresión Actualizada	X		
8	Certificacion Entrada a Almacen (contratos de suministros)			X
9	Informe De Actividades Del Contratista con sus debidos soportes (Según el requerimiento del supervisor y normatividad vigente)	X		
	ANTICIPO			
10	Los Documentos del Numeral 1 al 8 (los que apliquen)			
11	Certificado Encargo Fiduciario o Patrimonio Autonomo (Obras-Licitaciones publicas)			
12	Solicitud y Plan de Inversion del Anticipo Previamente Aprobado por la Interventoria o quien haga sus veces			
	PAGOS PARCIALES Y FINAL			
13	Los Documentos del Numeral 1 al 8 (los que apliquen)	X		
14	Originales de Actas parciales (numeral y literal según el caso)	X		
15	Originales de Acta final (numeral y literal según el caso)			X
16	Cuando aplique, Actas de Suspensión, Reiniciación con sus respectivas ampliaciónes de polizas y Registros presupuestales, Si hay adicion.			X

**En caso de que no aplique coloque NA *Los documentos anexos deben ir debidamente foliados y en el orden establecido*

ALEX FRANCISCO GIL COVILLA	**JOSE LUIS GARZON MUÑOZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE

Inder Sucre	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE-INDERSUCRE	Código: IN-GJC-DAE.001	Fecha: 30/05/2022
	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION		
	GESTION DE CONTRATACION	Versión: 001	Página: 1 de 1
	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL		

MODALIDAD DE CONTRATACION	**LP**	**X**	**SA**		**CD**		**CM**		**MC**		**CON**	
CONTRATO N°	IDDRS-CMA-001-2024		**FECHA DE SUSCRIPCION**		25/04/2024		**VALOR CONTRATO**			$85.278.615,00		
CONTRATISTA	JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA					**NIT - CC**		1.103.100.955				
FORMA DE PAGO	POR ACTAS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA			**FECHA**	29/04/2024		**RP N°**	424				
PLAZO	CUATRO (4) MESES											

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA CERTIFICA QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN SECOP I I Y EN EL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL CONTRATO DE REFERENCIA:

ITEM	DESCRIPCION			SI	NO	N/A
1	ORIGINAL ACTA DE INICIO			X		
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			X		
3	CONTRATO/ACEPTACIÓN DE OFERTA			X		
4	REGISTRO PRESUPUESTAL			X		
5	FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA Y MATRICULA PROFESIONAL VIGENTE			X		
6	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y DE REPRESENTACION LEGAL CON UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS (CAMARA DE COMERCIO)					X
7	PERSONERIA JURIDICA Y RECONOCIMIENTO DEPORTIVO					X
8	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURIA)			X		
9	ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORIA)			X		
10	ANTECEDENTES JUDICIALES			X		
11	MEDIDAS CORRECTIVAS			X		
12	CERTIFICADO DE INHABILIDADES DE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE 18 AÑOS(Ley 1918/2018)			X		
13	CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS–REDAM (Ley 2097 de 2021)			X		
14	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)			X		
15	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)			X		
16	CERTIFICADO ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)			X		
17	POLIZA DE GARANTIA UNICA			X		
18	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			X		
19	RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZA			X		
20	**PAGO ESTAMPILLAS APLICABLES**	**% PAGADO**	100%	X		
21	CONTRATO DE FIDUCIA (CUANDO EXISTE ANTICIPO)					X

LP Licitación Público; SA Selección Abreviada; CD Contratación Directa; CM Concurso de Merito; MC Minima cuantia; CONV Convenios. Todos los documentos relacionados se encuentran original en el expediente contractual para su verificacion

Para contancia se firma el presente documento a los 12días del mes de noviembre de 2024

KAROL TRUCO BALDOVINO
P.U. ÁREA JURÍDICA

INGENIERO CIV

Sincelejo – Sucre, 5 de noviembre de 2024

Inder Sucre
FECHA 8-11-24
HORA 2:30 N. FOLIO 07
N. RADICADO 490 RECIBIDO

Señores

SAMUEL ALVAREZ LEON
DIRECTOR DE INDERSUCRE

ALEX GIL COVILLA.
SUPERVISOR DEL PROYECTO

Cordial Saludo.

Referencia: Presentación de cuenta de cobro parcial No.1, del Contrato No. IDDRS-CMA-001-2024.

Mediante la presente, se hace la radicación de la cuenta de cobro final del contrato en ejecución No. IDDRS-CMA-001-2024., cuyo objeto es: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERAS – SUCRE.**", para el correspondiente pago se anexa:

Atentamente,

JOSE CARRASQUILLA MONTERROZA

INTERVENTOR DE OBRA.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL O PLANILLA

INGENIERO CIVIL

PAGOS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.

DIRECCION: CALLE 24B 10º, SINCELEJO-SUCRE

CEL: 300 339 7872

E-MAIL: josecarrasquilla2107@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103100955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 10 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PARQUE PELINKU
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7934979545			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			24				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			820012911

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 0	$ 280.000	$ 5.100	$ 285.100
230301	230301-PORVENIR	2	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 520.000	$ 9.400	$ 529.400
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 14.500**	**$ 814.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 76.000	$ 1.500	$ 0	$ 79.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 122.000	$ 2.200	$ 0	$ 124.200
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 3.700**	**$ 0**	**$ 203.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 348.100	$ 348.100	$ 6.300	$ 0	$ 354.400
SUBTOTALES:									**$ 348.100**	**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 354.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	3	$ 200.000	$ 3.600	$ 203.600
SUBTOTALES:			**$ 200.000**	**$ 3.600**	**$ 203.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REPORTADA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1103109676	PEREZ BOTIA ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.000	$110310095	$30 121.800	$ 1.750.000	SCCF41-CCF DEL SUCRE	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 92534966	MONTERROSA OTERO MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$110310095	$ 90.900	$ 1.300.000	SCCF41-CCF DEL SUCRE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 92535650	CABALLERO GUERRERO ALVARO RAFAEL	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.950.000	$110310095	$30 135.800	$ 1.950.000	SCCF41-CCF DEL SUCRE	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.576.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103100955
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 10 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1110616646	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			59				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			111532900

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600	$ 0	$ 320.000	$ 11.600	$ 331.600
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 11.600**	**$ 331.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 9.100	$ 0	$ 250.000	$ 9.100	$ 0	$ 259.100
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 9.100**	**$ 0**	**$ 259.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN						SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1103100955	CARRASQUILLA MONTERROZA JOSE ALFREDO	INDEPEND		$ 2.000.000				NO																		230201-PROTECCION	30	2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 590.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103100955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 10 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PARQUE PELINKU
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1110616638	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			50				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			111525801

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.200	$ 0	$ 280.000	$ 10.200	$ 290.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.800	$ 0	$ 520.000	$ 18.800	$ 538.800
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 29.000**	**$ 829.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 78.000	$ 2.900	$ 0	$ 80.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.000	$ 0	$ 4.500	$ 0	$ 122.000	$ 4.500	$ 0	$ 126.500
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 7.400**	**$ 0**	**$ 207.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 348.100	$ 348.100	$ 12.600	$ 0	$ 360.700
SUBTOTALES:									**$ 348.100**	**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 360.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	3	$ 200.000	$ 7.300	$ 207.300
SUBTOTALES:			**$ 200.000**	**$ 7.300**	**$ 207.300**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1103100676	PEREZ BOTIA ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.000	110310095	$ 121.800	30	$ 1.750.000	SCCF41-CCF DEL SUCRE	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 92534988	MONTERROZA OTERO MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	110310095	$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF41-CCF DEL SUCRE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 92535680	CABALLERO GUERRERO ALVARO RAFAEL	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.950.000	110310095	$ 135.800	30	$ 1.950.000	SCCF41-CCF DEL SUCRE	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.604.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103100955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 10 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1110616581	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	21		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	111544200

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 0	$ 320.000	$ 4.900	$ 324.900
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 4.900**	**$ 324.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 250.000	$ 3.800	$ 0	$ 253.800
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 3.800**	**$ 0**	**$ 253.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1103100955	CARRASQUILLA MONTERROZA JOSE ALFREDO	INDEPEND		$ 2.000.000				NO	30																230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000		30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 578.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1103100955
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 24 B 10 A 125	TELÉFONO:	2722772
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PARQUE PELINKU
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1110616573	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO		2024
DÍAS DE MORA:	21				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			111540300

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 280.000	$ 4.300	$ 284.300
230301	230301-PORVENIR	2	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900	$ 0	$ 520.000	$ 7.900	$ 527.900
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 12.200**	**$ 812.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.000	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 122.000	$ 1.900	$ 0	$ 123.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 78.000	$ 1.200	$ 0	$ 79.200
SUBTOTALES:													**$ 200.000**	**$ 3.100**	**$ 0**	**$ 203.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 348.100	$ 348.100	$ 5.300	$ 0	$ 353.400
SUBTOTALES:									**$ 348.100**	**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 353.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	3	$ 200.000	$ 3.100	$ 203.100
SUBTOTALES:			**$ 200.000**	**$ 3.100**	**$ 203.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1103109575	PEREZ BOTA ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO			SI		30														25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.000	$ 110310095	$ 121.800	30	$ 1.750.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 92534968	MONTERO ZA OTERO MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 110310095	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 92535650	CABALLERO GUERRERO ALVARO RAFAEL	DEPEND		$ 1.950.000	FIJO			SI		30														230301-PORVENIR	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.950.000	$ 110310095	$ 135.800	30	$ 1.950.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.571.800

RUT CON FECHA DE IMPRESIÓN ACTUALIZADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141109148238

(415)7707212489984(8020) 000014110914823 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 3 1 0 0 9 5 5	2	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosmético 4 7 7 3	

162. Nombre del establecimiento: DROGUERÍA SAN GABRIEL SINCELEJO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1	

165. Dirección: DG 28 15 91 BRR NUEVO MAJAGUAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 2 3 3 3 2	2 0 2 1 0 9 1 7	
168. Teléfono: 3 0 0 3 3 9 7 8 7 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141109148238

(415)7707212489984(8020) 000014110914823 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 0 3 1 0 0 9 5 5	2	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 3 1 0 0 9 5 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Corozal 2 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARRASQUILLA	MONTERROZA	JOSE	ALFREDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal: CL 24 B 10 A 125 MZ 4 LC 22 BRR ALTOS DE BUCARAMANGA

42. Correo electrónico: documentosjosecarrasquilla@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 4 8 2 3 0 3 6	3 0 0 3 3 9 7 8 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 2 0 5 2 5	4 2 2 0	2 0 1 2 0 5 2 5	0 0 1 0	4 7 7 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2 2	4 9	5 2																						

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 10 / 12 : 50: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO-RECIBIDO A SATISFACCIÓN

(ACTAS PARCIALES/FINAL)

CERTFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO IDDRS-CMA-001-2024

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENERIOS DEPORTIVOS

CERTIFICA

Que, el contrato de obra con la siguiente ficha técnica se encuentra en ejecución.

Contrato No.	IDDRS-CMA-001-2024					
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".					
Contratista:	JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA			NIT.	1.103.100.955	
Valor Inicial:	$85.278.615,00	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS.				
Valor Adicional:	N/A	N/A				
Valor Actualizado:	N/A	N/A				
Anticipo (%)	N/A					
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo adicional:		UN (1) MES	Plazo total:	CUARO (4) MESES
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	623	FECHA	10/10/2023	CDP ADICIONAL	N/A	N/A
N° De Registro Presupuestal - RP (Inicial)	424	FECHA	29/04/2024	RP ADICIONAL	N/A	N/A
Fecha acta de Inicio:	18/6/2024					
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024					
Fecha de Terminación Actualizada:	17/10/2024					
SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA			CARGO: P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS		
FECHA DE ASIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	14/06/2024					
PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTE ACTA:	94.95%	**POREcentaje ACUMULADO:**		94.95%		

CERTFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO IDDRS-CMA-001-2024

ESTADO DEL CONTRATO:	EN EJECUCIÓN

Que, como contratista el señor **JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA,** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.103.100.955**, una vez verificadas y certificadas las condiciones contractuales y/u obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales, por parte de la supervisión, se evidencia que el contratista de obra está cumpliendo a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato de obra pública **No. IDDRS-CMA-001-2024**, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA"**; según las condiciones señaladas en el **ACTA PARCIAL No.1**, correspondiente al período del 18 de junio de 2024 al 17 de septiembre de 2024, bajo las siguientes condiciones contractuales:

1. **CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES**
2. **DATOS ACTA PARCIAL No.1-**

VALOR INICIAL CONTRATO INCLUYE AIU	**100%**	**$85.278.615,00**
VALOR ADICIONAL CONTRATO INCLUYE A.I.U.	**0%**	**N/A**
VALOR TOTAL ADICIONAL DEL CONTRATO INCLUYE AIU	**0%**	**N/A**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1-	**94.95%**	**$$80,972,045.00**
SALDO POR FACTURAR	**5.05%**	**$ 4,306,570.00**

Nota 2: Se aclara que el porcentaje cobrado en el acta final se calculó bajo las condiciones iniciales del proyecto.

CERTFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO IDDRS-CMA-001-2024

3. DATOS DE FACTURACIÓN

N°	NUMERO DE FACTURA	CONCEPTO	VALOR
1	JCFV4	ACTA PARCIAL No.1- DEL CONTRATO - IDDRS-CMA-001-2024, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".	**$$80,927,045.00**

La presente certificación se firma en Sincelejo a los 7 días del mes de noviembre de 2024.

ALEX GIL COVILLA
P.U. Área De Fomento y Desarrollo Deportivo
/Infraestructura y Escenarios Deportivos
Supervisor

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó			
Revisó	JORGE M. DIAZ	Arq. Deportes/Infraestructura Deportiva	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes			

2224

INFORME DEL SUPERVISOR

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	LP-002-2023				
Objeto:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKÚ, EN EL MUNICIPIO DE GALERAS - SUCRE.				
Contratista:	ARCA MEGAPROYECTOS SAS			NIT.	9014740951
Representante Legal:	YUSNEIDY MARIA OROZCO MARQUEZ			C.C.	1.045.306.356
Valor Inicial:	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE.				
Valor Inicial:	$1,154,918,106.00				
Valor Adicional:	$63,295,541.00				
Valor Actualizado:	$1,218,213,647.00				
Anticipo (%)	N/A				
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo adicional:	UN (1) MES	Plazo total:	CUARO (4) MESES
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	723	FECHA: 10/10/2023	CDP ADICIONAL	723- 10/10/2023	
N° De Registro Presupuestal - RP (Inicial)	324	FECHA: 29/04/2024	RP- ADICIONAL	624- 17/09/2024	
Fecha acta de Inicio:	18/6/2024				
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024				
Fecha de Terminación Actualizada:	17/10/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato:	IDDRS-CMA-001-2024				
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".				
Interventor:	JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA				
C.C. / NIT.	1.103.100.955				
Valor Inicial:	OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS.				
Valor Incial:	$85.278.615,00				
Valor Adicional:	N/A				
Valor Actualizado:	N/A				
Anticipo (30%)	N/A				
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo adicional:	UN (1) MES	Plazo total:	CUARO (4) MESES
N° De Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (Inicial)	623	FECHA:	10/10/2023		
N° De Registro Presupuestal (Inicial)	424	FECHA:	29/04/2024		
Fecha acta de Inicio	18/6/2024				
Fecha de Terminación Inicial:	17/9/2024				
Fecha de Terminación Actualizada:	17/10/2024				

POLIZAS

CONTRATO DE OBRA

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$115,491,811.00	10/4/2024	10/7/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y calidad de Obra	$115,491,811.00	10/4/2024	10/7/2029
		Prestaciones sociales	$115,491,811.00	10/4/2024	10/7/2027

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DE MODIFICACIÓN No. 1

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
SURAMERICANA	3907877-7	Cumplimiento	$121,821,364.70	18/6/2024	17/10/2024
		Anticipo	N/A	N/A	N/A
		Estabilidad de y calidad de Obra	$121,821,364.70	17/10/2024	17/10/2029
		Prestaciones sociales	$121,821,364.70	18/6/2024	18/7/2027

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

				desde	hasta
SURAMERICANA	0960219-4	Predios, labores y operaciones	$ 260,000,000.00	18/6/2024	18/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
SEGUROS MUNDIAL		Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	N/A	N/A	N/A
		Calidad Del Servicio	N/A	N/A	N/A

POLIZAS ACTUALIZADAS A LA FIRMA DE MODIFICACIÓN No. 1

Aseguradora	N° De Póliza	Amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
SEGUROS MUNDIAL	100018621	Cumplimiento	$ 8,527,861.50	18/6/2024	20/4/2025
		Buen manejo del anticipo	N/A	N/A	N/A
		Salario, prestaciones sociales, indemnizaciones	$ 4,263,930.75	18/6/2024	20/10/2027
		Calidad Del Servicio	$ 8,527,861.50	15/8/2024	15/9/2029

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

AVANCE DE LA OBRA

CONTRATO DE OBRA

OBRA PROGRAMADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	25.00%	93.50%
Valor de la Obra programada:	$304,553,412	$913,660,235

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Ejecutada (%)	15.16%	94.95%
Valor de la Obra ejecutada:	$235,237,535	$1,156,729,161.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBRA PROGRAMADA

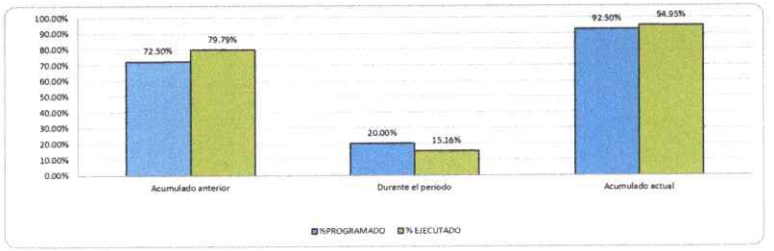
	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	25.00%	93.50%
Valor de la Obra Ejecutada:	$21,319,654	$79,735,505.03

OBRA EJECUTADA

	MENSUAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	15.16%	94.95%
Valor de la Obra Ejecutada:	$36,925,640	$80,972,045

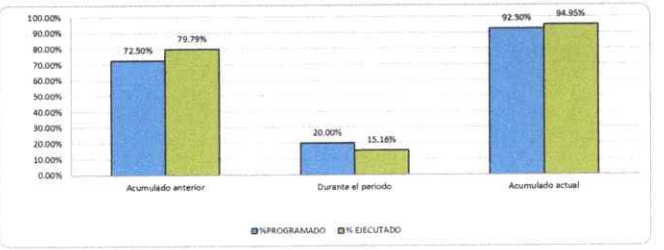
GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	72.50%	79.79%	2.45%
Durante el periodo	20.00%	15.16%	
Acumulado actual	92.50%	94.95%	



GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	72.50%	79.79%	2.45%
Durante el periodo	20.00%	15.16%	
Acumulado actual	92.50%	94.95%	



ACTIVIDADES REALIZADAS

	CONTRATO DE OBRA	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
1	PRELIMINARES		
1.1	Limpieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetral.	  Se observa la ejecución de la actividad de impieza manual de maleza y desmonte de material organico zona perimetra. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las Se realiza actividad de impieza manual   Se identifica por la Interventoría la localización del parque Pelinkú y las áreas a intervenir.

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024 NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".											
INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

1.4	Roceria del área externa de cuerpos de agua	  Se observa la ejecución de la actividad de Roceria del área externa de cuerpos de agua,. Ejecutado 87% (teniendo en cuenta el adicional)	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Roceria del área externa de cuerpos de agua Ejecutado 87% (teniendo en cuenta el adicional)	
1.6	Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza	 Se observa la ejecución de la actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpieza. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la actividad Retiro de material sobrante, de excavación, demolición y limpiezaEjecutado 100%	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CIRCUITOS RAMALES INTERNOS)			
2.1	Suministro e instalación de Acometida principal desde punto de conexión bujes de baja transformador existente hasta Gab. Ppal en 2xNo.2/0F+1xNo.2/0N+1xNo.4T Aluminio S8000	  Se observa Suministro e instalación de Acometida principal desde punto de conexión bujes de baja transformador existente hasta Gab. Ppal en 2xNo.2/0F+1xNo.2/0N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la observa Suministro e instalación de Acometida principal desde punto de conexión bujes de baja transformador existente. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre

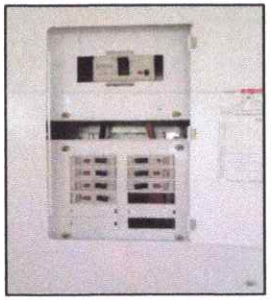
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

2.02	Suministro e instalación de Bajante acometida en tubería imc 2", incluye capacete y cinta de acero inoxidable	 Se observa Suministro e instalación de Bajante acometida en tubería imc 2", incluye capacete y cinta de acero inoxidable. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se Suministro e instalación de Bajante acometida en tubería imc 2", incluye capacete y cinta de acero inoxidable. Ejecutado 100%	
2.07	Suministro e instalación de Gabinete Principal GAB PPAL tipo exterior con breakers industriales para alimentadores y control de iluminación acorde a diagrama unifilar, incluye DPS	 Se observa el Suministro e instalación de Gabinete Principal GAB PPAL tipo exterior con breakers industriales para alimentadores y control de	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Suministro e instalación de Gabinete Principal GAB PPAL tipo exterior con breakers industriales para alimentadores y control de iluminación acorde a diagrama unifilar, incluye DPS. Ejecutado 100%	 
2.11	Suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000	 Se observa la ejecución de la actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutaado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD1 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutaado 100%	

Gobernación de Sucre


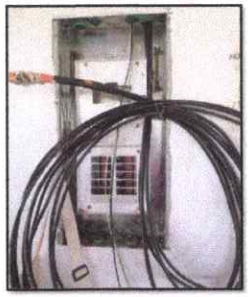

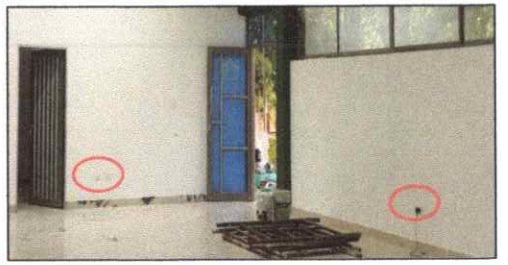
Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

2.12	suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000	  Se observa la ejecución de la actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutad 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. la actividad 'suministro e instalación de Alimentador de GAB PPAL a TD2 en 2x#4F+1x#4N+1xNo.4T Aluminio S8000. Ejecutad 100%	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS (ILUMINACIÓN, TOMAS Y ESPECIALES)			
2.20	Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	 Se observa la ejecución de la Actividad de Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación salida tomacorriente doble con polo a tierra en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación e instalación de salida para luminaria led soporte vertical de 40w. Ejecutado 100%	
2.21	Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	 Se observa la ejecución de la Actividad Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad Suministro e instalación salida tomacorriente GFCI doble en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC 1/2", accesorios y demás elementos de fijación. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

2.22	Suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	 Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 100%	
2.23	Suministro e instalación switch o interruptor manual sencillo de encendido iluminación en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	 Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 100%	
2.24	Suministro e instalación switch o interruptor manual doble de encendido iluminación en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijación	 Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 29%	

Gobernación de Sucre


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

2.25	Suministro e instalación de Tablero bifásico 12 circuitos, incluye sus protecciones	  Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 50%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la Actividad de suministro e instalación salida iluminación y ventiladores (incluye emergencia y avisos) en conductor 3xNo.12 libre de halógeno, tubería PVC SCH40 1/2", accesorios y demás elementos de fijaciónn. Ejecutado 100%	
2.26	Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar	 Se observa la ejecución de la Actividad 'Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar. Ejecutado 33%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Ejecución de la Actividad 'Suministro e instalación panel led redondo 12w para incrustar. Ejecutado 33%	
2.27	Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar	 Se observa la ejecución de la Actividad Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación panel led redondo 18w para incrustar. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre



Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

2.28	Suministro e instalación de ventiladores de techo	 Se observa la ejecución de la actividad 'Suministro e instalación de ventiladores de techo. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. 'Suministro e instalación de ventiladores de techo. Ejecutado 100%	
2.29	Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w	 Se observa la ejecución de la actividad 'Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad 'Suministro e instalación de luminaria led hermética 2x18w. Ejecutado 100%	
2.30	Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse	 Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse. Ejecutado 33%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de lámpara led emergencia, tipo mickey mouse. Ejecutado 33%	

Gobernación de Sucre


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

2.31	Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA	  Se observa la ejecución de la actividad de 'Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA. Ejecutado 10%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de 'Suministro e instalación de Aviso señalización SALIDA. Ejecutado 100%	
2.32	Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados	 Suministro e instalación de salida para Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados. Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Lámpara led tipo tortuga 20W (incluye la luminaria) en kioscos con tubería EMT 3/4 y accesorios galvanizados. Ejecutasdo 100%	
2.33	Suministro e instalación de salida para aire acondicionado, incluye suministro aire 18000 btu	  Suministro e instalación de salida para aire acondicionado, incluye suministro aire 18000 btu. Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Suministro e instalación de salida para aire acondicionado, incluye suministro aire 18000 btu. Ejecutasdo 100%	

Gobernación de Sucre


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

3	ACABADOS				
3.1	Pintura vinilo muros (3 manos)	 Se observ la ejecución de la actividad de Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutasdo 59%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutasdo 59%		
3.2	Mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura aticorrosiva	  Se observ la ejecución de la actividad Mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura aticorrosiva. Ejecución 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Mantenimiento general de puertas existentes incluye pintura aticorrosiva . Ejecición 100%	 	
3.4	Suministro e intalacion de cielo raso en Drywall	  Se observ la ejecución de la actividad de Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutasdo 70%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Pintura vinilo muros (3 manos). Ejecutasdo 70%		

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

3.5	Mantenimiento de fachada existente en SUPERBOARD	 Se observ la ejecución de la actividad de Mantenimiento de fachada existente en SUPERBOARD Ejecutasdo 50%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Mantenimiento de fachada existente en SUPERBOARDEjecutasdo 50%	
3.6	Pintura acrilica de marcacion continua para bordillo (linea perimetral ancho 15 cm, altura 15 cm)	  Se observ la ejecución de la actividad de Mantenimiento de fachada existente en SUPERBOAPintura acrilica de marcacion continua para bordillo (linea perimetral ancho 15 cm, altura 15 cmD Ejecutasdo 55%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Mantenimiento Pintura acrilica de marcacion continua para bordillo (linea perimetral ancho 15 cm, altura 15 cm. Ejecutasdo 55%	
3.7	Pintura acrilica de demarcación	 Se observ la ejecución de la actividad de Pintura acrilica de demarcación Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Mantenimiento Pintura acrilica de demarcación . Ejecutasdo 100%	

Gobernación de Sucre

Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

3.9	Suministro e instalación de baranda en tuberia galvanizada de 2" incluye pintura	Se observ la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de ventanas en aluminio Ejecutasdo 100%  Se observ la ejecución de Suministro e instalación de baranda en tuberia galvanizada de 2" incluye pintura Ejecutasdo 100%	Actividad Suministro e instalación de ventanas en aluminio Ejecutasdo 100% La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación de baranda en tuberia galvanizada de 2" incluye pintura. Ejecutasdo 100%	
3.10	Mantenimiento de baranda existente de 2"	 Se observ la ejecución Mantenimiento de baranda existente de 2"Ejecutasdo 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Mantenimiento de baranda existente de 2". Ejecutasdo 100%	
4	ELEMENTOS URBANOS PREFABRICADOS			
4.1	Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Suministro e instalación de Adoquin de cemento Seccion: 0,20x0,10 metros Color: Gris. Incluye material de base. Ejecutado 100%	

Gobernación de Sucre | Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

7	FITOTECTURA PARQUE PELINKÚ			
7.1	Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp)	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp). Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro e instalación de grama natural. (Incluye 10 cm de tierra negra de esp). Ejecutado 100%	
7.2	Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores	  Se observa la ejecución de la actividad de Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Suministro y siembra de plantas ornamentales zonas verdes exteriores. Ejecutado 100%	
7.3	Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajístico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación	 Se observa la ejecución de la actividad de Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajístico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación. Ejecutado 68%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Siembra de arboles maderables y frutales tipo paisajístico 1.5 m<h<2m (incluye tierra, abono, tutor, transporte y disposición final de escombros a 28 km). suministro y plantación. Ejecutado 68%	

Gobernación de Sucre


Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Sucre - INDERSUCRE

INSTITUTO DE DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDDRS- CMA-001-2024

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA ERL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO RECREACIONAL PELINKU, MUNICIPIO DE GALERA".

INFORME DE SUPERVISIÓN:	MENSUAL N°.3 -	ACTA PARCIAL N°.1-	PERÍODO DE:	21/08/2024	HASTA	17/09/2024	SUPERVISOR:	ALEX GIL COVILLA	P.U. Á. FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO/INFRAESTRUCTURA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS	FECHA DE ELAVORACIÓN:	12/10/2024

7.4	Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp.	  Se observa la ejecución de la actividad de Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Se observa la ejecución de la actividad de Adecuación de terreno para especies vegetales con tierra negra a 10 cm esp. Ejecutado 100%	
8	PISOS			
8.3	Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado	  Se observa la ejecución de la actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% proctor modificado. Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad de Relleno con material seleccionado compactado a rana 95% procEjecutado 100%tor modificado.	
8.8	Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota	  Se observa la ejecución de la actividad Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 100%	La interventoría realiza vigilancia y control en la ejecución de las obras. Actividad Suministro e instalación de madera plastica WPC 70% polimero 30% fibra natural resistente a la intemperie para muelle y puente, color terracota . Ejecutado 100%	
