República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023

Cumaral, Meta. 16 de enero de 2025

Ingeniero
JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal

Ref. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN – LIQUIDACIÓN CONTRATO No. SAMC-004-2024

1. INTRODUCCION


Con ocasión a la ejecución del contrato **SAMC-004-2024** cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVOS VIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL Y CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META".** celebrado entre el **Municipio de Cumaral** y la **UNIÓN TEMPORAL SEÑALES VIALES** identificada con **NIT No. 901.886.137-0** y dando cumplimiento a las funciones de la supervisión de obra, a continuación, se presenta el informe ejecutivo de supervisión correspondiente a **LIQUIDACIÓN.**

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SEÑALES VIALES
NIT No 901.886.137-0
R/L: DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS
C.C. 86.048.318 de Villavicencio

SUPERVISOR: ALCALDIA DE CUMARAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
SECRETARIO DE GOBIERNO: FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ


1. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El municipio de Cumaral situado en el departamento del Meta, Se encuentra a 23 km de la capital del departamento, en la región del Piedemonte del departamento del Meta; el cual se encuentra en la región de la Orinoquia colombiana, el municipio limita por el Norte: Paratebueno, Oeste: Restrepo, Este: Cabuyaro y Sur: Restrepo.

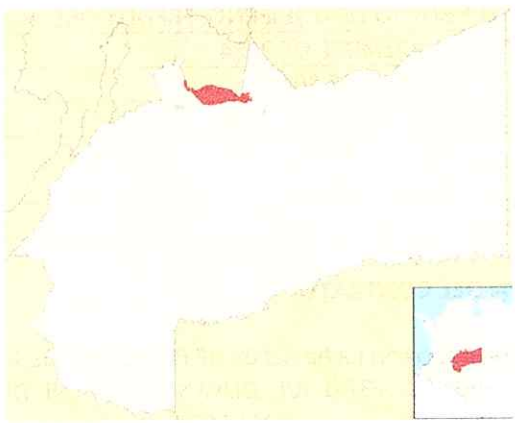

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023

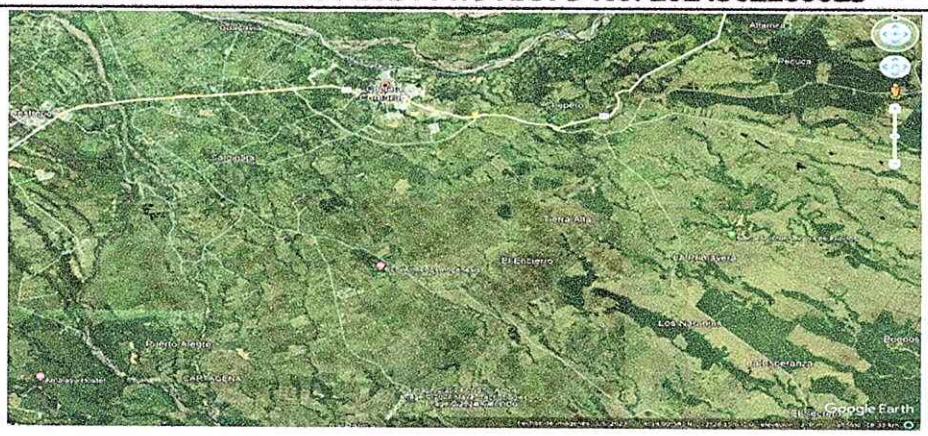

2. CONTRATO DE OBRA

1.1 Información General

CONTRATO No.	SAMC-004-2024
TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SEÑALES VIALES NIT 901.886.137.-0 R/L DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS C.C. 86.048.318 de Villavicencio
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPOSITIVOS VIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL Y CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($257.463.727,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO SECRETARIO DE GOBIERNO: FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
ACTA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	08 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO:	N/A
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que, mediante acta de inicio con fecha del 09 DE DICIEMBRE DE 2024, da la autorización a la UNIÓN TEMPORAL SEÑALES VIALES CON NIT. 901.886.137-0 R/L DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS C.C. 86.048.318 de Villavicencio para que inicie con la ejecución del contrato SAMC-004-2024, me permito informar que, a la fecha del

presente informe, el contratista ejecuto el 100% de las actividades contratadas, por lo cual, se cumplió satisfactoriamente con alcance definido en el contrato.

El proyecto de mejoramiento de señalización vial no solo logró cumplir con las actividades previstas, sino que también alcanzó un impacto mayor gracias a la colaboración activa de las veredas y la industria del municipio. La voluntad e iniciativa de estas fueron fundamentales, ya que aportaron viajes de material, lo cual permitió no solo alcanzar las metas establecidas, sino ampliarlas significativamente. Además, permitió optimizar los recursos financieros y logísticos del proyecto, facilitando la ejecución de trabajos adicionales sin incurrir en sobrecostos.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Registro Presupuestal

RP N°	FECHA	RUBRO	VALOR
1057	05/12/2024	24.09.0600.009-2024502260023-1.2.1.0.00	35.000.000.00
1057	05/12/2024	24.09.0600.009-2024502260023-1.3.3.3.17	13.065.809.50
1057	05/12/2024	45.01.1000.026-2024502260034-1.3.3.1.17	209.397.917.50

4.2 BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

VALOR INICIAL	VALOR MODIFICADO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$257.463.727,00	N/A	$0	$ 257.463.727,00

Lo anterior, en razón a que la FORMA DE PAGO establecida se contempló así: EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: **UN UNICO PAGO FINAL** con la liquidación del contrato, previa presentación de informes mensuales, acreditación del pago de seguridad social del personal y demás requisitos de supervisión, cumplimiento, terminación y liquidación cuando sea el caso, así como el cumplimiento general de las obligaciones del pago de la seguridad social integral del y parafiscales.

4.3 Giros Realizados Por Concepto de Anticipo

RELACIÓN DE PAGOS DEL PROYECTO						
CONCEPTO	COMP. EGRESO	ORDEN DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
					TOTAL	

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS

PRÓRROGAS		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES Y REINICIOS		
ACTA N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL N°	PLAZO (MESES / DÍAS CALENDARIO)	FECHA DE CELEBRACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES				
ACTA N°	MAYORES CANT.	MENORES CANT.	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE CELEBRACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. CONTROL DE GARANTÍAS

El contratista **UNIÓN TEMPORAL SEÑALES VIALES** entregó a la entidad contratante las pólizas de seguro N° 11-40-101071625 y N°11-44-101242819 expedidas por **ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO,** las cuales se describen a continuación, cumpliendo con los requisitos de valor amparado y vigencia exigidos en el contrato SAMC-004-2024, así:

Actualizadas con Acta de Recibo Final:

PÓLIZA N°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR AEGURADO
		DESDE	HASTA	
11-44-101242819	CUMPLIMIENTO	05/12/2024	05/01/2030	$ 25.746.373
11-44-101242819	PAGO DE SALARIOS	05/12/2024	05/01/2030	$ 12.873.187
11-44-101242819	CALIDAD	05/12/2024	05/01/2030	$ 25.746.187
11-40-101071625	RESPONSABILIDAD CIVIL	05/12/2024	05/01/2025	$ 260.000.000,00

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral


INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



1. BARRIO VILLA CLAUDIA CALLE PPAL - ENTRE MANZANA 10.80 metros

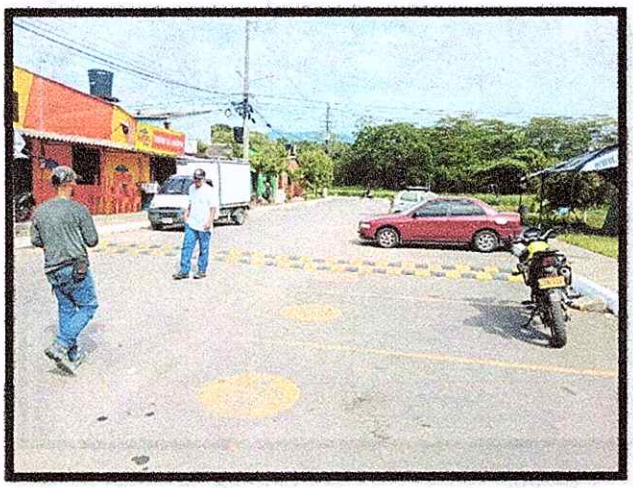

2. BARRIO VILLA CLAUDIA CALLE PPAL - ENTRE MANZANA 10.80 metros




3. BARRIO VILLA CLAUDIA CALLE PPAL - ENTRE MANZANA 10.80 metros



4. BARRIO VILLA CLAUDIA CALLE PPAL – MANZANA 5.93 metros



5. BARRIO VILLA CLAUDIA CARRERA 6A – CALLE
5.65 metros

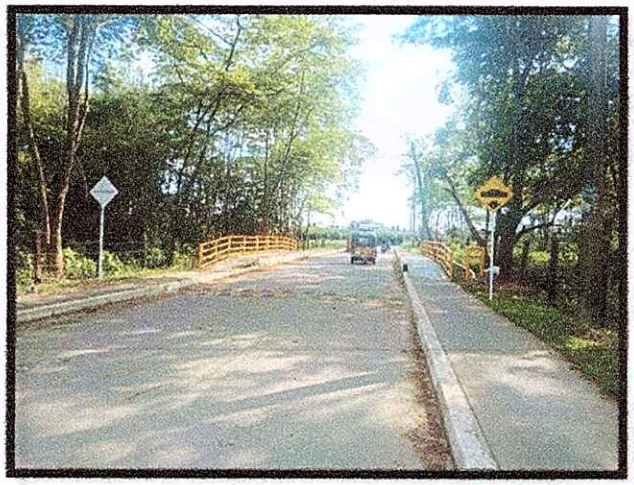

6. BARRIO VILLA CLAUDIA CARRERA 6A - PUENTE
5.65 metros



7. CARRERA 6A - CALLE 20
5.94 metros



8. CALLE 20 - ENTRE CRA 7 y CRA 8
5.94 metros


República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN


CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023




9. CALLE 20 - ENTRE CRA 7 y CRA 8
5.94 metros

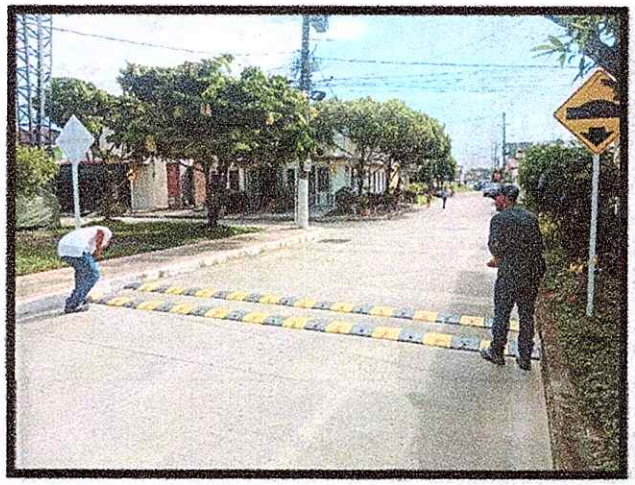


10. CALLE 19 - ENTRE CRA 6A y CRA 7a
5.94 metros

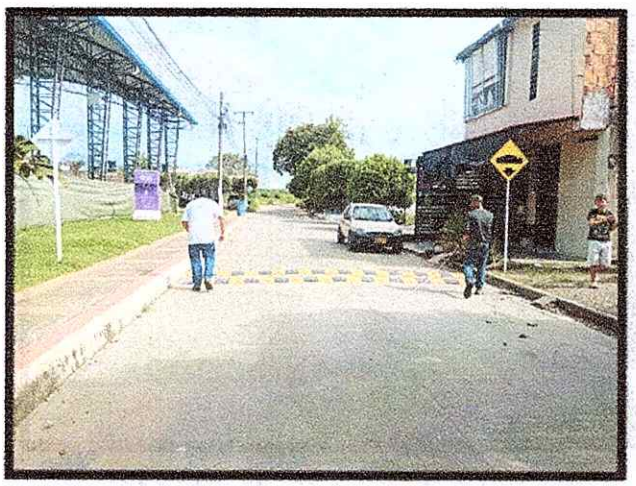

11. CARRERA 6A - ENTRE CALLE 19 y CALLE 18B
5.67 metros

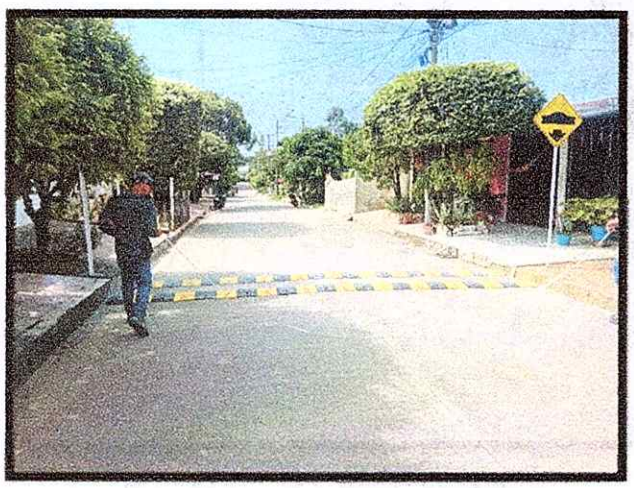

12. CARRERA 6A - ENTRE CALLE 19 y CALLE 18B
5.94 metros

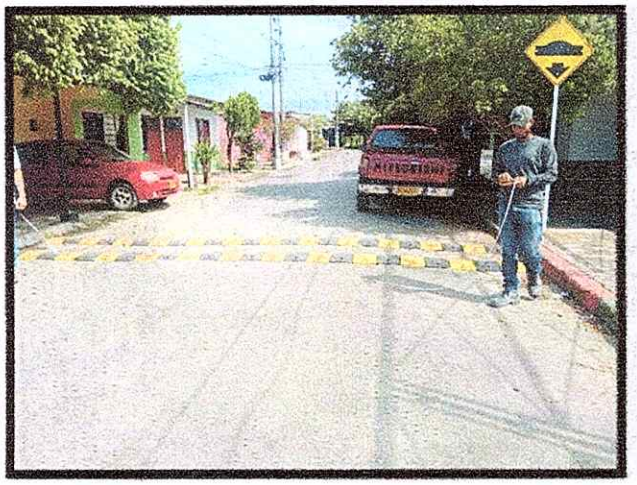

13. CRA 11 - ENTRE CALLE 16B y CALLE 17
6.47 metros



14. CRA 11 - ENTRE CALLE 17 y CALLE 17A
6.75 metros



15. CALLE 18 - ENTRE CRA 15 y CRA 15A
7.05 metros



16. CALLE 18 - ENTRE CRA 16 y CRA 16A
6.77 metros

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023



17. CALLE 18 - CRA 17
6.75 metros




CRA 18 - ENTRE CALLE 16A y CALLE 17
5.46 metros



19. CRA 17 - ENTRE CALLE 16 y CALLE 16A
5.45 metros



20. CRA 17 - ENTRE CALLE 14 y CALLE 15A
5.43 metros

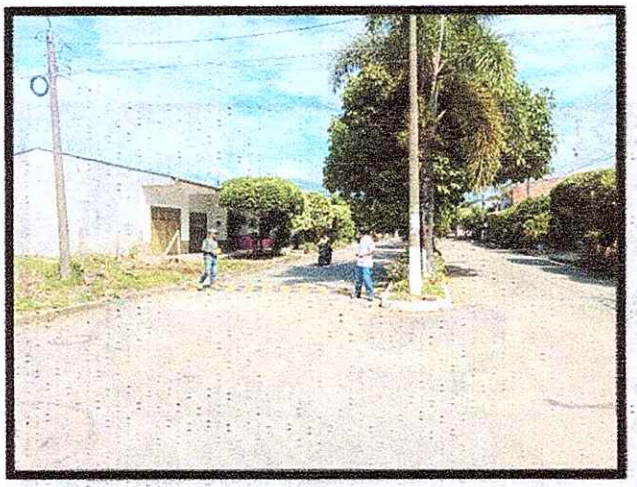

21. CRA 17 - ENTRE CALLE 14 y CALLE 13
5.68 metros



22. CALLE 14 - ENTRE CRA 16A y CRA 17
8.90 metros



23. CALLE 14 - ENTRE CRA 16 y TRONCAL AL LLANO
8.65 metros




24. CRA 18 - CALLE 14
11.05 metros


República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023

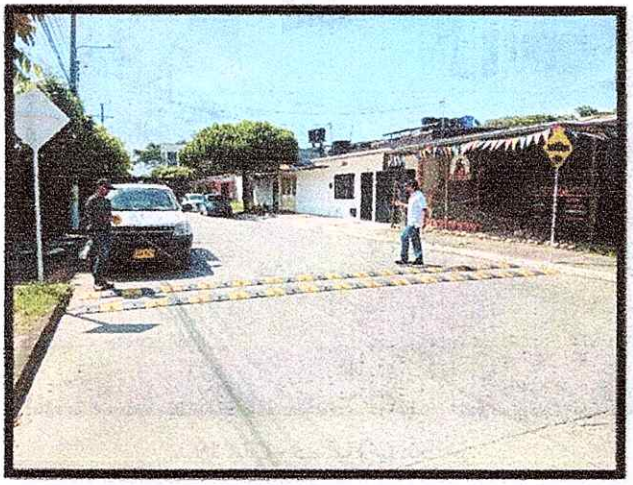

25. CRA 18 - ENTRE CALLE 15A y CALLE 16
8.10 metros

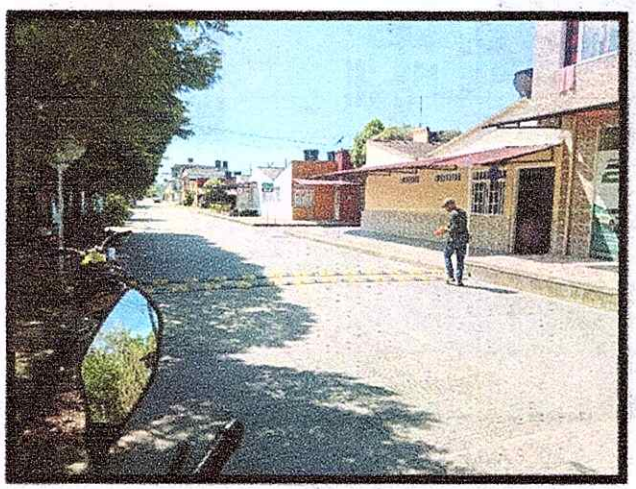

26. CRA 18 - ENTRE CALLE 18 y CALLE 19
7 metros



27. CRA 18 - ENTRE CALLE 19A y CALLE 20
6.73 metros



28. CALLE 23A - CRA 18A
4.58 metros




29. CALLE 23 - ENTRE CRA 18A y CRA 18B
5.68 metros



30. CALLE 23 - CRA 19
5.95 metros



31. CALLE 21 - CRA 18C
5.97 metros

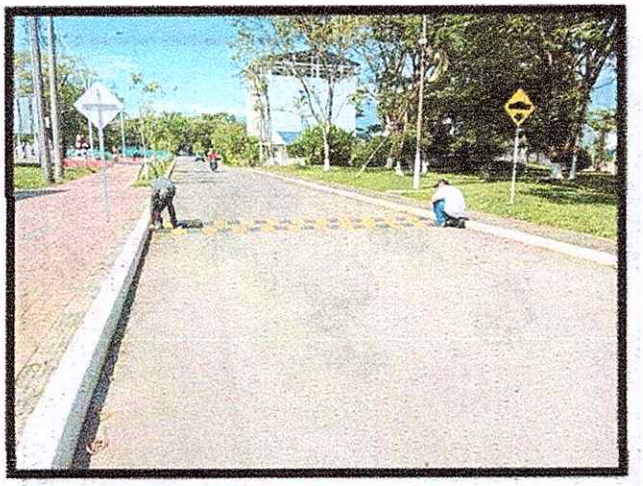

32. CALLE 14 - CRA 18B COLISEO DEL PUEBLO
5.95 metros

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN


CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023




33. CALLE 13 - ENTRE CRA 12A y CRA 13
5.70 metros



34. CALLE 13 - CRA 13
6.48 metros

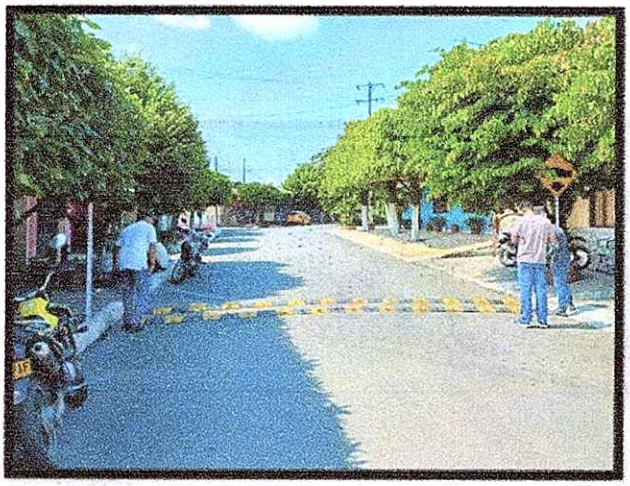

35. CALLE 13 - ENTE CRA 13 y CRA 14
6.48 metros

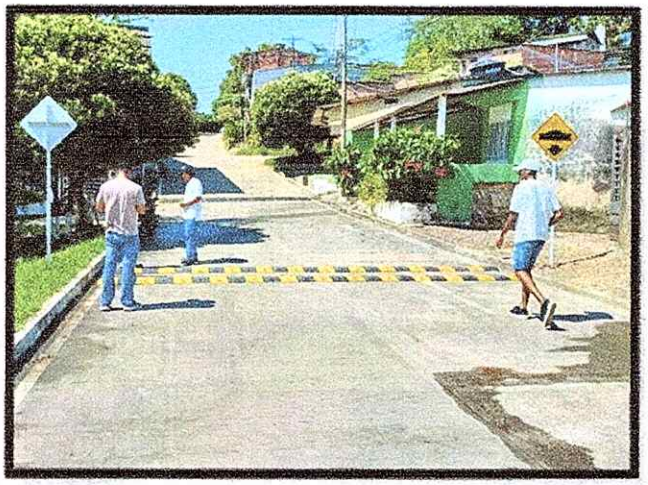

36. CALLE 10A - CRA 14
6.74 metros



37. CRA 14 - ENTRE CALLE 11 y CALLE 12
6.75 metros



38. CRA 17 - ENTRE CALLE 10 y CALLE 10A
8.40 metros y 8.11 metros



39. CRA 19 - ENTRE CALLE 9 y CALLE 10
5.40 metros



40. CRA 19 - ENTRE CALLE 9 y CALLE 8
5.94 metros


República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023



41. CRA 19 - ENTRE CALLE 6A y CALLE 7ª
6.74 metros

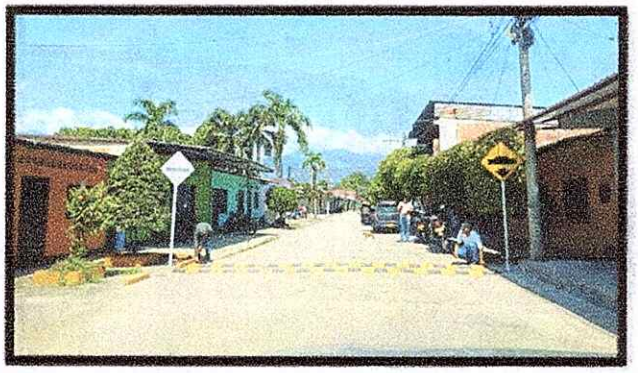

42. CRA 19 - ENTRE CALLE 5A y CALLE 6A
5.93 metros



43. CRA 20 - ENTRE CALLE 5A y CALLE 6A
9.46 metros



44. CRA 21 - ENTRE CALLE 8 y CALLE 9
10.26 metros



45. CRA 21 - ENTRE CALLE 9 y CALLE 8
9.99 metros



46. BARRIO OASIS CALLE 3A - ENTRE CALLE VIA CUMARAL Guacavía y CRA 1
5.95 metros



47. BARRIO OASIS CALLE 3A - ENTRE CRA 1 y CRA 2
5.96 metros



48. BARRIO OASIS CALLE 2A - ENTRE CRA 1 y CRA 2
5.41 metros



49. BARRIO OASIS CALLE 2A - ENTRE CALLE VIA CUMARAL
Guacavía y CRA 1
5.40 metros



50. FUNDACION CAMINOS LA ESPERANZA
VEREDA CANEY MEDIO
4.05 metros



51. HOGAR SAN JOSE VEREDA CANEY MEDIO
4.05 metros




52. VIA CANEY MEDIO - CANCHA SINTETICA CRUCE
5.67 metros

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN


CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023

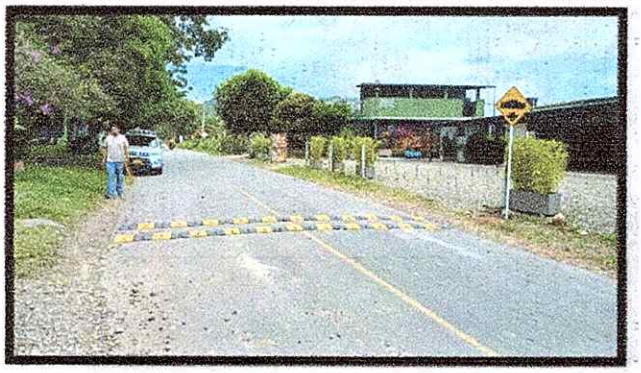

53. VIA CANEY MEDIO - CANCHA SINTETICA
5.95 metros



54. VIA CANEY MEDIO - CRUCE CUATRO ESQUINAS
5.96 metros

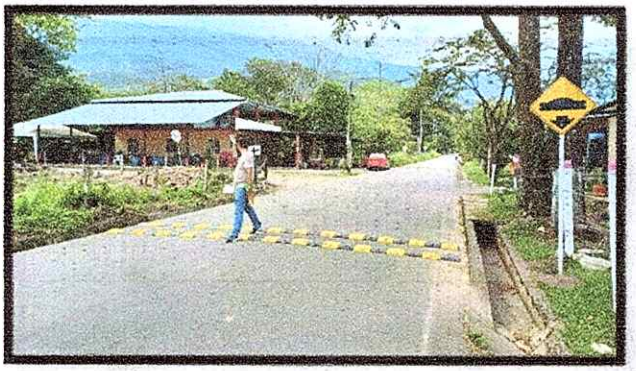

55. VIA CANEY MEDIO - CRUCE CUATRO ESQUINAS
6.49 metros



56. VIA CANEY MEDIO - VIA ANTIGUA CUMARAL
5.42 metros



57. VIA CANEY MEDIO - VIA ANTIGUA CUMARAL
5.40 metros




58. VIA YARI - HOGAR SAN GABRIEL
4.87 metros



59. VIA YARI - INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIANA VISION AGAPE
4.87 metros



60. VIA YARI - INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIANA VISION AGAPE
4.88 metros

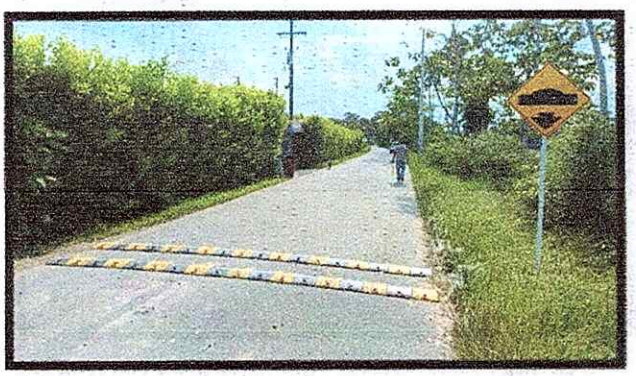

61. VIA YARI - COLEGIO BETHEL CHILDREN CAMPESTRE
4.88 metros



62. VIA YARI - COLEGIO BETHEL CHILDREN CAMPESTRE
4.87 metros



63. VIA ANTIGUA CUMARAL - GIULIO NATTA CENTRO DI ENNIOVAZIONES
5.88 metros



64. VIA ANTIGUA CUMARAL - GIULIO NATTA CENTRO DI ENNIOVAZIONES
5.88 metros

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023



65. VIA ANTIGUA CUMARAL –
ENTRE SANTA ROSITA y NATURELA
4.60 metros



66. VIA ANTIGUA CUMARAL -
ENTRE SANTA ROSITA y NATURELA
4.86 metros



67. CALLE 12 - CRA 16
5.95 metros



68. CALLE 12 - CRA 16
5.67 metros

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SAMC-004-2024 PROYECTO No. 2024502260023

CONCLUSIONES

- De acuerdo a las obligaciones contractuales, la **UNION TEMPORAL SEÑALES VIALES** con **Nit. 892099184-9**, cuyo representante legal es el DUVAN GEOVANNI DIAZ VARGAS, llevo a cabo la instalación de 863,37 metros lineales de reductores de velocidad y 104 señales verticales, con lo cual, ha ejecutado el 100% de las actividades contratadas. Por lo anteriormente descrito, la supervisión del contrato APRUEBA, y considera pertinente y procedente realizar el pago FINAL (único pago) que equivale a DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($257.463.727,00) MCTE correspondiente al 100% del valor del contrato.

- La secretaria de gobierno, quien tiene como a cargo el PLAN DE SEGURIDAD VIAL, lleva a cabo el desarrollo del contrato SAMC-004-2024, teniendo a cargo la decisión de la disposición final donde se instalo los reductores de velocidad, teniendo en cuenta la necesidad inherente que llevo a cabo el desarrollo del presente contrato y a solicitudes hechas por los presidentes de junta de acción comunal.

- Por lo mencionado anteriormente, y en el marco de la ejecución del contrato, la Secretaria de Infraestructura llevo a cabo la supervisión técnica del presente contrato, por esta razón, la localización de los puntos donde se instalaron los reductores de velocidad, así como su respectiva señalización y demás directrices fue por disposición de la secretaria de gobierno.

Atentamente,

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
Secretario de Gobierno

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISO	REVISO
NOMBRE		Freddy Yiber Cortes Jiménez	Juan Eduardo Martínez Turriago
CARGO		Secretario de Gobierno	Secretario de Infraestructura
FIRMA			
