
Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidades de medida	cantidades a ejecutar	Predecesoras
0		**0**	**CONSTRUCCIÓN DE COMANDO DE ATENCION INMEDIATA FIJO SANTA HELENA, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META**	**42 días**	mié 27/11/24	vie 21/02/25			
1		1	INICIO	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24			
2		**2**	**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**37 días**	mié 27/11/24	vie 14/02/25			
3		2.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	M2	56,79	1CC
4		2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	ML	46,7	1CC
5		2.3	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	2 días	jue 28/11/24	vie 29/11/24	M2	144,35	3
6		2.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	35 días	vie 29/11/24	vie 14/02/25	M3	123,95	5FC-1 día
7		2.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	22 días	jue 12/12/24	lun 10/02/25	M3	103	12
8		2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	15 días	lun 2/12/24	vie 20/12/24	M3/KM	2020,39	6CC+1 día
9		2.7	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	4 días	jue 6/02/25	mar 11/02/25	ML	237,04	4
10		**3**	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO**	**23 días**	jue 28/11/24	mar 28/01/25			
11		3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	2 días	jue 28/11/24	vie 29/11/24	M3	0,89	6CC-1 día
12		3.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	7 días	mar 3/12/24	mié 11/12/24	M3	2,27	11;22
13		3.3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	7 días	vie 29/11/24	lun 9/12/24	M3	4,97	11CC+1 día
14		3.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	7 días	mar 3/12/24	mié 11/12/24	M3	3,17	12CC
15		3.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	7 días	jue 12/12/24	vie 20/12/24	M3	2,23	14
16		3.6	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3 días	lun 16/12/24	mié 18/12/24	M3	5,37	15CC+2 días
17		3.7	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3 días	lun 23/12/24	mié 25/12/24	M3	6,81	15
18		3.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	4 días	jue 12/12/24	mar 17/12/24	M3	21,56	14
19		3.9	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24	ML	4,48	18
20		3.10	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	jue 26/12/24	mar 28/01/25	KG	164,48	23
21		3.11	MALLA ELECTROSOLDADA REFM188 6MM 15X15FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	jue 26/12/24	lun 27/01/25	KG	782,72	23
22		3.12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	3 días	jue 28/11/24	lun 2/12/24	KG	1992,73	3
23		3.13	PLACA ALIG/C. GUAD e=0.35m,27,6MPa(4000)	2 días	mar 24/12/24	mié 25/12/24	M2	47,52	15FC+1 día;1
24		**4**	**RELLENOS E INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y SANITARIAS**	**27 días**	mié 18/12/24	vie 21/02/25			
25		4.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE ACERO DE REFUERZO E INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	UN	2,00	4;6
26		4.2	ARENA LAVADA RIO (Planta) Inc. Sum, transp, ins	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	M3	16,48	30;18FF-2 días
27		4.3	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24	ML	11,63	18
28		4.4	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT.EXT PVC	1 día	mié 18/12/24	mié 18/12/24	ML	5,56	18
29		4.5	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT.EXT PVC	2 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24	ML	8,32	18
30		4.6	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	2 días	lun 17/02/25	mar 18/02/25	ML	11,10	6
31		4.7	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 18/12/24	mié 18/12/24	ML	6,04	18
32		4.8	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	UN	2,00	31
33		4.9	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	UN	3,00	29;18
34		4.10	YEE D=4 PVC SANITARIO	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	UN	1,00	29;18
35		4.11	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	UN	1,00	29;18
36		4.12	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	1 día	vie 20/12/24	vie 20/12/24	UN	2,00	29;18
37		4.13	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	3 días	vie 20/12/24	mar 24/12/24	UN	1,00	29;18
38		**5**	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**12 días**	jue 6/02/25	vie 21/02/25			
39		5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	6 días	jue 6/02/25	jue 13/02/25	M2	46,45	16CC+1 día
40		5.2	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO .10X.15 D=2 DE 1/2 Y FLEJES EN 3/8	2 días	jue 6/02/25	vie 7/02/25	ML	7,00	16
41		5.3	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN INCLUYE REFUERZO	2 días	lun 10/02/25	mar 11/02/25	M3	0,53	40
42		5.4	PAÑETE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	4 días	vie 14/02/25	mié 19/02/25	M2	159,76	39
43		5.5	GRANITO PULIDO EN MESON	2 días	lun 17/02/25	mar 18/02/25	M2	6,25	44
44		5.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	M3	0,76	39
45		5.7	ESTUCO PLASTICO	2 días	jue 20/02/25	vie 21/02/25	M2	64,13	42
46		5.8	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	2 días	jue 20/02/25	vie 21/02/25	M2	172,92	45FF
47		5.9	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	5 días	mié 12/02/25	mar 18/02/25	M2	45,92	41
48		5.10	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR	5 días	mar 11/02/25	lun 17/02/25	M2	47,52	23
49		**6**	**INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS**	**6 días**	vie 14/02/25	vie 21/02/25			
50		6.1	SUMINISTRO Y TENTIDO ACOMETIDA BIFASICA CABLE CONCENTRICO 2X8+8	2 días	mar 18/02/25	mié 19/02/25	ML	40,00	60
51		6.2	BAJANTE GALVANIZADA EN DUCTO IMC DE 1" X 3 METROS	1 día	mar 18/02/25	mar 18/02/25	UND	4,00	60
52		6.3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UND	1,00	6
53		6.4	CAJA PARA ALUMBRADO PUBLICO AP 280	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	6
54		6.5	CANALIZACION PARA 1 DUCTO DE PVC 1"	1 día	mar 18/02/25	mar 18/02/25	ML	30,00	60
55		6.6	SUMIN. E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	UND	1,00	54;39
56		6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIN DE CORTE BIFASICO	1 día	mar 18/02/25	mar 18/02/25	UND	1,00	53
57		6.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	UN	1,00	55
58		6.9	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA INCLUYE BREAKERS	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25	UND	1,00	57
59		6.10	ACOMETIDA PARCIAL EN COBRE 2(F) No. 8 +1(T)No. 8 EN DUCTO PVC 1"	2 días	mar 18/02/25	mié 19/02/25	ML	12,00	53
60		6.11	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	6
61		6.12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	vie 14/02/25	mar 18/02/25	PTO	8,00	39
62		6.13	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	PTO	1,00	39
63		6.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA PVC SCH40 Y CABLE DE COBRE No 12 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	UND	18,00	39
64		6.15	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	UN	6,00	39
65		6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 W	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	UND	14,00	39
66		6.17	REFLECTOR 28 LED NW-RGB-MATRIX ILUMINACION PLAZOLET	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	UN	4,00	39
67		6.18	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+1No. 14) L= 10m	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	PTO	1,00	39
68		6.19	SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	UN	3,00	39
69		6.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR BIFASICO	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	UND	1,00	39
70		6.21	SUMIN Y MONTAJE CAJA DE PASO METALICA 10X 10 CM	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	69
71		6.22	SALIDA TV PVC	2 días	vie 14/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	39
72		6.23	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	3 días	mié 19/02/25	vie 21/02/25	UN	1,00	61
73		6.24	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" TIPO PESADO	2 días	jue 20/02/25	vie 21/02/25	ML	18,83	55
74		6.25	SALIDA DE VOZ Y DATOS	1 día	jue 20/02/25	jue 20/02/25	UN	3,00	55
75		**7**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**40 días**	**mié 27/11/24**	**mié 19/02/25**			
76		7.1	ACOMETIDA DOMIC.ACUE6X1/2"MANG10M,ACCE,REG YCAJIL	3 días	vie 14/02/25	mar 18/02/25	UN	1,00	78FF
77		7.2	MICRO MEDIDOR AGUA 11/2"	1 día	mié 19/02/25	mié 19/02/25	UN	1,00	76
78		7.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC+A96:BH113F97A96:BH115	3 días	vie 14/02/25	mar 18/02/25	ML	22,65	39
79		7.4	AGUA POTABLE PVC 1000 LT CON TAPA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1" - 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	UN	1,00	
80		7.5	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	PTO	5,00	79CC
81		7.6	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	UN	1,00	80CC
82		7.7	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	1 día	mié 27/11/24	mié 27/11/24	UN	2,00	79CC
83		**8**	**PISOS Y ACABADOS**	**25 días**	**jue 19/12/24**	**jue 20/02/25**			
84		8.1	ABUZARDAJE DE CONCRETO	3 días	jue 19/12/24	lun 23/12/24	M2	68,02	16
85		8.2	AFINADO PISOS MORTER01:4 e=50 mm	3 días	vie 14/02/25	mar 18/02/25	M2	79,17	90
86		8.3	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	3 días	mar 28/01/25	jue 30/01/25	M2	2,34	18
87		8.4	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	5 días	vie 14/02/25	jue 20/02/25	M2	16,11	90
88		8.5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	2 días	mié 29/01/25	jue 30/01/25	ML	24,99	86FF
89		8.6	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	1 día	vie 14/02/25	vie 14/02/25	M2	18,98	39
90		8.7	PLACA CONTRAPISO e = 15 cm(27.6Mpa,4000psi)	3 días	mar 11/02/25	jue 13/02/25	M2	42,15	7
91		**9**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**1 día**	**lun 17/02/25**	**lun 17/02/25**			
92		9.1	SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	89
93		9.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	89
94		9.3	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	89
95		9.4	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	89
96		9.5	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum anticu	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	1,00	89
97		9.6	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	M2	0,48	89
98		**10**	**CARPINTERIA METALICA Y BLINDAJE**	**11 días**	**vie 7/02/25**	**vie 21/02/25**			
99		10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	6 días	vie 7/02/25	vie 14/02/25	UN	1,00	
100		10.2	SUM E INST VENTANA CON VIDRIO SEGURIDAD NIVEL 3	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	M2	15,35	99
101		10.3	SUM EINST PUERTA PRINCIPAL 2.3X1 ESPEC POLICIA NA	5 días	lun 17/02/25	vie 21/02/25	UN	1,00	99
102		10.4	SUM E INST COMPUERTA DE ESCAPE, ESEPC POLICIA NACI	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	UN	1,00	99
103		10.5	SUM E INST PERSIANA DE VENTILACION 0,60X0,25 POLIC	2 días	lun 17/02/25	mar 18/02/25	UN	1,00	99
104		10.6	SUM EINST PUERTA INTERNA ESPE POLICIA NACIONAL	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	UN	3,00	99
105		10.7	SUMIN EINST ASTA BANDERAS LARGO 4 MTS	2 días	lun 17/02/25	mar 18/02/25	UN	3,00	99
106		10.8	ESCUDO Y LETRAS POLICIA NACIONAL	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	UN	1,00	99
107		10.9	MIRILLAS - LAMINA Cold Rolled CALIBRE 18	3 días	lun 17/02/25	mié 19/02/25	UN	6,00	99
108		**11**	**OBRAS EXTERIOR Y PAISAJISMO**	**23 días**	**jue 19/12/24**	**mar 18/02/25**			
109		11.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	4 días	mar 11/02/25	vie 14/02/25	ML	39,50	7
110		11.2	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm EXC-TRAN	2 días	vie 7/02/25	lun 10/02/25	ML	38,95	7FF
111		11.3	SARDINEL BAJO RAMP.A85,8x,2x,35.IncMorteEXC-TRAN	2 días	mar 11/02/25	mié 12/02/25	UN	3,00	7
112		11.4	LOSETA PREF.A-50 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	2 días	jue 13/02/25	vie 14/02/25	M2	15,00	111
113		11.5	RAMPA PREF. T. A-100 0,6x0,2x0,5.Inc mortero, bal	2 días	jue 13/02/25	vie 14/02/25	UN	16,00	111
114		11.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	2 días	mar 11/02/25	mié 12/02/25	M3	0,80	7
115		11.7	SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	5,00	112
116		11.8	SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	5,00	112
117		11.9	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 2500 PSI MEZCLA EN OBRA	1 día	lun 17/02/25	lun 17/02/25	UN	4,00	112
118		11.10	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mar 18/02/25	mar 18/02/25	UN	2,00	115
119		11.11	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M121	1 día	mar 18/02/25	mar 18/02/25	UN	1,00	116
120		11.12	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24	M2	10,00	115
121		**12**	**PMA Y PMT**	**42 días**	**mié 27/11/24**	**vie 21/02/25**			
122		12.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	42 días	mié 27/11/24	vie 21/02/25	GB	1,00	
123		12.2	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	42 días	mié 27/11/24	vie 21/02/25	GB	1,00	122CC
124		**13**	**SERVICIOS PUBLICOS**	**3 días**	**mié 19/02/25**	**vie 21/02/25**			
125		13.1	CONEXIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	2 días	mié 19/02/25	jue 20/02/25	UND	1,00	76
126		13.2	FIN DEL PROYECTO	1 día	vie 21/02/25	vie 21/02/25			

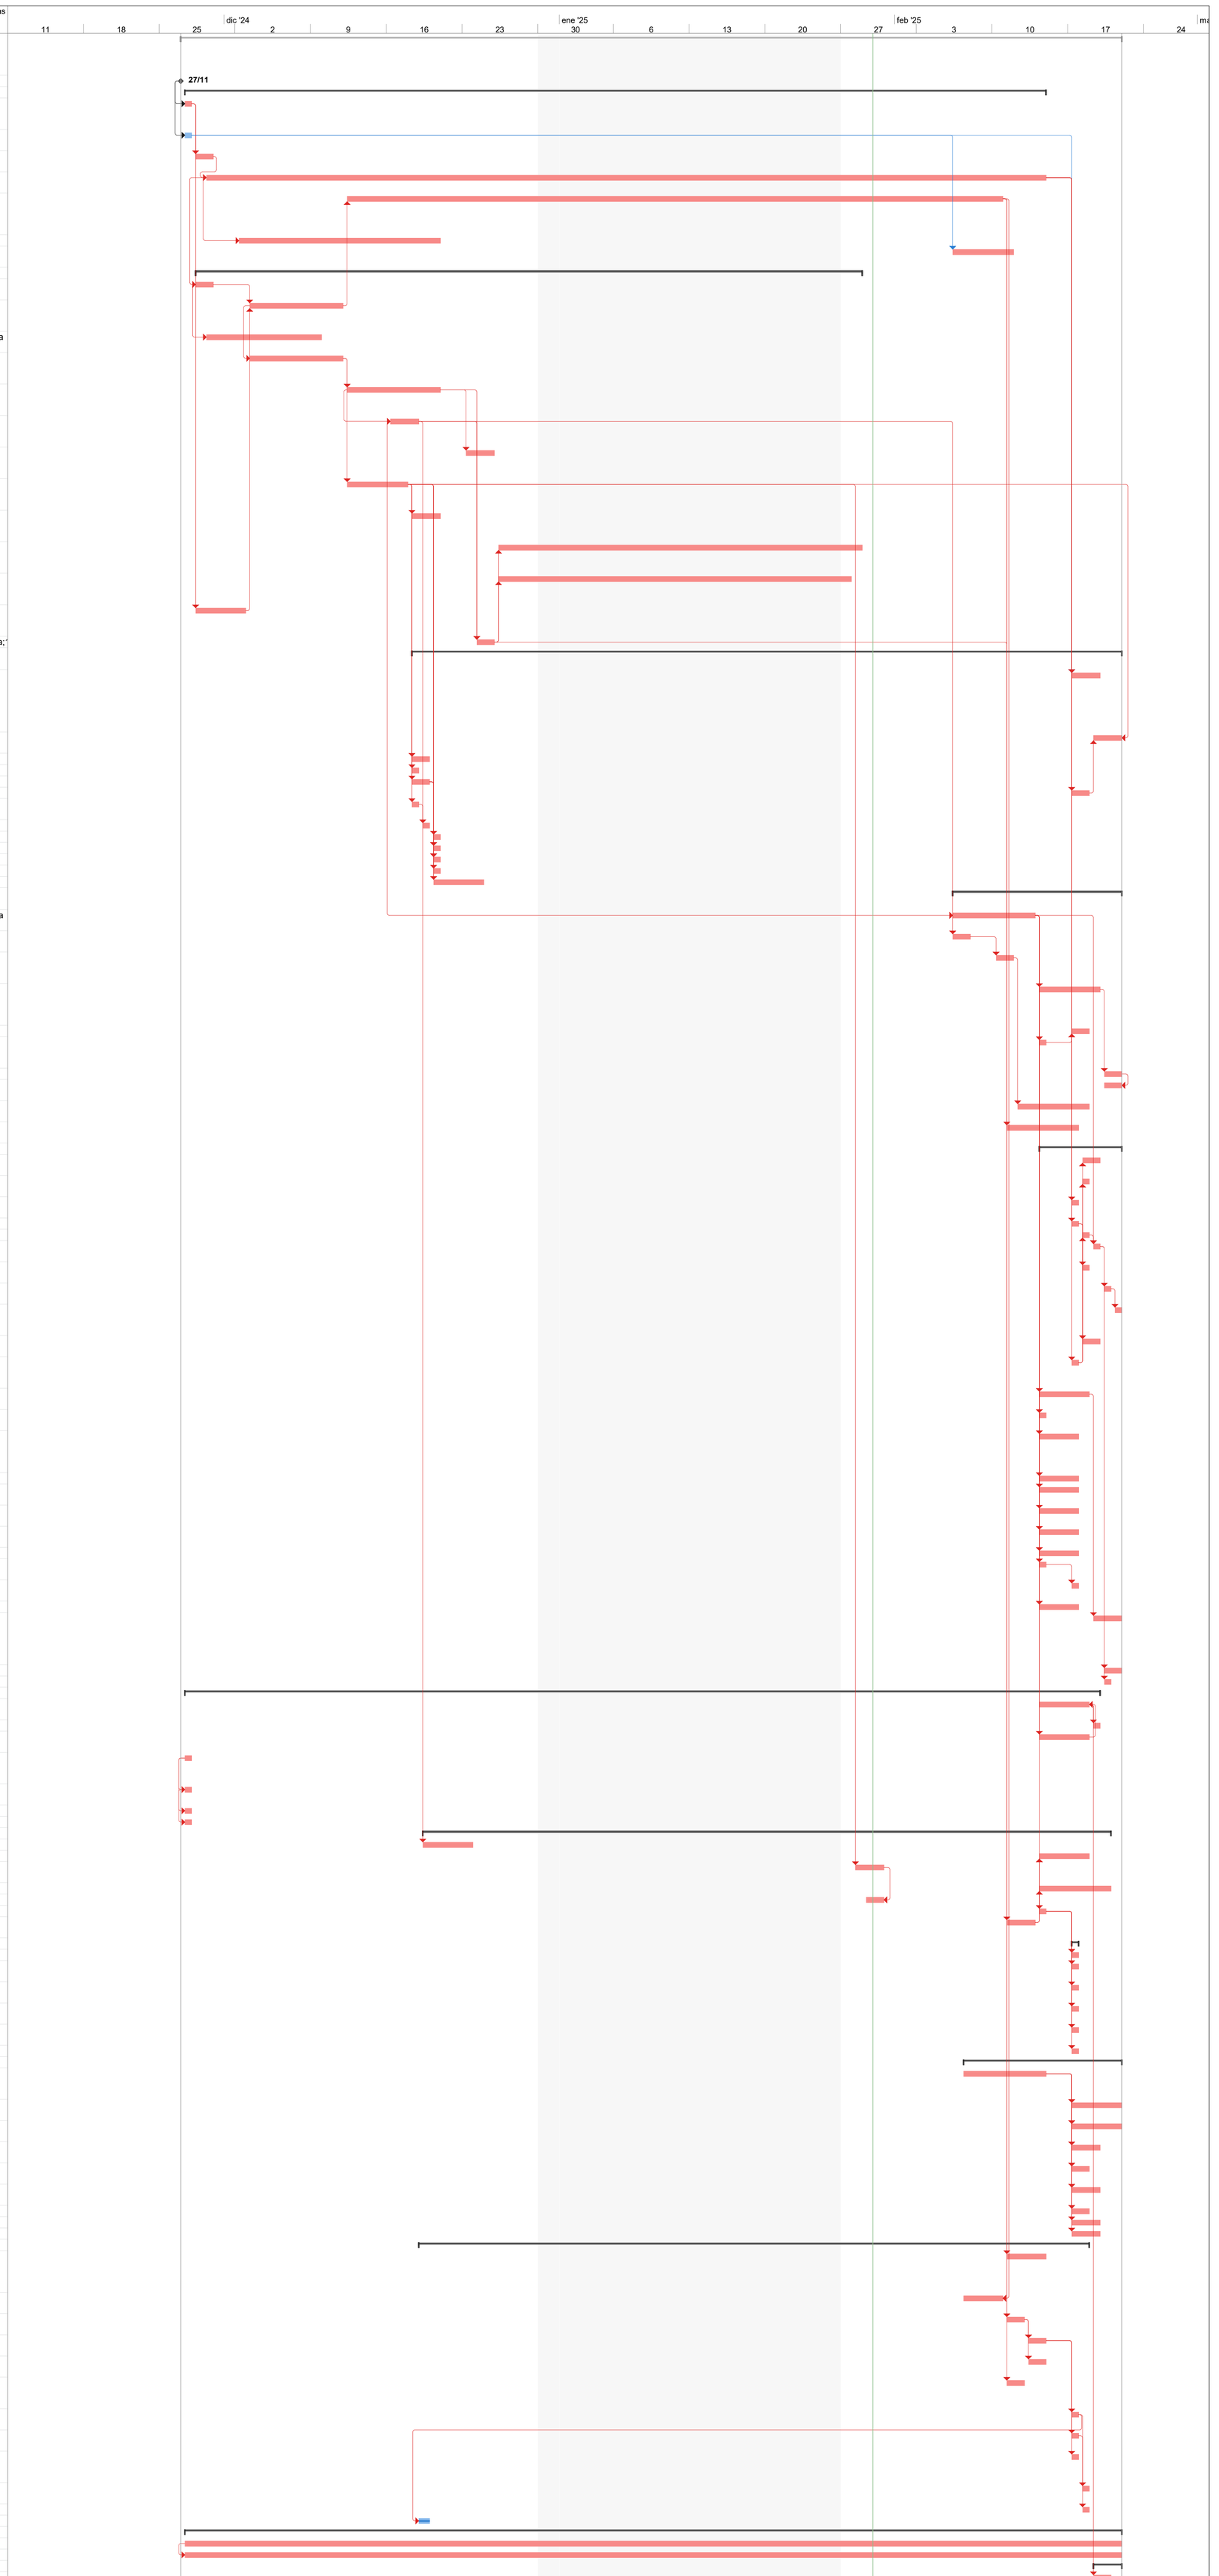

Proyecto: Construccion de comando de atencion inmediata fijo Santa Helena, para la policia metropolitana del municipio de Villavicencio - Meta

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin	División crítica
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Fecha límite	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Tareas críticas	Progreso manual
