Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1			**CONTRATO DE OBRA GGC-079-2024**	**89 días**	**lun 21/10/24**	**lun 20/01/25**			**$ 311.753.900,55**
2			INICIO	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24		31	$ 0,00
3		**1.0**	**COMPONENTE 1: BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL**	**0 días**	**lun 20/01/25**	**lun 20/01/25**			**$ 0,00**
4		1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE MILANO - 200 X 120 EN PVC SE CARACTERIZA POR SEPERADOR DE AMBIENTES O PARA DIVIDIR AREA INTERNA Y AREA DE ATENCION AL USUARIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 0,00
5		2.0	AREA ADMINISTRATIVA	44 días	vie 6/12/24	lun 20/01/25			$ 92.659.699,16
6		2.01	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	29 días	vie 6/12/24	vie 3/01/25	31	10	$ 23.580.898,00
7		2.02	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	29 días	vie 6/12/24	vie 3/01/25	31	10	$ 7.580.381,44
8		2.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	29 días	vie 6/12/24	vie 3/01/25	31	10	$ 44.527.210,56
9		2.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS . NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 0,00
10		2.05	DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A SITIO ESCOBRERA CERTIFICADO	8 días	vie 3/01/25	sáb 11/01/25	8;7;6	11;17;12	$ 895.849,42
11		2.06	INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS TIPO REFERENCIA PARED CERÁMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 25X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS	0 días	sáb 11/01/25	sáb 11/01/25	10	67	$ 0,00
12		2.07	DESBASTADA , RETAPADO,PULIDA, DESENMACHADA , DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN GRANITO INVLUYE GUARDAESCOBAS	7 días	sáb 11/01/25	lun 20/01/25	10	67	$ 13.873.356,90
13		2.08	INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.05 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONS DEL EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL. CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE AGARRE EN ACERO INOXIDABLE	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 1.392.492,84
14		2.09	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE. DESCAPADO MECANICO REALIZADO CON PULIDORA O LIJA MANUAL Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PASIVADO POR FROTE INMERSION O ASPERSION	2 días	vie 17/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 809.510,00
15		**3.0**	**PSG**	**7 días**	**sáb 11/01/25**	**lun 20/01/25**			**$ 922.438,00**
16		3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	19	67	$ 0,00
17		3.03	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE AGUAS NEGRAS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS	4 días	sáb 11/01/25	jue 16/01/25	10	18	$ 513.240,00
18		3.04	CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA. CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA Y MANGUERAS PARA LAVAMANOS.	2 días	jue 16/01/25	sáb 18/01/25	17	19	$ 356.928,00
19		3.05	AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS PARA BAÑO EN PSG	1 día	sáb 18/01/25	lun 20/01/25	18	16	$ 52.270,00
20		**4.0**	**NUEVO BAÑO DE GERENCIA SECCIONAL**	**89 días**	**lun 21/10/24**	**lun 20/01/25**			$ 2.368.248,00
21		4.30	DEMOLICIONES - CORTES PARA REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR CERTIFICADO.	5 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 179.504,00
22		4.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERIA DE 4" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 4" Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE	5 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 1.328.112,00
23		4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 2" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2". Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE	5 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 670.726,00
24		4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICA EN TUBERÍA DE1 / 2" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 1/2"	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 0,00
25		4.07	SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE PARA PAREED CERÁMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 1.62 M2	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 0,00
26		4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V. INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24			$ 0,00
27		4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"". INCLUYE CIRCUITO MONOFÁSICO F:1X12+N:1X12+T:1X12 AWG THHN-THWN, EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE UNIONES, TEMINALES, CODOS, BANDA NARANJA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24			$ 0,00

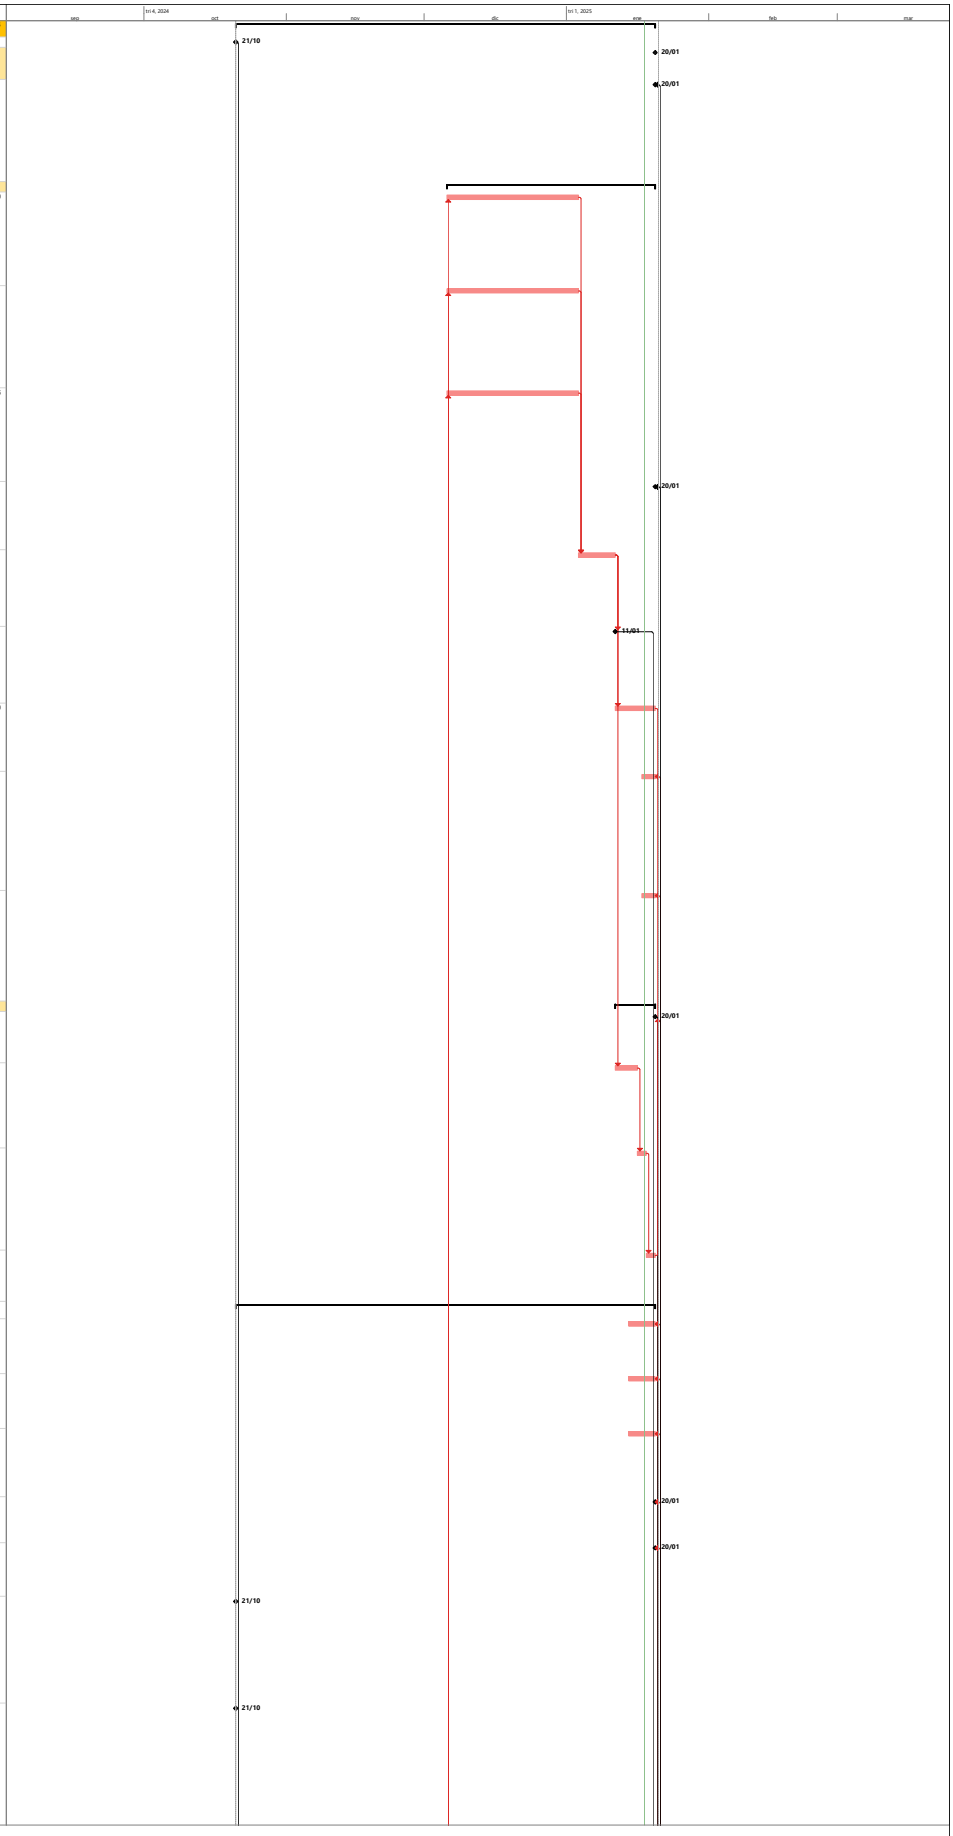

Proyecto: PROGRAMACION_IC
Fecha: sáb 18/01/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Resumen manual · sólo duración · Informe de resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
28		4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO, INCLUYE CAJA RAWELL, 5800, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.	5 días	mar 14/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 189.906,00
29		4.11	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE SENCILLA CON POLO A TIERRA (TOMACORRIENTE, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O SIMILAR), CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH, INCLUYE: TOMACORRIENTE, CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,DUCTOS	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	32FF		$ 0,00
30			**5.0 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**89 días**	**lun 21/10/24**	**lun 20/01/25**			**$ 144.988.886,00**
31		5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA DE 150KW TRIFÁSICA CABINADA, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, TUBO DE DESFOGUE 5 MTS, CAPACITACIÓN Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. INCLUYE CABLEADO DESDE LA PLANTA A LA TRANSFERENCIA Y DE LA RED A LA	45 días	lun 21/10/24	jue 5/12/24	2	67;6;7;8	$ 141.582.737,00
32		5.02	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO A LAMPARAS LED DE SOBREPONER 30 X 120 48 W CON MARCO PARA LAS OFCINAS ADMINISTRATIVAS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF	FF;22FF;23FF;24FF;25	$ 3.406.149,00
33			**ITEMS NO PREVISTOS**	**10 días**	**jue 9/01/25**	**lun 20/01/25**			**$ 70.814.629,39**
34		NP-01	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA, E=10CM, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 287.884,80
35		NP-02	DEMOLICION PISO EXISTENTE , INCLUYE DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 996.533,66
36		NP-03	DESMONTE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y RETIRO DE ESCOMBROS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 141.630,32
37		NP-04	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA, E=10CM	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 142.818,00
38		NP-05	PAÑETE MUROS, MORTERO 1:3	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 3.098.283,30
39		NP-06	PAÑETE MUROS, MORTERO 1:3	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 165.594,00
40		NP-07	ESTUCO MUROS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 76.784,00
41		NP-08	BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 3.000 PSI	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 786.052,58
42		NP-09	PUERTA EN MALLA ESLABONADA , ESTRUCTURA EN TUBERA DE 2 PULGADAS ,	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 5.809.488,00
43		NP-10	GRANIPLAST MUROS EXTERIORES	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 15.453.603,28
44		NP-11	INSTALACION VIGA EN PERFIL C 100MMX2.5MM	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 395.895,00
45		NP-12	TUBERIA IMC DE 4 PULGADAS, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CURVA IMC 4"	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 5.551.280,00
46		NP-13	CIELO RASO EN YESO CARTON , no intcuye estructura	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 571.116,94
47		NP-14	DESMONTE DE DIVISIONES EN ACERO BAÑOS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 318.994,00
48		NP-15	INSTALACION DIVISIONES EN ACERO BAÑOS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 1.792.674,00
49		NP-16	DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y/U LAVAMANOS Y/U ORINALES	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 680.000,00
50		NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 1.327.269,00
51		NP-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE Grifería Orinal Push Tradicional, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 1.079.058,00
52		NP-19	ALISTADO DE PISO 1-3	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 1.316.916,98
53		NP-20	DESMONTE MESON LAVAMANOS EN GRANITO EXISTENTE	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 95.946,40
54		NP-21	TE DE ESPEJOS EXI	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 76.420,00
55		NP-22	DESMONTE SECADORDE MANOS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 40.748,00
56		NP-23	INSTALACION SECADOR MANOS	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 65.346,00
57		NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 3.641.408,00
58		NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 1.279.536,00
59		NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 3.862.936,00
60		NP-27	MESON EN GRANITO NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 4.180.000,00
61		NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED PARA BAÑOS, incluye todo para correcta instalacion y funcionamiento	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 8.686.701,66
62		NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO PARA BAÑOS, incluye todo para correcta instalacion y funcionamiento	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 2.989.465,54
63		NP-30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POLIURETANO PARA PUERTAS METALICAS, PRECIO POR UNA CARA , INCLUYE TODO PARA SU	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 4.021.947,93
64		NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO SEDE AEROPUERTO , INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 950.000,00
65		NP-32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDSTAL, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	10 días	jue 9/01/25	lun 20/01/25	67FF		$ 932.298,00
66									
67			FIN DEL CONTRATO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25	16;31;11;12	8FF;49FF;51FF;52FF;4	$ 0,00

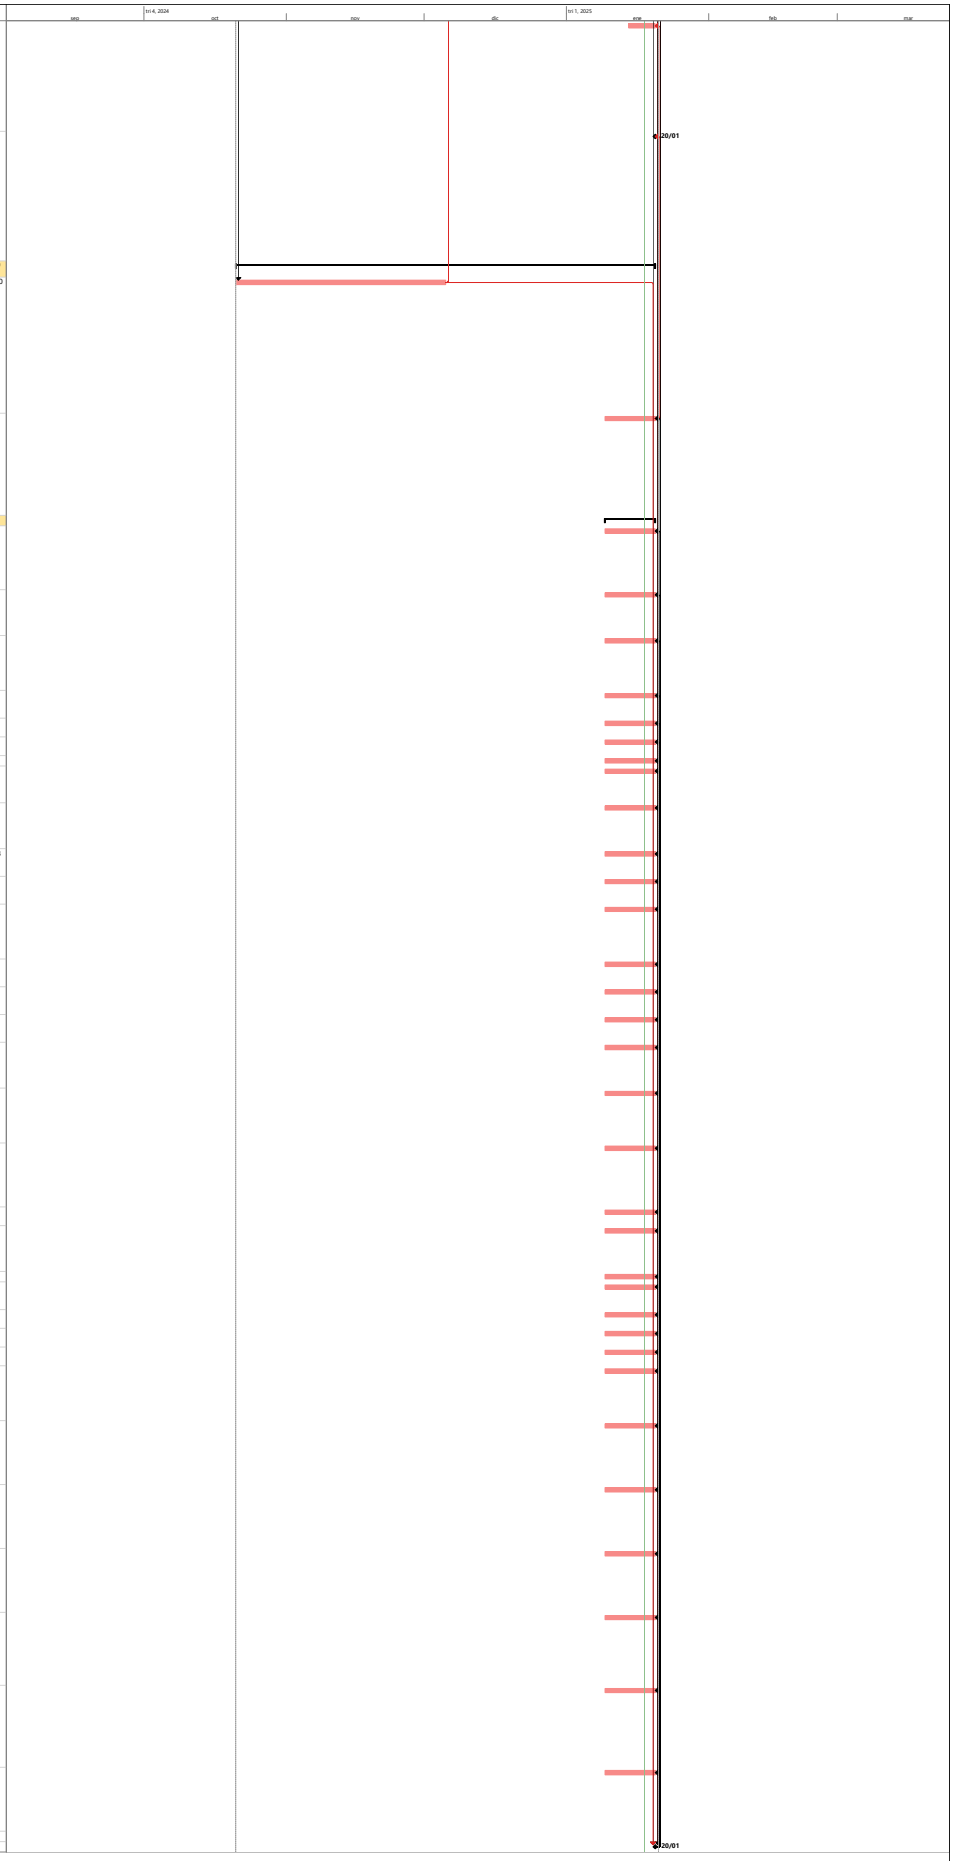

Proyecto: PROGRAMACION_IC
Fecha: sáb 18/01/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
