1. **FECHA:** 24/05/2024
2. **SOLICITANTE:** TALLER DE ARQUITECTURA
3. **RADICADO:** N/A
4. **OBJETIVO GENERAL:** REPOSICION PARCIAL DE ANDENES.
5. **LOCALIZACIÓN:** COMUNA Nº16 **BARRIO:** EL TEJAR
6. **DIRECCIÓN:** COSTADO SUR DE LA CALLE 93 INICIANDO DESDE LA PORTERIA Nº4 PORTON DEL TEJAR Nº 34-34 FRENTE AL POSTE DE LUZ Nº 1194500 INCLUYENDO LAS PORTERIAS Nº3,2,1 EN LA CALLE 93 Nº 33-34 HASTA EL FINAL DE LAS ESCALERAS UBICADAS EN LA CARRERA 33
7. **CORREGIMIENTO:** N/A **VEREDA:** N/A
8. **PROBLEMA O NECESIDAD:**

   EL ANDÉN EN LOS TRAMOS SOLICITADOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CARECE DE VADOS PEATONALES Y VEHICULARES.

9. **PROPIEDAD DEL PREDIO:** ESPACIO PÚBLICO
10. **ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:**

    CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ANDÉN Y VADOS.

COSTADO NORTE

carrera 33 a Portería N 1 portón del tejar

Ancho: 2,70
Largo: 64,60
Accesos vehiculares: 1
Tapas gas:0
Tapa de acueducto :1
Tapas de comunicación :1
Tapa cdm :1
Señal: 1
Señal Metrolinea: 0
Tapas en el CAI por identificar:0

Vados:0

portería portón del tejar N 1 hasta portería portón del tejar N 2

Ancho: 1,56
Largo: 62,00
Accesos vehiculares: 1
Tapas comunicación: 1
Tapas gas:2
Tapa de acueducto :1
Tapa cdm :1
Señal: 0
Señal Metrolínea: 0
Tapas en el CAI por identificar:0
Vados:0

portería portón del tejar N 2 hasta portería portón del tejar N 3

Ancho: 1,50
Largo: 50,50
Accesos vehiculares: 3
Tapas gas:8
Tapa de acueducto :8
Tapas de comunicación :4
Tapa cdm :3
Señal: 0
Señal Metrolinea: 0
Tapas en el CAI por identificar:0
Vados:0

portería portón del tejar N 3 hasta portería portón del tejar N 4

Ancho: 3,00
Largo: 67,00
Accesos vehiculares: 8
Tapas gas:9
Tapa de acueducto :4
Tapas de comunicación :3
Tapa cdm :1
Señal: 2
Señal Metrolinea: 1
Tapas en el CAI por identificar:0
Vados:0

Costado sur de la calle 93 iniciando desde portería N 4 Costado Sur de la calle 93 frente al porte de luz numero

Ancho: 3,00
Largo: 31,70
Accesos vehiculares:
Tapas gas:2
Tapa de acueducto :3
Tapas de comunicación :3
Tapa cdm :1
Señal: 1
Señal Metrolinea: 0
Tapas en el CAI por identificar:0
Vados:0

11. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE ☐ **ALTA** ☒ **MEDIA** ☐ **BAJA** ☐

12. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

13. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA.



Ilustración 1: escaleras ubicadas en la carrera 33

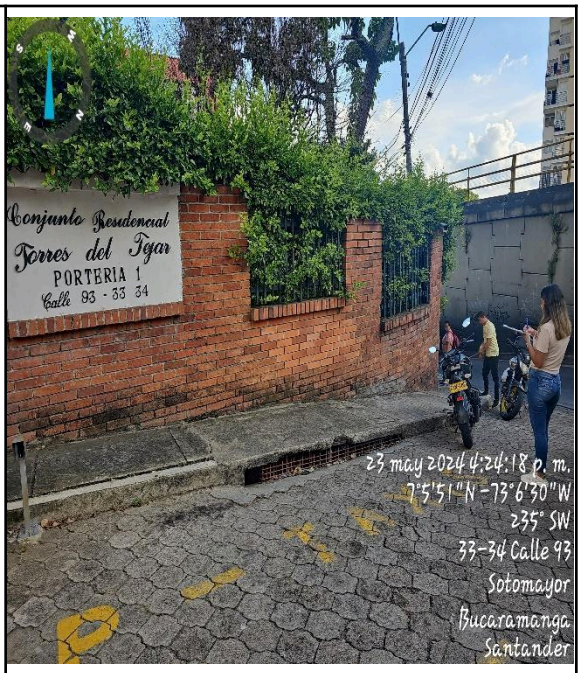


Ilustración 2: escaleras ubicadas en la carrera 33 porteria N 1



Ilustración 3: porteria porton del tejar N 1 hasta porteria porton del tejar N 2



Ilustración 4 porteria porton del tejar N 1 hasta porteria porton del tejar N 2

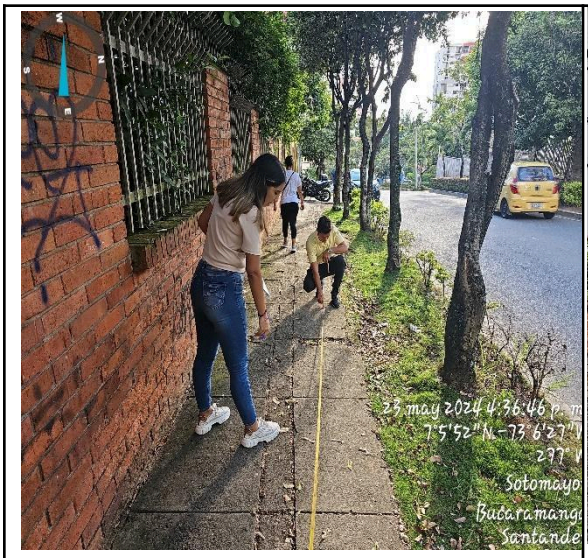


Ilustración 5: porteria porton del tejar N 1 hasta porteria porton del tejar N 2

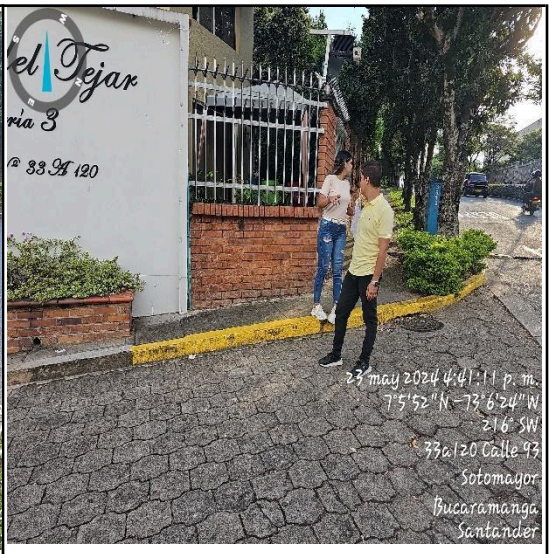


Ilustración 6: porteria porton del tejar N 1 hasta porteria porton del tejar N 2



Ilustración 7: porteria porton del tejar N 3 hasta porteria porton del tejar N 4



Ilustración 8: porteria porton del tejar N 3 hasta porteria porton del tejar N 4



Ilustración 9 porteria porton del tejar N 3 hasta porteria porton del tejar N 4



Ilustración 10: porteria porton del tejar N 3 hasta porteria porton del tejar N 4



Ilustración 11: porteria porton del tejar N 4 Costado Sur de la calle 93 frente al porte de luz numero

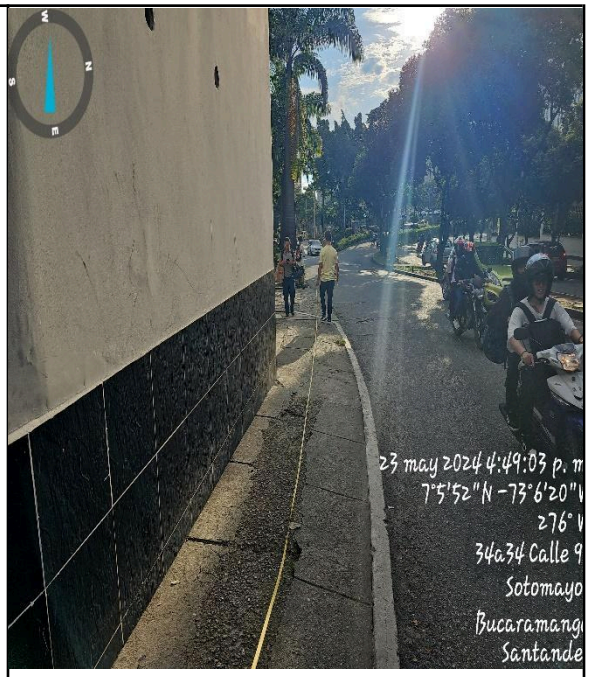


Ilustración 12: porteria porton del tejar N 4 Costado Sur de la calle 93 frente al porte de luz numero

14. **ANALISIS DE VIABILIDAD:**

ES TECNICAMENTE VIABLE LA REPOSICION DEL ANDEN A LO LARGO DEL TRAYECTO A INTERVENIR.

Robinson Fabian Figueroa


_____

Ing. ROBINSON FIGUEROA
Cps Secretaría de Infraestructura


_____

MARIA FERNANDA NIÑO GUTIERREZ
Cps Secretaría de Infraestructura

EMMANUEL NOVA RUSSI
Técnico Operativo (Topógrafo).
Secretaría de Infraestructura

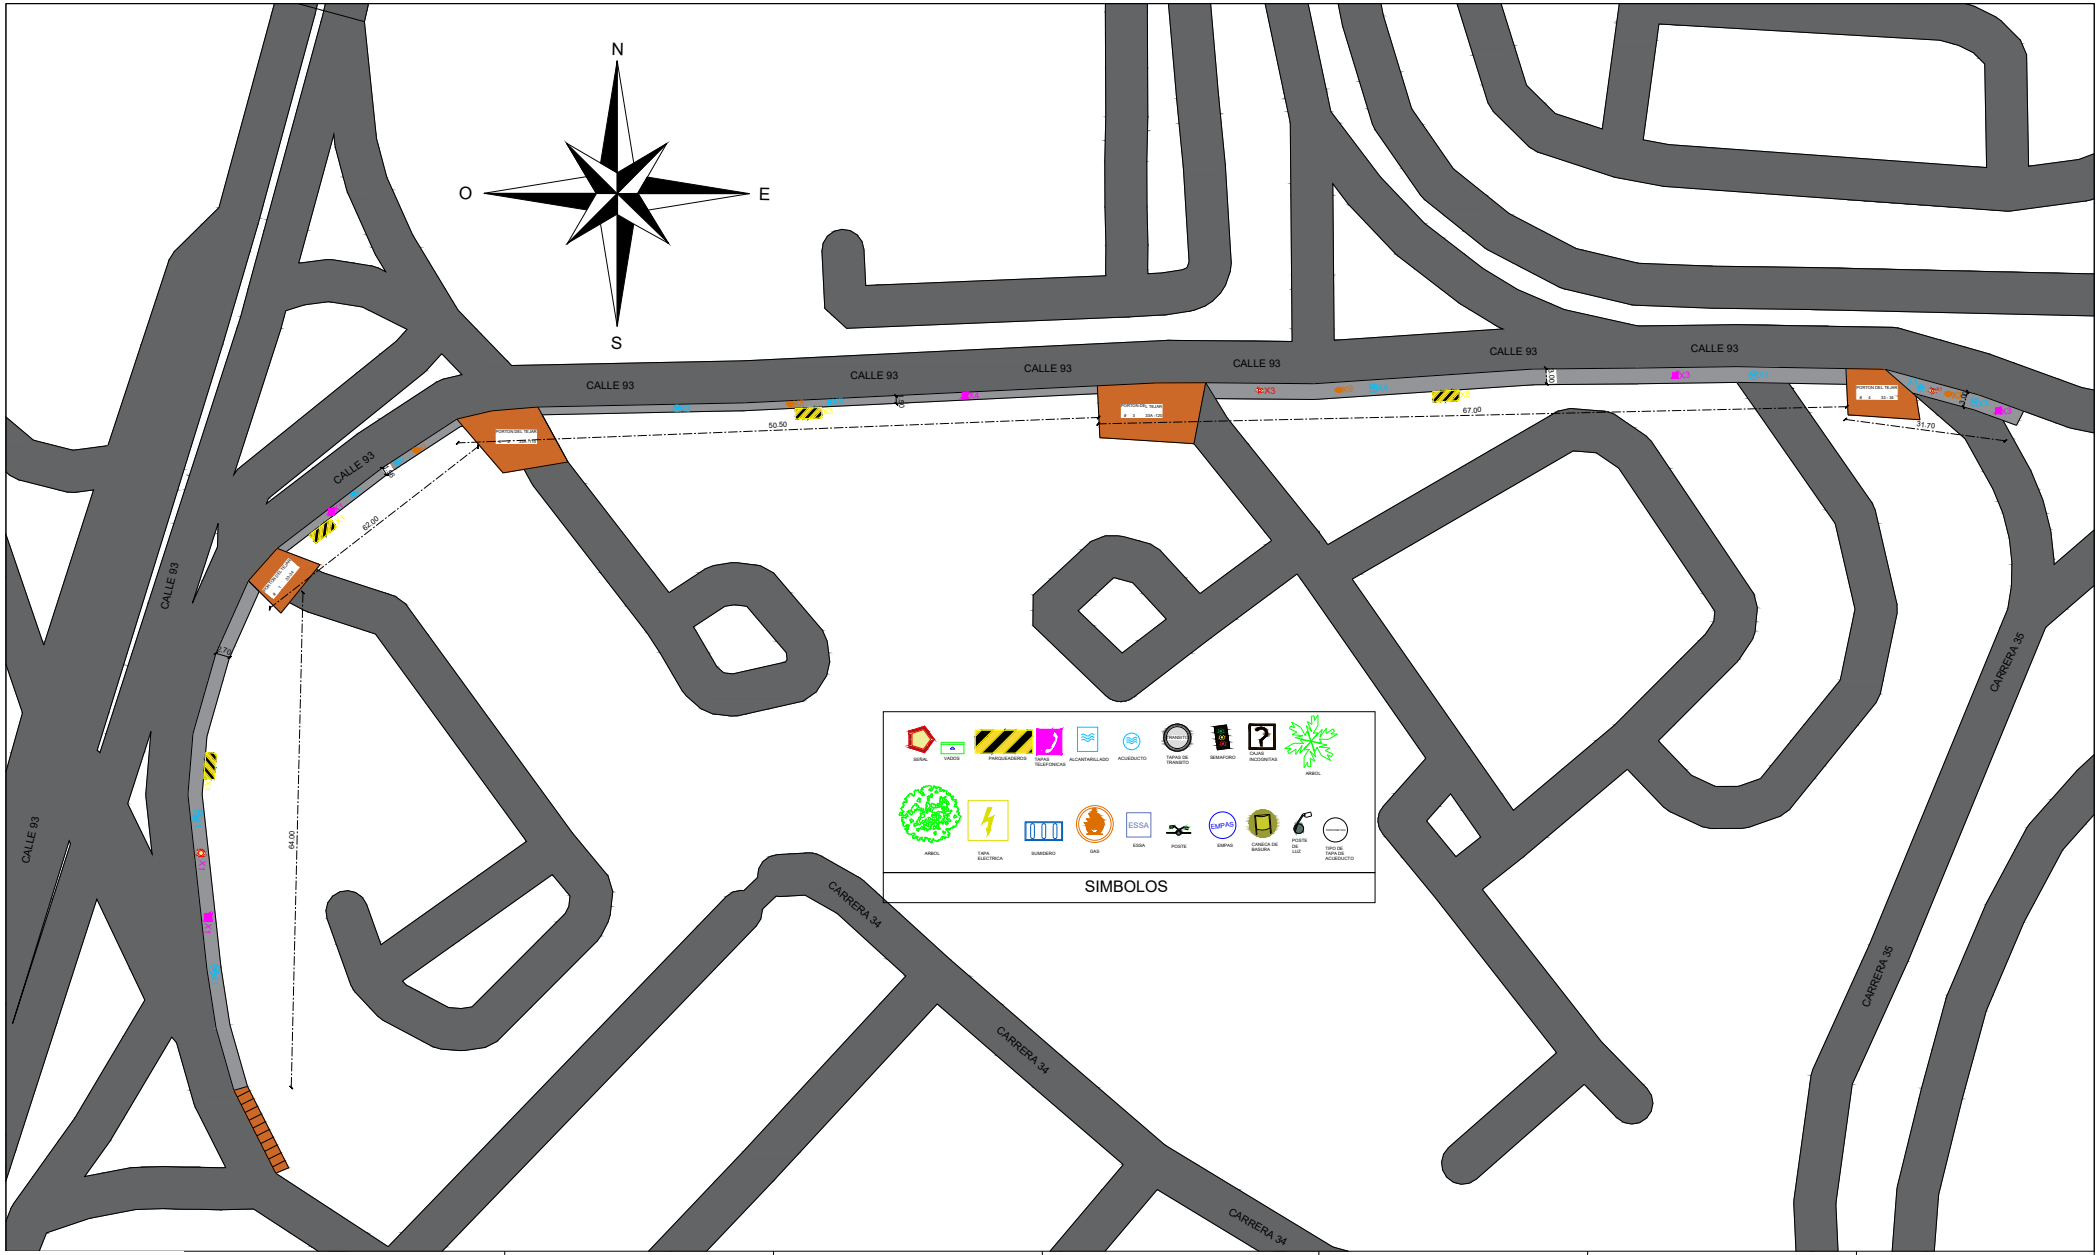

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Secretaria de infraestructura	Hecho por: Maria Arenas Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 24 de mayo 2024	Escala: Indicada	Localización: Barrio Tejar	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..

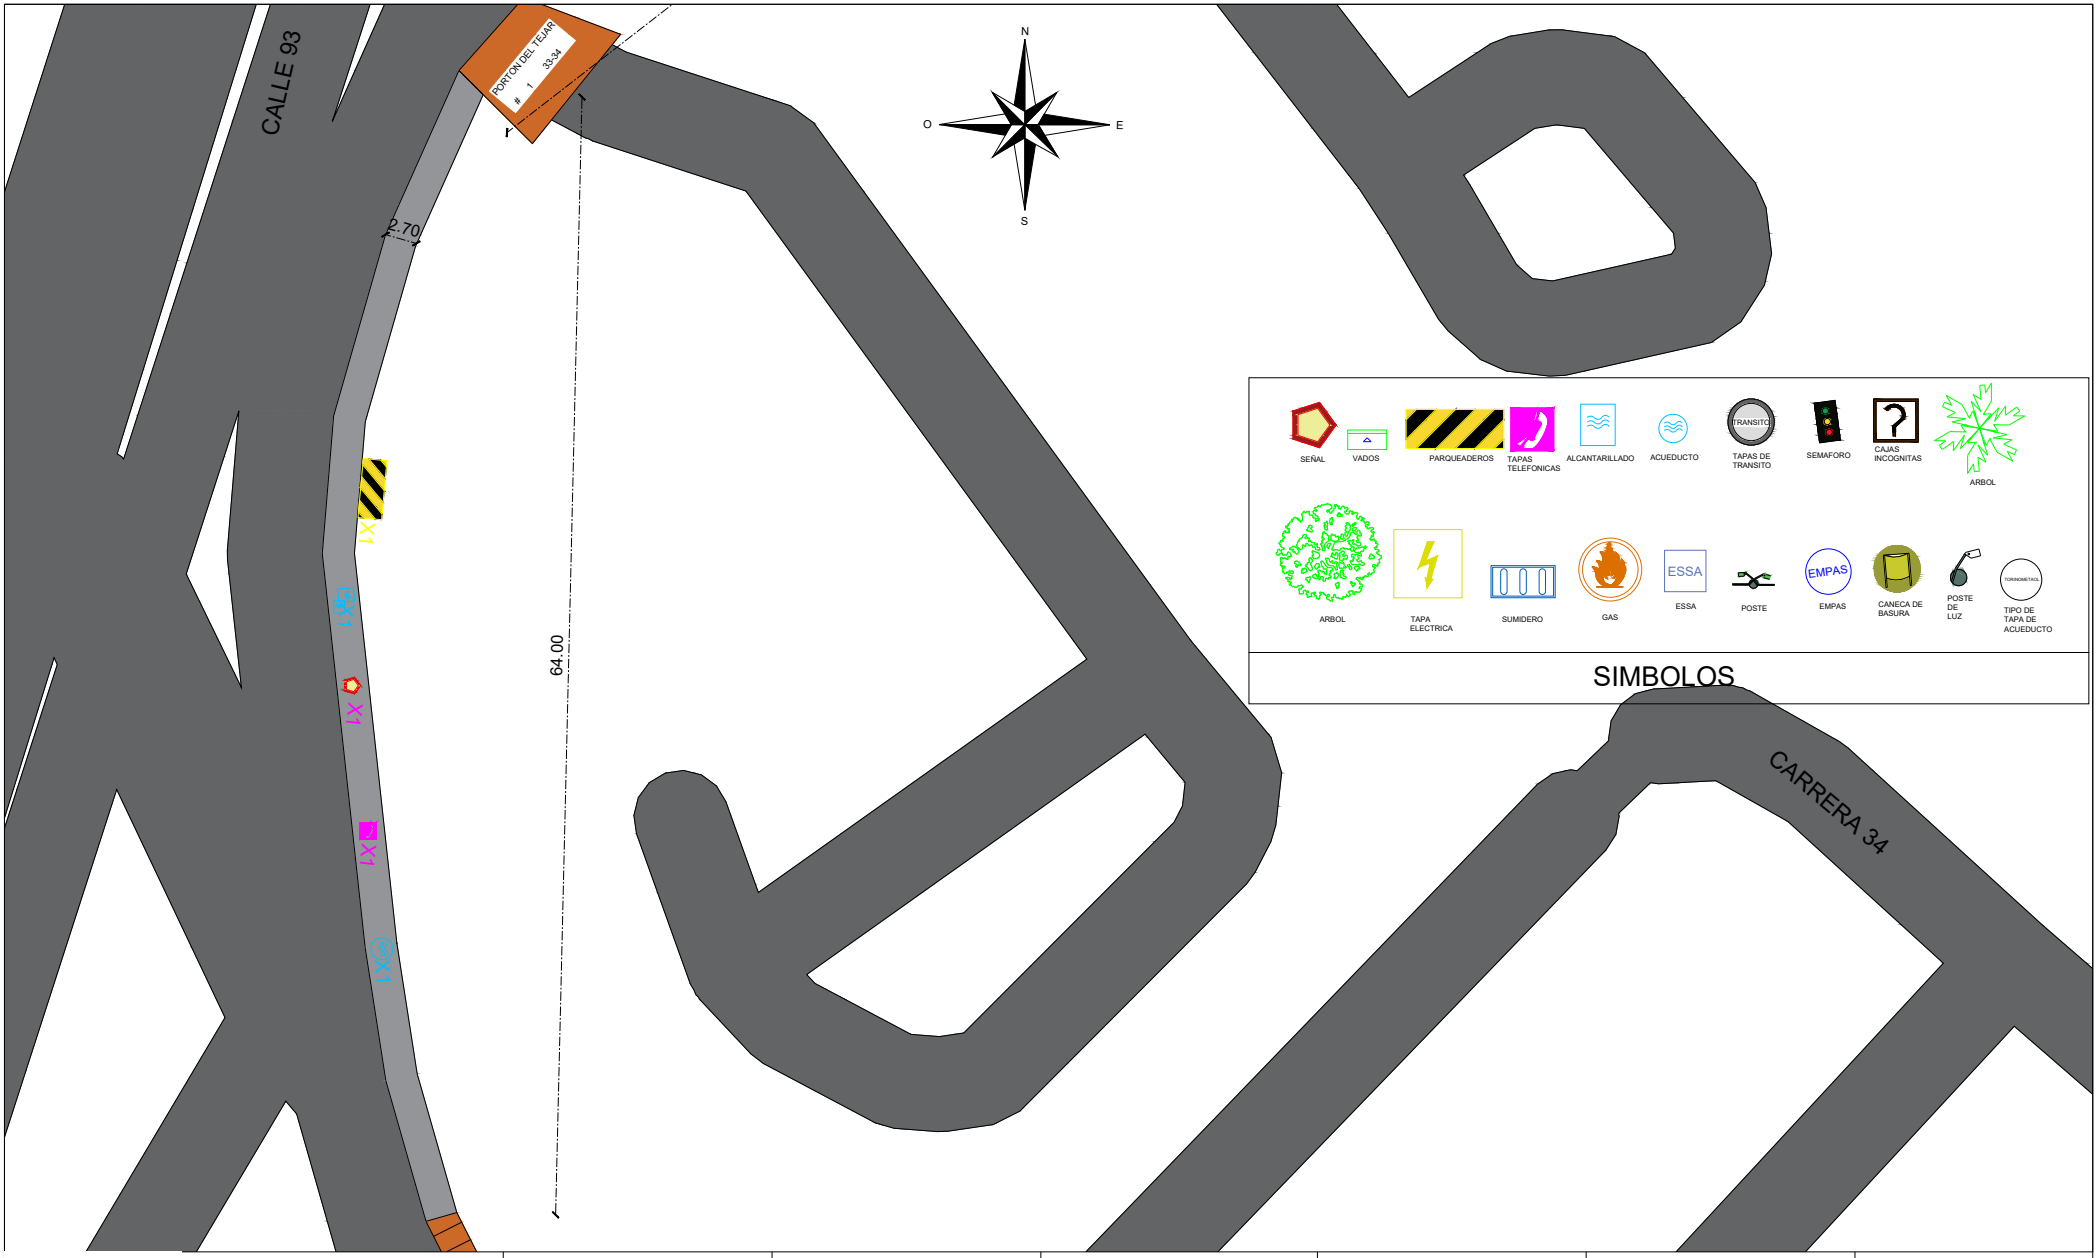


MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Secretaria de infraestructura	Hecho por: Maria Arenas Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 24 de mayo 2024	Escala: Indicada	Localización: Barrio Tejar	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..




MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Secretaria de infraestructura	Hecho por: Maria Arenas, Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 24 de mayo 2024	Escala: Indicada	Localización: Barrio Tejar

Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..

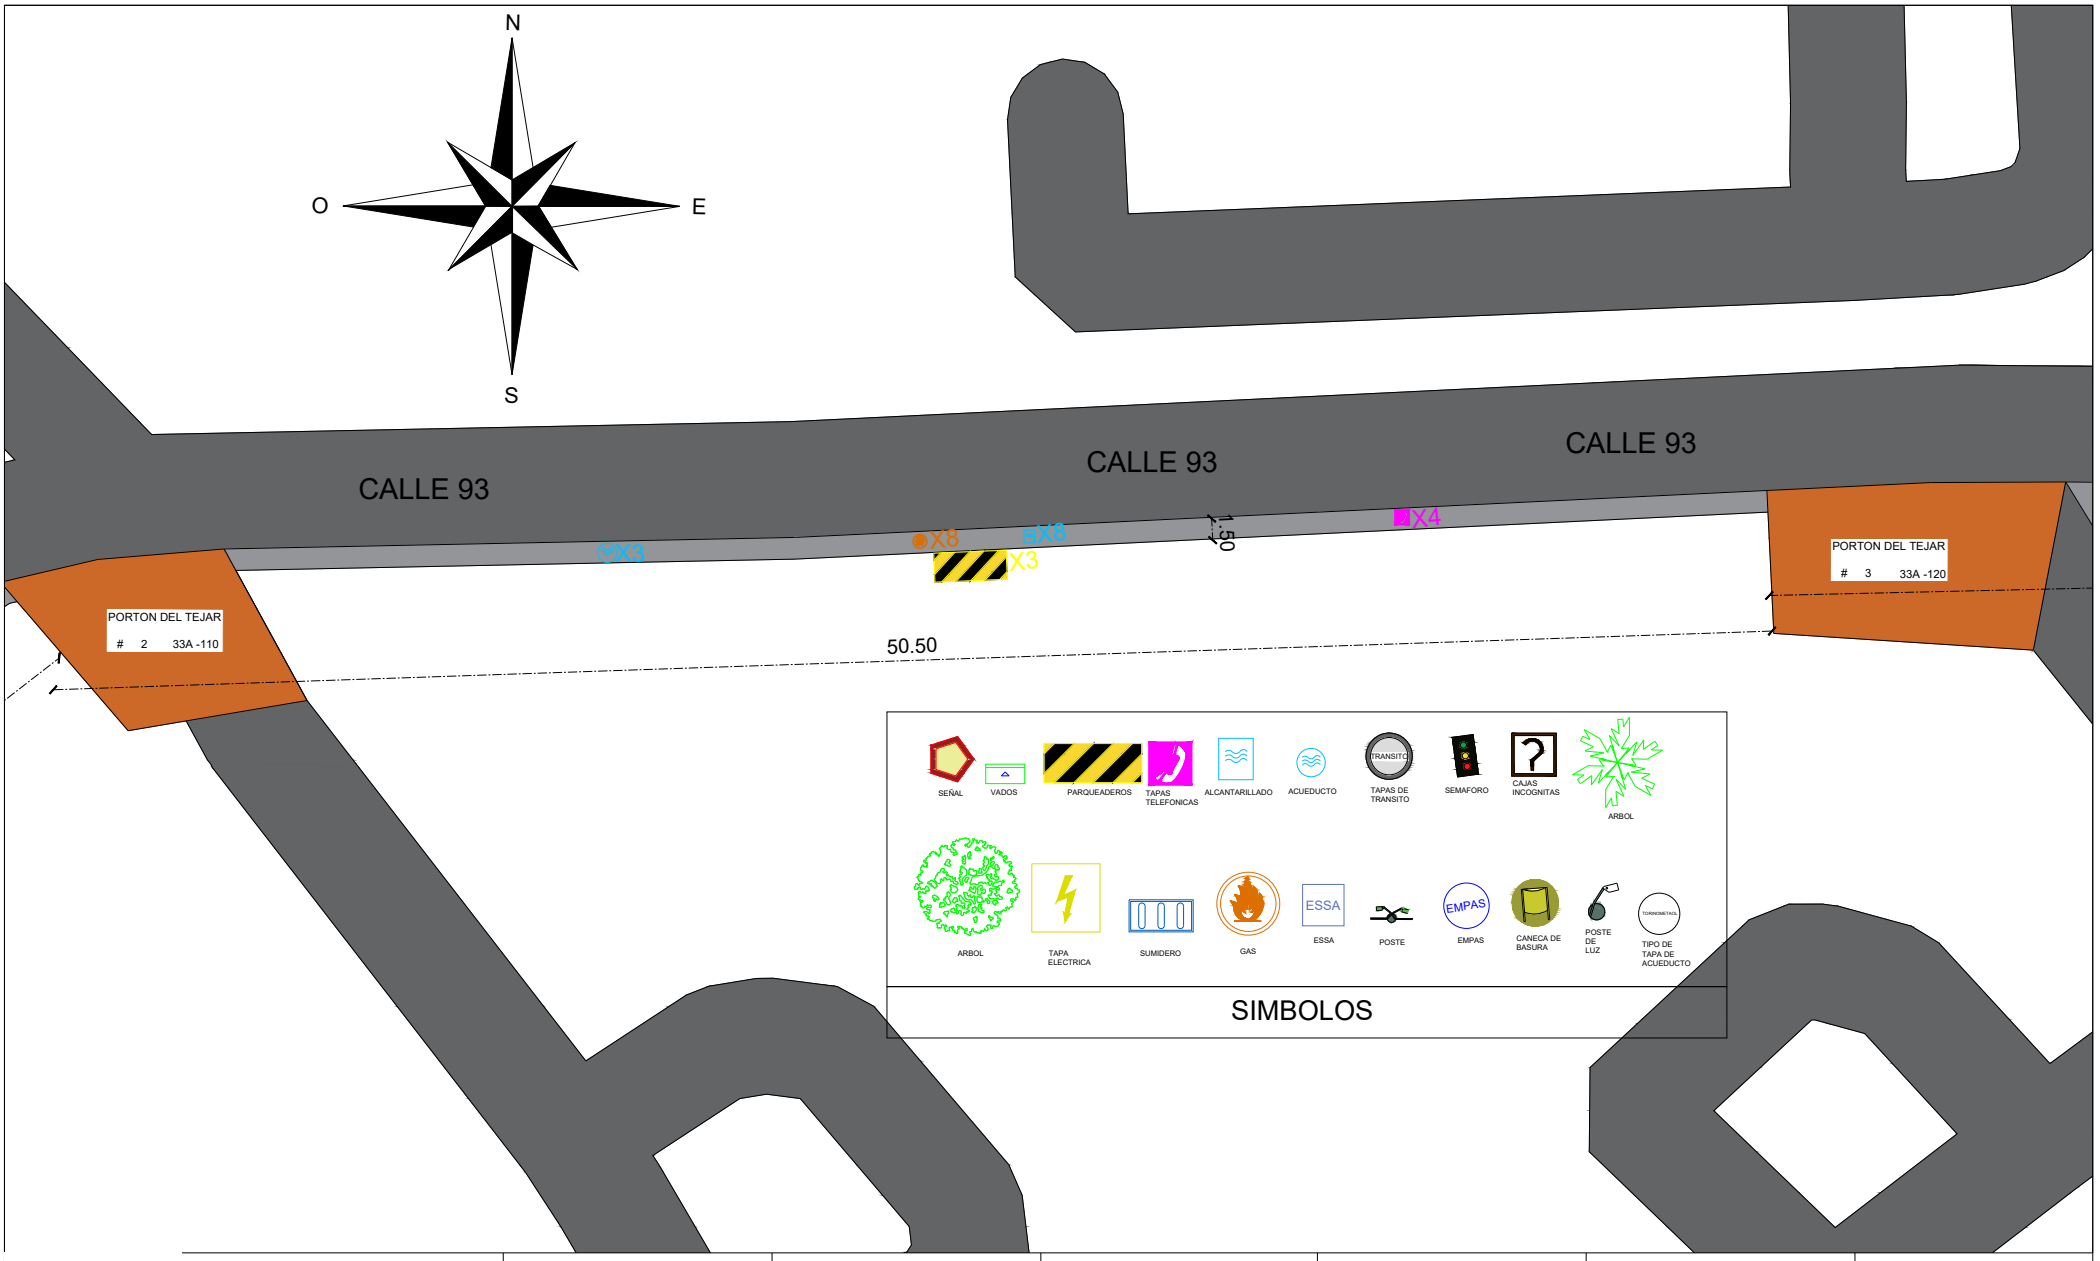


MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Secretaria de infraestructura	Hecho por: Maria Arenas, Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 24 de mayo 2024	Escala: Indicada	Localización: Barrio Tejar

Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..

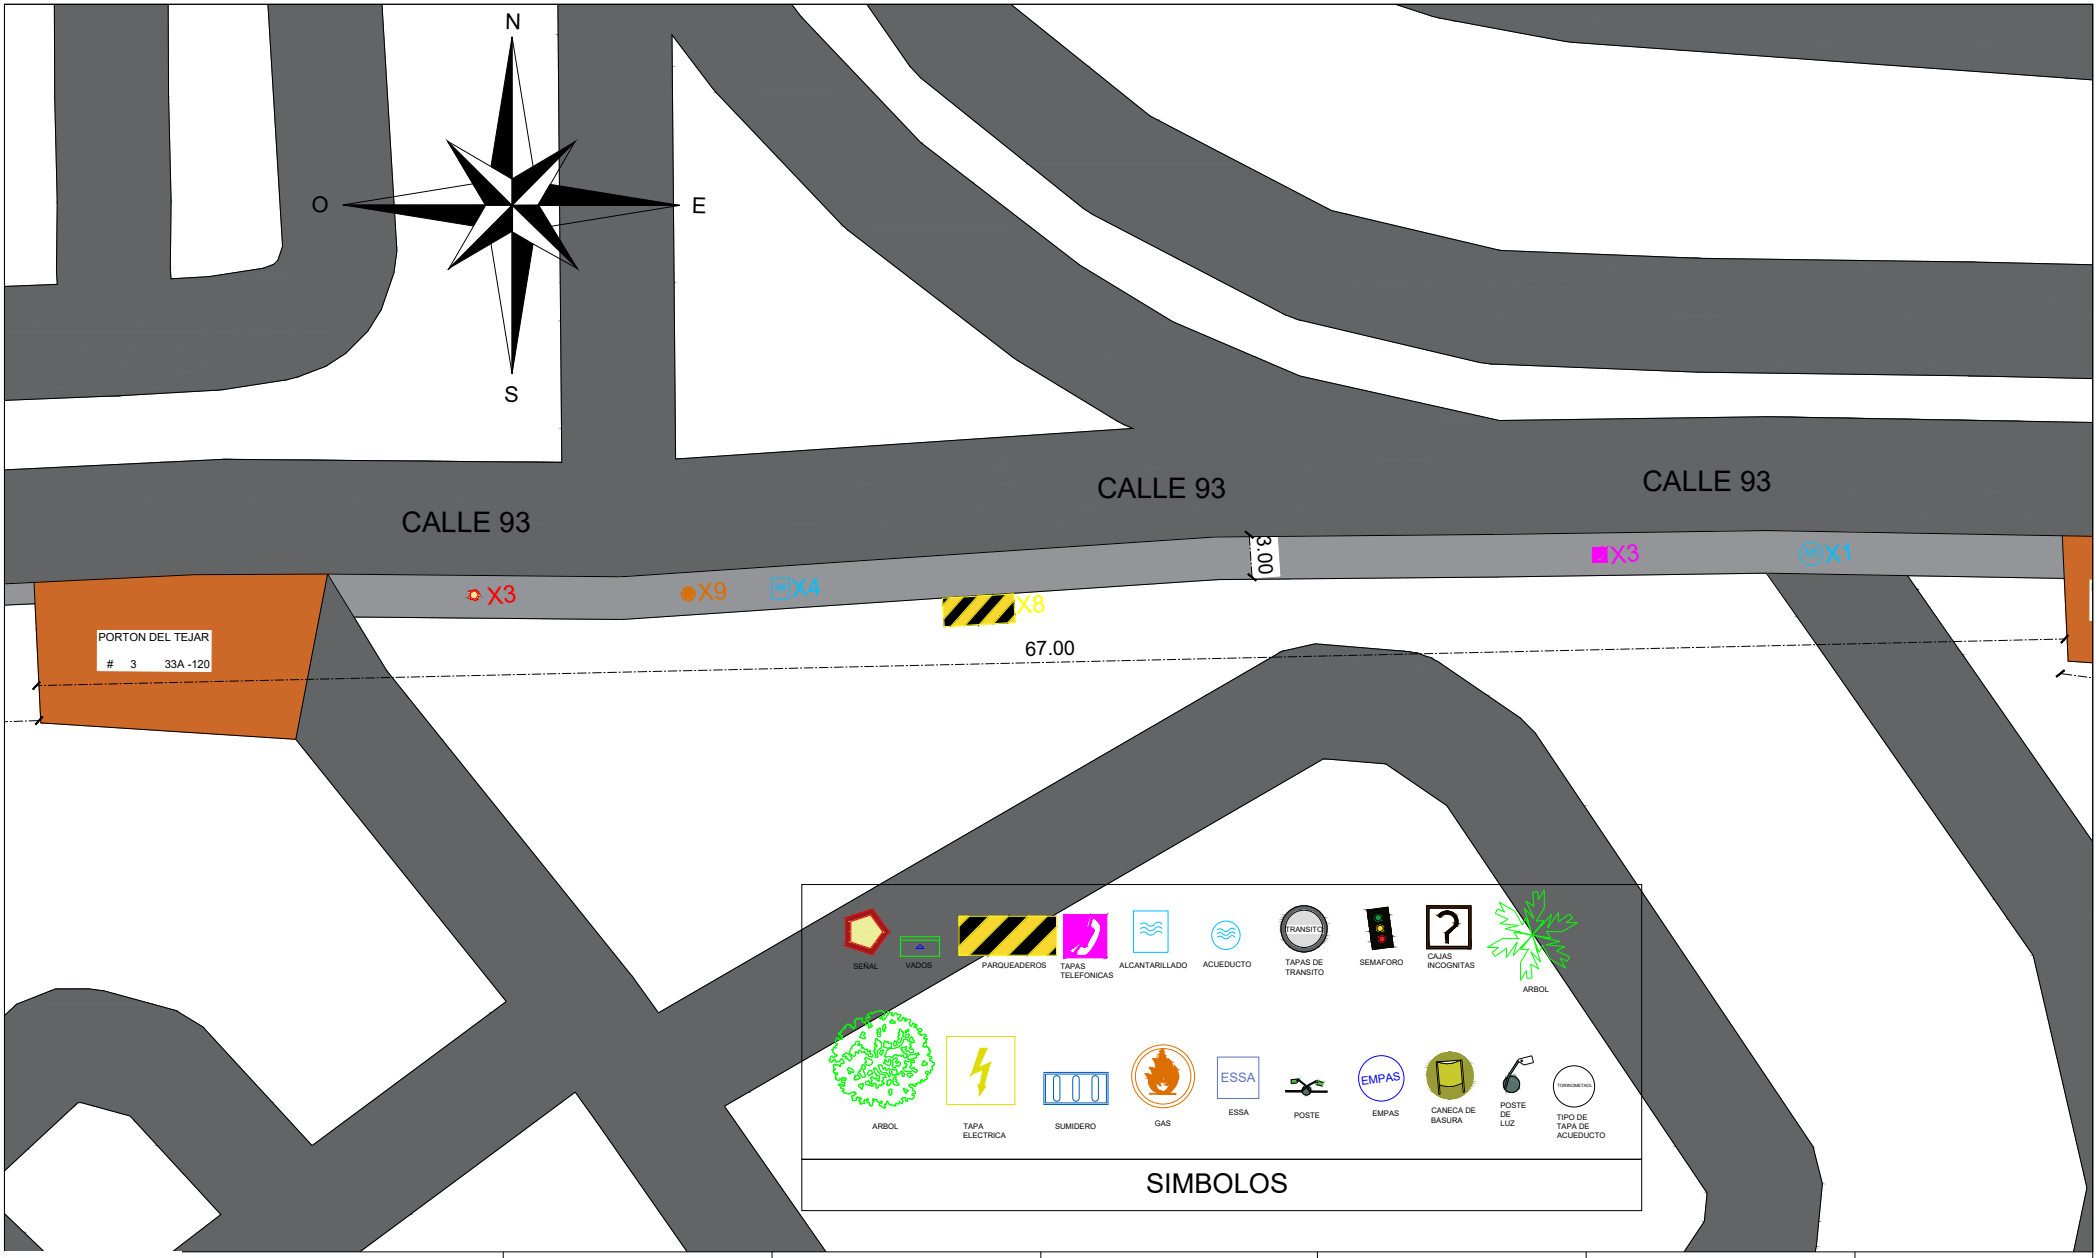

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Secretaria de infraestructura	Hecho por: Maria Arenas Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 24 de mayo 2024	Escala: Indicada	Localización: Barrio Tejar	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..

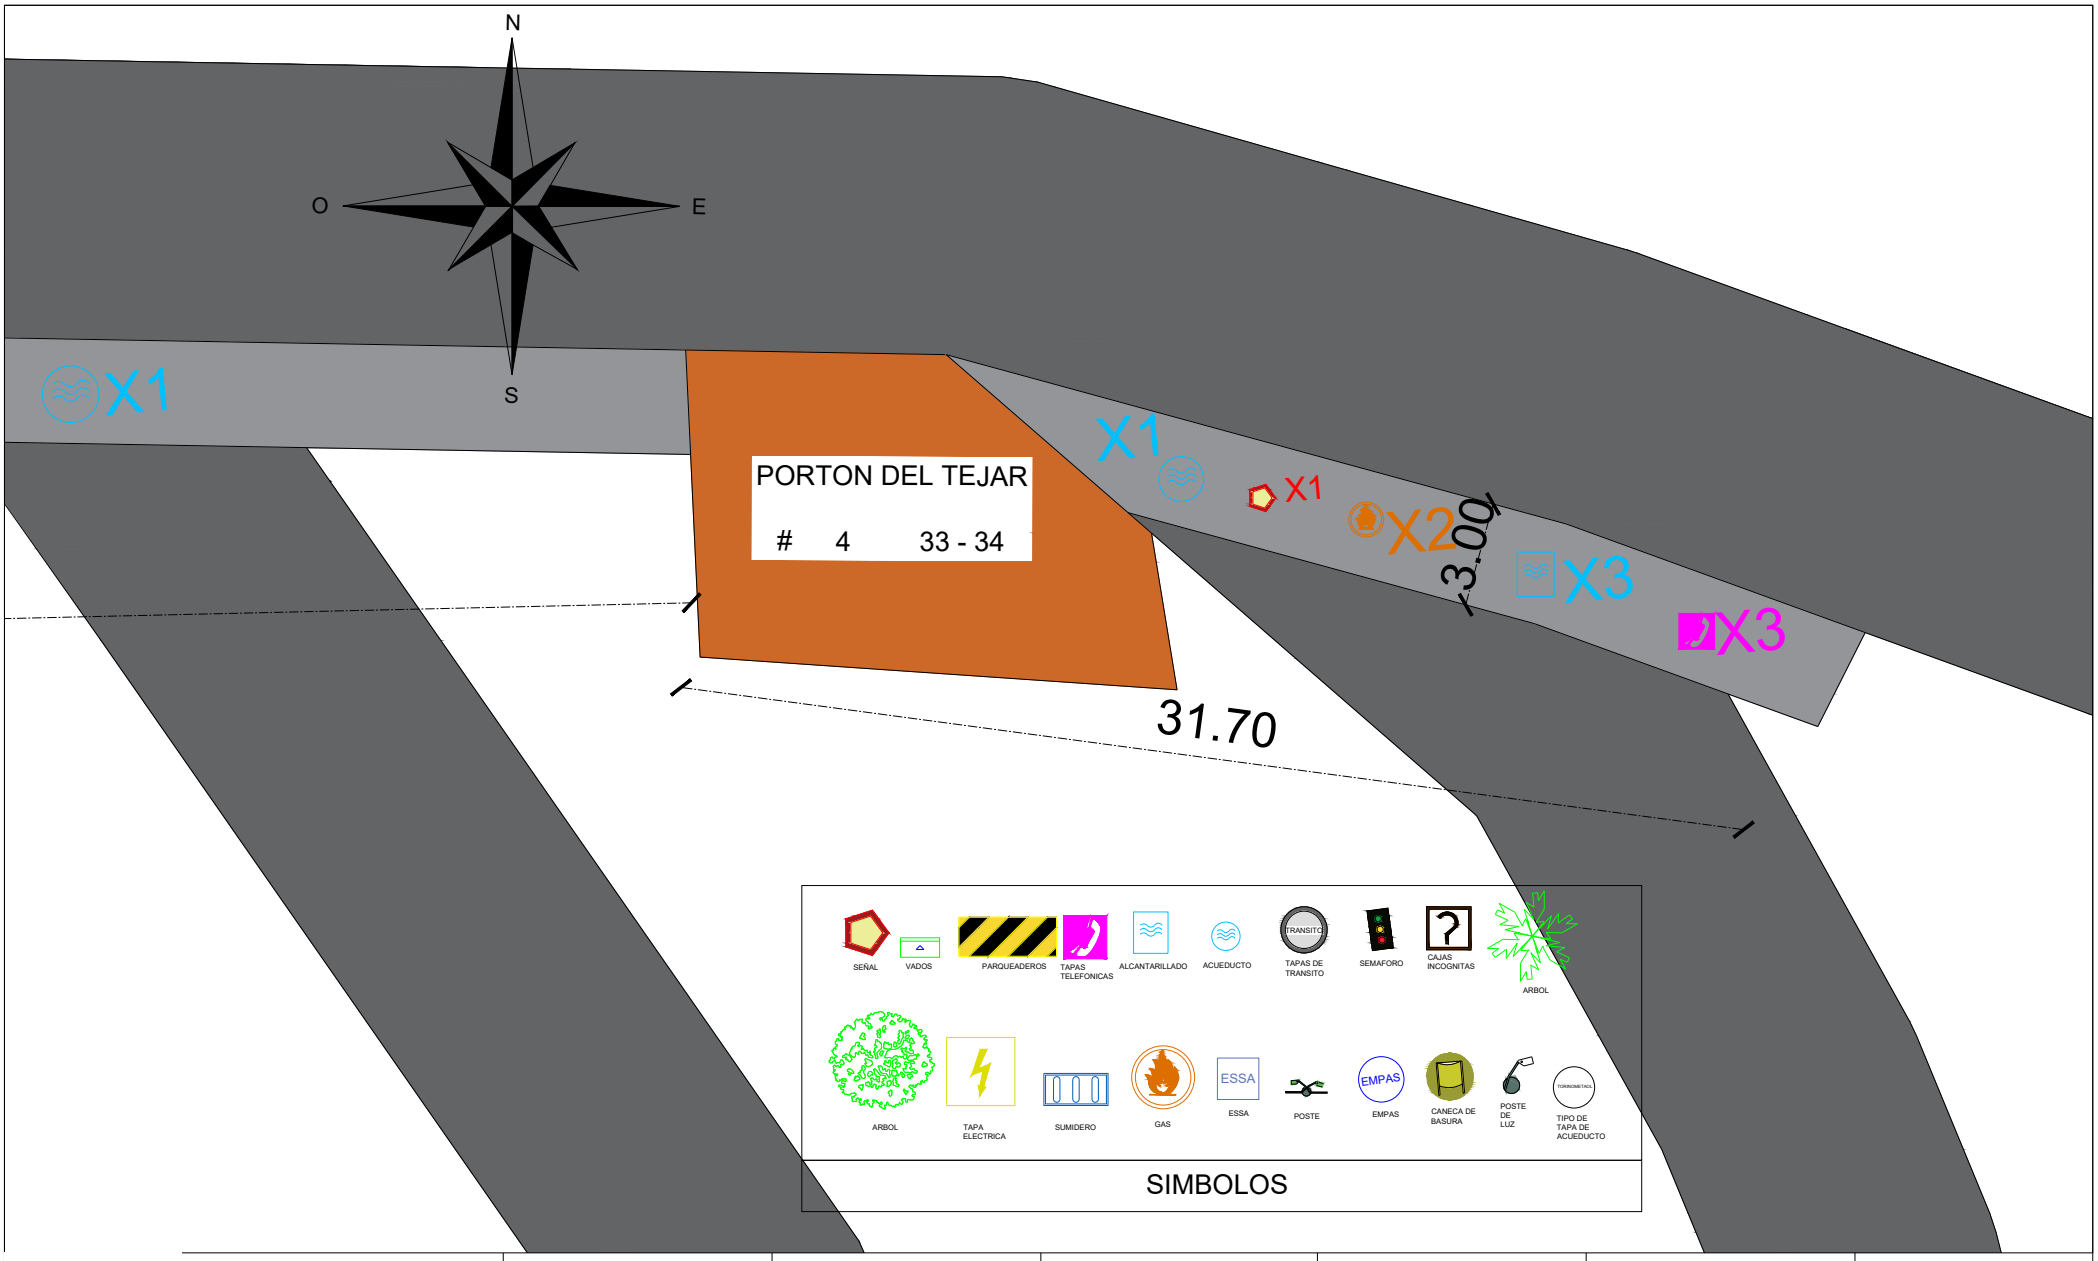

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Alcaldia Bucaramanga	Revisa: Secretaria de infraestructura	Hecho por: Maria Arenas Tec. Dibujo arq	Fecha Visita: 24 de mayo 2024	Escala: Indicada	Localización: Barrio Tejar	Contiene: Plano de andenes con identificación de acueductos, cajas eléctricas, etc..
