ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

INFORME DE SUPERVISION N°1
FECHA INFORME: 24-01-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA C-OBRA-No. 283-2024
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 04-12-2024 A 10-01-2025

1. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
IDENTIFICACION:	NIT N° 900.976.357-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
IDENTIFICACION:	C.C. N° 1.019.044.913 de Bogotá D.C.
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL CURAL SECTOR BUTULU; LA VIA DE LA VEREDA UCRANIA SECTOR CASERIO Y LA VIA DE LA VEREDA CURAL SECTOR CASA GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
VALOR: M/CTE.	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 331.085.753,00) M/CTE
DURACION:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE DOS (02) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
FECHA DE INICIO:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	03 DE FEBRERO DE 2025
2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO (EN CASO QUE APLIQUE)	
ADICION EN VALOR:	NA
FECHA DE LA ADICION:	NA
PRORROGA EN TIEMPO:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NA
FECHA TERMINACION:	NA

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo mandado en los **Artículos 83, 84 y 85** de la **Ley 1474 de 2011** y de las funciones establecidas dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales de la alcaldía municipal, como supervisor del contrato me permito informar que: el desarrollo correspondiente al pago No. 1 **del CONTRATO DE OBRA No. 283-2024, de fecha: 28/11/2024** en los siguientes términos:

3.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN LAS ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto contractual:

El avance financiero en la ejecución del contrato es del 60.56 %, y un avance de obra del 65%.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dentro de las actividades desarrolladas en el presente contrato se encuentran actividades de:

- Localización y Replanteo
- Conformación de la Calzada Existente
- Subbase Granular
- Excavaciones varias en material común seco a mano (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Excavaciones varias a máquina sin clasificar (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)
- Concreto clase D, f´c = 3000 PSI (bases)
- Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases
- Cuneta en concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar
- Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI

Dichas cantidades se encuentran expresadas en la memoria de cantidades entregadas anexa a este informe.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE PROCESOS

Como soporte al registro fotográfico de actividades desarrollas del presente informe se anexa el informe de obra y registro fotográfico presentado por parte del contratista.

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VERDA EL CURAL SECTOR BUTULU DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

40.65 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 4.5 mts, una rampa de entrada que permite el empalme con la vía existente con una longitud de 1.5 mts, para un total de 38.55 ml de vía mejorada a la fecha del presente informe.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

SUBBASE GRANULAR

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)



EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

CONCRETO CLASE D, F´C = 3000 PSI (BASES)




CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES



CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR



SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

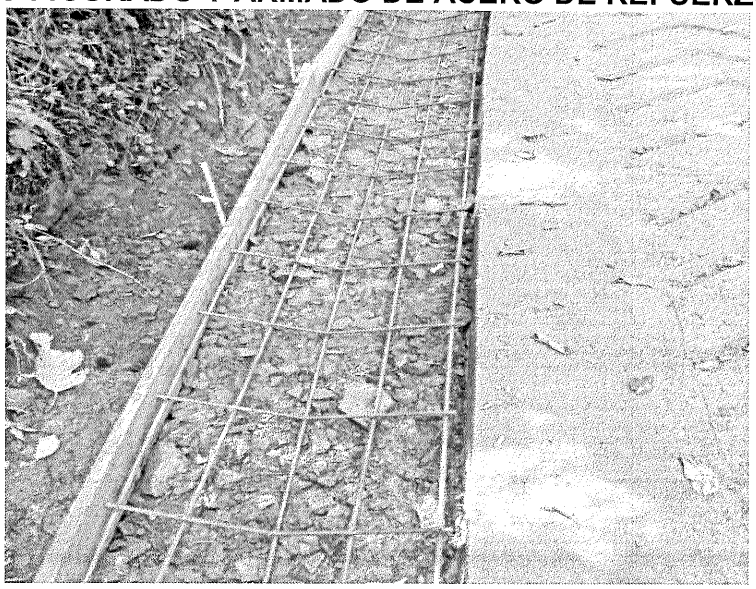

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA UCRANIA SECTOR EL CASERIO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA


34.65 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 4.0 mts, una rampa de entrada que permite el empalme con la vía existente con una longitud de 1.5 mts, para un total de 36.15 ml de vía mejorada a la fecha del presente informe.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE


SUBBASE GRANULAR

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

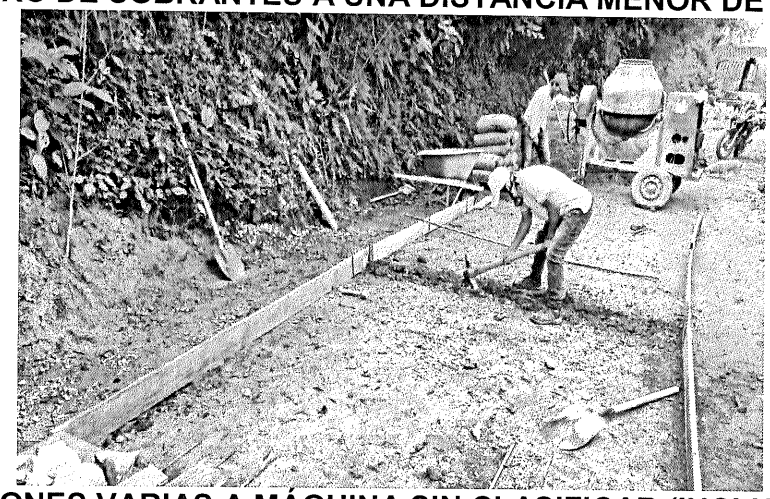


EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)


CONCRETO CLASE D, F´C = 3000 PSI (BASES)

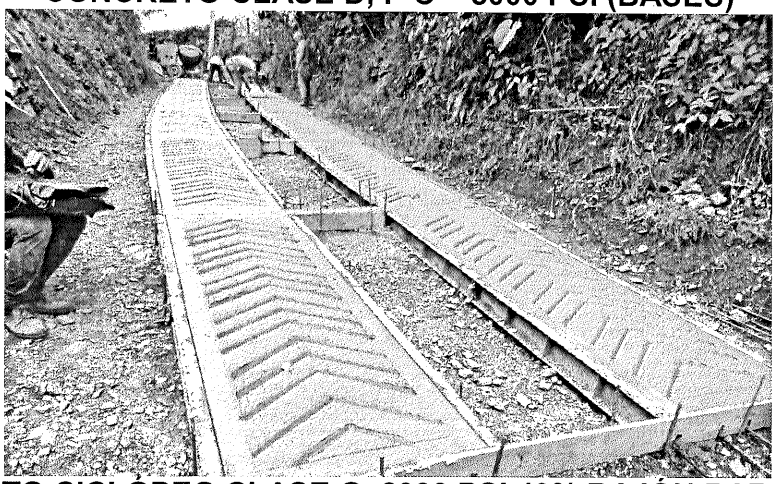


CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

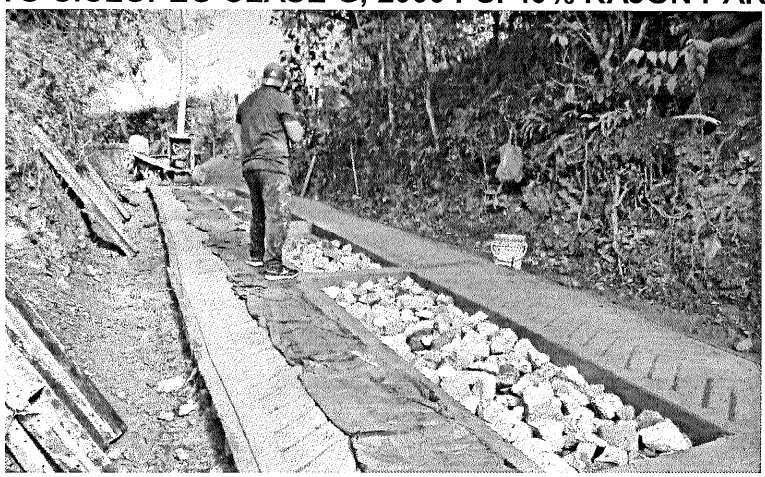

CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

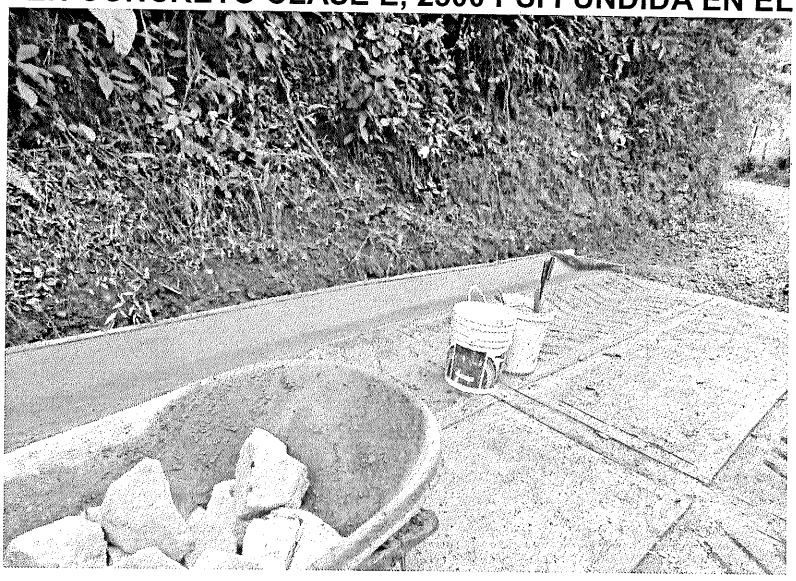

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

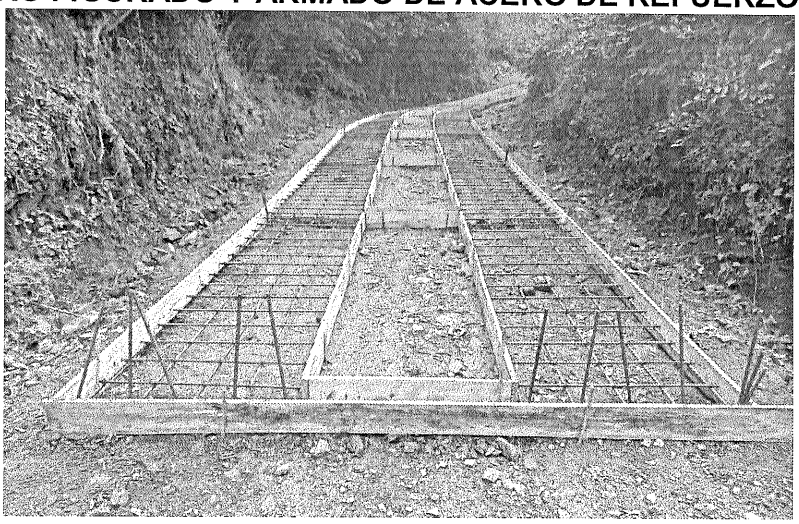

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL CURAL SECTOR CASA DE GUADUA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

70.65 ml construidos de placas huellas, con un ancho de vía de 5.0 mts, empalme con las placas huellas existentes, para un total de 70.65 ml de vía mejorada a la fecha del presente informe.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO


CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE


SUBBASE GRANULAR

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)



EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
CONCRETO CLASE D, F´C = 3000 PSI (BASES)

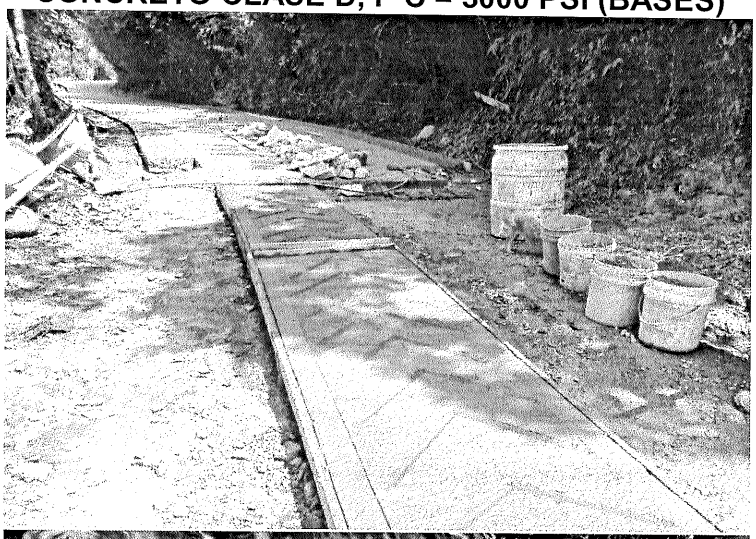


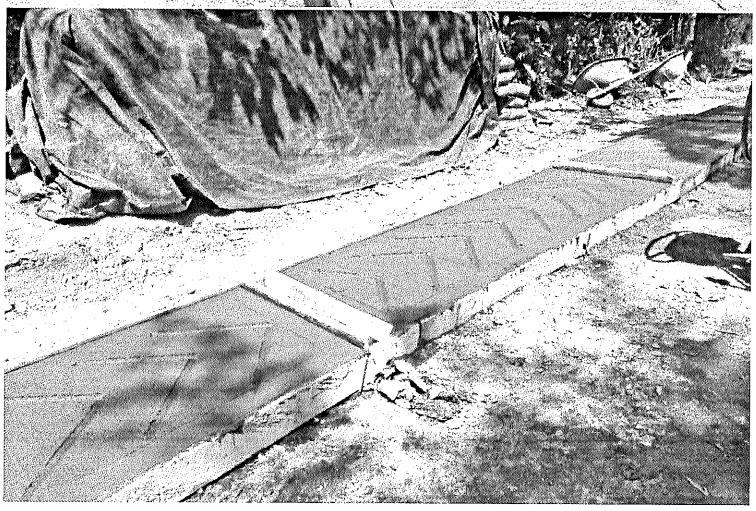


CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES



CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

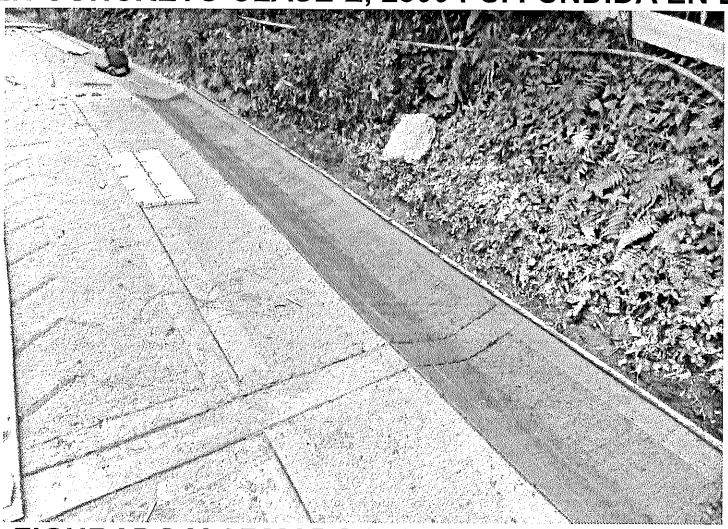

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

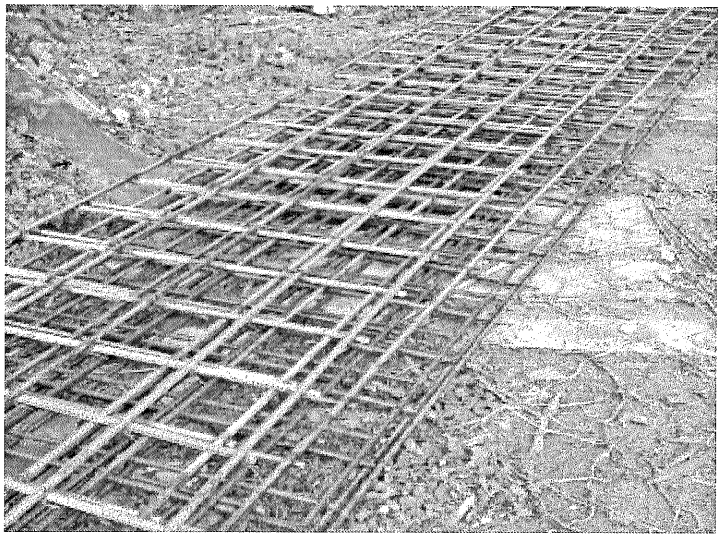

4. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO:

A la fecha de suscripción del presente informe de supervisión el avance físico en la ejecución es del (65%).

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En cumplimiento con lo dispuesto en el **Artículo 2.2.4.2.2.13** del **Decreto 1072 de 2015,** se procedió a verificar el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, ARL, pensión) y parafiscales correspondientes al periodo de diciembre de 2024 y enero de 2025.

El contratista aporta dentro del informe de obra la respectiva certificación de parafiscales.

6. AVANCE FINANCIERO

6. 1 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2024000610
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2024001217
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$331.085.753,00
ADICIONES	00,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$331.085.753,00

6.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO EJECUTADO	FECHA CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN	VALOR EJECUTADO
PRIMER PAGO	24-01-2025	$200.517.385,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$200.517.385,00**

6.3 TOTAL PAGADO

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR PAGADO
TOTAL PAGADO		$00,00

6.4 RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$331.085.753,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$00,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$331.085.753,00

VALOR TOTAL EJECUTADO	$200.517.385,00
SALDO POR EJECUTAR	$130.568.368,00
VALOR TOTAL PAGADO	$00,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$200.517.385,00
VALOR PENDIENTE A PAGAR	$00,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$00,00

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor del contrato certifico que para el presente pago el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además cumplió con todas las obligaciones pactadas y con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por el valor de ***doscientos millones quinientos diecisiete mil trescientos ochenta y cinco pesos con cero centavos ($200.517.385,00) M/CTE***

Dado a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2025.

LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO
Secretaria de planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Elaboro: DAYRON ALEXIS CELIS TRIANA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
