CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INFORME FINAL TÉNICO DE INTERVENTORÍA
PERIODO: DEL 19 DE JUNIO 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:



4318 DE 2023 – OAC LOS ALETONES
4045 DE 2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
4346 DE 2023 – OAC CAMPOALEGRE

PERIODO:

DEL 19 DE JUNIO - 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE - 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO

Tipo de Documento: INFORME TÉCNICO	Contrato: ACEPTACIÓN DE OFERTA 4879 DE 2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
Titulo: INFORME FINAL 19 JUNIO – 15 NOVIEMBRE/2024		
Emitido para: Aprobación		
ELABORÓ: Ing. Residente	Firma:	
	Nombre:	Ing. Diego Fernando Gallego Calderon C. C. No. 1.006.524.418 de Belén de los Andaquies M P No. 091037 0644694 CND
REVISÓ: Ing. Director	Firma:	
	Nombre:	Ing. Elkin David Ramos Mosquera C. C. No. 7.692.245 de NEIVA M P No. 19202 61820 CAU
APROBÓ: Supervisor	Firma:	
	Nombre:	José Ricardo Burbano Barcenas

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 4318 DE 2023
4045 DE 2023
4346 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES
Contratista 2: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

Contrato de Interventoría No. 4879 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME FINAL No. 1

MES O PERIODO: 15-NOVIEBRE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7
	CONTENIDO		14
1	**INTRODUCCIÓN**		18
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		21
2.1	Localización		21
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		27
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		27
2.4	Características técnicas del proyecto		29
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		42
3.1	Información general de convenios solidarios		42
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		54
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		85
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		85
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS**		88
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	88
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	89
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	89
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	90
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	90
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	90
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	91
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	92
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		92
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		92
	• Seguimiento programa de obra		93
4.10	• Actas de comité de obra		95
4.11	• Actas de reunión		95
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		96
5.1	Información general del contrato		96
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		100
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		101
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	101
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	101
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	101
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	101
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		101
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	105
7	**Conclusiones y recomendaciones**		102
8	**Anexos**		103
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		103
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		103
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		103
8.4	Informes semanales		103
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		103
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		104
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		104
8.8	Estado general del tiempo		104
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		104

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 4318 DE 2023
4045 DE 2023
4346 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES
Contratista 2: ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

Contrato de Interventoría No. 4879 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME FINAL No. 1

MES O PERIODO: 15-NOVIEBRE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		104
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		105
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		105
8.13	Seguimiento programa de obra		105
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		105
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		105
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		105
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contrato de interventoría		105
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		105

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4318 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 196.378.598,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	102,000
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros MEJORAMIENTO			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		112,000
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros MEJORAMIENTO				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 147.760.112,00	$ -	$ 147.760.112,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 44.185.683,00	$ -	$ 44.185.683,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.432.803,00	$ -	$ 4.432.803,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 196.378.598,00	$ -	$ 196.378.598,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 147.760.112,00	$ -	$ 147.760.112,00	$ 147.760.112,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 44.185.683,00	$ -	$ 44.185.683,00	$ 44.185.683,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 4.432.803,00	$ -	$ 4.432.803,00	$ 4.432.803,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 196.378.598,00	$ -	$ 196.378.598,00	$ 196.378.598,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 196.378.598,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 196.378.598,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,000%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	**Foto 2**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4045 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 185.171.800,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 185.171.800,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND	5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros MEJORAMIENTO	Alcantarillas	UND		5

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 138.939.422,00	$ -	$ 138.939.422,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 42.064.195,00	$ -	$ 42.064.195,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.168.183,00	$ -	$ 4.168.183,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 185.171.800,00	$ -	$ 185.171.800,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 138.939.422,00	$ -	$ 138.939.422,00	$ 138.939.422,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 42.064.195,00	$ -	$ 42.064.195,00	$ 42.064.195,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 4.168.183,00	$ -	$ 4.168.183,00	$ 4.168.183,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 185.171.800,00	$ -	$ 185.171.800,00	$ 185.171.800,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 185.171.800,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 185.171.800,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,000%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma



Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4346 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199.753.948,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	102,00
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN	1,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ML		115,00
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros MEJORAMIENTO	ALCANTARILLAS	UN		1,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.067.610,00	$ -	$ 151.067.610,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 44.154.310,00	$ -	$ 44.154.310,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.532.028,00	$ -	$ 4.532.028,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.753.948,00	$ -	$ 199.753.948,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 151.067.610,00	$ -	$ 151.067.610,00	$ 151.067.610,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 44.154.310,00	$ -	$ 44.154.310,00	$ 44.154.310,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 4.532.028,00	$ -	$ 4.532.028,00	$ 4.532.028,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 199.753.948,00	$ -	$ 199.753.948,00	$ 199.753.948,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199.753.948,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 199.753.948,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 100,000%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **14**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCANTARILLA ALETA-POCETA FUNDIDA EN CONCRETO ARMADO DE 3000 PSI



PLACA HUELLA FINALIZADA





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **18**
ANTECEDENTES **20**
FINALIDAD DEL PROYECTO **20**
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **21**
2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL **21**
2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS **21**
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **27**
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA **27**
A) CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 – LOS ALETONES **27**
B) CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES **28**
C) CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 – CAMPOALEGRE **28**
2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS **29**
INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS **42**
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **42**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023** **42**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023** **46**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023** **50**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRES CONVENIOS SOLIDARIOS **54**
3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS **85**
3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA **85**
REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **88**
4.1. INFORME SEMANAL **88**
4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS **89**
4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS **89**
4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **90**
4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **90**
4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO **90**
4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **91**
4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS **92**
4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL **92**
- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** **92**
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA** **93**

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **95**
4.11. ACTAS DE REUNIÓN **95**

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA **96**
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO **96**
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR **100**
REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **101**
6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **101**
6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **101**
6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA **101**
6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **101**
6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL **101**
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **102**
ANEXOS **103**
8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO **103**
8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **103**
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **103**
8.1.3 Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **103**
8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS **103**
8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **103**
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **103**
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **103**
8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO **103**
8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **103**
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 ..... **103**
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **103**
8.4. INFORMES SEMANALES **103**
8.4.1. Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318 ..... **103**
8.4.2. Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045 ..... **103**
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346 ..... **103**
8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS **103**

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318 103
8.5.2. Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045....103
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Campoalegre – CS#4346 103
8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 104
8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318.....104
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 104
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346.....104
8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 104
8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Los Aletones – CS#4318 104
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 104
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346 104
8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....104
8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318 104
8.8.2. Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045.....104
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346 104
8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 104
8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318104
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 104
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346 104
8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS.....104
8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318 104
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 104
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346 104
8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS.....105

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318 105
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 105
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346 105
8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 105
8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318 105
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 105
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346 105
8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 105
8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318 105
8.13.2. Seguimiento programa de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045 105
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346105
8.14. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....105
8.15. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 105
8.16. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....105
8.17. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 105
8.18. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO 105

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

El presente informe **FINAL DE INTEVENTORÍA** a consideración del **INVIAS,** comprendido entre el **19 DE JUNIO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuesta, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""**, hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor BENITO OME MUÑOZ de la JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor LUIS ELVER CAANTILLO PATIÑO de ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE

CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor JESUS OME RENTERIA de la JAC DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios está basada en la agricultura, complementada con la ganadería, los cultivos ilícitos y aprovechamientos forestales.

Debido el aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas, las trochas son intervenidas con maquinarias pesada para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, una de las principales actividades económicas de la región que afectan la transitabilidad y aspecto de estas.

El programa caminos para la paz pretende ayudar a la transformación de nuestros campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías terciarias con el objetivo de regenerar las comunicaciones, comercio y acceso a bienes básicos como la salud y educación de estas veredas.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá *s*e localiza en el Sur del país, haciendo parte de la región Amazonia*.* Cuenta con una superficie de 88.965 Km², es el tercer departamento más extenso. Su capital es la ciudad de Florencia*,* y está dividido política y administrativamente en 16 municipios; dos de ellos son los municipios de Belén de los Andaquies y Morelia en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de Belén de los Andaquies se encuentra localizado en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia. Se encuentra en la Zona de transición Andino-Amazónica. En este municipio Se desprende la cordillera Oriental de los Andes Colombianos del Macizo Colombiano. Entre sus paisajes se encuentran el de montaña, piedemonte, lomeríos y valles. Su cabecera municipal se encuentra localizada sobre las coordenadas 1°24’59” latitud Norte y 75°52’21” a una altitud de 310 m s. n. m.

En cuanto al municipio de Morelia se encuentra ubicado en la región de la amazonia colombiana, en el Departamento del Caquetá al sur de Colombia y al suroccidente de la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, de la cual dista 24 kilómetros, en un punto intermedio entre Florencia y Belén de los Andaquíes sobre la carretera Marginal de la Selva. La cabecera municipal está ubicada a 1°29’25” de latitud norte y 75°43’43” de longitud oeste y tiene una altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de superficie de 46468 hectáreas (464.7 km²), y cuenta con el suelo urbano más pequeño del Caquetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS

- *VEREDA LOS ALETONES (CS # 4318 - 2023)*

El tramo a intervenir de Placa Huella se encuentra ubicado en el municipio de Belén de los Andaquies Caquetá en la vereda Los Aletones, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá en el acceso de la vereda Aletones en Km 11+450 de la vía Tramo Los Mosquera, con coordenadas iniciales 1,48793 N ; - 75,86604 W, y punto final de coordenadas 1,48851 N- 75,86735 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

https://www.bing.com/maps?osid=ebdd4dd3-54ae-4426-9c87-2888ad8574f4&cp=1.488768%7E-75.865319&lvl=17.5&v=2&sV=2&form=S00027&style=h

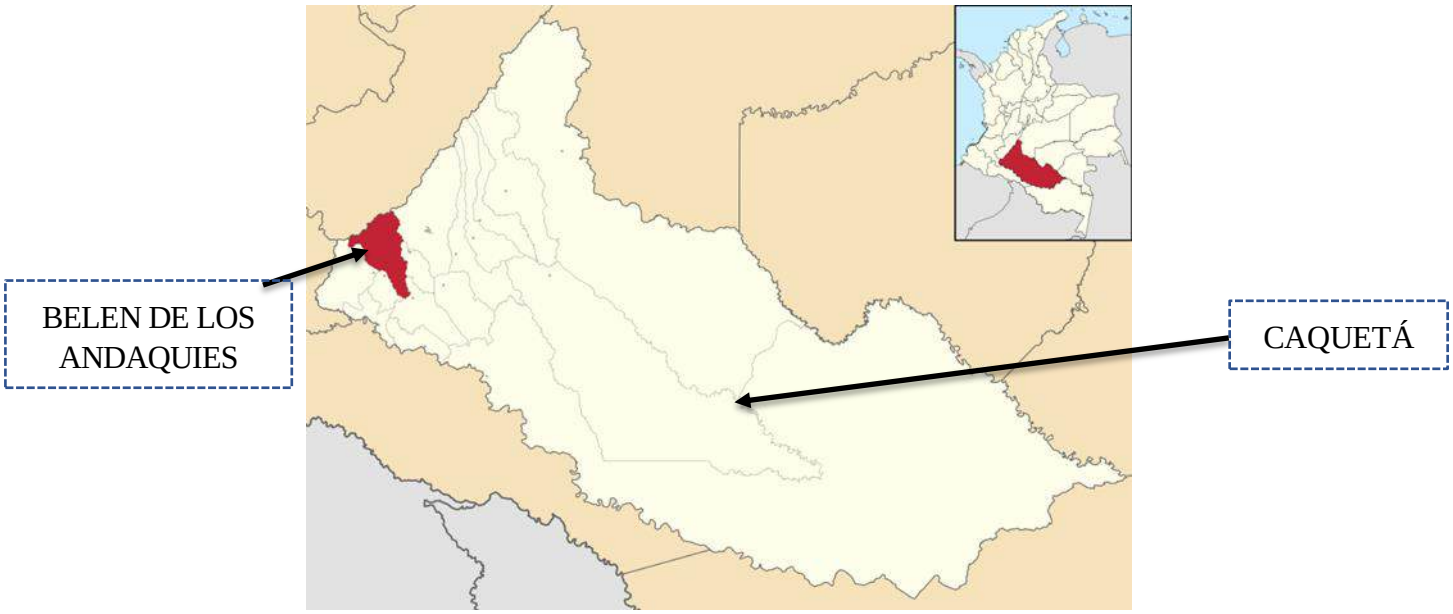


Ilustración 1. *Localización municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 2. *Ubicación del proyecto en la Vereda Los Aletones.*



Ilustración 3. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Los Aletones.*

- *ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES (CS # 4045 - 2023)*

Los puntos a intervenir de Alcantarillas se encuentran ubicados en el municipio de Belén de los Andaquies Caquetá en la vereda El Porvenir, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá en el acceso de la vereda El Porvenir en Km 2+400 de la vía Tramo Génova, con coordenadas iniciales 1,42528 N; - 75,88028 W, y punto final de coordenadas 1,44111 N; - 75,87000 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

https://www.bing.com/maps?osid=395e39ac-09e7-4d8c-bc15-5c781dcf6238&cp=1.43193%7E-75.866188&lvl=14.7&v=2&sV=2&form=S00027

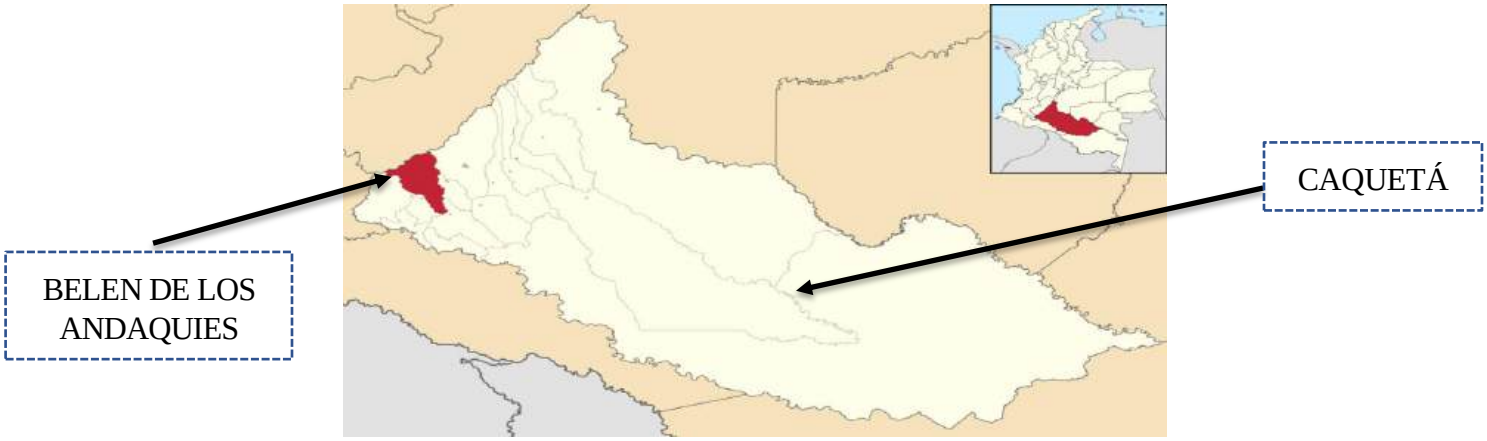


Ilustración 4. *Localización municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 5. *Ubicación del proyecto ASOJUNTAS BELEN en la Vereda El Porvenir.*

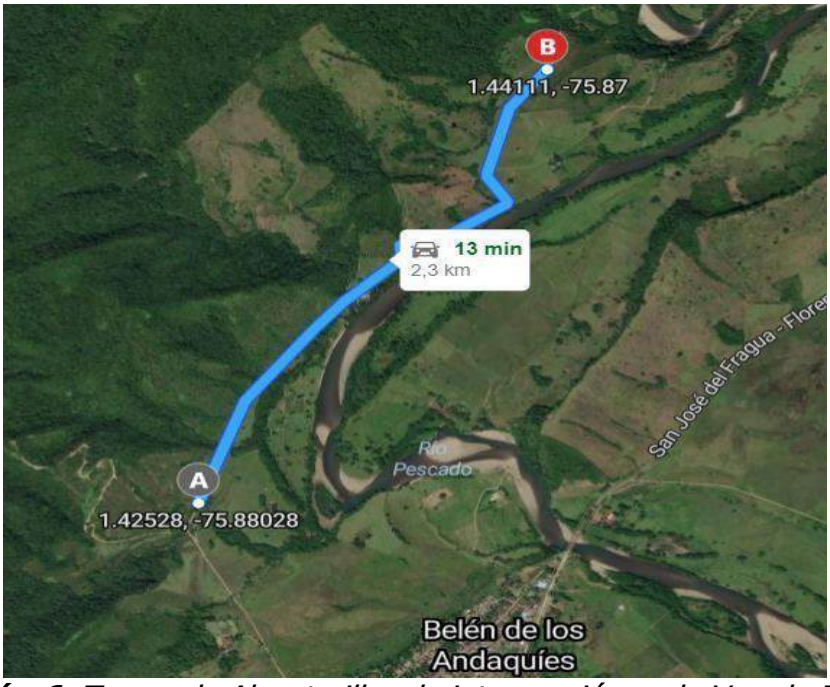


Ilustración 6. *Tramo de Alcantarillas de intervención en la Vereda El Porvenir.*

- *VEREDA CAMPOALEGRE (CS # 4346 - 2023)*

Los puntos a intervenir de Alcantarilla y Placa Huella se encuentran ubicados en el Se encuentra ubicados en el municipio de Morelia Caquetá en la vereda Campoalegre, teniendo como punto de referencia inicial el PR 21+000 de la vía Morelia – Valparaíso, con coordenadas iniciales 1,31611 N; - 75,69974 W, y punto final de coordenadas 1,31416 N; - 75,69173 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Microsoft bing".

https://www.bing.com/maps?osid=40c04c60-c5b6-498e-a7ae-c62470f7a743&cp=1.315309%7E-75.700997&lvl=16.8&v=2&sV=2&form=S00027

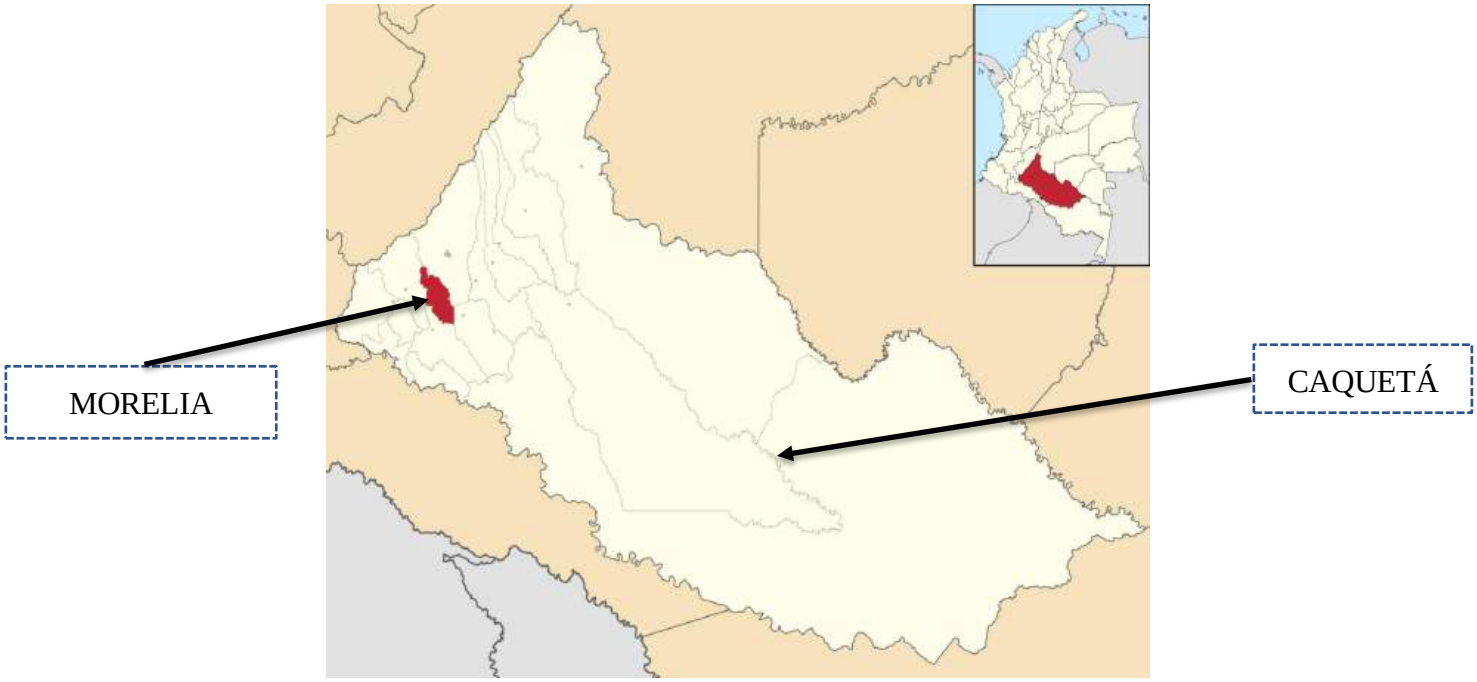


Ilustración 7. *Localización municipio de Morelia en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 8. *Ubicación del proyecto en la Vereda Campoalegre.*

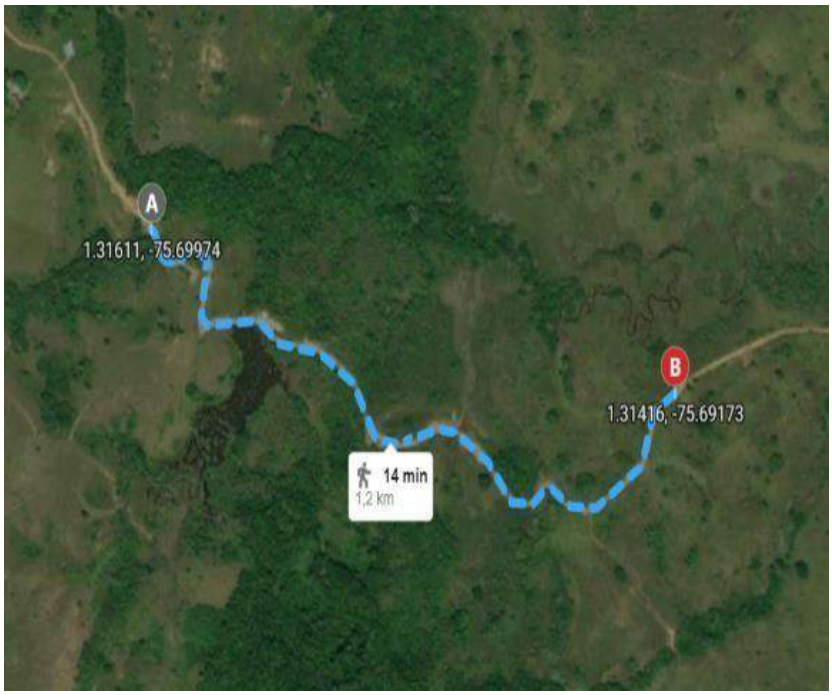


Ilustración 9. *Tramo de placa huella y alcantarilla de intervención en la Vereda Campoalegre.*

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los municipios directamente influenciados por el proyecto son Belén de los Andaquies en sus veredas Aletones, El Porvenir, San Luis, San Antonio, Las Minas, El Prado y Los Ángeles, en el municipio de Morelia en sus Veredas Campo Alegre, Fuente Hermosa, Virginia y Rochela. Adicionalmente, con la atención de dichas vías se pretende entregar a las comunidades una vía en óptimas condiciones de transitabilidad y seguridad, la cual ocupa un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 – LOS ALETONES

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Los Aletones*

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo a intervenir llamado Los Mosquera actualmente se ha convertido en un punto crítico que dificulta el acceso y el tránsito de vehículos o motocicletas hacia las diferentes zonas veredales del municipio. Una de las principales causas de esta problemática se genera en épocas de invierno principalmente por la composición del suelo tipo arcilloso que suelen presentar un alto porcentaje de saturación de humedad provocando una afectación directa al estado de la vía. Debido esto se requiere una intervención directa a través de un mejoramiento a la estructura de la vía y pavimentación mediante el sistema

de placa huella con el fin de mejorar la movilidad y el transporte de los diferentes productos agrícolas comercializados en la zona con el objetivo de impulsar el desarrollo y crecimiento económico en el área rural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

- INVENTARIO

En el tramo de intervención se evidencian alcantarillas en concreto reforzado y tramos de placa huella por sectores.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Regular	8
Placa Huella	Regular	500 m

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención – Asojuntas Belén de los Andaquies*

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Los puntos a intervenir se encuentran por nombre vía Génova – La abeja, los cuales presentan diversos puntos críticos en diferentes tramos principalmente por el mal manejo y drenaje de aguas lluvias en épocas de inviernos que provocan la perdida de los finos, socavación, derrumbes entre otros afectando la movilidad y el transito vial de los habitantes, productos agrícolas, etc. Por lo tanto, se requiere la necesidad de realizar mantenimiento y limpieza de las obras de drenaje existentes (cunetas y alcantarillas) además de construir o implementar nuevas obras de canalización y desagües en puntos críticos a lo largo de la vía. De esta manera se busca mitigar el impacto y daños de la vía por causas de las fuertes lluvias.

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 – CAMPOALEGRE

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

Tabla 3. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Campoalegre*

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El tramo a intervenir se encuentra en un estado general de la superficie como una vía carreteable que presenta irregularidades del terreno a lo largo de la vía por paso de agua en épocas de lluvias, los cuales impiden la transitabilidad de fácil acceso en épocas de invierno, por lo cual se recomienda mejorar. El ancho de la vía es variable entre 5 a 6 m aproximadamente. Se observa vegetación alta y media invadiendo parte de la vía.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.


A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de Aletones, Campoalegre y la Asociación comunal de juntas del municipio de Belén de los Andaquies, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:

- **JAC LOS ALETONES** (CS#4318 DE 2023)

La organización de acción comunal de la vereda Los Aletones tiene como alcance la construcción de ciento dos (102) metros lineales de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

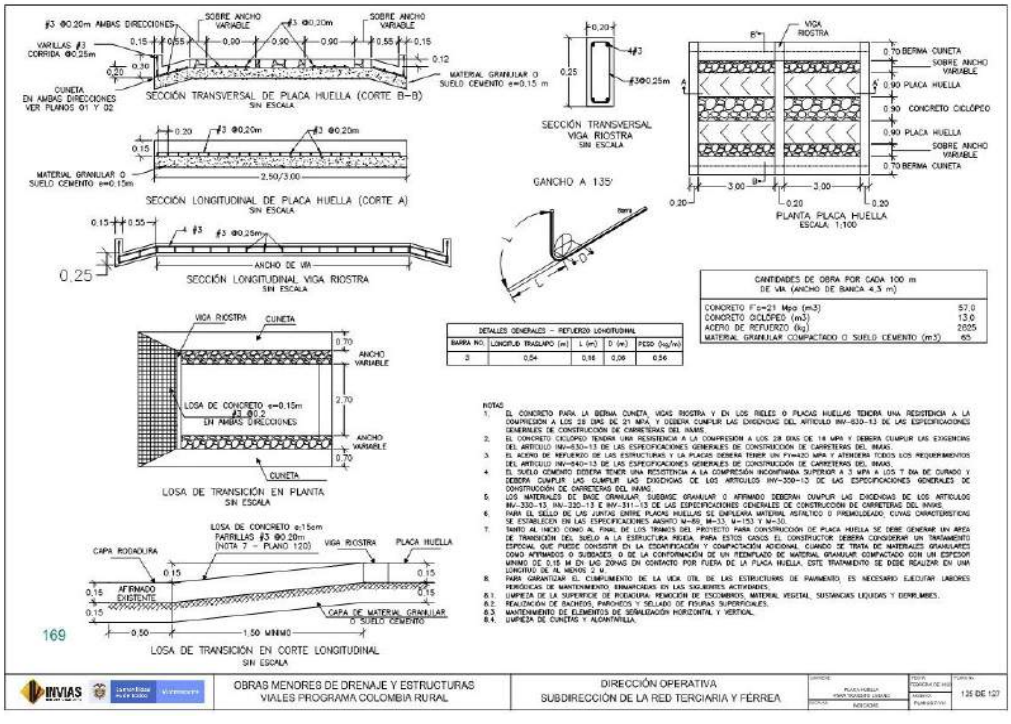



- **ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES** (CS#4045 DE 2023)


La Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies tiene como alcance la construcción de cinco (5) alcantarillas.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

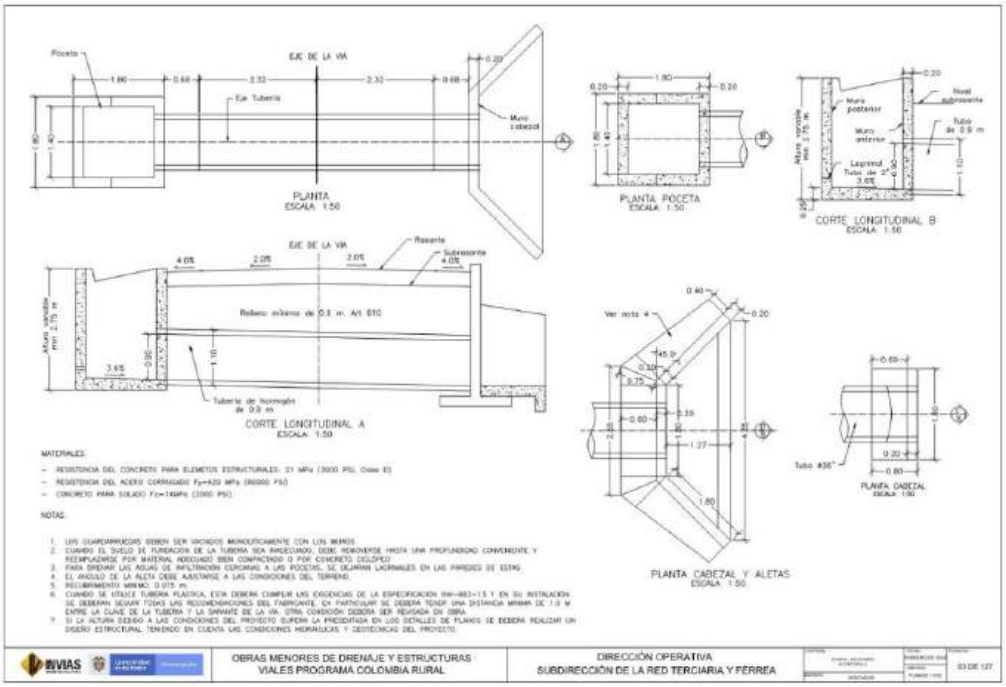

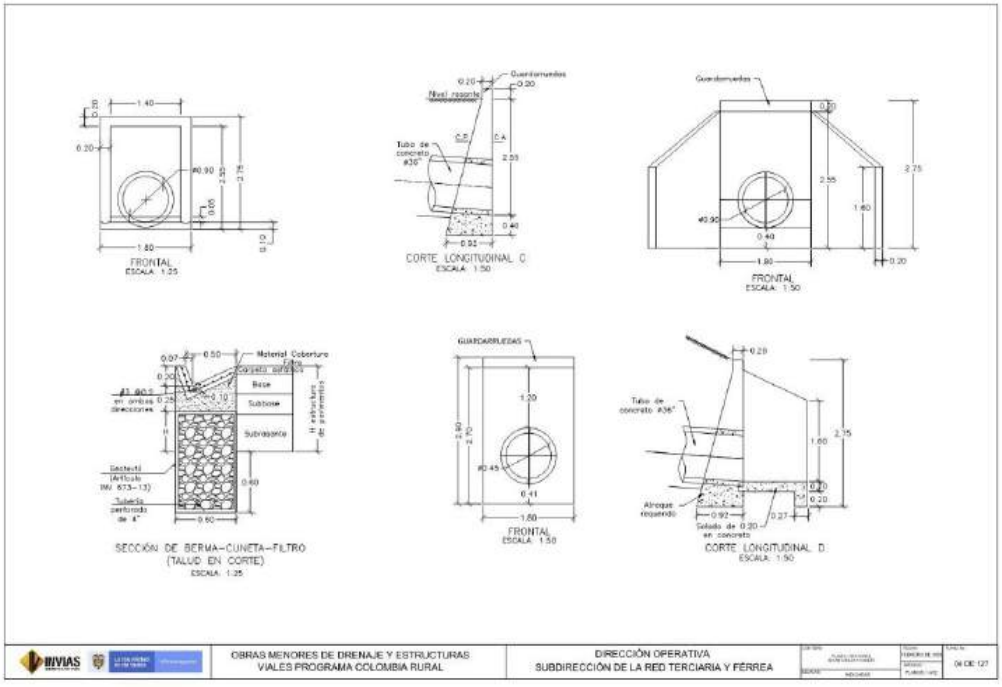

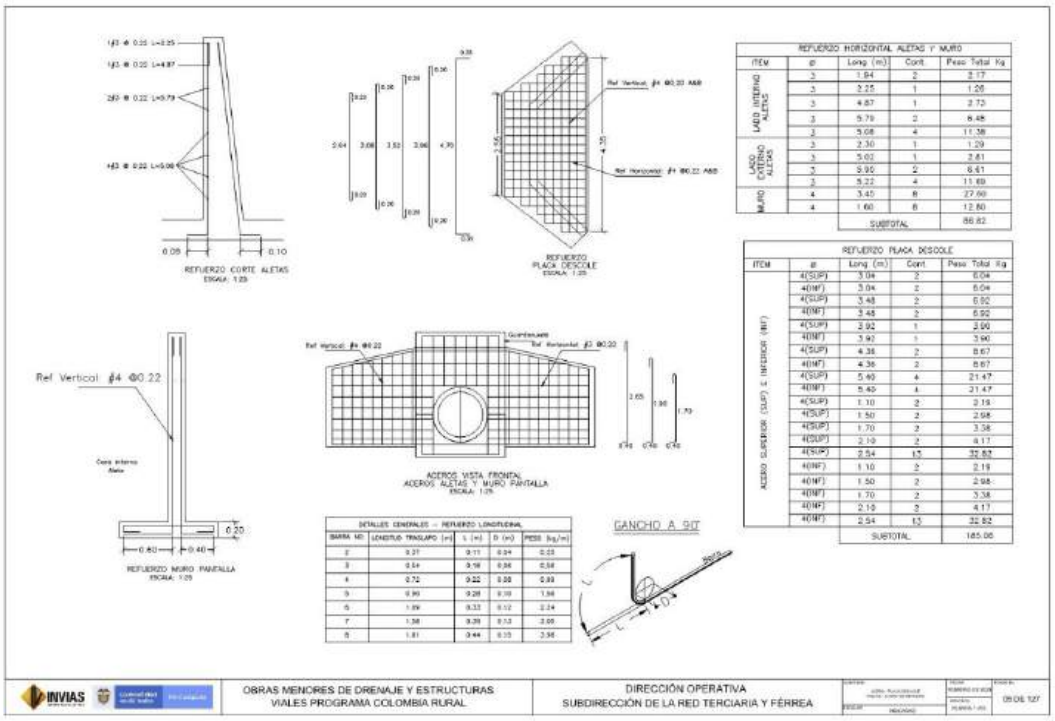

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO


ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.84	2	3.17
	3	3.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	8.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	8.61
MURO	3	5.22	4	11.69
	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		86.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	2.92	1	3.90
	4(INF)	2.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
		SUBTOTAL		165.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO kg/m
2	0.27	0.11	0.04	0.05
3	0.54	0.18	0.06	0.56
4	0.72	0.22	0.08	0.99
5	0.90	0.26	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.36	0.39	0.13	3.05
8	1.81	0.44	0.16	3.96

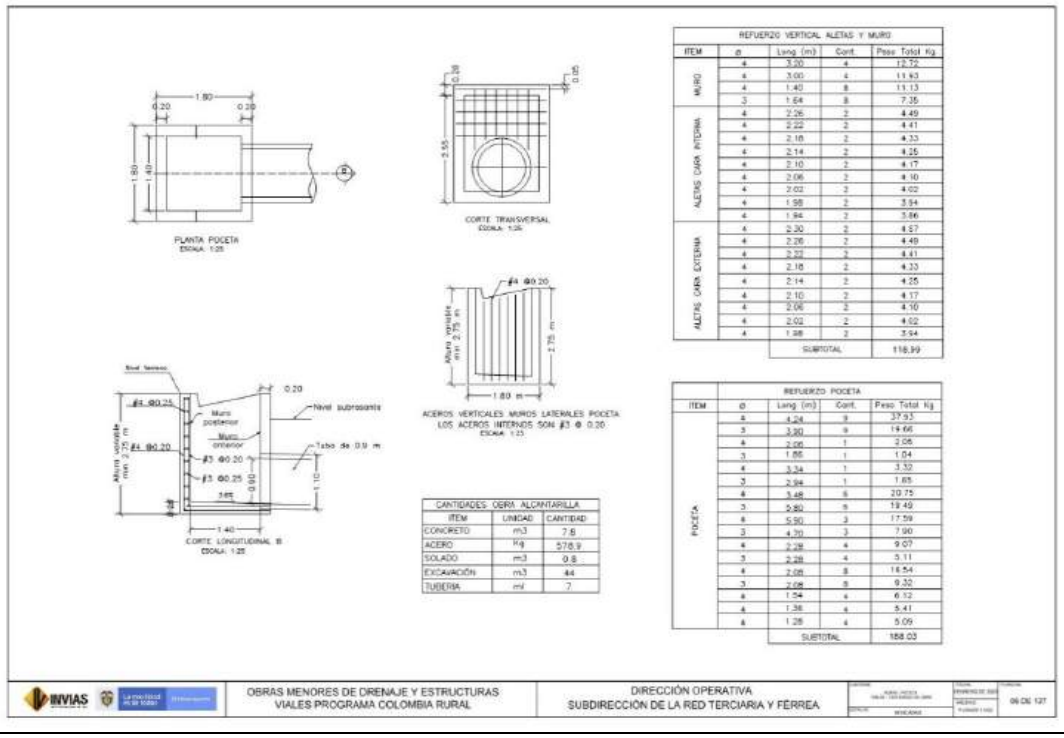

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.00	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
		SUBTOTAL		118.99

REFUERZO POCETA

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.90	9	19.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.66	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.85
	4	3.48	6	20.75
	3	5.80	5	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.08	8	16.54
	3	2.08	5	8.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		168.03

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA


ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.6
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

- **JAC CAMPOALEGRE** (CS#4346 DE 2023)


La organización de acción comunal de la vereda Campoalegre tiene como alcance la construcción de cientos dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla.


CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA**
	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior


ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

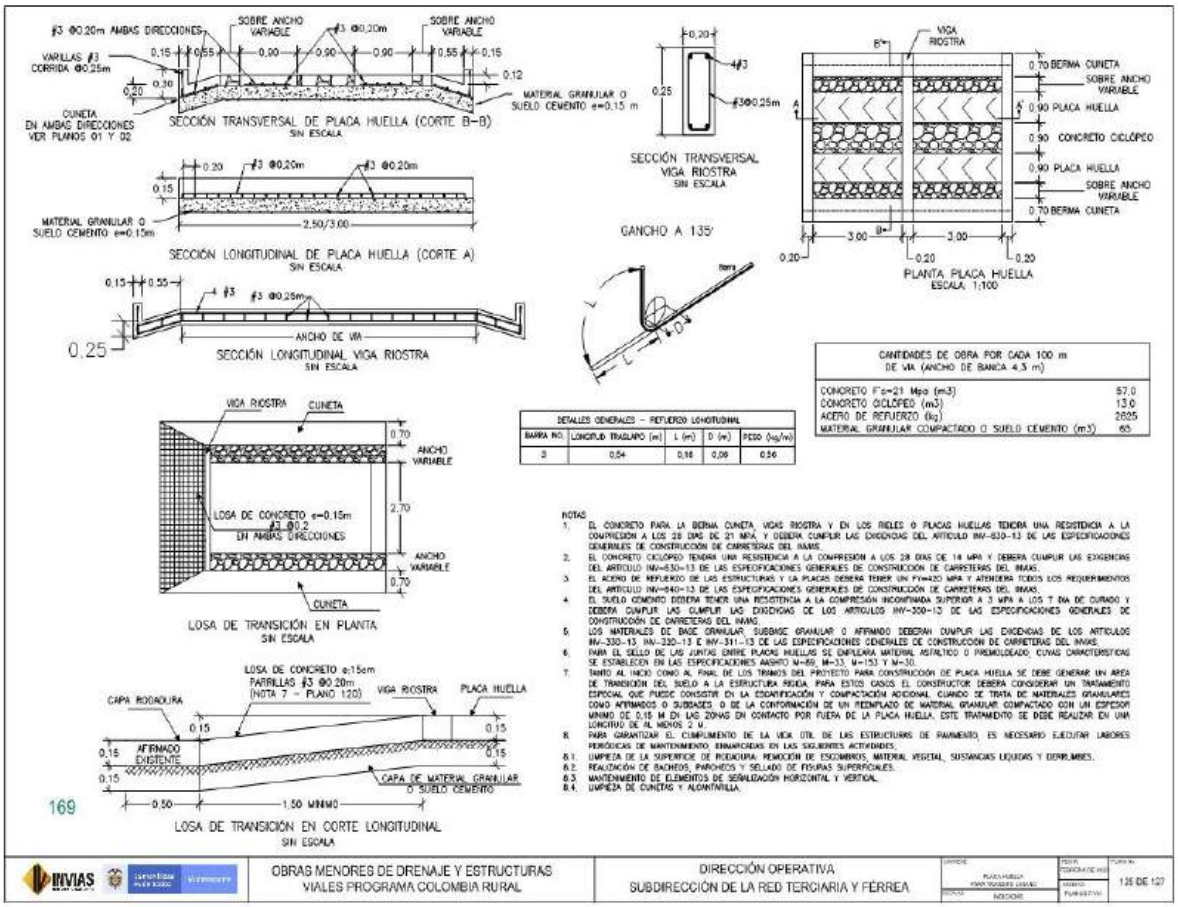

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

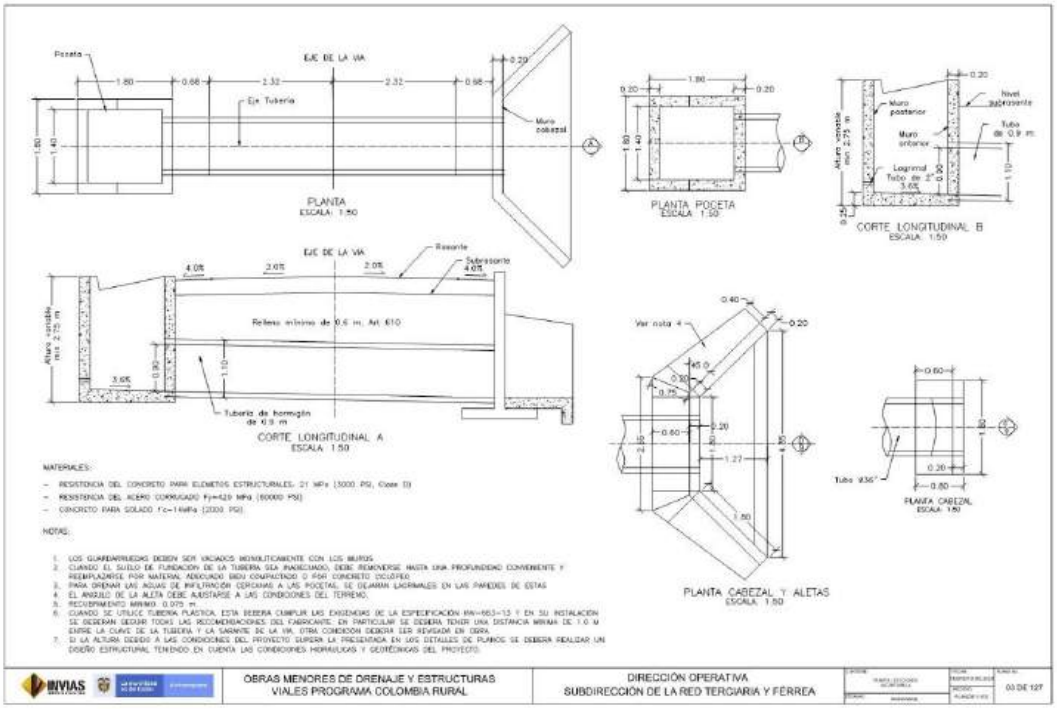

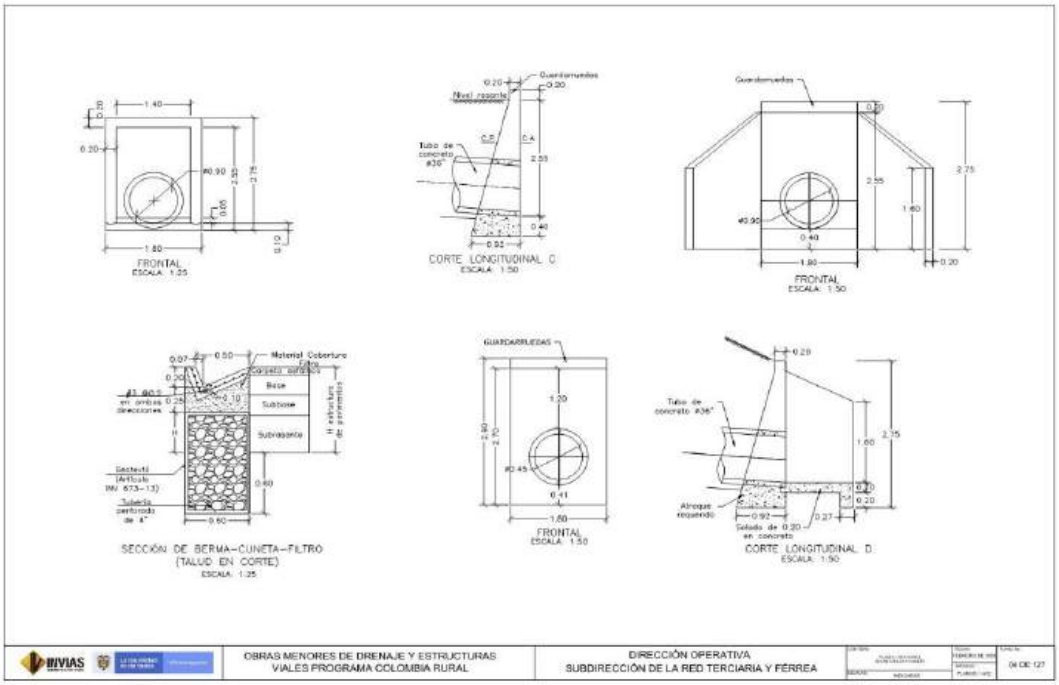

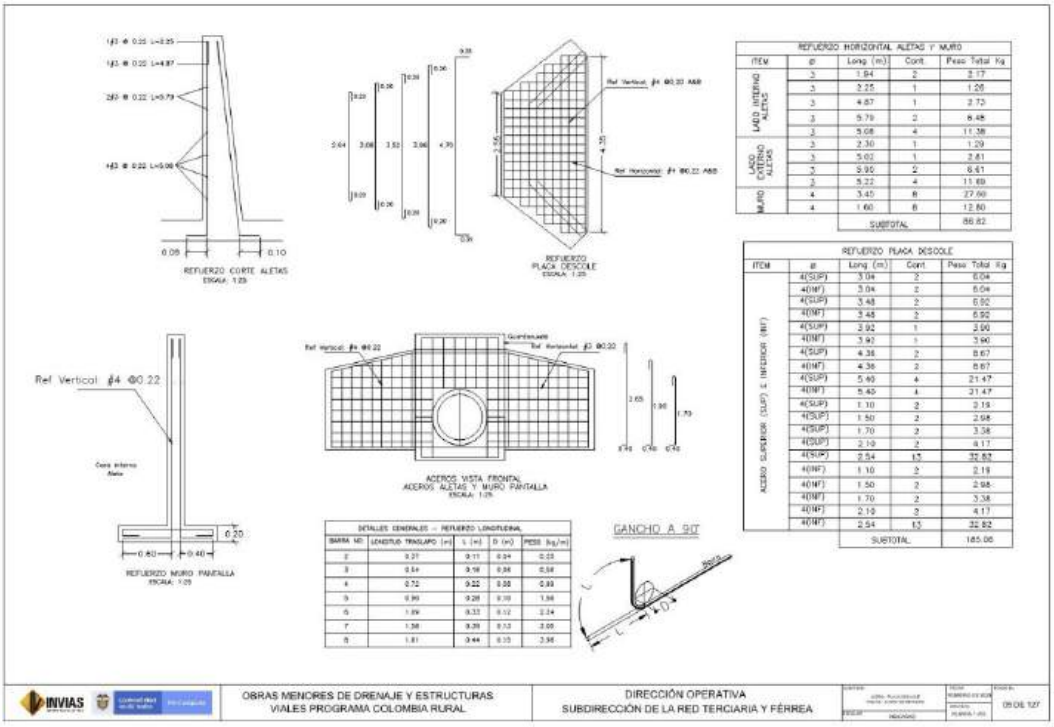

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO


ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.84	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	8.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	8.41
	3	5.22	4	11.69
MURO	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		88.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.90
	4(INF)	3.48	2	6.90
	4(SUP)	3.92	1	3.90
	4(INF)	3.92	1	3.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
		SUBTOTAL		185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO (kg/m)
2	0.27	0.77	0.24	0.23
3	0.54	0.58	0.36	0.58
4	0.72	0.55	0.48	0.93
5	0.90	0.28	0.60	1.86
6	1.08	0.33	0.72	2.24
7	1.26	0.39	0.72	3.05
8	1.81	0.44	0.72	3.96

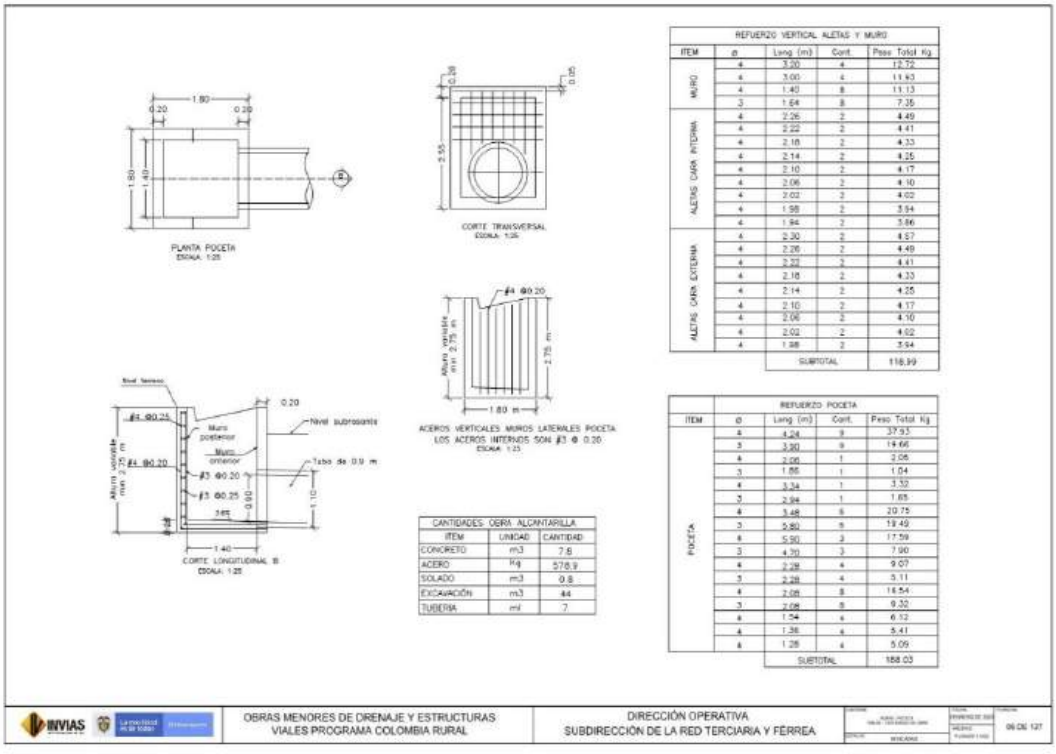

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
	4	1.94	2	3.86
ALETAS CARA EXTERNA	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
		SUBTOTAL		118.99

REFUERZO POCETA

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.30	9	14.66
	4	2.06	1	2.05
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	5.48	5	20.75
	3	5.80	5	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.06	8	16.54
	3	2.06	8	9.32
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		188.03

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA


ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.6
ACERO	Kg	576.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

- **JAC CAMPOALEGRE** (CS#4346 DE 2023)


La organización de acción comunal de la vereda Campoalegre tiene como alcance la construcción de cientos dos (102) metros lineales de placa huella y una (1) alcantarilla.


CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	102 ML DE PLACA HUELLA Y LA CONTRUCCIÓN DE 1 ALCANTARILLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	**PLACA HUELLA**
	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópea resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi
	ALCANTARILLA
	- Excavaciones varias sin clasificar - Excavaciones en roca en seco - Demolición de estructuras - Concreto reforzado de resistencia 14 MPA (F) – mezcla in situ - Concreto reforzado de resistencia de 21 MPA (D) – mezcla in situ - Acero de refuerzo Fy 4200 MPA - Relleno para estructuras con suelo - Tubería de concreto reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior


ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

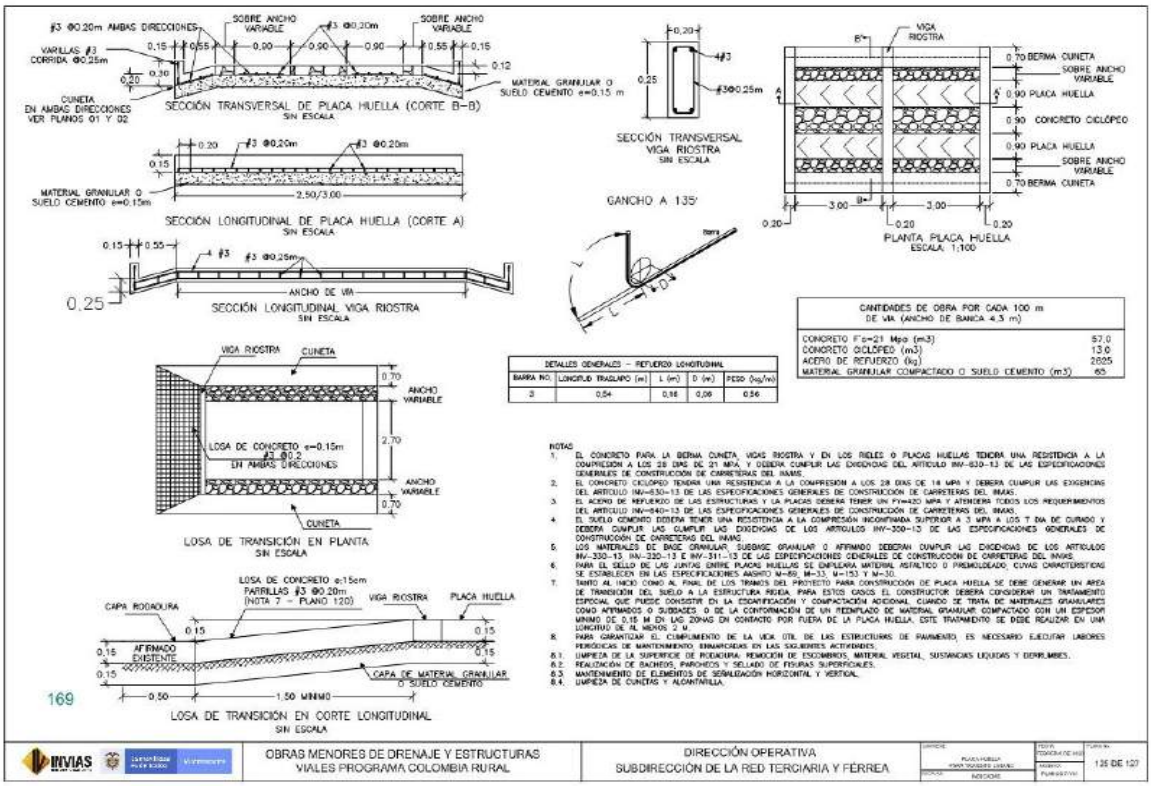

ESQUEMA O PLANO DE ALCANTARILLA

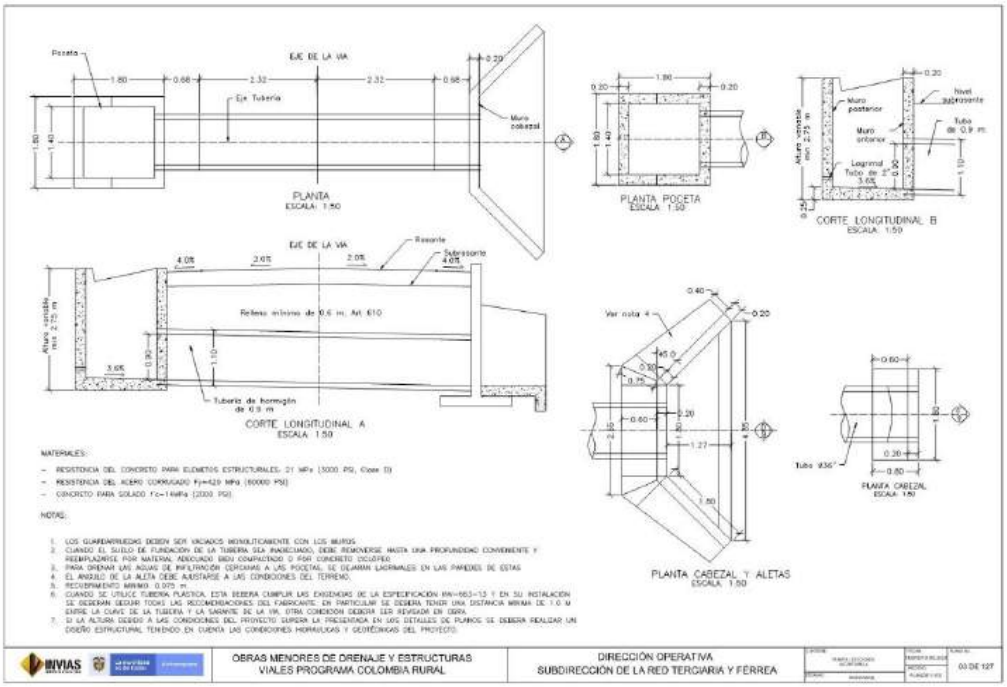

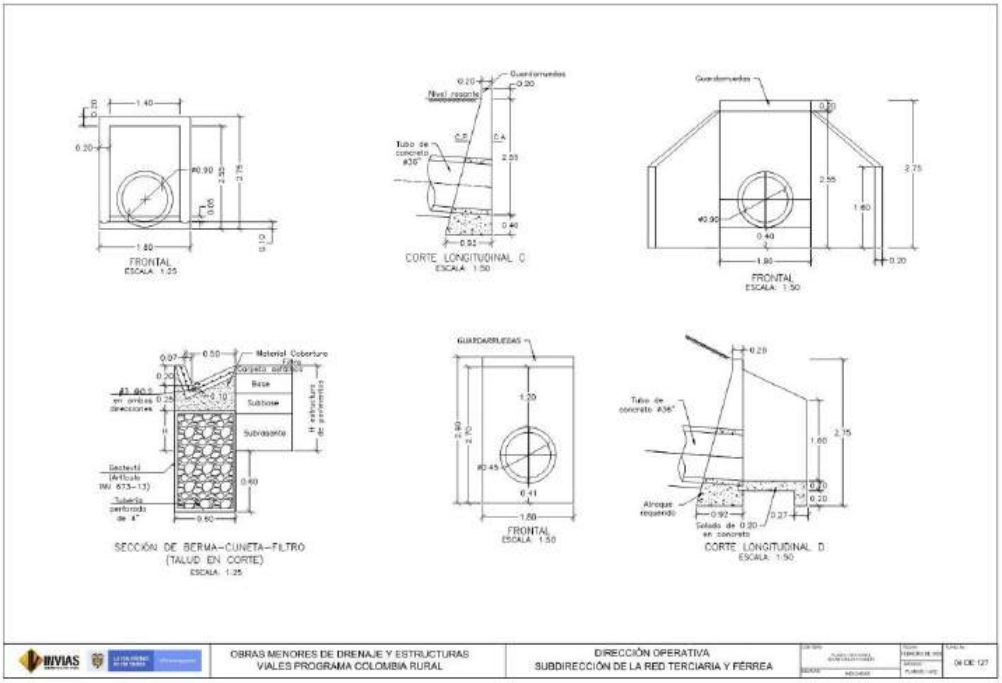

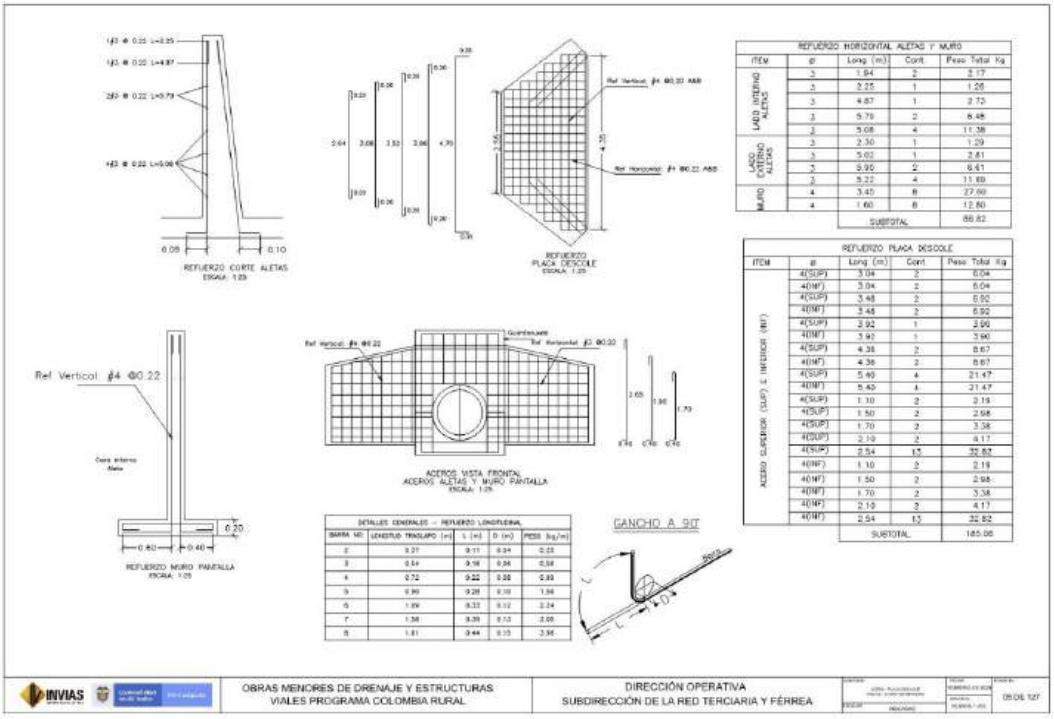

REFUERZO HORIZONTAL ALETAS Y MURO


ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
LADO INTERNO ALETAS	3	1.84	2	2.17
	3	2.25	1	1.26
	3	4.87	1	2.73
	3	5.79	2	6.48
	3	5.08	4	11.38
LADO EXTERNO ALETAS	3	2.30	1	1.29
	3	5.02	1	2.81
	3	5.90	2	6.61
	3	5.22	4	11.69
MURO	4	3.45	8	27.60
	4	1.60	8	12.80
		SUBTOTAL		86.82

REFUERZO PLACA DESCOLE

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
ACERO SUPERIOR (SUP) E INFERIOR (INF)	4(SUP)	3.04	2	6.04
	4(INF)	3.04	2	6.04
	4(SUP)	3.48	2	6.92
	4(INF)	3.48	2	6.92
	4(SUP)	2.92	1	2.90
	4(INF)	2.92	1	2.90
	4(SUP)	4.36	2	8.67
	4(INF)	4.36	2	8.67
	4(SUP)	5.40	4	21.47
	4(INF)	5.40	4	21.47
	4(SUP)	1.10	2	2.19
	4(SUP)	1.50	2	2.98
	4(SUP)	1.70	2	3.38
	4(SUP)	2.10	2	4.17
	4(SUP)	2.54	13	32.82
	4(INF)	1.10	2	2.19
	4(INF)	1.50	2	2.98
	4(INF)	1.70	2	3.38
	4(INF)	2.10	2	4.17
	4(INF)	2.54	13	32.82
		SUBTOTAL		185.06

DETALLES GENERALES – REFUERZO LONGITUDINAL

BARRA NO.	LONGITUD TRASLAPO (m)	L (m)	D (m)	PESO kg/m
2	0.27	0.11	0.04	0.05
3	0.54	0.18	0.06	0.08
4	0.72	0.22	0.08	0.09
5	0.90	0.26	0.10	1.56
6	1.09	0.33	0.12	2.24
7	1.36	0.39	0.13	2.65
8	1.81	0.44	0.15	2.96

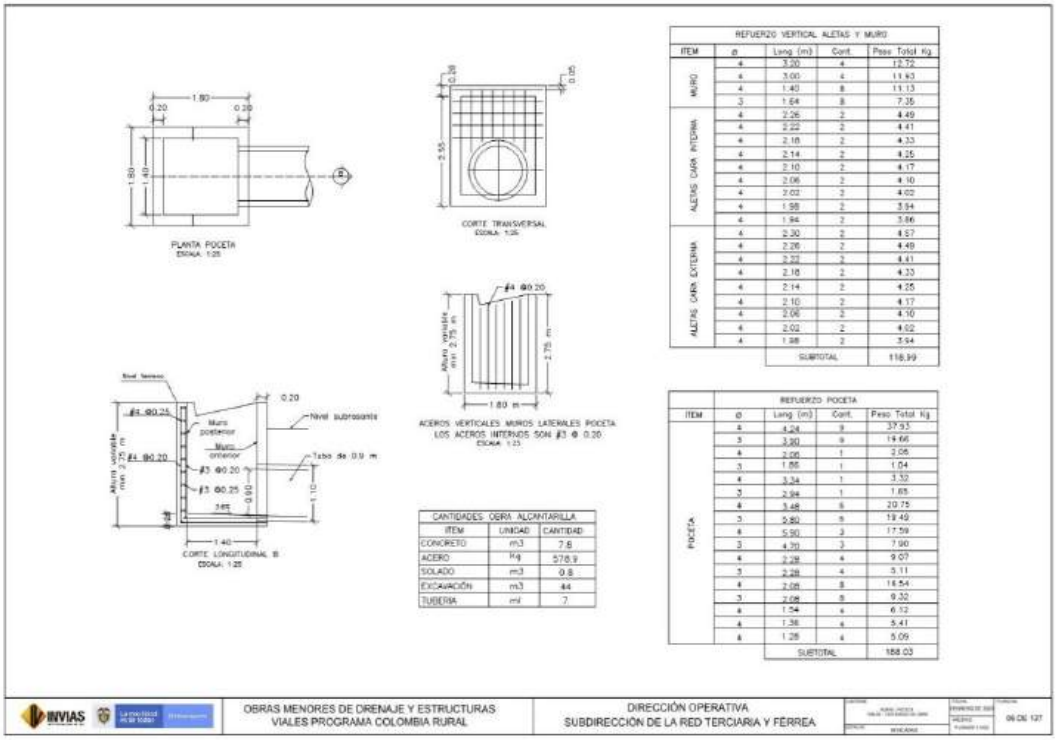

REFUERZO VERTICAL ALETAS Y MURO

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
MURO	4	3.20	4	12.72
	4	3.00	4	11.93
	4	1.40	8	11.13
	3	1.64	8	7.35
ALETAS CARA INTERNA	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
ALETAS CARA EXTERNA	4	1.94	2	3.86
	4	2.30	2	4.57
	4	2.26	2	4.49
	4	2.22	2	4.41
	4	2.18	2	4.33
	4	2.14	2	4.25
	4	2.10	2	4.17
	4	2.06	2	4.10
	4	2.02	2	4.02
	4	1.98	2	3.94
		SUBTOTAL		118.99

REFUERZO POCETA

ITEM	ø	Long. (m)	Cant.	Peso Total Kg
POCETA	4	4.24	9	37.93
	3	3.30	9	19.66
	4	2.06	1	2.06
	3	1.86	1	1.04
	4	3.34	1	3.32
	3	2.94	1	1.65
	4	3.48	5	20.75
	3	5.80	5	19.49
	4	5.90	3	17.59
	3	4.70	3	7.90
	4	2.28	4	9.07
	3	2.28	4	5.11
	4	2.06	8	16.54
	3	2.06	8	9.30
	4	1.54	4	6.12
	4	1.36	4	5.41
	4	1.28	4	5.09
		SUBTOTAL		188.03

CANTIDADES OBRA ALCANTARILLA

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
CONCRETO	m3	7.6
ACERO	Kg	578.9
SOLADO	m3	0.8
EXCAVACIÓN	m3	44
TUBERÍA	ml	7

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 4318 – 2023 se suscribió el día 17 de noviembre de 2023 entre la señora *RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor BENITO OME MUÑOZ en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (**$197.378.598,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (**$196.378.598,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4318-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES
NIT:	900.553.557-8
REPRESENTANTE LEGAL:	BENITO OME MUÑOZ
IDENTIFICACIÓN:	17.683.153 DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALOR DEL CONTRATO:	$ 197.378.598,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 196.378.598,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACION No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 16 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 01 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	**PLAZO SOLICITADO HASTA:**	EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE OCTUBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4318-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA*

DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de 102 ml de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETÁ	BELÉN DE LOS ANDAQUIES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES	102,00	CAQUETÁ	19/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	$ -
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 209.706,00	$ 209.706,00
							SUB-TOTAL	$ **209.706,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	163,000	$ 29.262,00	$ 4.769.706,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	125,740	$ 244.056,00	$ 30.687.601,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	61,420	$ 1.136.318,00	$ 69.792.652,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,920	$ 616.013,00	$ 15.967.057,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.087,150	$ 8.530,00	$ 26.333.390,00
							SUB-TOTAL	$ **147.550.406,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ **147.760.112,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ **4.432.803,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ **44.185.683,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ **196.378.598,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4045 – 2023 se suscribió el día 24 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS* en calidad de presidente y representante legal de la **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DELOS ANDAQUIES**, por un valor del convenio de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (**$186.171.800,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (**$185.171.800,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4045-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
NIT:	900.128.460-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
IDENTIFICACIÓN:	17.684.267 DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

VALOR DEL CONTRATO:	$ 186.171.800,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 185.171.800,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	24 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACION No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	**PLAZO SOLICITADO HASTA:**	EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE OCTUBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4045-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA*

DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de 5 alcantarillas, dos de ellas aleta por aleta y las otras tres caja-aleta. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado.

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	ALCANTARILLAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	BELEN DE LOS ANDAQUIES	ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS CABECERA MUNICIPAL	5,00	CAQUETÁ	19/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00	$ 65.271,00	$ 783.252,00
							SUB-TOTAL	$ 783.252,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 178.577,00	$ 178.577,00
							SUB-TOTAL	$ 178.577,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	270,30	$ 26.911,00	$ 7.274.043,00
4	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	67,60	$ 56.658,00	$ 3.830.081,00
5	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	0,00	$ 150.500,00	$ -
6	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	19,10	$ 711.276,00	$ 13.585.372,00
7	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	50,90	$ 1.080.948,00	$ 55.020.253,00
8	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	3643,00	$ 7.350,00	$ 26.776.050,00
9	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	76,30	$ 151.961,00	$ 11.594.624,00
10	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	30,00	$ 663.239,00	$ 19.897.170,00
							SUB-TOTAL	$ 137.977.593,00
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 138.939.422,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.168.183,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.064.195,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	$ 185.171.800,00

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

El presente convenio solidario No. 4346 – 2023 se suscribió el día 14 de noviembre de 2023 entre la señora *RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *JESUS OME RENTERIA* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (**$200.753.948,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (**$199.753.948,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	4346-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE
NIT:	900.622.519-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS OME RENTERIA

IDENTIFICACIÓN:	17.631.475 DE FLORENCIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.753.948,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 199.753.948,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	18 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 22 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 24 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	**PLAZO SOLICITADO HASTA:**	EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE OCTUBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 4346-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a*

ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 19 de junio de 2024 un alcance físico de ciento dos (102) ml de placa huella y una (1) alcantarilla. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m) Y ALCANTARILLAS (und)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MORELIA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE	102 ML Y 1 ALCANTARILLA	CAQUETÁ	19/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2013	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	6,00	$ 66.271,00	$ 397.626,00
							SUB-TOTAL	$ 397.626,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 176.561,00	$ 176.561,00
							SUB-TOTAL	$ 176.561,00
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,43	$ 28.211,00	$ 96.764,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	100,96	$ 144.365,00	$ 14.577.978,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	62,08	$ 1.040.558,00	$ 64.597.841,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	26,44	$ 547.005,00	$ 14.462.812,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.807,19	$ 8.610,00	$ 24.169.906,00
							SUB-TOTAL	$ 117.905.301,00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	56,20	$ 28.211,00	$ 1.585.458,00
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3	0,30	$ 58.057,00	$ 17.417,00
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3	3,58	$ 151.900,00	$ 543.802,00
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	16,00	$ 547.005,00	$ 8.752.080,00
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	11,10	$ 1.040.558,00	$ 11.550.194,00
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	731,00	$ 8.610,00	$ 6.293.910,00
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	22,20	$ 21.976,00	$ 487.867,00
15	661.3	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00	$ 559.565,70	$ 3.357.394,00
							SUB-TOTAL	$ 32.588.122,00
CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT								
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.067.610,00
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.532.028,00
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.753.948,00**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRES CONVENIOS SOLIDARIOS

En el presente informe final de interventoría, se describen las actividades realizadas por cada una de las juntas de acción comunal, desde el 19 de junio de 2024, fecha en la cual se firmó el nuevo alcance de la meta física hasta el 31 de octubre de 2024, tiempo donde finaliza la construcción y el plazo final de prorrogas de las obras de los tres convenios solidarios, correspondientes a las veredas LOS ALETONES Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS suscrita al municipio de BELEN DE LOS ANDAQUIES y para la vereda CAMPO ALEGRE en el municipio de MORELIA del departamento del CAQUETÁ descrita a continuación:

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023 (LOS ALETONES)

Para el periodo del 19 de junio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, se firmó el nuevo alcance de obra, se socializó con la comunidad la nueva meta física del proyecto, se realizó la exploración geotécnica (CBR), la localización y replanteo con equipo RTK del tramo de la placa huella y la finalización de la obra de 102 ml de placa huella.

Estas actividades consisten en la elaboración de concretos ciclópeo (concreto de 2.000 psi 60% y piedra 40%) y concretos de 3.000 psi para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, como también el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para el tramo de los 102 Ml según acta de comité de obra, pero en ejecución se realizaron 112 ml contando la rampa de acceso por parte de la junta de acción comunal de la vereda LOS ALETONES. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas este periodo:

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Actividad que comprende las excavaciones varias sin clasificar para las zonas de vigas riostras y nivelación del terreno para ello se contó con maquinaria tipo pajarita para la intervención área total del tramo de placa huella (112), antes de realizar estas excavaciones a máquina se chequearon niveles de profundidad de excavación o cota deseada del tramo de placa huella a intervenirse. Para esta labor se contó con un maestro, un oficial y ayudantes de obra para orientar estas máquinas desde los puntos de intervención.

	
Imagen No. 1: Excavaciones a máquina con retro excavadora tipo pajarita para para la perfilación y corte de banca del tramo de placa huella.	**Imagen No. 2:** Corte de la banca para la ampliación de la vía con equipo retro excavadora tipo pajarita.

	
Imagen No. 3: Excavación manual para las vigas riostras del tramo de placa huella desde la abscisa K0+000 hasta la K0+112.	**Imagen No. 4:** Perfilación manual para el cajeo de cuneta de la MI y MD del tramo de placa huella.

- **Subbase granular clase C**

Esta actividad consiste en el suministro, el transporte, la colocación, el humedecimiento o aireación, la extensión y la conformación, la compactación y el terminado de material sub-base granular instalado sobre una superficie preparada, en una o varias capas hasta lograrse un espesor de e=18cm, teniendo en cuenta los niveles terminados de la placa huella el cual está dentro de los lineamientos, las pendientes y las dimensiones indicados en los planos estructurales de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó en campo con maquinarias amarilla y equipos para llevarse a cabo esta actividad junto con ayudantes, el oficial y el maestro de obra para labores varias durante la operación de estas maquinarias o equipos.

	
Imagen No. 5: instalación de subbase para el tramo de placa huella con maquina amarilla desde la abscisa K0+000 hasta la K0+112.	**Imagen No. 6:** Compactación de la subbase granular del tramo de placa huella.

- **Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción de vigas riostras, huellas y cunetas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se

contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 7: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las huellas y vigas riostras de la MD desde la abscisa K0+000 hasta la K0+045.	**Imagen No. 8:** Concreto de 3.000 PSI para las huellas y vigas riostras desde la abscisa K0+045 hasta la K0+112.

	
Imagen No. 9: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las rampas de acceso (inicial y final) de la placa huella.	**Imagen No. 10:** Concreto de 3.000 PSI para la cuneta desde la abscisa K0+045 hasta la K0+112.

	
Imagen No. 11: Concreto de 3.000 PSI para las huellas de la MI y MD, vigas riostras, cunetas, bordillos MI y MD y rampas de acceso (inicial y final) de la placa huella de los 112 ml.	**Imagen No. 12:** Concreto de 3.000 PSI para la placa huella ejecutada en un 100% desde las rampas de acceso hasta los 112 ml.

- **Concreto Ciclópeo de Resistencia 14 MPA (G):**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa) – (60%) y por otra parte piedra (40%), utilizados para la construcción de tres franjas de concreto ciclópeo, dos de 45cm y una de 90cm para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro de obra, oficial y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 13: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa para el ciclópeo central de la placa huella.	**Imagen No. 14:** Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa para el ciclópeo central desde la abscisa K0+000 hasta K0+045.

	
Imagen No. 15: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 MPA para el ciclópeo central desde la abscisa K0+045 hasta K0+112.	**Imagen No. 16:** Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 MPA para el ciclópeo de la MD de 45cm desde la abscisa K0+000 hasta K0+112.

	
Imagen No. 17: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 MPA para el ciclópeo de la MI de 45cm desde la abscisa K0+000 hasta K0+085.	**Imagen No. 18:** Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 MPA para el ciclópeo de la MI de 45cm desde la abscisa K0+085 hasta K0+112.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto como para la placa de acceso y salida, vigas riostras, huellas y cunetas con su respectivo en concordancia con los planos estructurales para placa huellas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con un oficial y 2 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 19: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la huella y viga riostra de la MD, entre la abscisa k0+000 hasta la k0+048.	**Imagen No. 20:** Acero de refuerzo de 60.000 psi para la huella y viga riostra de la MD, entre la abscisa k0+048 hasta la k0+0112.

	
Imagen No. 21: Acero de refuerzo de 60.000 psi para las rampas de acceso (inicio y final).	**Imagen No. 22:** Instalación de acero de refuerzo para las cunetas de la MI y MD del tramo de placa huella de los 112ml.

Por último, cabe resaltar que se realizaron 112 ml de 102 ml de placa huella presupuestados inicialmente, incluidos su placa de acceso y de salida la cual sus dimensiones son de 1,50 x 5 metros de ancho, con acero de refuerzo#3 y fundidas en concreto de 3000 psi.

❖ CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023 (ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES)

Para el periodo del 19 de junio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, se firmó el nuevo alcance de obra, se socializó con la comunidad la nueva meta física del proyecto, se realizó, la localización y replanteo de las cinco alcantarillas a construir y actividades de mantenimientos de estructuras ya existentes sobre el corredor vial que conecta el municipio de Belén de los Andaquies y El Centro Poblado Los Aletones.

Estas actividades consisten en la elaboración de concretos de 14 MPA para el solado de limpieza de la caja poceta, zapata del muro cabezal, solera del descole y el solado de nivelación para el cuerpo de tubería y el atraque de la misma; y para concretos de 3.000 psi es utilizado para la losa y muros de la caja poceta, solera del descole, muro cabezal y aletas del descole de la alcantarilla, como también el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para la construcción de las cinco alcantarillas según acta de comité de obra, ejecutada por parte de la junta de acción comunal de la vereda ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas este periodo:

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Actividad que comprende las excavaciones varias sin clasificar para las zonas de la construcción de las cinco alcantarillas para ello se contó con maquinaria tipo pajarita para la intervención del área total de las cinco alcantarillas, antes de realizar estas excavaciones a máquina se chequearon niveles de profundidad de excavación o cota deseada. Para esta labor se contó con un maestro, un oficial y ayudantes de obra para orientar estas máquinas desde los puntos de intervención.

	
Imagen No. 23: Excavaciones varias sin clasificar en la alcantarilla zona del cuerpo de tubería.	**Imagen No. 24:** Excavaciones varias sin clasificar en la alcantarilla zona del cuerpo de tubería.

	
Imagen No. 25: Excavaciones varias sin clasificar en la alcantarilla en la zona de caja poceta.	**Imagen No. 26:** Excavaciones varias sin clasificar en la alcantarilla en la zona de caja poceta.

	
Imagen No. 27: Excavaciones varias sin clasificar en la alcantarilla en la zona de descole.	**Imagen No. 28:** Excavaciones varias sin clasificar en la alcantarilla en la zona de descole.

- **Demolición de estructura de concreto**

Comprende a la demolición de las alcantarillas existes para ello se contó con maquina tipo pajarita para la intervención del área de la alcantarilla. Para esta labor se contó con un maestro de obra, un oficial de obra y tres ayudantes para orientar esta actividad.

	
Imagen No. 29 Demolición de las alcantarillas existentes	**Imagen No. 30** Demolición de alcantarilla existente

- **Concreto reforzado de resistencia de 14 MPA (F)**

Comprende al suministro de materiales pétreos y de ferreterías, preparación, transporte, vaciado y vibrado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 PSI (14 MPA), utilizados para la losa de nivelación del cuerpo de tubería, solado de limpieza para la zapata del muro del cabezal, solera y caja poceta. De mismo modo, es utilizado en este caso el atraque de la tubería de concreto reforzado de 36" de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se contó además con un maestro de obra, oficial y ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 31: Solado de limpieza para nivelación del cuerpo de tubería de 36" de la alcantarilla.	**Imagen No. 32**: Solado de limpieza para nivelación del cuerpo de tubería de 36" de la alcantarilla.

	
Imagen No. 33: Concreto de 14 MPA para solado de limpieza del descole de alcantarilla.	**Imagen No. 34:** Concreto de 14 MPA para solado de limpieza del descole de alcantarilla.

	
Imagen No. 35: Concreto de 14 MPA para solado de limpieza de la caja alcantarilla.	**Imagen No. 36:** Concreto de 14 MPA para atraque para la tubería de concreto reforzado de 36" de la alcantarilla.

- **Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción de las cinco alcantarillas (muro cabezal, aletas, solera, dentellón, zapata del muro cabezal, caja poceta y losa superior del cuerpo de tubería para garantía de la misma) de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y

ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 35: Concreto de 3.000 PSI para la losa de la solera del descole de la alcantarilla.	**Imagen No. 36:** preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las aletas y muro cabezal del descole de la alcantarilla.

	
Imagen No. 37: Concreto de 3.000 PSI para la los muro de la caja poceta.	**Imagen No. 38:** concreto de 3.000 PSI para las aletas y muro cabezal del descole de la alcantarilla.

	
Imagen No. 39: Concreto de 3.000 PSI para la caja poceta.	**Imagen No. 40:** Concreto de 3.000 PSI para las aletas y muro cabezal del descole de la alcantarilla.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto para la construcción de cinco alcantarillas (muro cabezal, solera, aletas, dentellón y caja poceta) en concordancia con los planos estructurales para alcantarillas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con un oficial y 2 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 41: Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las aletas, muro cabezal y solera del descole de alcantarilla.	**Imagen No. 42:** Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las aletas, muro cabezal y solera del descole de alcantarilla.

	
Imagen No. 43: Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las aletas, muro cabezal y solera del descole de alcantarilla.	**Imagen No. 44:** Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las aletas, muro cabezal y solera del descole de alcantarilla.

	
Imagen No. 45: Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para la caja poceta de la alcantarilla.	**Imagen No. 46:** Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para la caja poceta de la alcantarilla.

- **Relleno para estructuras con suelo**

Actividad que comprende al relleno de cinco alcantarillas procedente de excavación en las zonas de aletas, cuerpo de tubería de 36" y para la caja poceta; este tipo de relleno es realizado a máquina tipo pajarita. Para esta actividad se contó con mano de obra no calificada como es el maestro de obra, un oficial de obra y ayudantes.

	
Imagen No. 47: Relleno de material procedente de excavación para la la alcantarilla cuya diseño es alateas por aletas.	**Imagen No. 48:** Relleno de material procedente de excavación para la caja poceta y cuerpo de tubería de concreto reforzado de 36".

- **Instalación tubería de concreto reforzado de 36”**

Comprende el suministro, transporte de tuberías de concreto reforzado de 36” e instalación para las cinco alcantarillas con maquinaria retro excavadora tipo pajarita según la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES” por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra su respectiva instalación donde se contó con un maestro de obra, un oficial y ayudantes prácticos para realizar las labores de instalación de la misma chequeando los niveles correspondientes.

	
Imagen No. 49: Instalación de tubería de concreto reforzado de 36” para las cinco alcantarillas.	**Imagen No. 50:** Instalación de tubería de concreto reforzado de 36” para las cinco alcantarillas.

Nota: Es importante mencionar que las actividades de obra fueron culminadas el día 18 de septiembre en su totalidad. La última semana se llevó una retroexcavadora de llantas para realizar actividades de conformación, explanación y perfilación mecánica de la banca vial. Además, se realizó el encole y desencole de cada una de las alcantarillas para garantizar su correcto funcionamiento. Por último, se realizó la instalación de cercas con postes plásticos en los predios que se utilizaron durante la construcción de las cinco alcantarillas. Durante este proceso, se llevó a cabo una supervisión constante para asegurar que cada etapa se ejecutara con precisión y dentro de los estándares de calidad establecidos. También se realizaron pruebas de drenaje para verificar que las alcantarillas operaran eficientemente, minimizando así el riesgo de inundaciones en la zona.

	
Imagen No. 51: Conformación, explanación y perfilación mecánica de la banca vial.	**Imagen No. 52:** Instalación de cercas con postes plásticos en predios.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023 (CAMPOALEGRE)

Para el periodo del 19 de junio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, se firmó el nuevo alcance de obra, se socializó con la comunidad la nueva meta física del proyecto, se realizó la exploración geotécnica (CBR), la localización y replanteo con equipo RTK del tramo de la placa huella y la finalización de la obra de 102 ml de placa huella y la construcción de una alcantarilla con tubería de concreto reforzado de 36".

Estas actividades consisten en la elaboración de concretos ciclópeo (concreto de 2.000 psi 60% y piedra 40%) y concretos de 3.000 psi para huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos, como también el suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para el tramo de los 102 mL y de mismo modo para la construcción de una alcantarilla según acta de comité de obra, pero en ejecución se realizaron 115 ml contando la rampa de acceso por parte de la junta de acción comunal de la vereda CAMPOALEGRE. A continuación, se describe con mayor brevedad cada una de las actividades ejecutadas este periodo:

- ✓ **PLACA HUELLA:**

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Actividad que comprende las excavaciones varias sin clasificar para las zonas de vigas riostras y nivelación del terreno para ello se contó con maquinaria tipo pajarita para la intervención área total del tramo de placa huella (115 mL), antes de realizar estas excavaciones a máquina se chequearon niveles de profundidad de excavación o cota deseada del tramo de placa huella a intervenirse. Para esta labor se contó con un maestro, un oficial y ayudantes de obra para orientar estas máquinas desde los puntos de intervención.

	
Imagen No. 53: Excavaciones a máquina con retro excavadora tipo pajarita para para la perfilación y corte de banca del tramo de placa huella..	**Imagen No. 54:** Excavaciones a máquina con retro excavadora tipo pajarita para para la perfilación y corte de banca del tramo de placa huella.

	
Imagen No. 55: Excavación para las vigas riostras de todo el tramo de placa huella de los 115 ml.	**Imagen No. 56:** Excavación para las vigas riostras de todo el tramo de placa huella de los 115 ml.

- **Subbase granular clase C**

Esta actividad consiste en el suministro, el transporte, la colocación, el humedecimiento o aireación, la extensión y la conformación, la compactación y el terminado de material sub-base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas hasta lograrse un espesor de e=18 cm, de conformidad con los lineamientos, las pendientes y las dimensiones indicados en los planos estructurales de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES". Se contó en campo con maquinarias y equipos para llevarse a cabo esta actividad junto con ayudantes para labores varias durante la operación de estas maquinarias o equipos.

	
Imagen No. 57: Suministro, extendido, humedecimiento y compactación de sub-base granular 115 ml.	**Imagen No. 58:** Suministro, extendido, humedecimiento y compactación de sub-base granular 115 ml.

- **Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción de vigas riostras, huellas y cunetas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 59: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las vigas riostras y huellas de la MI y MD desde la abscisa K0+000 hasta la K0+090.	**Imagen No. 60:** Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las vigas riostras y huellas de la MI y MD desde la abscisa K0+090 hasta la K0+0115.

	
Imagen No. 61: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las rampas de acceso (entrada y salida).	**Imagen No. 62:** Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para las cunetas de la MI y MD desde la abscisa K0+000 hasta la K0+0115.

	
Imagen No. 63: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para los bordillos de la MI y MD desde la abscisa K0+000 hasta la K0+0115.	**Imagen No. 64:** Concretos de 3.000 PSI y 2.000 PSI de la obra de la placa huella se encuentra en un 100% terminada.

- **Concreto ciclópeo de resistencia de 14 MPA (G)**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa) – (60%) y por otra parte piedra (40%), utilizados para la construcción de tres franjas de concreto ciclópeo, dos de 45cm y una de 90cm para placa

huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro de obra, oficial y ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 65: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa para el ciclópeo central (90 cm), lateral derecho (45cm) y lateral izquierdo (45cm) desde la abscisa k0+000 hasta la k0+0115.	**Imagen No. 66:** Preparación, transporte y vaciado de concreto de 14 Mpa para el ciclópeo central (90 cm), lateral derecho (45cm) y lateral izquierdo (45cm) desde la abscisa k0+000 hasta la k0+0115..

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto como para la placa de acceso y salida, vigas riostras, huellas y cunetas con su respectivo en concordancia con los planos estructurales para placa huellas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con un oficial y ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 67: Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las huellas de la MI y MD entre las abscisas K0+000 hasta la K0+115.	**Imagen No. 68:** Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para las vigas riostras y huellas de la MI y MD entre las abscisas K0+000 hasta la K0+115.

	
Imagen No. 69: Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para la cuneta de la MI entre las abscisas K0+000 hasta la K0+115.	**Imagen No. 70:** Instalación de acero de refuerzo de 60.000 PSI para la cuneta de la MD entre las abscisas K0+000 hasta la K0+115.

- ***CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA***

- **Excavaciones varias sin clasificar**

Actividad que comprende las excavaciones varias sin clasificar para las zonas de la construcción de una alcantarilla para ello se contó con maquinaria tipo pajarita para la intervención área total de la alcantarilla, antes de realizar estas excavaciones a máquina se chequearon niveles de profundidad de excavación o cota deseada. Para esta labor se contó con un maestro, un oficial y ayudantes de obra para orientar estas máquinas desde los puntos de intervención.

	
Imagen No. 71 Excavaciones varias sin clasificar para el cuerpo de la alcantarilla	**Imagen No. 72** Excavación a máquina del cuerpo de alcantarilla

	
Imagen No. 73 Excavaciones varias sin clasificar para zona de caja poceta de la alcantarilla.	**Imagen No. 74** Excavaciones varias sin clasificar para zona de descole de la alcantarilla.

- **Concreto reforzado de resistencia de 14 MPA (F)**

Comprende al suministro de materiales pétreos y de ferreterías, preparación, transporte, vaciado y vibrado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 PSI (14 MPA), utilizados para la losa de nivelación del cuerpo de tubería, solado de limpieza para la zapata del muro del cabezal, solera y caja poceta. De mismo modo, es utilizado en este caso para el atraque de la tubería de concreto reforzado de 36" de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con un maestro de obra, oficial y ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 75: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 2.000 PSI para el solado de nivelación de la tubería de concreto reforzado de 36".	**Imagen No. 76**: Concreto de 2.000 MPA para el solado de limpieza de la solera del descole de la alcantarilla.

	
Imagen No. 77: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 2.000 PSI para el solado de la caja poceta.	**Imagen No. 78**: Concreto de 2.000 MPA para el atraque de la alcantarilla.

- **Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción de una alcantarilla (muro cabezal, aletas, solera, dentellón, zapata del muro cabezal, caja poceta y losa superior del cuerpo de tubería para garantía de la misma) de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, baldes, etc. Se contó además con un maestro de obra, un oficial de obra y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 79: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para la caja poceta de la alcantarilla.	**Imagen No. 80**: Preparación, transporte y vaciado de concreto de 3.000 PSI para la las aletas, muro cabezal y solera del descole de la alcantarilla.

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto para la construcción de una alcantarilla (muro cabezal, solera, aletas, dentellón y caja poceta) en concordancia con los planos estructurales para alcantarillas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó con equipos manuales y herramientas menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con un oficial y 2 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

	
Imagen No. 81: Acero de refuerzo de 60.000 psi para la losa de la caja poceta.	**Imagen No. 82**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para los muros de la caja poceta.

	
Imagen No. 83: Acero de refuerzo de 60.000 psi para las aletas, muro cabezal, dentellón y solera para el descole de la alcantarilla.	**Imagen No. 84**: Acero de refuerzo de 60.000 psi para las aletas y muro cabezal para el descole de la alcantarilla.

- **Relleno para estructuras con suelo**

Actividad que comprende al relleno procedente de excavación en las zonas de aletas, cuerpo de tubería de 36" y para la caja poceta; este tipo de relleno es realizado a máquina tipo pajarita. Para esta actividad se contó con mano de obra no calificada como es el maestro de obra, un oficial de obra y tres ayudantes.

	
Imagen No. 85 Relleno de material procedente de excavación para el cuerpo de tuberia.	**Imagen No. 86** Relleno de material procedente de excavación para el cuerpo de tubería de 36".

- **Instalación tubería de concreto reforzado de 36"**

Comprende el suministro, transporte de tuberías de concreto reforzado de 36" e instalación con maquinaria retro excavadora tipo pajarita según la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra su respectiva instalación donde se contó con un maestro de obra, un oficial y ayudantes prácticos para realizar las labores de instalación de la misma chequeando los niveles correspondientes.

	
Imagen No. 87: Transporte de tubería de concreto reforzado de 36" al sitio de instalación.	**Imagen No. 88**: Instalación de tubería de concreto reforzado de 36" para la alcantarilla.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han presentado ítems no previstos en ninguno de los convenios establecidos ya que en uno de ellos no se ha ejecutado obra y en los otros dos convenios no se han encontrado hasta el momento.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4879 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 4318–4045–4346 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.

2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.
3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.
7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.
8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este informe final desde el 19 de junio de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a la vereda de Los Aletones, La Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies y en la vereda Campoalegre en el municipio de Morelia, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.

- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.

- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas previo inicio por parte de las JAC.

- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS".

- Chequeo visual de los materiales pétreos utilizados en cada uno de los convenios vinculados con Asojuntas Belén, Vereda los Aletones y Vereda Campoalegre.

- Acompañamiento por parte del equipo de interventoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social frente a cada una de las comunidades donde se ejecutan los proyectos de placa huella y alcantarillas.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe final se presenta por parte de esta firma interventora los últimos cinco (5) informes semanales donde se evidencian la terminación de las obras para cada uno de los proyectos en las veredas de los convenios solidarios (JAC de la vereda Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies y JAC de la vereda Campoalegre), corresponden al informe final de interventoria, de los cuales se describen a continuación:

- Convenio Solidario No. 4318-2023 (**Los Aletones**)

- Informe semanal No. 27: del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 28: del 07 de octubre al 13 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 29: del 14 de octubre al 20 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 30: del 21 de octubre al 27 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 31: del 28 de octubre al 31 de octubre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.1**).

- Convenio Solidario No. 4045-2023 **(Asojuntas Belén de los Andaquies)**

- Informe semanal No. 27: del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 28: del 07 de octubre al 13 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 29: del 14 de octubre al 20 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 30: del 21 de octubre al 27 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 31: del 28 de octubre al 31 de octubre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.2**).

- Convenio Solidario No. 4346-2023 (**Campoalegre**)

- Informe semanal No. 27: del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 28: del 07 de octubre al 13 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 29: del 14 de octubre al 20 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 30: del 21 de octubre al 27 de octubre de 2024

- Informe semanal No. 31: del 28 de octubre al 31 de octubre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (**Ver Anexo 8.4.3)**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de octubre de 2024, esta firma de interventoría presentará el ultimo registros de maquinaria y equipos utilizados por lo que ya se reportó en los informes anteriores de cada mes (informe 3, 4, 5, 6 y 7) de cada una de las juntas de acción comunal en la obra. Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.5.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.5.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS

Para este informe final del 15 de noviembre del 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal durante la ejecución de la obra, control de aportes legales y seguridad social de cada una de las juntas de acción comunal. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.6.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.6.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver**

Anexo 8.6.3).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora el informe final de los informes financieros y presupuestales de los meses anteriores de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.7.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.7.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este informe final se adjunta el último reporte del mes de octubre ya que para este periodo se culminó la obra y de ahí de se registró el tiempo climático diario de cada una de las veredas donde se ejecutan las obras de placa huellas, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.8.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.8.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para este informe final se adjunta el reporte correspondiente al mes de octubre – 2024 se han realizado ensayos de compresión de cilindros pertenecientes a los tres convenios (Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquíes y Campoalegre), estos han sido tomados durante el proceso constructivo de los diferentes elementos estructurales de las

alcantarillas y placa huella. Actualmente estás muestras se encuentran en laboratorio y está a espera de los resultados.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.9.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4318, correspondiente a la JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.10.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4045, correspondiente a Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.10.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 4346, correspondiente a la JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la "LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA", No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Para este informe final se anexa el reporte del mes de octubre – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4318, JAC de la Vereda Los Aletones - (**Ver Anexo 8.12.1**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4045, Asojuntas Belén de los Andaquies - (**Ver Anexo 8.12.2**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 4346, JAC de la Vereda Campoalegre - (**Ver Anexo 8.12.3**).

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 24 de junio de 2024 para todas las juntas (Los Aletones, Asojuntas Belén de los Andaquies, Campoalegre). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente periodo, donde se deja constancia el atraso o avance físico de cada una de las juntas para el presente periodo.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Los Aletones.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,053%	0,000%	-0,053%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	35,597%	8,036%	-27,561%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	35,750%	38,523%	2,773%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	28,600%	53,441%	24,841%
TOTAL	**100,000%**	**100,000%**	**0,000%**

Tabla 4. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – Los Aletones.*

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,000% correspondiente a $ 196.378.598,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,00% equivalente a $ 196.378.598,00 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Los Aletones, se encuentra en el tiempo estimado de entrega, es decir, acorde a lo programado.

- Programado vs ejecutado acumulado – Asojuntas Belén de los Andaquies.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA **"ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES" CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,260%	0,000%	-0,260%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	40,329%	35,239%	-5,090%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	37,674%	36,595%	-1,079
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	21,737%	28,166%	6,429
TOTAL	**100,000%**	**100,000%**	**0,000%**

Tabla 5. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de Asojuntas Belén de los Andaquies.*

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,000% correspondiente a $ 185.171.800,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,000% equivalente a $ 185.171.800,00 de pesos, lo que indica que Asojuntas Belén de los Andaquies, se encuentra en el tiempo estimado de entrega, es decir, acorde a lo programado.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Campoalegre.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada	Ejecutado Acumulado	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,044%	0,000%	-0,044%

Julio – 2024 Días del 01 al 31	42,992%	7,895%	-35,097%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	30,872%	20,439%	-10,433
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	26,092%	53,242%	27,150%
Octubre 2024 Días del 01 al 31	0,000%	18,424%	0,000%
TOTAL	**100,000%**	**100,000%**	**0,000%**

Tabla 6. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC – Campoalegre.*

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,000% correspondiente a $ 199.753.948,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,000% equivalente a $ 199.753.948,00 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Campoalegre, Campoalegre, se encuentra en el tiempo estimado de entrega respecto a la nueva prórroga del 31 de octubre, es decir, acorde a lo reprogramado.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el presente periodo del mes de septiembre -2024, No se realizaron Actas de Comité de obra en ninguno de los convenios.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

Para el presente periodo del mes de septiembre -2024, No se realizaron Actas de reunión en ninguno de los convenios.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4879 – 2023 se suscribió el día 07 de diciembre de 2023 entre el señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (**$106.174.537,00**) M/CTE, equivalente a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4879-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 106.174.537,00 M/CTE

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	07 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACION SUSPENSIÓN:	31 DE MARZO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 18 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	**FECHA DE FIRMADO:**	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	**PLAZO SOLICITADO HASTA:**	EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA.** VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($106.174.537,00) M/CTE, equivalentes a 91,53 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (1)	PRIMA REGIONAL (2)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (3)	VALOR PARCIAL ($) ((1)+(2))*(3) = (4)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00
	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.000.000,00
	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Vía y/o Pavimentos	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.500.000,00			
	Especialista en diseño Geometrico	$ 5.500.000,00			
	Inspector	$ 1.200.000,00		6,00	$ 7.200.000,00
	Inspector SST	$ 1.200.000,00		0,50	$ 600.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				$ 31.540.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 74.434.400,00

	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (7)	UTILIZACION (8)	VALOR PARCIAL ($) (7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
	Viaticos Director y/o Especialistas	**Dia**	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	**Mes**	$ 550.000,00	12,00	$ 6.600.000,00
	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	**Según comprobante por mes**	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	**Según comprobante por mes**	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
	OTROS COSTOS				
	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	**Según comprobante por mes**	$ 176.200,00	2,00	$ 352.400,00
	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	**Según comprobante por mes**	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	**Según comprobante por mes**	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	**Según comprobante por mes**	$ 38.500,00	3,00	$ 115.500,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 14.787.900,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 89.222.300,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 16.952.237,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 106.174.537,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se culminó en el periodo del mes de octubre – 2024, el seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada uno de los convenios solidarios suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Revisión y aprobación de los materiales pétreos suministrados por los proveedores acordados por cada una de las juntas, donde se detalló los permisos o licencias ambientales y/o explotación minera, como también, que dichos materiales estén acordes a los materiales estipulados en los diseños de mezcla de 3.000 psi.

- Se finaliza por parte de la interventoría las visitas técnicas por el residente de interventoría al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevó en las obras en las veredas Aletones, Asojuntas Belén De Los Andaquies y Campoalegre. Además, por parte del residente y director de esta firma de interventoría se transmitió a los ingenieros residentes de obra las recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de los bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas al momento de fundirse concretos de 3.000 psi (huellas, cunetas con bordillos y vigas riostras) y de ciclópeo (franjas de 45cm y de 90cm) y para el proceso de la construcción de las alcantarillas.

- Se realizó chequeo visual de los materiales de ferretería acopiados en sitio de obra, donde se evidenció la calidad y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos necesarios para la construcción de la placa huella y alcantarillas.

- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella y alcantarillas.
(**Ver Anexo 8.15**).

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.16**).

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría para el presente periodo.
(**Ver Anexo 8.17**).

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4879 – 2023 a la fecha del presente periodo.
(**Ver Anexo 8.18**)

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

Se anexa formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS. (**Ver Anexo 8.19**).

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se verificó por parte de esta firma interventora a las JAC los materiales pétreos adquiridos, y son acordes tal como se establecen en los diseños de concreto de 3.000 psi, siendo estos pétreos de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas del INVIAS.

- Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Aletones presenta para este periodo un programado acumulado del 100,000% correspondiente a $ 196.378.598,00 de pesos M/CTE, contra un ejecutado acumulado del 100,00% equivalente a $ 196.378.598,00 de pesos M/CTE, lo que indica que la JAC de la Vereda Los Aletones, se encuentra en el tiempo estimado de entrega, es decir, acorde a lo programado.

- Que la Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies presenta para este periodo un programado acumulado del 100,000% correspondiente a $ 185.171.800,00 de pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 100,000% correspondiente a 185.171.800,00 de pesos M/CTE, lo que indica que Asojuntas Belén de los Andaquies, se encuentra en el tiempo estimado de entrega, es decir, acorde a lo programado.

- Que la Junta de Acción Comunal de la vereda Campoalegre se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,000% correspondiente a $ 199.753.948,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,000% equivalente a $ 199.753.948,00 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Campoalegre, Campoalegre, se encuentra en el tiempo estimado de entrega respecto a la nueva prórroga del 31 de octubre, es decir, acorde a lo reprogramado.

- Para este presente informe final de interventoría, los tres proyectos de las siguientes juntas de acción comunal cumplieron a cabalidad con el 100% de obras como son las de Asojuntas Belén de los Andaquies donde se construyeron cinco alcantarilla; Para, la vereda Los Aletones se construyó una placa huella con 112 ml donde inicialmente era 102 según met a física inicial y para la vereda el Campoalegre se terminó la construcción de una placa huella de 115 ml y la construcción de una alcantarilla.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.1.3 Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.4. INFORMES SEMANALES

8.4.1. Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.4.2. Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.5.2. Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies– CS#4045
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.8.2. Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318
8.13.2. Seguimiento programa de obra de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

8.14. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.15. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.16. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 8.1.1.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Los Aletones – CS#4318

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 - VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe SST Convenio solidario No 4318 de 2023	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)
02/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
03/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de adición del valor contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
09/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Convenio solidario No. 4318 de 2023 – Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

051-4879

Florencia, 02 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atte.: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Dirección Territorial Caquetá
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Informe SST Convenio solidario No. 4318 de 2023

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST del numeral 12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del Anexo 1 – Anexo Técnico, de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe inicial de seguridad y salud en el trabajo del Convenio solidario No. 4318 de 2023

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

053-4879

Florencia, 02 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de octubre de 2024.

El pasado 17 de septiembre de 2024 el suscrito solicito prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en asocio de los organismos de acción comunal en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total. Mas, sin embargo, el INVIAS realizo la minuta de prorroga #04 de 2024 con plazo hasta el 15/octubre/2024, la cual fue aceptada por el suscrito en el Secop II.

Se hace necesario prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024. La anterior solicitud se justifica así:

- Los convenios solidarios 4045 de 2023, 4318 de 2023 y 4346 de 2023, fueron prorrogados hasta el 31 de octubre de 2024.
- La prórroga del plazo del Contrato de Interventoría de la referencia es necesaria para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.
- Las causas que justifican esta solicitud de prórroga son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

- La finalidad de una prórroga del plazo contractual es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

055-4879

Florencia, 03 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de adición del valor contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de noviembre de 2024.

Ya que el objeto de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra y/o las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente y velando por la correcta ejecución de los trabajos, fue necesario prorrogar el plazo contractual de los convenios solidarios y en consecuencia prorrogar el plazo de la Interventoría en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.

Como se evidencia en el formato "MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS" de fecha 26/junio/2024, los recursos del contrato de interventoría de la referencia han sido distribuidos hasta el 30/septiembre/2024, es decir, se hace necesario la adición de recursos al contrato de interventoría de la referencia, para el correcto cumplimiento de sus funciones y/o obligaciones hasta el 15/noviembre/2024.

Las causas que justifican esta solicitud de adición son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

Por lo anterior le solicito comedidamente adicionar recursos por la suma de $39.815.449.59, (IVA incluido) para ser ejecutados en cumplimento de contrato de interventoría de la referencia, en el periodo 01/octubre/2024 a 15/noviembre/2024.

Anexo para su revisión y aprobación:

- MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

057-4879

Florencia, 09 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co


Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Convenio Solidario No. 4318 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión social inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALETONES con **Convenio Solidario No. 4318 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Social.

Se remite anexo al presente el seguimiento y el balance de gestión social inicial, para su evaluación.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
01/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Convenio solidario No. 4045 de 2023 – Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)
01//2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe SST Convenio Solidario No. 4045 de 2023	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
02/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
03/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de adición del valor contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD)
28/10/2024	Convenio Solidario No.4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023	Remisión de paquete de archivos correspondientes al balance final ambiental	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)
31/10/2024	Convenio Solidario No.4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023	Respuesta a oficio 2024S-VBOG-080791 del 30/10/2024, mediante el caul la subdirección de sostenibilidad solicita que subsanen observaciones de la Gestion Ambiental Inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

048-4879

Florencia, 01 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Convenio Solidario No. 4045 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión social inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES con **Convenio Solidario No. 4045 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Social.

Se remite anexo al presente el seguimiento y el balance de gestión social inicial, para su evaluación.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

051-4879

Florencia, 01 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atte.: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Dirección Territorial Caquetá
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Informe SST Convenio solidario No. 4045 de 2023

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST del numeral 12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del Anexo 1 – Anexo Técnico, de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe inicial de seguridad y salud en el trabajo del Convenio solidario No. 4045 de 2023

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

053-4879

Florencia, 02 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de octubre de 2024.

El pasado 17 de septiembre de 2024 el suscrito solicito prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en asocio de los organismos de acción comunal en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total. Mas, sin embargo, el INVIAS realizo la minuta de prorroga #04 de 2024 con plazo hasta el 15/octubre/2024, la cual fue aceptada por el suscrito en el Secop II.

Se hace necesario prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024. La anterior solicitud se justifica así:

- Los convenios solidarios 4045 de 2023, 4318 de 2023 y 4346 de 2023, fueron prorrogados hasta el 31 de octubre de 2024.
- La prórroga del plazo del Contrato de Interventoría de la referencia es necesaria para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.
- Las causas que justifican esta solicitud de prórroga son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

- La finalidad de una prórroga del plazo contractual es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

055-4879

Florencia, 03 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de adición del valor contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de noviembre de 2024.

Ya que el objeto de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra y/o las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente y velando por la correcta ejecución de los trabajos, fue necesario prorrogar el plazo contractual de los convenios solidarios y en consecuencia prorrogar el plazo de la Interventoría en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.

Como se evidencia en el formato "MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS" de fecha 26/junio/2024, los recursos del contrato de interventoría de la referencia han sido distribuidos hasta el 30/septiembre/2024, es decir, se hace necesario la adición de recursos al contrato de interventoría de la referencia, para el correcto cumplimiento de sus funciones y/o obligaciones hasta el 15/noviembre/2024.

Las causas que justifican esta solicitud de adición son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

Por lo anterior le solicito comedidamente adicionar recursos por la suma de $39.815.449.59, (IVA incluido) para ser ejecutados en cumplimento de contrato de interventoría de la referencia, en el periodo 01/octubre/2024 a 15/noviembre/2024.

Anexo para su revisión y aprobación:

- MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

061-4879

Florencia – Caquetá, 28 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes a al balance ambiental final.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la Asociación Comunal de Juntas de Belén de los Andaquíes con **Convenio Solidario No. 4045 de 2023,** presentó los archivos concernientes al balance ambiental final, con los formatos y sus respectivos anexos (Ver listado anexo).

Siendo así, se informa que se aprueba la documentación ambiental recibida y se espera concepto sobre el Balance Final Ambiental final a la Terminación del Convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

DOCUMENTACIÓN
BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION CTO OBRA

CS No. 4045 DE 2023 _ ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

1. MASPS-MN1-IN-2-FR-1 BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION CTO OBRA_ ASOJUNTAS
2. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMP AMB ACTOS ADMINISTRATIVOS_ ASOJUNTAS
3. MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA
4. MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL
5. RADICADO_ SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CORPOAMAZONIA
6. PAZ Y SALVO_ MATERIAL PETREO
7. PAZ Y SALVO_ PROVEEDOR MATERIAL DE FERRETERÍA
8. CERTIFICACIÓN DE LA NO GENERACIÓN DE PASIVOS Y PENDIENTES AMBIENTALES_ CS No. 4045 de 2023
9. AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA REUTILIZAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN
10. ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS ESPECIALES
11. PLAN DE GESTIÓN AMBIETAL_ASOJUNTAS
12. INFORME_AMBIENTAL_PGA_CS No. 4045 de 2023
13. CERTIFICACIÓN BAJA COMPLEJIDAD_ CS No. 4045 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

065-4879

Florencia - Caquetá, 31 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023

Asunto: Respuesta a oficio **2024S-VBOG-080791** del 30/10/2024, mediante el cual la subdirección de sostenibilidad solicita que se subsanen observaciones de la Gestión Ambiental Inicial.

Por medio de la presente y en relación con las observaciones establecidas en el oficio **2024S-VBOG-080791**, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* con apoyo de la OAC contratista (Asociación Comunal de Juntas de Belén de los Andaquíes) con **Convenio Solidario No. 4045 de 2023,** se atienden las apreciaciones dadas por la subdirección de sostenibilidad de la siguiente manera:

Se realizaron los siguientes ajustes al formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental:

1. En relación con el requerimiento No. 1, se anexa el acta de compromiso para la recolección y suministro de la cantidad de agua lluvia requerida para el desarrollo de las actividades durante la totalidad del proyecto (desde el 14 de julio hasta el 20 de septiembre, fechas en las que se ejecutaron las actividades de la obra).

2. Frente a los ajustes solicitados al formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental, se reporta lo siguiente:

a. En los formatos se evidencia la Dirección Territorial Caquetá a la que pertenece el Convenio No. 4045-2023 desarrollado en el municipio de Belén de los Andaquíes.

b. Se realiza la corrección de la unidad ejecutora reemplazando "subdirección de vías regionales" por "Gerencia de Caminos Comunitarios para la Paz Total".

c. Teniendo en cuenta lo manifestado: "*Los formatos se deben presentar (…) con todas las firmas establecidas y soportes. La entrega de un formato con la falta de una de las firmas se considerará como No válido*, se solicita incluir la firma del contratista, en este caso, del Organismo de Acción Comunal (Junta de Acción Comunal de la Vereda La Conga), y de la persona que funge como responsable de obra del presente Convenio", se incluyen en los formatos (MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental y Formato MASPS-MN1-IN-FR-2 Plan de Inversión Ambiental) los roles con los datos y firmas respectivas.


d. Tal como se solicita, se ajustó la clasificación de proyecto, reemplazando el valor de No Aplica "N/A" en la celda P20, por "PAGA-BAJA COMPLEJIDAD". Sin embargo, se hace énfasis en que aunque el proyecto es de BAJA COMPLEJIDAD, como bien es sabido, se certificó que no requiere la formulación de PAGA.

Adicional, informamos que se realiza una corrección en la fecha de terminación del convenio en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental, y Formato MASPS-MN1-IN-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, teniendo en cuenta una prorroga solicitada y otorgada tanto a la Junta de Acción Comunal, como a la Interventoría, con vigencia hasta el 31 de octubre del 2024.

Anexos:
Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental.
Formato MASPS-MN1-IN-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.
Acta de autorización para la recolección de agua lluvia y documento de quien autoriza.

Agradecemos su atención.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 – VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de prorroga #5 del plazo contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
03/10/2024	Convenio solidario No. 4346 de 2023 adscrito al contrato de interventoría	Convenio solidario No. 4346 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

053-4879

Florencia, 02 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de octubre de 2024.

El pasado 17 de septiembre de 2024 el suscrito solicito prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en asocio de los organismos de acción comunal en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total. Mas, sin embargo, el INVIAS realizo la minuta de prorroga #04 de 2024 con plazo hasta el 15/octubre/2024, la cual fue aceptada por el suscrito en el Secop II.

Se hace necesario prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024. La anterior solicitud se justifica así:

- Los convenios solidarios 4045 de 2023, 4318 de 2023 y 4346 de 2023, fueron prorrogados hasta el 31 de octubre de 2024.
- La prórroga del plazo del Contrato de Interventoría de la referencia es necesaria para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.
- Las causas que justifican esta solicitud de prórroga son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

- La finalidad de una prórroga del plazo contractual es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

054-4879

Florencia, 03 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co


Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Convenio Solidario No. 4346 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión social inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE con **Convenio Solidario No. 4346 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Social.

Se remite anexo al presente el seguimiento y el balance de gestión social inicial, para su evaluación.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ANEXO 8.1.3.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Campoalegre – CS#4346

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 – VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de prorroga #5 del plazo contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
03/10/2024	Convenio solidario No. 4346 de 2023 adscrito al contrato de interventoría	Convenio solidario No. 4346 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión ambiental inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

053-4879

Florencia, 02 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de octubre de 2024.

El pasado 17 de septiembre de 2024 el suscrito solicito prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en asocio de los organismos de acción comunal en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total. Mas, sin embargo, el INVIAS realizo la minuta de prorroga #04 de 2024 con plazo hasta el 15/octubre/2024, la cual fue aceptada por el suscrito en el Secop II.

Se hace necesario prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024. La anterior solicitud se justifica así:

- Los convenios solidarios 4045 de 2023, 4318 de 2023 y 4346 de 2023, fueron prorrogados hasta el 31 de octubre de 2024.
- La prórroga del plazo del Contrato de Interventoría de la referencia es necesaria para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.
- Las causas que justifican esta solicitud de prórroga son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

- La finalidad de una prórroga del plazo contractual es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

054-4879

Florencia, 03 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co


Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Convenio Solidario No. 4346 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión social inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE con **Convenio Solidario No. 4346 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Social.

Se remite anexo al presente el seguimiento y el balance de gestión social inicial, para su evaluación.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 – ASOJUNTAS BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
01/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Convenio solidario No. 4045 de 2023 – Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)
01//2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Informe SST Convenio Solidario No. 4045 de 2023	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
02/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS (DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA)
03/10/2024	Aceptación de oferta No. 4879 de 2023	Solicitud de adición del valor contractual	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD)
28/10/2024	Convenio Solidario No.4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023	Remisión de paquete de archivos correspondientes al balance final ambiental	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)
31/10/2024	Convenio Solidario No.4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023	Respuesta a oficio 2024S-VBOG-080791 del 30/10/2024, mediante el caul la subdirección de sostenibilidad solicita que subsanen observaciones de la Gestion Ambiental Inicial	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA (INTERVENTORÍA)	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD)

A continuación, se anexa OFICIOS REMISORIOS relacionados en el cuadro anterior.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

048-4879

Florencia, 01 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Convenio Solidario No. 4045 de 2023 - Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión social inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES con **Convenio Solidario No. 4045 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Social.

Se remite anexo al presente el seguimiento y el balance de gestión social inicial, para su evaluación.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

051-4879

Florencia, 01 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Atte.: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Dirección Territorial Caquetá
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Informe SST Convenio solidario No. 4045 de 2023

Cordial saludo;

En cumplimiento del numeral 5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST del numeral 12. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, del Anexo 1 – Anexo Técnico, de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe inicial de seguridad y salud en el trabajo del Convenio solidario No. 4045 de 2023

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

053-4879

Florencia, 02 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de prórroga #5 del plazo contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de octubre de 2024.

El pasado 17 de septiembre de 2024 el suscrito solicito prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en asocio de los organismos de acción comunal en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total. Mas, sin embargo, el INVIAS realizo la minuta de prorroga #04 de 2024 con plazo hasta el 15/octubre/2024, la cual fue aceptada por el suscrito en el Secop II.

Se hace necesario prorrogar el plazo contractual vigente del Contrato de Interventoría de la referencia en hasta el 15 de noviembre de 2024. La anterior solicitud se justifica así:

- Los convenios solidarios 4045 de 2023, 4318 de 2023 y 4346 de 2023, fueron prorrogados hasta el 31 de octubre de 2024.
- La prórroga del plazo del Contrato de Interventoría de la referencia es necesaria para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.
- Las causas que justifican esta solicitud de prórroga son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

- La finalidad de una prórroga del plazo contractual es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

055-4879

Florencia, 03 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director Territorial Caquetá (E)
atencionciudadano@invias.gov.co
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4879 de 2023
Asunto: Solicitud de adición del valor contractual

Cordial saludo;

Como es sabido, entre el INVIAS y el suscrito ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, se celebró la Aceptación de oferta No. 4879 de 2023 para realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" en cuantía inicial de ciento seis millones ciento setenta y cuatro mil quinientos treinta y siete pesos m-cte ($106.174.537), pactando un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, que, habida cuenta de suspensiones y prórrogas, expira el próximo 15 de noviembre de 2024.

Ya que el objeto de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra y/o las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente y velando por la correcta ejecución de los trabajos, fue necesario prorrogar el plazo contractual de los convenios solidarios y en consecuencia prorrogar el plazo de la Interventoría en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.

Como se evidencia en el formato "MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS" de fecha 26/junio/2024, los recursos del contrato de interventoría de la referencia han sido distribuidos hasta el 30/septiembre/2024, es decir, se hace necesario la adición de recursos al contrato de interventoría de la referencia, para el correcto cumplimiento de sus funciones y/o obligaciones hasta el 15/noviembre/2024.

Las causas que justifican esta solicitud de adición son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

Por lo anterior le solicito comedidamente adicionar recursos por la suma de $39.815.449.59, (IVA incluido) para ser ejecutados en cumplimento de contrato de interventoría de la referencia, en el periodo 01/octubre/2024 a 15/noviembre/2024.

Anexo para su revisión y aprobación:

- MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

Cra 1 No.29 – 08 Oficina 208 B/ Cunduy
elkinramos@gmail.com - Florencia – Caquetá

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

061-4879

Florencia – Caquetá, 28 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes a al balance ambiental final.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la Asociación Comunal de Juntas de Belén de los Andaquíes con **Convenio Solidario No. 4045 de 2023,** presentó los archivos concernientes al balance ambiental final, con los formatos y sus respectivos anexos (Ver listado anexo).

Siendo así, se informa que se aprueba la documentación ambiental recibida y se espera concepto sobre el Balance Final Ambiental final a la Terminación del Convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

DOCUMENTACIÓN
BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION CTO OBRA

CS No. 4045 DE 2023 _ ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

1. MASPS-MN1-IN-2-FR-1 BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACION CTO OBRA_ ASOJUNTAS
2. MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ CUMP AMB ACTOS ADMINISTRATIVOS_ ASOJUNTAS
3. MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA
4. MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL
5. RADICADO_ SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN CORPOAMAZONIA
6. PAZ Y SALVO_ MATERIAL PETREO
7. PAZ Y SALVO_ PROVEEDOR MATERIAL DE FERRETERÍA
8. CERTIFICACIÓN DE LA NO GENERACIÓN DE PASIVOS Y PENDIENTES AMBIENTALES_ CS No. 4045 de 2023
9. AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA REUTILIZAR MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN
10. ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS ESPECIALES
11. PLAN DE GESTIÓN AMBIETAL_ASOJUNTAS
12. INFORME_AMBIENTAL_PGA_CS No. 4045 de 2023
13. CERTIFICACIÓN BAJA COMPLEJIDAD_ CS No. 4045 de 2023

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INGENIERO CIVIL

065-4879

Florencia - Caquetá, 31 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 4045 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4879 de 2023

Asunto: Respuesta a oficio **2024S-VBOG-080791** del 30/10/2024, mediante el cual la subdirección de sostenibilidad solicita que se subsanen observaciones de la Gestión Ambiental Inicial.

Por medio de la presente y en relación con las observaciones establecidas en el oficio **2024S-VBOG-080791**, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* con apoyo de la OAC contratista (Asociación Comunal de Juntas de Belén de los Andaquíes) con **Convenio Solidario No. 4045 de 2023,** se atienden las apreciaciones dadas por la subdirección de sostenibilidad de la siguiente manera:

Se realizaron los siguientes ajustes al formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental:

1. En relación con el requerimiento No. 1, se anexa el acta de compromiso para la recolección y suministro de la cantidad de agua lluvia requerida para el desarrollo de las actividades durante la totalidad del proyecto (desde el 14 de julio hasta el 20 de septiembre, fechas en las que se ejecutaron las actividades de la obra).

2. Frente a los ajustes solicitados al formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental, se reporta lo siguiente:

a. En los formatos se evidencia la Dirección Territorial Caquetá a la que pertenece el Convenio No. 4045-2023 desarrollado en el municipio de Belén de los Andaquíes.

b. Se realiza la corrección de la unidad ejecutora reemplazando "subdirección de vías regionales" por "Gerencia de Caminos Comunitarios para la Paz Total".

c. Teniendo en cuenta lo manifestado: "*Los formatos se deben presentar (…) con todas las firmas establecidas y soportes. La entrega de un formato con la falta de una de las firmas se considerará como No válido*, se solicita incluir la firma del contratista, en este caso, del Organismo de Acción Comunal (Junta de Acción Comunal de la Vereda La Conga), y de la persona que funge como responsable de obra del presente Convenio", se incluyen en los formatos (MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental y Formato MASPS-MN1-IN-FR-2 Plan de Inversión Ambiental) los roles con los datos y firmas respectivas.


d. Tal como se solicita, se ajustó la clasificación de proyecto, reemplazando el valor de No Aplica "N/A" en la celda P20, por "PAGA-BAJA COMPLEJIDAD". Sin embargo, se hace énfasis en que aunque el proyecto es de BAJA COMPLEJIDAD, como bien es sabido, se certificó que no requiere la formulación de PAGA.

Adicional, informamos que se realiza una corrección en la fecha de terminación del convenio en el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental, y Formato MASPS-MN1-IN-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, teniendo en cuenta una prorroga solicitada y otorgada tanto a la Junta de Acción Comunal, como a la Interventoría, con vigencia hasta el 31 de octubre del 2024.

Anexos:
Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 de Radicación y Actualización Ambiental.
Formato MASPS-MN1-IN-FR-2 Plan de Inversión Ambiental.
Acta de autorización para la recolección de agua lluvia y documento de quien autoriza.

Agradecemos su atención.

Atentamente,



Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4879 de 2023

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO
DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Los Aletones – CS#4318

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de obras de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Campoalegre – CS#4346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE **FECHA:**31/10/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Fundida de huellas en concreto de 3000 PSI)	FOTOGRAFÍA 2 (Fundida de huellas y vigas riostras en concreto de 3000 PSI)
	
FOTOGRAFÍA 3 (Fundida de huellas y vigas riostras en concreto de 3000 PSI)	FOTOGRAFÍA 4 (Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos)
	
FOTOGRAFÍA 5 (Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos)	FOTOGRAFÍA 6 (Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
FECHA:31/10/2024

	
FOTOGRAFÍA 7 (Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos)	FOTOGRAFÍA 8 (Instalación de acero de refuerzo para cunetas y bordillos)
	
FOTOGRAFÍA 9 (Fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI)	FOTOGRAFÍA 10 (Fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI)
	
FOTOGRAFÍA 11 (Fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI)	FOTOGRAFÍA 12 (Fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
FECHA:31/10/2024

	
FOTOGRAFÍA 13 (Fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI)	FOTOGRAFÍA 14 (Fundida de cunetas en concreto de 3000 PSI)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Acero de refuerzo de bordillos)	FOTOGRAFÍA 16 (Fundida en concreto de 3000 PSI de bordillos)
	
FOTOGRAFÍA 17 (Fundida en concreto de 3000 PSI de bordillos)	FOTOGRAFÍA 18 (Fundida en concreto de 3000 PSI de bordillos)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
FECHA:31/10/2024

	
FOTOGRAFÍA 19 (Acero de refuerzo placa de poceta)	FOTOGRAFÍA 20 (Acero de refuerzo muros de poceta)
	
FOTOGRAFÍA 21 (Fundida en concreto de 3000 PSI de poceta)	FOTOGRAFÍA 22 (Acero de refuerzo placa de descole)
	
FOTOGRAFÍA 23 (Acero de refuerzo aletas)	FOTOGRAFÍA 24 (Fundida en concreto de 3000 PSI de Placa de descole)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CAMPOALEGRE **FECHA:**31/10/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 19 (Acero de refuerzo placa de poceta)	FOTOGRAFÍA 20 (Fundida de aletas y cabezal de 3000 PSI)
	
FOTOGRAFÍA 21 (Encole de poceta)	FOTOGRAFÍA 22 (Fundida de cunetas y placa de salida en 3000 PSI)
	
FOTOGRAFÍA 23 (Estructura de placa huella finalizada)	FOTOGRAFÍA 24 (Estructura de placa huella finalizada)

ANEXO 8.3.

COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Los Aletones – CS#4318

Convenio Solidario 4318 de 2023

Objeto = "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Accion Comunal de la Vereda Los Aletones del municipio de Belén de los Andaquíes en el departamento del Caquetá para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total."

Contratista = Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Aletones.
NIT = 900.553.557 - 8
Rep. Legal = Benito Ome Muñoz

Interventor = Elkin David Ramos Mosquera.
NIT = 7.962.245 - 1

Fecha Orden de Inicio = 14 de Diciembre de 2023.

Rene Orlando Sanchez Calderón
Residente de Obra

Diego f. Gallego Calderón
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

24/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Se realiza por parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) la actualización de información y contraseña de el Token para poder realizar pagos de compras de materiales de ferretería, transporte y petreos.

Rene Orlando Sanchez Calderon
Residente de Obra

Diego F Gallego Calderon
Residente de Interventoría

25/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Se continúa con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para la activación del Token.
- Se inicia con el proceso de contratación del personal calificado y no calificado.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

26/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice pagos a los proveedores.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice los pagos pertinentes a los proveedores.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

28/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias moderadas

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice compra de materiales requeridos en obra.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice compra de materiales requeridos en obra.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventor

01/07/2024 Registo de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco

Nota: Dia festivo

Residente de obra

Residente de Interventoria

02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

08/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia Intensa

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

09/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia intensas
Tarde: Lluvia moderadas

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

11/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra Residente de Interventoria

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra Residente de Interventoria

14/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia dominical

Residente de obra Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

15/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria.

17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

18/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

19/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

20/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia (dominical) festivo

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

21/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

22/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Total Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de obra
* Maestro de obra
* Ayudantes de obra (5)
* Oficial de obra
* Director de Interventoria

Maquinaria y equipo: * Pulidora electrica

Actividades: Se realizaron labores de corte y figurado de acero de refuerzo Para elementos estructurales como Vigas riostras, Huellas, Contras y bordillos.

Powered by CamScanner

-Se realizó acopio de material Pétreo y de ferretería sobre la vía

Residente de Obra

Residente de Interventoria

23/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Personal en obra: *Residente de Interventoria
*Residente de Obra
*Maestro de Obra
*Ayudantes de Obra (5)
*Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Actividades: - Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillas.

Powered by CamScanner

-Se continuaron con el acopio de material Petreo y de ferreteria sobre la via.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

24/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de Obra
* Ayudante de obra (5)
* Oficial de obra
* Director de Interventoria

Maquinaria y equipo: Pulidora electrica

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.

Powered by CamScanner

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via.

-Se socializó el nuevo alcance del Proyecto ante la comunidad de la vereda los Aletones en la Caseta Comunal de la Junta, en la que asistieron el equipo de interventoria, supervisor de Invias, residente de obra y comunidad en general.

Residente de obra

Residente de Interventoria.

25/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Lluvia moderada

Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de Obra
* Ayudante de obra (s)
* Oficial de Obra

Maquinaria y equipo: Polidora eléctrica

Powered by CamScanner

Actividades: -Se continuaron con laboreS de corte y figurado de acero de refuerzo Para elementos estructurales como vigas riostras, huellas, contras y bordillos

-Se continuo con el acopio de materiales Pétreo y de ferreteria sobre la via.

Residente de obra

Residente de Interventoria

26/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (5)
* Oficial de obra.

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Powered by CamScanner

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzos Para elementos estructurales como Vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pét y de ferretería sobre la vía.

Residente de obra

Residente de Interventoria

27/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
Residente de Obra
Maestro de obra
Ayudante de obra (5)
Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Polidora eléctrica

Powered by CamScanner

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzos Para elementos estructurales como vigas nastras, huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via.

Residente de obra

Residente de Interventoria

28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

29/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (5)
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo Para elementos estructurales como vigas riostra huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

30/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Personal de obra: * Residente de obra
* Residente de Interventoria
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (s)
* Oficial de obra.

Maquinaria y equipo: Pulidora eléctrica

Actividades: -Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas, huellas, cunetas y bordillos.

-Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la vial.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

31/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de obra:
* Residente de Interventoria
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Ayudante de obra (S)
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: Pulidora electrica

Actividades: - Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para elementos estructurales como vigas nostras, cunetas, y bordillos

- Se continuo con el acopio de material Pétreo y de ferreteria sobre la via

Residente de obra

Residente de Interventoria

NKA

Powered by CamScanner

01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de Obra. (5)
* Oficial de obra.
* Director de Interventoría.

(NOTA: 0% do)

(Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora)
(* Volqueta)

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para viga riostras.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Ayudante de Obra. (5).
* Oficial de Obra
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Pulidora eléctrica.
*

Actividades: Se continuaron con labores de corte y figurado de acero de refuerzo para viga viostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Scanned with CamScanner

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de obra.

Maquinaria y equipos: * Polidora electrica.

Actividades: Se finalizó labores de corte y figurado de acero de refuerzo para viga riostras.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

05/08/2024

Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de Obra. (5)
* Oficial de Obra.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Se realizó excavación mecánica del terreno de aprox 15 cm. Posteriormente Se realizó corte de talud para nivelación y conformación de subrasante.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco:

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de Obra. (5)
* Oficial de Obra.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Polidora eléctrica.
* Volqueta.

Actividades: Se realizó figurado de acero de refuerzo para cunetas y bordillos. Se Continúo con el corte de talúd para la nivelación y conformación de subrasante.


Residente de Obra

Residente de Interventoría


Scanned with CamScanner

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día festivo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría


08/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se continuo con el corte de talúd para la nivelación y conformación de subrasante.

Scanned with CamScanner



Residente de Obra



Residente de Interventoría

09/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra
* Ayudante de Obra (s).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.
* Vibrocompactador.

Actividades: Se realizó extendida y nivelación de la sub-base granular clase C en la longitud de la vía mecánica y manualmente. Posteriormente se realizó la compactación de la sub-base con maqui-

nava amarilla.

Residente de Obra


Residente de Interventoría

10/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.


Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudante de obra (5).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Vibrocompactador.

Actividades: Se continuo con la extendido y nivelaci
de la sub-base granular mecánica y manualmente.
Posteriormente se realizó la compactación con el
vibrocompactador en la longitud restante.




Residente de Obra




Residente de Interventoría

11/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias intensas.

NOTA: Día festivo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría


12/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).


Scanned with CamScanner

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Actividades: Se realizó fundido de concreto ciclópeo en la huella central.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

13/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto ciclópeo en la huella central.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

14/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra. (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concretos.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto ciclopeo en la pranja central.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

15/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvia Intensa.

Personal en obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto ciclópeo en la franja central.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

16/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto ciclópeo en la franja central.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderada.
Tarde: Seco.

Scanned with CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de Concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto ciclópeo en la franja central.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

18/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Intensa.
Tarde Lluvia Intensa.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

19/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día festivo.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.
* Ayudantes de obra (5).

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto

Actividades: Se realizó fundida de franja central y sobreancho de concreto ciclópeo en carril izquierdo.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se finalizó fundida de franja central y se continuó con la fundida de sobre ancho en carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

22/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida del sobre ancho en concreto ciclópeo en carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

23/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.

Scanned with CamScanner

* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida del sobre ancho en concreto ciclópeo en carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continúo con la fundida del sobre ancho en concreto ciclópeo en carril izquierdo.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.

Scanned with CamScanner

* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).



Residente de Obra



Residente de Interventoría

25/08/2024 Registro de lluvias: Mañana (Tarde): Seco
Tarde: Seco.

Pers. NOTA: Día dominical.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

26/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

Scanned with CamScanner

* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).

(27/08/2024) Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales, viga riostra posteriormente se realizó la instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga riostras, cunetas y bordillos del carril izquierdo. Se procedió a fundir en concreto 3.000 PSI.

Residente de obra

Residente de Interventoría

27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Scanned with CamScanner

Actividades: Se realicaron excavaciones manuales para viga riostra, posteriormente se realizó la instalación del accero de reforzo en las huellas, viga riostras, cunetas y bordillos del carril izquierdo teniendo en cuenta su respectivo traslapo. Se procedió a fundir en concreto 3.000 PSI.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostra, posteriormente se realizó la

Scanned with CamScanner

instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga riostr
cunetas y bordillos del carril izquierdo teniendo en
cuenta su respectivo traslapo. Se procedo a fundir concreto en
3.000 PSI.

Residente de Obra

Residente de Interventor

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.


Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostra., cunetas, bordillos. Posteriormente, se realizó la instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga riostras, cunetas y bordillos del carril izquierdo

Scanned with CamScanner

teniendo en cuenta su respectivo traslapo. Se procedió a fundir en concreto de 3.000 PSI.



Residente de Obra



Residente de Interventoría

30/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostras, cunetas, bordillos. Posteriormente se realizó la instalación del acero de refuerzo en las huellas, viga riostras, cunetas y bordillas del carril izquierdo. Se procedió a fundir en concreto de 3.000 PSI.

Scanned with CamScanner

Residnte de Obra Residente de Interventoría

31/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra
* Maestro de obra
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
*

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se fundió en concreto reforzado de 3.000 PSI las huellas con su respectiva viga viostra, cunetas y bordillos en carril izquierdo.

Residente de obra Residente de Interventoría

01/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Dia dominical

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto

Personal en Obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Opicial de obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se fundió concreto reforzado la cuneta de carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

03/09/2024 Registro de lluvia: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuo con la fundida en concreto armado de 3000 PSI con la cuneta y bordillos de carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: (Lluvias Intensas) Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.

* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuo con la fundida en concreto armado de 3.000PSI con la cuneta y bordillo de carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

05/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Moderadas.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: *Mezcladora de concreto.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continuó con la fundida en concreto armado de 3.000 PSI de cunetas y bordillos de canal izquierdo:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

06/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

NIKA

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continuo con la fundida en concreto armado de 3000 PSI de cunetas y bordillos de carril izquierdo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

07/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: (Seco) Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.

NKA

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayodante de obra (5).

Actividades: Se continúo con la fundida en concreto armado de 3.000 PSI de cunetas y bordillos de carril izquierdo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

08/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

09/09/2024 Registro de Mañana: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.

Personal en Obra: * Maestro de obra.
* Residente de Obra
* Residente de Interventoría.
* Oficial de obra
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó fundida de sobre ancho de concreto ciclópeo en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

10/09/2024 Registro de Mañana: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.

Personal de Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclópeo en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos:
* Mezclador de concreto.

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra (5).

NKA

Scanned with CamScanner

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclópeo en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

12/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Lluvia moderada.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto

Personal en Obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra. (5).

(Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.).

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto ciclopeo en carril drecha. Se Inició con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI

de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de obra.

* Residente de Interventoría.

* Maestro de obra.

* Oficial de obra.

* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

14/04/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continúa con la fundida de concreto armado de 3000 psi de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

15/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

16/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuo con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

NKA

Residente de Obra

Residente de Interventoría

17/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en carril derecha

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

18/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5)

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto armado de 3.000 psi de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

19/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NKA

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (3).

Actividades: Se continuando con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

20/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Ligeras Intensas
Tarde: Seco

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoria.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continuo con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI de losetta con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

27/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en obra: * Residente de obra.
* Residente de interventoria.
* Maestro de obra.

NICA

Scanned with CamScanner

* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto de 3.000 psi de huella con su respectiva muestra en carril derecho.

Residente de obra

Residente de Interventoría

22/09/2024 Registro de lluvia: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

(Maquinaria y equipos: Mezcladora de concreto)

Actividades: Se N/A.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría
NKA

23/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga y los tres en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias moderadas

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.

Personal en obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la fundido de concreto de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

25/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

NKA

Scanned with CamScanner

Personal de obra: * Residente de obra
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto de 3000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra
* Maestro de obra.

NKA

Scanned with CamScanner

* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continuo con la fundida de concreto de 3.000psi de huella con su respectiva viga riostra en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra.
* Maestro de obra
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).

Scanned with CamScanner

Actividades: Se continuo con la fundida de concreto de
3000 PSI de huella con su respectiva viga vistra
en carril derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

28/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Interventoria
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Director de Interventoria.

Actividades: Se inició con la fundida de cunetas,
y bordillo en carril derecho en concreto armado.

Scanned with CamScanner

Residente de obra

Residente de Interventoría

29/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

NOTA: Día dominical

Residente de obra

Residente de Interventoría

30/09/2024 Registro de lluvias. Mañana: Seco.

Tarde: Seco

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de obra (5).

Scanned with CamScanner

Actividades: Se continuó con cunetas y bordillos en carril. derecho de concreto armado. (fundida).

Residente de obra

Residente de Interventoría

01/10/2024
Al
31/10/2024

NOTA: En el presente convenio durante el mes de Octubre se han realizado tramites administrativos, sociales, ambientales y de SSST con el fin de liquidar el proyecto. Ademas, dar complimiento a los requisitos exigidos por parte del INVIAS.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ANEXO 8.3.2.

Copia de la bitácora de obra de Asojuntas
Belén de los Andaquies – CS#4045

Convenio Solidario 4045 de 2023

Objeto = "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación Comunal de Juntas del Municipio de Belén de los Andaquies en el departamento del Caquetá para el mantenimiento y mejoramiento vial en el programa marco del programa caminos comunitarios de la paz total."

Contratista= Asociación Comunal de Juntas del municipio de Belén de los Andaquies.

NIT= 900.128.460-0

Rep. Legal= Luis Elver Cantillo Patiño.

Interventor = Elkin David Ramos Mogquera.

NIT= 7.962.245-1

fecha Orden de Inicio = 14 de Diciembre de 2023

Oscar Mauricio Ossa Vargas

Residente de Obra

Diego f. Gallego Calderón

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

24/06/2024

Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias Intensas

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5)

Maquinarias y equipos:
* Pulidora eléctrica.
* Taladro Inalámbrico.

Actividades: Se realizaron labores de corte y figurado de acero de refuerzo. Además construcción de formaletas para muros y aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

25/06/2024

Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias Intensas.

Powered by CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra
* Maestro de obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinarias y equipos: * Pulidora eléctrica.
* Taladro Inalámbrico.
*

Actividades: Se continúo con el corte y figurado de acero de refuerzo. Además construcción de formaletas para muros y aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de obra (5).

Powered by CamScanner

Maquinarias y equipos: * Pulidora eléctrica.
* Taladro Inalámbrica.

Actividades: Se continúo con el corte y figurado de acero de refuerzo. Además construcción de formaletas para muros y aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Ayudantes de Obra. (5)

Maquinarias y equipos: * Pulidora eléctrica.
* Taladro inalámbrico.

Powered by CamScanner

Actividades: Se continúo con el corte y figurado de acero de refuerzo. Además construcción de formaletas para muros y aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

28/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Ayudantes de obra (5).

Maquinaria y equipos:
* Pulidora eléctrica.
* Taladro Inalámbrica.

Actividades: Se continúo con el corte y figurado de acero de refuerzo. Además construcción de formaletas para muros y aletas.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias Intensas

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos:
* Pulidora eléctrico.
* Taladro Inalámbrico.

Actividades: Se continúo con el corte y figurado de acero de refuerzo. Además construcción de formaletas para muros y aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

01/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco

(Personal) NOTA: Día festivo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

Powered by CamScanner

* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinarias y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.
* Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuó con el figurado de acero de refuerzo para aletas, zarpas y cajas. Se hizó acopio de material pétreo, cemento y tubos de concreto de 36" sobre la vía en los distintos puntos de construción de las alcantarillas. Se realizó limpieza manual de alcantarilla existente. Además, se desmontó y limpio zonas no boscosas sobre margen derecha e izquierda de un tramo de vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.

Powered by CamScanner

* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra.
* Director de Interventoría

Maquinarias y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizó limpieza manual de alcantarilla existente. Además se realizó desmonte y limpieza de zonas no boscosas sobre margen derecha e izquierda de un tramo de vía. Se continuó con el acopio de material pétreo, cemento y tubos de concreto de 36" sobre la vía en los distintos puntos de construcción de las alcantarillas.

Residente de Obra: Residente de Inter:

04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

(Residente de Obra)

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Ayudantes de obra. (5).

Powered by CamScanner

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizó desmonte y limpieza de zonas no boscosas sobre margen derecha e izquierda de un tramo de vía. Se continúo con el acopio de material pétreo, cemento y tubos de concreto de 36" sobre la vía.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5)
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Powered by CamScanner

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para elementos como cajas, aletas y zarpas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para elementos como cajas, aletas y zarpas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

08/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluia intensa.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas para pocetas, zarpas, cabezal y aletas. en una alcantarilla.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

09/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia intensa
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta

Actividades: Se continuó con las excavaciones mecánicas para poceta, zarpa, cabezal y aletas, sobre la misma alcantarilla.

Residente de Obra.

Residente Interventoría

10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se continuó con las excavaciones mecánicas para poceta, zarpa, cabezal, aletas sobre las misma alcantarilla. Se continuó con el acopio de material pétreo sobre la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Powered by CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudantes de Obra (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se continuo con las excavaciones mecánicas, para poceta zarpa y aleta. Se continuo con el acopio de material pétreo sobre la vía.

Residente de obra

Residente de Interv

12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.

Powered by CamScanner

* Ayudantes de obra (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizó excavación mecánica para instalación de tubería. Posteriormente se fundio el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguio a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36" teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizo el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Powered by CamScanner

Personal en obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudantes de Obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se finaliza con el acopio de material pétreo y de ferretería sobre la vía.

Residente de obra

Residente de Interventoría

14/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

15/01/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra.
* Ayudantes de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto
* Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Se realizo excavación mecánica para instalación de tubería en la segunda alcantarilla. Posteriormente se fundio el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguio a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36" teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4 de la dimensión del tubo. Por último se realizo el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la v

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: (Seco) Lluvia moderada

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra
* Oficial de obra.
* Ayudantes de obra (5)

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto.
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizo excavación mecanica para instalación de tubería en la tercera alcantarilla. Posteriormente se fundio el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguio a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36". teniendo en cuenta la ubicación de la poceta

Powered by CamScanner

y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizo el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudantes de Obra (I)
* Director de Interventoría

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecanicas en la segunda alcantarilla en zona de poceta y

Powered by CamScanner

descole. Además excavaciones manuales debido a qu
el terreno se encontraba rocoso.

Residente de Obra

Residente de Interventor

18/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra
* Ayudante de Obra (5).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la tercera alcantarilla en zona de poceta y descole. Además excavaciones manuales debido a qu

el terreno se encontraba rocoso.

Residente de Obra Re

Residente de Interventoría

19/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se continuo con las excavaciones mecánicas y manuales en la poceta debido a que las condiciones del terreno se encuentra rocoso.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

20/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día festivo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

21/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente Interventoría

22/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.

Powered by CamScanner

* Oficial de Obra
* Ayudantes de obra (5).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipo:
* Mezcladora de Concreto
* Retroexcavadora.
* Vibrador.

Actividades: Se realizó excavaciones mecánicas en la cuarta alcantarilla en zona de la tubería de la alcantarilla. Posteriormente se fundió el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguió a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36". teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4" de la dimensión del tubo. Por último se realizó el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

23/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de obra.
* Residente de interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de obra (5).

Maquinaria y equipo:
* Mezcladora de concreto
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la quinta y última alcantarilla para instalación de tubería. Posteriormente se fundió el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguió a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36". teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desague de la alcantarilla. Por consiguió se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4 de la dimensión del tubo. Por último se realizó

Powered by CamScanner

el relleno de material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudantes de Obra.
* Director de Interventoría

Maquinaria y equipo: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la cuarta alcantarilla. en zona de poceta y descole. Además excavaciones manuales debido a que el terreno se encontraba rocoso.

Powered by CamScanner

- Se socializó el nuevo alcance del proyecto ante la comunidad de Asojuntas Belén de los Andaquíes en la caseta comunal de la vereda Los Aletones en la que asistieron el equipo de interventoría, supervisor de Invías, residente de obra y comunidad en general.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

25/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas en la quinta alcantarilla en zona de poceta y descole.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/07/2024 Registros de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas y manuales en los descoles de las alcantarillas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra (5).
* Oficial de Obra.

Maquinaria y equipo: Retroexcavadora.

Actividades: Se realizaron excavaciones mecánicas y manuales en los descoles de las alcantarillas.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día dominical.

Powered by CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco

Personal en obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de obra.

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se retomo actividades de figurado de acero de refuerzo faltantes en elementos como aletas y cabezal.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

30/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal de obra:
* Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de obra

Maquinaria y equipo: *Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

31/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de obra.

Powered by CamScanner

* Maestro de obra.
* Ayudante de obra. (5).
* Oficial de Obra
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para aletas.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra:
* Director de Interventoría.
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra. (5)

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continuó con el figurado de acero de refuerzo para aletas

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra. (5)
* Director de Interventoría

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se continúo con el figurado de acero de refuerzo para aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra. (5).

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Actividades: Se realiza figurado de acero de refuerzo para placas de descoles.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

NOTA: D/a dominical.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

05/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la primera alcantarilla. (aletas - Poceta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
: Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la segunda alcantarilla.. (Colectas - Poceta).

Residente de Obra Residente de Interventoría

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

(Personal) NOTA: Día festivo.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

08/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra.
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la tercera alcantarilla. (aleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

09/08/2024 Registro de lluvias. Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la cuerta alcantarilla (Caleta-aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

10/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra
* Ayudante de obra (5)

Scanned with CamScanner

Actividades: Se realizó la instalación del acero de refuerzo de todos los elementos estructurales de la quinta de cantarilla. (Aletas - Pocetas).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/08/2024 Registro de lluvia: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

12/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la primera alcantarilla (aleta - poceta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

13/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

(A) Personal de obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Oficial de Obra.

Actividades: Se continúo con la instalación de formaleta en la primera alcantarilla Caleta - poceta).

Scanned with CamScanner

Residente de Obra — Residente de Interventoría

14/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la instalación de formaleta en la primera alcantarilla. (aleta - Poceta).

Residente de Obra — Residente de Interventoría

15/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensa

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de Concreto.

Actividades: Se realizó la fundida in sitú, de concreto 3.000 PSI en la primera alcantarilla de aletas, cabezal y placa de descole. con su respectivo solado de limpieza

Residente de Obra

Residente de Interventoría

16/08/2024 Registro de Lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.

* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).
*

Actividades: Se realizó la fundida in sitú de concreto 3.000 PSI en la primera alcantarilla de la poceta. con su solado de limpieza

Residente de Obra | Residente de Interventoría

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y equipos como mezclador de concreto, herramientas menores, tableros, etc. a la segunda alcantarilla.

Residente de Obra | Residente de Interventoría

18/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Intensa.
Tarde: Lluvia Intensa.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

19/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

NOTA: Día festivo:

Residente de Obra

Residente de Interventoría

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

Scanned with CamScanner

* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de obra (6).

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la segunda alcantarilla (aleta - poceta).

Residente de Obra

Residente de Interventa

21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Actividades:
(Personal en Obra) Se continúo con la instalación de formaleta en la segunda alcantarilla. (aleta - poceta)

Personal en Obra:
* Residente de Interventoria.
* Residente de Obra
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2).
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoria.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

22/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: (Seco) Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto 3.000 psi en la segunda alcantarilla de aletas, cabezal y placa de disco. con su respectivo solado de limpieza

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

23/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se realizó la fundida in sito de concreto de 3000 PSI en la segunda alcantarilla de la poceta. con su solado de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: (* Mezcladora) N/A.

Scanned with CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y equipos como mezclador de concreto, herramientas menores, tableros etc. a la tercera alcantarilla.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la tercera alcantarilla (aleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Personal en Obras * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

Scanned with CamScanner

* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de obra (5)

Actividades: Se continúo con la instalación de formaleta en la tercera alcantarilla. (caleta - aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la instalación de formaleta en la tercera alcantarilla (caleta-aleta).

Scanned with CamScanner

Residente de Obra Residente de Interventoría

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.
Personal de Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto
3000 psi en la tercera alcantarilla de aletas, cabez
y placa de descole con sus respectivos solados de limp

Residente de Obra Residente de Interventoría

30/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto de 3000 PSI en la tercera alcantarilla de las aletas faltantes cabezal y placa con sus respectivos solados de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

31/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y equipos como mezclador de concreto, herramientas menores, tableros, etc. a la cuarta alcantarilla.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

01/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

21/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.

Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: N/A.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la instalación de formaleta en la cuarta alcantarilla (aleta-aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

03/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: N/A

·Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra
* Maestro de Obra
* Ayudante de Obra (5)
* Oficial de Obra (2)
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la instalación de formaleta en la cuarta alcantarilla (aleta-aleta).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: ~~N/A~~. Mezcladora de concreto.

Personal en Obra:
* Residente de obra.
* Residnte de Interventoría
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2).
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto 3.000 PSI en la cuarta alcantarilla de aletas, cabezal y placa de descole con sus respectivas solados de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

05/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto.

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.

NKA

* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (5).

Actividades: Se realizó la fundida in sitio de concreto de 3.000 Psi en la cuarta alcantarilla de las aletas faltantes, cabezal y placa con sus respectivos solados de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

06/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: N/A:

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.

* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se realizó el traslado de maquinaria y equipos como mezclador de concreto, herramientas menores, tableros, etc. a la quinta alcantarilla. Se inició con la instalación de formaleta en la quinta alcantarilla. (caleta - Poceta)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias intensas.
Tarde: Lluvias moderadas

Maquinaria y equipos: N/A.

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)

* Ayudante de obra (51.

(Maquinaria y equipos: N/A.)

Actividades: Se continúo con la instalación de formaleta en la quinta alcantarilla (caleta - pocetal).

Residente de Obra

Residente de Interventoría

08/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco.

NOTA: Día. Dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: N/A.

Personal en obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de obra (5).
* Director de Interventoría

Actividades: Se continuó con la instalación de formaleta en la quinta alcantarilla (Caleta - puente)

Residente de Obra

Residente de Interventoría

10/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Scanned with CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó la fundida in situ de concreto de 3.000 PSI en la quinta alcantarilla de la poceta con su solado de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.

NICA

Scanned with CamScanner

* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5)

Actividades: Se realizo' la fundida in situ de concreto 3.000 Psi en la quinta alcunterilla de aletes, cabezal y placa de descole con sus respectivos solados de limpieza.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

12/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Lluvia moderado.

Maquinaria y equipos: N/A.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el resane de tubería interna en todas las alcantarillas. Se realizó un mejor acabado de las alcantarillas con agua-cemento en muros.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

13/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: N/A

Personal en obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de obra (2)
* Ayudante de obra (5)

Actividades: Se continuó con el mejoramiento en el acabado de muros de las cinco alcantarillas y resane de tubos interno.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/09/2024 Registro de lluvias: Mañana. Seco.

Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Volqueta.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra. (2).
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó el cargue y descargue de material restante, herramientas menores, talleros, (5) mezcladora de concreto, entre otros. en la caseta comunal de Asojuntas Belén.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

NKA

15/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

NOTA: O/a dominical.

Residente de Obra



Residente de Interventoría

16/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra
*. Maestro de Obra
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra (2)
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó retiro de explanación de material de excavación y perfilación de encoles y descoles con retroexcavadora.

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

17/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas

* Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Personal de Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra.
* Ayudante de Obra (2).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con el retiro y explo
.nación de material de excavación y perfilación
de encoles y descoles con retroexcavadora.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

18/09/2014 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: N/A.

Personal de obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (
* Ayudante de obra. (2).

Actividades: Se realizó instalación de cercas con postes plásticos en predios utilizados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

01/10/2024
Al
31/10/2024

NOTA: En el presente convenio durante el mes de Octubre se han realizado trámites administrativos sociales, ambientales y de SSST con el fin de liquidar el proyecto.. Además, dar cumplimiento a los requisitos exigidos por parte del INVITAS.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

Convenio Solidario 4346 de 2023

Objeto = "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Alegre del municipio de Morelia en el departam del Caquetá para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total".

Contratista = Junta de Acción Comunal de la Vereda Campoalegre.

NIT = 900.622.519-4

Rep. Legal = Jesus Ome Renteria

Interventor: Elkin David Ramos Mosquera.

NIT = 7.962.245 - 1

fecha Orden de Inicio = 27 de Diciembre de 2023.

Manuel A. Gallo Santofimia

Residente de Obra

Diego f. Gallego Calderón

Residente de Interventoría

NKA

24/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco

NOTA: Se realiza por parte de la Junta de Acción Comunal (OAC) la actualización de información y contraseña de el Token para poder realizar pagos de compras de materiales de ferretería, transporte y pétreos.

Manuel A. Gallo Santofimio
Residente de Obra

Diego F Gallyo Calderon
Residente de Interventoría

25/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Se continúa con la actualización de datos por parte de la OAC con el banco para la activación del Token.
- Se inicia con el proceso de contratación del personal calificado y no calificado.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

26/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas
Tarde: Seco

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice pagos a los proveedores.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice los pagos pertinentes a los proveedores.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra no calificada y calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

28/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Moderadas.

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice compra de materiales requeridos en obra.
- Se continúa con la activación del Token para que la OAC el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Moderadas
Tarde: Lluvias Intensas.

NOTA: Se continúa con la activación del Token para que la OAC realice compra de materiales requeridos en obra.
- Se continúa con el proceso de contratación de mano de obra calificada y no calificada.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

30/06/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco

NOTA: Día dominical.

Residente de obra

Residente de Interventoría

01/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde Seco

Nota: Dia festivo

Residente de obra

Residente de interventoria

02/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: seco
Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

03/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

04/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

05/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

06/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

07/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Seco: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

08/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventona

Powered by CamScanner

09/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

10/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria.

Residente de obra

Residente de Interventoria

11/07/2024 Registro de lluvia: Mañana: lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

12/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

13/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: lluvia Moderada

Tarde: lluvia Moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

14/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

15/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

16/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: lluvia Moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

17/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Introduce el texto aquí

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

18/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de Obra

Residente de Interventoria

19/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

20/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

-Se socializó el nuevo alcance del Proyecto ante la comunidad de la vereda Campoalegre en la casa del Presidente de la

Introduce el texto aquí

Powered by CamScanner

Junta en la que asistieron el equipo de interventoria, residente de obra, contadora JAC y comunidad general

Residente de obra

Residente de Interventoria

21/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

22/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria.

Introduce el texto aquí

Powered by CamScanner

23/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de Obra Residente de Interventoria

24/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra Residente de Interventoria

25/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

26/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

27/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Seco: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

28/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

29/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

30/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

31/07/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Seco: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificado y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

01/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

02/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensas

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

03/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Seco: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

04/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco:

Nota: Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

05/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Lluvia Intensas

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

06/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

07/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Lluvia moderada

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria
Dia festivo

Residente de obra

Residente de Interventoria

08/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

09/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

10/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

11/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: (Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria)
Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

12/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

13/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

14/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

15/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

16/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

17/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia Intensas.

Nota: Busqueda de mano de obra no calificada y maquinaria

Residente de obra

Residente de Interventoria

18/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Nota: Busqueda de mano de obra/ Dia dominical

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

19/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco

Tarde: Seco

Nota: Dia festivo

Residente de obra

Residente de Interventoria

20/08/2024 Registro de lluvias: Mañana Seco

Tarde: Seco

(Nota) Personal en obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra
* Ayudante de Obra (1).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora
* Volqueta.

Actividades: Acopio de material pétreo y de ferretería sobre costado de la vía.. en

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

21/08/2024 Registro de lluvias: Mañana Seco
Tarde: Seco

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (1).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Acopio de material pétreo y de ferretería sobre costado de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

22/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra. (1)
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Acopio de material pétreo y de ferretería sobre costado de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

23/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Scanned with CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Ayudantes de obra (1).
* Oficial de Obra.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se continúo con el acopio de material pétreo y de ferretería sobre un costado de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra.

Scanned with CamScanner

* Ayudante de Obra (1).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Volqueta.

Actividades: Se finalizó el acopio de material pétreo y de ferretería sobre un costado de la vía.

Residente de Obra. Residente de Interventoría

25/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

26/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Seco.

Personal en Obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de obra.
* Maestro de Obra.

Scanned with CamScanner

* Oficial de Obra.
* Ayudante de Obra (2).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.

Actividades: Se realizó corte de talud para nivelación y conformación de subrasante.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (2).

Maquinaria y equipos:
* Retroexcavadora.

Actividades: Se continuó con el corte de talud para la nivelación y conformación de subrasante. Además se

Scanned with CamScanner

realizaron excavaciones mecánicas para la poceta y cabezal aletas.

28/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia Intensa
Tarde: Lluvia moderada.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de obra. (3)
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.

Actividades: Se realizó instalación, extendida y nivelación mecánica y manual de sub-base granular.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Scanned with CamScanner

Personal en Obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (3).
* Director de Interventoría.

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Vibrocompactador.

Actividades: Se continúo con la instalación, extendida, nivelación mecánica y manual de sub-base granular. Además se realizó la compactación de toda la vía. continuamente con el vibrocompactador.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

30/08/2024 Registro de lluvias: Mañana: (Tarde) Seco.
Tarde: Seco.

Personal en obra: * Residente de Interventoría
* Residente de Obra

* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudantes de Obra. (3).

Maquinaria y equipos: * Retroexcavadora.
* Mezcladora de concreto.

Actividades: Se realizó excavación mecánica para instalación de tubería. Posteriormente se fundió el solado de limpieza con un espesor aprox 15 cm. Se prosiguió a colocar y alinear los 6 tubos de concreto de 36" teniendo en cuenta la ubicación de la poceta y el desagüe de la alcantarilla. Por consiguiente se fundió el atraque por ambos costados a una altura equivalente a 3/4 de la dimensión del tubo. Por último se realizó el relleno con material seleccionado con el fin de llegar a la rasante de la vía.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Scanned with CamScanner

31/08/2024 Registro de lluvias. Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Personal en Obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudantes de obra. (3).

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades.- Instalación del solado de limpieza para placa de descole y pocetas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Residente de obra

Residente de Interventoria

02/09/2014 Registro de lluvias: Mañana: Seco.

Tarde: Seco

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de obra.

* Residente de Interventoria
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de obra (4)
* Director de Interventoría

Actividades: Se realizon fundida de franja central y sobreanchos de concreto ciclopeo en carril izquierdo y derecho.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

03/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (6).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuo con la fundida de placa central y sobreanchos en carril izquierdo y derecho en concreto ciclópeo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/09/2024 Registro de lluvia: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Scanned with CamScanner

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continuó con la fundida de franja central y sobreanchos en carril izquierdo y derecho. en concreto ciclópeo.

Residente de obra

Residente de Interventoría

05/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría

* Maestro de obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (4).

Actividades: Se continúo con la fundida de franja central y sobre anchos de cortina izquierdo y derecho en concreto ciclópeo.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

06/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra: (4).

MKA

Scanned with CamScanner

Actividades: Se continuo con la fundida de franja central y sobre anchos en carril izquierdo y derecho en concreto ciclópeo.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias intensas
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continuo con la fundida de franja central y sobre anchos en carril izquierdo y derecho en concreto ciclopeo.

Scanned with CamScanner

Residente de obra Residente de Interventoría

08/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

NOTA: O/a dominical.

Residente de Obra Residente de Interventoría

09/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.
* Pulidora eléctrica.

Personal en Obra: * Maestro de Obra
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.

NKA

Scanned with CamScanner

* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (5)
* Directos de Interventoria.

Actividades: Se continuó con la fundida de franja central y sobre anchos en carril izquierdo y derecho en concreto Ciclópeo. Se inició con la figuración e instalación de acero de refuerzo para curetas, bordillos, huellas y viga riostra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

10/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto.
* Pulidora eléctrica.

Personal en Obra:
* Maestro de Obra.
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Oficial de obra (2).

Scanned with CamScanner

* Ayudante de Obra. (4)
* Director de Interventoría

Actividades: Se continuo con la fundida de franja central y sobre anchos en carril izquierdo y derecho en concreto ciclópeo. Se inicio con la continuó con la figuración de acero de refuerzo para cuartas, bordillos huellas y viga riostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.
* Pulidora eléctrica.

Personal en Obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra. (5)

Scanned with CamScanner

Actividades: Se continúo con la fundida de franja central y sobre anchos en carril izquierdo y derecho en concreto ciclópeo. Se continuo con la figuración de acero de refuerzo para cunetas, bordillos, huellas y viga riostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02/04/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvia moderada.
Tarde: Lluvia moderada.

Maquinaria y equipos:
* Mezclador de concreto.
* Soldadora eléctrica.

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continuo con la fundida de Franja central y sobre anchos en carril izquierdo y derecho en concreto ciclópeo. Se continuo con el figurado de acero de refuerzo para cunetas, bordillos, huellas y viga riostra.

Residente de obra

Residente de Interventoría

13/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Pulidora eléctrica.

Personal de obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudante de Obra (5).

NKA

Actividades: Se continuo con el figurado e instalación de acero de refuerzo para cimientos, bordillos, huellas y viga viostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

14/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Polidora eléctrica.

Personal en obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra
* Oficial de Obra (2).
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continúa con el alguacido e instalac
de acero de refuerzo para cunetas, bordillos, hoell
y viga riostras.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

15/09/2024 Registro de lluvias: Mañana. Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical

Residente de Obra

Residente de Interventor

16/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Scanned with CamScanner

Personal de Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra
* Ayudante de Obra. (5)
* Oficial de Obra (2).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizaron excavaciones manuales para viga riostra. Posteriormente Se continuo con la instalación de acero de refuerzo y se inició con la fundida de concreto de 3.000 PSI con su respectiva viga.

Residente de obra

Residente de Interventoría

17/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora

Scanned with CamScanner

Personal de obra:
* Residente de obra
* Residente de Interventoría
* Maestra de obra
* Oficial de obra. (2).
* Ayudantes de obra. (5)
* Director de Interventoría

Actividades: Se continuó con la instalación de acero de refuerzo y la fundida de concreto de 3.000 PSI de las huellas con su respectiva viga riostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

18/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de Obra:
* Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2).

Scanned with CamScanner

* (Ayudantes de Obra (5).

Actividades: Se continua con la instalación de acero de refuerzo y la fundida de concreto de 3.000 rs de las huellas con su respectiva viga riostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

19/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continuó con la instalación de acero de refuerzo y la fundida de concreto de 3.000 PSI

NKA

Scanned with CamScanner

de las huellas con su respectiva viga riostra.

Residente de obra

Residente de Interventoria

20/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias intensas.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de Obra:
* Residente de Obra
* Residente de Interventoria
* Maestro de obra.
* Oficial de obra (2)
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se realizó la fundida de concreto de 3000 PSI de las huellas con su respectiva viga riostra

Residente de obra

Residente de Interventoria

27/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra (2).
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se realizó la fundida de concreto reforzado de 3000 PSI de las huellas con su respectiva viga riostra.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

22/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

(Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.)

NKA

Scanned with CamScanner

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

23/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2).
* Ayudante de Interventoría/(2) obra
* Director de Interventoría.

Actividades: Se realizó fundida de concreto de 3.000 psi de huella con su respectiva viga riostra en ambos cavetes.

NKA

Scanned with CamScanner

Residente de Obra

Residente de Interventoría

24/04/2014 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezclador de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de Obra (5)
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en ambos carriles.

Residente de obra

Residente de Interventoría

NKB

25/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de obra:
* Residente de obra.
* Residente de interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de obra. (5).

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto de 3.000 PSI de huella con su respectiva viga riostra en ambos carriles.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias moderadas.
Tarde: Seco.

NKA

Maquinaria y equipos. * Mezcladora de concreto.

Personal de obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra
* Oficial de Obra (2).
* Ayudante de Obra (5).

Actividades: Se continúa con la fundida de concreto de 3.000 psi de huella con su respectiva viga riostra en ambos carriles

Residente de obra

Residente de Interventoría

27/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Lluvias Intensas.
Tarde: Lluvias Intensas

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de obra: * Residente de Interventoría.
* Residente de Obra.

NKA

* Maestro de obra.
* Oficial de Obra. (2).
* Ayudante de obra (5)

Actividades: Se continuo con la fundida en concreto de 3000 PSI de huellas con su respectiva viga riostra en ambos carriles.

Residente de obra

Residente de Interventoría.

28/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Seco: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de obra:
* Residente de Interventoría
* Residente de Obra.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra (2)
* Ayudantes de Obra (5).
* Director de Interventoría.

Actividades: Se continúo con la fundida en concreto de 3.000 psi de huellas con su respectiva viga riostra en ambos carriles.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

29/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical

Residente de Obra

Residente de Interventoría

30/09/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.

Scanned with CamScanner

* Maestro de obra.
* Oficial de obra (2).
* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se inició la fundida de cunetas en concreto armado de 3000 PSI en ambos costados.

Residente de obra

Residente de Interventoría

01/10/2024 Registro de Nevla: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de Concreto.

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra (2).
* Ayudantes de Obra (5).

Actividades: Se continuó con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

02/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudantes de Obra. (5)

Actividades: Se continúo con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

03/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Sco.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal de Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudantes de Obra (5)

c Actividades: Se continúo con la fundida en concreto armado de 3.000 PSI en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

04/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudantes de Obra (5)

Actividades: Se continúo con la fundida en concreto armado de 3.000 PSI en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

05/10/24 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudantes de Obra. (5).

Actividades: Se continuó con la fundida en concreto de 3.000 psi en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

06/10/24 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

07/10/24 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Actividades: Se continuó con la fundida de cunetas y se inició con la fundida de bordillos en concreto armado de 3.000 PSI. en ambos carriles.

Residente de obra

Residente de Interventoría

08/10/24 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos. * Mezcladora de concreto.

Actividades.: Se continuó con la fundida de cunetas y se continuó con la fundida de bordillos en concreto armado de 3.000 psi en ambos carriles.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Oficial de obra (2).
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra (5).

Residentes de Obra

Residente de Interventoría

09/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoria.
* Oficial de obra (2)
* Maestro de Obra

* Ayudante de obra (5).

Actividades: Se continuó con la fundida de bordillos en concreto armado de 3.000 PSI. en ambos carriles.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

10/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Ayudante de obra. (5)
* Oficial de Obra (2)

Actividades: Se continuó con la fundida de bordillos en concreto armado de 3.000 PSI.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

11/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos:
* Mezcladora de concreto.
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.

Personal en obra:
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra. (4)
* Oficial de Obra. (2)

Actividades: Se continúo con la fundida de bordillos en concreto armado de 3.000 PSI en ambos carriles.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

12/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoria.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudantes de obra (4)

Actividades: Se continúo con la fundida en concreto de bordillos de 3.000 psi en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

15/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de obra

Residente de Interventoría

14/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas.
NOTA: Día festivo pero se laboró normalmente.
Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudantes de Obra (4)

Actividades: Se continúo con la fundida en concreto armado de 3.000 PSI de cunetas y bordillos en ambos carriles.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

15/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

* Personal en obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudantes de obra (4)

Actividades: Se continúo con fundida de concreto armado de 3.000 psi de vigas y bordillos.

Residente de obra

Residente de Interventoría

16/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.
Personal en obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Ayudantes de obra. (4)
* Oficial de obra. (2)

Actividades: Se continuo con la fundida de concreto armado de 3.000 PSI de cunetas y bordillos en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

17/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seca
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * (Mezcladora de concreto)
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoria.
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra (2)
* Ayudantes de Obra (4)

Actividades: Se continuo con la fundida de bordillos y cunetas en concreto armado de 3.000 PSI en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

18/10/2014 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Ayudantes de obra. (4)
* Oficial de obra (2)

Actividades: Se continúo con la fundida de cunetas y bordillos en concreto armado de 3.000 PS. en ambos costados.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

19/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto
Personal en obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría
* Maestro de obra.
* Oficial de Obra. (2)
* Ayudantes de Obra (4)

Actividades: Se continúo con la fundida de bordillos en concreto armado de 3.000 PSI ambos cavilles

Residente de Obra

Residente de Interventoría

20/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

NOTA: Día dominical.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/10/2024 Registro de lluvias. Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto.

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Ayudantes de obra (4)
* Oficial de Obra (2)

Actividades: Se fundió las tres franjas de concr
ciclopeo en los tres últimos módulos de placa
huella. Se instaló el solado de limpieza en la
placa de cimentación y descole de la poceta. Post
mente se instalo el acero de refuerzo de estas
con sus respectivos muros.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

22/01/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * (Mezcladora de concreto.)
* N/A)

Personal en obra: * Residente de obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudantes de obra. (4)

Actividades: Se continúo con la instalación de acero de refuerzo para poceta.

Residente de obra

Residente de Interventoría

23/01/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: ~~N/A~~ Pulidora eléctrica.

Personal en Obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra (2)
* Ayudante de Obra (9)

Actividades: Se continúo con la instación de acero de refuerzo para poceta y el figurado de acero de refuerzo para aletas, cabezal.

Residente de obra

Residente de Interventor

24/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Lluvias Intensas.

Maquinaria y equipos: * Soldadora eléctrica.

Personal en Obra: * Maestro de Obra
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Oficial de Obra. (2)

* Ayudante de Obra (4)

Actividades: Se continuo con la instalación de acero de refuerzo de pocetas y figurado para las aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

25/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Lluvias moderadas.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de carreto

Personal en Obra:
* Residente de Obra.
* Residente de Interventoria
* Maestro de Obra.
* Oficial de Obra. (2).
* Ayudante de Obra (4)

Actividades: Se realizó la fundida de concreto en 3.000 PSI de la placa de la poceta y se inició la instalación de acero de refuerzo de

placa de descole y aletas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

26/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seca
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal en Obra: * Residente de Obra
* Residente de Interventoría.
* Maestro de obra.
* Oficial de obra. (2).
* Ayudante de Obra. (4)

Actividades: Se realizó la fundida de concreto de 3.000 PSI en muros de la poceta. Se fundió placa de descole.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

27/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco.

(Maquinaria y equipos)
NOTA: Día dominical.

Residente de obra: Residente de Interventoría

28/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Ayudantes de Obra (4)
* Oficial de Obra. (2).

Actividades: Se fundió muros aletas, cabecal y las huellas faltantes con su respectiva viga riostra

de los tres últimos módulos.

29/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Seco.
Tarde: Seco.

Maquinaria y equipos: * Mezcladora de concreto

Personal en Obra: * Residente de Obra.
* Residente de Interventoría.
* Maestro de Obra.
* Oficial de obra. (2)
* Ayudante de obra. (4).

Actividades: Se fundió en concreto de 3.000 PS
las cunetas y bordillos de los tres últimos mod
de placa huella. Se realizo la instalación de plac
de salida para posteriormente fundirla.

Residente de Obra

Residente de Interventor

30/10/2024
Al
31/10/2024

NOTA: Se continuaron realizando trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST con el fin de liquidar el proyecto. Además dar cumplimiento a los requisitos exigidos por parte del INVIAS.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 28 del 7/10/2024 al 13/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI [ ]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES**

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.378.598,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.378.598,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 100,000
Avance o Atraso Físico % 0.000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/10/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 29 del 14/10/2024 al 20/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI [X]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.378.598,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.378.598,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 100,000
Avance o Atraso Físico % 0.000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/10/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 30 del 21/10/2024 al 27/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.378.598,00	#######
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.378.598,00	#######
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 100,000
Avance o Atraso Físico % 0.000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/10/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**
	 FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 28 del 7/10/2024 al 13/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 102 ML DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 2.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO No. 4318 de 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 196.378.598,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 196.378.598,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 196.378.598,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 196.378.598,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.378.598,00	#######
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.378.598,00	#######
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0.000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 100,000
Avance o Atraso Físico % 0.000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda Los Aletones en Km 11+450 tramo Los Mosquera, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/10/2024 (Día / Mes / Año)

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 28 del 7/10/2024 al 13/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES		
CONVENIO No.	4045 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 185.171.800,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 185.171.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4879 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.171.800,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.171.800,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,000 Avance o Atraso Físico %: 0.000

Meta Física Ejecutada %: 100,000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00				100,0%
Ejec	5,00				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 29 del 14/10/2024 al 20/10/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES		
CONVENIO No.	4045 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 185.171.800,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 185.171.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4879 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.171.800,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.171.800,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000 Avance o Atraso Físico % 0.000
Meta Física Ejecutada % 100,000

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* ALCANTARILLAS	UND	5
*		
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00				100,0%
Ejec	5,00				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/10/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 30 del 21/10/2024 al 27/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES**

CONVENIO No. 4045 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 185.171.800,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 185.171.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO: 14/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.171.800,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.171.800,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000 — Avance o Atraso Físico % 0,000
Meta Física Ejecutada % 100,000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00				100,0%
Ejec	5,00				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 3/11/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 31 del 28/10/2024 al 3/11/2024 Último Informe Semanal SI ☒ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS DE 36".

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGÚN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 5 ALCANTARILLAS CON EL FIN DE MEJORAR LA CANALIZACION Y CONTROL DE AGUAS PARA OPTIMIZAR EL TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA QUE SE DIRIGE HACIA LA VEREDA ALETONES EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES**

CONVENIO No.	4045 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 185.171.800,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 185.171.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4879 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 185.171.800,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 185.171.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 185.171.800,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 185.171.800,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,000%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000 Avance o Atraso Físico % 0,000

Meta Física Ejecutada % 100,000

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	ALCANTARILLAS	UND	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00				100,0%
Ejec	5,00				100,0%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá Código 1800 , en el acceso a la vereda El Porvenir en Km 2+400 tramo Genoba, Belen de los Andaquies.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúo con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.4.3.

Informe semanal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 13/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 28 del 7/10/2024 al 13/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.753.948,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 182.083.355,00	91,154%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (17.670.593,00)	-8,846%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.200.666,84	4,606%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.133.144,00	9,578%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 91,154
Avance o Atraso Físico % -8,846

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	85,00				83,33%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Continuar con la fundida de cunetas en concreto armado de 3000 psi en ambos carriles.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la fundida de cunetas e iniciar con la fundida de bordillos en concreto armado de 3000 psi en ambos carriles.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 20/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 29 del 14/10/2024 al 20/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE**

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.753.948,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 186.214.844,00	93,222%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.539.104,00)	-6,778%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.200.666,84	4,606%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.131.489,00	2,068%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 81,576
Avance o Atraso Físico % -18,424

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	-				-
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
Total	1	1

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Fundida de cunetas y bordillos en concreto armado de 3000 psi en ambos carriles.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de acero de refuerzo para poceta, placa de descole y aletas con su respectivo solado para posteriormente fundida de 3000 psi.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON

Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 27/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 30 del 21/10/2024 al 27/10/2024 Último Informe Semanal SI ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No. 4346 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024
VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024
VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.753.948,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 193.406.544,00	96,822%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.347.404,00)	-3,178%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.200.666,84	4,606%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.191.700,00	3,600%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000
Meta Física Ejecutada % 81,576
Avance o Atraso Físico % -18,424

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	PLACA HUELLA	ML	102
*	ALCANTARILLA	UN	1
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	0,50				50,00%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
PULIDORA ELECTRICA	1	1
Total	2	2

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI	X NO
MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO			X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO			X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de acero de refuerzo para placa y muros de poceta, con su respectivo solado. Posteriormente se realizó fundida de 3000 psi. Fundida de concreto ciclópeo en franja central, derecha e izquierda para los tres últimos modulos de placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de acero de refuerzo y fundida de concreto de 3000 PSI junto con su respectiva cuneta y bordillo en los tres últimos modulos de placa huella.
Instalación de acero de refuerzo y fundida de placa de salida en la placa huella. Instalación de acero de refuerzo para placa de descole, cabezal y aletas.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **SEMANA No.:** 31 del 28/10/2024 al 31/10/2024 Último Informe Semanal SI ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA DE 36", PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

INTERVENIR SEGUN EL NUEVO ALCANCE AJUSTADO DEL CONVENIO 102 ML DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA CON EL FIN DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRANSITO VEHICULAR EN LA VIA DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEBIDO A QUE PRESENTA MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO EN UN TIEMPO ESTIMADO DE 3 MESES.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONVENIO No. 4346 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.753.948,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.753.948,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4879 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 — VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 199.753.948,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	N/A	$ 106.174.537,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.753.948,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.753.948,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.753.948,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.200.666,84	4,606%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.347.404,00	3,178%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.174.537,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000 — Avance o Atraso Físico % -18,424
Meta Física Ejecutada % 81,576

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* PLACA HUELLA	ML	102
* ALCANTARILLA	UN	1
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	102,00				100,00%
Ejec	102,00				100,00%
Prog	1,00				100,00%
Ejec	1,00				100,00%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1
PULIDORA ELECTRICA	1	1
Total	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n): PR 21+000 de la vía Morelia- Valparaiso, en la vereda Campoalegre, Morelia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:
OBSERVACIONES:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MORELIA CAQUETA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO		X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: Se realizó actividades de obra hasta el día 29 de octubre de 2024 culminando con la fundida de la placa de salida en la placa huella.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Instalación de acero de refuerzo y fundida de concreto de 3000 PSI junto con su respectiva cuneta y bordillo en los tres últimos modulos de placa.
Instalación de acero de refuerzo y fundida de placa de salida en la placa huella.
refuerzo para placa de descole, cabezal y aletas.

Instalación de acero de

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con trámites administrativos, sociales, ambientales y de SSST.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No refleja

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se relaciona maquinaria ni equipos debido a que ya se termino la ejcución de la obra y se estan realizando tramites administrativos, ambientales, sociales y SSST.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma

Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: No se relaciona maquinaria ni equipos debido a que ya se termino la ejcución de la obra y se estan realizando tramites administrativos, ambientales, sociales y SSST.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma

Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda
Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4346 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE JUNIO																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
PULIDORA ELECTRICA			CAMPOALEGRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I		
MEZCLADORA DE CONCRETO			CAMPOALEGRE	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	I	A	A	I	A	A		
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1		
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1		

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	58	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	24	41,38%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	34	58,62%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Los Aletones – CS#4318

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	9/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

No se relaciona personal debido a que ya se termino la ejecución de la obra y se estan realizando tramites administrativos, ambientales, sociales y SSST.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre. el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad social de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 al 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

No se relaciona personal debido a que ya se termino la ejecución de la obra y se estan realizando tramites administrativos, ambientales, sociales y SSST.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Luis elver Cantillo P.
Nombre: LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
Rep. Legal Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Campoalegre – CS#4346

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MILLER CABRERA	17648027	MAESTRO	$ 2.158.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 2.158.000	$ 150.200	V	NUEVA EPS	31590263	$ 269.800	PORVENIR	31590263	$ 43.160	COMFACA	$ 43.200	$ 64.800	
2	WILLIAM GOMEZ CORTES	1117530163	OFICIAL	$ 1.938.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.938.000	$ 134.900	V	ASMET SALUD	31590263	$ 242.300	PORVENIR	31590263	$ 38.760	COMFACA	$ 38.800	$ 58.200	
3	ROBINZON GOMES	1117518886	OFICIAL	$ 1.938.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.938.000	$ 134.900	V	NUEVA EPS	31590263	$ 242.300	COLPENSIONES	31590263	$ 38.760	COMFACA	$ 38.000	$ 58.200	
4	JESUS STIVEN OSPINA	1119212041	AYUDANTE	$ 1.300.620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	31590263	$ 162.500	COLPENSIONES	31590263	$ 26.012	COMFACA	$ 26.000	$ 39.000	
5	RUBEN DARIO LUNA	1117502088	AYUDANTE	$ 1.300.620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31590263	$ 162.500	PORVENIR	31590263	$ 26.012	COMFACA	$ 26.000	$ 39.000	
6	YEISON STIVEN NAVARRO	1119210534	AYUDANTE	$ 1.300.620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.300.000	$ 60.400	V	ASMET SALUD	31590263	$ 108.400	PORVENIR	31590263	$ 26.012	COMFACA	$ 17.400	$ 26.100	
7	OSCAR LIEVANO CABRERA	1117554547	AYUDANTE	$ 1.300.620	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31590263	$ 162.500	PORVENIR	31590263	$ 26.012	COMFACA	$ 26.000	$ 39.000	
8	GUILLERMO OME	1117491634	AYUDANTE	$ 1.300.620	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					JAC VEREDA CAMPO ALEGRE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	ASMET SALUD	31590263	$ 162.500	PORVENIR	31590263	$ 26.012	COMFACA	$ 26.000	$ 39.000	
9																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
15																																												
16																																												
17																																												
18																																												
19																																												
20																																												
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Jesus Ome

Firma
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Rep. Legal: Presidente de la Junta de Acción Comunal

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900622519	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-479	VEREDA CAMPOALEGRE	3214619602	OMERENTERIA@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31590263	E	2024-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.953.600	28.500	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7 de 7	31590263	2024-11-07	Pagada

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900622519	4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-479	VEREDA CAMPOALEGRE	3214619602	OMERENTERIA@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31590263	E	2024-11-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.953.600	28.500	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7 de 7	31590263		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.859.535	10.859.535	10.859.535	11.915.032	11.915.032

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.737.800	0	10.000	0	1.747.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	500.900	0	2.900	0	503.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	333.800	0	1.900	0	335.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	903.100	0	5.200	0	908.300
EPS(Administradoras: 3)				7	1.357.600	0	7.900	0	1.365.500
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	548.400	0	3.200	0	551.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	417.900	0	2.400	0	420.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	391.300	0	2.300	0	393.600
ARP(Administradoras: 1)				7	756.000	0	4.300	0	760.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	756.000	0	4.300	0	760.300
CCF(Administradoras: 1)				7	477.000	0	2.800	0	479.800
COMFACA	CCF13	891190047	2	7	477.000	0	2.800	0	479.800
SENA(Administradoras: 1)				7	238.800	0	1.400	0	240.200
SENA	PASENA	899999034	1	7	238.800	0	1.400	0	240.200
ICBF(Administradoras: 1)				7	357.900	0	2.100	0	360.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	357.900	0	2.100	0	360.000
Gran Total					4.925.100	0	28.500	0	4.953.600

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la
Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1298823		10	NACIÓN	4318-0	$ 196.378.598,00	$ -
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 197.378.598,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 147.760.112,00		$ 147.760.112,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.432.803,00		$ 4.432.803,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.185.683,00		$ 44.185.683,00
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 196.378.598,00		$ 196.378.598,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1219723		10	NACIÓN	4045-0	$ 185.171.800,00	$ -
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 186.171.800,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 138.939.422,00		$ 138.939.422,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.168.183,00		$ 4.168.183,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.064.195,00		$ 42.064.195,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	$ 185.171.800,00		$ 185.171.800,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1297423		10	NACIÓN	4346-0	$ 199.753.948,00	$ -
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		TOTAL					

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.753.948,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 151.067.610,00		$ 151.067.610,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.532.028,00		$ 4.532.028,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00		$ 44.154.310,00
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	$ 199.753.948,00		$ 199.753.948,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

No se relaciona estado general del tiempo debido a que ya se termino la ejecución de la obra y se estan realizando tramites administrativos, ambientales, sociales y SSST.

Firma
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

No se relaciona estado general del tiempo debido a que ya se termino la ejecución de la obra y se estan realizando tramites administrativos, ambientales, sociales y SSST.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	23	19	22	23	21	19	22	19	24	19	24	24	20	24	24	18	24	21	24	19	24	24	19	22	24	23	22	22			637
Lluvias moderadas	0	1	4	2	1	0	5	0	1	0	4	0	0	4	0	0	1	0	3	0	1	0	0	1	2	0	1	2	2			35
Lluvias intensas	0	0	1	0	0	3	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0			24
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma
Nombre: DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0644694 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	18/09/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2162	SI	ensayo realizado a los 7 dias
2	25/09/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2729	SI	ensayo realizado a los 145 dias
3	9/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	3020	SI	ensayo realizado a los 28 dias
4	21/09/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2156	SI	ensayo realizado a los 7 dias
5	28/09/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2746	SI	ensayo realizado a los 14 dias
6	12/09/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	3047	SI	ensayo realizado a los 28 dias
7	3/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2144	SI	ensayo realizado a los 7 dias
8	3/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2137	SI	ensayo realizado a los 7 dias
9	10/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2716	SI	ensayo realizado a los 14 dias
10	10/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	2719	SI	ensayo realizado a los 14 dias
11	24/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	3066	SI	ensayo realizado a los 28 dias
12	24/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	HUELLA	1	3000	3070	SI	ensayo realizado a los 28 dias
13	4/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	CUNETA	1	3000	2153	SI	ensayo realizado a los 7 dias
14	4/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	CUNETA	1	3000	2149	SI	ensayo realizado a los 7 dias
15	11/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	CUNETA	1	3000	2745	SI	ensayo realizado a los 14 dias
16	11/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	CUNETA	1	3000	2749	SI	ensayo realizado a los 14 dias
17	25/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	CUNETA	1	3000	3074	SI	ensayo realizado a los 28 dias
18	25/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	CUNETA	1	3000	3061	SI	ensayo realizado a los 28 dias
29	7/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	BORDILLO	1	3000	2150	SI	ensayo realizado a los 7 dias
20	14/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	BORDILLO	1	3000	2749	SI	ensayo realizado a los 14 dias
21	28/10/2024	CONCRETO DE PLACA HUELLA	INV E 406 INV 410	BORDILLO	1	3000	3066	SI	ensayo realizado a los 28 dias
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio

Firma

Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GI	**GEOCON INGENIERIA** **LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS** CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO

I.N.V. E - 406 - 13 I.N.V. E - 410 - 13

EMPRESA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES	FECHA:	Octubre 24 de 2024
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4318 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
1	11/09/24	18/09/24	7	263,4	2162	3000	2162	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12465	5301,5	2,351	3	72	SI	HUELLA
2	11/09/24	25/09/24	14	332,5	2729	3000	3166	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12457	5301,5	2,350	3	91	SI	
3	11/09/24	09/10/24	28	368,0	3020	3000	3020	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12438	5301,5	2,346	3	101	SI	
4	14/09/24	21/09/24	7	262,7	2156	3000	2156	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12427	5301,5	2,344	3	72	SI	HUELLA
5	14/09/24	28/09/24	14	334,6	2748	3000	3186	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12432	5301,5	2,345	3	92	SI	
6	14/09/24	12/10/24	28	371,2	3047	3000	3047	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12385	5301,5	2,336	3	102	SI	
7	26/09/24	03/10/24	7	261,2	2144	3000	2144	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12354	5301,5	2,330	2	71	SI	HUELLA
8	26/09/24	03/10/24	7	260,4	2137	3000	2479	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12325	5301,5	2,325	3	71	SI	
9	26/09/24	10/10/24	14	330,8	2716	3000	3149	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12370	5301,5	2,333	2	91	SI	
10	26/09/24	10/10/24	14	331,3	2719	3000	3154	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12361	5301,5	2,332	2	91	SI	
11	26/09/24	24/10/24	28	373,8	3066	3000	3066	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12343	5301,5	2,328	3	102	SI	
12	26/09/24	24/10/24	28	374,0	3070	3000	3070	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12349	5301,5	2,329	3	102	SI	
Observaciones:																			

Elaboró	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERÍA GI LABORATORIO DE SUELOS LUIS ANTONIO AVILEZ Nit. 6.886.705-8

Calle 6 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-5233649
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

GI	**GEOCON INGENIERIA** **LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS** CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES	GI - RE - CC - 027

ENSAYO A LA COMPRESION DE MUESTRAS DE CONCRETO

I.N.V. E - 406 - 13 I.N.V. E - 410 - 13

EMPRESA:	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES**	**FECHA:**	Octubre 28 de 2024
OBRA:	CONVENIO SOLIDARIO 4318 DE 2023. AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Lectura dial (Kn)	Resistencia obtenida (psi)	Resistencia esperada (psi)	Resistencia proyectada (psi)	Asenta (pulg)	Relacion mezcla volumen	Diametro muestra (cm)	Altura muestra (cm)	Area (cm2)	Peso muestra (Gms)	Volumen (cm3)	Densidad (Gm/cm3)	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
13	27/09/24	04/10/24	7	262,3	2153	3000	2153	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12320	5301,5	2,324	3	72	SI	CUNETA
14	27/09/24	04/10/24	7	261,8	2149	3000	2149	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12308	5301,5	2,322	3	72	SI	
15	27/09/24	11/10/24	14	334,6	2746	3000	3186	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12310	5301,5	2,322	3	92	SI	
16	27/09/24	11/10/24	14	335,0	2749	3000	3189	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12315	5301,5	2,323	3	92	SI	
17	27/09/24	25/10/24	28	374,5	3074	3000	3074	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12336	5301,5	2,327	3	102	SI	
18	27/09/24	25/10/24	28	373,0	3061	3000	3061	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12327	5301,5	2,325	3	102	SI	
19	30/09/24	07/10/24	7	261,9	2150	3000	2150	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12341	5301,5	2,328	3	72	SI	BORDILLO
20	30/09/24	14/10/24	14	335,0	2749	3000	3189	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12374	5301,5	2,334	3	92	SI	
21	30/09/24	28/10/24	28	373,6	3066	3000	3066	3"	1: 2,1: 3,2	15	30	176,7	12355	5301,5	2,330	3	102	SI	
Observaciones:																			

Elaboró	LUIS ANTONIO AVILEZ Laboratorista Nombre/Firma

GEOCON INGENIERIA LABORATORIO DE SUELOS GI LUIS ANTONIO AVILEZ Mat. 6.885.705-8

Calle 9 Sur N° 18 - 18 Barrio Villa Monica. Cel: 312-6233648
E-mail: geoconingenieria@hotmail.com
Florencia - Caquetá

Powered by CamScanner

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 5/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	14/08/2024	CONCRETO DE ALCANTARILLAS	INV E 406 INV 410	PLACA DE DESCOLE	1	3000	3031	SI	ensayo realizado a los 28 dias
2	27/08/2024	CONCRETO DE ALCANTARILLAS	INV E 406 INV 410	PLACA POCETA	1	3000	3021	SI	ensayo realizado a los 28 dias
3	19/09/2024	CONCRETO DE ALCANTARILLAS	INV E 406 INV 410	MUROS ALETAS	1	3000	3024	SI	ensayo realizado a los 28 dias
4	1/10/2024	CONCRETO DE ALCANTARILLAS	INV E 406 INV 410	MUROS POCETA	1	3000	3028	SI	ensayo realizado a los 28 dias
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND



Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/09/2024 AL 30/09/2024

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 197.378.598,00

VALOR ACUMULADO: $ 197.378.598,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.475.719,60	17/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.868.929,90	17/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.213.579,40	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100295255

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	118%	$ 232.000.000	17/11/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073005 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	**% Asegurado**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/09/2024 AL 30/09/2024

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 186.171.800,00

VALOR ACUMULADO: $ 186.171.800,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ -		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ -		
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ -		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ -		
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NO EXISTE INFORMACION CARGADA EN LA PAGINA DEL SECOP SOBRE LAS POLIZAS DE ESTE CONVENIO.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 01/09/2024 AL 30/09/2024

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.753.948,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.753.948,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.750.189,60	14/11/2023	31/10/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.037.697,40	14/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.226.184,40	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100296701

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	$ 232.000.000	17/11/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073329 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	**% Amparo**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	**% Asegurado**	**Valor Asegurado ($)**	**VIGENCIA**					
			Desde			**Hasta**		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO
DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4318 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.104.062,00	$ 44.328.046,00	$ 44.328.046,00		$ 147.760.154,00	75,2%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.432.805,00		$ 4.432.805,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.674.255,00	$ 13.255.692,00	$ 13.255.692,00		$ 44.185.639,00	22,5%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 76.778.317,00	$ 57.583.738,00	$ 62.016.543,00		$ 196.378.598,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Benito Ome M
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma: Diana Milena Rivera
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 228928-T

Contratista

Firma:
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4045 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 55.575.768,00	$ 41.681.827,00	$ 41.681.827,00		$ 138.939.422,00	75,0%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.168.183,00		$ 4.168.183,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 16.825.677,00	$ 12.619.259,00	$ 12.619.259,00		$ 42.064.195,00	22,7%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 72.401.445,00	$ 54.301.086,00	$ 58.469.269,00		$ 185.171.800,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Luis Elver Cantillo P.
Nombre: LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ERIKA PAOLA GARCIA CASTRO
Contador del contratista
Apoyo Administrativo Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 279409-T

Contratista

Firma:
Nombre: OSCAR MAURICIO OSSA VARGAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-114224 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4346 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.427.044,00	$ 45.320.283,00	$ 45.320.283,00		$ 151.067.610,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.532.028,00		$ 4.532.028,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.661.724,00	$ 13.246.293,00	$ 13.246.293,00		$ 44.154.310,00	22,1%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 78.088.768,00	$ 58.566.576,00	$ 63.098.604,00		$ 199.753.948,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA PARRA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Contratista

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-284714 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Los Aletones – CS#4318

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	1 de 1 .
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** AGOSTO DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4318 de 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 196.378.598,00** **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
14	2/08/2024	FERNEY OYOLA GUEVARA	Nomina	$ 828.525,00	0	0	0	$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
15	6/08/2024	JHO FREDY CUELLAR SALINAS	Nomina	$ 893.452,00	0	0	0	$ 893.452,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
16	2/08/2024	ARMANDO CALDERON ARTUNDUAGA	Nomina	$ 1.401.577,00	0	0	0	$ 1.401.577,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
17	2/08/2024	ULDARICO QUINTERO MOSQUERA	Nomina	$ 828.525,00	0	0	0	$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
18	2/08/2024	EMILIO CALDERON OME	Nomina	$ 828.525,00	0	0	0	$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
19	2/08/2024	KEVIN MAURICIO YELA QUINTERO	Nomina	$ 828.525,00	0	0	0	$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
20	2/08/2024	JHON SEBASTIAN CANTILLO OME	Nomina	$ 828.525,00	0	0	0	$ 828.525,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
21	16/08/2024	JUAN GABRIEL MOTTA NUÑEZ	Transporte material de ferreteria	$ 3.200.000,00	0	32000	0	$ 3.168.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
22	9/08/2024	LINDELIA SARRIAS CAMPOS	Alquiler de maquinaria	$ 9.000.000,00	0	360000	0	$ 8.640.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
23	13/08/2024	RENTACAT ZOMAC SAS	Transporte de maquinaria	$ 2.000.000,00	0	5000	0	$ 1.995.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
24	13/08/2024	DANIEL ALBERO GONZALEZ ARCILLA	Compra base granular	$ 2.142.000,00	0	45000	0	$ 2.097.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
25	15/08/2024	JUAN CARLOS MANRIQUE YEPES	Vibrocompactador	$ 2.160.000,00	0	86400	0	$ 2.073.600,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
26	15/08/2024	ANIBAL GUACA RODRIGUEZ	Transporte de materiales petréo	$ 8.000.000,00	0	80000	0	$ 7.920.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
27	15/08/2024	CARLOS ZAMBRANO CORTES	Servicios de excavacion	$ 4.332.000,00	0	173280	0	$ 4.158.720,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
28	20/08/2024	MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA	COMPRA DE MATERIAL PETREO	$ 1.963.000,00	0	41250	0	$ 1.921.750,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
29	31/08/2024	DIAN	Retención en la fuente de Julio	$ 585.000,00	0	0	0	$ 585.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
30	28/08/2024	MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA	COMPRA DE MATERIAL PETREO	$ 2.891.700,00	0	60750	0	$ 2.830.950,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
31	28/08/2024	ANIBAL GUACA RODRIGUEZ	Transporte de materiales petréo	$ 6.000.000,00	0	60000	0	$ 5.940.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
32	31/08/2024	Aseguradora mundial de seguro	Actualizacion Poliza NB-100295255	$ 1.619.200,00	0	0	0	$ 1.619.200,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
33	31/08/2024	Banco de Occidente	Rendimientos financieros	$ 461.658,30	0	0	0	$ 461.658,30	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

$ 50.792.212,30

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 147.803.248,00	$ 51.533.139,00	$ 48.711.354,00	$ 100.244.493,00	$ 47.558.755,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.434.097,00			$ -	$ 4.434.097,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.141.253,00	$ 8.465.221,00	$ 2.080.858,30	$ 10.546.079,30	$ 33.595.173,70
					$ -	$ -
					$ -	$ -
	TOTALES	$ 196.378.598,00			$ 110.790.572,30	$ 85.588.025,70

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(AGOSTO) :** $ 23.265,97
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 468.456,67
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
0	$ -	$ -	0	0/01/1900	$ -

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Benito Ome
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma: Diana Milena Rivera
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 228928-T

Firma:
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 4318 de 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	UNICO DESEMBOLSO	$ 196.378.598,00	15/12/2023		A907142		UNICO DESEMBOLSO	JAC los Aletones	900553557			JAC@GMAIL.COM								$ 137.925.687,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/08/2024	014	14	NOMINA	Nomina	FERNEY OYOLA GUEVARA	17684087	VEREDA ALETONES	3125541548	kevinvelaquintero@gmail.co	$ 828.525,00		$ 828.525,00			$ -	$ 828.525,00	$ 137.097.162,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/08/2024	015	15	NOMINA	Nomina	JHON FREDY CUELLAR SALINAS	1119213244	CR 5 # 6A - 63 CENTRO	3212286063	hons8277@gmail.com	$ 893.452,00		$ 893.452,00			$ -	$ 893.452,00	$ 136.203.710,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/08/2024	016	16	NOMINA	Nomina	ARMANDO CALDERON ARTUNDUAGA	17684183	VEREDA ALETONES	3168236817	calderonarmando754@gmail	$ 1.401.577,00		$ 1.401.577,00			$ -	$ 1.401.577,00	$ 134.802.133,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/08/2024	017	17	NOMINA	Nomina	ULDARICO QUINTERO MOSQUERA	17684623	VEREDA ALETONES	3144482354	claroscamilo989@gmail.com	$ 828.525,00		$ 828.525,00			$ -	$ 828.525,00	$ 133.973.608,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/08/2024	018	18	NOMINA	Nomina	EMILIO CALDERON OME	17682547	VEREDA SAN LUIS FINCA LA BOCAN	3143334755	wilmer102016@outlook.com	$ 828.525,00		$ 828.525,00			$ -	$ 828.525,00	$ 133.145.083,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/08/2024	019	19	NOMINA	Nomina	KEVIN MAURICIO YELA QUINTERO	1006410126	VEREDA ALETONES	3216747808	kevinvelaquintero@gmail.co	$ 828.525,00		$ 828.525,00			$ -	$ 828.525,00	$ 132.316.558,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/08/2024	020	20	NOMINA	Nomina	JHON SEBASTIAN CANTILLO OME	1115791337	VEREDA ALETONES	3223913391	sebastiancantilloome2006@	$ 828.525,00		$ 828.525,00			$ -	$ 828.525,00	$ 131.488.033,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/08/2024	021	21	CUENTA DE COBRO	Transporte material de ferreteria	JUAN GABRIEL MOTTA NUÑEZ	1117511822	CRA 2 CA A D BRR PALONEGRO	3226103017	juangabrielmottanunez24@gm	$ 3.200.000,00		$ 3.200.000,00		$ 32.000,00	$ -	$ 3.168.000,00	$ 128.320.033,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/08/2024	022	22	CUENTA DE COBRO	Alquiler de maquinaria	LINDELIA SARRIAS CAMPOS	1117541019	VEREDA LOS ALETONES	3227284111	lindamo95@gmail.com	$ 9.000.000,00		$ 9.000.000,00		$ 360.000,00	$ -	$ 8.640.000,00	$ 119.680.033,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		13/08/2024	023	23	FE616	Transporte de maquinaria	RENTACAT ZOMAC SAS	901426420	CLL 11 4A SUR 420 BRR LOS MOLIN	3203022675	rentacatzomacsas@gmail.co	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00		$ 5.000,00	$ -	$ 1.995.000,00	$ 117.685.033,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		13/08/2024	024	24	FEDA17	Compra base granular	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILLA	1075237530	CLL 5 28-06 AP 803	3212759901	lagonotificacionDian@gmail.c	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00		$ 45.000,00	$ -	$ 2.097.000,00	$ 115.588.033,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		15/08/2024	025	25	CUENTA DE COBRO	Vibrocompactador	JUAN CARLOS MANRIQUE YEPES	7934444	CR 7 33B 05	3115140976	juankmanyepes@hotmail.co	$ 2.160.000,00		$ 2.160.000,00		$ 86.400,00	$ -	$ 2.073.600,00	$ 113.514.433,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		15/08/2024	026	26	CUENTA DE COBRO	Transporte de materiales petréo	ANIBAL GUACA RODRIGUEZ	17615980	CRA 2 2D -148	3137770008	guacarodriguez777@gmail.c	$ 8.000.000,00		$ 8.000.000,00		$ 80.000,00	$ -	$ 7.920.000,00	$ 105.594.433,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		15/08/2024	027	27	CUENTA DE COBRO	Servicios de excavacion	CARLOS ZAMBRANO CORTES	1080362496	Cr3 5 5 55 B CINCUENTENARIO	3224579632	karlaz1991@hotmail.com	$ 4.332.000,00		$ 4.332.000,00		$ 173.280,00	$ -	$ 4.158.720,00	$ 101.435.713,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		20/08/2024	028	28	FACTURA FV-716	COMPRA DE MATERIAL PETREO	MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA SAS	900768578	CL 12 C 2 C 45 BR ALTAMIRA	3138651755	edwinson_1@hotmail.com	$ 1.650.000,00	$ 313.000,00	$ 1.963.000,00		$ 41.250,00	$ -	$ 1.921.750,00	$ 99.513.963,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		31/08/2024	029	29	72043734	Retención en la fuente mes de Julio	DIAN	800197268	CLL 33 N 6B-24	3103158207	notificacionesjudicialesdian@	$ 585.000,00		$ 585.000,00			$ -	$ 585.000,00	$ 98.928.963,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		28/08/2024	030	30	FACTURA FV-719	COMPRA DE MATERIAL PETREO	MATERIALES Y EXCAVACIONES DEL CAQUETA SAS	900768578	CRA. 11 #131 a 13-109	3138651755	edwinson_1@hotmail.com	$ 2.430.000,00	$ 461.700,00	$ 2.891.700,00		$ 60.750,00	$ -	$ 2.830.950,00	$ 96.098.013,65	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		28/08/2024	031	31	CUENTA DE COBRO	Transporte de materiales petréo	ANIBAL GUACA RODRIGUEZ	17615980	CRA 2 2D -148	3137770008	guacarodriguez777@gmail.c	$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00		$ 60.000,00	$ -	$ 5.940.000,00	$ 90.158.013,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		31/08/2024	032	32	72043734	Actualizacion Poliza NB-100295255	Aseguradora mundial de seguro	900531292	CLL 33 N 6B-24	3214590179	medellin@segurosmundial.c	$ 1.619.200,00		$ 1.619.200,00			$ -	$ 1.619.200,00	$ 88.538.813,65	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		31/08/2024	033	33	Gravamenes	Gravamenes	Banco de Occidente	890.300.279-4	CARRERA 4 # 7 - 61 CALI, VALLE DE	01 800 05 14652	bancodeoccidente.com.co	$ 461.658,30		$ 461.658,30			$ -	$ 461.658,30	$ 88.077.155,35	

Firma: Benito Ome
Nombre: BENITO OME MUÑOZ
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma: Diana Milena Rivera
Nombre: DIANA MILENA RIVERA LOZANO
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 228928-T

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: RENE ORLANDO SANCHEZ CALDERON
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 63202-121075 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de Asojuntas Belén de los Andaquies – CS#4045

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 03/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4045 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 185,171,800** **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (JUNIO) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Jesus Ome
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Firma:
Nombre:
Contadora de la OAC
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Campoalegre – CS#4346

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** SEPTIEMBRE DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4346 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.853.746,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
NOTA DEBITO 0001	2/09/2024	OAC O JAC VEREDA CAMPOALEGRE	REVERSO NOMINA NO PAGADA 30/AGO Y GMF	3.006.342,00		-	-	-	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
NC 0006	2/09/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO CUOTA MANEJO RED PUBLICA Y GMF	95.580,80		-	-	95.580,80	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 026	5/09/2024	WILLIAM ARTUNDUAGA/ARMO	COMPRA 30 M3 GRAVILLA S/FRA TR-1500	2.760.000,00	$ -	$ 57.983,00	$ 11.597,00	2.690.420,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
NC 0007	5/09/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	19.602,90	$ -	$ -	$ -	19.602,90	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 027	6/09/2024	WILLIAM GOMEZ CORTES	QUINCENA 16-31 AGOSTO	893.124,00	$ -	$ -	$ -	893.124,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
NC 0008	6/09/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	21.254,94	$ -	$ -	$ -	21.254,94	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 028	10/09/2024	MILLER CABRERA RIVAS	QUINCENA 16-31 AGOSTO	1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	1.312.455,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 029	10/09/2024	ROBINSON GOMEZ CORTES	QUINCENA 16-31 AGOSTO	248.507,00	$ -	$ -	$ -	248.507,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 030	10/09/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTES MATERIALES FERRETERIA , PIEDRA, ARENA	3.510.000,00	$ -	$ 35.100,00	$ -	3.474.900,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
NC 0009	10/09/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	46.667,11	$ -	$ -	$ -	46.667,11	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 031	17/09/2024	OSCAR LIEVANO CABRERA	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 032	17/09/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTE TRITURADO DESDE FLORENCIA	2.400.000,00	$ -	$ 24.000,00	$ -	2.376.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 033	17/09/2024	GUILLERMO OME JOVEN	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	1.657.752,00	$ -	$ -	$ -	1.657.752,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 034	17/09/2024	MILLER CABRERA RIVAS	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	1.312.455,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 035	17/09/2024	YEISSON STIVEN NAVARRO MORENO	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	276.123,00	$ -	$ -	$ -	276.123,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 036	17/09/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTE CEMENTO CON CARGUE	700.000,00	$ -	$ 7.000,00	$ -	693.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 037	17/09/2024	RUBEN DARIO LUNA MALAMBO	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 038	17/09/2024	WILLIAM GOMEZ CORTES	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	1.483.462,00	$ -	$ -	$ -	1.483.462,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 039	17/09/2024	JESUS STIVEN OSPINA	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	1.215.162,00	$ -	$ -		1.215.162,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 040	17/09/2024	ROBINSON GOMEZ CORTES	QUINCENA 1-15 SEPTIEMBRE	1.296.182,00	$ -	$ -		1.296.182,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
NC 0010	17/09/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	136.281,31	$ -	$ -	$ -	136.281,31	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento: (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso; situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro seoún la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 151.067.610,00	$ 86.152.829,22	14.955.432,00	101.108.261,22	$ 49.959.348,78
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.532.028,00	$ -	-	-	$ 4.532.028,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00	$ 10.942.792,77	2.944.297,06	13.887.089,83	$ 30.267.220,17
	TOTALES	**$ 199.753.948**	**97.095.621,99**	**$ 17.899.729,06**	**114.995.351,05**	**$ 84.758.596,95**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(SEPTIEMBRE) :** 28.610,55
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 254.227,22
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: **JESUS OME RENTERIA**
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA PARRA TORRES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 4346 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
																				102.883.942,68	saldo anterior
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024	NOTA DEB 0001			REVERSO NOMINA 17-361 AGO	OAC VEREDA CAMPOALEGRE	900622519	VDA CAMPOALEGRE	3214619602	omerenteria@gmail.com	3.006.349,00	$ -	$ 3.006.349,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.890.291,68	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024	NC 0006		DSCTO AUTOMATIC	PAGO CUOTA MANEJO, IVA, GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11			95.580,80	$ -	$ 95.580,80	$ -	$ -	$ -	$ 95.580,80	$ 105.794.710,88	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		5/09/2024	CE 026		TR-1500	COMPRA GRAVILLA 3/4	WILLIAM ARTUNDUAGA M.	17648625	VEREDA EL CHAMON	3507887361		2.319.327,73	$ 440.672,27	$ 2.760.000,00	$ -	$ 57.983,00	$ 11.597,00	$ 2.690.420,00	$ 103.104.290,88	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5/09/2024	NC 0007		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11			19.602,90	$ -	$ 19.602,90	$ -	$ -	$ -	$ 19.602,90	$ 103.084.687,98	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/09/2024	CE 027		NOMINA	QUINCENA 16-31 AGOSTO	WILLIAM GOMEZ CORTES	1117530163	Palmeras sector 1 casa 5	3115066499	williamgoco1994@gmail.com	893.124,00		$ 893.124,00				$ 893.124,00	$ 102.191.563,98	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		6/09/2024	NC 0008		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11			21.254,94	$ -	$ 21.254,94	$ -	$ -		$ 21.254,94	$ 102.170.309,04	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		10/09/2024	CE 028		NOMINA	QUINCENA 16-31 AGOSTO	MILLER CABRERA RIVAS	17645027	Calle 33 1ABis-09 B. Amazonia	3124879876	millercabrera201517@gmail.com	1.312.455,00	$ -	$ 1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.312.455,00	$ 100.857.854,04	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		10/09/2024	CE 029		NOMINA	QUINCENA 16-31 AGOSTO	ROBINSON GOMEZ CORTES	1117518886	Palmeras sector 1 casa 5	3138049555	robinsongomezcortes@gmail.com	248.507,00	$ -	$ 248.507,00	$ -	$ -	$ -	$ 248.507,00	$ 100.609.347,04	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		10/09/2024	CE 030		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTES MATERIALES	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	3.510.000,00	$ -	$ 3.510.000,00	$ -	$ 35.100,00	$ -	$ 3.474.900,00	$ 97.134.447,04	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/09/2024	NC 0009		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11			46.667,11	$ -	$ 46.667,11	$ -	$ -	$ -	$ 46.667,11	$ 97.087.779,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 031		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	OSCAR LIEVANO C.	1117554547	CALLE 45 15-04 B. SINAI	3138002375	oscarcabrera20238@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 96.259.208,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 032		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTE TRITURADO	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00	$ -	$ 24.000,00	$ -	$ 2.376.000,00	$ 93.883.208,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 033		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	GUILLERMO OME JOVEN	1117491634	VDA CAMPOALEGRE	3172649707		1.657.752,00	$ -	$ 1.657.752,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.657.752,00	$ 92.225.456,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 034		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	MILLER CABRERA RIVAS	17645027	Calle 33 1ABis-09 B. Amazonia	3124879876	millercabrera201517@gmail.com	1.312.455,00	$ -	$ 1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.312.455,00	$ 90.913.001,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 035		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	YEISSON STIVEN NAVARRO M.	1119210534	CASA 32 B. 20 DE MARZO	3222832382	yeisonstivennavarromoreno@gmail.com	276123	$ -	$ 276.123,00	$ -	$ -	$ -	$ 276.123,00	$ 90.636.878,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 036		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTE CEMENTO CON CARGUE	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	700.000,00	$ -	$ 700.000,00	$ -	$ 7.000,00	$ -	$ 693.000,00	$ 89.943.878,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 037		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	RUBEN DARIO LUNA MALAMBO	1117502088	Calle 3Bis 7-23 B. Esperanza	3025431523	rubenaziuna09@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 89.115.307,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 038		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	WILLIAM GOMEZ CORTES	1117530163	Palmeras sector 1 casa 5	3115066499	williamgoco1994@gmail.com	1.483.462,00	$ -	$ 1.483.462,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.483.462,00	$ 87.631.845,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 039		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	JESUS STIVEN OSPINA	1119212041	Manzana 6 Casa 6 B. El Timy	3132520283	perezdarlolorena@gmail.com	1.215.162,00	$ -	$ 1.215.162,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.215.162,00	$ 86.416.683,93	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 040		NOMINA	QUINCENA 1-15 SEPT	ROBINSON GOMEZ CORTES	1117518886	Palmeras sector 1 casa 5	3138049555	robinsongomezcortes@gmail.com	1.296.182,00	$ -	$ 1.296.182,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.296.182,00	$ 85.120.501,93	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		17/09/2024	NC 0010		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11			136.281,31	$ -	$ 136.281,31	$ -	$ -	$ -	$ 136.281,31	$ 84.984.220,62	
							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OAC O JAC VEREDA CAMPOALEGRE	900622519	VDA CAMPOALEGRE	3214619602	omerenteria@gmail.com	28.603,52	$ -	$ 28.603,52	$ -	$ -	$ -	$ 28.603,52	$ 85.012.824,14	

Firma:
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA PARRA TORRES
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** OCTUBRE DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4346 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199.853.746,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
CE 041	1/10/2024	MILLER CABRERA RIVAS	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	1.312.455,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 042	1/10/2024	WILLIAM GOMEZ CORTES	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	1.188.293,00	$ -	$ -	$ -	1.188.293,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 043	1/10/2024	ROBINSON GOMEZ CORTES	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	1.188.293,00	$ -	$ -	$ -	1.188.293,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 044	1/10/2024	JESUS STIVEN OSPINA	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 045	1/10/2024	RUBEN DARIO LUNA MALAMBO	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 046	1/10/2024	YEISSON STIVEN NAVARRO MORENO	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 047	1/10/2024	OSCAR LIEVANO CABRERA	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 048	1/10/2024	GUILLERMO OME JOVEN	QUINCENA 16-30 SEPTIEMBRE	828.571,00	$ -	$ -	$ -	828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 049	2/10/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTES VARIOS MATERIALES	3.800.000,00	$ -	$ 38.000,00	$ -	3.762.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 050	2/10/2024	CSP ,INGENIERIA ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS	PAGO INFORME NUCLEOS, DISEÑOS DE MEZCLA Y APIQUES	1.249.500,00	$ -	$ -	$ -	1.249.500,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
NC 0011	2/10/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	235.366,56	$ -	$ -	$ -	235.366,56	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 051	7/10/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTES TRITURADO, ARENA Y CEMENTO	5.150.000,00	$ -	$ 51.500,00	$ -	5.098.500,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
NC 0012	7/10/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	29.235,22	$ -	$ -	$ -	29.235,22	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 052	16/10/2024	MILLER CABRERA RIVAS	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	1.312.455,00	$ -	$ -		1.312.455,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 053	17/09/2024	WILLIAM GOMEZ CORTES	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	1.188.293,00	$ -	$ -		1.188.293,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 054	16/10/2024	ROBINSON GOMEZ CORTES	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	1.188.293,00	$ -	$ -		1.188.293,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 055	16/10/2024	JESUS STIVEN OSPINA	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	828.571,00	$ -	$ -		828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 056	16/10/2024	RUBEN DARIO LUNA MALAMBO	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	828.571,00	$ -	$ -		828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 057	16/10/2024	YEISSON STIVEN NAVARRO MORENO	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	828.571,00	$ -	$ -		828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 058	16/10/2024	OSCAR LIEVANO CABRERA	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	828.571,00	$ -	$ -		828.571,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 059	16/10/2024	GUILLERMO OME JOVEN	QUINCENA 1-15 OCTUBRE	524.691,00	$ -	$ -		524.691,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 060	16/10/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTES TRITURADO Y OTROS	1.661.000,00	$ -	$ 16.600,00		1.644.400,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 061	16/10/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTES VARIOS MATERIALES	3.633.850,00	$ -	$ 36.350,00		3.597.500,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
NC 0013	16/10/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	148.333,08	$ -	$ -		148.333,08	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 062	21/10/2024	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	PAGO SUMINISTRO DE GRAVA DE 3/4 Y ARENA	722.000,00	$ -	$ -		722.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 063	21/10/2024	OAC VEREDA CAMPOALEGRE	ABONO SUBSIDIO TRANSPORTE RL	600.000,00	$ -	$ -		600.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 064	21/10/2024	ASOPAGOS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	1.861.400,00	$ -	$ -		1.861.400,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 065	21/10/2024	ASOPAGOS	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE	5.447.100,00	$ -	$ -		5.447.100,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
NC 0014	21/10/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	52.204,44	$ -	$ -		52.204,44	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 066	25/10/2024	OAC VEREDA CAMPOALEGRE	SALDO SUBSIDIO TRANSPORTE RL	600.000,00	$ -	$ -		600.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 067	25/10/2024	BENAVIDES DURAN POLANIA	PAGO TRANSPORTES VARIOS MATERIALES	2.700.000,00	$ -	$ 27.000,00	$ -	2.673.000,00	1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA
CE 068	25/10/2024	JHONATHAN OCASIONES HERMIDA	PAGO REVISION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	4.000.000,00	$ -	$ 160.000,00	$ -	3.840.000,00	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS
CE 069	25/10/2024	GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	COMPRA SILLAS, MESAS,PAPELERA (OBRA SOCIAL)	4.500.000,00	$ -	$ 94.538,00		4.405.462,00	2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL
NC 00015	25/10/2024	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO COMISIONES,IVA Y GMF	81.438,73	$ -	$ -	$ -	81.438,73	3	GASTOS ADMINISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento: (Que contengan el número de la cedula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 151.067.610,00	101.108.261,22	30.232.402,00	131.340.663,22	$ 19.726.946,78
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.532.028,00	$ -	4.405.462,00	4.405.462,00	$ 126.566,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00	$ 13.887.089,83	16.769.488,03	30.656.577,86	$ 13.497.732,14
	TOTALES	**$ 199.753.948**	**114.995.351,05**	**$ 51.407.352,03**	**166.402.703,08**	**$ 33.351.244,92**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **(OCTUBRE) :** 8.835,77
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 263.062,99
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: **JESUS OME RENTERIA**
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA PARRA TORRES
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 4346 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
																				85.012.824,14	saldo anterior
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 041		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	MILLER CABRERA RIVAS	17645027	Calle 33 1ABis-09 B. Amazonia	3124879876	millercabrera201517@gmail.com	1.312.455,00	$ -	$ 1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.312.455,00	$ 83.700.369,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 042		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	WILLIAM GOMEZ CORTES	1119210534	CASA 32 B. 20 DE MARZO	3222832382	williamgoco1994@gmail.com	1.188.293,00	$ -	$ 1.188.293,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.188.293,00	$ 82.512.076,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 043		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	ROBINSON GOMEZ CORTES	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	robinsongomezcortes@gmail.com	1.188.293,00	$ -	$ 1.188.293,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.188.293,00	$ 81.323.783,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 044		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	JESUS STIVEN OSPINA	1117502088	Calle 3Bis 7-23 B. Esperanza	3025431523	perezdarlolorena@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 80.495.212,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 045		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	RUBEN DARIO LUNA MALAMBO	1117530163	Palmeras sector 1 casa 5	3115066499	rubenazluna09@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 79.666.641,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 046		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	YEISSON STIVEN NAVARRO MORENO	1119212041	Manzana 6 Casa 6 B. El Timy	3132520283	yeisonstivennavarromoreno@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -		$ 828.571,00	$ 78.838.070,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 047		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	OSCAR LIEVANO CABRERA	17645027	Calle 33 1ABis-09 B. Amazonia	3124879876	oscarcabrera20238@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 78.009.499,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE 048		NOMINA	QUINCENA 16-30 SEPT	GUILLERMO OME JOVEN	1117518886	Palmeras sector 1 casa 5	3138049555		828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 77.180.928,14	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		2/10/2024	CE 049		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTES MATERIALES	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	3.800.000,00	$ -	$ 3.800.000,00	$ -	$ 38.000,00	$ -	$ 3.762.000,00	$ 73.418.928,14	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/10/2024	CE 050		CSP-119	PAGO INFORME NUCLEOS, DISEÑOS MEZCLAY APIQUES	CSP ,INGENIERIA ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS	901775247	CALLE 21A 2E-40	3124017009		1.249.500,00	$ -	$ 1.249.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.249.500,00	$ 72.169.428,14	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/10/2024	NC 0011		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11	3138002375		235.366,56	$ -	$ 235.366,56	$ -	$ -	$ -	$ 235.366,56	$ 71.934.061,58	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		7/10/2024	CE 051		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTE TRITURADO	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	5.150.000,00	$ -	$ 5.150.000,00	$ -	$ 51.500,00	$ -	$ 5.098.500,00	$ 66.835.561,58	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7/10/2024	NC 0012		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11	3138002375		29.235,22	$ -	$ 29.235,22	$ -	$ -	$ -	$ 29.235,22	$ 66.806.326,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 052		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	MILLER CABRERA RIVAS	17645027	Calle 33 1ABis-09 B. Amazonia	3124879876	millercabrera201517@gmail.com	1.312.455,00	$ -	$ 1.312.455,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.312.455,00	$ 65.493.871,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/09/2024	CE 053		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	WILLIAM GOMEZ CORTES	1119210534	CASA 32 B. 20 DE MARZO	3222832382	williamgoco1994@gmail.com	1.188.293,00	$ -	$ 1.188.293,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.188.293,00	$ 64.305.578,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 054		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	ROBINSON GOMEZ CORTES	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	robinsongomezcortes@gmail.com	1.188.293,00	$ -	$ 1.188.293,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.188.293,00	$ 63.117.285,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 055		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	JESUS STIVEN OSPINA	1117502088	Calle 3Bis 7-23 B. Esperanza	3025431523	perezdarlolorena@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 62.288.714,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 056		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	RUBEN DARIO LUNA MALAMBO	1117530163	Palmeras sector 1 casa 5	3115066499	rubenazluna09@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 61.460.143,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 057		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	YEISSON STIVEN NAVARRO MORENO	1119212041	Manzana 6 Casa 6 B. El Timy	3132520283	yeisonstivennavarromoreno@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 60.631.572,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 058		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	OSCAR LIEVANO C.	1117554547	CALLE 45 15-04 B. SINAI	3138002375	oscarcabrera20238@gmail.com	828.571,00	$ -	$ 828.571,00	$ -	$ -	$ -	$ 828.571,00	$ 59.803.001,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 059		NOMINA	QUINCENA 1-15 OCT	GUILLERMO OME JOVEN	1117491634	VDA CAMPOALEGRE	3172649707		524.691,00	$ -	$ 524.691,00	$ -	$ -	$ -	$ 524.691,00	$ 59.278.310,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 060		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTE TRITURADO Y OTROS	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	1.661.000,00	$ -	$ 1.661.000,00	$ -	$ 16.600,00	$ -	$ 1.644.400,00	$ 57.633.910,36	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE 061		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTE MATERIALES VARIOS	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	3.633.850,00	$ -	$ 3.633.850,00	$ -	$ 36.350,00	$ -	$ 3.597.500,00	$ 54.036.410,36	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	NC 0013		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11	3138002375		148.333,08	$ -	$ 148.333,08	$ -	$ -	$ -	$ 148.333,08	$ 53.888.077,28	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE 062			PAGO UN VIAJE GRAVA 3/4 Y ARENA	DANIEL ALBERTO GONZALEZ ARCILA	107537530	MORELIA	3212759901	contabilidadmultilago@gmail.com	722.000,00	$ -	$ 722.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 722.000,00	$ 53.166.077,28	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		21/10/2024	CE 063			ABONO SUBSIDIO RL	OAC VEREDA CAMPOALEGRE	900622519	VDA CAMPOALEGRE	3214619602	omerenteria@gmail.com	600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ 52.566.077,28	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE 064		PLANILLA 31294572	PAGO SSGS AGO	ASOPAGOS	900.319.291	CALLE 66 7 - 18, Piso 3	4074000	servicioalcliente@asopagos.c	1.861.400,00	$ -	$ 1.861.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.861.400,00	$ 50.704.677,28	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE 065		PLANILLA 31294631	PAGO SSGS SEPT	ASOPAGOS	900.319.291	CALLE 66 7 - 18, Piso 3	4074000	servicioalcliente@asopagos.c	5.447.100,00	$ -	$ 5.447.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.447.100,00	$ 45.257.577,28	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		21/10/2024	NC 0014		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11	3138002375		52.204,44	$ -	$ 52.204,44	$ -	$ -	$ -	$ 52.204,44	$ 45.205.372,84	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25/10/2024	CE 066			SALDO SUBSIDIO RL	OAC VEREDA CAMPOALEGRE	900622519	VDA CAMPOALEGRE	3214619602	omerenteria@gmail.com	600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ 44.605.372,84	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		25/10/2024	CE 067		CTA COBRO	PAGO TRANSPORTE MATERIALES VARIOS	BENAVIDES DURAN POLANIA	1012402533	CALLE 33 40-60	3133819962	benavidesduranpolania@gmail.com	2.700.000,00	$ -	$ 2.700.000,00	$ -	$ 27.000,00	$ -	$ 2.673.000,00	$ 41.932.372,84	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25/10/2024	CE 068		CTA COBRO	PAGO REVISON, AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	JHONATHAN OCASIONES HERMIDA	7728586	CARRERA 19 1DBIS-27	3155392435	ing.ocasiones@gmail.com	4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ 160.000,00	$ -	$ 3.840.000,00	$ 38.092.372,84	
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL		25/10/2024	CE 069		fe 006071	COMPRA SILLAS,MESAS, OBRA SOCIAL	GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	12225611	CALLE 17 9-02	3174923519	distritodo@hotmail.com	4.500.000,00	$ -	$ 4.500.000,00	$ -	$ 94.538,00	$ -	$ 4.405.462,00	$ 33.686.910,84	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		25/10/2024	NC 00015		DSCTO AUTOMATIC	PAGO COMISIONES, IVA Y GMF	BANCO DE OCCIDENTE	890300279	CALLE 15 44-11	3138002375		81.438,73	$ -	$ 81.438,73	$ -	$ -	$ -	$ 81.438,73	$ 33.605.472,11	
							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	OAC O JAC VEREDA CAMPOALEGRE	900622519	VDA CAMPOALEGRE	3214619602	omerenteria@gmail.com	8.835,79	$ -	$ 8.835,79	$ -	$ -	$ -	$ 8.835,79	$ 33.614.307,90	

Firma: Jesus Ome
Nombre: JESUS OME RENTERIA
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: SANDRA PATRICIA PARRA TORRES
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 118739-T

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: MANUEL ALFONSO GALLO SANTOFIMIO
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-284715 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda
Los Aletones – CS#4318

CONVENIO SOLIDARIO No. 4318-2023

BENITO OME MUÑOZ
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LOS ALETONES

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP - 6 OCT)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	**0,00**																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 209.706,00	$ 104.853,00	$ 104.853,00														**$ 209.706,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 4.769.706,00				$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60	$ 476.970,60			**$ 4.769.706,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 30.687.601,00			$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20	$ 6.137.520,20									**$ 30.687.601,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 69.792.652,00					$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11	$ 7.754.739,11			**$ 69.792.652,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 15.967.057,00						$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13	$ 1.995.882,13			**$ 15.967.057,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 26.333.390,00			$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00	$ 2.633.339,00				**$ 26.333.390,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.432.803,00													$ 1.773.121,20	$ 1.773.121,20	$ 886.560,60	**$ 4.432.803,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.185.683,00		$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	$ 3.156.120,21	**$ 44.185.683,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 196.378.598,00	**$ 104.853,00**	**$ 3.260.973,21**	**$ 11.926.979,41**	**$ 12.403.950,01**	**$ 20.158.689,13**	**$ 22.154.571,25**	**$ 22.154.571,25**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 16.017.051,05**	**$ 15.156.833,25**	**$ 4.929.241,41**	**$ 4.042.680,81**	**$ 196.378.598,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,053%	1,661%	6,073%	6,316%	10,265%	11,282%	11,282%	8,156%	8,156%	8,156%	8,156%	8,156%	7,718%	2,510%	2,059%	100,000%
	ACUMULADO	0,053%	1,714%	7,787%	14,103%	24,368%	35,650%	46,932%	55,088%	63,244%	71,400%	79,556%	87,712%	95,430%	97,940%	100,000%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,607%	1,607%	1,607%	1,607%	1,607%	19,576%	6,828%	2,369%	9,750%	11,631%	8,159%	12,915%	10,468%	10,268%	100,000%
	ACUMULADO	0,000%	1,607%	3,214%	4,821%	6,429%	8,036%	27,612%	34,440%	36,809%	46,559%	58,190%	66,349%	79,264%	89,732%	100,000%	

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de Asojuntas
Belén de los Andaquies – CS#4045

CONVENIO SOLIDARIO No. 4045-2023

LUIS ELVER CANTILLO PATIÑO
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	PROGRAMACIÓN FINANCIERA															
			SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP - 6 OCT)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 783.252,00	$ 391.626,00	$ 391.626,00														**$ 783.252,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 178.577,00	$ 89.288,50	$ 89.288,50														**$ 178.577,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 7.274.043,00			$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60	$ 1.454.808,60									**$ 7.274.043,00**
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	$ 3.830.081,00			$ 766.016,20	$ 766.016,20	$ 766.016,20	$ 766.016,20	$ 766.016,20									**$ 3.830.081,00**
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 0,00	$ 0,00															**$ 0,00**
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	$ 13.585.372,00				$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43	$ 1.940.767,43						**$ 13.585.372,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 55.020.253,00				$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44	$ 6.113.361,44				**$ 55.020.253,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 MPA	$ 26.776.050,00			$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00	$ 2.677.605,00				**$ 26.776.050,00**
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 11.594.624,00				$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40	$ 1.159.462,40			**$ 11.594.624,00**
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 19.897.170,00				$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00	$ 3.979.434,00								**$ 19.897.170,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.168.183,00													$ 1.667.273,20	$ 1.667.273,20	$ 833.636,60	**$ 4.168.183,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.064.195,00		$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	$ 3.004.585,36	**$ 42.064.195,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 185.171.800,00	**$ 480.914,50**	**$ 3.485.499,86**	**$ 7.903.015,16**	**$ 21.096.040,43**	**$ 21.096.040,43**	**$ 21.096.040,43**	**$ 21.096.040,43**	**$ 18.875.215,63**	**$ 14.895.781,63**	**$ 14.895.781,63**	**$ 12.955.014,20**	**$ 12.955.014,20**	**$ 5.831.320,96**	**$ 4.671.858,56**	**$ 3.838.221,96**	**$ 185.171.800,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,260%	1,882%	4,268%	11,393%	11,393%	11,393%	11,393%	10,193%	8,044%	8,044%	6,996%	6,996%	3,149%	2,523%	2,073%	100,000%
	ACUMULADO	0,260%	2,142%	6,410%	17,803%	29,196%	40,589%	51,982%	62,175%	70,219%	78,263%	85,259%	92,255%	95,404%	97,927%	100,000%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,754%	7,277%	6,020%	18,177%	2,010%	15,046%	6,351%	7,203%	7,995%	10,849%	10,198%	2,523%	2,523%	2,523%	100,000%
	ACUMULADO	0,000%	1,754%	9,031%	15,051%	33,228%	35,239%	50,285%	56,636%	63,839%	71,834%	82,683%	92,881%	95,404%	97,927%	100,000%	

ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Campoalegre – CS#4346

CONVENIO SOLIDARIO No. 4346-2023

JESUS OME RENTERIA
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP - 06 OCT)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 397.626,00		$ 397.626,00														**$ 397.626,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 176.561,00	$ 88.280,50	$ 88.280,50														**$ 176.561,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 96.764,00				$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40	$ 9.676,40			**$ 96.764,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 14.577.978,00			$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60	$ 2.915.595,60									**$ 14.577.978,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 64.597.841,00					$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89	$ 7.177.537,89			**$ 64.597.841,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 14.462.812,00						$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50	$ 1.807.851,50			**$ 14.462.812,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.169.906,00			$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60	$ 2.416.990,60				**$ 24.169.906,00**
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 1.585.458,00			$ 792.729,00	$ 792.729,00												**$ 1.585.458,00**
600.2.1	EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO	$ 17.417,00			$ 8.708,50	$ 8.708,50												**$ 17.417,00**
201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	$ 543.802,00			$ 543.802,00													**$ 543.802,00**
630.1.6	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA (F) MEZCLA IN SITU	$ 8.752.080,00				$ 4.376.040,00	$ 4.376.040,00											**$ 8.752.080,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 11.550.194,00				$ 3.850.064,67	$ 3.850.064,67	$ 3.850.064,67										**$ 11.550.194,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 MPA	$ 6.293.910,00			$ 2.097.970,00	$ 2.097.970,00	$ 2.097.970,00											**$ 6.293.910,00**
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	$ 487.867,00							$ 487.867,00									**$ 487.867,00**
661.1	TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 3.357.394,00				$ 3.357.394,00												**$ 3.357.394,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.532.028,00													$ 1.812.811,20	$ 1.812.811,20	$ 906.405,60	**$ 4.532.028,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.154.310,00		$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	$ 3.153.879,29	**$ 44.154.310,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 199.753.948,00	**$ 88.280,50**	**$ 3.639.785,79**	**$ 11.929.674,99**	**$ 22.979.048,05**	**$ 25.997.754,44**	**$ 21.331.595,94**	**$ 17.969.398,27**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 14.565.935,67**	**$ 13.961.756,27**	**$ 4.966.690,49**	**$ 4.060.284,89**	**$ 199.753.948,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,044%	1,822%	5,972%	11,504%	13,015%	10,679%	8,996%	7,292%	7,292%	7,292%	7,292%	7,292%	6,989%	2,486%	2,033%	100,000%
	ACUMULADO	0,044%	1,866%	7,838%	19,342%	32,357%	43,036%	52,032%	59,324%	66,616%	73,908%	81,200%	88,492%	95,481%	97,967%	100,000%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	1,579%	15,702%	6,502%	16,116%	16,539%	16,474%	16,035%	100,000%
	ACUMULADO	0,000%	1,579%	3,158%	4,737%	6,316%	7,895%	9,474%	11,053%	12,632%	28,334%	34,836%	50,952%	67,491%	83,965%	100,000%	

ANEXO 8.14.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4879 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONTRATO DE OBRA No. 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALETONES

CONTRATO DE OBRA No. 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONTRATO DE OBRA No. 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMPOALEGRE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIIONETA	MITSUBISHI DOBLE CABINA CON PLACA DE MATRICULA (**HQX980**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
MOTOCICLETA	YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA DE MATRICULA (**NSI18G**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

CAMIONETA: **MARCA:** MITSUBISHI **CILINDRAJE:** 2477 CC **MODELO:** 2015


MOTOCICLETA: **MARCA**: YAMAHA **CILINDRAJE:** 149 CC **MODELO:** 2024

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012318750

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HQX980	MITSUBISHI	L 200 2.5L	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.477	PLATA COOL	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NUMERO DE MOTOR	RL	VIN
4D56UCET7305	N	MMBJNKB40FD000188

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	MMBJNKB40FD000188	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID — C.C. 7692245

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	134

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
882014000090224	I	11/07/2014	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/07/2014	16/08/2016	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE IBAGUE



LT02004137760

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029905008

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NSI18G	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E105381	N	9FKDG3619R2105381

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3619R2105381	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GALLEGO CALDERON DIEGO FERNANDO	C.C. 1006524418

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
900230000136079

I/E
I

FECHA IMPORT.
24/08/2023

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
31/08/2023

FECHA EXP. LIC. TTO.
31/08/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE DPTAL CAQUETA/BELEN DE LOS ANDAQUIES

LT0700252241 6

Powered by CamScanner

ANEXO 8.15.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/11/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **PERIODO MES:** 01/10/2024 AL 31/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVIN RAMOS MOSQUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No: 4318 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES

CONVENIO SOLIDARIO No: 4045 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

CONVENIO SOLIDARIO No: 4346 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	DIEGO FERNANDO GALLEGO CALDERON	1.006.524.418	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 4.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	ASMET SALUD	31506284	$ 52.000,00	PORVENIR	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
2	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	7.682.245	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.650.000,00	X	X						X	X						X	X					X	X					X	X			33%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 4.060.000,00	$ 282.600,00	V	SANITAS	31199719	$ 507.500,00	COLPENSIONES	31199719	$ 649.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
3	INGRID YULIETH MEJIA PEÑA	1.117.505.206	PROFESIONAL SOCIAL	$ 924.000,00	X	X						X	X	X					X	X	X				X	X	X					X	X			44%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	31506284	$ 52.000,00	PORVENIR	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
4	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	1.118.027.920	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 924.000,00	X	X						X	X	X					X	X	X				X	X	X					X	X			44%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	ASMET SALUD	31506284	$ 52.000,00	COLPENSIONES	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
5	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	1.117.492.838	PROFESIONAL SISO	$ 924.000,00	X	X						X	X	X					X	X	X				X	X	X					X	X			44%	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	31506284	$ 52.000,00	PORVENIR	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	
6																																																
7																																																	
8																																																
9																																																
10																																																
11																																																
12																																																
13																																																
14																																																
15																																																
16																																																
17																																																
18																																																

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES $ 8.422.000,00

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/11/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.16.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 4318 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 4045 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 4346 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA
ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE - MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1409123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 106.174.537,00	$ 29.370.638,71
TOTAL						$ 106.174.537,00	$ 29.370.638,71

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 106.174.537,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	26/12/2023 - 28/12/2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 106.174.537,00	$ 106.174.537,00		
2	31/03/2024 - 30/04/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 106.174.537,00	$ 106.174.537,00		
3	may-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 106.174.537,00	$ 106.174.537,00		
4	jun-24	$ 15.675.555,00	$ 2.978.355,45	$ 18.653.910,45	$ -	$ 18.653.910,45	$ -		$ 87.520.626,55	$ 87.520.626,55		
5	jul-24	$ 24.467.315,00	$ 4.648.789,85	$ 29.116.104,85	$ -	$ 29.116.104,85	$ -		$ 58.404.521,70	$ 58.404.521,70		
6	ago-24	$ 24.398.221,00	$ 4.635.661,99	$ 29.033.882,99	$ -	$ 29.033.882,99	$ -		$ 29.370.638,71	$ 29.370.638,71		
7	sep-24	$ 24.485.920,00	$ 4.652.324,80	$ 29.138.244,80	$ -	$ 29.138.244,80	$ -		$ 232.393,91	$ 232.393,91		
TOTALES		**$ 89.027.011,00**	**$ 16.915.132,09**	**$ 105.942.143,09**	$ -	**$ 105.942.143,09**	$ -		**$ 232.393,91**	**$ 232.393,91**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 89.222.300,00		$ 89.222.300,00
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 16.952.237,00	$ 16.952.237,00
VALOR TOTAL	$ 89.222.300,00	$ 16.952.237,00	$ 106.174.537,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202 61820 CAU 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.17.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

FECHA DE INICIO: 26-dic-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15-nov-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 106.174.537,00

VALOR ACUMULADO: $ 106.174.537,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	7/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	7/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	7/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11-dic-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	26/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	26/01/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	26/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/11/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/05/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/11/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/07/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/01/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/09/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.234.907,40	7/12/2023	3/12/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	7/12/2023	3/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.617.453,70	26/09/2024	20/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20%	$ 21.234.907,40	26/09/2024	20/12/2027
Calidad del servicio	30%	$ 10.617.453,70	26/09/2024	20/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CT-100003506

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30-sep-24

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	de 1
FECHA	03/10/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTI SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4879

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES Y MORELIA DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO # 4045 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 4318 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 4346 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 7,70 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 106.174.537,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 106.174.537,00

ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA
ONTRATIST JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES – MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETA
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPO ALEGRE - MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _1_ de fecha _26 / 06 / 2024_		AÑO 2024																		TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		OCT		NOV		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
1	1	Director de Interventoría	5.000.000,00		0,50	2.500.000,00			1,32	$ 6.600.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,33	$ 1.650.000,00	0,17	$ 825.000,00			1,82	$ 9.075.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			4,00	$ 16.000.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	0,50	$ 2.000.000,00			5,50	$ 22.000.000,00
3	1	Profesional ambiental	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,33	$ 924.000,00	0,17	$ 462.000,00			1,82	$ 5.082.000,00
4	1	Profesional social	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,33	$ 924.000,00	0,17	$ 462.000,00			1,82	$ 5.082.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.000.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
	1	Especialista en Estructuras	5.500.000,00																													
	1	Especialista en Vía y/o Pavimentos	5.500.000,00																													
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.500.000,00																													
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.500.000,00																													
	1	Especialista en diseño Geométrico	5.500.000,00																													
6	1	Inspector	1.200.000,00		6,00	7.200.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
7	1	Inspector SST	1.200.000,00		0,50	600.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		NO PREVISTOS																														
8	1	Profesional SST	2.800.000,00		-	-			1,32	$ 3.696.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,44	$ 1.232.000,00	0,33	$ 924.000,00	0,17	$ 462.000,00			1,82	$ 5.082.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						31.540.000,00				$ 33.688.000,00				$ -		$ -		$ 5.650.000,00		$ 9.346.000,00		$ 9.346.000,00		$ 9.346.000,00		$ 8.422.000,00		$ 4.211.000,00				$ 46.321.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						74.434.400,00				$ 79.503.680,00				$ -		$ -		$ 13.334.000,00		$ 22.056.560,00		$ 22.056.560,00		$ 22.056.560,00		$ 19.875.920,00		$ 9.937.960,00				$ 109.317.560,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024																		TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		OCT		NOV		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
9	1	Viáticos Director y/o Especialistas	140.000,00	Día	4,00	560.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
10	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en	550.000,00	Mes	12,00	6.600.000,00			4,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	0,50	$ 275.000,00			5,50	$ 3.025.000,00
11	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equip	2.800.000,00	Según compro	2,00	5.600.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
12	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos	300.000,00	Según compro	3,00	900.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		OTROS COSTOS																														
13	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pea	176.200,00	Según compro	2,00	352.400,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
14	1	Edición de informes, papelería, reproducción d	80.000,00	Según compro	3,00	240.000,00			4,00	$ 320.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00	0,50	$ 40.000,00			5,50	$ 440.000,00
15	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,c	140.000,00	Según compro	3,00	420.000,00			4,00	$ 560.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00	0,50	$ 70.000,00			5,50	$ 770.000,00
16	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500,00	Según compro	3,00	115.500,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		NO PREVISTOS																														
17	1	Costos de alquiler de Equipo -Vehiculo mayor	4.229.257,00	Mes	-	-			1,32	$ 5.582.619,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75	0,33	$ 1.395.654,75	0,16	$ 697.827,37			1,81	$ 7.676.101,12
18	1	Oficina (incluye servicios públicos)	800.000,00	Mes	-	-			1,32	$ 1.056.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00	0,33	$ 264.000,00	0,17	$ 132.000,00			1,82	$ 1.452.000,00
19	1	AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 1,00																						
*		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				14.787.900,00				$ 9.718.620,00				$ -		$ -		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75		$ 2.429.654,75		$ 1.214.827,37				$ 13.363.101,12
*		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				89.222.300,00				$ 89.222.300,00				$ -		$ -		$ 15.763.654,75		$ 24.486.214,75		$ 24.486.214,75		$ 24.486.214,75		$ 22.305.574,75		$ 11.152.787,37				$ 122.680.661,12
*		IVA = 19% * (C) = (D)				16.952.237,00				$ 16.952.237,00				$ -		$ -		$ 2.995.094,00		$ 4.652.381,00		$ 4.652.381,00		$ 4.652.381,00		$ 4.238.059,00		$ 2.119.030,00				$ 23.309.325,61
*		COSTO TOTAL = (C) + (D)				106.174.537,00				$ 106.174.537,00				$ -		$ -		$ 18.758.748,75		$ 29.138.595,75		$ 29.138.595,75		$ 29.138.595,75		$ 26.543.633,75		$ 13.271.817,37				$ 145.989.986,73

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por necesidades en la ejecución del contrato se hace necesario la modificación de la dedicación de los profesionales vinculados al proyecto.

Ya que el objeto de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra y/o las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente y velando por la correcta ejecución de los trabajos, fue necesario prorrogar el plazo contractual de los convenios solidarios y en consecuencia prorrogar el plazo de la Interventoría en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.

Como se evidencia en el formato "MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS" de fecha 26/junio/2024, los recursos del contrato de interventoría de la referencia han sido distribuidos hasta el 30/septiembre/2024, es decir, se hace necesario la adición de recursos al contrato de interventoría de la referencia, para el correcto cumplimiento de sus funciones y/o obligaciones hasta el 15/noviembre/2024.

Las causas que justifican esta solicitud de adición son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
