CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 - 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"



INFORME FINAL TÉCNICO MENSUAL
PERIODO: DEL 31 DE MARZO 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

SUPERVISOR:

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS SOLIDARIOS:

3379 DE 2023 – OAC LA ESMERALDA
3441 DE 2023 – OAC BAJO PLATANILLO
3760 DE 2023 – OAC BUENOS AIRES BAJOS

PERIODO:

DEL 31 DE MARZO 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024

FLORENCIA – CAQUETÁ

RESPONSABLES DE ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO



<table>
<tr><td>Tipo de Documento:

INFORME TÉCNICO</td><td colspan="2" rowspan="3">Contrato:

ACEPTACIÓN DE OFERTA 4136 DE 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”</td></tr>
<tr><td>Titulo:

INFORME FINAL.
NOVIEMBRE/2024</td></tr>
<tr><td>Emitido para:

Aprobación</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ELABORÓ:
Ing. Residente</td><td>Firma:</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre:</td><td>Ing. Cesar Augusto Galindez García
C. C. No. 1.110.521.985 de IBAGUÉ
M P No. 70202 393111 TLM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REVISÓ:
Ing. Director</td><td>Firma:</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre:</td><td>Ing. Elkin David Ramos Mosquera
C. C. No. 7.692.245 de NEIVA
M P No. 19202 61820 CAU</td></tr>
<tr><td rowspan="2">APROBÓ:
Supervisor</td><td>Firma:</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre:</td><td>José Ricardo Burbano Barcenas</td></tr>
</table>

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-1*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3379 DE 2023
3441 DE 2023
3760 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

Contrato de Interventoría No. 4136 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 8

MES O PERIODO: OCTUBRE DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	4
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	7
	CONTENIDO		14
1	**INTRODUCCIÓN**		20
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		23
2.1	Localización		23
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		30
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		30
2.4	Características técnicas del proyecto		32
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		37
3.1	Información general de convenios solidarios		37
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		49
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		53
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		53
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS**		56
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	56
4.2	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	57
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	57
4.4	Informe Financiero y Presupuestal de convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	58
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	58
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	58
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros de los convenios solidarios	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	59
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad de convenios solidarios	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	59
4.9	Otros documentos de seguimientos mensual		60
	• Seguimiento a la inversión del desembolso		60
	• Seguimiento programa de obra		60
4.10	• Actas de comité de obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	63
4.11	• Actas de reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	63
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		64
5.1	Información general del contrato		64
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		68
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		69
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	69
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	69
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	69
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	69
6.5	Otros documentos seguimiento mensual		69
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	69
7	**Conclusiones y recomendaciones**		70
8	**Anexos**		71
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		71
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		71
8.3	Copia de la bitácora de obra del mes correspondiente del convenio solidario		71
8.4	Informes semanales		71
8.5	Maquinaria y Equipo de convenios solidarios		71
8.6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social de convenios solidarios		72
8.7	Informe Financiero y presupuestal de convenios solidarios		72
8.8	Estado general del tiempo		72

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenios Solidarios No.: 3379 DE 2023
3441 DE 2023
3760 DE 2023

Contratista 1: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA
Contratista 2: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO
Contratista 3: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

Contrato de Interventoría No. 4136 DE 2023

Interventor: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Objeto Contrato de Interventoría:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 8

MES O PERIODO: OCTUBRE DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
8.9	Resumen ensayos de laboratorio		72
8.10	Seguimiento garantías y seguros de los convenios solidarios		72
8.11	Plan de inversión de desembolso de los convenios solidarios		73
8.12	Informe de inversión y buen manejo de desembolso de los convenios solidarios		73
8.13	Seguimiento programa de obra		73
8.14	Actas de comité de obra		73
8.15	Equipo y vehículos contrato de interventoría		73
8.16	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social contrato de interventoría		73
8.17	Informe Financiero y presupuestal de contrato de interventoría		73
8.18	Seguimiento garantías y seguros de los contrato de interventoría		73
8.19	Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado		74

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3230 de fecha 15/09/2023.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(**VER A CONTINUACIÓN FORMATO:** *MEPI-MN1-IN-15-FR-2*)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	98
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	105	105
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854,00	-	$ 149.372.854,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	-	$ 44.147.531,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186,00	-	$ 4.481.186,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571,00	-	$ 198.001.571,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.001.571,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.001.571,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,000%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de placa huella terminada, abscisa k0+060



Vista general de placa huella terminada, abscisa k0+080

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	109
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	43	119
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 149.372.854,00	-	$ 149.372.854,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00	-	$ 44.147.531,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.481.186,00	-	$ 4.481.186,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 198.001.571,00	-	$ 198.001.571,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 198.001.571,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 198.001.571,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,000%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**3**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 199.001.571,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 199.001.571,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de placa huella terminada, abscisa k0+058



Vista general de placa huella terminada, abscisa k0+000

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	29 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REANUDACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.663.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.663.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	98
Estructuras (Obras de drenaje)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación (Placa huella)	Construcción	mL	43	98
Estructuras (Obras de drenaje)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 150.980.064,00	-	$ 150.980.064,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	-	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.153.960,00	-	$ 44.153.960,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 4.529.402,00	-	$ 4.529.402,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.663.426,00	-	$ 199.663.426,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	-	-	-	-
AJUSTES	-	-	-	-
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	-	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-	-
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	-	-	-	-
VALOR EJECUTADO	-	-	-	-

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 199.663.426,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.663.426,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,000%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**9**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PERIODO MES: 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	29 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REANUDACIÓN 02:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.663.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.663.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4136 DE 2023

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vista general de placa huella terminada, abscisa k 0+060



Vista general de placa huella terminada, abscisa k 0+050

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 19202 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN **20**

ANTECEDENTES **22**

FINALIDAD DEL PROYECTO **22**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **23**

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL **23**

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS **23**

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO **30**

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA **30**

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 – LA ESMERALDA **30**

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 – BAJO PLATANILLO **31**

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 – BUENOS AIRES BAJO 32

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS **32**

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS **37**

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **37**

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023** **37**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023** **41**
- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023** **45**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES **49**

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS **52**

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA **52**

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **54**

4.1. INFORME SEMANAL **54**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS **54**

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS **55**

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS **55**

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **56**

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO **56**

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **57**

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS **57**

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL **57**

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** **58**
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA** **58**

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **60**

4.11. ACTAS DE REUNIÓN **61**

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA **62**

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO **62**

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR **66**

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **67**

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **67**

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **67**

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA **67**

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **67**

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL **67**

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO** **67**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **68**

8. ANEXOS.....69

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO 69

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379.....69

8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 69

8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 69

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS ..69

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379.....69

8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 69

8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 69

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO 69

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 69

8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 69

8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 69

8.4. INFORMES SEMANALES.....69

8.4.1. Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379.....69

8.4.2. Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 69

8.4.3. Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 69

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....69

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ...69

8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 .69

8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 69

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS.....70

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 70

8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 70

8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 70

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS 70

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 70

8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.....70

8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379.....70

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....70

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379.....70

8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441.....70

8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379.....70

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 70

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 70

8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **70**

8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **70**

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **70**

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **70**

8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **70**

8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **70**

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **71**

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **71**

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **71**

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **71**

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS **71**

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **71**

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **71**

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **71**

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA **71**

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **71**

8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **71**

8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **71**

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA **71**

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379 ..... **71**

8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441 ..... **71**

8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379 ..... **71**

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA **71**

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **71**

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **71**

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA **71**

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO **72**

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- ha estructurado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretende intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios.

En este informe se presenta a consideración del **INVIAS, EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA** correspondiente al periodo comprendido entre el **31 DE MARZO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024** el cual incluye la información técnica, administrativa, financiera presupuestal, jurídica, ambiental y social correspondiente a los avances de las actividades contratadas, la interventoría cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL""**, hace referencia a las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos, especificaciones técnicas y administrativas de los siguientes convenios:

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor HERNÁN SANCHEZ HUERTAS de la JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS de la JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

- ✓ **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023**, y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE

CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", encabezada por el señor GEAN CARLOS TAPIERO MONGE de la JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO, en calidad de presidente y Rep. Legal del convenio.

ANTECEDENTES

La economía de los municipios de La Montañita y de Milán en el departamento del Caquetá, está basada principalmente por la agricultura y la ganadería de doble propósito (leche y carne), complementada con la piscicultura, la apicultura, la coca y aprovechamientos forestales.

Debido al aumento del número de fincas y de la densidad poblacional de las veredas de los municipios, las trochas son intervenidas con maquinaria pesada (motoniveladora) para mejorarlas y, así facilitar el transporte de los lugareños. Las vías adecuadas también son utilizadas para movilizar ganado, productos lácteos (leche y queso) y de agricultura (caña de azúcar, plátanos, etc.).

A los municipios de La Montañita y de Milán, se acede por la ruta troncal del llano, en la vía que conduce desde Bogotá a Florencia, Caquetá, siendo prestado sus servicios por la empresa Coomotor por vía terrestre, además de su vecina, se accede por Villavicencio en el vecino departamento del Meta en el norte, Mitú (Vaupés) al este y Leticia (Amazonas) en el sur.

FINALIDAD DEL PROYECTO

Involucrar a las comunidades rurales en la planificación, implementación, seguimiento y sostenibilidad de cualquier tipo de proyecto, especialmente, proyectos de baja complejidad de infraestructura vial en vías terciarias, para contribuir con la transformación de vidas de los campesinos, mejorando la transitabilidad de las vías regionales. Los convenios de Caminos Comunitarios de la Paz Total fortalecen la participación de las comunidades en el manejo de los recursos, en la ejecución, vigilancia y calidad de las obras de mejoramiento de sus propios caminos, impulsando el campo colombiano y entre todos, construyendo ciudadanía para ser parte de una sociedad más igualitaria y garante de derechos. Esta metodología se basa en la premisa de que las comunidades deben ser en gran medida las responsables de su propio desarrollo y debe gestionar y participar activamente en todas las acciones que se adelantan en sus territorios por parte de los entes territoriales y entidades gubernamentales, para asegurar que sus problemas y necesidades sean solucionadas adecuadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

El Departamento del Caquetá se localiza en el Sur-Oriente de Colombia, haciendo parte de la región Amazónica. Cuenta con una superficie 88.965 km2, lo que representa el 7.79% del territorio nacional y su capital es la ciudad de Florencia. El departamento está dividido políticamente en 16 municipios, dos de ellos son los municipios de La Montañita y Milán en donde se ejecutarán las obras viales tipo terciarias.

Para el caso del municipio de La Montañita se encuentra localizada al sur – oriente de Colombia, situado al Occidente del departamento de Caquetá, a una distancia de 32 km de Florencia, capital departamental. entre las coordenadas: Latitud: 1º 28’ 53” N y Longitud: 75° 26’ 23” W con respecto al meridiano de Greenwich. Altitud de la cabecera municipal: 237 metros sobre el nivel del mar. El territorio municipal comprende una extensión en superficie de 184.042.22 Hectáreas (1.840,42 Km2), perteneciendo casi todo al sector rural. De acuerdo con las proyecciones DANE 2019, la población para el Municipio de La Montañita presenta un total de 24.323, de los cuales 11.797 son mujeres, representando un 48,5% y 12.526 son hombres con un 51,4%.

Y en cuanto al municipio de Milán se encuentra ubicado en la región de la amazonia colombiana, con predominio de terrenos semi- ondulados y llanuras de inundación. La principal fuente hídrica es el rio Orteguaza con sus afluentes el rio Bodoquero y Pescado, las quebradas de Platanillo y Getuchá. El Municipio de Milán se localiza en las coordenadas 1°17’25” de latitud norte y 75°30’25” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich en el parque principal. Se encuentra a una distancia de 80 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Florencia Capital del Departamento del Caquetá por vía terrestre y a 47 kilómetros por vía fluvial a través de río Orteguaza.

Por lo que en el municipio de Milán se ejecutará una obra en la Vereda de Bajo Platanillo y en el municipio de La Montañita se ejecutarán dos proyectos ubicados en las Veredas de La Esmeralda y en Buenos Aires Bajo.

2.1.1. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS

- *VEREDA LA ESMERALDA (CS # 3379 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La montañita del departamento del Caquetá, en la Vereda La Esmeralda, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda La Esmeralda de la

inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La esmeralda – La montañita código: 181050, con coordenadas iniciales 1,21556 N; -75,12500 W, y punto final de coordenadas 1,21528 N; -75,12611 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExTjZhMmNXeUhocDVROEZma295cFJhekxsRGxxRW5nemsSFgoUMEYzRUFFODU2RTMxQjk0NTZBOEIgAQ

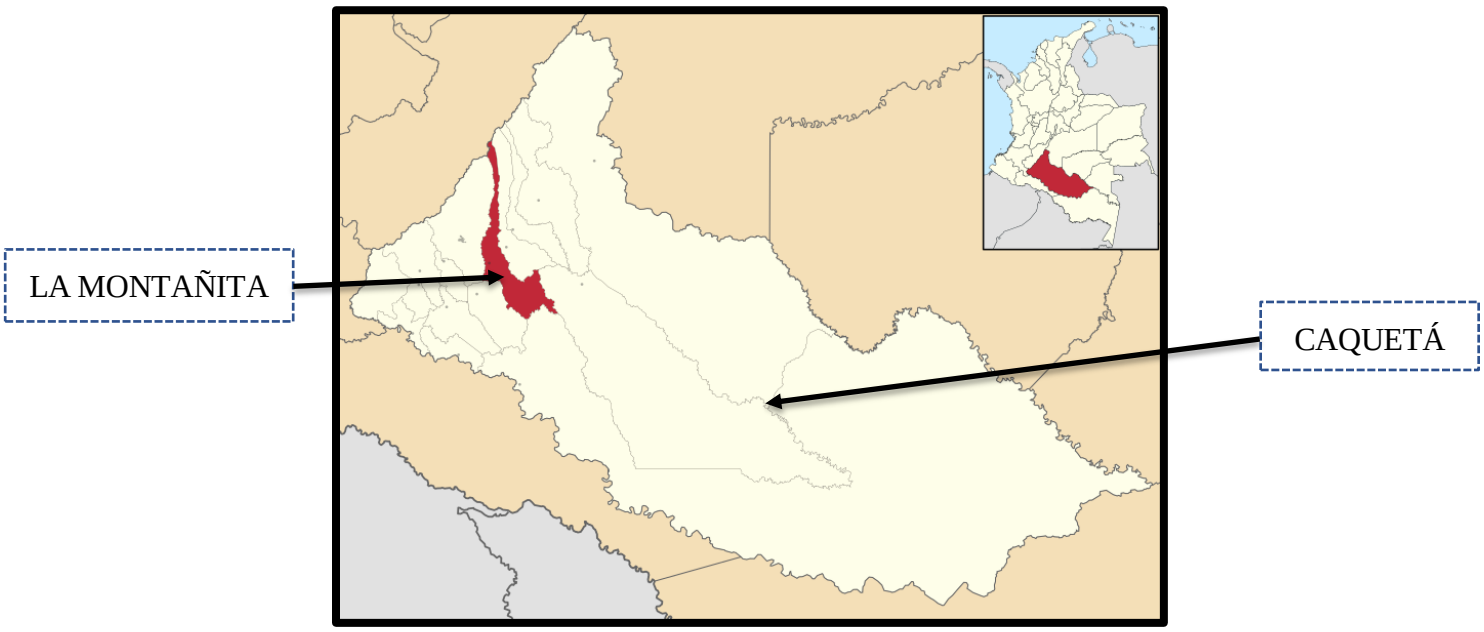


Ilustración 1. *Localización municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá.*

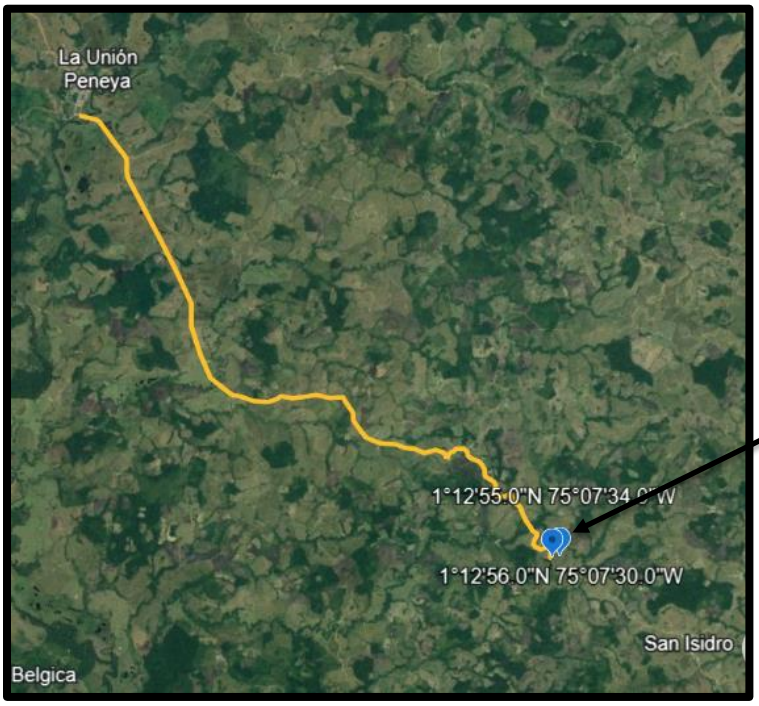


Ilustración 2. *Ubicación del proyecto en la Vereda La Esmeralda.*

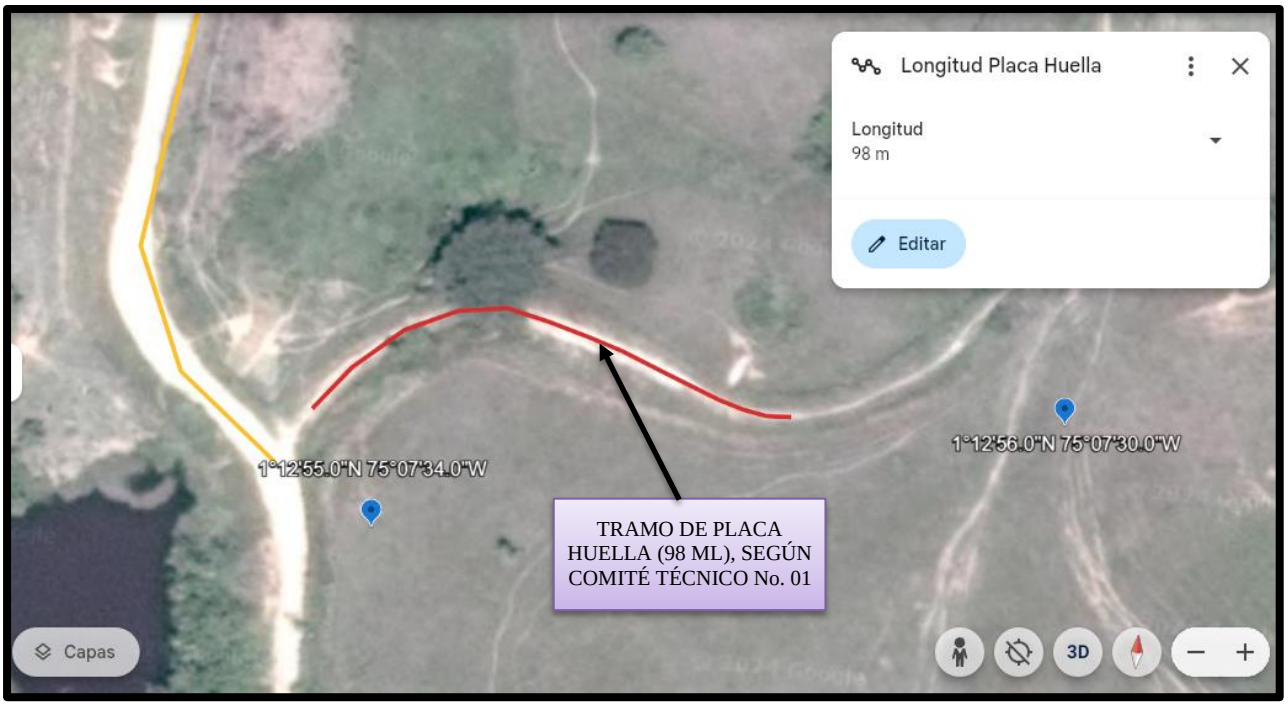


Ilustración 3. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda La Esmeralda.*

- *VEREDA BAJO PLATANILLO (CS # 3441 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Milán del departamento del Caquetá, en la Vereda Bajo Platanillo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Bajo Platanillo en Km 45+000 de la vía – Cruce la Sevilla hacia La Anguilla –Milán código: 185030, con coordenadas iniciales 1,28639 N; -75,46528 W, y punto final de coordenadas 1,28500 N; - 75,46472 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth" y "Bing Mapas".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExRlNNMUo2QjgzS19nejgzY3MzbEhzV3FGMEdoNzQxUTESFgoUMDYyOTQ3REIyMTMxQjlEMzQ1QzEgAQ

https://www.bing.com/maps?osid=58d481cd-a819-470e-9c37-5b30c43051c3&cp=1.286942~-75.492878&lvl=14.531498&style=h&pi=0&v=2&sV=2&form=S00027

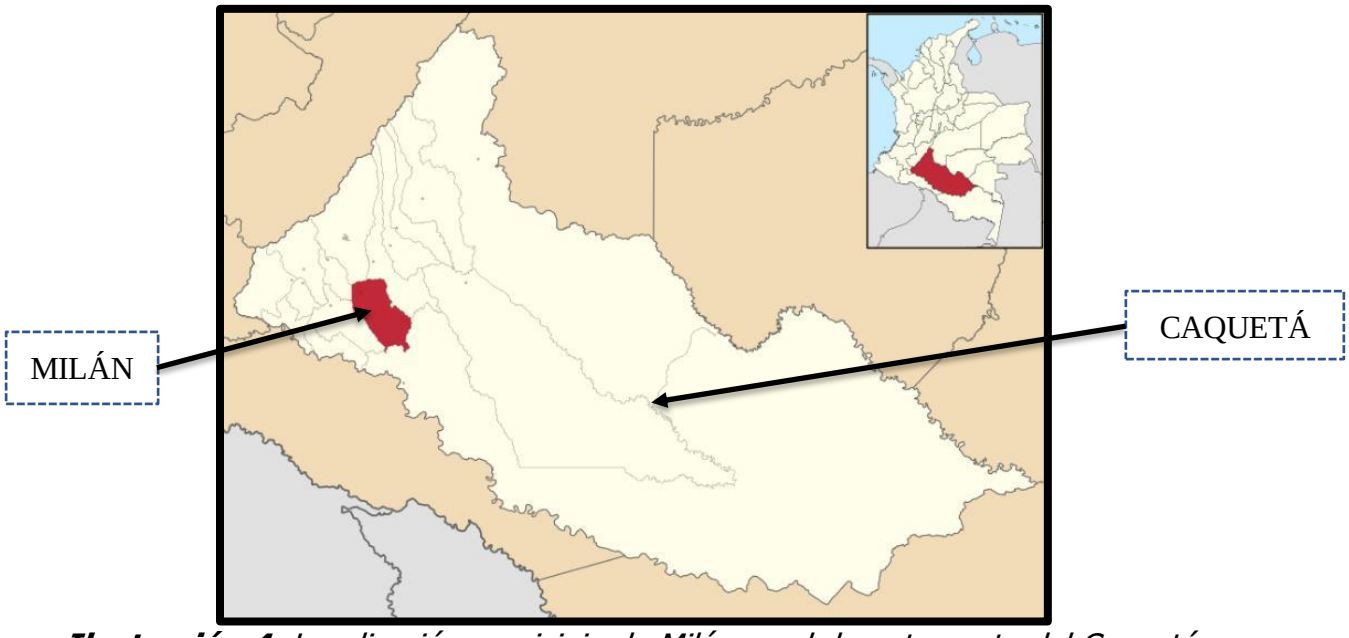


Ilustración 4. *Localización municipio de Milán en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 5. *Ubicación del proyecto en la Vereda Bajo Platanillo.*



Ilustración 6. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Bajo Platanillo.*

- *VEREDA BUENOS AIRES BAJO (CS # 3760 - 2023)*

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La montañita del departamento del Caquetá, en la Vereda Buenos aires bajos, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050, con coordenadas iniciales 1,32056 N; -75,13139 W, y punto final de coordenadas 1,32528 N; -75,12667 W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS.

Nota: Ubicación del proyecto mediante el siguiente link "Google Earth".

https://earth.google.com/web/data=MkEKPwo9CiExZ1hwR3ptTXh2VkxNZVFaaHdPUkNvX1FFbnJoenY5amkSFgoUMDE5MkNFQzkwRTMxQkE5QjYwRkYgAQ

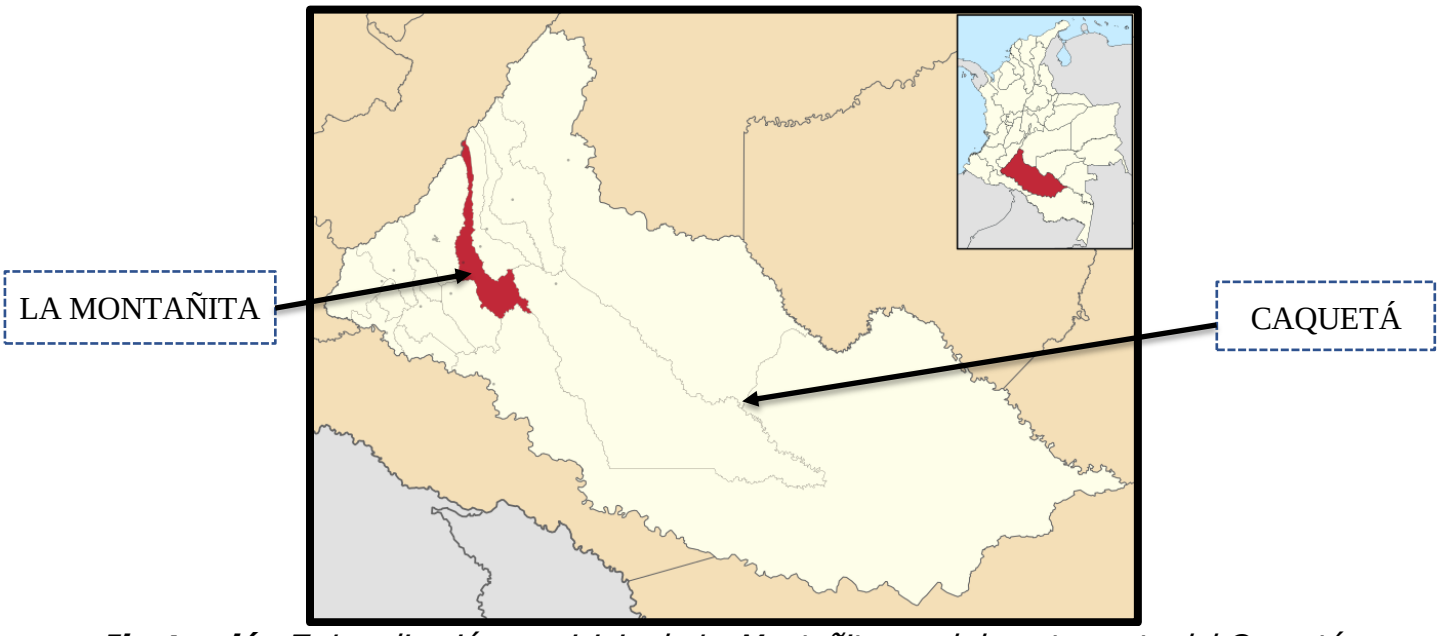


Ilustración 7. *Localización municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá.*



Ilustración 8. *Ubicación del proyecto en la Vereda Buenos Aires Bajo*

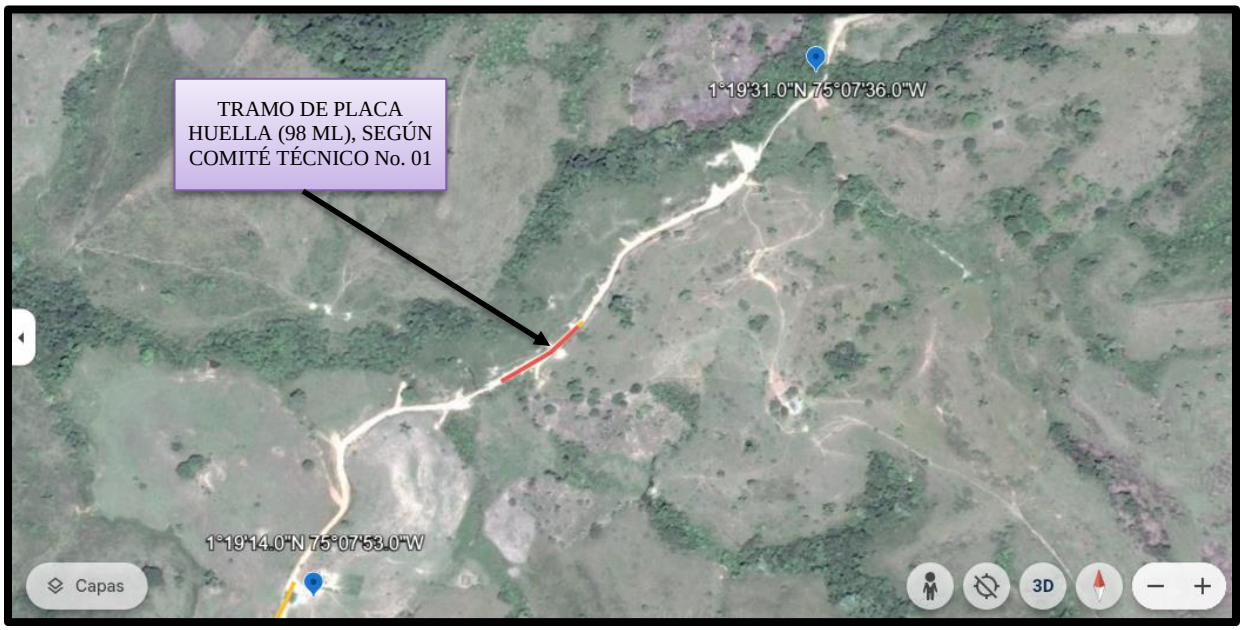


Ilustración 9. *Tramo de placa huella de intervención en la Vereda Buenos Aires Bajo.*

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En este convenio establecido, se benefician las veredas que corresponden a La Esmeralda y Buenos Aires Bajo del municipio de LA MONTAÑITA y Bajo Platanillo del municipio de MILÁN, las cuales, al ser mejorada su vía terciaria, aquellas carreteras o caminos que conectan áreas rurales y comunidades locales, podrán tener varios beneficios significativos. Las vías terciarias ocupan un puesto esencial en el desarrollo social, económico y humano de un país por lo cual mejorar una vía tercería, tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales además facilita el acceso a zonas remotas y comunidades rurales, siendo esto fundamental para conectar a las personas con servicios básicos, como atención médica, educación y mercados locales, de igual manera, se genera un desarrollo económico, ya que se mejora la movilidad de bienes y personas, lo que puede ayudar a impulsar el comercio local y regional.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

A) CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 – LA ESMERALDA

- INVENTARIO

En el tramo de intervención, solo se evidenció en sitio de obra, una obra de arte tipo alcantarilla en concreto reforzado con tubería en concreto reforzado de 36”, encole de caja poceta y descole en aletas.

Tabla 1. *Inventario en tramo de intervención - Vereda La Esmeralda*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Bueno	1

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda La Esmeralda, teniendo en cuenta las coordenadas 1.21556 N; -75.12500 W y 1.21528 N; -75.12611 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno presenta hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, a causa del tránsito de caballos, medio que se utiliza como transporte hacia la escuela, dado que en el momento que se presentan lluvias es imposible transitarse en vehículos (moto o carro).
- Se evidencia surcos que se ha generado por de épocas de lluvias mediante proceso de arrastre o por erosión de material limoso, llegando con el tiempo más hundimiento del terreno natural.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

B) CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 – BAJO PLATANILLO

➢ INVENTARIO

Para esta vereda, en el tramo de intervención solo se evidenció en sitio de obra, una obra de arte tipo alcantarilla (cajón-aletas) en concreto reforzado con tubería en concreto reforzado de diámetro < 36”, don la caja o poceta está totalmente deteriorado la calidad de concreto con el pasar de los años de uso.

Tabla 2. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Bajo Platanillo*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
Alcantarilla en concreto reforzado	Deteriorado	1

➢ ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Bajo Platanillo, teniendo en cuenta las coordenadas 1.28639 N; -75.46528 W y 1.28500 N; -75.46472 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie o rodadura del terreno cuenta con material de afirmado (material de rio) con existencias de surcos transversales a la vía a causa de épocas de lluvias.
- Se evidencia erosión en zona de descole de alcantarilla existente, donde la comunidad ha solicitado suspenderse para que no se continue generando daños al predio.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto de 3.000 psi.
- Se evidencia sobre los taludes vegetación y no cuenta con árboles de diámetro mayor a 5cm en el tramo de intervención de este proyecto

C) CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 – BUENOS AIRES BAJO

- INVENTARIO

No se cuenta con obras de arte de drenajes, ni placa huellas u otras obras viales en vías terciarias.

Tabla 3. *Inventario en tramo de intervención - Vereda Buenos Aires Bajo*

DESCRIPCIÓN	ESTADO	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A

- ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Se realizada la inspección visual por parte de esta firma de interventoría en el tramo de intervención de la vereda Buenos Aires Bajo, teniendo en cuenta las coordenadas 1.32056 N; -75.13139 W y 1.32528 N; -75.12667 W, levantadas en campo por INVIAS, a continuación, se describe el estado inicial antes de su inicio de obra:

- La superficie del terreno o rodadura del terreno presenta pocos hundimientos puntuales a lo largo del tramo establecido, el tránsito sobre la vía es muy baja.
- No se cuenta con cunetas en material de concreto reforzado sobre el tramo a intervenir.
- No se cuentan con obras de arte de drenajes (alcantarillas).
- No se evidencia material granular (mixto) sobre la capa de rodadura o terreno natural.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

Los proyectos consisten en realizar la revisión e implementación del contenido de la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje o placa huella en los sectores priorizados. Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución de las obras deberán ser los que se exigen en las especificaciones técnicas del INVIAS, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.


Las obras que se van a ejecutar, deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías -Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen.

A continuación, se describe el alcance y las actividades técnicas a ejecutar de cada uno de los proyectos ubicados en las veredas de Buenos Aires Bajo, La Esmeralda y Bajo Platanillo, de los cuales fueron avalados por esta interventoría como se evidencia en el comité técnico de obra No. 01 desarrollados en cada una de las juntas de acción comunal:

- **JAC LA ESMERALDA** (CS#3379 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de La Esmeralda tiene como alcance la construcción de 98 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	98 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

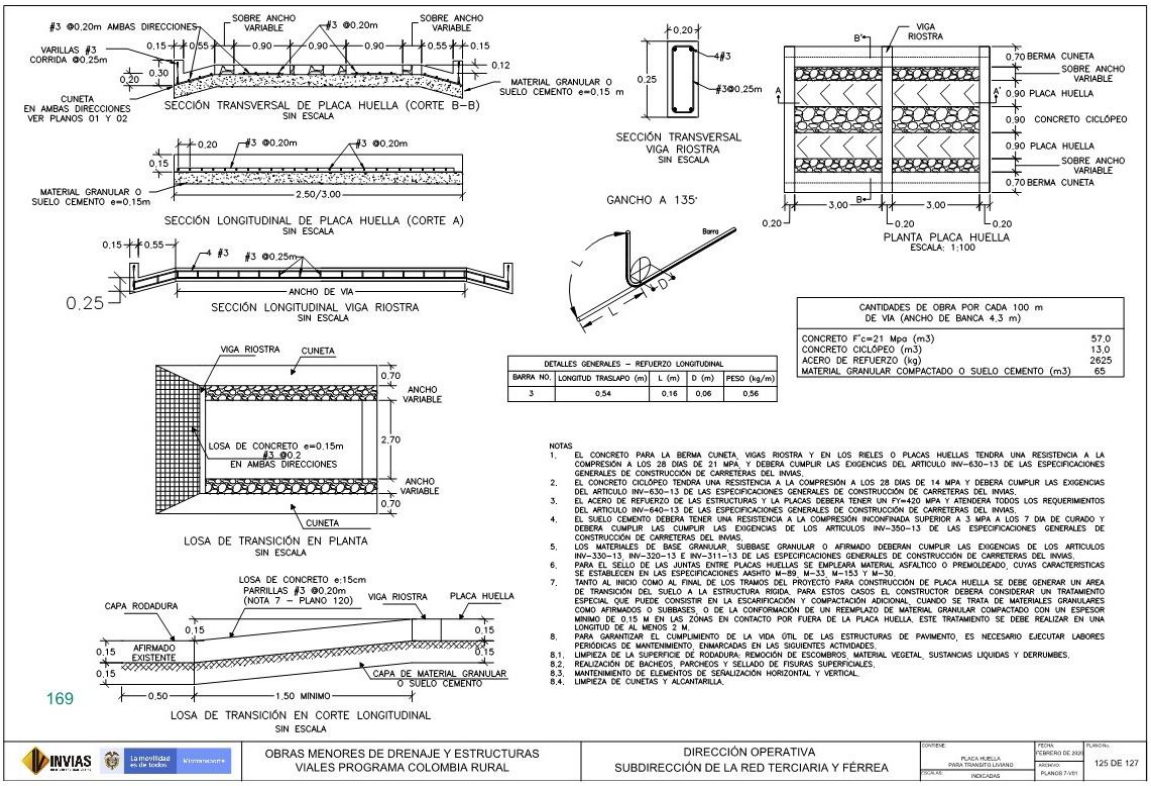ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA


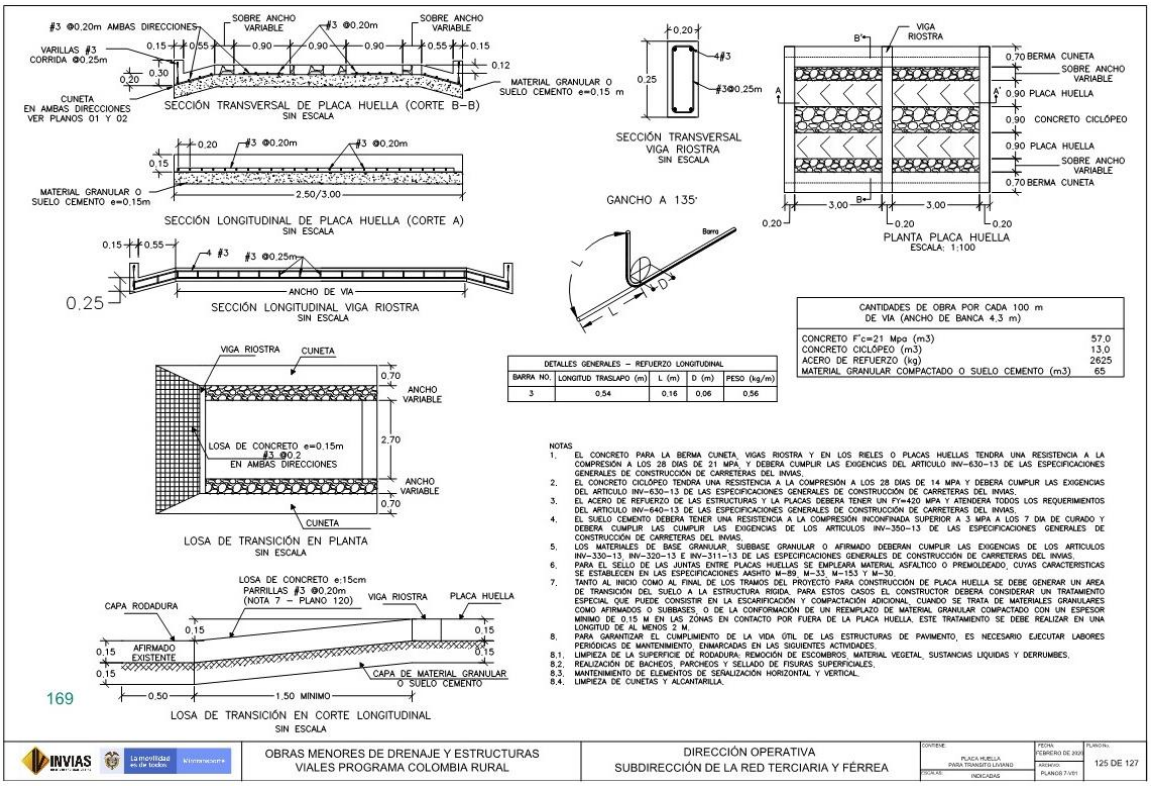
- **JAC BAJO PLATANILLO** (CS#3441 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de Bajo Platanillo tiene como alcance la construcción de 109 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	109 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C

	- Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA




- **JAC BUENOS AIRES BAJO** (CS#3760 DE 2023)

La junta de acción comunal de la vereda de Buenos Aires Bajo tiene como alcance la construcción de 98 metros lineales de placa huella, no se cuenta con construcción de obras de drenajes como alcantarillas u otras.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023	
ALCANCE DEL PROYECTO:	98 ML DE PLACA HUELLA
ACTIVIDADES A REALIZAR:	- Desmonte y limpieza de zona no boscosas - Excavaciones varias sin clasificar - Sub-base granular clase C - Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ - Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G) - Acero de refuerzo de 60.000 psi

ESQUEMA O PLANO DE PLACA HUELLA

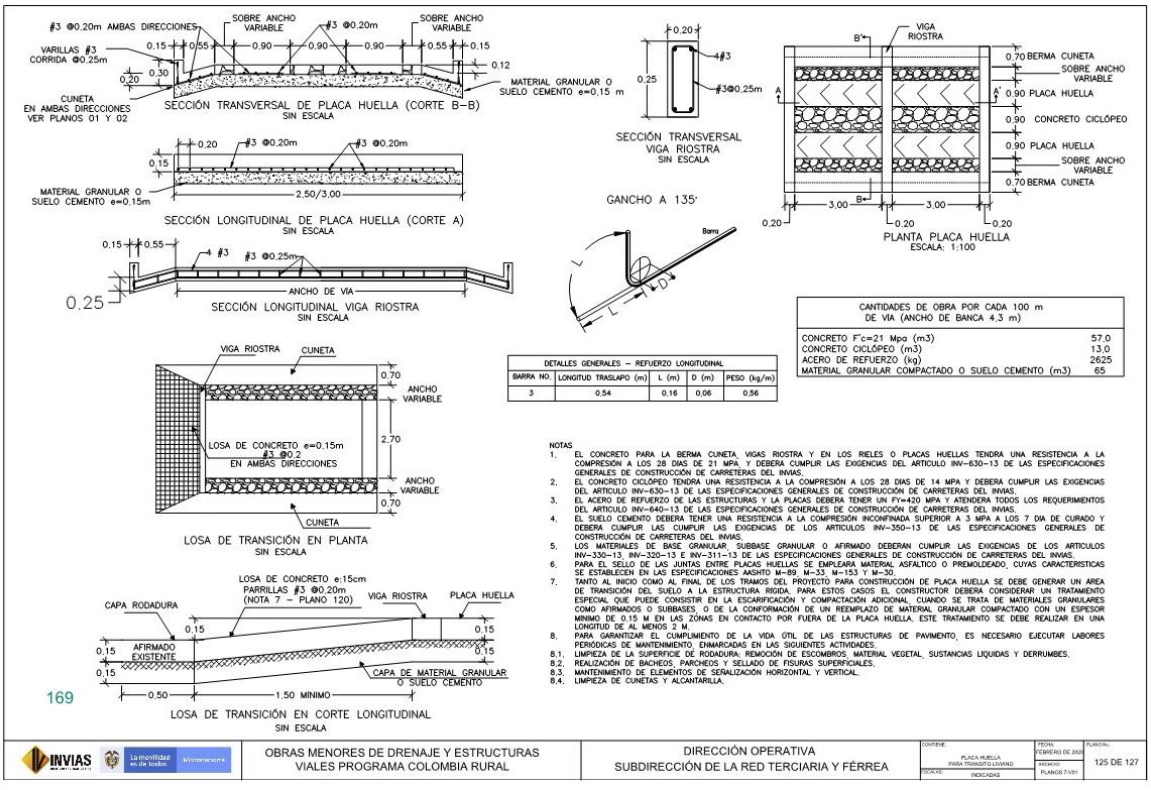

3. INFORMACIÓN DE CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

- **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023**

El presente convenio solidario No. 3379 – 2023 se suscribió el día 29 de septiembre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *HERNÁN SANCHEZ HUERTAS* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$199.001.571,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$198.001.571,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3379-2023
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
NIT:	901.705.545-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNÁN SANCHEZ HUERTAS
IDENTIFICACIÓN:	17.644.725 DE FLORENCIA

VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 198.001.571,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 23 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 31 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE OCTUBRE DE 2024

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3379-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 98 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MONTAÑITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA	98,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,000	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,000	$ 179.200,00	$ 179.200,00
							SUB-TOTAL	**$ 179.200,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,2600	$ 29.170,00	$ 95.094,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	82,4700	$ 303.772,00	$ 25.052.077,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,1700	$ 1.324.340,00	$ 79.685.538,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,6200	$ 774.303,00	$ 19.837.643,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.873,6000	$ 8.534,00	$ 24.523.302,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.193.654,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3441 – 2023 se suscribió el día 19 de septiembre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO**, por un valor del convenio de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$199.001.571,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (**$198.001.571,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3441-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO	
NIT:	900.124.679-8	
REPRESENTANTE LEGAL:	DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS	
IDENTIFICACIÓN:	1.117.511.741 DE FLORENCIA	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 199.001.571,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**
		$ 198.001.571,00 M/CTE

		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 25 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31 DE OCTUBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3441-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a*

ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio", fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 18 de junio de 2024 un alcance físico de 109 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MILAN	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO	109,00	CAQUETÁ	18/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 278.204,00	$ 278.204,00
							SUB-TOTAL	**$ 278.204,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,5700	$ 29.815,000	$ 106.440,00
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	95,0600	$ 225.354,000	$ 21.422.151,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	65,8500	$ 1.241.285,000	$ 81.738.617,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	28,0900	$ 737.443,000	$ 20.714.774,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.164,0000	$ 7.937,000	$ 25.112.668,00
							SUB-TOTAL	**$ 149.094.650,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.372.854,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.481.186,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.147.531,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 198.001.571,00**

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

El presente convenio solidario No. 3760 – 2023 se suscribió el día 5 de octubre de 2023 entre la señora *PAOLA ANDREA ROA MORA* en calidad de **SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *GEAN CARLOS TAPIERO MONGE* en calidad de presidente y representante legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO**, por un valor del convenio de DOSCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (**$200.663.426,00**) M/CTE, donde se discrimina que **a)** EL INSTITUTO aporta en dinero un valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (**$199.663.426,00**) M/CTE y **b)** la OAC realiza un aporte en especie correspondiente a la herramienta menor el cual se cuantifica monetariamente en la suma de UN MILLÓN DE PESOS (**$1.000.000,00**) M/CTE, a continuación, se relaciona los datos generales del convenio solidario:

CONVENIO SOLIDARIO No.	3760-2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"	
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
NIT:	800.215.807-2	
CONTRATISTA DEL CONVENIO SOLIDARIO:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO	
NIT:	900.787.710-3	
REPRESENTANTE LEGAL:	GEAN CARLOS TAPIERO MONGE	
IDENTIFICACIÓN:	1.006.529.457 DE EL PAUJIL	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.663.426,00 M/CTE	**APORTE INVIAS**

		$ 199.663.426,00 M/CTE
		APORTE OAC
		$ 1.000.000,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONVENIO:	5 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
AMPLIACIÓN No. 2 A SUSPENSIÓN No. 01:	15 DE FEBRERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 23 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE OCTUBRE DE 2024
SUSPENSIÓN No. 02:	29 DE OCTUBRE DE 2024	
REINICIO No. 02:	8 DE NOVIEMBRE DE 2024	

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024

De acuerdo a la **CLÁUSULA TERCERA:** ALCANCE DEL OBJETO:, del Convenio Solidario No. 3760-2023 se anuncia en el párrafo "*La definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES" como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio"*, fue aprobado en el Acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 un alcance físico de 98 mL de placa huella. A continuación, se detalla el presupuesto final ajustado:

PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO

PRESUPUESTO ESTIMADO DE REFERENCIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD DEL CORREDOR (m)	DIRECCIÓN TERRITORIAL	FECHA ELABORACIÓN
CAQUETA	MONTAÑITA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO	98,00	CAQUETÁ	20/06/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2013	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO								
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE								
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	0,00	$ 63.146,00	$ -
							SUB-TOTAL	**$ -**
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS								
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 202.690,00	$ 202.690,00
							SUB-TOTAL	**$ 202.690,00**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,2600	$ 27.566,00	$ 89.865,00
4	320.3.1	320-13		Subbase Granular Clase C	M3	82,4700	$ 303.612,00	$ 25.038.882,00
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	60,1700	$ 1.334.950,00	$ 80.323.942,00
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,6200	$ 795.544,00	$ 20.381.837,00
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	2.873,6000	$ 8.680,00	$ 24.942.848,00
							SUB-TOTAL	**$ 150.777.374,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 150.980.064,00**
							PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	**$ 4.529.402,00**
							GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 44.153.960,00**
							VALOR ESTIMADO CONVENIO	**$ 199.663.426,00**

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023 (LA ESMERALDA)

Para el presente mes de Noviembre de 2024, la Junta de Acción Comunal no evidenció actividades técnicas en obra, dado que el pasado 31 de agosto de 2024 se culminaron al 100% cada una de las actividades del contrato del convenio solidario, siendo el alcance inicial de 98 metros lineales tal como se firmó en el acta de comité técnico de obra el día 20 de junio de 2024 y que debido a los ahorros que se efectuaron en el transcurso de la ejecución de la obra, la interventoría junto con la junta, se concluyó ejecutar más metros lineales de placa huella, que se llegó finalmente a una nueva meta física de 105 metros lineales construidos en campo.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023 (BAJO PLATANILLO)

Para el presente mes de Noviembre de 2024, la Junta de Acción Comunal no evidenció actividades técnicas en obra, dado que el pasado 30 de septiembre de 2024 se culminaron al 100% cada una de las actividades del contrato del convenio solidario, siendo el alcance inicial de 109 metros lineales tal como se firmó en el acta de comité técnico de obra el día 18 de junio de 2024 y que debido a los ahorros que se efectuaron en el transcurso de la ejecución de la obra, la interventoría junto con la junta, se concluyó ejecutar más metros lineales de placa huella, que se llegó finalmente a una nueva meta física de 119 metros lineales construidos en campo.

- CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023 (BUENOS AIRES BAJO)

En el periodo del mes de Noviembre 2024, la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Buenos Aires Bajo culminó cada una de las actividades faltantes establecidas y firmadas en el acta de comité técnico de obra del día 20 de junio de 2024, para ello se realizaron las actividades como concreto de 3.000 psi, acero de refuerzo de 60.000 psi para huellas y cunetas con bordillo, como también concreto ciclópeo (60% concreto de 2.000 psi y 40% de piedra) para las franjas central de 90cm y dos laterales de 45cm. Estas actividades se ejecutaron dentro del tramo de los 98 mL de placa huella, dejando claridad que se cumplió al 100% cada una de las actividades estipuladas en el presupuesto ajustado (***98 mL***), a continuación, se describe con mayor detalle cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo:

- **Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ**

Actividad que comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 3.000 psi (21 Mpa), utilizados para la construcción vigas riostras, huellas, cunetas y bordillos para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla, actividad que se ejecutó entre las abscisas k0+048 al k0+098 con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con 1 maestro, 1 oficiales y 5 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.



Imagen No. 1: Concreto de 3.000 psi para huellas sobre MD y MI.



Imagen No. 2: Concreto de 3.000 psi para huellas sobre MD y MI.



Imagen No. 3: Concreto de 3.000 psi para huellas sobre MD y MI



Imagen No. 4: Concreto de 3.000 psi para huellas sobre MD y MI

- **Concreto ciclópeo resistencia 14 MPA (G)**

Comprende el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico de resistencia a la compresión de 2.000 psi (14Mpa) – (60%) y por otra parte piedra (40%), utilizados para la construcción de tres franjas de concreto ciclópeo, dos de 45cm y una de 90cm para placa huellas de acuerdo a los planos estructurales definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Esta interventoría verificó en sitio de obra, la elaboración y el cumplimiento de dosificación del concreto de acuerdo al diseño de mezcla y su respectiva instalación de piedra, actividad que se ejecutó entre las abscisas k0+048 al k0+098 con equipos y herramientas menores como mezcladora, palas, bades, etc. Se contó además con 1 oficial y 5 ayudantes prácticos para realizar las labores de fabricación de concretos.

	
Imagen No. 7: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja central 90cm y laterales de 45cm	**Imagen No. 8**: Concreto de 2.000 psi (14Mpa) - (60%) y piedra (40%) para concreto ciclópeo para franja central 90cm y laterales de 45cm

- **Acero de refuerzo de FY=4.200 kg/cm2 (60.000 psi)**

Consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto como vigas riostras, huellas y cunetas con su respectivo bordillo en concordancia con los planos estructurales para placa huellas definidos en la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES" por parte de la entidad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. Se verificó en campo de obra que los aceros de refuerzo correspondieran al número de la barra, espaciado, medidas de cortes acordes y flejes con su respectiva longitud de desarrollo, actividad que se ejecutó entre las abscisas k0+048 al k0+098 con equipos manuales y herramientas

menores como pulidora, bichiroque, etc. Se contó además con 1 oficial y 3 ayudantes prácticos para realizar las labores de corte, figurado e instalación del acero de refuerzo.

3.3. SEGUIMIENTO A ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha del presente informe no se han evidenciado ni presentado ítems no previstos en cada uno de los proyectos que se tienen en las veredas de La Esmeralda, Bajo Platanillo y en Buenos Aires Bajo.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Conforme a lo estipulado en el contrato de interventoría No. 4136 de 2023, la firma interventora realizó el seguimiento, control y supervisión a las obligaciones de los convenios solidarios número 3379–3441–3760 de 2023, de acuerdo a lo consignado en la guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría emitida por *Colombia Compra Eficiente* y el *manual de interventoría de obra pública (2022)*, y demás lineamientos señalados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

En ese sentido, es importante señalar algunas de las actividades que, a la luz de la normativa vigente en el ordenamiento jurídico, así como en la guía de Colombia Compra Eficiente y en la reiterada Jurisprudencia del Consejo de Estado, debe realizar los interventores:

1. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos de este.
2. Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en el contrato y documentos que lo integran.
3. Hacer seguimiento estricto al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, verificando que se cumpla el plazo y los cronogramas previstos en el contrato.
4. Requerir oportunamente al contratista con el fin de que presente planes de contingencia que conjuren las situaciones que generen retrasos o impactos en el cronograma de obra.
5. Informar oportunamente a la entidad estatal de posibles incumplimientos del contratista, y elaborar y presentar los soportes correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, el contrato y documentos que lo integran, el Manual de Interventoría de Obra y demás documentos.
6. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para atender las situaciones que afectan la ejecución contractual.

7. Informar oportunamente a la Entidad, las afectaciones al cronograma causadas por las gestiones de terceros y/o Entidades Públicas, con el fin de que sea desarrollada la gestión interinstitucional debida.
8. Informar, analizar, avalar y solicitar a la Entidad oportunamente, las modificaciones contractuales necesarias para la debida ejecución del proyecto.

En virtud de lo anterior, para este periodo del mes de Noviembre / 2024, la interventoría ha realizado el acompañamiento a cada uno de los proyectos que se ejecutan en el departamento del Caquetá que corresponden a las veredas de La Esmeralda y Buenos Aires Bajo en el municipio de La Montañita y en la vereda Bajo Platanillo en el municipio de Milán, dentro de las actividades más puntuales que se han llevado por parte de esta interventoría se describen a continuación:

- Se ha realizado control y registro de cada uno de los pagos solicitados por parte de las juntas de acción comunal, destinadas para compras de materiales de obra, equipos, alquiler de maquinarias y nóminas.

- Verificación en cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de afiliación y pagos de la seguridad social de cada uno de los trabajadores calificados y no calificados de la obra.

- Visitas técnicas a los proyectos de obra con el fin de llevar control y seguimiento de cada una de las actividades ejecutadas en el presente periodo, de igual forma cada uno de los procesos constructivos de la placa huella.

- Verificación de dimensiones estipuladas en los diseños de acuerdo a la "CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES DEL INVIAS" de la entidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

- Chequeo visual de los materiales pétreos utilizados en cada una de las obras de placa huellas que se llevan en las veredas.

- Acompañamiento por parte del equipo de interventoría en el área de seguridad y salud en el trabajo, ambiental y social frente a cada una de las comunidades donde se ejecutan los proyectos de placa huella.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

4.1. INFORME SEMANAL

En el periodo comprendido del presente informe se presenta por parte de esta firma interventora los informes semanales para cada uno de los proyectos de obra que se adelantan en las veredas La Esmeralda y Buenos Aires Bajo en el municipio de La Montañita y en la vereda Bajo Platanillo en el municipio de Milán, de los cuales se describen a continuación:

- Convenio Solidario No. 3379-2023 (**La Esmeralda**)

- Obras culminadas al 100%

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.1**).

- Convenio Solidario No. 3441-2023 (**Bajo Platanillo**)

- Obras culminadas al 100%

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.2**).

- Convenio Solidario No. 3760-2023 (**Buenos Aires Bajo**)

- Informe semanal No. 27: del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 28: del 07 de octubre al 13 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 29: del 14 de octubre al 20 de octubre de 2024
- Informe semanal No. 30: del 21 de octubre al 27 de octubre de 2024

Se adjunta Informes semanales en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-3* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.4.3)**

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Durante el mes de octubre de 2024, esta firma de interventoría llevó registro de maquinaria y equipos utilizados por cada una de las juntas de acción comunal en la obra.

Dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.5.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.5.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-4* registro de maquinaria y equipos utilizado en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.5.3**).

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDAROS

Durante el mes de octubre de 2024, esta firma de interventoría llevó registro del personal de obra, control de aportes legales y seguridad social de cada una de las juntas de acción comunal. Se adjunta la información diligenciada en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.6.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.6.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-6* de registro de personal, control de aportes legales y seguridad social de la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.6.3**).

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

Se presenta por parte de esta firma interventora para el mes noviembre de 2024 los informes financieros y presupuestales de cada uno de los convenios solidarios, el cual se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.7.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.7.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-8* donde se evidencia el informe financiero y presupuestal de la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.7.3**).

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de octubre 2024 se registró el tiempo climático diario de cada una de las veredas donde se ejecutan las obras de placa huellas, dicha información se diligenció en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.8.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.8.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-10* donde se registró el tiempo climático evidenciado en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.8.3**).

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo correspondiente al mes de octubre – 2024, se cuenta con resultados de ensayos de laboratorios de la vereda Buenos Aires Bajo del Municipio de La Montañita en el departamento del Caquetá, resultados que comprende a los concretos de resistencia de 3.000 psi para vigas riostras, cunetas con bordillos, franjas de huellas y placa de acceso y salida a la placa huella. De igual forma, esta interventoría presenta la relación de información correspondiente a los resultados de ensayos de laboratorio en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.9.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda

Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.9.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-11* donde se reporta resultados de ensayos de laboratorio tomados de la obra que se ejecutan en la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.9.3**).

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Comprende la relación de las garantías y seguros de cada uno de los convenios solidarios cuando estos surten modificaciones, por lo que esta firma de interventoría hace seguimiento mensual a través del formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3379, correspondiente a la JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.10.1**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3441, correspondiente a la JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.10.2**).

- Se adjunta formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-12* donde se reporta las garantías y seguros del convenio solidario No. 3760, correspondiente a la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.10.3**).

4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIOS SOLIDARIOS

Teniendo en cuenta las características de las obras, no se exige a las JAC presentar un plan de calidad, por lo que no es aplicable a ninguno de los convenios solidarios.

Nota: El formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-14* que se establece en la "LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA", No Aplica (N/A).

4.9. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTOS MENSUAL

A continuación, se relacionan otros documentos de seguimientos mensuales que se lleva a cada uno de los convenios solidarios por esta interventoría, que corresponde al seguimiento de los desembolsos realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y su respectivo seguimiento de programa de inversiones de ello, que a continuación se relacionan:

- SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

Para este presente periodo del mes de noviembre – 2024, esta firma interventora solicitó a las JAC el informe de seguimiento de la inversión del desembolso mensual de su respectivo convenio basado en el plan de inversión de desembolso presentado por cada una de las Juntas y aprobados por esta firma (**Ver Anexo 8.11.1, Anexo 8.11.2 y Anexo 8.11.3**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3379, JAC de la Vereda La Esmeralda - (**Ver Anexo 8.12.1**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3441, JAC de la Vereda Bajo Platanillo - (**Ver Anexo 8.12.2**).

- Se adjunta informe de inversión y buen manejo de desembolso, donde se reporta los pagos realizados a proveedores con su respectivo número de factura, cheque o documento de egreso correspondiente al convenio solidario No. 3760, JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo - (**Ver Anexo 8.12.3**).

- SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Se realiza por esta firma de interventoría el seguimiento mensual del programa de obra para cada JAC de acuerdo a la programación elaborada por el ingeniero residente y lo aprobado por esta interventoría (**Ver Anexo 8.13.1, Anexo 8.13.2 y Anexo 8.13.3**), programación que es vigente a partir del día 24 de junio de 2024 para todas las juntas (La Esmeralda, Bajo Platanillo y Buenos Aires Bajo). De acuerdo a lo anterior, se refleja mediante de tablas el porcentaje programado y ejecutado acumulado del presente periodo, donde se deja constancia el atraso o avance física de cada una de las juntas para el presente periodo.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda La Esmeralda.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 - 2023**

Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,030%	0,000%	-0,030%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	34,283%	20,754%	-13,529%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,214%	79,246%	43,032%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	27,428%	0,000%	-27,428%
Octubre – 2024 Días del 01 al 31	2,045%	0,000%	-2,045%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**	**0,0%**

Tabla 4. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - La Esmeralda.*

Según Tabla No. 4, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $ 198.001.571,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,00% equivalente a $ 198.001.571,00 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda La Esmeralda, se encuentra en adelanto y finalizada la obra, es decir, por encima del programado en un 0,0% que representa en valor de $ 0,00 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Bajo Platanillo.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,047%	0,141%	0,094%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	33,299%	18,836%	-14,463%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,627%	57,164%	20,537%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	27,983%	23,859%	-4,124%
Octubre – 2024	2,044%	0,000%	-2,044%

Días del 01 al 31			
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**	**0,0%**

Tabla 5. *Cuadro comparativo de programado vs ejecutado acumulado de JAC - Bajo Platanillo.*

Según Tabla No. 5, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $ 198.001.571,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,00% equivalente a $ 198.001.571,00 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Bajo Platanillo, se encuentra en adelanto, es decir, por encima del programado en un 0,0% que representa en valor de $ 0,00 de pesos.

- Programado vs ejecutado acumulado – JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ACUMULADA "**JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO**" **CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 - 2023**			
Mes/Año Periodo	Programación Acumulada Mensual	Ejecutado Acumulado Mensual	Avance o Atraso Físico
Junio – 2024 Días del 24 al 30	0,034%	0,000%	-0,034%
Julio – 2024 Días del 01 al 31	34,217%	7,898%	-26,319%
Agosto – 2024 Días del 01 al 31	36,260%	28,690%	-7,570%
Septiembre – 2024 Días del 01 al 30	27,456%	27,479%	0,023%
Octubre – 2024 Días del 01 al 31	2,033%	35,933%	33,900%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**	**0,0%**

Tabla 6. *Cuadro comparativo programado vs ejecutado acumulado de JAC - Buenos Aires Bajo*

Según Tabla No. 6, se tiene un avance ejecutado acumulado del 100,0% correspondiente a $ 199.663.426,00 de pesos, contra un programado acumulado de 100,00% equivalente a $ 199.663.426,00 de pesos, lo que indica que la JAC de la Vereda Buenos Aires Bajo, se encuentra en adelanto, es decir, por encima del programado en un 0,0% que representa en valor de $ 0,00 de pesos.

4.10. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para este presente periodo del mes de noviembre - 2024, no se realizaron actas de comité de obra.

4.11. ACTAS DE REUNIÓN

Para este presente periodo del mes de noviembre – 2024, no se realizaron actas de reuniones en obra.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

El presente contrato de interventoría No. 4136 – 2023 se suscribió el día 26 de octubre de 2023 entre la señor *JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS* en calidad de **DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ** del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS** y el señor *ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA* en calidad de **CONTRATISTA**, por un valor del contrato de CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (**$107.999.997,00**) M/CTE, equivalente a 93,10 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, a continuación, se relaciona los datos generales del contrato de interventoría:

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4136-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILÁN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT:	800.215.807-2
CONTRATISTA:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
NIT:	7.692.245-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 107.999.997,00 M/CTE
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSIÓN No. 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01:	17 DE ENERO DE 2024	
PRÓRROGA No. 01:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 19 DE MARZO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 02:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 24 DE ABRIL DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE JUNIO DE 2024
PRÓRROGA No. 03:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE JUNIO DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 04:	***FECHA DE FIRMADO:***	EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	PLAZO SOLICITADO HASTA:	EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	

De acuerdo a la **CLÁUSULA CUARTA.** VALOR: El valor del contrato de interventoría es por la suma de CIENTO SIETO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M-CTE ($107.999.997), equivalentes a 93,10 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2023, suma que se discrimina de la siguiente manera o presupuesto de interventoría inicial:

PRESUPUESTO INICIAL DE INTERVENTORÍA

	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
		(1)	**(2)**	**(3)**	((1)+(2))*(3) = **(4)**
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00
	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,40	$ 1.120.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3.000.000,00
	Especialista en Estructuras	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Vía y/o Pavimentos	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 5.500.000,00			
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.500.000,00			
	Especialista en diseño Geometrico	$ 5.500.000,00			
	Inspector	$ 1.300.000,00		6,00	$ 7.800.000,00
	Inspector SST	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				$ 32.190.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2,36
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				$ 75.968.400,00

	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
			(7)	(8)	(7)*(8) = (9)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
	Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 550.000,00	12,00	$ 6.600.000,00
	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 2.800.000,00	2,00	$ 5.600.000,00
	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	3,00	$ 900.000,00
	OTROS COSTOS				
	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 176.200,00	2,00	$ 352.400,00
	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 80.000,00	3,00	$ 240.000,00
	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
	Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 38.500,00	3,00	$ 115.500,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 14.787.900,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 90.756.300,00
	IVA = 19% * (C) = (D)				$ 17.243.697,00
	COSTO TOTAL = (C) + (D)				$ 107.999.997,00

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Como interventoría, se culminó en este periodo del mes de noviembre – 2024, el seguimiento, acompañamiento y supervisión a cada uno de los convenios solidarios suscritas entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y las juntas de acción comunal, dentro de las actividades de las cuales realizó esta firma durante el periodo del presente informe se describen a continuación:

- Se finaliza por parte de la interventoría realizando visitas técnicas por el residente de interventoría, en cumplimiento al seguimiento y control de cada una de las actividades que se llevó en las obras de la Vereda de Buenos Aires Bajo. Además, por parte del residente y director de esta firma de interventoría se continúa informando al ingeniero residente de la obra de la vereda de Buenos Aires Bajo, recomendaciones muy puntuales en cuanto al tema de los bombeos y peraltes para cada una de las placas huellas al momento de fundirse concretos de 3.000 psi (huellas, cunetas con bordillos y vigas riostras) y de ciclópeo (franjas de 45cm y de 90cm).

- Se realizaron tomas de muestras de concreto de 3.000 psi en conjunto entre los ingenieros residente de obra e interventoría a lo largo del tramo de intervención de construcción de placa huellas para la vereda de Buenos Aires Bajo (*las otras veredas no aplican, ya se culminaron obras*).

- Se continua el chequeo visual de los materiales de ferretería acopiados en sitio de obra, donde se evidenció la calidad y las especificaciones técnicas de cada uno de ellos necesarios para la construcción de las placas huellas en la junta de Buenos Aires Bajo.

- Se verificó en sitio de obra que el personal de mano de obra calificada y no calificada estuviesen debidamente afiliados al sistema de seguridad social, para las juntas que iniciaron a realizar actividades físicas en obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de noviembre el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-5* donde hace referencia el vehículo utilizado por el director y residente de interventoría para cada una de las veredas donde se supervisa, control y seguimiento técnico de las obras de placa huella.
(**Ver Anexo 8.15**)

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de noviembre el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7* donde se relaciona el personal mínimo requerido de acuerdo a la propuesta económica presentada por esta firma de interventoría, necesarios para llevar a cabo la supervisión técnica de cada uno de los convenios suscritos con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.16**)

6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de noviembre el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9* donde se relaciona el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría.
(**Ver Anexo 8.17**)

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se anexa para el mes de noviembre el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13* donde se relacionan las pólizas de **a)** cumplimiento general, **b)** pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y **c)** Calidad del servicio; correspondiente al contrato de interventoría No. 4136 – 2023 a la fecha.
(**Ver Anexo 8.18**)

6.5. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

Otros de los documentos que se llevan periódicamente en el presente informe hace énfasis al formato de plan de cargas o reprogramación al plan de cargas del INVIAS.

- **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO**

Se anexa para el mes de noviembre el formato *MEPI-MN-IN-9-FR-2* donde se evidencia el plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado para esta firma de interventoría por parte de la supervisión del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
(**Ver Anexo 8.19**)

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda BAJO PLATANILLO presenta para este periodo un programado acumulado del 100,00% correspondiente a $198.001.571,00 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $198.001.571,00 pesos M/CTE, lo que indica un adelanto por encima de lo programado en un 0,0% correspondiente a $0,00 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda BUENOS AIRES BAJO presenta para este periodo un programado acumulado del 100,00% correspondiente a $199.663.426,00 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $199.663.426,00 pesos M/CTE, lo que indica un adelanto por encima de lo programado en un 0,0% correspondiente a $ 0,00 pesos M/CTE.

- Que la Junta de Acción Comunal de la Vereda LA ESMERALDA presenta para este periodo un programado acumulado del 100,00% correspondiente a $198.001.571,00 pesos M/CTE contra un ejecutado acumulado del 100,00% correspondiente a $198.001.571,00 pesos M/CTE, lo que indica un adelanto por encima de lo programado en un 0,0% correspondiente a $ 0,00 pesos M/CTE.

8. ANEXOS

8.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

8.1.1. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.1.2. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.1.3. Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

8.2.1. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.2.2. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.2.3. Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.3. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

8.3.1. Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.3.2. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.3.3. Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.4. INFORMES SEMANALES

8.4.1. Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.4.2. Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.4.3. Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.5.1. Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.5.2. Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.5.3. Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.6. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.6.1. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.6.3. Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.7. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

8.7.1. Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.7.2. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.7.3. Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.8. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

8.8.1. Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.8.2. Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.8.3. Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.9. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

8.9.1. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.9.2. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.9.3. Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.10. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.10.1. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.10.2. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.10.3. Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.11. PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.11.1. Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.13. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

8.13.1. Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.13.2. Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.13.3. Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.14. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

8.14.1. Actas de comité de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379
8.14.2. Actas de comité de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441
8.14.3. Actas de comité de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3379

8.15. EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.16. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.17. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.18. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

8.19. PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

Atentamente,



ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
MP No. 19202-61820 CAU

ANEXOS

ANEXO 8.1.

RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO

ANEXO 8.1.1.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda La Esmeralda – CS#3379

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Remisión de paquete de archivos correspondientes al balance ambiental final CS 3379 - JAC VEREDA LA ESMERALDA

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 22 de octubre de 2024, 9:11 a.m.
Para: atencionciudadano@invias.gov.co, nacevedo@invias.gov.co, jalgonzalez@invias.gov.co
CC: Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Adriana Montoya <bioadrimontoya@gmail.com>

075-4136

Florencia - Caquetá, 22 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 3379 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes al balance ambiental final.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Esmeralda con **Convenio Solidario No. 3379 de 2023,** presentó los archivos concernientes al balance ambiental final, con los formatos y sus respectivos anexos (Ver listado anexo).

Siendo así, se informa que se aprueba la documentación ambiental recibida y se espera concepto sobre el Balance Final Ambiental final a la Terminación del Convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

BALANCE FINAL AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CS No. 3379 de 2023.zip

075-4136 OFICIO REMISIÓN BALANCE AMBIENTAL FINAL _ CS No. 3379 de 2023.pdf
72K

ANEXO 8.1.2.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Balance ambiental final CS No. 3441 de 2023 - JAC VEREDA BAJO PLATANILLO

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 31 de octubre de 2024, 4:15 p.m.
Para: atencionciudadano@invias.gov.co, nacevedo@invias.gov.co, jalgonzalez@invias.gov.co
CC: Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Adriana Montoya <bioadrimontoya@gmail.com>

077-4136

Florencia – Caquetá, 22 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 3441 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes al balance ambiental final.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Bajo Platanillo con **Convenio Solidario No. 3441 de 2023,** presentó los archivos concernientes al balance ambiental final, con los formatos y sus respectivos anexos (Ver listado anexo).

Siendo así, se informa que se aprueba la documentación ambiental recibida y se espera concepto sobre el Balance Final Ambiental final a la Terminación del Convenio.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

2 archivos adjuntos

077-4136 OFICIO REMISIÓN BALANCE AMBIENTAL FINAL _ CS No. 3441 de 2023.pdf
72K

BALANCE FINAL AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CS No. 3441 de 2023.zip
5719K

ANEXO 8.1.3.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Gestión social inicial CS No. 3760 de 2023 - JAC VEREDA BUENOS AIRES BAJO

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 28 de octubre de 2024, 9:03 a.m.
Para: atencionciudadano@invias.gov.co
CC: Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, ijmp_19@hotmail.com

3760 de 2023_ENTREGA OFICIAL SS_ETAPA INCIAL.zip

075-4136

Florencia – Caquetá, 28 de octubre de 2024

Señores
SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Sr. Jairo Fernando Arguello Urrego
Subdirector de sostenibilidad
antecionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Convenio Solidario No. 3760 de 2023 adscrito al contrato de interventoría No. 4136 de 2023
Asunto: Remisión de paquete de archivos correspondientes a la gestión social inicial.

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoría *(ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA, NIT: 7.692.245-1)* notifica que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO con **Convenio Solidario No. 3760 de 2023,** presentó el Plan de Gestión Social.

Se remite anexo al presente el seguimiento y el balance de gestión social inicial, para su evaluación.

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

075-4136 OFICIO REMISIÓN GESTIÓN SOCIAL INICIAL _ CS 3760 de 2023.pdf
65K

ANEXO 8.1.4.

Relación de correspondencia generada entre el interventor y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Gmail **Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>**

IP 018 cto 4136 - Informe semanal #29

1 mensaje

Elkin D. Ramos M. <elkinramos@gmail.com> 22 de octubre de 2024, 4:43 p.m.
Para: Angy Juliet Lara Murcia <alara@invias.gov.co>, lkrodriguez@invias.gov.co, Cesar Augusto Galindez Garcia <cesargalindez920402@gmail.com>, carlosydiana20@gmail.com, jesal_1090@hotmail.com

Florencia, 22 de octubre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - Territorial Caquetá
Ing. Angy Juliet Lara Murcia
Supervisora
Dra. Karina Rodríguez
Profesional Social
Florencia – Caquetá

Referencia: Aceptación de oferta No. 4136 de 2023
Asunto: Informe semanal #29

Cordial saludo;

En atención a su solicitud y en cumplimiento del numeral 2.1 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE y del numeral 2.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA de la Invitación publica que dio origen al contrato de la referencia, remito para su revisión y/o aprobación los siguientes documentos:

- Informe semanal #29 del convenio 3441
- Informe semanal #29 del convenio 3379
- Informe semanal #29 del convenio 3760

Atentamente,

Ing. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Contratista de Interventoría
Aceptación de oferta No. 4136 de 2023

3 archivos adjuntos

IS - CS # 3441 (S29).pdf
231K

IS - CS # 3379 (S29).pdf
232K

IS - CS # 3760 (S29).pdf
269K

ANEXO 8.2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

ANEXO 8.2.1.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA **FECHA:**31/10/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Vista general del proyecto terminado el 31 de agosto de 2024, e inicio de proceso de cierre del convenio solidario No. 3379 de 2023)	FOTOGRAFÍA 2 (Vista general del proyecto terminado el 31 de agosto de 2024, e inicio de proceso de cierre del convenio solidario No. 3379 de 2023)

ANEXO 8.2.2.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO **FECHA:**31/10/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 1 (Vista general del proyecto terminado el 30 de septiembre de 2024, inicio y finalización de proceso de cierre del convenio solidario No. 3441 de 2023)	FOTOGRAFÍA 2 (Vista general del proyecto terminado el 30 de septiembre de 2024, inicio y finalización de proceso de cierre del convenio solidario No. 3441 de 2023)

ANEXO 8.2.3.

Registro fotográfico y video del avance de obras de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO **FECHA:**31/10/2024
INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

	
FOTOGRAFÍA 13 (Toma de muestras de concreto para laboratorios)	FOTOGRAFÍA 14 (Vista general de placa huella terminada)
	
FOTOGRAFÍA 15 (Vista general de placa huella terminada)	FOTOGRAFÍA 16 (Vista general de placa huella terminada)

ANEXO 8.3.

COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA DEL MES CORRESPONDIENTE DEL CONVENIO SOLIDARIO

ANEXO 8.3.1.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

[*02/09/2024 al]

* 01/10/2024 al 31/10/2024

Para el presente periodo se finaliza las gestiones adelantadas en cuanto a temas de documentos y trámites de parte social, siso y ambiental por parte de la junta de acción comunal de la vereda La Esmeralda en conjunto con la interventoria.

ANEXO 8.3.2.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

01/10/2024 al 31/10/2024.

Se dio finalización para este periodo las gestiones adelantadas en cuanto a temas de documentos y trámites de parte social, SISD y ambiental por parte de la junta de acción comunal de la vereda Bajo Platanillo en conjunto con la Interventoría.

ANEXO 8.3.3.

Copia de la bitácora de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

01/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 polidora
ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para huellas desde Km 0+048 al Km 0+060, y Colocacion de acero de refuerzo de 60.000 psi y formaleta para mas huella.

02/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes

Scanned with CamScanner

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora
ACTIVIDADES: Concreto de 3000 psi para cunetas MI y MD. Desde abscisa Km 0+040 al Km 0+060; se continua con la colocación de acero de refuerzo y formaletas para placa huellas.

03/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.


Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 pulidora.

ACTIVIDADES: Concreto ciclopeo para placa huellas entre las abscisas Km 0+040 al Km 0+060. Se continua con la colocación

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

de acero de refuerzo de 60.000 psi y formaletas




04/10/2024 Registro lluvias: Soleado
Soleado.

Personal de obra: 1 maestro.
1 oficial
5 ayudante

Maq. y Equipo: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora

ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para huellas entre las abscisas K0+060 al K0+099. Se continua colocando acero de refuerzo de 60.000 psi y formaleta





05/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora.


ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para cunetas sobre MI y MD entre abscisa K0+060 al K0+099.
Se continua con las excavaciones para vigas riostras.






06/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Día Dominical.





INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

07/10/2024 Registro lluvia: Soleado = Mañana
Soleado = Tarde.

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes


Maq. y Equipo: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 polidora.

ACTIVIDADES: Concreto ciclópeo para franjo Central y laterales de 90cm y 45cm respectivamente entre las abscisas Km060 al Km099. Se continua colocando formaleta para bordillos.


08/10/2024 Registro lluvia: Lluvia fuerte = Mañana
Lluvia fuerte = Tarde

No se laboró, dado que se están realizando acti-

vidales de Concreto.



09/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Lluvia fuerte
Tarde: Lluvia fuerte
No se labaró, se registrar fuertes lluvias.





10/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: nublado
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 polidora
ACTIVIDADES: Se realiza retiro de

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

material granular por arreste de material por las lluvias sueltes presentadas. colocacion de formaletas para bordillos







11/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Seco
Tarde: Seco

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 7.5 bultos
1 pulidora.

ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para bordillos entre las abscisas K0+048 Id K0+060 sobre ML y MD.





Scanned with CamScanner

12/10/2024 Registro lluvias: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.
Mag. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 pulidora
ACTIVIDADES: Se realizo llenos con material procedente de la excavacion o de prestamo, sobre los [alcantarillas] bordillos entre las abscisas K0+000 al K0+048.

13/10/2024 Registro lluvias: Mañana: soleado
Tarde: soleado.


Dia Dominical. No se labora.

14/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora
ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para bordillos y vigas riostras en de las abscisas Km 060 al Km 072. Se continuo colocando acero de refuerzo y realizando limpieza en zonas de vigas riostras

15/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro

Scanned with CamScanner

1 oficial
5 ayudantes
ACTIVIDADES: Concreto de 3.000 psi para vigas riostras y bordillos. entre las abscisas K0+072 al K0+097. Se retira material de derrumbe generadas por fuertes lluvias.



16/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora
ACTIVIDADES: Se continua con la fabricacion, transporte y vaciado de concreto de 3.000 psi

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

para bordillos y vigas riostras entre las abscisas Km 0+091 al Km 0+099. Se continua con el retiro de material de derrumbe.

17/10/2024 Registro lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.

Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 polidora.

ACTIVIDADES: Se continua con retiro (con) material de derrumbe.

18/10/2024 Registro lluvias: Mañana: 2 lluvias f.
Tarde: 2 lluvias f.
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 pulidora.
ACTIVIDADES: No se reportan actividades en obra.

19/10/2024 Registro lluvias: Mañana: 2 lluvias fu.
Tarde: 2 lluvias fu.
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes.
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos
1 pulidora.
ACTIVIDADES: No se reporta

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

actividades en obra:

Hasta las:

20/10/2024 Registo de lluvias: Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Día Dominical:

Hasta las:

21/10/2024 Registo de lluvias: Mañana: soleado
Tarde: soleado.

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 Ayudantes.

Mqq. y Equipos: 1 mezcladora 7.5 bultos
1 pulidora.

ACTIVIDADES: Se realizan excavaciones manuales para zapatas y

Scanned with CamScanner

relleno con material procedente de derrumbe para posterior del bordillo. entre las abscisas- Km0+99.

22/10/2024 Registro lluvias: mañana: soleado
tarde: soleado.

Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes

Mag. y Equipos: 1 mezcladora 15 baldes.
1 pulidora.

ACTIVIDADES: Se continua con relleno de derrumbe para posterior del bordillo. Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para rampa de acceso.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

23/10/2024 Registro lluvias: Mañana: soleado
Tarde: soleado.
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos.
1 polidora.
ACTIVIDADES: Concreto de 3000 psi para rampas de acceso entrada y salida del tramo de placa huella.

Firma:

24/10/2024 Registro de lluvias: Mañana: soleado
Tarde: soleado
Personal de obra: 1 maestro
1 oficial
5 ayudantes
Maq. y Equipos: 1 mezcladora 1.5 bultos

1 polidora

ACTIVIDADES: Se realizan actividades de aseo general de placa huella finalizada. Retiro y finalizacion de derrumbe faltante y retirado hacia la parte posterior del bordillo de cunetas.

25/10/2024 al 10/11/2024

Se generó durante este periodo tramites de documentacion y gestiones de avance y finalizacion de parte social, SISO y ambiental entre la junta de la vereda Buenos Aires Bajo y la Interventoria.

INDUCONTABLES

Scanned with CamScanner

ANEXO 8.4.

INFORMES SEMANALES

ANEXO 8.4.1.

Informe semanal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

ANEXO 8.4.2.

Informe semanal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

ANEXO 8.4.3.

Informe semanal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	6/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 27 del 30/09/2024 al 6/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO
INTEGRANTES: N/A
CONVENIO No. 3760 de 2023 VALOR INICIAL: $ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 4136 DE 2023 VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO: 10/11/2023 VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2024 VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.608.575,58	98,470%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 172.987.204,00	86,639%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.621.371,58)	-11,831%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 998.317,13	0,500%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.070.041,00	22,573%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 98,470% Avance o Atraso Físico % -11,831%
Meta Física Ejecutada % 86,639%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	92,77				94,7%
Ejec	85,00				86,7%
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Volqueta	2	2
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CONCRETO DE 3.000 PSI PARA HUELLA Y VIGA RIOSTRA ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 AL K0+099,2

2) CONCRETO CILÓPEO PARA FRANJAS DE 45CM Y DE 90CM ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 AL K0+099,2.

3) ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 AL K0+099,2.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS DE LA PLACA HUELLA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto de 3.000 psi y ciclópeo, abscisa k0+085



Concreto de 3.000 psi y ciclópeo, abscisa k0+065



Concreto de 3.000 psi y ciclópeo, abscisa k0+045

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	13/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 28 del 7/10/2024 al 13/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.024.503,04	99,680%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 196.472.897,00	98,402%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.551.606,04)	-1,278%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.018.283,47	0,510%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 23.485.693,00	11,763%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,680% Avance o Atraso Físico % -1,278%
Meta Física Ejecutada % 98,402%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	96,69				98,7%
Ejec	95,00				96,9%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	1
Vibrador de concreto	1	1
Volqueta	2	2
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 AL K0+099,2 MARGEN IZQUIERDA SENTIDO SUBIENDO.

2) ARMADO DE FORMALETA PARA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 AL K0+099,2 MARGEN IZQUIERDA SENTIDO SUBIENDO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON EL CORTE, FIGURADO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS DE LA PLACA HUELLA, SOBRE MARGEN DERECHA SENTIDO SUBIENDO.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto de 3.000 psi para cunetas y bordillos MI subiendo, abscisa k0+082



Concreto de 3.000 psi para cunetas y bordillos MI subiendo, abscisa k0+050



Concreto de 3.000 psi para cunetas y bordillos MI subiendo, abscisa k0+048

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	20/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 29 del 14/10/2024 al 20/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.663.426,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.663.426,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 998.317,13	0,500%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.190.530,00	1,598%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99,890% Avance o Atraso Físico % 0,110%
Meta Física Ejecutada % 100,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	98,00				100,0%
Ejec	98,00				100,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	
Vibrador de concreto	1	
Volqueta	2	
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) CONCRETO DE 3.000 PSI PARA CUNETAS Y BORDILLOS ENTRE LAS ABSCISAS K0+048 AL K0+099,2 MARGEN DERECHA SENTIDO SUBIENDO.

2) RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN SOBRE LA PARTE POSTERIOR DEL BORDILLO DE CUNETA EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DESDE LA ABSCISA K0+000 AL K0+099.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL E INTERVENTORÍA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto de 3.000 psi para huellas, cunetas y bordillos MI y MD, abscisa k0+065



Relleno con material procedente de la excavación, parte posterior del bordillo de cunetas, abscisa k0+085



Vista general de placa huella terminada, en cumplimiento a los planos estructurales tipo INVIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	27/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **SEMANA No.:** 30 del 21/10/2024 al 27/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** JUAN PABLO TELLO CARVAJAL

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, PRESUPUESTO AJUSTADO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE 98 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA, QUE COMPRENDE DOS FRANJAS DE PLACA HUELLA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, TRES FRANJAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI CON PIEDRA PEGADA, CUNETAS Y BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 PSI, RAMPA DE ACCESO Y SALIDA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO		
INTEGRANTES:	N/A		
CONVENIO No.	3760 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.663.426,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.663.426,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/10/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA		
INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	4136 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 107.999.997,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 107.999.997,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.663.426,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 107.999.997,00	N/A		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	N/A	N/A		
	SALDO DE VIGENCIA	N/A	N/A		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.663.426,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199.663.426,00	100,000%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 199.663.426,00	100,000%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 107.999.997,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,000% Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % 100,000%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	alcaltarillas	Unidad	-
*	placa huella	ML	98,0
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog	98,00				100,0%
Ejec	98,00				100,0%
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto 1.5 bulto	1	
Vibrador de concreto	1	
Volqueta	2	
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 de la vía Caquetá código: 1800, en el acceso a la Vereda Buenos aires bajos de la inspección de la unión Peneya en Km 0 +160 de la vía – Tramo La Y Bolivia – La montañita código: 181050

TRAMO Y/O SECTOR 2:

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	LA GRANADA, DONCELLO - CAQUETÁ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	DISTRIBUIDORA JLA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En Elaboración

OBSERVACIONES:A LA FECHA NO SE CUENTA CON AVANCE AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	-	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	N/A

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1) SE CONTINUAN GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y TRÁMITES EN LA PARTE SOCIAL Y AMBIENTAL ENTRE INTERVENTORÍA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) DAR FINALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN LA PARTE SOCIAL Y AMBIENTAL ENTRE INTERVENTORÍA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA

Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.5.1.

Maquinaria y equipo de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **8**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE OCTUBRE																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	186	100,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): INACTIVA, DADO QUE LA JUNTA TERMINÓ LABORES EL 31 DE AGOSTO DE 2024.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NINGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521785 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.2.

Maquinaria y equipo de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **8**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE OCTUBRE																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
RANA COMPACTADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	186	100,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): INACTIVA, DADO QUE LA JUNTA TERMINÓ LABORES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NINGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma

1110521785 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.5.3.

Maquinaria y equipo de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ** **PERIODO MES:** **8**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023

INTERVENTORÍA: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE OCTUBRE																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO EXCAVADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBRADOR DE RODILLO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR DE CONCRETO				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL ACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	93	50,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	93	50,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): NORMAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NINGUNA

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521765 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.6.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.6.1.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

ANEXO 8.6.2.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

ANEXO 8.6.3.

Personal, control aportes legales y seguridad social de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

ANEXO 8.7.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.7.1.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1113323		10	NACIÓN	3379-0	$ 197.824.563,00	$ 197.824.563,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.2.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1114423		10	NACIÓN	3441-0	$ 197.824.563,00	$ 197.824.563,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.001.571,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.7.3.

Informe financiero y presupuestal de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1137923		10	NACION	3760-0	$ 199.486.418,00	$ 199.486.418,00
		N/A					
		N/A					
		N/A					
		N/A					
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.663.426,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
		N/A													
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
*	N/A		
VALOR TOTAL	N/A		

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ANEXO 8.8.1.

Estado general del tiempo climático de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 8

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: NO SE REGISTRA LLUVIAS, DADO QUE LA OBRA SE CULMINÓ EL 31 DE AGOSTO DE 2024, TAL COMO SE ESTABLECE EN LA BITÁCORA DE OBRA.

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 7710521785 de Ibague
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.2.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 8

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: NO SE REGISTRA LLUVIAS, DADO QUE LA OBRA SE CULMINÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, TAL COMO SE ESTABLECE EN LA BITÁCORA DE OBRA.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma 1110521985 de Ibague

Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.8.3.

Estado general del tiempo climático de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: 8

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	16	14	21	24	24	24	24	24	24	24	14	14	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	703
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma 1110521785 de Ibague
Nombre: CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No 70202-393111 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO 8.9.1.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.2.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.9.3.

Resumen ensayos de laboratorio de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

PARA ESTE MES NO SE REPORTA RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.10.1.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 27/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,00	29/09/2023	3/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.079,00	29/09/2023	3/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3749854-1

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurad	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,00	29/09/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0931402-2 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	10	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurad	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.2.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 28/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.001.571,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.001.571,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 39.800.314,20	19/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.950.078,55	19/09/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.700.471,30	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3746473-3

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	117%	$ 232.000.000,00	19/09/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0930728-3 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	10	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.10.3.

Seguimiento garantías y seguros de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	21 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 29/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.663.426,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.663.426,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 4.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.132.685,00	5/10/2023	6/07/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.033.171,00	5/10/2023	6/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.199.028,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3752670-2

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 10/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116%	$ 232.000.000,00	5/10/2023	31/12/2023
Otros		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0932022-1 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 10/10/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	21 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.

PLAN DE INVERSIÓN DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.11.1.

Plan de inversión de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3379 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: HERNÁN SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Contratista

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.2.

8.11.2. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3441 DE 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMACAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 59.749.142,00	$ 44.811.856,00	$ 44.811.856,00		$ 149.372.854,00	75,4%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.481.186,00		$ 4.481.186,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.659.013,00	$ 13.244.259,00	$ 13.244.259,00		$ 44.147.531,00	22,3%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 77.408.155,00	$ 58.056.115,00	$ 62.537.301,00		$ 198.001.571,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ROBINSON ALMARIO PENAGOS
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 93901-T

Contratista

Firma:
Nombre: JESUS ALBERTO DUSSAN ORTIZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 70202-316991 TLM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.11.3.

8.12.3. Plan de inversión de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	18/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3760 de 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 60.392.026,00	$ 45.294.019,00	$ 45.294.019,00		$ 150.980.064,00	75,6%
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)	$ -	$ -	$ 4.529.402,00		$ 4.529.402,00	2,3%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 17.661.584,00	$ 13.246.188,00	$ 13.246.188,00		$ 44.153.960,00	22,1%
4							
5							
N							
TOTAL		$ 78.053.610,00	$ 58.540.207,00	$ 63.069.609,00		$ 199.663.426,00	100,0%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o Comunidad o comunidad étnica.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma: Gean Carlos Tapiero.
Nombre: GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador del contratista
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Contratista

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.12.

8.12. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

ANEXO 8.12.1.

8.12.1. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ 2

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **6** **MES:** OCTUBRE del 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3379 del 2023 (Indicar numero y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: **100** **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.001.571,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
Nota de Contabilidad 006	31/10/2024	BANCO DE OCCIDENTE	Gastos bancarios e Impuestos	$ 185.815,60	$ -	$ -	$ -	$ 185.815,60	3	Gastos Administrativos
051	15/10/2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	Pago Retefuente Septiembre del 2024	270.000,00	-	-	-	270.000,00	N/A	N/A
052	28/10/2024	ALMACEN EL SURTIDOR DEL HOGAR	Compras elementos de Gestión Social y Ambiental	4.400.000,00	-	92.437,00	-	4.307.563,00	2	Gestión Social y Ambiental
053	28/10/2024	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	Reintegro de rendimientos financieros de Junio a Septiembre del 2024	86.748,67	-	-	-	86.748,67	N/A	N/A
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-		-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 149.372.854,00	$ 147.445.044,00	$ -	$ 147.445.044,00	$ 1.927.810,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.481.186,00	-	4.400.000,00	4.400.000,00	81.186,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.147.531,00	$ 35.303.304,12	185.815,60	35.489.119,72	8.658.411,28
	TOTALES	**$ 198.001.571,00**	**$ 182.748.348,12**	**$ 4.585.815,60**	**$ 187.334.163,72**	**$ 10.667.407,28**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **Octubre del 2024:** (Indicar el mes) **$ 1.252,51** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 449.149,17** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1	$ 361.147,99	$ -	Mayo del 2024	26/06/2024	$ 361.147,99
2	$ 86.748,67	$ -	Junio-Octubre:2024	28/10/2024	$ 447.896,66

OBSERVACIONES:

El valor de los rendimientos financieros consignados es el valor acumulado a 31 de Octubre del 2024.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Hernan Sanchez H
Nombre: **HERNAN SANCHEZ HUERTAS**
Representante Legal OAC

Firma:
Nombre: **ALVARO GASCA TORRES**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **96892-T**

Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **19202-61820 CAU**

Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-72334 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 06/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. **3379 del 2023** (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	SALDO INICIAL		**1/10/2024**																	**$ 15.127.971,55**	
N/A	N/A		15/10/2024	C.E	051	N/A	Pago Retención en la Fuente Julio 2024	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268				$ 270.000,00	$ -	$ 270.000,00		$ -		270.000,00	14.857.971,55	
2	Gestión Social y Ambiental		28/10/2024	C.E	052	ASH-2136	Compras elementos de Gestión Social y Ambiental	ALMACEN EL SURTIDOR DEL HOGAR	17.646.218	Calle 16 No. 14-45	3204133415	segundotelag@hotmail.com	3.697.479,00	702.521,00	4.400.000,00		92.437,00		4.307.563,00	10.550.408,55	
N/A	N/A		28/10/2024	C.E	053	N/A	Reintegro rendimientos financieros Junio a Septiembre del 2024	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL					86.748,67		86.748,67		-		86.748,67	10.463.659,88	
N/A	Interéses Generados	1.252,51	31/10/2024	N.C	006	N/A	Rendimientos Financieros	O.A.C	901.705.545	Vereda La Esmeralda	3124077972	jacveredlaesmeraldaup@gmail.com	1.252,51		1.252,51		-		1.252,51	10.464.912,39	
3	Gastos Administrativos		31/10/2024	N.C	006	N/A	Gastos Financieros	Banco de Occidente	890.300.279				185.815,60		185.815,60		-		185.815,60	10.279.096,79	

Firma: Hernan Sanchez H
Nombre: HERNÁN SÁNCHEZ HUERTAS
Representante Legal

Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado

Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

ANEXO 8.12.2.

8.12.2. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

ANEXO 8.12.3.

8.12.3. Informe de inversión y buen manejo de desembolso de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#33760

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** OCTUBRE del 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3760 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 199.663.426,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4136 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
033	1/10/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Pago sueldo Administración Sep.2024	$ 443.027,00	$ -	$ -	$ -	$ 443.027,00	3	Gastos Administrativos
034	1/10/2024	Emir Cespedes Lopez	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 337.867,00		$ -	$ -	$ 337.867,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	Hermel Dade Peña Paez	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 362.133,00		$ -	$ -	$ 362.133,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	José Diomedes Perdomo Carrillo	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 264.867,00		$ -	$ -	$ 264.867,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	Julian Andrés Ome Medina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 264.867,00		$ -	$ -	$ 264.867,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	Rigoberto Cubillos Velez	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 264.867,00		$ -	$ -	$ 264.867,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	Rodrigo Medina Castro	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 264.867,00		$ -	$ -	$ 264.867,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	William Tapiero Monje	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 264.867,00		$ -	$ -	$ 264.867,00	1	Costo Directo
034	1/10/2024	Wilson Tapiero Monge	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	$ 362.133,00		$ -	$ -	$ 362.133,00	1	Costo Directo
035	1/10/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Servicio de transporte de materiales	$ 1.350.000,00		$ 13.500	$ -	$ 1.336.500,00	1	Costo Directo
036	1/10/2024	Compensar	Seguridad Social Sep. 2024 Costo	$ 3.316.800,00		$ -	$ -	$ 3.316.800,00	1	Costo Directo

036	1/10/2024	Compensar	Seguridad Social Sep. 2024 Admón	$ 756.800,00		$ -	$ -	$ 756.800,00	3	Gastos Administrativos
037	11/10/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Anticipo sueldo Administración Oct.2024	$ 1.158.267,00		$ -	$ -	$ 1.158.267,00	3	Gastos Administrativos
038	11/10/2024	Emir Cespedes Lopez	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 682.267,00	-	$ -	$ -	$ 682.267,00	1	Costo Directo
038	11/10/2024	Hermel Dade Peña Paez	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 682.267,00		$ -	$ -	$ 682.267,00	1	Costo Directo
038	11/10/2024	José Diomedes Perdomo Carrillo	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 682.267,00		$ -	$ -	$ 682.267,00	1	Costo Directo
038	11/10/2024	Julian Andrés Ome Medina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 682.267,00		$ -	$ -	$ 682.267,00	1	Costo Directo
038	11/10/2024	Rigoberto Cubillos Velez	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 341.133,00		$ -	$ -	$ 341.133,00	1	Costo Directo
038	11/10/2024	Rodrigo Medina Castro	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 682.267,00		$ -	$ -	$ 682.267,00	1	Costo Directo
038	11/10/2024	William Tapiero Monje	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 682.267,00		$ -	$ -	$ 682.267,00	1	Costo Directo
039	15/10/2024	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Pago Retefuente Sep. 2024	$ 62.000,00		$ -	$ -	$ 62.000,00	N/A	Gastos Administrativos
040	16/10/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Servicio de transporte de materiales	$ 5.680.000,00		$ 56.800	$ -	$ 5.623.200,00	1	Costo Directo
041	18/10/2024	Gean Carlos Tapiero Monge	Subsidio transporte Presidente del OAC	$ 400.000,00		$ -	$ -	$ 400.000,00	3	Gastos Administrativos
042	18/10/2024	MATECO de Colombia S.A.S	Pago materiales de construcción	$ 1.856.820,00		$ 9.752	$ -	$ 1.847.068,00	1	Costo Directo
043	24/10/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Pago sueldo Administración Oct.2024	$ 525.760,00		$ -	$ -	$ 525.760,00	3	Gastos Administrativos
044	24/10/2024	Emir Cespedes Lopez	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 132.533,00		$ -	$ -	$ 132.533,00	1	Costo Directo
044	24/10/2024	Julian Andrés Ome Medina	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 223.066,00		$ -	$ -	$ 223.066,00	1	Costo Directo
044	24/10/2024	Rodrigo Medina Castro	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 132.533,00		$ -	$ -	$ 132.533,00	1	Costo Directo
044	24/10/2024	William Tapiero Monje	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	$ 223.066,00	-	$ -	$ -	$ 223.066,00	1	Costo Directo
045	24/10/2024	Wilson Tapiero Monge	Liquidación contrato de trabajo del 23 al 30 Sep.2024	$ 21.164,00	-	-	-	21.164,00	1	Costo Directo
046	24/10/2024	Rigoberto Cubillos Velez	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 06 Oct.2024	$ 260.567,00	-	-	-	260.567,00	1	Costo Directo
047	24/10/2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 22 Oct.2024	$ 752.691,00	-	-	-	752.691,00	3	Gastos Administrativos
048	24/10/2024	Emir Cespedes Lopez	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 16 al 18 Oct.2024	$ 329.308,00	-	-	-	329.308,00	1	Costo Directo
049	24/10/2024	Hermel Dade Peña Paez	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 23 al 15 Oct.2024	$ 175.666,00		-		175.666,00	1	Costo Directo
050	24/10/2024	José Diomedes Perdomo Carrillo	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 15 Oct.2024	$ 369.103,00		-		369.103,00	1	Costo Directo
051	24/10/2024	Julian Andrés Ome Medina	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 20 Oct.2024	$ 419.355,00	-	-	-	419.355,00	1	Costo Directo
052	24/10/2024	Rodrigo Medina Castro	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 18 Oct.2024	$ 399.416,00	-	-	-	399.416,00	1	Costo Directo
053	24/10/2024	William Tapiero Monje	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 20 Oct.2024	$ 419.355,00	-	-	-	419.355,00	1	Costo Directo
054	24/10/2024	Carlos Alberto Zambrano Gonzalez	Pago No. 2 Honorarios Ingeniero Residente	$ 6.250.000,00	-	-	-	6.250.000,00	3	Gastos Administrativos
055	28/10/2024	Compensar	Pago seguridad social octubre 2024 - Costo	$ 2.892.900,00	-	-	-	2.892.900,00	1	Costo Directo
055	28/10/2024	Compensar	Pago seguridad social octubre 2024 - Admón	$ 756.800,00	-	-	-	756.800,00	3	Gastos Administrativos
N.C 008	31/10/2024	Banco de Occidente	Gastos Financieros	$ 558.057,31	-	-	-	558.057,31	3	Gastos Administrativos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO

RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA	$ 150.980.064,00	$ 119.411.510,00	$ 25.022.855,00	$ 144.434.365,00	$ 6.545.699,00
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	4.529.402,00	-	-	-	4.529.402,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.153.960,00	20.640.752,93	$ 11.601.402,31	32.242.155,24	11.911.804,76
	TOTALES	**$ 199.663.426,00**	**$ 140.052.262,93**	**$ 36.624.257,31**	**$ 176.676.520,24**	**$ 22.986.905,76**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME **Octubre** (Indicar el mes) **$ 6.271,92** (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: **$ 233.088,77** (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES


COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

OBSERVACIONES:


NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Gean carlos tapiero.
Nombre: **GEAN CARLOS TAPIERO MONGE**
Representante Legal OAC



Firma:
Nombre: **ALVARO GASCA TORRES**
Contador de la OAC
Tarjeta Profesional No.: **96892-T**



Firma:
Nombre: **ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA**
Interventor
Matrícula Profesional No.: **19202-61820 CAU**



Firma:
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **25202-72334 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 08/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONVENIO No. 3760 del 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
	SALDO INICIAL	$ -	**1/10/2024**										$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 59.899.979,92**	
3	Gastos Administrativos		1/10/2024	C.E	033	Nómina	Pago sueldo Administración Sep.2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	89.004.542	Calle 33 No. 40-60 B. Cuatro Esquinas	3202284610	jasator_maestro@hotmail.com	$ 443.027,00		$ 443.027,00		$ -		$ 443.027,00	59.456.952,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	Emir Cespedes Lopez	1.007.442.880	Vereda Buenos Aires Bajo	320 9582147		$ 337.867,00		$ 337.867,00		$ -		$ 337.867,00	59.119.085,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	Hermel Dade Peña Paez	96.333.565	Vereda Buenos Aires Bajo	313 2483687		$ 362.133,00		$ 362.133,00		$ -		$ 362.133,00	58.756.952,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	José Diomedes Perdomo Carrillo	1.119.216.405	Vereda Buenos Aires Bajo	311 5734386		$ 264.867,00		$ 264.867,00		$ -		$ 264.867,00	58.492.085,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	Julian Andrés Ome Medina	1.007.443.505	Vereda Buenos Aires Bajo	312 3181130		$ 264.867,00		$ 264.867,00		$ -		$ 264.867,00	58.227.218,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	Rigoberto Cubillos Velez	1.673.785	Vereda Buenos Aires Bajo	320 3030587		$ 264.867,00		$ 264.867,00		$ -		$ 264.867,00	57.962.351,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	Rodrigo Medina Castro	14.259.112	Vereda Buenos Aires Bajo	320 7375206		$ 264.867,00		$ 264.867,00		$ -		$ 264.867,00	57.697.484,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	William Tapiero Monje	1.118.026.054	Vereda Buenos Aires Bajo	323 4559458		$ 264.867,00		$ 264.867,00		$ -		$ 264.867,00	57.432.617,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	034	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Sep.2024	Wilson Tapiero Monge	1.119.211.276	Vereda Buenos Aires Bajo	313 8411574		$ 362.133,00		$ 362.133,00		$ -		$ 362.133,00	57.070.484,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	035	D.E-006	Servicio de transporte de materiales	Jhon Jairo Saavedra Torres	89.004.542	Calle 33 No. 40-60 B. Cuatro Esquinas	3202284610	jasator_maestro@hotmail.com	$ 1.350.000,00		$ 1.350.000,00		$ 13.500,00		$ 1.336.500,00	55.733.984,92	
1	Costo Directo		1/10/2024	C.E	036	Planilla PILA	Seguridad Social Sep. 2024	Compensar					$ 3.316.800,00		$ 3.316.800,00		$ -		$ 3.316.800,00	52.417.184,92	
3	Gastos Administrativos		1/10/2024	C.E	036	Planilla PILA	Seguridad Social Sep. 2024	Compensar					$ 756.800,00		$ 756.800,00		$ -		$ 756.800,00	51.660.384,92	
3	Gastos Administrativos		11/10/2024	C.E	037	Nómina	Anticipo sueldo Administración Oct.2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	89.004.542	Calle 33 No. 40-60 B. Cuatro Esquinas	3202284610	jasator_maestro@hotmail.com	$ 1.158.267,00		$ 1.158.267,00		$ -		$ 1.158.267,00	50.502.117,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	Emir Cespedes Lopez	1.007.442.880	Vereda Buenos Aires Bajo	320 9582147		$ 682.267,00		$ 682.267,00		$ -		$ 682.267,00	49.819.850,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	Hermel Dade Peña Paez	96.333.565	Vereda Buenos Aires Bajo	313 2483687		$ 682.267,00		$ 682.267,00		$ -		$ 682.267,00	49.137.583,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	José Diomedes Perdomo Carrillo	1.119.216.405	Vereda Buenos Aires Bajo	311 5734386		$ 682.267,00		$ 682.267,00		$ -		$ 682.267,00	48.455.316,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	Julian Andrés Ome Medina	1.007.443.505	Vereda Buenos Aires Bajo	312 3181130		$ 682.267,00		$ 682.267,00		$ -		$ 682.267,00	47.773.049,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	Rigoberto Cubillos Velez	1.673.785	Vereda Buenos Aires Bajo	320 3030587		$ 341.133,00		$ 341.133,00		$ -		$ 341.133,00	47.431.916,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	Rodrigo Medina Castro	14.259.112	Vereda Buenos Aires Bajo	320 7375206		$ 682.267,00		$ 682.267,00		$ -		$ 682.267,00	46.749.649,92	
1	Costo Directo		11/10/2024	C.E	038	Nómina	Anticipo sueldo Costo Directo Oct.2024	William Tapiero Monje	1.118.026.054	Vereda Buenos Aires Bajo	323 4559458		$ 682.267,00		$ 682.267,00		$ -		$ 682.267,00	46.067.382,92	
N/A	N/A		15/10/2024	C.E	039	Declaración	Pago Retefuente Sep. 2024	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales					$ 62.000,00		$ 62.000,00		$ -		$ 62.000,00	46.005.382,92	
1	Costo Directo		16/10/2024	C.E	040	D.E-007	Servicio de transporte de materiales	Jhon Jairo Saavedra Torres	89.004.542	Calle 33 No. 40-60 B. Cuatro Esquinas	3202284610	jasator_maestro@hotmail.com	$ 5.680.000,00		$ 5.680.000,00		$ 56.800,00		$ 5.623.200,00	40.382.182,92	
3	Gastos Administrativos		18/10/2024	C.E	041	N/A	Subsidio transporte Presidente del OAC	Gean Carlos Tapiero Monge	1.006.529.457	Vereda Buenos Aires Bajo	302 7296169	veredabuenosairesbajos@gmail.com	$ 400.000,00		$ 400.000,00		$ -		$ 400.000,00	39.982.182,92	
1	Costo Directo		18/10/2024	C.E	042	FVE-4653	Pago materiales de construcción	MATECO de Colombia S.A.S	901.307.417	Calle 33 No. 22E Calle 12	318 2098864	comprasmateco@gmail.com	$ 1.560.353,00	$ 296.467,00	$ 1.856.820,00		$ 9.752,00		$ 1.847.068,00	38.135.114,92	
3	Gastos Administrativos		24/10/2024	C.E	043	Nómina	Pago sueldo Administración Oct.2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	89.004.542	Calle 33 No. 40-60 B. Cuatro Esquinas	3202284610	jasator_maestro@hotmail.com	$ 525.760,00		$ 525.760,00		$ -		$ 525.760,00	37.609.354,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	044	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	Emir Cespedes Lopez	1.007.442.880	Vereda Buenos Aires Bajo	320 9582147		$ 132.533,00		$ 132.533,00		$ -		$ 132.533,00	37.476.821,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	044	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	Julian Andrés Ome Medina	1.007.443.505	Vereda Buenos Aires Bajo	312 3181130		$ 223.066,00		$ 223.066,00		$ -		$ 223.066,00	37.253.755,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	044	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	Rodrigo Medina Castro	14.259.112	Vereda Buenos Aires Bajo	320 7375206		$ 132.533,00		$ 132.533,00		$ -		$ 132.533,00	37.121.222,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	044	Nómina	Pago sueldo Costo Directo Oct.2024	William Tapiero Monje	1.118.026.054	Vereda Buenos Aires Bajo	323 4559458		$ 223.066,00		$ 223.066,00		$ -		$ 223.066,00	36.898.156,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	045	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo del 23 al 30 Sep.2024	Wilson Tapiero Monge	1.119.211.276	Vereda Buenos Aires Bajo	313 8411574		$ 21.164,00		$ 21.164,00		$ -		$ 21.164,00	36.876.992,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	046	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 06 Oct.2024	Rigoberto Cubillos Velez	1.673.785	Vereda Buenos Aires Bajo	320 3030587		$ 260.567,00		$ 260.567,00		$ -		$ 260.567,00	36.616.425,92	

3	Gastos Administrativos		24/10/2024	C.E	047	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 22 Oct.2024	Jhon Jairo Saavedra Torres	89.004.542	Calle 33 No. 40-60 B. Cuatro Esquinas	3202284610	jasator_maestro@hotmail.com	$ 752.691,00		$ 752.691,00		$ -		$ 752.691,00	35.863.734,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	048	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 16 al 18 Oct.2024	Emir Cespedes Lopez	1.007.442.880	Vereda Buenos Aires Bajo	320 9582147		$ 329.308,00		$ 329.308,00		$ -		$ 329.308,00	35.534.426,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	049	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 23 al 15 Oct.2024	Hermel Dade Peña Paez	96.333.565	Vereda Buenos Aires Bajo	313 2483687		$ 175.666,00		$ 175.666,00		$ -		$ 175.666,00	35.358.760,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	050	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 15 Oct.2024	José Diomedes Perdomo Carrillo	1.119.216.405	Vereda Buenos Aires Bajo	311 5734386		$ 369.103,00		$ 369.103,00		$ -		$ 369.103,00	34.989.657,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	051	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 20 Oct.2024	Julian Andrés Ome Medina	1.007.443.505	Vereda Buenos Aires Bajo	312 3181130		$ 419.355,00		$ 419.355,00		$ -		$ 419.355,00	34.570.302,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	052	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 18 Oct.2024	Rodrigo Medina Castro	14.259.112	Vereda Buenos Aires Bajo	320 7375206		$ 399.416,00		$ 399.416,00		$ -		$ 399.416,00	34.170.886,92	
1	Costo Directo		24/10/2024	C.E	053	Liquidación contrato	Liquidación contrato de trabajo de Sep. 09 al 20 Oct.2024	William Tapiero Monje	1.118.026.054	Vereda Buenos Aires Bajo	323 4559458		$ 419.355,00		$ 419.355,00		$ -		$ 419.355,00	33.751.531,92	
3	Gastos Administrativos		24/10/2024	C.E	054	FEZ-42	Pago No. 2 Honorarios Ingeniero Residente	Carlos Alberto Zambrano Gonzalez	79.695.240	CL 26 19 26 BRR ACOLSURE	3142187509	carlosydiana20@gmail.com	$ 6.250.000,00		$ 6.250.000,00		$ -		$ 6.250.000,00	27.501.531,92	
1	Costo Directo		28/10/2024	C.E	055	Planilla PILA	Pago seguridad social octubre 2024 - Costo	Compensar					$ 2.892.900,00		$ 2.892.900,00		$ -		$ 2.892.900,00	24.608.631,92	
3	Gastos Administrativos		28/10/2024	C.E	055	Planilla PILA	Pago seguridad social octubre 2024 - Admón	Compensar					$ 756.800,00		$ 756.800,00		$ -		$ 756.800,00	23.851.831,92	
N/A	INTERESES GENERADOS	6.271,92	31/10/2024	N.C	007	N/A	Rendimientos Financieros	O.A.C	900.787.710	Vereda Buenos Aires Bajo		jacveredabuenosairesbajos@gmail.com	$ 6.271,92		$ 6.271,92		$ -		$ 6.271,92	23.858.103,84	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		31/10/2024	N.C	007	N/A	Gastos Financieros	Banco de Occidente	890.300.279				$ 558.057,31		$ 558.057,31		$ -		$ 558.057,31	$ 23.300.046,53	

Firma: Gean Carlos Tapiero.
Nombre: GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-61820 CAU

Firma:
Nombre: ALVARO GASCA TORRES
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 96892-T

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

ANEXO 8.13.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

ANEXO 8.13.1.

Seguimiento programa de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379-2023

HERNÁN SANCHEZ HUERTAS
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA LA ESMERALDA

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 179.200,00	$ 59.733,33	$ 59.733,33	$ 59.733,33													**$ 179.200,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 95.094,00				$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40	$ 9.509,40			**$ 95.094,00**
320.3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 25.052.077,00			$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40	$ 5.010.415,40									**$ 25.052.077,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 79.685.538,00					$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67	$ 8.853.948,67			**$ 79.685.538,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 19.837.643,00					$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56	$ 2.204.182,56			**$ 19.837.643,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.523.302,00			$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20	$ 2.452.330,20				**$ 24.523.302,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 59.733,33**	**$ 3.213.128,40**	**$ 10.675.874,00**	**$ 10.625.650,07**	**$ 21.683.781,29**	**$ 21.683.781,29**	**$ 21.683.781,29**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.673.365,89**	**$ 16.013.510,09**	**$ 4.945.869,47**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,030%	1,623%	5,392%	5,366%	10,951%	10,951%	10,951%	8,421%	8,421%	8,421%	8,421%	8,421%	8,088%	2,498%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,030%	1,653%	7,045%	12,411%	23,362%	34,313%	45,264%	53,685%	62,106%	70,527%	78,948%	87,369%	95,457%	97,955%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	14,384%	22,831%	16,365%	8,296%	31,754%							
	ACUMULADO	0,000%	1,593%	3,185%	4,778%	6,370%	20,754%	43,585%	59,950%	68,246%	100,000%							

ANEXO 8.13.2.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441-2023

DUBERLEY TOLEDO COLLAZOS
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO DEL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 278.204,00	$ 92.734,67	$ 92.734,67	$ 92.734,67													**$ 278.204,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 106.440,00				$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00	$ 10.644,00			**$ 106.440,00**
320.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 21.422.151,00			$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20	$ 4.284.430,20									**$ 21.422.151,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 81.738.617,00					$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56	$ 9.082.068,56			**$ 81.738.617,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 20.714.774,00					$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56	$ 2.301.641,56			**$ 20.714.774,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 25.112.668,00			$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80	$ 2.511.266,80				**$ 25.112.668,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.481.186,00													$ 1.792.474,40	$ 1.792.474,40	$ 896.237,20	**$ 4.481.186,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.147.531,00		$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	$ 3.153.395,07	**$ 44.147.531,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 198.001.571,00	**$ 92.734,67**	**$ 3.246.129,74**	**$ 10.041.826,74**	**$ 9.959.736,07**	**$ 21.343.446,18**	**$ 21.343.446,18**	**$ 21.343.446,18**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 17.059.015,98**	**$ 16.340.223,58**	**$ 4.945.869,47**	**$ 4.049.632,27**	**$ 198.001.571,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,047%	1,639%	5,072%	5,030%	10,779%	10,779%	10,779%	8,616%	8,616%	8,616%	8,616%	8,616%	8,253%	2,498%	2,045%	100,000%
	ACUMULADO	0,047%	1,686%	6,758%	11,788%	22,567%	33,346%	44,125%	52,741%	61,357%	69,973%	78,589%	87,205%	95,458%	97,956%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,141%	1,593%	1,593%	1,593%	1,593%	12,466%	8,916%	19,135%	10,205%	18,908%	4,132%	5,102%	5,684%	8,942%		
	ACUMULADO	0,141%	1,733%	3,326%	4,918%	6,511%	18,977%	27,893%	47,028%	57,232%	76,140%	80,272%	85,374%	91,058%	100,000%		

ANEXO 8.13.3.

Seguimiento programa de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760-2023

GEAN CARLOS TAPIERO MONGE
PRESIDENTE Y REP. LEGAL DE JAC DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
INTERVENTOR DE OBRA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

ITEM	CAPITULOS	V / PROGRAMADO	SEMANA 1 (24 JUN - 30 JUN)	SEMANA 2 (1 JUL - 7 JUL)	SEMANA 3 (8 JUL - 14 JUL)	SEMANA 4 (15 JUL - 21 JUL)	SEMANA 5 (22 JUL - 28 JUL)	SEMANA 6 (29 JUL - 4 AGOS)	SEMANA 7 (5 AGOS - 11 AGOS)	SEMANA 8 (12 AGOS - 18 AGOS)	SEMANA 9 (19 AGOS - 25 AGOS)	SEMANA 10 (26 AGOS - 1 SEP)	SEMANA 11 (2 SEP - 8 SEP)	SEMANA 12 (9 SEP - 15 SEP)	SEMANA 13 (16 SEP - 22 SEP)	SEMANA 14 (23 SEP - 29 SEP)	SEMANA 15 (30 SEP)	TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO																	
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE																	
800.1P	LIMPIEZA A MANO DE ALCANTARILLAS DE 600MM A 900MM	$ 0,00																**$ 0,00**
	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS																	
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$ 202.690,00	$ 67.563,33	$ 67.563,33	$ 67.563,33													**$ 202.690,00**
	SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO																	
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA																	
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	$ 89.865,00				$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50	$ 8.986,50			**$ 89.865,00**
320.3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	$ 25.038.882,00			$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40	$ 5.007.776,40									**$ 25.038.882,00**
630.1.4.1	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21 MPA (D) MEZCLA IN SITU	$ 80.323.942,00					$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44	$ 8.924.882,44			**$ 80.323.942,00**
630.1.7	CONCRETO CICLÓPEO RESISTENCIA 14 MPA (G)	$ 20.381.837,00					$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56	$ 2.264.648,56			**$ 20.381.837,00**
640.1	ACERO DE REFUERZO FY'=4200 KG/CM2 (60.000 PSI)	$ 24.942.848,00			$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80	$ 2.494.284,80				**$ 24.942.848,00**
	OTROS GASTOS NO BÁSICOS DE OBRA																	
	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.529.402,00													$ 1.811.760,80	$ 1.811.760,80	$ 905.880,40	**$ 4.529.402,00**
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.153.960,00		$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	$ 3.153.854,29	**$ 44.153.960,00**
	TOTAL PROYECTO	$ 199.663.426,00	**$ 67.563,33**	**$ 3.221.417,62**	**$ 10.723.478,82**	**$ 10.664.901,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 21.854.432,99**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.846.656,59**	**$ 16.164.132,59**	**$ 4.965.615,09**	**$ 4.059.734,69**	**$ 199.663.426,00**

PROGRAMADO	**SEMANAL**	0,034%	1,613%	5,371%	5,341%	10,946%	10,946%	10,946%	8,438%	8,438%	8,438%	8,438%	8,438%	8,096%	2,487%	2,033%	100,000%
	ACUMULADO	0,034%	1,647%	7,018%	12,359%	23,305%	34,251%	45,197%	53,635%	62,073%	70,511%	78,949%	87,387%	95,483%	97,970%	100,00%	

EJECUTADO	**SEMANAL**	0,000%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	1,580%	23,951%	1,580%	1,580%	6,320%	18,000%	35,934%	
	ACUMULADO	0,000%	1,580%	3,159%	4,739%	6,318%	7,898%	9,478%	11,057%	12,637%	36,588%	38,167%	39,747%	46,066%	64,066%	100,000%	

ANEXO 8.14.

8.14. ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA

ANEXO 8.14.1.

Actas de reunión de obra de la Vereda La Esmeralda – CS#3379

ANEXO 8.14.2.

Actas de reunión de obra de la Vereda Bajo Platanillo – CS#3441

ANEXO 8.14.3.

Actas de reunión de obra de la Vereda Buenos Aires Bajo – CS#3760

ANEXO 8.15.

EQUIPO Y VEHÍCULO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO:** 8

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4136 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No. 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES BAJO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIIONETA	MITSUBISHI DOBLE CABINA CON PLACA DE MATRICULA (**HQX980**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
MOTOCICLETA	HONDA CON CILINDRAJE 150 Cc CON PLACA DE MATRICULA (**RGK09F**)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO:** 8

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).


(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8.16.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **PERIODO MES:** 8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIO SOLIDARIO No: 3379 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONVENIO SOLIDARIO No: 3441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO

CONVENIO SOLIDARIO No: 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO

NOMBRE ARL: POSITIVA ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	7.692.245	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 4.060.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$4.060.000,00	$ 282.600,00	V	SANITAS	31199719	$ 507.500,00	COLPENSIONES	31199719	$ 649.600,00	$ -	$ -	$ -	
2	CESAR AUGUSTO GALINDEZ GARCIA	1.110.521.985	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	31506284	$ 52.000,00	PORVENIR	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	INGRID YULIETH MEJIA PEÑA	1.117.505.206	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31506284	$ 52.000,00	PORVENIR	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	ADRIANA JULIETH MONTOYA GONZALEZ	1.118.027.920	BIÓLOGA	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	ESSC ASMET SALUD	31506284	$ 52.000,00	COLPENSIONES	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	MAYRA KATHERINE BERMUDEZ PARRA	1.117.492.838	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	ELKIN DAVID RAMOS MOQUERA	$1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	31506284	$ 52.000,00	PORVENIR	31506284	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 9.260.000,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3-nov-24 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 61820 CAU

Firma

Nombre: José Ricardo Burbano Barcenas
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NARIÑO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7692245	0	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	I	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CENTRO		3114755282			ELKINRAMOS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31199719	I	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.439.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31199719	2024-11-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 7692245	RAMOS MOSQUERA ELKIN DAVID	4.060.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	4.060.000	649.600	0	0	SANITAS-EPS005	4.060.000	507.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	4.060.000	282.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	1.439.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7692245	0	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	I	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CENTRO		3114755282			ELKINRAMOS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-10	31199719	I	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.439.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31199719	2024-11-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.060.000	4.060.000	4.060.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	649.600	0	0	0	649.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	649.600	0	0	0	649.600
EPS(Administradoras: 1)				1	507.500	0	0	0	507.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	507.500	0	0	0	507.500
ARP(Administradoras: 1)				1	282.600	0	0	0	282.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	282.600	0	0	0	282.600
Gran Total					1.439.700	0	0	0	1.439.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7692245	1	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	B	014	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CRA 3 B BIS NO 12 18		0984359385			ELKINRAMOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31506284	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.415.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31506284	2024-11-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1117492838	BERMUDEZ PARRA MAYRA KATHERINE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 1110521985	GALINDEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
3	CC 1006524418	GALLEGO CALDERON DIEGO FERNANDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
4	CC 1117505206	MEJIA PEÑA INGRID YULIETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
5	CC 1118027920	MONTOYA GONZALEZ ADRIANA JULIETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
6	CC 1106713403	MORALES CORTES DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACA-CCF13	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 7692245	1	ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA	B	014	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CRA 3 B BIS NO 12 18		0984359385			ELKINRAMOS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31506284	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.415.000	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	31506284	2024-11-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.248.000	0	0	0	1.248.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	832.000	0	0	0	832.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 3)				6	312.000	0	0	0	312.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	104.000	0	0	0	104.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	104.000	0	0	0	104.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				6	543.000	0	0	0	543.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	543.000	0	0	0	543.000
CCF(Administradoras: 1)				6	312.000	0	0	0	312.000
COMFACA	CCF13	891190047	2	6	312.000	0	0	0	312.000
Gran Total					2.415.000	0	0	0	2.415.000

ANEXO 8.17.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 DE 2023 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

MES INFORME MENSUAL: 01/10/2024 al 31/10/2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO # 3441 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3379 DE 2023
CONVENIO SOLIDARIO # 3760 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO – MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO - MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1235223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$ 107.999.997,00	$ 59.317.251,70
TOTAL						$ 107.999.997,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 107.999.997,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jun-24	$ 16.059.055,00	$ 3.051.220,45	$ 19.110.275,45	$ -	$ 19.110.275,45	$ -		$ 88.889.721,55	$ 88.889.721,55		
2	jul-24	$ 24.850.815,00	$ 4.721.654,85	$ 29.572.469,85	$ -	$ 29.572.469,85	$ -		$ 59.317.251,70	$ 59.317.251,70		
3	ago-24	$ 24.781.721,00	$ 4.708.526,99	$ 29.490.247,99	$ -	$ 29.490.247,99	$ -		$ 29.827.003,71	$ 29.827.003,71		
4	sep-24	$ 24.869.420,00	$ 4.725.189,80	$ 29.594.609,80	$ -	$ 29.594.609,80	$ -		$ 232.393,91	$ 232.393,91		
TOTALES		**$ 90.561.011,00**	**$ 17.206.592,09**	**$ 107.767.603,09**	**$ -**	**$ 107.767.603,09**	**$ -**	**$ -**	**$ 232.393,91**	**$ 232.393,91**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.


RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)	$ 90.756.300,00		$ 90.756.300,00
IVA = 19% * (C) = (D)		$ 17.243.697,00	$ 17.243.697,00
VALOR TOTAL	$ 90.756.300,00	$ 17.243.697,00	$ 107.999.997,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-72334 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.18.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10-nov-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15-nov-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00

VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	31/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10-nov-23

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	31/03/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	31/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10-nov-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15-nov-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00

VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	30/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	30/04/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	30/04/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17-abr-24

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26/10/2023	31/12/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.600.000	26/10/2023	30/06/2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26/10/2023	30/06/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288

Certificado de modificación o anexo No.: 3 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4-may-24

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136 **INTERVENTOR:** ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10-nov-23

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15-nov-24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 107.999.997,00

VALOR ACUMULADO: $ 107.999.997,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.800.000	26	9	2024	15	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 21.600.000	26	9	2024	15	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 32.400.000	26	9	2024	15	11	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100009288


Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30-sep-24

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8.19.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ **No.** 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4136

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA Y MILAN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO # 3441 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 3379 DE 2023; CONVENIO SOLIDARIO # 3760 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO PLATANILLO – MUNICIPIO DE MILAN, CAQUETA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES BAJO - MUNICIPIO DE MONTAÑITA, CAQUETA

PLAZO INICIAL: HASTA 31/DIC/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 107.999.997,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 107.999.997,00

PLAZO ACUMULADO: 9,23 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _1_ de fecha 26/06/2024		AÑO 2024																				TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		OCT		NOV		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		Director de Interventoría	5.000.000,00		0,50	2.500.000,00			1,32	$ 6.600.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000	0,33	$ 1.650.000	0,17	$ 825.000			1,82	$ 9.075.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			4,00	$ 16.000.000			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	0,50	$ 2.000.000			5,50	$ 22.000.000,00
		Profesional ambiental	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,33	$ 924.000	0,17	$ 462.000			1,82	$ 5.082.000,00
		Profesional social	2.800.000,00		0,40	1.120.000,00			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,33	$ 924.000	0,17	$ 462.000			1,82	$ 5.082.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				3.000.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		Especialista en Estructuras	5.500.000,00																													
		Especialista en Vía y/o Pavimentos	5.500.000,00																													
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	5.500.000,00																													
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	5.500.000,00																													
		Especialista en diseño Geométrico	5.500.000,00																													
		Inspector	1.300.000,00		6,00	7.800.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		Inspector SST	1.300.000,00		0,50	650.000,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		NO PREVISTOS																														
		Profesional SST	2.800.000,00		-	-			1,32	$ 3.696.000			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,44	$ 1.232.000	0,33	$ 924.000	0,17	$ 462.000			1,82	$ 5.082.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						32.190.000,00				$ 33.688.000				$ -		$ -		$ 5.650.000		$ 9.346.000		$ 9.346.000		$ 9.346.000		$ 8.422.000		$ 4.211.000				$ 46.321.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36				2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						75.968.400,00				$ 79.503.680				$ -		$ -		$ 13.334.000		$ 22.056.560		$ 22.056.560		$ 19.875.920		$ 9.937.960				$ 109.317.560,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2024																				TOTAL	
											MES		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		VIÁTICOS																														
8	1	Viáticos Director y/o Especialistas	140.000,00	Día	4,00	560.000,00			0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
9	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014	550.000,00	Mes	12,00	6.600.000,00			4,00	$ 2.200.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 550.000	1,00	$ 550.000	1,00	$ 550.000	1,00	$ 550.000	1,00	$ 550.000	0,50	$ 275.000			5,50	$ 3.025.000,00
10	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equ	2.800.000,00	Según compro	2,00	5.600.000,00			0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
11	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimen	300.000,00	Según compro	3,00	900.000,00			0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		OTROS COSTOS								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
12	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye pe	176.200,00	Según compro	2,00	352.400,00			-	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
13	1	Edición de informes, papelería, reproducció	80.000,00	Según compro	3,00	240.000,00			4,00	$ 320.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	1,00	$ 80.000	0,50	$ 40.000			5,50	$ 440.000,00
14	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fa	140.000,00	Según compro	3,00	420.000,00			4,00	$ 560.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	1,00	$ 140.000	0,50	$ 70.000			5,50	$ 770.000,00
15	1	Veeduría Técnica Comunitaria	38.500,00	Según compro	3,00	115.500,00			0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
		OTROS COSTOS								$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -
16	1	Costos de alquiler de Equipo -Vehiculo mayo	5.391.378,00	Mes	-	-			1,32	$ 7.116.619,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 1.779.155	0,33	$ 1.779.155	0,33	$ 1.779.155	0,33	$ 1.779.155	0,33	$ 1.779.155	0,17	$ 889.577			1,82	$ 9.785.351,00
16	1	Oficina (incluye servicios públicos)	800.000,00	Mes	-	-			1,32	$ 1.056.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,33	$ 264.000	0,33	$ 264.000	0,33	$ 264.000	0,33	$ 264.000	0,33	$ 264.000	0,17	$ 132.000			1,82	$ 1.452.000,00
17	1	AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								$ 1,00																						
+		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				14.787.900,00				$ 11.252.620,00				$ -		$ -		$ 2.813.155		$ 2.813.155		$ 2.813.155		$ 2.813.155		$ 1.406.577				$ 15.472.351,00
+		SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)				90.756.300,00				$ 90.756.300,00				$ -		$ -		$ 16.147.155		$ 24.869.715		$ 24.869.715		$ 24.869.715		$ 22.689.075		$ 11.344.537				$ 124.789.911,00
+		IVA = 19% * (C) = (D)				17.243.697,00				$ 17.243.697,00				$ -		$ -		$ 3.067.959		$ 4.725.246		$ 4.725.246		$ 4.725.246		$ 4.310.924		$ 2.155.462				$ 23.710.083,09
+		COSTO TOTAL = (C) + (D)				107.999.997,00				$ 107.999.997,00				$ -		$ -		$ 19.215.114		$ 29.594.961		$ 29.594.961		$ 29.594.961		$ 26.999.999		$ 13.499.999				$ 148.499.994,09

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

PLAN DE CARGAS INICIAL

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por necesidades en la ejecución del contrato se hace necesario la modificación de la dedicación de los profesionales vinculados al proyecto.

Ya que el objeto de la interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra y/o las JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (OAC) durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente y velando por la correcta ejecución de los trabajos, fue necesario prorrogar el plazo contractual de los convenios solidarios y en consecuencia prorrogar el plazo de la Interventoría en hasta el 15 de noviembre de 2024, plazo necesario para: a) la culminación de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías que ejecutan las OAC, b) dar cumplimiento a los compromisos en los planes de Gestión Social y Gestión Ambiental adquiridos por las OAC y C) gestión documental de liquidación de los convenios.

Como se evidencia en el formato "MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS" de fecha 26/junio/2024, los recursos del contrato de interventoría de la referencia han sido distribuidos hasta el 30/septiembre/2024, es decir, se hace necesario la adición de recursos al contrato de interventoría de la referencia, para el correcto cumplimiento de sus funciones y/o obligaciones hasta el 15/noviembre/2024.

Las causas que justifican esta solicitud de adición son ajenas a la voluntad del contratista de Interventoría.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202 61820 CAU

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
