

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN**	**200 días**	**mar 16/07/24**	**vie 28/02/25**		**$ 2.428.924.994,00**
2		INICIO	0 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24		$ 0,00
3		**CAPITULO II - EXPLANACIONES**	**63 días**	**sáb 24/08/24**	**lun 4/11/24**		**$ 351.056.822,00**
4		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	12 días	sáb 24/08/24	sáb 7/09/24	41	$ 4.480.000,00
5		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	12 días	sáb 24/08/24	sáb 7/09/24	4CC	$ 4.883.200,00
6		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	26 días	sáb 7/09/24	lun 7/10/24	4	$ 30.240.000,00
7		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	20 días	mié 18/09/24	vie 11/10/24	6CC+10 días	$ 117.516.500,00
8		**NO PREVISTOS**	15 días	lun 7/10/24	jue 24/10/24		**$ 74.745.632,00**
9		TERRAPLENES	15 días	lun 7/10/24	jue 24/10/24	6	$ 74.745.632,00
10		PEDRAPLEN COMPACTO	10 días	jue 24/10/24	lun 4/11/24	9	$ 119.191.490,00
11		**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**	**30 días**	**mié 2/10/24**	**mar 5/11/24**		**$ 548.652.750,00**
12		SUB-BASE GRANULAR CLASE B	20 días	mié 2/10/24	vie 25/10/24	7FC-15 días;3	$ 277.056.000,00
13		BASE GRANULAR CLASE B	20 días	mar 8/10/24	jue 31/10/24	12FC-15 días	$ 261.690.000,00
14		**NO PREVISTOS**	5 días	jue 31/10/24	mar 5/11/24		**$ 9.906.750,00**
15		CONFORMACION DE LA CALZADA	5 días	jue 31/10/24	mar 5/11/24	13	$ 9.906.750,00
16		**CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**	**75 días**	**sáb 16/11/24**	**mar 11/02/25**		**$ 693.240.000,00**
17		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-40	40 días	sáb 16/11/24	mié 1/01/25	15FC+10 días	$ 27.000.000,00
18		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	70 días	vie 22/11/24	mar 11/02/25	17CC+5 días	$ 666.240.000,00
19		**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**157 días**	**lun 2/09/24**	**jue 27/02/25**		**$ 689.603.100,00**
20		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	25 días	lun 2/09/24	lun 30/09/24	5CC+7 días	$ 34.440.000,00
21		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	18 días	sáb 14/09/24	vie 4/10/24	25CC+4 días	$ 19.932.000,00
22		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (Alcantarillas, losas, cabezales y demás estructuras)	25 días	lun 23/09/24	mar 22/10/24	24CC+7 días	$ 27.493.200,00
23		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado)	10 días	sáb 7/09/24	mié 18/09/24	20CC+5 días	$ 3.215.400,00
24		ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	15 días	sáb 14/09/24	mié 2/10/24	25CC+5 días	$ 243.000.000,00

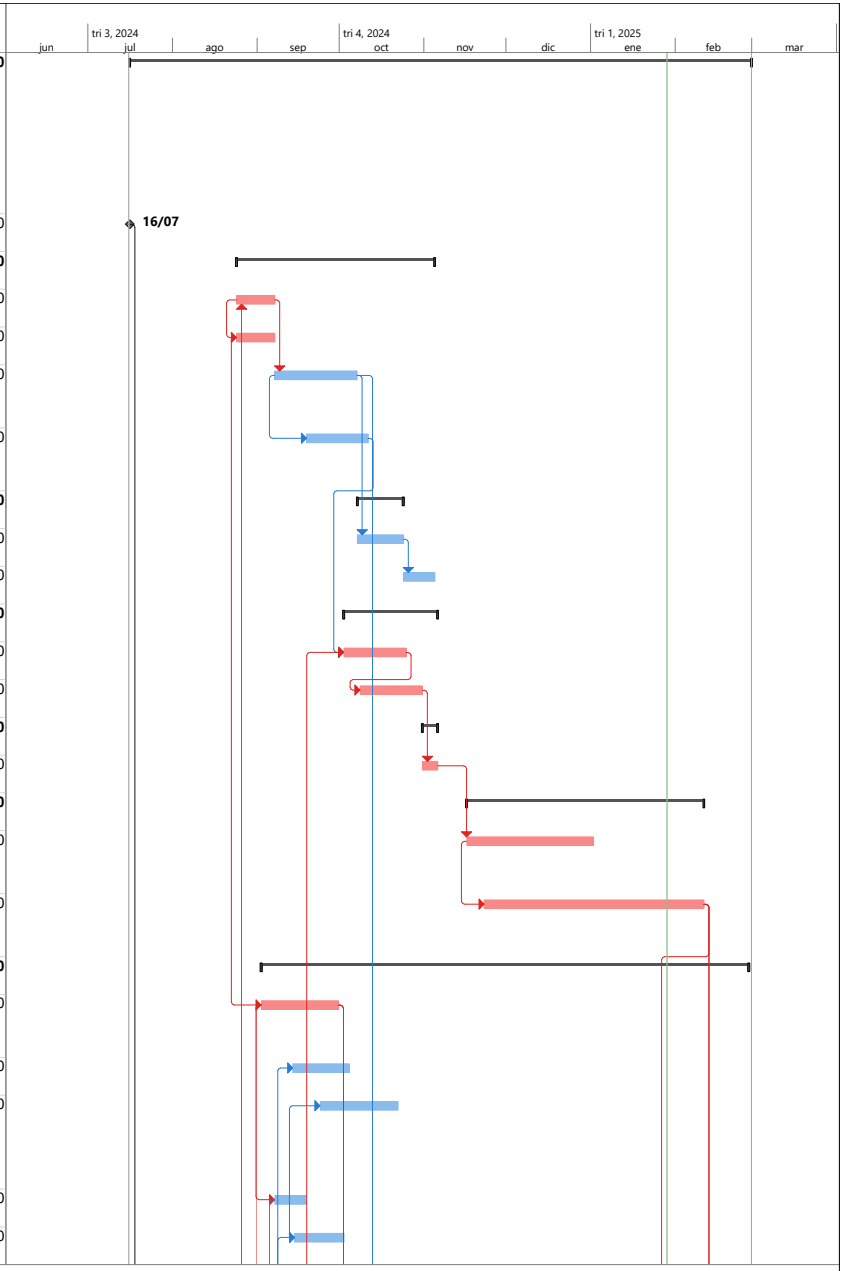

Proyecto: Programación - Prórr
Fecha: mié 29/01/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
25		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	20 días	mar 10/09/24	mié 2/10/24	23CC+2 días	$ 27.372.800,00
26		TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC 3722, DE DIAMETRO 65MM (3")	15 días	lun 30/09/24	jue 17/10/24	20	$ 12.900.000,00
27		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLÓPEO	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	20	$ 0,00
28		CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN SUPERFICIE DE APOYO (Berma cuneta)	25 días	jue 30/01/25	jue 27/02/25	18FC-10 días	$ 209.081.600,00
29		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	28CC	$ 0,00
30		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	10 días	mar 10/09/24	vie 20/09/24	20CC+7 días	$ 32.027.600,00
31		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	10 días	vie 20/09/24	mié 2/10/24	30	$ 80.140.500,00
32		**CAPITULO VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**	**25 días**	**vie 31/01/25**	**vie 28/02/25**		**$ 34.529.100,00**
33		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	16 días	mar 11/02/25	vie 28/02/25	18	$ 24.400.000,00
34		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	16 días	mar 11/02/25	vie 28/02/25	33FF	$ 590.400,00
35		TACHA REFLECTIVA	3 días	mié 26/02/25	vie 28/02/25	33FF	$ 3.000.000,00
36		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO DOBLE TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (60 cm X 60 cm)	16 días	mar 11/02/25	vie 28/02/25	18	$ 4.668.300,00
37		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	25 días	vie 31/01/25	vie 28/02/25	36FF	$ 1.870.400,00
38		**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**	**30 días**	**jue 5/09/24**	**mié 9/10/24**		**$ 34.304.300,00**
39		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	30 días	jue 5/09/24	mié 9/10/24	6FF+2 días	$ 34.304.300,00
40		**PGIO**	**95 días**	**sáb 14/09/24**	**mar 31/12/24**	**41FC+18 días**	**$ 35.627.062,00**
41		**REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS**	**35 días**	**mar 16/07/24**	**sáb 24/08/24**	**2**	**$ 41.911.860,00**
42		FIN	0 días	vie 28/02/25	vie 28/02/25	34;40	$ 0,00

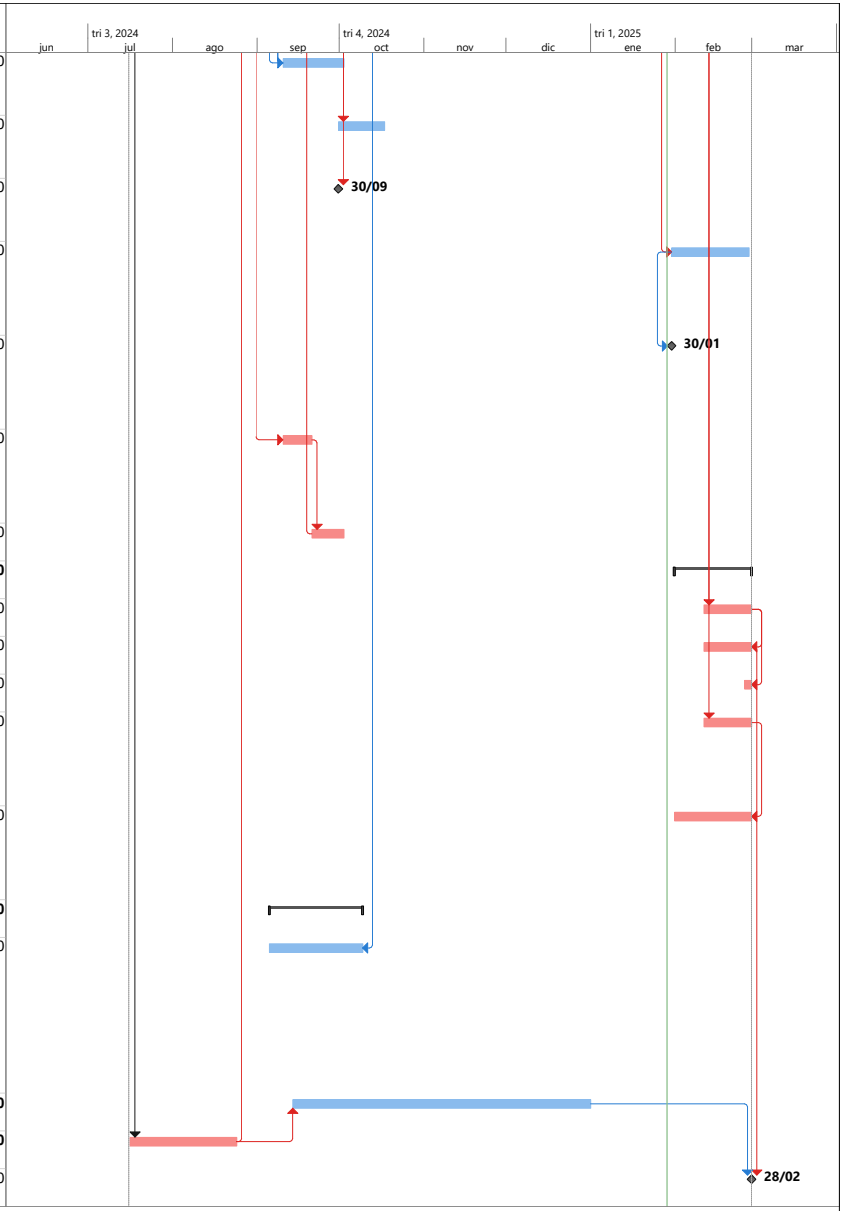

Proyecto: Programación - Prórr
Fecha: mié 29/01/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
