MEMORIA DE CANTIDADES

Edificio Gobernación, Calle 8, Cra 4 esquina.
Neiva - Huila - Colombia.


REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila


NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
MUNICIPIO	TELLO	**VERSIÓN:**		**FECHA DE EMISION**	
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	**NIT O C.C**	901.785.282-7	**CONTRATO N°**	015 DE 2024

CAPÍTULO	I	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**1.1 LOCALIZACIÒN Y REPLANTEO**	**UNIDAD**	**Km**	**UBICACIÓN**	**TOTALIDAD DE LA OBRA**


Tramo 1




Tramo 2




Tramo 3



Tramo 4, 5, 6



Tramo 7 y8



Localización	**Dimensiones** ancho (m)	largo (m)	largo (Km)	**UND**	**Medida Total**
Tramo 1	6,60	21,78	0,022	Km	0,022
Tramo 2	6,60	193	0,193	Km	0,193
Tramo 3	6,60	91,52	0,092	Km	0,092
Tramo 4	6,60	74,7	0,075	Km	0,075
Tramo 5	6,60	78	0,078	Km	0,078
Tramo 6	6,60	65,99	0,066	Km	0,066
Tramo 7	6,60	30	0,030	Km	0,030
Tramo 8	6,60	130	0,130	Km	0,130
Tramo 9	6,60	121,65	0,122	Km	0,122
Tramo 10	6,60	24,95	0,025	Km	0,025
Tramo 11	6,60	107,1	0,107	Km	0,107
Tramo 12	6,60	56	0,056	Km	0,056
Tramo 13	6,60	48,7	0,049	Km	0,049
Tramo 14	6,60	103,6	0,104	Km	0,104
Tramo 15	6,60	94,35	0,094	Km	0,094
Tramo 16	6,60	88,3	0,088	Km	0,088
Tramo 17	6,60	725,07	0,725	Km	0,725
Tramo 18	6,60	200	0,200	Km	0,200
Tramo 19	6,60	1360	1,360	Km	1,360
Tramo 20	6,60	206,35	0,206	Km	0,206
Tramo 21	6,60	66,97	0,067	Km	0,067
Tramo 22	6,60	52	0,052	Km	0,052
Tramo 23	6,60	120	0,120	Km	0,120
Tramo 24	6,60	825,99	0,826	Km	0,826
Tramo 25	6,60	446,63	0,447	Km	0,447
			Subtotal		5,33
			TOTAL		5,33

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC **INTERVENTORIA**


7

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA


Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	**VERSIÓN:**		**FECHA DE EMISION**			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	**NIT O C.C**	901.785.282-7	**CONTRATO N°**	015 DE 2024		
CAPÍTULO	1	**PRELIMINARES**	**ITEM**	1.2 Fresado de pavimientop asfaltico	**UNIDAD**	m2	**UBICACIÓN**	**TOTALIDAD DE LA OBRA**

Tramo 1




Tramo 2




Tramo 3



Tramo 4, 5, 6





Localización	Dimensiones ancho (m)	largo (m)	UND	Medida Total
Tramo 1	6,60	21,78	m2	143,75
Tramo 2	6,60	193	m2	1273,80
Tramo 3	6,60	91,52	m2	604,03
Tramo 4	6,60	74,7	m2	493,02
Tramo 5	6,60	78	m2	514,80
Tramo 6	6,60	65,99	m2	435,53
Tramo 7	6,60	30	m2	198,00
Tramo 8	6,60	130	m2	858,00
Tramo 9	6,60	121,65	m2	802,89
Tramo 10	6,60	24,95	m2	164,67
Tramo 11	6,60	107,1	m2	706,86
Tramo 12	6,60	56	m2	369,60
Tramo 13	6,60	48,7	m2	321,42
Tramo 14	6,60	103,6	m2	683,76
Tramo 15	6,60	94,35	m2	622,71
Tramo 16	6,60	88,3	m2	582,78
Tramo 17	6,60	725,07	m2	4785,46
Tramo 18	6,50	200	m2	1320,00
Tramo 19	6,60	1360	m2	8976,00
Tramo 20	6,60	206,35	m2	1361,91
Tramo 21	6,60	66,97	m2	442,00
Tramo 22	6,60	52	m2	343,20
Tramo 23	6,60	120	m2	792,00
Tramo 24	6,60	825,99	m2	5451,53
Tramo 25	6,60	446,63	m2	2947,76
		Subtotal		35.195,49
		TOTAL		35.195,49

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA


REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila


NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
MUNICIPIO	TELLO	**VERSIÓN:**		**FECHA DE EMISION**	
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	**NIT O C.C**	901.785.282-7	**CONTRATO N°**	015 DE 2024

CAPÍTULO	2	EXPLANACIONES	ITEM	2.1 Corte en Conglomerado	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA	


Tramo 2

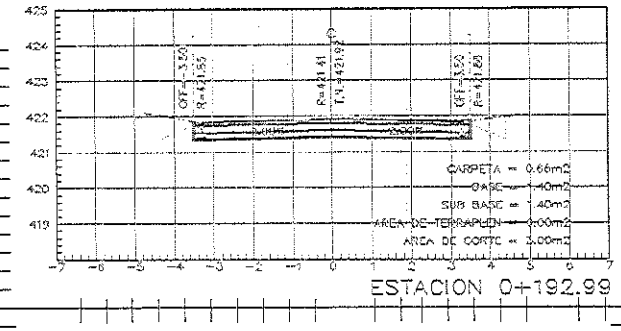

ESTACION 0+192.99

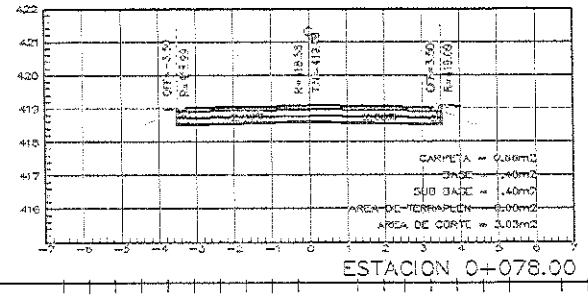

ESTACION 0+078.00

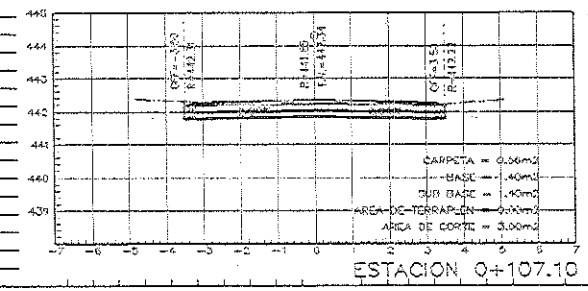

ESTACION 0+107.10

Localización	Dimensiones VOLUMEN (M3) EXCAVACION DE VIA	CANTIDAD	UND	Medida Total
TRAMO 1	Cartera Topográfica	65,56	m3	65,56
TRAMO 2	Cartera Topográfica	580,93	m3	580,93
TRAMO 3	Cartera Topográfica	275,48	m3	275,48
TRAMO 4	Cartera Topográfica	224,85	m3	224,85
TRAMO 5	Cartera Topográfica	234,78	m3	234,78
TRAMO 6	Cartera Topográfica	198,63	m3	198,63
TRAMO 7	Cartera Topográfica	90,30	m3	90,30
TRAMO 8	Cartera Topográfica	391,30	m3	391,30
TRAMO 9	Cartera Topográfica	366,17	m3	366,17
TRAMO 10	Cartera Topográfica	75,10	m3	75,10
TRAMO 11	Cartera Topográfica	322,37	m3	322,37
TRAMO 12	Cartera Topográfica	168,56	m3	168,56
TRAMO 13	Cartera Topográfica	146,59	m3	146,59
TRAMO 14	Cartera Topográfica	311,84	m3	311,84
TRAMO 15	Cartera Topográfica	283,99	m3	283,99
TRAMO 16	Cartera Topográfica	265,78	m3	265,78
TRAMO 17	Cartera Topográfica	2.182,46	m3	2182,46
TRAMO 18	Cartera Topográfica	602,00	m3	602,00
TRAMO 19	Cartera Topográfica	4.093,60	m3	4093,60
TRAMO 20	Cartera Topográfica	621,11	m3	621,11
TRAMO 21	Cartera Topográfica	201,58	m3	201,58
TRAMO 22	Cartera Topográfica	163,80	m3	163,80
TRAMO 23	Cartera Topográfica	378,00	m3	378,00
TRAMO 24	Cartera Topográfica	2.601,87	m3	2601,87
TRAMO 25	Cartera Topográfica	1.406,88	m3	1406,88
	Subtotal			16.253,52


	CUNETAS Long(m)	CANTIDAD Sección(m2) Ambos lados	UND	Medida Total
TRAMO 1	21,78	0,60	m3	13,07
TRAMO 2	193,00	0,60	m3	115,80
TRAMO 3	91,52	0,60	m3	54,91
TRAMO 4	74,70	0,60	m3	44,82
TRAMO 5	78,00	0,60	m3	46,80
TRAMO 6	65,99	0,60	m3	39,59
TRAMO 7	30,00	0,60	m3	18,00
TRAMO 8	130,00	0,60	m3	78,00
TRAMO 9	121,65	0,60	m3	72,99
TRAMO 10	24,95	0,60	m3	14,97
TRAMO 11	107,10	0,60	m3	64,26
TRAMO 12	56,00	0,60	m3	33,60
TRAMO 13	48,70	0,60	m3	29,22
TRAMO 14	103,60	0,60	m3	62,16
TRAMO 15	94,35	0,60	m3	56,61
TRAMO 16	88,30	0,60	m3	52,98
TRAMO 17	725,07	0,60	m3	435,04
TRAMO 18	200,00	0,60	m3	120,00
TRAMO 19	1.360,00	0,60	m3	816,00
TRAMO 20	206,35	0,60	m3	123,81
TRAMO 21	66,97	0,60	m3	40,18

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
MUNICIPIO	TELLO	VERSION:	FECHA DE EMISION
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C 901.785.282-7	CONTRATO N° 015 DE 2024

CAPÍTULO	2	EXPLANACIONES	ITEM	2.1 Corte en Conglomerado	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

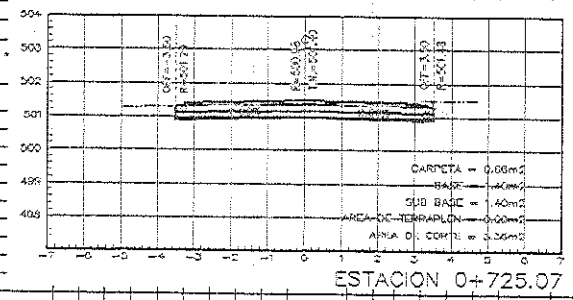

TRAMO 22	52,00	0,60	m3	31,20
TRAMO 23	120,00	0,60	m3	72,00
TRAMO 24	825,99	0,60	m3	495,59
TRAMO 25	446,63	0,60	m3	267,98
Subtotal				3.199,59

FILTROS	Long(m)	CANTIDAD Sección(m2)	UND	Medida Total
TRAMO 1			m3	0,00
TRAMO 2			m3	0,00
TRAMO 3			m3	0,00
TRAMO 4			m3	0,00
TRAMO 5			m3	0,00
TRAMO 6			m3	0,00
TRAMO 7			m3	0,00
TRAMO 8			m3	0,00
TRAMO 9			m3	0,00
TRAMO 10			m3	0,00
TRAMO 11			m3	0,00
TRAMO 12			m3	0,00
TRAMO 13			m3	0,00
TRAMO 14			m3	0,00
TRAMO 15			m3	0,00
TRAMO 16			m3	0,00
TRAMO 17	1.410 14	0,60	m3	846,08
TRAMO 18	200,00	0,60	m3	120,00
TRAMO 19	2.720 00	0,60	m3	1632,00
TRAMO 20			m3	0,00
TRAMO 21			m3	0,00
TRAMO 22			m3	0,00
TRAMO 23			m3	0,00
TRAMO 24	236,00	0,60	m3	141,60
TRAMO 25			m3	0,00
Subtotal				2.739,68

MUROS	Long(m)	CANTIDAD Sección(m2)	UND	Medida Total
TRAMO 17	7,00	15,00	m3	105,00
TRAMO 17	31,00	6,00	m3	186,00
Subtotal				291,00
TOTAL				22.483,80

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA


REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
MUNICIPIO	TELLO	VERSIÓN:		FECHA DE EMISION	
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°	015 DE 2024

CAPÍTULO	3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ITEM	3.1 Conformación de la calzada	UNIDAD	m2	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA


Tramo 1




Tramo 2




Tramo 3



Tramo 4, 5, 6



Tramo 7 y8



Localización	Dimensiones ancho (m)	largo (m)	Alto (m)	UND	Medida Total
Tramo 1	7,00	21,78		m2	152,46
Tramo 2	7,00	193,00		m2	1351,00
Tramo 3	7,00	91,52		m2	640,64
Tramo 4	7,00	74,70		m2	522,90
Tramo 5	7,00	78,00		m2	546,00
Tramo 6	7,00	65,99		m2	461,93
Tramo 7	7,00	30,00		m2	210,00
Tramo 8	7,00	130,00		m2	910,00
Tramo 9	7,00	121,65		m2	851,55
Tramo 10	7,00	24,95		m2	174,65
Tramo 11	7,00	107,10		m2	749,70
Tramo 12	7,00	56,00		m2	392,00
Tramo 13	7,00	48,70		m2	340,90
Tramo 14	7,00	103,60		m2	725,20
Tramo 15	7,00	94,35		m2	660,45
Tramo 16	7,00	88,30		m2	618,10
Tramo 17	7,00	725,07		m2	5075,49
Tramo 18	7,00	200,00		m2	1400,00
Tramo 19	7,00	1.360,00		m2	9520,00
Tramo 20	7,00	206,35		m2	1444,45
Tramo 21	7,00	66,97		m2	468,79
Tramo 22	7,00	52,00		m2	364,00
Tramo 23	7,00	120,00		m2	840,00
Tramo 24	7,00	825,99		m2	5781,93
Tramo 25	7,00	446,63		m2	3126,41
		Subtotal			37.328,55
		TOTAL			37.328,55

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA


ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA


Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	VERSIÓN:		FECHA DE EMISION			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°	015 DE 2024		
CAPÍTULO	3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ITEM	3.2 base granular	UNIDAD	m3	UBICACIÓN

Estructura sección 1 y 2.



Estructura sección 3.



Localización		CANTIDAD	UND	Medida Total
TRAMO 1	Cartera Topógrafica	30,49	m3	30,49
TRAMO 2	Cartera Topógrafica	270,20	m3	270,20
TRAMO 3	Cartera Topógrafica	128,13	m3	128,13
TRAMO 4	Cartera Topógrafica	104,58	m3	104,58
TRAMO 5	Cartera Topógrafica	109,20	m3	109,20
TRAMO 6	Cartera Topógrafica	92,39	m3	92,39
TRAMO 7	Cartera Topógrafica	42,00	m3	42,00
TRAMO 8	Cartera Topógrafica	182,00	m3	182,00
TRAMO 9	Cartera Topógrafica	170,31	m3	170,31
TRAMO 10	Cartera Topógrafica	34,93	m3	34,93
TRAMO 11	Cartera Topógrafica	149,94	m3	149,94
TRAMO 12	Cartera Topógrafica	78,40	m3	78,40
TRAMO 13	Cartera Topógrafica	68,18	m3	68,18
TRAMO 14	Cartera Topógrafica	145,04	m3	145,04
TRAMO 15	Cartera Topógrafica	132,09	m3	132,09
TRAMO 16	Cartera Topógrafica	123,62	m3	123,62
TRAMO 17	Cartera Topógrafica	1.015,10	m3	1015,10
TRAMO 18	Cartera Topógrafica	280,00	m3	280,00
TRAMO 19	Cartera Topógrafica	1.904,00	m3	1904,00
TRAMO 20	Cartera Topógrafica	288,89	m3	288,89
TRAMO 21	Cartera Topógrafica	93,76	m3	93,76
TRAMO 22	Cartera Topógrafica	72,80	m3	72,80
TRAMO 23	Cartera Topógrafica	168,00	m3	168,00
TRAMO 24	Cartera Topógrafica	1.156,39	m3	1156,39
TRAMO 25	Cartera Topógrafica	625,28	m3	625,28
Subtotal				7.465,71
TOTAL				7.465,71

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA


REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila


NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
MUNICIPIO	TELLO	VERSIÓN:		FECHA DE EMISION	
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°	015 DE 2024

CAPÍTULO	3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ITEM	3.3 Mezcla Densa en caliente MDC-19 - Compra de Mezcla	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

Estructura sección 1 y 2.



Estructura sección 3.



Localización		CANTIDAD	UND	Medida Total
TRAMO 1	Cartera Topográfica	14,37	m3	14,37
TRAMO 2	Cartera Topográfica	127,38	m3	127,38
TRAMO 3	Cartera Topográfica	60,40	m3	60,40
TRAMO 4	Cartera Topográfica	49,30	m3	49,30
TRAMO 5	Cartera Topográfica	51,48	m3	51,48
TRAMO 6	Cartera Topográfica	43,55	m3	43,55
TRAMO 7	Cartera Topográfica	19,80	m3	19,80
TRAMO 8	Cartera Topográfica	85,80	m3	85,80
TRAMO 9	Cartera Topográfica	80,29	m3	80,29
TRAMO 10	Cartera Topográfica	16,47	m3	16,47
TRAMO 11	Cartera Topográfica	70,69	m3	70,69
TRAMO 12	Cartera Topográfica	36,96	m3	36,96
TRAMO 13	Cartera Topográfica	32,14	m3	32,14
TRAMO 14	Cartera Topográfica	68,38	m3	68,38
TRAMO 15	Cartera Topográfica	62,27	m3	62,27
TRAMO 16	Cartera Topográfica	58,28	m3	58,28
TRAMO 17	Cartera Topográfica	478,55	m3	478,55
TRAMO 18	Cartera Topográfica	132,00	m3	132,00
TRAMO 19	Cartera Topográfica	897,60	m3	897,60
TRAMO 20	Cartera Topográfica	136,19	m3	136,19
TRAMO 21	Cartera Topográfica	44,20	m3	44,20
TRAMO 22	Cartera Topográfica	41,18	m3	41,18
TRAMO 23	Cartera Topográfica	95,04	m3	95,04
TRAMO 24	Cartera Topográfica	654,18	m3	654,18
TRAMO 25	Cartera Topográfica	353,73	m3	353,73
	Subtotal			3.710,24
	TOTAL			3.710,24

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA


ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA


Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	VERSIÓN:		FECHA DE EMISION			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°	015 DE 2024		
CAPÍTULO	3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ITEM	3.4 Sub - base granular	UNIDAD	m3	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

Estructura sección 1 y 2.



Estructura sección 3.



Localización		CANTIDAD	UND	Medida Total
Tramo 1	Cartera Topográfica	30,49	m3	30,49
Tramo 2	Cartera Topográfica	270,20	m3	270,20
Tramo 3	Cartera Topográfica	128,13	m3	128,13
Tramo 4	Cartera Topográfica	104,58	m3	104,58
Tramo 5	Cartera Topográfica	109,20	m3	109,20
Tramo 6	Cartera Topográfica	92,39	m3	92,39
Tramo 7	Cartera Topográfica	42,00	m3	42,00
Tramo 8	Cartera Topográfica	182,00	m3	182,00
Tramo 9	Cartera Topográfica	170,31	m3	170,31
Tramo 10	Cartera Topográfica	34,93	m3	34,93
Tramo 11	Cartera Topográfica	149,94	m3	149,94
Tramo 12	Cartera Topográfica	78,40	m3	78,40
Tramo 13	Cartera Topográfica	68,18	m3	68,18
Tramo 14	Cartera Topográfica	145,04	m3	145,04
Tramo 15	Cartera Topográfica	132,09	m3	132,09
Tramo 16	Cartera Topográfica	123,62	m3	123,62
Tramo 17	Cartera Topográfica	1.015,10	m3	1015,10
Tramo 18	Cartera Topográfica	280,00	m3	280,00
Tramo 19	Cartera Topográfica	1.904,00	m3	1904,00
Tramo 20	Cartera Topográfica	288,89	m3	288,89
Tramo 21	Cartera Topográfica	93,76	m3	93,76
Tramo 22	Cartera Topográfica	72,80	m3	72,80
Tramo 23	Cartera Topográfica	168,00	m3	168,00
Tramo 24	Cartera Topográfica	1.156,39	m3	1156,39
Tramo 25	Cartera Topográfica	625,28	m3	625,28
			Subtotal	7.465,71
			TOTAL	7.465,71

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA


ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA


Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	VERSIÓN:		FECHA DE EMISION			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°	015 DE 2024		
CAPÍTULO	3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ITEM	3.5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	UNIDAD	m2	UBICACIÓN

Tramo 1




Tramo 2




Tramo 3



Tramo 4, 5, 6



Tramo 7 y8



Localización	Dimensiones ancho (m)	largo (m)	alto	UND	Medida Total
Tramo 1	6,60	21,78		m2	143,75
Tramo 2	6,60	193,00		m2	1273,80
Tramo 3	6,60	91,52		m2	604,03
Tramo 4	6,60	74,70		m2	493,02
Tramo 5	6,60	78,00		m2	514,80
Tramo 6	6,60	65,99		m2	435,53
Tramo 7	6,60	30,00		m2	198,00
Tramo 8	6,60	130,00		m2	858,00
Tramo 9	6,60	121,65		m2	802,89
Tramo 10	6,60	24,95		m2	164,67
Tramo 11	6,60	107,10		m2	706,86
Tramo 12	6,60	56,00		m2	369,60
Tramo 13	6,60	48,70		m2	321,42
Tramo 14	6,60	103,60		m2	683,76
Tramo 15	6,60	94,35		m2	622,71
Tramo 16	6,60	88,30		m2	582,78
Tramo 17	6,60	725,07		m2	4785,46
Tramo 18	6,60	200,00		m2	1320,00
Tramo 19	6,60	1.360,00		m2	8976,00
Tramo 20	6,60	206,35		m2	1361,91
Tramo 21	6,60	66,97		m2	442,00
Tramo 22	6,60	52,00		m2	343,20
Tramo 23	6,60	120,00		m2	792,00
Tramo 24	6,60	825,99		m2	5451,53
Tramo 25	6,60	448,63		m2	2947,76
		Subtotal			35.195,49
		TOTAL			35.195,49

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA


REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	**VERSIÓN:**		**FECHA DE EMISION**			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	**NIT O C.C**	901.785.282-7	**CONTRATO N°**		015 DE 2024	
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	**ITEM**	4,1 Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	**UNIDAD**	M3	**UBICACIÓN**

TOTALIDAD DE LA OBRA


Tramo 1



Tramo 2




Tramo 3



Tramo 4, 5, 6





Localización	Dimensiones area (m2)	largo (m)	Alto (m)	Cant	UND	Medida Total
Tramo 1	0,15	21,78		2,00	m3	6,53
Tramo 2	0,15	193,00		2,00	m3	57,90
Tramo 3	0,15	91,52		2,00	m3	27,46
Tramo 4	0,15	74,70		2,00	m3	22,41
Tramo 5	0,15	78,00		2,00	m3	23,40
Tramo 6	0,15	65,99		2,00	m3	19,80
Tramo 7	0,15	30,00		2,00	m3	9,00
Tramo 8	0,15	130,00		2,00	m3	39,00
Tramo 9	0,15	121,65		2,00	m3	36,50
Tramo 10	0,15	24,95		2,00	m3	7,49
Tramo 11	0,15	107,10		2,00	m3	32,13
Tramo 12	0,15	56,00		2,00	m3	16,80
Tramo 13	0,15	48,70		2,00	m3	14,61
Tramo 14	0,15	103,60		2,00	m3	31,08
Tramo 15	0,15	94,35		2,00	m3	28,31
Tramo 16	0,15	88,30		2,00	m3	26,49
Tramo 17	0,15	725,07		2,00	m3	217,52
Tramo 18	0,15	200,00		2,00	m3	60,00
Tramo 19	0,15	1.360,00		2,00	m3	408,00
Tramo 20	0,15	206,35		2,00	m3	61,91
Tramo 21	0,15	66,97		2,00	m3	20,09
Tramo 22	0,15	52,00		2,00	m3	15,60
Tramo 23	0,15	120,00		2,00	m3	36,00
Tramo 24	0,15	825,99		2,00	m3	247,80
Tramo 25	0,15	446,63		2,00	m3	133,99
		Subtotal				1.599,80
		TOTAL				1.599,80

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA


ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	VERSION:		FECHA DE EMISION			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°		015 DE 2024	
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	N.P 4.2 Material granular filtrante	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

SECCION

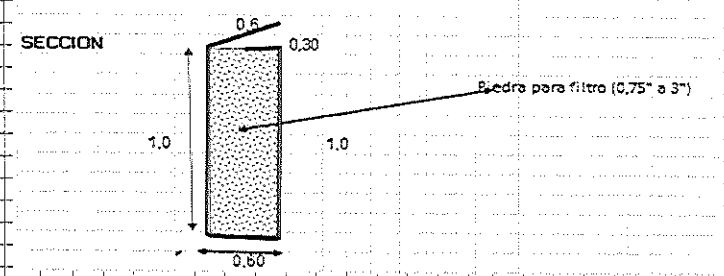

Localización	Dimensiones Area m2	largo (m) MI	largo (m) MD	UND	Medida Total
TRAMO 1				m3	0,00
TRAMO 2				m3	0,00
TRAMO 3				m3	0,00
TRAMO 4				m3	0,00
TRAMO 5				m3	0,00
TRAMO 6				m3	0,00
TRAMO 7				m3	0,00
TRAMO 8				m3	0,00
TRAMO 9				m3	0,00
TRAMO 10				m3	0,00
TRAMO 11				m3	0,00
TRAMO 12				m3	0,00
TRAMO 13				m3	0,00
TRAMO 14				m3	0,00
TRAMO 15				m3	0,00
TRAMO 16				m3	0,00
TRAMO 17	0,60	685,07	725,07	m3	846,08
TRAMO 18	0,60		200,00	m3	120,00
TRAMO 19	0,60	1.360,00	1.360,00	m3	1632,00
TRAMO 20				m3	0,00
TRAMO 21				m3	0,00
TRAMO 22				m3	0,00
TRAMO 23				m3	0,00
TRAMO 24	0,60	118,00	118,00	m3	141,60
TRAMO 25				m3	0,00
			Subtotal		2.739,68
			TOTAL		2.739,68

OBSERVACIONES


ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
MUNICIPIO	TELLO		VERSIÓN:		FECHA DE EMISION				
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello		NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°			015 DE 2024	
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	N.P 4.3 Geotextil no tejido 2500	UNIDAD	Und	M2	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

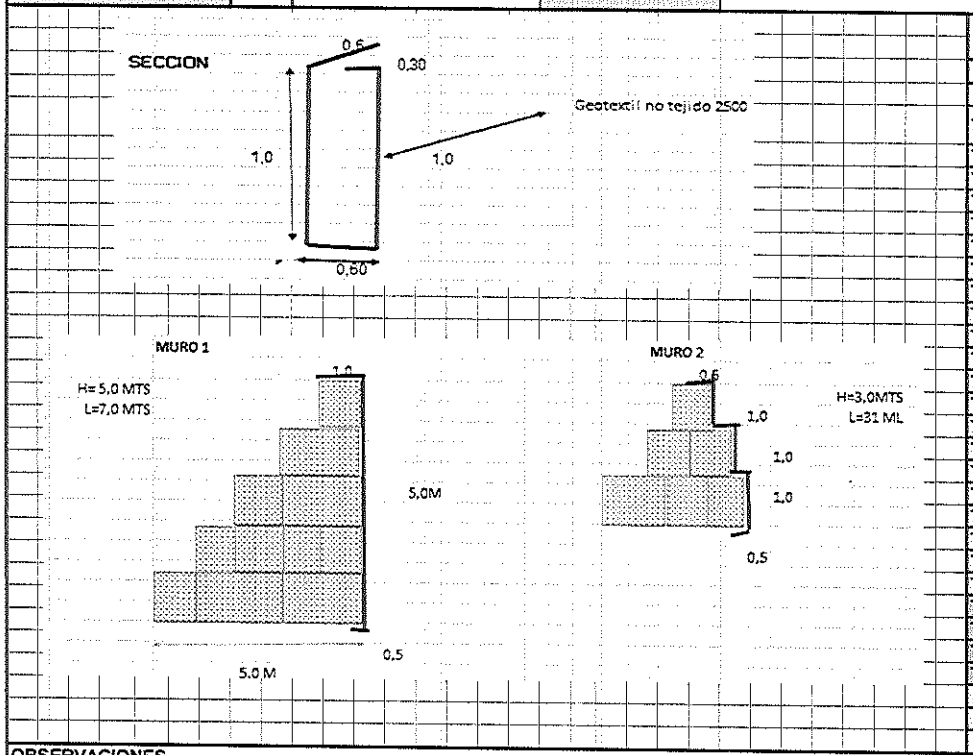

Localización	Dimensiones Long(m)	Alto(m)	ancho(m)		UND	Medida Total
Tramo 1					m2	0,00
Tramo 2					m2	0,00
Tramo 3					m2	0,00
Tramo 4					m2	0,00
Tramo 5					m2	0,00
Tramo 6					m2	0,00
Tramo 7					m2	0,00
Tramo 8					m2	0,00
Tramo 9					m2	0,00
Tramo 10					m2	0,00
Tramo 11					m2	0,00
Tramo 12					m2	0,00
Tramo 13					m2	0,00
Tramo 14					m2	0,00
Tramo 15					m2	0,00
Tramo 16					m2	0,00
Tramo 17	1410,14	1,00	0,60		m2	4938,99
Tramo 18	200	1,00	0,60		m2	703,50
Tramo 19	2720	1,00	0,60		m2	9523,50
Tramo 20					m2	0,00
Tramo 21					m2	0,00
Tramo 22					m2	0,00
Tramo 23					m2	0,00
Tramo 24	236	1,00	0,60		m2	829,50
Tramo 25					m2	0,00
Tramo 17 (Muro 1)	17,00	6,50			m2	110,50
Tramo 17 (Muro 2)	31,00	5,0			m2	155,00
			Subtotal			16.260,99
			TOTAL			16.260,99

OBSERVACIONES


ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
MUNICIPIO	TELLO		VERSIÓN:		FECHA DE EMISION				
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello		NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°			015 DE 2024	
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	N.P 4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PERFORADA DE 4"	UNIDAD	Und	ML	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

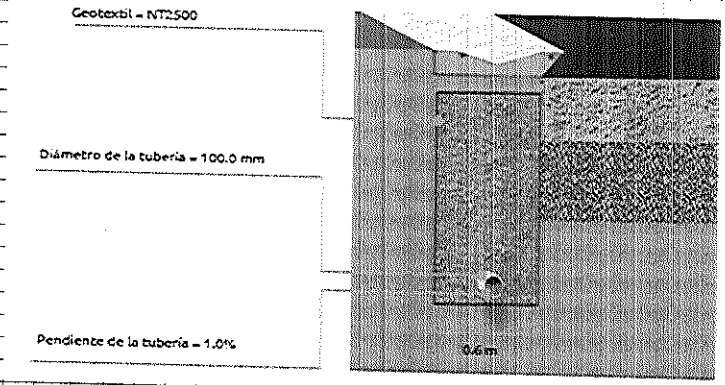

Localización	Dimensiones Long(m)	Alto(m)	ancho(m)		UND	Medida Total
Tramo 1					ml	0,00
Tramo 2					ml	0,00
Tramo 3					ml	0,00
Tramo 4					ml	0,00
Tramo 5					ml	0,00
Tramo 6					ml	0,00
Tramo 7					ml	0,00
Tramo 8					ml	0,00
Tramo 9					ml	0,00
Tramo 10					ml	0,00
Tramo 11					ml	0,00
Tramo 12					ml	0,00
Tramo 13					ml	0,00
Tramo 14					ml	0,00
Tramo 15					ml	0,00
Tramo 16					ml	0,00
Tramo 17	1410,14				ml	1410,14
Tramo 18	200				ml	200,00
Tramo 19	2720				ml	2720,00
Tramo 20					ml	0,00
Tramo 21					ml	0,00
Tramo 22					ml	0,00
Tramo 23					ml	0,00
Tramo 24	236				ml	236,00
Tramo 25					ml	0,00
				Subtotal		4.566,14
				TOTAL		4.566,14

OBSERVACIONES


ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA						
MUNICIPIO	TELLO	VERSIÓN:		FECHA DE EMISION			
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello	NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°	015 DE 2024		
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	N.P 4.5 GAVION EN PIEDRA ZONGA Y MEDIA ZONGA, MALLA C-12, ESCUADRÌA 10CM X 8CM, VENA C-10. INCLUYE ATIRANTAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. ESP. 681 INV.	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

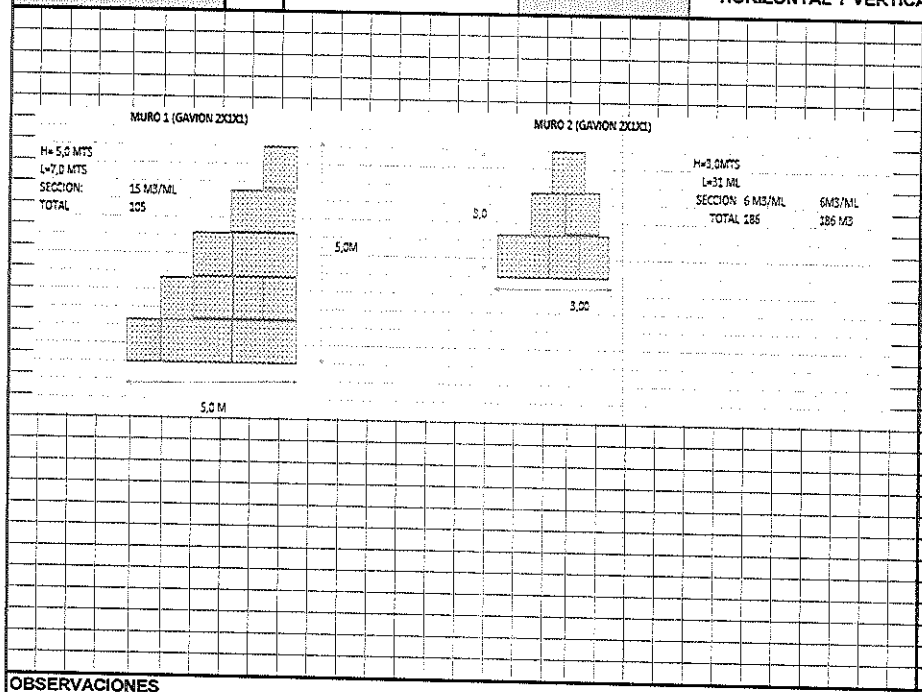

Localización	Dimensiones Long (m)	Dimensiones Sección		UND	Medida Total
Tramo 17(Muro 1)	7,00	15,00		m3	105,00
Tramo 17(Muro 2)	31,00	6,00		m3	186,00
Subtotal					291,00
TOTAL					291,00

OBSERVACIONES


ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

SOMOS GENTE POLÉNSEE GRANDES | Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
MUNICIPIO	TELLO		VERSIÓN:		FECHA DE EMISION				
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello		NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°			015 DE 2024	
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	N.P 4.6 CONCRETO PARA REVESTIMIENTO DE GAVIONES	UNIDAD	M2		UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

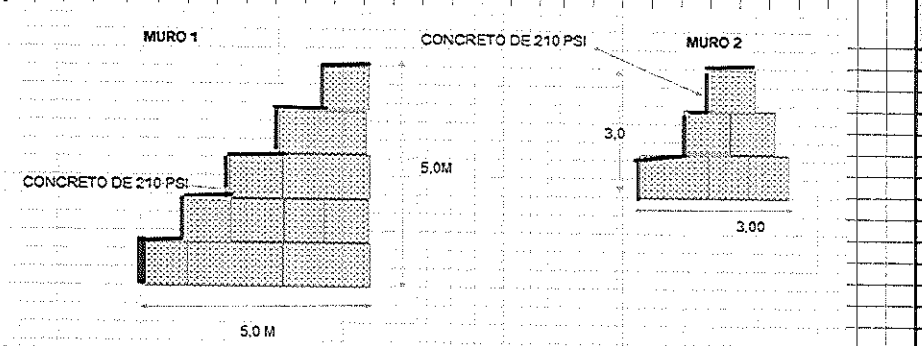

Localización	Dimensiones Long (m)	Ancho (m)				UND	Medida Total
Tramo 17(Muro 1)	7,00	10,00				m2	70,00
Tramo 17(Muro 1)	31,00	5,00				m2	155,00
Subtotal							225,00
TOTAL							225,00

OBSERVACIONES


ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
MUNICIPIO	TELLO		VERSIÓN:		FECHA DE EMISION				
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello		NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°				
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	4.7 BASE PARA PISO DE GAVIONES EN CONCRETO DE 21Mpa ESPESOR 20CMS	UNIDAD	M3		UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

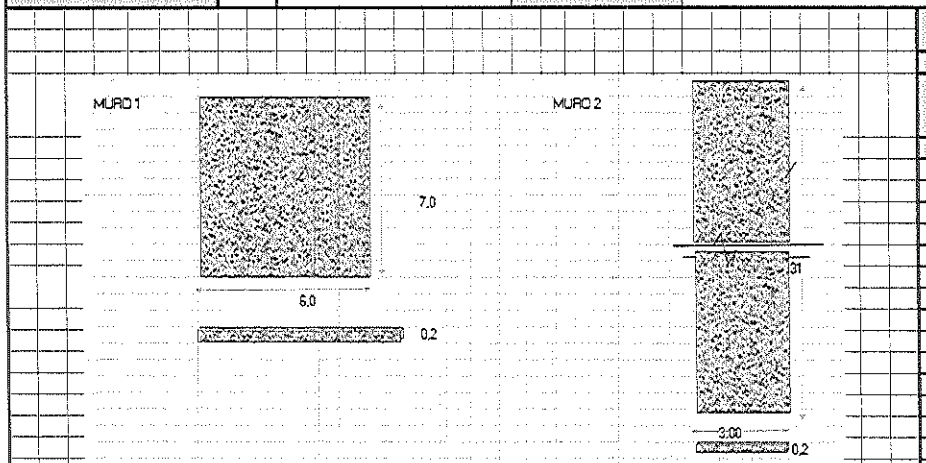

Localización	Dimensiones ancho (m)	largo (m)	espesor (m)		UND	Medida Total
Tramo 17(Muro1)	6,00	7,00	0,20		m3	8,40
Tramo 17(Muro2)	3,00	31,00	0,20		m3	18,60

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA								
MUNICIPIO	TELLO		VERSIÓN:		FECHA DE EMISION				
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello		NIT O C.C	901.785.282-7	CONTRATO N°			015 DE 2024	
CAPÍTULO	4	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	ITEM	4.8 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO . ESP. 610-13 P. INV	UNIDAD	M3		UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA

Localización		Dimensiones largo (m)	ancho (m)	espesor(m)	UND	Medida Total
Tramo 17(Muro 1)		7,00	5,00	1	m3	35,00
Tramo 17(Muro 2)		31,00	3,00	1	m3	93,00
				Subtotal		128,00
				TOTAL		128,00

OBSERVACIONES

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA


ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
MUNICIPIO	TELLO	**VERSION**		**FECHA DE EMISION**	
RESPONSABLE	Consorcio Infraestructura JPN Tello	**NIT O C.C.**	901.785.282-7	**CONTRATO N°**	015 DE 2024

CAPÍTULO	5	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	**ITEM**	5.1 Línea de demarcación con pintura en frío	**UNIDAD**	ML	**UBICACIÓN**	TOTALIDAD DE LA OBRA	

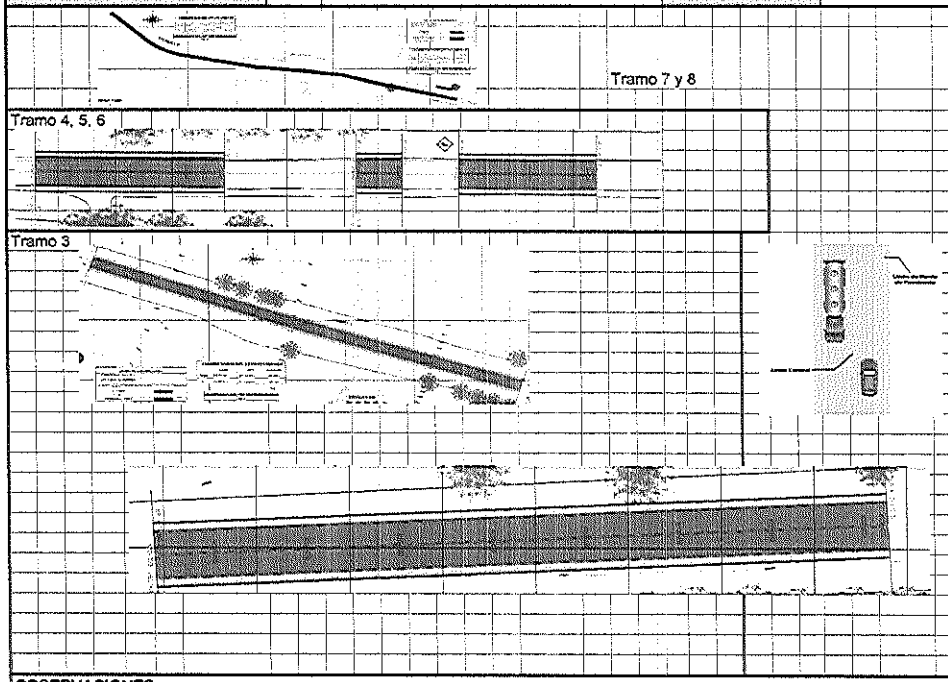

Localización	Dimensiones Área	Longitud		Cantidad	UND	Medida Total
TRAMO 1		21,78		3,00	ml	65,34
TRAMO 2		193,00		3,00	ml	579,00
TRAMO 3		91,52		3,00	ml	274,56
TRAMO 4		74,70		3,00	ml	224,10
TRAMO 5		78,00		3,00	ml	234,00
TRAMO 6		65,99		3,00	ml	197,97
TRAMO 7		30,00		3,00	ml	90,00
TRAMO 8		130,00		3,00	ml	390,00
TRAMO 9		121,65		3,00	ml	364,95
TRAMO 10		24,95		3,00	ml	74,85
TRAMO 11		107,10		3,00	ml	321,30
TRAMO 12		56,00		3,00	ml	168,00
TRAMO 13		48,70		3,00	ml	146,10
TRAMO 14		103,60		3,00	ml	310,80
TRAMO 15		94,35		3,00	ml	283,05
TRAMO 16		88,30		3,00	ml	264,90
TRAMO 17		725,07		3,00	ml	2175,21
TRAMO 18		200,00		3,00	ml	600,00
TRAMO 19		1.360,00		3,00	ml	4080,00
TRAMO 20		206,35		3,00	ml	619,05
TRAMO 21		66,97		3,00	ml	200,91
TRAMO 22		52,00		3,00	ml	156,00
TRAMO 23		120,00		3,00	ml	360,00
TRAMO 24		825,99		3,00	ml	2477,97
TRAMO 25		446,63		3,00	ml	1339,89
				Subtotal		15.997,95
				TOTAL		15.997,95

OBSERVACIONES:

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA


ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R.
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CÓDIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Gobernación del Huila

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA - SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO	TELLO
CONTRATISTA	Consorcio Infraestructura JPN Tello
VERSION	
NIT O C.C.	901.785.282-7
FECHA DE EMISION	
CONTRATO N°	015 DE 2024

CAPÍTULO	6	TRANSPORTES	ITEM	6.1 TRANSPORTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN DE EXPLANEACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS	UNIDAD	m³/km	UBICACIÓN	TOTALIDAD DE LA OBRA



Localización	Dimensiones Long(m)	Volumen fresado = Via(m3)	Volumen excavación filtro(m3)	Volumen excavación Gavion(m3)	Volumen excavación cuneta (m3)	Total a material a transportar(m3)	Factor expansion	Distancia	UND	Medida Total
TRAMO 1	21,78	75,62			13,07	88,69	1,40	5,00	M3KM	620,82
TRAMO 2	193,00	670,10			115,80	785,90	1,40	5,00	M3KM	5501,30
TRAMO 3	91,52	317,76			54,91	372,67	1,40	5,00	M3KM	2608,70
TRAMO 4	74,70	259,36			44,82	304,18	1,40	5,00	M3KM	2129,26
TRAMO 5	78,00	270,82			46,80	317,62	1,40	5,00	M3KM	2223,34
TRAMO 6	65,99	229,12			39,594	268,71	1,40	5,00	M3KM	1881,00
TRAMO 7	30,00	104,16			18,00	122,16	1,40	5,00	M3KM	855,12
TRAMO 8	130,00	451,36			78,00	529,36	1,40	5,00	M3KM	3705,52
TRAMO 9	121,65	422,37			72,99	495,36	1,40	5,00	M3KM	3467,52
TRAMO 10	24,95	86,63			14,97	101,60	1,40	5,00	M3KM	711,20
TRAMO 11	107,10	371,85			64,26	436,11	1,40	5,00	M3KM	3052,77
TRAMO 12	56,00	194,43			33,60	228,03	1,40	5,00	M3KM	1596,21
TRAMO 13	49,7	169,09			29,22	198,31	1,40	5,00	M3KM	1388,17
TRAMO 14	103,60	359,70			62,16	421,86	1,40	5,00	M3KM	2953,02
TRAMO 15	94,35	327,58			56,61	384,19	1,40	5,00	M3KM	2689,33
TRAMO 16	88,30	306,58			52,98	359,56	1,40	5,00	M3KM	2516,92
TRAMO 17	725,07	2517,44	846,08	291,00	435,04	4089,57	1,40	5,00	M3KM	28626,96
TRAMO 18	200,00	694,40	120,00		120,00	934,40	1,40	5,00	M3KM	6540,80
TRAMO 19	1360,00	4721,92	1632,00		816,00	7169,92	1,40	5,00	M3KM	50189,44
TRAMO 20	206,35	716,45			123,81	840,26	1,40	5,00	M3KM	5881,82
TRAMO 21	66,97	232,52			40,18	272,70	1,40	5,00	M3KM	1908,91
TRAMO 22	52,00	187,82			31,20	219,02	1,40	5,00	M3KM	1533,14
TRAMO 23	120,00	433,44			72,00	505,44	1,40	5,00	M3KM	3538,08
TRAMO 24	825,99	2983,48	141,60		495,59	3620,67	1,40	5,00	M3KM	25344,72
TRAMO 25	446,63	1613,23			267,98	1881,21	1,40	5,00	M3KM	13168,46
					Subtotal					174.632,53
					TOTAL					174.632,53

OBSERVACIONES:

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
Rep. Legal Consorcio Infraestructura JPN Tello
CONTRATISTA

ING. VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R
Rep. Legal Rep. Legal Consorcio VC
INTERVENTORIA
