INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 **Del:** 9 de diciembre de 2024 **Al:** 15 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **51** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE COROZAL SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	23,23%	23,23%
Valor básico de la Obra	$ 18.036.677,74	$ 18.036.677,74

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	16,02%	29,30%
Valor básico de la Obra	12.435.604,78	22.749.662,41

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 77.643.899,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA


AVANCE

En el transcurso de de esta semana se realizaron las siguientes actividades:
- Desmonte de cielo raso.
- Acopio de material de demolicion.
- luminarias led 60x60.
- Cielo raso plano en drywall.
- Canaleta plastica 100X45MM
- Punto cableado estructurado

IMAGENES AVANCE




Comentario: Suministro e instalacion de canaletas y puntos de cableado estructurado.

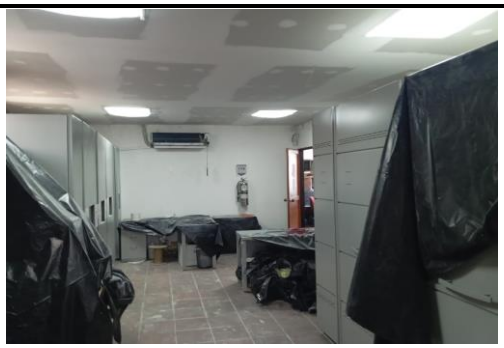

Comentario: Suministro e instalacion de luminarias.



Comentario: Suministro e instalacion de cielo raso en drywall - salon de recepcion y oficnas.

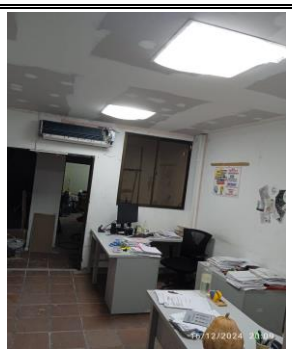

Comentario: Suministro e instalacion de cielo raso en drywall.



Comentario: Acopio de material en zona exterior de ORIP.



Comentario:Desmonte de cielo raso.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : JOSE PADILLA Matrícula No.:
