INFORME SEMANAL

Semana Número: 7 **Del:** 9 de diciembre de 2024 **Al:** 15 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **51** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE SINCELEJO SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,57%	6,57%
Valor básico de la Obra	$ 12.752.396,21	$ 12.752.396,21

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,57%	6,57%
Valor básico de la Obra	12.752.396,21	12.752.396,21

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 194.100.399,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24


IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se da inicnio de obra, realizando las siguientes actividades en esta semana :
- Proteccion de mobiliario durante la obra.
- Resanes.
- Estuco.
- Vinilo tipo I,3 manos alta calidad.
-

IMAGENES AVANCE

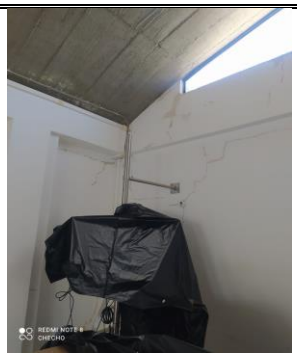

Comentario: Proteccion de mobiliario, resanes y estuco interior.



Comentario: Resanes y estuco en muros de ORIP.



Comentario: Resanes y estuco en muros de ORIP.



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ auditorio



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ auditorio



Comentario: Aplicación de pintura en muros de ORIP_ auditorio

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : JOSE PADILLA Matrícula No.:
