INFORME SEMANAL

Semana Número: 9 **Del:** 23 de diciembre de 2024 **Al:** 29 de diciembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **65** **Días**

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE COROZAL SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	41,56%	93,75%
Valor básico de la Obra	$ 32.268.804,42	$ 72.791.155,31

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	43,00%	93,00%
Valor básico de la Obra	33.386.876,57	72.208.826,07

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO PROINVERSIONES
Contrato No.	2344 de 2024
Valor Inicial:	$ 77.643.899,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
Contrato No.	2366 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	26-10-24
Fecha de Vencimiento:	31-12-24

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

En el transcurso de de esta semana se realizaron las siguientes actividades:

- Aplicacion de Vinilo tipo I.
- Escarificación de muros.
- Aseo genral de obra.
- Proteccion de mobiliario.
- Instalacion de cielo raso.
- Instalación de luminaria led tipo tortuga.


IMAGENES AVANCE




Comentario: Escarificación de muros.



Comentario: Escarificación de muros.

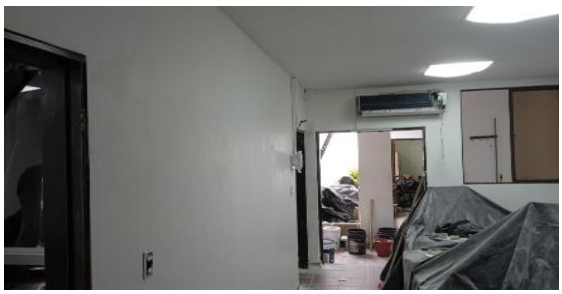

Comentario: Suministro,aplicación de pintura en muros y proteccion de mobiliario.

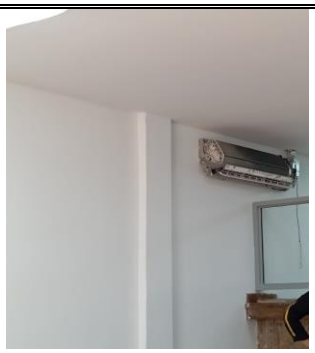

Comentario: Suministro,aplicación de pintura en muros y proteccion de mobiliario.



Comentario: Suministro e instalacion de cielo raso.



Comentario: Suministro e instalacion de cielo raso.

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : JOSE PADILLA Matrícula No.:
