PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación **M-2022-4301-061964**

Fecha radicación: 2022-12-07 10:11:53 AM

# MEMORANDO

PARA: Radicación trámite de pago

Coordinador

GIT CUENTAS POR PAGAR

DE: GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

ASUNTO: Solicitud tercer desembolso Convenio No. 664 FIP 2021 Municipio de Fresno - Tolima

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del convenio 664 de 2021, autorizo el desembolso No. 3, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mismo. Lo anterior conforme al siguiente detalle:

Nombre del beneficiario: MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
Identificación del beneficiarlo (NIT): 800.100.056-3
Número de la cuenta bancaria: 167600105065
Tipo de la cuenta bancaria: Ahorros
Nombre del banco: BANCO DAVIVIENDA
Registro presupuestal: 152021
Valor del desembolso: $184.727.692,00
Nombre Proyecto: “CONSTRUCCION DE 2KM DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BAJO GUALI”
Posición del catálogo de gasto: C-4103-1500-14-0-4103016-03
Código uso presupuestal: A-03-03-02

Dejo constancia que la información aquí suministrada ha sido debidamente verificada con respecto a los documentos que reposan en el expediente contractual, que corresponden a la real ejecución contractual y doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos requisitos para el desembolso.

Atentamente

Juan Carlos Clavijo Sierra

Profesional Especializado

Anexos:

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación **M-2022-4301-061964**

Fecha radicación: 2022-12-07 10:11:53 AM

Nombre Anexo: certificado de cumplimiento.pdf

informe financiero.pdf

informe semanal de interventoría.pdf

solicitud ente territorial.pdf

Copia: Hector Dario Brito Solano - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Elaboró: Juan Carlos Clavijo Sierra

Revisó: Hector Dario Brito Solano

PROSPERIDAD SOCIAL

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Con base en el informe semanal de interventoría No. 9, en el cual se informa un avance de obra superior al 50% y la solicitud del Ente Territorial; en mi calidad de supervisor del convenio No. 664 FIP 2021, me permito certificar que, se ha cumplido con lo estipulado en la Cláusula Sexta - Forma de desembolso de los recursos, Literal c), del Convenio Interadministrativo No. 664 FIP de 2021 y por tanto se procede a solicitar el tercer desembolso del convenio.

La presente se expide a los 6 días del mes de diciembre de 2022.

**JUAN CARLOS CLAVIJO SIERRA**
Supervisor del Convenio

Fresno -Tolima, 06 de Diciembre de 2022

OFICIO N° **523-**2022


**Señores:**
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – DPS JUAN CARLOS CLAVIJO.**
**Supervisor del Convenio.**

**Ref.:** Convenio N° 664 FIP - Contrato de obra N° 219 -2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA BAJO GUALI DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA"

**Asunto:** Solicitud tercer desembolso Convenio Interadministrativo N° 664 de fecha 12 de noviembre de 2021.

De conformidad con la cláusula Sexta "Forma de desembolso de los recursos" del convenio fijado en el asunto, por medio de la presente solicito, se realice el tercer desembolso equivalente a la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C ($184.727.692), en consideración al avance de obra que corresponde al 50% en el acta anexa y aval de ingeniería. Adicional adjunto el informe de legalización contable correspondiente al mes inmediatamente anterior.

Cordialmente;



**JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS Alcalde Municipal**

Reviso: Carlos Alberto Ocampo García -Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 664 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE FRESNO**

**INFORME FINANCIERO DEL DIA 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**
**MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA**

**PROYECTO (S):** objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo delnversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa".

CUENTA AHORROS No.: 167600105065 DEL BANCO: DAVIVIENDA

**VALOR CONVENIO** **$ 923.638.459,00**

VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL $ 923.638.459,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

| VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL: | | |
|---|---|---|
| | GIRO 1 | $ 92.363.845,00 |
| | GIRO 2 | $ 0,00 |
| | GIRO 3 | $ 0,00 |
| | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | GIRO 5 | $ 0,00 |
| | GIRO N | $ 0,00 |
| | **TOTAL GIRADO DPS.** | **$ 92.363.845,00** |

VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO $ 0,00

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** **$ 92.363.845,00**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| 219 | CONSORCIO CONSTRUCCIONES ACC | $ 923.235.738,70 | $ 0,00 | $ 923.235.738,70 |
| | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 923.235.738,70** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA | VALOR ACTA PARCIAL | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTICIPO | | | - | - | $ 0,00 |
| | ACTA preconstruccion | 0 | 0 | - | - | $ 0,00 |
| 219 | ACTA PARCIAL 1 | 1855 | 1 | 92.813.034,00 | 0 | $ 92.813.034,00 |
| | ACTA PARCIAL 2 | | | - | | $ 0,00 |
| | ACTA PARCIAL 3 | | | - | | $ 0,00 |
| | ACTA PARCIAL 4 | | | - | | $ 0,00 |
| | ACTA PARCIAL 5 | | | - | | $ 0,00 |
| | ACTA PARCIAL 6 | | | - | | $ 0,00 |
| | ACTA PARCIAL 7 | | | - | | $ 0,00 |
| | ACTA PARCIAL 8 | | | - | | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | **$ 92.813.034,00** | **$ 0,00** | **$ 92.813.034,00** |

| RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO | | RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO |
|---|---|---|
| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
| Sept-22 | $ 1.108,36 | $ 1.108,36 |
| Oct-22 | $ 4.435,24 | $ 4.435,24 |
| Nov-22 | $ 1.299,28 | $ 1.299,28 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | $ - | $ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (3) | **$ 6.842,88** | **$ 6.842,88** |

| DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL | | |
|---|---|---|
| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
| Sept-22 | $ 0,00 | |
| Oct-22 | $ 0,00 | |
| Nov-22 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| ene-00 | $ 0,00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (4) | **$ 0,00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 92.363.845,00**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** **$ 92.813.034,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 6.842,88

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 6.842,88**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 13.572.421,88**

**SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER** (INFORME FINAL)

**OBSERVACIONES** SE PRESENTA SALDO EN CUENTA POR CUANTO ES ENCUENTRAN PENDIENTES DE REALIZAR TRANSFERENCIAS POR DESCUENTOS REALIZADOS CONSISTENTES EN IMPUESTOS LOCALES Y NACIONALES SEGÚN ORDEN DE PAGO 1810 ANEXA

FIRMA

**WILSON MONTERO VASQUEZ**
SECRETARIO MUNICIPAL DE HACIENDA

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

| La equidad es de todos — Prosperidad Social | FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | Código: F-IP-226 |
|---|---|---|
| | PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos | Versión: 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INFORME: | 2/11/2022 | | INFORME N°: | 9 | PERÍODO DEL | 25/11/2022 |
| | | | ETAPA: | | AL | 2/11/2022 |
| N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS): | 664 FIP DE 2021 | | ID DEL PROYECTO: | | | |
| DEPARTAMENTO: | TOLIMA | | MUNICIPIO: | FRESNO | | |
| N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | **No. 411 FIP DE 2021** | | SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS): | JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ | | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL


| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: | **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BAJO GUALI, DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA.** | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **FRESNO - TOLIMA, VEREDA BAJO GUALI** | No. Beneficiarios | **1623** |
| N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente): | **18 de julio de 2022** | **Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes** | |


| PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI) | | | | CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente): | 016 - REGION V | | | N° Y AÑO DE CONTRATO: | No. 219 DE 2022 | | |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL | | | CONTRATANTE: | ALCALDIA MUNICIPAL DE FRESNO TOLIMA | | |
| INTERVENTOR: | MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS | | | CONTRATISTA: | CONSORCIO CONSTRUCCIONES ACC | | |
| PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: | - | | | PLAZO PRECONSTRUCCIÓN: | - | | |
| PLAZO CONSTRUCCIÓN: | 3 MESES | | | PLAZO CONSTRUCCIÓN: | 3 MESES | | |
| PLAZO TOTAL INICIAL: | 3 MESES | | | PLAZO TOTAL INICIAL: | 3 MESES | | |
| FECHA DE INICIO: | 22 de julio de 2022 | | | FECHA DE INICIO: | 18 de julio de 2022 | | |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN N° : | 18 de agosto de 2022 | | | *FECHA DE SUSPENSIÓN N°: | 18 de agosto de 2022 | | |
| *FECHA DE REINICIO N°: | 19 de septiembre de 2022 | | | *FECHA DE REINICIO N°: | 19 de septiembre de 2022 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 22 de noviembre de 2022 | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 de noviembre de 2022 | | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 90 | | | PLAZO ACTUALIZADO: | 90 | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 103 | EQUIVALE AL | 1,144444444 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 107 | EQUIVALE AL | 1,188888889 |
| VALOR INICIAL : | $ 92.363.845,90 | | | VALOR INICIAL : | $ 923.235.738,70 | | |
| *VALOR ADICIÓN N° : | | | | *VALOR ADICIÓN N° : | | | |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 92.363.845,90 | | | VALOR ACTUALIZADO: | $ 923.235.738,70 | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | 50,04% | | | PORCENTAJE DE EJECUCION | 50,04% | | |
| VALOR EJECUTADO | $ 46.215.747,73 | | | VALOR EJECUTADO: | $ 461.955.969,70 | | |
| PORCENTAJE DE PAGO | 0 | | | PORCENTAJE DE PAGO | 0 | | |
| VALOR PAGADO: | 0 | | | VALOR PAGADO: | 0 | | |
| VALOR POR EJECUTAR: | $ 46.148.098,17 | | | VALOR POR EJECUTAR: | $ 461.279.769,00 | | |
| SUPERVISOR DE CONVENIO O CONTRATO: | JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ | | | SUPERVISOR DESIGNADO POR EL CONTRATANTE: | CARLOS ALBERTO OCAMPO GACRCIA | | |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| | Planeado | Ejecutado | Avance |
|---|---|---|---|
| 2.1 AVANCE FÍSICO (%) | 60,01% | 50,04% | -9,97% |
| 2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($) | $ 554.016.174,92 | $ 461.955.969,70 | |
| DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $) | -$ 92.060.205,22 | | |

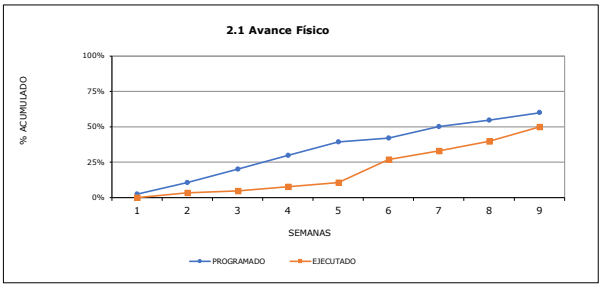

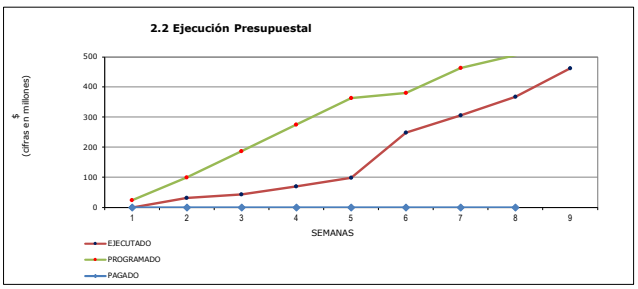
## 3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

| No. | FECHA PROGRAMADA | HORA INICIO/ HORA FIN | LUGAR | FECHA REAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |

## 4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

En la semana 9 comprendida entre 25 de noviembre y 02 de diciembre de 2022, se continúan ejecutando actividades en tramo 4 y tramo 1 de corte y armado de acero de cinta huella, instalación de formaleta, excavación de vigas, figuración y armado de acero de vigas, fundido de cintas, ciclópeo, vigas; ejecutándose así un avance físico de 50,04%. Según el cronograma programado se presenta un retraso del 9,97%

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con profesionales y mano de obra calificada en el frente de trabajo para el desarrollo de actividades.
Residente de obra (1)
Profesional SST (1)
Maestro de obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes de obra (7)
En la obra cuentan con los equipos y materiales necesarios para realizar actividades programadas.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En la semana 9 comprendida entre 25 de noviembre y 02 de diciembre de 2022, se continúan ejecutando actividades en tramo 1 y tramo 4, ejecutándose así un avance presupuestal de 461.955.696,70 equivalente al 50,04% y un programado de 554.016.174,92 equivalente a un 60,01%, con un retraso de 92.060.205,22 equivalente al 9,97% .

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La jecucion de las actividades cumplen con la calidad y los lineamientos de las especificaciones tecnicas del contrato, verificada por la interventoria

4.5. MANEJO AMBIENTAL

se continua con la implementación del PGIO con el fin de dar cumplimiento a los estándares ambientales.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante la ejecución de obras el personal cuenta con los elementos de protección personal correspondientes a cada actividad.

4.7 SALUD OCUPACIONAL

Durante la ejecución de obras el personal cuenta con los elementos de protección personal correspondientes a cada actividad.

4.8 ASPECTOS SOCIALES

El contratista cuenta con residente social, la cual esta presta a atender las PQR de la comunidad y la elaboración de actas de vecindad a viviendas aledañas a la obra.

**5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ID ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ESTADO | NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE | FECHA INICIO PROGRAMADA | FECHA FIN PROGRAMADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | se da reinicio del contrato | | Municipio | 25/11/2022 | 25/11/2022 |
| | | | | | |

**6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

N.A. (No aplica)

**7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Durante la sexta semana comprendida entre el 25 de noviembre y 02 de diciembre se ejecutan las actividades descritas a continuación:
TRAMO 1:
- Acarreo de materiales pétreos del punto de acopio a tramo 1. y tramo 4
- Renivelación material súbase en cunetas.
- Corte y armado de acero para vigas riostras.
- Instalación de formaleta para cinta huella y vigas riostras.
- Excavación manual de vigas riostras.
- Fundida de cintas 50 mts, ciclópeo,
- Se continua con implementación del PGIO

Debido que que el retraso en ejecucion es de 9,97% est intervenotori solicitara al contratista entrega de plan de contingencia a impementar para nivelarse con la programacion de obra.

**8. ANEXOS**

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)
2. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Reconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)
3. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 3MB>
4. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado
5. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

**FIRMA:**_____
**INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)**
**NOMBRE: CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO**
**TP N°:**

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.
