I. GESTIÓN DOCUMENTAL

1.2 Certificación de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados por el revisor fiscal y planillas de pago del periodo facturado

CONSORCIO OBRAS GT
NIT. 901.886.750-6

Bogotá, D.C. 21 de enero de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

REF: CONTRATO No. 9176 -2024

OBJETO: *Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado.*

ASUNTO: Cumplimiento Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley indicada en la referencia, me permito certificar que **CONSORCIO OBRAS GT** con NIT 901.886.750 – 6 ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988
Representante Legal Consorcio Obras GT

SANDRA PATRICIA SEGURA TELLEZ
C.C. 55.062.810
Contadora
T.P. 144934-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

144934-T



SANDRA PATRICIA
SEGURA TELLEZ
C.C. 55062810
RESOLUCION INSCRIPCION 274 **FECHA 15/10/2009**
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE Leonardo Sanchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155336

FIRMA DEL TITULAR

69168

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

NUMERO DE RADICADO : 6065066

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Ciudad, 29 de noviembre de 2024

Señores

EPS Sanitas

Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como **NIT – 9 0 1 8 8 6 7 5 0 – 6 – CONSORCIO OBRAS GT**, para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	C.C.	1.019.119.229	ADRIANA CASTELLANOS VINCHERY	$2.200.000	29/11/2024	N/A	CL 148 # 101 - 24	BOGOTÁ	3219174466	ing.adriana03@gmail.com
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

Daniela Serrato

Auxiliar De Afiliaciones

ARL | sura

Medellín, 28 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO OBRAS GT, en el centro de trabajo 0005433001 - CONSORCIO S.I.S, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1019119229	CASTELLANOS VINCHERY ADRIANA	29/11/2024		20946181	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C529726832433334585

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/11/2024 09:36:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.24.70, 107.154.191.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Bogota 02.12.2024

Señores,
CONSORCIO OBRAS GT - NI 901886750
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2024-12-02 con numero de radicado 6065066 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

MEDIEXPRESS S.A.S.

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49 No.91-98
BOGOTA D.C.-BARRIOS UNIDOS (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5080 de 03/11/2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 35531144

Fecha: 04-diciembre-2024 2:37 pm
Impresión: 19-diciembre-2024 2:07 pm



Paciente: MORA YAMILE ANDREA
Doc.Iden.: CC35531144 Edad: 45 Años Sexo: F
Entidad: SOLUCIONES FUERZACTIVA S.A.S.
Act. Economic: N/D Estrato: 3
Empresa: Cargo: SISO
Dirección: calle 36 n 1 35 Teléfono: 3112781587 Estado civil: CASADO(A)
Adm. Salud: E.P.S. SANITAS S.A. Admin.Pension PROTECCION
Admin.Riesgos NINGUNO

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que MORA YAMILE ANDREA identificada con documento de identidad CC 35531144 fue valorada en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de SISO:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.
Régimen de reducción de peso controlado por EPS.
Mantener un consumo moderado de carbohidratos y grasas.
Realizar actividad física regular.
Control rutinario anual por optometría en EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.
Uso permanente de anteojos para laborar.

PRUEBAS PARACLINICAS:

CUPS	Servicio	Resultado
890201	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL

OTRAS PRUEBAS PARACLINICAS
Ninguna

Medico(a): MARTINEZ GUTIERREZ ERWIN
Registro médico: 82392360
Licencia en Salud Ocupacional: 14046 de 18/03/2024 SDS

MORA YAMILE ANDREA
CC35531144

9

NUMERO DE RADICADO : 6080917

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Ciudad, 04 de diciembre de 2024

Señores

EPS Sanitas

Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como **NIT – 9 0 1 8 8 6 7 5 0 – 6 – CONSORCIO OBRAS GT**, para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	c.c.	35.531.144	YAMILE ANDREA MORA	$1.800.000	05/12/2024	N/A	CALLE 35 # 1 - 36	SOACHA	3112781587	andreay_08@hotmail.com
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

Daniela Serrato

Auxiliar De Afiliaciones

10

ARL | sura

Medellín, 05 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO OBRAS GT.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0005433001 CONSORCIO S.I.S		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C35531144	MORA YAMILE ANDREA	06/12/2024		21319329	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 05/12/2024 17:12:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.24.70, 198.143.37.66, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MEDIEXPRESS S.A.S.

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49 No.91-98
BOGOTA D.C.-BARRIOS UNIDOS (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5080 de 03/11/2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 1026289628

Fecha: 14-diciembre-2024 11:38 am
Impresión: 16-diciembre-2024 8:01 am



Paciente: CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES
Doc.Iden.: CC1026289628 Edad: 30 Años Sexo: M
Entidad: SOLUCIONES FUERZACTIVA S.A.S.
Act. Economic: N/D
Empresa: CONSORCIO OBRAS GT
Dirección: N/D
Adm. Salud: E.P.S. FAMISANAR LTDA.
Admin.Riesgos NINGUNO

Estrato: 2
Cargo: INSPECTOR DE OBRA DOS
Teléfono: 3227630096 Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension PORVENIR

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES identificado con documento de identidad CC 1026289628 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de INSPECTOR DE OBRA DOS:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS:

CUPS	Servicio	Resultado
890201	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NEGATIVO

OTRAS PRUEBAS PARACLINICAS
Ninguna

Medico(a): DIAZ MARTINEZ BRIGITTE
Registro médico: 70413
Licencia en Salud Ocupacional: Res. 4711 30-ABR-2019

CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES
CC1026289628

ARL | sura

Medellín, 13 de December de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO OBRAS GT.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0005433001 CONSORCIO S.I.S		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	16/12/2024		37152182	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/12/2024 12:55:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.24.70, 198.143.37.39, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MEDIEXPRESS S.A.S.

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49 No.91-98
BOGOTA D.C.-BARRIOS UNIDOS (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5080 de 03/11/2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 1033689993

Fecha: 14-noviembre-2024 9:58 am
Impresión: 22-noviembre-2024 12:10 pm



Paciente: QUINTERO PARRA JUAN CAMILO
Doc.Iden.: CC1033689993 Edad: 37 Años Sexo: M
Entidad: SOLUCIONES FUERZACTIVA S.A.S.
Act. Economic: N/D Estrato: 3
Empresa: CONSORCIO OBRAS GT Cargo: INSPECTOR DE OBRA
Dirección: DIAGONAL 52 C BIS SUR 28 94 Teléfono: 3178593564 Estado civil: UNION LIBRE
Adm. Salud: EPS SURA Admin.Pension PORVENIR
Admin.Riesgos NINGUNO

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que QUINTERO PARRA JUAN CAMILO identificado con documento de identidad CC 1033689993 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de INSPECTOR DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS:

CUPS	Servicio	Resultado
890201	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL

OTRAS PRUEBAS PARACLINICAS
SEROLOGIA NORMAL

Medico(a): GUTIERREZ GUERRERO LAURA KATHERINE
Registro médico: 1033756583
Licencia en Salud Ocupacional: Resolución 8485 DE 9 ABRIL DE 2021

QUINTERO PARRA JUAN CAMILO
CC1033689993

14

ARL | sura

Medellín, 28 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO OBRAS GT, en el centro de trabajo 0005433001 - CONSORCIO S.I.S, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1033689993	QUINTERO PARRA JUAN CAMILO	29/11/2024		205cO321	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C529726832433334770

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/11/2024 09:39:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.24.70, 198.143.37.66, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MEDIEXPRESS S.A.S.

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49 No.91-98
BOGOTA D.C.-BARRIOS UNIDOS (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5080 de 03/11/2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 1026289001

Fecha: 21-noviembre-2024 3:48 pm
Impresión: 22-noviembre-2024 7:46 am



Paciente: FORERO GONZALEZ CAROL GINETH
Doc.Iden.: CC1026289001 Edad: 30 Años Sexo: F
Entidad: SOLUCIONES FUERZACTIVA S.A.S.
Act. Economic: N/D
Empresa: CONSORCIO OBRAS GT
Dirección: N/D
Adm. Salud: COMPENSAR E.P.S.
Admin.Riesgos NINGUNO
Estrato: 4
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Teléfono: 3208949692 Estado civil: SOLTERO(A)
Admin.Pension PROTECCION

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que FORERO GONZALEZ CAROL GINETH identificada con documento de identidad CC 1026289001 fue valorada en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de RESIDENTE DE OBRA:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.
Mantener un consumo moderado de carbohidratos y grasas.
Realizar actividad física regular.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS:

CUPS	Servicio	Resultado
890201	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NORMAL

OTRAS PRUEBAS PARACLINICAS
Ninguna

Medico(a): MARTINEZ GUTIERREZ ERWIN
Registro médico: 82392360
Licencia en Salud Ocupacional: 14046 de 18/03/2024 SDS

FORERO GONZALEZ CAROL GINETH
CC1026289001

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **FORERO GONZALEZ CAROL GINETH** identificado(a) con **CC** número **1.026.289.001** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 22 de octubre de 2015 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 21 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20241121110248

17

compensar eps
salud

	SI	NO
¿ Previo diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	
¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo la entrega de la carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	X	
¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	X	
¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	

Como cotizante y representante de mi grupo familiar, hago constar mediante mi firma que compartiré la presente carta de derechos y deberes y carta de desempeño de la EPS con mis beneficiarios.

Firma del afiliado: Carol Tirado

No. Identificación: 1026289021

FIRMA A RUEGO (Diligenciar exclusivamente cuando el cotizante no pueda firmar)

A ruego de (la) señor (a) _____ con C.C. No. _____ lo hace en su nombre, el (la) señor(a) _____ con C.C. No. _____ mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que se está entregando, quien además actúa como testigo, certificando que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al (la) señor(a) _____

25 NOV 2019
Cód 655 Luzy Yaneth Ibañez M.
HUELLA AUTENTICACIÓN

Firma a Ruego: _____

Nombres y apellidos: _____

Identificación: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombres y apellidos de quien no sabe firmar: _____

Identificación: _____

Autorizo de manera voluntaria, explícita, previamente informada e inequívoca a todos los servicios de salud Compensar EPS, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 886 de 2014, para tratar mi información personal, según lo establecido en su Manual de Protección de Datos Personales, disponible en: www.compensar.com / vínculo protección Datos Personales; información que será utilizada en el desarrollo de las funciones propias para:

- Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo y/o mis beneficiarios.
- Dar cumplimiento a requerimientos legales y de organismos de control.
- Proveer y/o evaluar la calidad de los productos y/o servicios requeridos por mí.
- La realización de estudios internos sobre fines estadísticos y analíticos de los datos, para mejoras de nuestros servicios o programas especializados de atención en salud; información sobre la cual podré, en cualquier momento, ejercer mis derechos de Habeas Data, para solicitar que no se me envíe información de los servicios en los casos que sea pertinente, y que no afecte el servicio de salud prestado por Compensar EPS.
- Transmitir mis datos personales a las administradoras encargadas de la seguridad social, con el fin de actualizar el estado de mi afiliación y/o traslado en el sistema.
- Comunicar mis datos personales con la Caja de Compensación Familiar Compensar para efectos de la prestación de servicios de salud.

Cabe anotar, que la protección de los datos personales se efectúa a través de proveedores tecnológicos con los cuales se tienen firmados contratos de transmisión de información, en aras de cumplir a cabalidad con los principios de acceso de la ley, así como de tomar las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para el aseguramiento de los datos.

Como titular de la información personal sobre la que Compensar EPS ejerce el tratamiento, se me informa sobre los canales a través de los cuales puedo ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir mis datos personales, entre ellos el correo electrónico protecciondedatos@compensar.com, y la central telefónica de la EPS.

La protección de datos personales efectuada por Compensar EPS, cumple con los principios de finalidad, necesidad, circulación restringida, confidencialidad y seguridad señalados en la Ley 1581 de 2012 y manifiesto expresamente que conozco dónde consultar la información sobre protección de datos personales, así como los efectos y alcance de la presente autorización y que estoy libre de todo vicio del consentimiento en el momento de otorgarla.

Firma del afiliado: Carol Tirado

No. Identificación: 1026289021

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9011576819

No. de Radicación: 28580494

Fecha de Radicación: 29 11 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]	A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

5. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
TALERO	ROJAS	DANIEL	FELIPE

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1030634359	Femenino [ ] Masculino [X]	D D M M A A A A: 31 12 1993

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo / Condición)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de pensiones
				SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$2.200.000				
Dirección	Municipio / Distrito	Teléfono fijo	Teléfono celular	
		Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Departamento	Correo electrónico

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino / Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios 29. Parentesco	30. Etnia
01				D D M M A A A A		
02				D D M M A A A A		
03				D D M M A A A A		
04				D D M M A A A A		
05				D D M M A A A A		

	31. Discapacidad (Tipo: F N M T P / Condición: P T)	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01						
02						
03						
04						
05						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
D		
SI		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO OBRAS GT	NT	901886750	

39. Ubicación				
CL 99 49 38 OF 509	31647308		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
Dirección	Teléfono fijo	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o actualización de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de petición al cabeza [ ] 17. Reporte de la calidad de Preexistencia [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación					
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre		
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad	
				29 11 2024	
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración en la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de fuerza de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de cumplimiento.
49. Declaración de no inscripción en otra entidad, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que corresponda de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular suministrados.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario

55. El Empleador, representante o pagador autorizado de la Afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] PAD [ ] TI [ ] CE [ ] PA [ ] RC [ ] CD [ ] MS [ ] Cantidad [ ] Total [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de difunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: INSPECTOR DE OBRAS

SI: Impresión Digital

19

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DANIEL FELIPE TALERO ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.030.634.359**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 20 de Noviembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9011564084

No. de Radicación: 28560751

Fecha de Radicación: 25 11 2024

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación B. Reporte de Novedades X	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia X • Beneficiario o afiliado adicional B. Colectivo C. Institucional D. De oficio	A. Contributivo B. Subsidiado X	A. Cotizante X B. Cabeza de familia C. Beneficiario	A. Dependiente X B. Independiente C. Pensionado	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

8. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: MERCHAN	Segundo Apellido: ADAME	Primer Nombre: JESSIKA	Segundo Nombre: PAOLA

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	1058038536	Femenino X Masculino	D: 12 M: 10 A: 1993

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales	16. Administradora de pensiones
	Tipo: Condición:			SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia			
$3.500.000				
	Zona: Urbana Rural			

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino Masculino	D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
01				
02				
03				
04				
05				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino / Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios 29. Parentesco	30. Etnia
01				D D M M A A A A		
02				D D M M A A A A		
03				D D M M A A A A		
04				D D M M A A A A		
05				D D M M A A A A		

	31. Discapacidad Tipo: F N M Y P	Condición	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
01								
02								
03								
04								
05								

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
01		
02		
03		
04		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO OBRAS GT	NT	901886750	

39. Ubicación				
CL 99 49 38 OF 509	31647308		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL
	Código Municipio	Código Departamento	Municipio / Distrito	Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación ☐ 3. Actualización del documento de identidad ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐ Código ☐ 6. Reinscripción en la EPS ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar X 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐ 13. Movilidad A. Régimen Contributivo X B. Régimen Subsidiado ☐ 14. Traslado A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐ 15. Reporte de fallecimiento ☐ 16. Reporte del fraude de protección al cesante ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre pensionado ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo Femenino / Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
				D: 25 M: 11 A: 2024

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de documento de carácter de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no ser cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliado adicional en una Instituciones Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS valide y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular dado a conocer por el titular.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cónyuge o compañero(a) permanente	55. El empleador, aportante o pagador de pensiones para afiliados adicionales o institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CE ☐ PA ☐ CD ☐ SC ☐ PE ☐ Cantidad ☐ Folios ☐

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización del traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: INGENIERO CIVIL

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JESSIKA PAOLA MERCHAN ADAME, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.058.038.536,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 19 de Noviembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9011593893

No. de Radicado: 28606422

Fecha de Radicación: 06 12 2024

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a reportar por la EPS)

II. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

8. Apellidos y nombres: BARBOSA | JOSE | ALFONSO

7. Tipo de documento de identidad: CC | 8. Número del documento de identidad: 79597144 | 9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X] | 10. Fecha de nacimiento: 23 12 1971

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia | 12. Discapacidad: Tipo / Condición | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de pensiones: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA

17. Ingreso base de cotización - IBC: $2.800.000 | 18. Residencia: Dirección | Municipio | Teléfono fijo: Zona Urbana [ ] Rural [ ] | Correo Electrónico | Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad | 21. Número del documento de identidad | 22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | 23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino / Masculino	28. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

	31. Discapacidad: Tipo (F, N, M, T, D) / Condición	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B1		
B2		
B3		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

36. Nombre o razón social: CONSORCIO OBRAS GT | 35. Tipo de documento de identificación: NT | 37. Número del documento de identificación: 901886750 | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

39. Ubicación: CL 99 49 38 OF 509 | 31647308 | Teléfono fijo y/o celular | Municipio / Distrito: BOGOTA | Departamento: DISTRITO CAPITAL

VI. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Traslado de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A-Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ]
16. Reporte del trámite de prolongación al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento: D D M M A A A A | 42. Fecha novedad: 06 12 2024

43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado: Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los parientes antes citados. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de personas de menor edad o mayor de edad que requieren la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no afiliación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales a una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS notifique y almacene datos y envíe de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS municipio los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o a celular como mensajes de texto. [ ]

IX. FIRMAS

Firma del cotizante, cabeza de familia o beneficiario | Firma del representante legal, pensionado o de la Administradora de Pensiones

X. ANEXOS

55. Anexa copia del documento de identidad: CN [ ] PC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total: [ ]

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración escrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificado de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento | 67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de radicación: D D M M A A A A | 69. Fecha de validación: D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | OBSERVACIONES: CARGO: TECNICO ELECTRONICISTA

Supersalud

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE ALFONSO BARBOSA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79597144,** se encuentra afiliado/a desde **01/11/2022** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de diciembre de 2024.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo

Bogota 02.12.2024

Señores,
CONSORCIO OBRAS GT - NI 901886750
Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 2 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2024-12-02 con numero de radicado 6065797 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

Baddy Sarmiento
Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

Colfondos
del grupo HABITAT

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) FABIO NELSON GOMEZ GUTIERREZ con identificación No. 79.924.627 se encuentra afiliado(a) al Pension Obligatoria desde el día 04 de octubre del 2002

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 28 de noviembre del 2024.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo

Bogota 25.11.2024

Señores,

-

Ciudad

Asunto : CERTIFICADO DE RADICACION

Respetados Señores :

Por medio del presente nos permitimos CERTIFICAR el recibido de 1 usuarios enviados para tramite de novedad web radicadas el 2024-11-25 con numero de radicado 6041130 :

Cordialmente,

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

Gestión de la Afiliación - Operaciones - EPS Sanitas

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ORLANDO ROBLES MONTESINO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.298.682**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 20 de Noviembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación | Fecha de Radicación: 29112024

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliado: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] C. Pensionado [ ] D. Otro [ ]
3. Ocupación [ ]
4. Régimen: A. Contributivo [X] B. Excepción [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ] D. Desempleado [ ] E. Estudiante [X]
6. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cónyuge o compañero(a) permanente [ ] C. Beneficiario [ ]
Código (a registrar por la EPS): 01

A. AFILIACION II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante o cabeza de familia)

8. Apellidos y nombres			
CHAPARRO	SECCU	SHARON	DANIELA

7. Tipo de documento de identidad: CC | 8. Número de documento de identidad: 1030625891 | 9. Sexo: Femenino [X] Masculino [ ] | 10. Fecha de nacimiento: 13/06/2001

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia: 1 | 12. Discapacidad: Tipo [ ] Cantidad [ ] | 13. Pertenece a grupo [ ] | 14. Grupo de población especial [ ] | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL: SURA | 16. Administradora de pensiones: PORVENIR

17. Ingreso base de cotización - IBC: $2.500.000 | 18. Residencia: CL 54 A # 92 A 96 | 19. Teléfono: 3202280734

Sharondaniela-0@hotmail.com | BOGOTA | Zona: Urbana [X] Rural [ ] | Kennedy | LA HOMBARDA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

20. Apellidos y nombres			
RUIZ	BRAVO	DIEGO	ALEJANDRO

21. Tipo de documento de identidad: CC | 22. Número de documento de identidad: 1.073.680.350 | 23. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X] | 24. Fecha de nacimiento: 19/01/1988

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	25. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	26. Tipo de documento de identidad	27. Número de documento de identidad	28. Sexo: Femenino	Masculino
01	RUIZ	CHAPARRO	EMMA	LUZ		1.027.213.130	X	
02	RUIZ	CHAPARRO	SARAH	ALEJANDRA	N.C.	1027210431		X
03								
04								
05								

	29. Fecha de nacimiento	30. Parentesco	31. Otro parentesco: Tipo	Cantidad	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana / Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC adicional (a registrar por la EPS)
01	12082023	HI							
02									
03	28/10/2021	HI			BOGOTA		BOGOTA		
04									
05									

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS: 11015 | Código de la IPS (a registrar por la EPS):

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: COMERCIO CARAS ST | 36. Tipo de documento de identificación: NIT
37. Número del documento de identificación: 901586750-6 | 38. Tipo de aportante a pagar aportes (a registrar por la EPS)
39. Ubicación: CL 99 # 49-39 | 4692101 | CENTRO COMERCIAL | BOGOTA | CUNDINAMARCA

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad:
1. Modificación datos básicos de identificación [ ]
2. Corrección datos básicos de identificación [ ]
3. Actualización ocupación de la persona [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ]
5. Terminación de la afiliación en la EPS. Código: [ ]
6. Reingreso a la EPS [X]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ]
11. Movilización a una entidad adecuada para realizar afiliados colectivos [ ]
12. Desvinculación de una entidad adecuada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ]
15. Reporte por fallecimiento [ ]
16. Retiro del formulario de protección al cesante [ ]
17. Retiro de la calidad de Pre-pensionado [ ]
18. Retiro de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	Fecha de nacimiento	Fecha
				29/11/2024

42. EPS anterior | 44. Motivo de traslado: Código [ ] | 45. Cód. de Compensación Familiar o Caja de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencias económicas de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de custodia de soportes de futuras mejoras a que tenga(n) derecho el(los) beneficiario(s) de los documentos que acreditan la calidad de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS envíe y consulte datos y pueda acceder a la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [X]
51. Autorización para que la EPS reporte la información sobre el goce efectivo de la afiliación del respectivo cotizante a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por ley lo requieran o regulen. [X]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [X]
53. Autorización para que la EPS envíe información sobre temas atinentes a el aseguramiento mientras exista. [X]

VIII. FIRMAS

Sharon Daniela Chaparro | [signature]

IX. ANEXOS

55. Anexa copia del documento de identidad: CN [ ] Cert. [ ] TI [ ] Cert. [ ] CC [X] Cert. [ ] Pa [ ] Cert. [ ] CE [ ] Cert. [ ] CD [ ] Cert. [ ] SC [ ] Cert. [ ] Otro [ ]
57. Copia del soporte de incapacidad permanente un año por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que acredite la unión marital. [ ]
59. Copia de la apertura o folio de la sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o de [illegible]
62. Documento en que conste la [illegible] los padres o de quien tiene su [illegible]
63. Copia de la autorización de [illegible]
64. Certificado de vinculación a [illegible]
65. Copia del acta administrativa [illegible] el cambio de beneficiario o co

29 NOV 2024 [illegible]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Jurisdicción de la entidad Territorial: Código del municipio [ ] Código del departamento [ ] | 67. Datos del SISBEN: Número de la ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ] | 68. Fecha de radicación | 69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Tipo de documento de identidad [ ] | Número de documento de identidad | 71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

APORTE DICIEMBRE, DOC ON BASE

Recuerde que cualquier falsedad, error u omisión modifica la veracidad de la información registrada y/o de documentos anexados en el presente formulario.

Vigilado Supersalud

ARL | sura

Medellín, 28 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO OBRAS GT, en el centro de trabajo 0005433001 - CONSORCIO S.I.S, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1030628001	CHAPARRO SECUE SHARON DANAY	29/11/2024		V1BQq195	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C529726832433333503

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/11/2024 09:18:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.24.70, 198.143.37.66, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COSMOS SUPPORT SAS
Nit: 9005304667
Dirección: Calle 57 N 18 21
Teléfono: 321 510 9956
Email: info@clinicosmos.com
agendamiento@clinicosmos.com

Información General



No. ingreso		Fecha Impresión	20/11/2024
Fecha Ingreso	20/11/2024	Nombre	CHISACA LEON JOHANA CATHERINE
CC	52486951	Sede	COSMOS SUPPORT
Cargo	RESIDENTE SST Y AMBIENTAL	Tipo de examen	EXAMEN INGRESO
Fecha Nacimiento	29/10/1980	Edad	44
Dirección	CLL 18 # 86 - 55	Teléfono	3153704261
Estado Civil	Soltera	# Hijos	
Empresa a Laborar	CONSORCIO OBRAS GT	Fecha de salida	20/11/2024
Nombre Acompañante			

Examenes Complementarios

Examen	Resultado	Examen	Resultado
ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR:	NORMAL	PERFIL LIPÍDICO	NORMAL
AUDIOMETRÍA:	NORMAL		
OPTOMETRÍA:	NORMAL	GLICEMIA SIMPLE	NORMAL

Certificación de Aptitud

APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Concepto de acuerdo al énfasis

OSTEOMUSCULAR: SIN RECOMENDACIONES NI RESTRICCIONES.

ALTURAS: APTO SIN RESTRICCIONES.

ESPACIOS CONFINADOS: N/A.

Recomendaciones Generales

- Control periódico ocupacional
- Hábitos nutricionales saludables
- Utilización de EPP Elementos de Protección personal de acuerdo al cargo Ejercicio regular 3 veces / semana

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

- **OSTEOMUSCULAR:** Pausas activas, ejercicios de estiramiento y posturas adecuadas.
- **VISUAL:** Educación en higiene visual. Uso de protección visual según tipo de exposición. Adecuada iluminación del puesto de trabajo. Pausa activa visual.
- **ALTURAS:** Capacitación y certificación de alturas.
- **AUDITIVO:** Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido y reposo auditivo extralaboral.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Énfasis en el examen del sistema osteomuscular

En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD, TODO ES VERÍDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Rodrigo Alejandro Méndez G.
Especialista en seguridad y salud en el trabajo
1.032.395.042

Profesional: RODRIGO ALEJANDRO MÉNDEZ G
CC: 1.032.395.042
Registro médico: 1.032.395.042

Firma del trabajador: CHISACA LEON JOHANA
CC:CC52486951

NUMERO DE RADICADO : 6037849

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

Ciudad, 21 De Noviembre 2024

Señores

EPS Sanitas

Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como **NIT – 9 0 1 8 8 6 7 5 0 – 6 – CONSORCIO OBRAS GT**, para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	c.c.	52.486.951	JOHANA CATHERINE CHISACA LEON	$ 3.500.000	25/11/2024	N/A	CALLE 18 # 86 – 55	BOGOTA	3153704251	catechile@hotmail.com
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente

Daniela Serrato

Auxiliar De Afiliaciones

ARL | sura

Medellín, 22 de Noviembre de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO OBRAS GT, en el centro de trabajo 0005433001 - CONSORCIO S.I.S, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C52486951	CHISACA LEON JOHANA CATHERINE	25/11/2024		16231213	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C529726832432748297

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/11/2024 13:24:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.24.70, 107.154.191.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIER. DE COLOMBIA

MEDIEXPRESS S.A.S.

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49 No.91-98
BOGOTA D.C.-BARRIOS UNIDOS (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5080 de 03/11/2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 4198494

Fecha: 26-febrero-2024 9:25 am
Impresión: 20-diciembre-2024 5:09 pm



Paciente: **CASTRO LOPEZ JOSE DARIO**
Doc.Iden.: **CC4198494** Edad: 51 Años Sexo: M
Entidad: **CONSTRULOG S.A.S.**
Act. Economic: N/D
Empresa: CONSORCIO OBRAS GT
Dirección: CALLE66 A SUR # 72 20
Adm. Salud: COMPENSAR E.P.S.
Admin.Riesgos N/D
Estrato: 2
Cargo: CONDUCTOR
Teléfono: 3118861792 Estado civil: CASADO(A)
Admin.Pension COLPENSIONES

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que CASTRO LOPEZ JOSE DARIO identificado con documento de identidad CC 4198494 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de CONDUCTOR:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.
Régimen de reducción de peso controlado por EPS.
Mantener un consumo moderado de carbohidratos y grasas.
Seguimiento y monitoreo de la presión arterial a cargo de la EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS
Serología: No reactiva.
Énfasis osteomuscular: Normal.

Medico(a): GUTIERREZ GUERRERO LAURA KATHERINE
Registro médico: 1033756583
Licencia en Salud Ocupacional: Resolución 8485 DE 9 ABRIL DE 2021

CASTRO LOPEZ JOSE DARIO
CC4198494

MEDIEXPRESS S.A.S.

Red Asistencial de Servicios en Salud
Carrera 49 No.91-98
BOGOTA D.C.-BARRIOS UNIDOS (Bogotá D.C.)
Lic. Salud Ocupac. 5080 de 03/11/2020

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

H.C. 79829872

Fecha: 20-diciembre-2024 12:10 pm
Impresión: 20-diciembre-2024 12:15 pm



Paciente: NEMEGUEN MORA WILLIAN FERNANDO
Doc.Iden.: CC79829872 Edad: 48 Años Sexo: M
Entidad: SOLUCIONES FUERZACTIVA S.A.S.
Act. Economic: N/D
Empresa: CONSORCIO OBRAS GT
Dirección: N/D
Adm. Salud: COMPENSAR E.P.S.
Admin.Riesgos SEGUROS BOLIVAR S.A.
Estrato: 2
Cargo: AUXILIAR SISO
Teléfono: 3118184440 Estado civil: UNION LIBRE
Admin.Pension COLFONDOS

Tipo Evaluación: PREOCUPACIONAL

Se certifica que NEMEGUEN MORA WILLIAN FERNANDO identificado con documento de identidad CC 79829872 fue valorado en esta IPS, luego de lo cual se emite el siguiente concepto para desempeñar el cargo de AUXILIAR SISO:

RESTRICCIONES:
Ninguna

RECOMENDACIONES:
Médico-Generales:
Chequeos rutinarios anuales por EPS.

Médico-Laborales:
Atender las instrucciones y directrices de seguridad y salud en el trabajo.

PRUEBAS PARACLINICAS:

CUPS	Servicio	Resultado
890201	ENFASIS OSTEOMUSCULAR	NEGATIVO

OTRAS PRUEBAS PARACLINICAS
Ninguna

Brigitte Diaz M

Medico(a): DIAZ MARTINEZ BRIGITTE
Registro médico: 70413
Licencia en Salud Ocupacional: Res. 4711 30-ABR-2019

NEMEGUEN MORA WILLIAN FERNANDO
CC79829872

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación | Fecha de Radicación 23/12/2024

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectivo [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): 01

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Nemeguen	Mora	William	Fernando

7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número de documento de identidad: 79529872
9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]
10. Fecha de nacimiento: 19/06/1976

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia | 12. Discapacidad: Tipo | Condición | 13. Puntaje SISBEN | 14. Grupo de población especial | 15. Administradora de riesgos laborales - ARL: SURA | 16. Administradora de pensiones: COLFONDOS

17. Ingreso base de cotización - IBC: 1.800000
18. Residencia: cll 59 # 79 -16 | 3118184442

wnemeguen@gmail.com | Bogotá | Zona Urbana [X] Rural [ ] | Galan | Cundinamarca

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres
20. Tipo de documento de identidad | 21. Número de documento de identidad | 22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | 23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre				
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana / Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS)
				F N M T P						
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Cot. S B B
1158

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razon social: Consorcio Obras GT
36. Tipo de documento de identificación: NIT
37. Número del documento de identificación: 901586750-6
38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación: cll 99 # 49-39 | oficinas Operativas GTC | Cundinamarca

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación [ ]
2. Corrección datos básicos de identificación [ ]
3. Actualización documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ]
5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código
6. Reincripción en la EPS [X]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [ ]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ]
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ]
15. Reporte por fallecimiento [ ]
16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ]
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ]
18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo: Femenino	Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha
					23/12/2024

43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado: Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acrediten la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [X]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [X]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 [X]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

William Fernando Nemeguen

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] Cant. [ ] PC [ ] Cant. [ ] TI [ ] Cant. [ ] CC [ ] Cant. [ ] PA [ ] Cant. [ ] CE [ ] Cant. [ ] CD [ ] Cant. [ ] SC [ ] Cant. [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Clarificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

23 DIC 2024
Cód471 Sandra Liliana Rincón R.
SUJETO A VERIFICACIÓN

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio | Código del departamento
67. Datos del SISBEN: Número de la ficha | Puntaje | Nivel
68. Fecha de radicación
69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación: Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad
71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES: Aporte Enero

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersubsidio

Colfondos
del grupo HABITAT

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) WILLIAN FERNANDO NEMEGUEN MORA identificado(a) con C.C No. 79.829.872, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 19 de diciembre del 2024.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

Medellín, 16 de december de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que CESAR AUGUSTO CUERVO identificado(a) con cédula de ciudadanía 11346289 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 17/12/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSORCIO OBRAS GT N901886750

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 16/12/2024 5:24 PM

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La EPS **SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS**,

CERTIFICA

Que **Cesar Augusto Cuervo Montaño** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **11346289**, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 11346289
NOMBRES Y APELLIDOS	Cesar Augusto Cuervo Montaño
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	25/07/1968
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	02/10/2017
FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	504 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	504 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	02/10/2017
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

Vigente
CEDULA DE CIUDADANIA 11346289 Trabajador Independiente Desde 02/10/2017 - Vigente

Generado por yudy.guzman 16/12/2024

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

42

Medellín, 16 de december de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que EDGAR IVAN SANCHEZ MORALES identificado(a) con cédula de ciudadanía 79317526 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 17/12/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSORCIO OBRAS GT N901886750

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 16/12/2024 5.27 PM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

E.P.S.Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado **EPS SANITAS,**

CERTIFICA

Que **Edgar Ivan Sanchez Morales** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA** número **79317526,** está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 79317526
NOMBRES Y APELLIDOS	Edgar Ivan Sanchez Morales
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	22/04/1964
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	31/12/2018
FECHA RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	452 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	452 semanas
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	31/12/2018
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

Vigente
CEDULA DE CIUDADANIA 79317526 Trabajador Independiente Desde 31/12/2018 - Vigente

Generado por yudy.guzman 16/12/2024

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

43

Medellín, 16 de december de 2024

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que IVAN AUGUSTO CUBILLOS TRUJILLO identificado(a) con cédula de ciudadanía 11685270 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 17/12/2024 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

CONSORCIO OBRAS GT N901886750

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERÁMICA, HORMIGÓN O PIEDRA TALLADA, PARQUÉ Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5433001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 16/12/2024 5:30 PM

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

IVAN AUGUSTO CUBILLOS TRUJILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **11.685.270,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 16 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

1.3 Certificado de la Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 5 5 5 B 0 4 A C 1 0 5 5 A C A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA SEGURA TELLEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55062810 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 144934-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1.4 Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 55.062.810

SEGURA TELLEZ
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1974

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAY-1993 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42116857-F-0055062810-20030923 04867 03265A 02 146754812

1.5 Acta de Inicio

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTION CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO	Código: FOR-GEC-053 Versión: 0 Fecha: Memo I2023037454 - 01/12/2023 Página 1

CONTRATO/CONVENIO No	9176	FECHA	19/11/2024

CLASE DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO – 3.

CONTRATISTA/ ASOCIADO

Nombre y/o Razon Social	CONSORCIO OBRAS GT
NIT. N°	901886750-6

PLAZO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de inicio de ejecución del contrato indicado en la plataforma secop II.

Fecha de Inicio: 11-dic.-24

Nota: La ejecución contractual se estima en meses de 30 dias.

Fecha de Finalizacion: 31-dic.-24

SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

Para Constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los 11/12/2024

Firma del -a contratista/asocicado
CONSORCIO OBRAS GT
NIT. N°.901886750-6

Firma del -a supervisor -a/Interventor
CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT. N°.901890754-0

Scanned with

1.6 Carta Aprobaci· n de P· lizasCertificaci· n dirigida a la supervisi· n y/o apoyo de la supervisi· n del contrato de interventor²a designada por la SDIS, con previa aprobaci· n de la interventor²a, de la acreditaci· n del pago de las responsabilidades frente al personal utilizado para la ejecuci· n del contrato.

CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

NIT. No. 901.890.754-0

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 9176-2024

CERTIFICA

Que la empresa **CONSORCIO OBRAS GT** con **NIT. 901.886.750-6**, representada legalmente por el Señor **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 19.321.988** de Bogotá, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. 9176-2024,** conforme al **Acta parcial No. 1** durante el periodo comprendido del 11/12/2024 al 10/01/2025.

Que la firma **CONSORCIO OBRAS GT** Identificada con NIT. 901.886.750-6, representada legalmente por el señor **GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE** identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 19.321.988 expedida en Bogotá, ha cumplido con los pagos de seguridad social integral y parafiscales durante el periodo de ejecución del contrato, los cuales fueron realizados oportunamente de conformidad a lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y demás decretos reglamentarios. Para tal efecto se verificó la certificación de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales emitida por el representante legal de la firma **CONSORCIO OBRAS GT.**

La presente se expide a los siete (7) días del mes de febrero del año 2025.

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT. 901.890.754-0

1.7 Relación de las unidades operativas atendidas en el periodo, identificando el proyecto y vigencia de los recursos, estableciendo por frente el porcentaje de ejecución del contrato de obra y del contrato total.

RELACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS ATENDIDAS EN EL PERIODO

No.	UNIDAD OPERATIVA	VIGENCIA DE LOS RECURSOS	% EJECUCIÓN DEL FRENTE	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ENGATIVÁ				
2	Casa de Luz Esperanza	2024	6,2%	0,58%
3	Jardín Infantil Engativá	2024	60,3%	6,64%
FONTIBÓN				
5	Centro Crecer Fontibón	2024	95,65%	1,61%
6	CPI Shush Urek	2024	81,73%	3,83%
7	Jardín Infantil Oso de Anteojos	2024	30,94%	2,20%
8	Jardín Infantil Sabana Grande	2024	45,78%	4,42%
KENNEDY				
10	Jardín Infantil Mis Primeros Pasos – Tintalito	2024	30,56%	2,69%
11	Jardín Infantil Acunar Caracol	2024	13,24%	1,08%
12	Centro Crecer Campo Alegre Calandaima	2024	10,77%	0,96%

1.8 Corte general de obra con memorias firmados por director y residente de obra y aprobadas por el director y residente de Interventoría, por cada una de las unidades operativas de las intervenciones por rubro.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA NO. 1
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 10 DE ENERO DE 2025

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 0	
Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No.: 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: X MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: UNIDADES OPERATIVAS SDIS

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9170-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/Días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/Días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/Días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/Días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C.; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la Interventoría. para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Obra y/o Modificaciones del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. LA CASA DE LA JUVENTUD													
1	PRELIMINARES				$ 11.650.478,11								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	195,67	$ 5.733,00	$ 1.121.776,11							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	195,67	$ 30.942,00	$ 6.054.421,14							-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10,00	$ 17.041,00	$ 170.410,00							-	
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO, (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	20,00	$ 204.191,00	$ 4.083.820,00							-	
2	CIMENTACIÓN				$ 8.258.814,50								
2.2	CONCRETOS												
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI, NO INCLUYE REFUERZO	M	57,16	$ 97.411,00	$ 5.568.912,76							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	135,02	$ 5.030,00	$ 655.501,40							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 5.091.598,28								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	10,00	$ 27.338,00	$ 273.380,00							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	233,61	$ 20.676,00	$ 4.818.128,28							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 10.884.622,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255,288,00	$ 765,864,00							-	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 382,107,00	$ 2,292,642,00							-	
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA, INLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	2,00	$ 62,412,00	$ 124,824,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10,00	$ 53,592,00	$ 535,920,00							-	
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	8,00	$ 47,463,00	$ 379,704,00							-	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	10,00	$ 19,397,00	$ 193,970,00							-	
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	8,00	$ 23,616,00	$ 188,928,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 337,681,00	$ 3,376,810,00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 176,593,00	$ 1,765,930,00							-	
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	10,00	$ 46,003,00	$ 460,030,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4,896,776,31							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	233,03	$ 10,265,00	$ 2,392,052,95							-	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	57,16	$ 11,259,00	$ 643,564,44							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	24,63	$ 43,084,00	$ 1,061,159,92							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 46,445,885,63							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	195,67	$ 236,329,00	$ 46,242,499,43							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	10,00	$ 40,339,00	$ 403,390,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 13,606,815,20							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	195,67	$ 5,025,00	$ 983,241,75							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA ENASBESTO	KG	3389,45	$ 3,741,00	$ 12,683,673,45							-	
02.CASA LUZ ESPERANZA													
1	PRELIMINARES				$ 5,699,198,79								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,20	$ 26,267,00	$ 136,588,40							-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,09	$ 19,188,00	$ 29,372,00							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20,373,00	$ 40,746,00							-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA + METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 26,092,00	$ 52,184,00							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERIA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21,73	$ 30,842,00	$ 672,369,66							-	
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,64	$ 54,634,00	$ 35,693,76							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,67	$ 18,069,00	$ 319,261,56							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	12,00	$ 17.841,00	$ 214.092,00								
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	71,21	$ 9.724,00	$ 692.846,04			12,00	$ 214.092,00			12,00	$ 214.092,00
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	0,94	$ 272.187,00	$ 255.855,78							-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	119,97	$ 19.227,00	$ 2.306.663,19			0,94	$ 255.855,78			0,94	$ 255.855,78
1.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	12,31	$ 21.401,00	$ 263.446,31			44,20	$ 849.833,40			44,20	$ 849.833,40
2	CIMENTACIÓN							8,37	$ 179.126,37			8,37	$ 179.126,37
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO				$ 355.469,00								
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1,00	$ 355.469,00	$ 355.469,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 21.253.677,00							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	583,25	$ 20.676,00	$ 20.329.677,00							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	50,00	$ 28.468,00	$ 1.423.400,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.505.888,00							-	
4.1	TUBERIA												
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	$ 89.454,00							-	
4.1.65	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.617.377,00								
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 255.288,00	$ 765.864,00			1,00	$ 255.288,00			1,00	$ 255.288,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 367.101,00	$ 367.101,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	50,00	$ 53.592,00	$ 2.679.600,00							-	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	50,00	$ 19.337,00	$ 966.850,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 337.681,00	$ 1.688.405,00			4,00	$ 1.350.724,00			4,00	$ 1.350.724,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 86.228,00	$ 689.824,00			7,00	$ 603.596,00			7,00	$ 603.596,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 43.892,00	$ 689.360,00			14,00	$ 614.488,00			14,00	$ 614.488,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 176.593,00	$ 176.593,00							-	
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	14,00	$ 94.937,00	$ 1.329.518,00			11,00	$ 1.044.967,00			11,00	$ 1.044.967,00
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	2,00	$ 41.825,00	$ 83.650,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.930.769,38								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 6.0cm	M2	71,21	$ 39.834,00	$ 2.822.337,14							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.19	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	2,00	$ 112.258,00	$ 224.516,00							-	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	151,04	$ 24.758,00	$ 3.739.449,32							-	
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	2,10	$ 8.609,00	$ 18.078,90							-	
7.2.40	GUARDAESCOBA ENDURIPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	5,95	$ 19.563,00	$ 116.393,83							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4,499,122,32								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14,91	$ 105.592,00	$ 1.580.161,62								
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,91	$ 185.770,00	$ 2.918.960,70							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.438.392,56							-	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,76	$ 299.004,00	$ 822.251,00							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS, (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	7,32	$ 220.783,00	$ 1.616.131,56							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.456.373,68								
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 361.460,00	$ 361.460,00							-	
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	3,00	$ 359.931,00	$ 1.079.793,00							-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.140.125,44								
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO EN ACERO INOX., CON DIMENSIONES: DE ANCHO 0,60, ALTO: 0,90M LONGITUD EN ML, CAL. 16, SALPICADERO 10 CM, PATAS EN TUBO DE ACERO INOX, CON NIVELADOR, UNA POCETA DE 50 X 50 X 30, CAL. 16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	2,48	$ 459.728,00	$ 1.140.125,44							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.112.921,22								
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1035,25	$ 10.060,00	$ 10.606.311,25							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	60,03	$ 19.539,00	$ 1.172.866,16							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36,35	$ 37.719,00	$ 1.355.243,84							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 716.868,52								
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 8 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	2,76	$ 259.732,00	$ 716.868,52							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.899.340,18								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,80	$ 49.619,00	$ 932.762,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 360 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	71,21	$ 130.839,00	$ 9.317.845,19							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGUN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	21,73	$ 235.329,00	$ 5.135.429,17							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	15,00	$ 40.339,00	$ 605.085,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.691.888,75								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	933,66	$ 5.025,00	$ 4.691.888,75							-	
03	**JARDIN INFANTIL ENGATIVA**				$ 4.691.888,75								
1	PRELIMINARES											-	
1.1	OBRAS PRELIMINARES				$ 34.005.425,80								
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	0,00	$ 18.898,00	$ 0,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CONACABADOS E = 0,15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,44	$ 23.408,00	$ 33.707,52			1,44	$ 33.707,52			1,44	$ 33.707,52
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,25	$ 17.612,00	$ 56.914,00			3,04	$ 53.236,48			3,04	$ 53.236,48

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	156,38	$ 30.542,00	$ 4.838.709,96			130,51	$ 4.038.240,42			130,51	$ 4.038.240,42
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	$ 215.116,00			2,00	$ 215.116,00			2,00	$ 215.116,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	7,30	$ 9.724,00	$ 70.965,20			6,08	$ 59.121,92			6,08	$ 59.121,92
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	784,11	$ 40.032,00	$ 28.750.219,52			693,60	$ 27.912.755,20			693,60	$ 27.912.755,20
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.184.279,20								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	444,20	$ 20.676,00	$ 9.184.279,20			127,16	$ 2.629.160,16			127,16	$ 2.629.160,16
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.519.892,00								
4.1	TUBERÍA												
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	$ 1.519.970,00								
4.1.62	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 119.920,00	$ 119.920,00							-	
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	$ 176.554,00	$ 529.662,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.799.642,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIONE INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 337.681,00	$ 1.350.724,00							-	
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN	1,00	$ 25.729,00	$ 25.729,00			1,00	$ 25.729,00			1,00	$ 25.729,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	17,00	$ 176.593,00	$ 3.002.081,00			9,00	$ 1.589.337,00			9,00	$ 1.589.337,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	2,00	$ 94.997,00	$ 189.994,00			2,00	$ 189.994,00			2,00	$ 189.994,00
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	$ 46.003,00	$ 184.012,00							-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIONDE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 45.502,00	$ 45.502,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 285.364,80							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.06M	M2	7,20	$ 39.634,00	$ 285.364,80								
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 697.291,60			6,08	$ 240.974,72			6,08	$ 240.974,72
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	5,01	$ 139.160,00	$ 697.291,60								
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 603.645,12			4,52	$ 629.093,60			4,52	$ 629.093,60
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS, (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,44	$ 419.559,00	$ 603.645,12							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 218.946,00								
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00	$ 218.946,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.758.164,64								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	$ 14.150,00	$ 84.900,00			5,28	$ 74.712,00			5,28	$ 74.712,00
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	444,16	$ 10.255,00	$ 4.555.807,70								
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	93,73	$ 19.539,00	$ 1.831.296,74							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	140,09	$ 37.719,00	$ 5.280.660,00								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 30.856.213,20							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	7,20	$ 130.839,00	$ 942.040,80							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	166,38	$ 236.329,00	$ 39.357.129,02			107,56	$ 25.419.647,24			107,56	$ 25.419.647,24
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13	M2	14,33	$ 69.786,00	$ 997.043,38			13,65	$ 911.628,50			13,65	$ 911.628,50
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 3.842.265,75								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	764,63	$ 5.025,00	$ 3.842.265,75								
04.LOS SAUCES													
1	PRELIMINARES				$ 9.285.787,55								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA ENTERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	320,05	$ 9.724,00	$ 3.112.165,20								
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	320,05	$ 19.227,00	$ 6.153.501,35							-	
1.3.24	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H= 15 CM	M		$ 22.151,00	$ 0,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.433.859,60							-	
4.1	TUBERIA												
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	25,00	$ 176.954,00	$ 4.423.850,00								
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.869.701,70							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	320,05	$ 39.634,00	$ 12.684.661,70								
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 25.520,00	$ 0,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	15,00	$ 25.656,00	$ 375.840,00								
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.773.809,00							-	
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 6" A 3"	UN	25,00	$ 70.952,00	$ 1.773.800,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.388.752,83							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 24.697,00	$ 4.212.648,45								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	170,85	$ 20.527,00	$ 3.507.037,95								
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 9.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	183,77	$ 11.259,00	$ 2.069.056,43							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 44.096.490,60							-	
17.1.5	MANTO MORTER FLAS AL - 300 3,00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	320,05	$ 130.839,00	$ 41.875.021,95								
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	55,07	$ 40.315,00	$ 2.221.468,73							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 6.687.521,25							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1330,85	$ 5.025,00	$ 6.687.521,25								
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ 0,00							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 3.975,00	$ 0,00							-	
05.CENTRO CRECER FONTIBON													
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.713.267,50								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	19,74	$ 20.676,00	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144,24
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	80,99	$ 28.468,00	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623,32
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 7.088.365,60								
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 86.228,00	$ 517.368,00			6,00	$ 517.368,00			6,00	$ 517.368,00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ CÁLIDA O EQUIVALENTE LED.	UN	6,00	$ 25.729,00	$ 154.374,00			6,00	$ 154.374,00			6,00	$ 154.374,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	18,00	$ 43.892,00	$ 790.056,00			18,00	$ 790.056,00			18,00	$ 790.056,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	32,00	$ 176.593,00	$ 5.650.976,00			32,00	$ 5.650.976,00			32,00	$ 5.650.976,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 50.888,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00			4,00	$ 203.552,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	7,00	$ 94.997,00	$ 664.979,00			7,00	$ 664.979,00			7,00	$ 664.979,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.541.939,07								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,23	$ 10.265,00	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.860,95
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26,24	$ 19.539,60	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677,12
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.026.261,60								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	650,44	$ 5.029,00	$ 3.318.711,00								
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	178,00	$ 3.979,00	$ 707.550,00			80,99	$ 406.974,75			80,99	$ 406.974,75
06. CPI SHUSH UREK													
1	PRELIMINARES				$ 12.595.971,76								
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.6	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	31,80	$ 17.330,00	$ 551.249,40			30,89	$ 535.570,82			30,89	$ 535.570,82
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	296,93	$ 60.832,00	$ 12.044.623,36			288,19	$ 11.763.699,20			288,19	$ 11.763.699,20
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.415.832,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.832,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 36.268.326,12								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	662,93	$ 43.084,00	$ 28.976.636,12			541,04	$ 23.310.167,36			541,04	$ 23.310.167,36
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	165,00	$ 13.986,00	$ 2.307.690,00			97,48	$ 1.363.355,28			97,48	$ 1.363.355,28
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.352.549,40								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,80	$ 42.533,00	$ 1.352.549,40								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.581.167,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	294,96	$ 5.025,00	$ 1.482.274,50								
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	27,50	$ 3.976,00	$ 109.292,50								
07. OSO DE ANTEOJOS													
1	PRELIMINARES				$ 1.034.633,69								
1,3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	106,49	$ 9.724,00	$ 1.034.633,69			106,23	$ 1.032.590,52			106,23	$ 1.032.590,52
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 272.187,00	$ 0,00								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 7.555.514,68								
3,2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	53,97	$ 20.576,00	$ 1.110.603,72			53,97	$ 1.110.603,72			53,97	$ 1.110.603,72
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	226,22	$ 28.469,00	$ 6.440.910,68			204,94	$ 5.834.231,93			204,94	$ 5.834.231,93
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.415.832,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.832,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.731.769,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	39,00	$ 43.892,00	$ 1.711.788,00			27,00	$ 1.185.084,00			27,00	$ 1.185.084,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.217.057,60								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04 M	M2	106,40	$ 39.634,00	$ 4.217.057,60			106,23	$ 4.210.319,82			106,23	$ 4.210.319,82
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 667.616,00								
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUPULA DE 6" A 3"	UN	8,00	$ 70.952,00	$ 667.616,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.899.216,30								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLÁSTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20,00	$ 37.055,00	$ 741.220,00							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	252,62	$ 10.265,00	$ 2.593.144,30			172,64	$ 1.772.149,60			172,64	$ 1.772.149,60
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	79,00	$ 18.538,00	$ 1.465.350,00			70,91	$ 1.385.439,68			70,91	$ 1.385.439,68
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 45.339.318,71								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 3003,00 MM ANCHO 1,10 M ROLLO 11 M2	M2	300,69	$ 130.039,00	$ 39.368.146,71							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	149,00	$ 40.339,00	$ 5.970.172,00			102,29	$ 4.122.645,60			102,29	$ 4.122.645,60
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 3.840.937,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287,50	$ 8.025,00	$ 1.444.687,50			8,00	$ 0,00			-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	150,00	$ 3.975,00	$ 596.250,00			150,00	$ 596.250,00			150,00	$ 596.250,00
08. SABANA GRANDE													
1	PRELIMINARES												
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS				$ 693.493,60								
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMUNOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,30	$ 30.732,00	$ 101.415,60			3,60	$ 49.171,20			1,65	$ 49.171,20
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,20	$ 10.186,80	$ 134.455,20			10,80	$ 110.023,68			10,80	$ 110.023,68
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,00	$ 20.373,00	$ 264.476,00			10,00	$ 203.730,00			10,00	$ 203.730,00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METALICAS, INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 26.092,00	$ 26.092,00							-	
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2", (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,60	$ 17.338,00	$ 62.416,80			3,60	$ 62.416,80			3,60	$ 62.416,80
1.3.39	PERFORACIÓN NEGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 15 CM, (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,60	$ 31.827,00	$ 114.577,20			2,65	$ 84.341,55			2,65	$ 84.341,55
2	CIMENTACIÓN				$ 20.929,60								
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4,12	$ 5.080,00	$ 20.929,60								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 17.693.579,60			3,60	$ 20.218,40			3,60	$ 20.218,40
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	198,55	$ 20.676,60	$ 4.105.319,80			152,55	$ 3.154.123,80			152,55	$ 3.154.123,80
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	419,40	$ 28.468,00	$ 11.939.479,20			172,23	$ 4.902.758,96			172,23	$ 4.902.758,96
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	2,00	$ 823.940,00	$ 1.647.880,00			1,60	$ 1.318.304,00			1,60	$ 1.318.304,00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.459.599,90								
4.1	TUBERÍA												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO		VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.14	PUNTO AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 46.071,00		$ 46.071,00							-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 46.071,00		$ 92.142,00			2,00	$ 92.142,00			2,00	$ 92.142,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 74.613,00		$ 149.226,00			2,00	$ 149.226,00			2,00	$ 149.226,00
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00		$ 89.454,00			2,00	$ 89.454,00			2,00	$ 89.454,00
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN PLASTICO FLEXIBLE	UN	6,00	$ 73.065,00		$ 438.390,00			0,00	$ 0,00			-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00	$ 176.954,00		$ 2.654.310,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 23.971.302,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	30,00	$ 86.328,00		$ 2.589.840,00			30,00	$ 2.589.840,00			30,00	$ 2.589.840,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	29,00	$ 176.055,00		$ 5.105.595,00			26,00	$ 4.529.540,00			26,00	$ 4.529.540,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	69,00	$ 176.593,00		$ 12.184.917,00			64,00	$ 11.301.952,00			64,00	$ 11.301.952,00
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 50.888,00		$ 457.992,00			9,00	$ 457.992,00			9,00	$ 457.992,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	22,00	$ 94.997,00		$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 45.502,00		$ 546.024,00			12,00	$ 546.024,00			12,00	$ 546.024,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 1.809.969,00							-	
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	12,00	$ 105.582,00		$ 1.271.784,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	8,00	$ 67.272,00		$ 538.176,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 556.167,44							-	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,86	$ 299.004,00		$ 556.147,44							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 15.580.720,00							-	
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	9,00	$ 839.235,00		$ 7.552.935,00			5,00	$ 4.196.075,00			5,00	$ 4.196.075,00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 369.799,00		$ 369.799,00							-	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 572.169,00		$ 572.169,00							-	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	2,00	$ 109.473,00		$ 218.946,00							-	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	13,00	$ 381.480,00		$ 4.959.240,00							-	
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	UN	2,00	$ 288.262,00		$ 576.524,00			8,00	$ 2.288.880,00			8,00	$ 2.288.880,00
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 30 X 20	UN	4,00	$ 359.931,00		$ 1.439.724,00			2,00	$ 576.524,00			2,00	$ 576.524,00
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	7,00	$ 35.912,00		$ 251.384,00			0,00	$ 0,00			-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 434.146,00			7,00	$ 251.384,00			7,00	$ 251.384,00
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	2,00	$ 312.073,00		$ 624.146,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 9.388.689,43							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	298,16	$ 10.265,00		$ 3.060.612,40			147,84	$ 1.517.577,60			147,84	$ 1.517.577,60
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	319,79	$ 19.538,00		$ 6.248.057,03			232,32	$ 4.539.068,16			232,33	$ 4.539.068,16
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 467.692,80							-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1,8 DE E=4MM	M2	7,20	$ 64.874,00		$ 467.692,80							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$ 239.599,80							-	
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MAROUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	10,20	$ 23.490,00		$ 239.598,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					$ 6.118.304,50							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.069,78	$ 5.025,00		$ 5.376.644,50							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00		$ 0,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIODEGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG	650,00	$ 3.975,00	$ 2.742.750,00								
NP	ITEMS NO PREVISTOS				$ 11.409.692,31								
NP-01	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA Succión mecánica, recolección, transporte y disposición final de residuos de la trampa de grasas, resane de fisuras y fracturas, e impermeabilización con mortero de revestimiento base de cemento semi flexible	UN	3,00	$ 3.803.230,77	$ 11.409.692,31								
09. CDC KENNEDY													
1	PRELIMINARES				$ 7.284.365,64								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,42	$ 30.942,00	$ 7.284.365,64								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 47.692.599,46								
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	166,00	$ 61.822,00	$ 9.582.410,00								
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	103,42	$ 210.132,00	$ 21.731.051,44								
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECORDOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	171,00	$ 54.306,00	$ 9.286.326,00								
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	71,00	$ 91.442,00	$ 6.492.382,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.909.590,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	380,00	$ 5.025,00	$ 1.909.500,00								
10.JJ TINTALITO													
1	PRELIMINARES				$ 4.828.459,81								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	$ 521.703,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	102,13	$ 30.942,00	$ 3.160.185,46			57,43	$ 1.778.655,53			57,43	$ 1.778.655,53
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCOMERIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	$ 107.559,00	$ 107.559,00								
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	64,45	$ 18.058,00	$ 1.164.492,60			64,45	$ 1.164.492,60			64,45	$ 1.164.492,60
1.3.16	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	6,00	$ 17.841,00	$ 107.046,00			6,00	$ 107.046,00			6,00	$ 107.046,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	4,00	$ 9.724,00	$ 38.896,00								
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0,35M (POR LAS 4 CARAS), INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	30,00	$ 26.299,00	$ 797.969,00								
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	11,13	$ 15.335,00	$ 170.678,55								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.744.401,52								
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	216,56	$ 20.676,00	$ 4.477.664,56								
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	185,42	$ 28.468,00	$ 5.278.536,56								
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.666.755,00								
4.1	TUBERÍA												
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	$ 769.585,00	$ 769.585,00								
4.1.66	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 176.954,00	$ 884.770,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 19.888.329,00								

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERIA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 380,338,00	$ 2.282.028,00							-	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	10,00	$ 345,659,00	$ 3.456.590,00							-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 331,657,00	$ 331.657,00							-	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	7,00	$ 62,812,00	$ 439,684,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	45,00	$ 53,592,00	$ 2.411.640,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE FRENA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 337,681,00	$ 8.442.025,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 85,228,00	$ 255,684,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION.	UN	2,00	$ 176,555,00	$ 353.110,00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 176,593,00	$ 1.412.744,00							-	
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	9,00	$ 46,003,00	$ 414,027,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 293.194,00							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	4,00	$ 39,634,00	$ 158.536,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	13,02	$ 3,430,00	$ 44.659,60							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.345.440,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	20,00	$ 67.272,00	$ 1.345.440,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.415.888,93							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMISO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	11,13	$ 217.061,00	$ 2.415.888,93							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.587.654,65							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	56,38	$ 72.554,00	$ 4.112.917,41							-	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,95	$ 10.565,00	$ 2.327.054,40							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	108,48	$ 19.538,00	$ 2.119.452,24							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	10,00	$ 41.787,00	$ 417.870,00							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	60,00	$ 26.646,00	$ 1.598.760,00							-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	30,00	$ 37.719,00	$ 1.131.570,00			30,00	$ 1.131.570,00			30,00	$ 1.131.570,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 25.136.661,00								
17.1.1	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 25 DESARROLLO 0,25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	28,00	$ 49.616,00	$ 992.320,00							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	13,00	$ 42.533,00	$ 552.929,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER FLAS AL - 300 3,00 MM ANCHO 1,10 M ROLLO 11 M2	M2	4,80	$ 130.039,00	$ 623.355,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGUN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	91,09	$ 236.329,00	$ 21.809.939,00			70,55	$ 16.673.010,95			70,55	$ 16.673.010,95
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	7,00	$ 65.786,00	$ 457.502,00			6,50	$ 434.109,00			6,50	$ 434.109,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	11,00	$ 99.809,00	$ 1.097.855,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 7.042.398,00								-
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	182,00	$ 5.035,00	$ 914.630,00								
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	1.638,00	$ 3.741,00	$ 6.127.768,00								-
11.CARACOL								945,00	$ 3.539.245,00			945,00	$ 3.539.245,00
1	PRELIMINARES				$ 8.483.566,30								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDA ESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	104,80	$ 26.267,00	$ 2.753.405,30			104,80	$ 2.753.405,30			104,80	$ 2.753.405,30
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,00	$ 18.068,00	$ 2.168.160,00			8,14	$ 147.073,52			8,14	$ 147.073,52
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS), INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	50,00	$ 25.266,00	$ 1.263.300,00								
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CARCAMO	M	100,00	$ 22.567,00	$ 2.256.760,00								-
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.897.574,24								-
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	97,89	$ 20.676,00	$ 1.817.213,64			56,85	$ 1.175.430,60			56,85	$ 1.175.430,60
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,85	$ 28.460,00	$ 1.080.360,60			37,85	$ 1.080.360,60			37,85	$ 1.080.360,60
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 40.362.513,36								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	349,68	$ 115.427,00	$ 40.362.513,36								
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.650.880,00								-
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EN ESPUMA S H= 1,5 M	UN	40,00	$ 67.272,00	$ 2.650.880,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.558.399,18								-
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MUROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	263,00	$ 10.265,00	$ 2.699.695,00			77,25	$ 792.971,25			77,25	$ 792.971,25
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	43,05	$ 19.539,00	$ 858.699,18			36,44	$ 711.964,72			36,44	$ 711.964,72
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.309.840,00								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	120,00	$ 127.582,00	$ 15.309.840,00								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.033.980,60								-
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	100,00	$ 40.339,00	$ 4.033.980,60								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.757.142,00								-
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	349,68	$ 5.025,00	$ 1.757.142,00								
12.CAMPO ALEGRE													
1	PRELIMINARES				$ 2.453.123,69								-
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	9,00	$ 17.841,00	$ 160.569,00			9,00	$ 160.569,00			9,00	$ 160.569,00
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	10,00	$ 5.720,00	$ 57.200,00			10,00	$ 57.200,00			10,00	$ 57.200,00
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	224,47	$ 9.724,00	$ 2.182.746,28								-
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	3,80	$ 8.561,00	$ 32.607,80			3,80	$ 32.607,80			3,80	$ 32.607,80
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.241.899,00								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	174,02	$ 20.676,00	$ 3.598.037,52								
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	22,61	$ 28.460,00	$ 643.861,48								-
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.217.397,00								-
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	16,00	$ 53.552,00	$ 760.288,00			7,20	$ 385.862,40			7,20	$ 385.862,40
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	5,00	$ 262.582,00	$ 1.312.910,00			5,00	$ 1.312.910,00			5,00	$ 1.312.910,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 6X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIONE INSTALACIÓN, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	5,00	$ 216.606,00	$ 1.083.030,00			5,00	$ 1.083.030,00			5,00	$ 1.083.030,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORIA 6 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 6X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACION, NO INCLUYE CABLEADO.	UN	2,00	$ 116.755,00	$ 233.552,00							-	
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AGRADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THW-LY TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M, INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 337.681,00	$ 675.362,00			2,00	$ 675.362,00			2,00	$ 675.362,00
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 86.228,00	$ 172.456,00			2,00	$ 172.456,00			2,00	$ 172.456,00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 6 CM TROQUELADA	M	15,00	$ 73.073,00	$ 1.096.095,00			7,28	$ 531.971,44			7,28	$ 531.971,44
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A FA/TP LZH	CAJA	60,00	$ 11.011,00	$ 660.660,00							-	
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A. INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS PUNTAS.	UN	2,00	$ 116.357,00	$ 232.714,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.698.077,64							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	219,46	$ 30.534,00	$ 6.698.077,64							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 24.356.748,80							-	
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM. INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	174,70	$ 139.460,00	$ 24.356.748,80			14,26	$ 1.987.490,40			14,26	$ 1.987.490,40
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.373,16								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA, INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y NIVELES DE PATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	2,52	$ 220.783,00	$ 556.373,16							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.488.880,35							-	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	242,19	$ 10.280,00	$ 2.488.880,35			45,10	$ 463.551,50			45,10	$ 463.551,50
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.288.370,44							-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	33,85	$ 94.764,00	$ 3.288.370,44							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 32.356.884,36							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL + 300 3,00 MM ANCHO 1,00 M ROLLO 11 M2	M2	219,46	$ 130.839,00	$ 28.713.926,94							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	87,76	$ 40.339,00	$ 3.540.957,42							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.327.606,56							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	264,36	$ 5.025,00	$ 1.327.606,56							-	
13. JARDIN INFANTIL BRITALIA													
1	PRELIMINARES				$ 9.485.369,24							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,59	$ 23.809,00	$ 133.079,31							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,20	$ 30.562,00	$ 2.172.129,40							-	
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 107.558,00	$ 215.116,00							-	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	8,00	$ 9.724,00	$ 77.792,00							-	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	168,50	$ 40.832,00	$ 6.880.192,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.091.393,56								

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	251,54	$ 20.676,00	$ 5.200.041,04							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	62,89	$ 28.460,00	$ 1.790.052,52							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.237.789,60								
4,1	TUBERIA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 755.585,60	$ 1.510.970,60							-	
4,1,86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	4,00	$ 176.554,60	$ 707.816,60							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 317.072,00								
7,1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7,1,2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	8,00	$ 39.634,00	$ 317.072,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 838.886,16								
9,2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CONPELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,92	$ 419.198,00	$ 804.860,16							-	
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1,00	$ 25.226,00	$ 25.226,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.499.359,16								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	62,89	$ 14.150,00	$ 889.893,50							-	
13,2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	286,34	$ 10.365,00	$ 2.939.289,10							-	
13,2,2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	34,25	$ 19.538,00	$ 669.178,50							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 28.384.742,50								
17.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,00	$ 49.616,00	$ 893.088,00							-	
17.1.3	BAJANTE EMPVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	9,00	$ 42.823,00	$ 212.685,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL + 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	8,00	$ 130.839,00	$ 1.046.712,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	93,70	$ 235.339,00	$ 22.044.027,30							-	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	50,00	$ 99.895,00	$ 4.990.250,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.031.532,00							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	205,28	$ 5.025,00	$ 1.031.532,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 966,215,432,35		$ 0		$ 224,333,679,52		$ 0		$ 224,333,679,52	23,22%
	35. DESCRIPCIÓN		36. VALOR CONTRACTUAL											
	ADMINISTRACIÓN		28,62%		$ 276,564,641,31		$ 0		$ 63,970,565,40		$ 0		$ 63,970,565,40	
	IMPREVISTO		1%		$ 9,662,154,32		$ 0		$ 2,243,336,80		$ 0		$ 2,243,336,80	
	UTILIDAD		5%		$ 48,310,771,62		$ 0		$ 11,216,683,98		$ 0		$ 11,216,683,98	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 333,537,567,25		$ 0		$ 77,439,986,17		$ 0		$ 77,439,986,17	23,22%
	AJUSTE AL PESO				$ 0,00		$ 0		$ 0,00		$ 0		$ 0,00	
	ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0		$ 0,00		$ 0		$ 0,00	
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0		$ 0,31		$ 0		$ 0,31	
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 1.299.753.000,00		$ 0		$ 301.773.666,00		$ 0		$ 301.773.666,00	23,22%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Hortas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA x MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA LUZ DE ESPERANZA

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Calle 63L No. 124-36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación: Obra y/o Modificaciones

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 5.003.118,70								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE	M2	5,20	$ 26.267,00	$ 136.588,40								
1.3.4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	2,00	$ 10.186,00	$ 20.372,00							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE	UN	2,00	$ 26.092,00	$ 52.184,00							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	21,73	$ 30.942,00	$ 672.369,66							-	
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y	M2	0,64	$ 54.634,00	$ 35.093,76							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL,	M2	17,67	$ 18.068,00	$ 319.261,56							-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	12,00	$ 17.841,00	$ 214.092,00			12,00	$ 214.092			12,00	$ 214.092
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	71,21	$ 9.724,00	$ 692.446,04							-	
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M3	0,94	$ 272.187,00	$ 255.855,78			0,94	$ 255.856			0,94	$ 255.856
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	119,97	$ 19.227,00	$ 2.306.693,19			44,20	$ 849.833			44,20	$ 849.833
1.3.35	DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR, INCLUYE ACARREO INTERNO,	M2	12,31	$ 21.401,00	$ 263.446,31			8,37	$ 179.126			8,37	$ 179.126

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2	CIMENTACIÓN				$ 355.469,00								
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON	M	1,00	$ 355.469,00	$ 355.469,00								
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 21.753.077,00							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	983,25	$ 20.676,00	$ 20.329.677,00								
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	50,00	$ 28.468,00	$ 1.423.400,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.505.086,00							-	
4.1	TUBERIA												
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 44.727,00	$ 89.454,00								
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 9.612.377,00							-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO,	UN	3,00	$ 255.288,00	$ 765.864,00								
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1,00	$ 367.101,00	$ 367.101,00			1,00	$ 255.288			1,00	$ 255.288
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE	M	50,00	$ 53.592,00	$ 2.679.600,00							-	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	50,00	$ 19.397,00	$ 969.850,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	5,00	$ 337.681,00	$ 1.688.405,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	8,00	$ 86.228,00	$ 689.824,00			4,00	$ 1.350.724			4,00	$ 1.350.724
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE	UN	15,00	$ 43.892,00	$ 658.380,00			7,00	$ 603.596			7,00	$ 603.596
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 176.593,00	$ 176.593,00			14,00	$ 614.488			14,00	$ 614.488
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES,	UN	4,00	$ 50.888,00	$ 203.552,00							-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	14,00	$ 94.997,00	$ 1.329.958,00			4,00	$ 203.552			4,00	$ 203.552
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	2,00	$ 41.625,00	$ 83.250,00			11,00	$ 1.044.967			11,00	$ 1.044.967
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 6.920.780,21							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	71,21	$ 39.634,00	$ 2.822.337,14								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	2,00	$ 112.258,00	$ 224.516,00								
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	151,04	$ 24.758,00	$ 3.739.448,32							-	
7.2.35	WIN DE ALUMNIO	M	2,10	$ 8.609,00	$ 18.078,90							-	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	5,95	$ 19.563,00	$ 116.399,85							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.499.122,32								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	14,91	$ 105.982,00	$ 1.580.191,62								
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A	M2	14,91	$ 195.770,00	$ 2.918.930,70							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.438.392,56							-	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	2,75	$ 299.004,00	$ 822.261,00								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E											-	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE	M2	7,32	$ 220.783,00	$ 1.616.131,56								
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 1.461.273,00							-	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE	UN	1,00	$ 381.480,00	$ 381.480,00								
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	3,00	$ 359.931,00	$ 1.079.793,00							-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 1.140.125,44							-	
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE Y ENTREPAÑO	M	2,48	$ 459.728,00	$ 1.140.125,44							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.112.921,23								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1033,25	$ 10.265,00	$ 10.606.311,25								
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	60,03	$ 19.538,00	$ 1.172.856,14							-	
13,4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	35,36	$ 37.719,00	$ 1.333.743,84								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 716.860,32							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE	M2	2,76	$ 259.732,00	$ 716.860,32								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 15.980.340,16							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,80	$ 49.616,00	$ 932.780,80								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1,10 M ROLLO 11 M2	M2	71,21	$ 130.839,00	$ 9.317.045,19							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	21,73	$ 236.329,00	$ 5.135.429,17							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	15,00	$ 40.339,00	$ 605.085,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.691.088,75							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	933,55	$ 5.025,00	$ 4.691.088,75							-	

26. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 89.206.051,69**		$ 0		$ 5.571.523		$ 0		$ 5.571.523
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		28,52%			$ 25.441.565,94		$ 0		$ 1.588.998		$ 0		$ 1.588.998
IMPREVISTO		1%			$ 892.060,52		$ 0		$ 55.715		$ 0		$ 55.715
UTILIDAD		5%			$ 4.460.302,58		$ 0		$ 278.576		$ 0		$ 278.576
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 30.793.929,04**		$ 0		$ 7.494.812		$ 0		$ 7.494.812
ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 119.999.980,73**		$ 0		$ 7.494.812		$ 0		$ 7.494.812

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE LA OBRA

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No.: 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: x MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL ENGATIVA

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Calle 68b No. 122-3

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación: Obra y/o Modificaciones

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 34.005.425,80								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE	M2	0,00	$ 18.896,00	$ 0,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0,15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	1,44	$ 23.408,00	$ 33.707,52			1,44	$ 33.708			1,44	$ 33.708
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,	UN	2,00	$ 20.373,00	$ 40.746,00							-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS,	M2	3,25	$ 17.512,00	$ 56.914,00			3,04	$ 53.236			3,04	$ 53.236
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL	M2	156,38	$ 30.942,00	$ 4.838.709,96			130,51	$ 4.038.240			130,51	$ 4.038.240
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXION, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO,	UN	2,00	$ 107.558,00	$ 215.116,00			2	$ 215.116			2,00	$ 215.116
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	7,20	$ 9.724,00	$ 70.012,80			6,08	$ 59.122			6,08	$ 59.122
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SANDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS	M2	704,11	$ 40.832,00	$ 28.750.219,52			683,6	$ 27.912.755			683,60	$ 27.912.755
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.184.279,20								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	444,20	$ 20.676,00	$ 9.184.279,20			127,16	$ 2.629.160			127,16	$ 2.629.160
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 2.169.852,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	2,00	$ 759.985,00	$ 1.519.970,00								
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 119.020,00	$ 119.020,00							-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3,00	$ 176.954,00	$ 530.862,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 4.768.042,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	4,00	$ 337.681,00	$ 1.350.724,00							-	
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLUYE BOMBILLO	UN	1,00	$ 25.729,00	$ 25.729,00			1	$ 25.729			1,00	$ 25.729
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES.	UN	17,00	$ 176.593,00	$ 3.002.081,00			9	$ 1.589.337			9,00	$ 1.589.337
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMETICA DE SOBREPONER	UN	2,00	$ 94.997,00	$ 189.994,00			2	$ 189.994			2,00	$ 189.994
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	4,00	$ 46.003,00	$ 184.012,00							-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 45.502,00	$ 45.502,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 285.364,80								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	7,20	$ 39.634,00	$ 285.364,80			6,08	$ 240.975			6,08	$ 240.975
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 697.291,80								
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO	M2	5,01	$ 139.160,00	$ 697.291,60			4,52	$ 629.094			4,52	$ 629.094
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 603.645,12								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE	M2	1,44	$ 419.198,00	$ 603.645,12							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 218.946,00								
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA	UN	2,00	$ 109.473,00	$ 218.946,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.756.364,44								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00	$ 14.150,00	$ 84.900,00			5,28	$ 74.712			5,28	$ 74.712
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	444,18	$ 10.265,00	$ 4.559.507,70							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	93,73	$ 19.638,00	$ 1.831.296,74							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE	M	140,00	$ 37.719,00	$ 5.280.660,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 38.856.213,20								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	7,20	$ 130.839,00	$ 942.040,80							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS	M2	156,38	$ 236.329,00	$ 36.957.129,02			107,56	$ 25.419.547			107,56	$ 25.419.547
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07	M2	14,33	$ 66.766,00	$ 957.043,38			13,65	$ 911.629			13,65	$ 911.629
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 3.842.265,75								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	764,63	$ 5.025,00	$ 3.842.265,75							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 106.417.690,11		$ 0		$ 64.022.354		$ 0		$ 64.022.354
35. DESCRIPCIÓN			36. VALOR CONTRACTUAL										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 30.350.325,22		$ 0		$ 18.259.175		$ 0		$ 18.259.175
IMPREVISTO			1%		$ 1.064.176,90		$ 0		$ 640.224		$ 0		$ 640.224
UTILIDAD			5%		$ 5.320.884,51		$ 0		$ 3.201.118		$ 0		$ 3.201.118
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 36.735.386,63		$ 0		$ 86.122.871		$ 0		$ 86.122.871
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 143.153.076,74		$ 0		$ 86.122.871		$ 0		$ 86.122.871

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12.275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO CRECER FONTIBÓN

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Calle 22 F No.106-26

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.713.767,56								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	19,74	$ 20.676,00	$ 408.144,24			19,74	$ 408.144			19,74	$ 408.144
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	80,99	$ 28.468,00	$ 2.305.623,32			80,99	$ 2.305.623			80,99	$ 2.305.623
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 7.981.305,00								
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES.	UN	6	$ 86.228,00	$ 517.368,00			6	$ 517.368			6,00	$ 517.368
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO	UN	6	$ 25.729,00	$ 154.374,00			6	$ 154.374			6,00	$ 154.374
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR. INCLUYE	UN	18	$ 43.692,00	$ 790.056,00			18	$ 790.056			18,00	$ 790.056
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES.	UN	32	$ 176.593,00	$ 5.650.976,00			32	$ 5.650.976			32,00	$ 5.650.976
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES.	UN	4	$ 50.888,00	$ 203.552,00			4	$ 203.552			4,00	$ 203.552
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	7	$ 94.997,00	$ 664.979,00			7	$ 664.979			7,00	$ 664.979
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.541.538,07								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	100,23	$ 10.265,00	$ 1.028.860,95			100,23	$ 1.028.861			100,23	$ 1.028.861

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26,24	$ 19.538,00	$ 512.677,12			26,24	$ 512.677			26,24	$ 512.677
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 4.026.261,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	660,44	$ 5.025,00	$ 3.318.711,00			80,99	$ 406.975			80,99	$ 406.975
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	178	$ 3.975,00	$ 707.550,00							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 16.262.871,63		$ 0		$ 12.643.585		$ 0		$ 12.643.585
35. DESCRIPCIÓN			36. VALOR CONTRACTUAL										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 4.638.170,99		$ 0		$ 3.605.951		$ 0		$ 3.605.951
IMPREVISTO			1%		$ 162.628,72		$ 0		$ 126.436		$ 0		$ 126.436
UTILIDAD			5%		$ 813.143,58		$ 0		$ 632.179		$ 0		$ 632.179
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 5.613.943,29		$ 0		$ 17.008.151		$ 0		$ 17.008.151
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 21.876.814,92		$ 0		$ 17.008.151		$ 0		$ 17.008.151

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera. 98a #15a-99

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 12.595.971,76								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN.	M	31,8	$ 17.338,00	$ 551.348,40			30,89	$ 535.571			30,89	$ 535.571
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH. INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	294,98	$ 40.832,00	$ 12.044.623,36			288,1	$ 11.763.699			288,10	$ 11.763.699
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.415.632,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 28.284.326,12							-	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	602,93	$ 43.064,00	$ 25.976.636,12			541,04	$ 23.310.167			541,04	$ 23.310.167
13.2.6	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0,6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	165	$ 13.956,00	$ 2.307.690,00			97,48	$ 1.363.355			97,48	$ 1.363.355
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 1.352.549,40								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	31,8	$ 42.533,00	$ 1.352.549,40							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.591.587,00								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	294,98	$ 5.025,00	$ 1.482.274,50							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	27,5	$ 3.975,00	$ 109.312,50							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 45.240.066,28		$ 0		$ 36.972.793		$ 0		$ 36.972.793
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 12.902.466,80		$ 0		$ 10.544.640		$ 0		$ 10.544.640
IMPREVISTO			1%		$ 452.400,66		$ 0		$ 369.728		$ 0		$ 369.728
UTILIDAD			5%		$ 2.262.003,31		$ 0		$ 1.846.640		$ 0		$ 1.846.640
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 15.616.870,87		$ 0		$ 49.735.801		$ 0		$ 49.735.801
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 60.856.937,15		$ 0		$ 49.735.801		$ 0		$ 49.735.801

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. NO. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19,321,988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,686,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	21	1	2025						
2. ACTA No.	1	3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	x	MODIFICACIONES		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			Carrera 100 No. 23-22		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23		2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	54 Días	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23		2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	54 Días	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES								
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Escoger una opción

Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 1.034.633,60								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	106,4	$ 9.724,00	$ 1.034.633,60			106,23	$ 1.032.981			106,23	$ 1.032.981
1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M3		$ 272.187,00	$ 0,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 7.555.914,68								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	53,97	$ 20.676,00	$ 1.115.883,72			53,97	$ 1.115.884			53,97	$ 1.115.884
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	226,22	$ 28.468,00	$ 6.440.030,56			204,94	$ 5.834.232			204,94	$ 5.834.232
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.415.632,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8	$ 176.954,00	$ 1.415.632,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 1.711.788,00								
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE	UN	39	$ 43.892,00	$ 1.711.788,00			27	$ 1.185.084			27,00	$ 1.185.084

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.217.057,60								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	106,4	$ 39.634,00	$ 4.217.057,60			106,23	$ 4.210.320			106,23	$ 4.210.320
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 567.616,00								
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	8	$ 70.952,00	$ 567.616,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.809.214,30								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLASTICO (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	20	$ 37.086,00	$ 741.720,00							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	252,62	$ 10.265,00	$ 2.593.144,30			172,64	$ 1.772.150			172,64	$ 1.772.150
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	75	$ 19.538,00	$ 1.466.350,00			70,91	$ 1.385.440			70,91	$ 1.385.440
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 45.338.318,71								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	300,69	$ 130.839,00	$ 39.368.146,71							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	148	$ 40.339,00	$ 5.970.172,00			102,2	$ 4.122.646			102,20	$ 4.122.646
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 2.040.937,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287,5	$ 5.025,00	$ 1.444.687,50							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	150	$ 3.975,00	$ 596.250,00			150	$ 596.250			150,00	$ 596.250

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 68.682.112,39		$ 0		$ 21.254.965		$ 0		$ 21.254.965
	35. DESCRIPCIÓN		36. VALOR CONTRACTUAL										
	ADMINISTRACIÓN		28,52%		$ 19.588.138,45		$ 0		$ 6.061.922		$ 0		$ 6.061.922
	IMPREVISTO		1%		$ 686.821,12		$ 0		$ 212.550		$ 0		$ 212.550
	UTILIDAD		5%		$ 3.434.105,62		$ 0		$ 1.062.749		$ 0		$ 1.062.749
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 23.709.065,19		$ 0		$ 28.592.206		$ 0		$ 28.592.206
	ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 92.391.177,58		$ 0		$ 28.592.206		$ 0		$ 28.592.206
					VERDADERO								

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera 108 No. 15 A – 32

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación: (Escoger una opción)

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 683.432,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS.	M	3.3	$ 30.732,00	$ 101.415,60								
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	13.2	$ 10.186,00	$ 134.455,20			1,60	$ 49.171			1,60	$ 49.171
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS.	UN	12	$ 20.373,00	$ 244.476,00			10,88	$ 110.824			10,88	$ 110.824
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO.	UN	1	$ 26.092,00	$ 26.092,00			10,00	$ 203.730			10,00	$ 203.730
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN,	M	3.6	$ 17.335,00	$ 62.406,60			0,00	$ 0			-	
1.3.39	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10	M	3.6	$ 31.827,00	$ 114.577,20			3,60	$ 62.417			3,60	$ 62.417
2	CIMENTACIÓN				$ 20.929,60			2,65	$ 84.342			2,65	$ 84.342
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4,12	$ 5.080,00	$ 20.929,60								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 17.692.579,00			3,98	$ 20.218			3,98	$ 20.218
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	198,55	$ 20.676,00	$ 4.105.219,80			152,55	$ 3.154.124			152,55	$ 3.154.124

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO	M2	419,4	$ 28.468,00	$ 11.939.479,20			172,22	$ 4.902.759			172,22	$ 4.902.759
3.2.19	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	2	$ 823.940,00	$ 1.647.880,00			1,60	$ 1.318.304			1,60	$ 1.318.304
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 3.469.599,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS	UN	1	$ 46.071,00	$ 46.071,00							-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	UN	2	$ 46.071,00	$ 92.142,00			2,00	$ 92.142			2,00	$ 92.142
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 74.613,00	$ 149.226,00			2,00	$ 149.226			2,00	$ 149.226
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 44.727,00	$ 89.454,00			2,00	$ 89.454			2,00	$ 89.454
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	UN	6	$ 73.066,00	$ 438.396,00			0,00	$ 0			-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15	$ 176.954,00	$ 2.654.310,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 22.971.302,00								
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES.	UN	30	$ 86.228,00	$ 2.586.840,00			30,00	$ 2.586.840			30,00	$ 2.586.840
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27, INCLUYE BOMBILLO	UN		$ 25.729,00	$ 0,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES.	UN	29	$ 176.055,00	$ 5.105.595,00			28,00	$ 4.929.540			28,00	$ 4.929.540
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	69	$ 176.593,00	$ 12.184.917,00			64,00	$ 11.301.952			64,00	$ 11.301.952
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES, INCLUYE SOPORTES,	UN	9	$ 50.888,00	$ 457.992,00			9,00	$ 457.992			9,00	$ 457.992
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	22	$ 94.997,00	$ 2.089.934,00			22,00	$ 2.089.934			22,00	$ 2.089.934
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN	12	$ 45.502,00	$ 546.024,00			12,00	$ 546.024			12,00	$ 546.024
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.809.960,00								
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2	12	$ 105.982,00	$ 1.271.784,00							-	
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	8	$ 67.272,00	$ 538.176,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.147,44								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1,86	$ 299.004,00	$ 556.147,44							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 15.960.720,00								
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE	UN	9	$ 839.215,00	$ 7.552.935,00			5,00	$ 4.196.075			5,00	$ 4.196.075
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	1	$ 389.799,00	$ 389.799,00							-	
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERIA TIPO	UN	1	$ 572.168,00	$ 572.168,00							-	
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA,	UN	2	$ 109.473,00	$ 218.946,00							-	
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH,	UN	13	$ 381.480,00	$ 4.959.240,00			6,00	$ 2.288.880			6,00	$ 2.288.880
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA ORINAL LINEA INFANTIL	UN	2	$ 288.262,00	$ 576.524,00			2,00	$ 576.524			2,00	$ 576.524
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	4	$ 359.931,00	$ 1.439.724,00			0,00	$ 0			-	
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	UN	7	$ 35.912,00	$ 251.384,00			7,00	$ 251.384			7,00	$ 251.384
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 624.146,00								
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A =	UN	2	$ 312.073,00	$ 624.146,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.308.669,42								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	298,16	$ 10.265,00	$ 3.060.612,40			147,84	$ 1.517.578			147,84	$ 1.517.578
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	319,79	$ 19.538,00	$ 6.248.057,02			232,32	$ 4.539.068			232,32	$ 4.539.068
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 467.092,80								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1,5 DE E=4MM	M2	7,2	$ 64.874,00	$ 467.092,80							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 239.598,00								
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	10,2	$ 23.490,00	$ 239.598,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 9.118.394,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1069,76	$ 5.025,00	$ 5.375.644,50								
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.741,00	$ 0,00							-	
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES	KG	690	$ 3.975,00	$ 2.742.750,00							-	
NP	ITEMS NO PREVISTOS				$ 11.409.692,31								
NP-01	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA Succión mecánica, recolección.	UN	3	$ 3.803.230,77	$ 11.409.692,31							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 93.332.262,87		$ 0		$ 45.518.501		$ 0		$ 45.518.501
35. DESCRIPCIÓN		36. VALOR CONTRACTUAL											
ADMINISTRACIÓN		28,52%		$	26.618.361,37		$ 0		$ 12.981.677		$ 0		$ 12.981.677
IMPREVISTO		1%		$	933.322,63		$ 0		$ 455.185		$ 0		$ 455.185
UTILIDAD		5%		$	4.666.613,14		$ 0		$ 2.275.925		$ 0		$ 2.275.925
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 32.218.297,14		$ 0		$ 61.231.488		$ 0		$ 61.231.488
ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 125.550.560,01		$ 0		$ 61.231.488		$ 0		$ 61.231.488

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.986 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No.: 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: x — MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera 86ª No. 39-63 Sur

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 se reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

(Escoger una opción)

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 6,028,450,61								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.3	REPLANTEO	M2	91,00	$ 5.733,00	$ 521.703,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	102,13	$ 30.942,00	$ 3.160.105,46								
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO,	UN	1,00	$ 107.558,00	$ 107.558,00			57,49	$ 1.778.856			57,49	$ 1.778.856
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL,	M2	64,45	$ 18.068,00	$ 1.164.482,60							-	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO,	UN	6,00	$ 17.841,00	$ 107.046,00			64,45	$ 1.164.483			64,45	$ 1.164.483
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	4,00	$ 9.724,00	$ 38.896,00			6,00	$ 107.046			6,00	$ 107.046
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4	M	30,00	$ 25.266,00	$ 757.980,00							-	
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION	M2	11,13	$ 15.335,00	$ 170.676,55							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 9.764.461,52							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	216,98	$ 20.676,00	$ 4.485.864,96							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	185,42	$ 28.468,00	$ 5.278.536,56							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 1.644.755,00								
4.1	TUBERIA												
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1,00	$ 759.985,00	$ 759.985,00							-	
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	5,00	$ 176.954,00	$ 884.770,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 19.809.379,00							-	
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON	UN	6	$ 380.338,00	$ 2.282.028,00								
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	10	$ 346.658,00	$ 3.466.580,00							-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1	$ 331.657,00	$ 331.657,00							-	
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA,	UN	7	$ 62.412,00	$ 436.884,00							-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE	M	45	$ 53.592,00	$ 2.411.640,00							-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	25	$ 337.681,00	$ 8.442.025,00							-	
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	3	$ 86.228,00	$ 258.684,00							-	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES,	UN	2	$ 176.055,00	$ 352.110,00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES,	UN	8	$ 176.593,00	$ 1.412.744,00							-	
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	9	$ 46.003,00	$ 414.027,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 203.194,60								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	4,00	$ 39.634,00	$ 158.536,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	13,02	$ 3.430,00	$ 44.658,60							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.345.440,00								
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	20,00	$ 67.272,00	$ 1.345.440,00							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.415.888,93								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	11,13	$ 217.061,00	$ 2.415.888,93							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 11.547.694,05								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO	M2	56,38	$ 72.954,00	$ 4.112.917,41							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	216,96	$ 10.285,00	$ 2.227.094,40							-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	108,48	$ 19.538,00	$ 2.119.482,24							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	10	$ 41.787,00	$ 417.870,00							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METALICA	M2	60	$ 25.646,00	$ 1.538.760,00							-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	30	$ 37.719,00	$ 1.131.570,00			30,00	$ 1.131.570			30,00	$ 1.131.570
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 25.139.901,00								
17.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0,25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	20,00	$ 49.616,00	$ 992.320,00							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	13,00	$ 42.533,00	$ 552.929,00							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLASAL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	4,00	$ 130.839,00	$ 523.356,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	91,00	$ 236.329,00	$ 21.505.939,00			70,55	$ 16.673.011			70,55	$ 16.673.011
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	7,00	$ 66.786,00	$ 467.502,00			6,50	$ 434.109			6,50	$ 434.109
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	11,00	$ 99.805,00	$ 1.097.855,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 7.042.308,69								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	182	$ 5.025,00	$ 914.550,00							-	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG	1636	$ 3.741,00	$ 6.127.758,00			945,00	$ 3.535.245			945,00	$ 3.535.245
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 84,940,412,71**		**$ 0**		**$ 24.824.319**		**$ 0**		**$ 24.824.319**
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			28,52%		$ 24.225.095,70		$ 0		$ 7.079.896		$ 0		$ 7.079.896
IMPREVISTO			1%		$ 849.404,13		$ 0		$ 248.243		$ 0		$ 248.243
UTILIDAD			5%		$ 4.247.020,64		$ 0		$ 1.241.216		$ 0		$ 1.241.216
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 29.321.430,47**		**$ 0**		**$ 33.393.674**		**$ 0**		**$ 33.393.674**
ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 114.261.843,18**		**$ 0**		**$ 33.393.674**		**$ 0**		**$ 33.393.674**

FALSO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12.275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No.: 1 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: x — MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDÍN INFANTIL CARACOL — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera. 57a No. 48a Sur-67,

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025 — 11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días — 13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024 — 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024 — 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025 — 22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días — 24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días — 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

Escoger una opción

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 8.443.569,30								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE	M2	104,9	$ 26.267,00	$ 2.755.408,30			104,9	$ 2.755.408			104,90	$ 2.755.408
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL,	M2	120	$ 18.068,00	$ 2.168.160,00			8,14	$ 147.074			8,14	$ 147.074
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0,35M (POR LAS 4	M	50	$ 25.266,00	$ 1.263.300,00							-	
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	100	$ 22.567,00	$ 2.256.700,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.997.574,24								
3,2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	87,69	$ 20.676,00	$ 1.817.213,64			56,85	$ 1.175.431			56,85	$ 1.175.431
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	37,95	$ 28.468,00	$ 1.080.360,60			37,95	$ 1.080.361			37,95	$ 1.080.361
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 40.382.513,36								
7,2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	349,66	$ 115.427,00	$ 40.382.513,36							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.699.699,00								

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	40	$ 67.272,00	$ 2.690.880,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.558.390,10								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283	$ 10.265,00	$ 2.699.695,00			77,25	$ 792.971			77,25	$ 792.971
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	43,95	$ 19.538,00	$ 858.695,10			36,44	$ 711.965			36,44	$ 711.965
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 15.309.840,00								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	120	$ 127.582,00	$ 15.309.840,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 4.033.900,00								
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	100	$ 40.339,00	$ 4.033.900,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.757.142,00								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	349,68	$ 5.025,00	$ 1.757.142,00							-	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 79.053.808,00**		$ 0		$ 6.663.209		$ 0		$ 6.663.209
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		28,52%		$ 22.546.148,04		$ 0		$ 1.900.347		$ 0		$ 1.900.347
	IMPREVISTO		1%		$ 790.538,08		$ 0		$ 66.632		$ 0		$ 66.632
	UTILIDAD		5%		$ 3.952.690,40		$ 0		$ 333.160		$ 0		$ 333.160
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 27.289.374,52**		$ 0		$ 8.963.349		$ 0		$ 8.963.349
	ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 106.343.182,52**		$ 0		$ 8.963.349		$ 0		$ 8.963.349

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,136 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901,890,754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 0 Fecha: Memo 2024000000 - 00/00/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 21 / 1 / 2025

2. ACTA No. 1

3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA [x] MODIFICACIONES [ ]

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA

5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: Carrera 88 No. 6A – 36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9176-2024

7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024

8. VALOR CONTRATO: $ 1.299.753.000

9. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2025

10. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

11. PLAZO: 74 Meses/días

12. PRORROGAS: 54 Días

13. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9355-2024

18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024

19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 11 / 12 / 2024

21. FECHA DE TERMINACIÓN: 23 / 2 / 2025

22. PLAZO: 74 Meses/días

23. PRORROGAS: 54 Días

24. SUSPENSIONES: 0 Meses/días

25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

27. SUPERVISOR SDIS: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 21 días del mes de enero del año 2025 e reunieron Cesar Eduardo Gómez Gómez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de ING. GUSTAVO TORRES DUARTE representante legal del contratista y del mes de diciembre según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 2.433.123,08								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	9,00	$ 17.841,00	$ 160.569,00			9	$ 160.569			9,00	$ 160.569
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	M2	10,00	$ 5.720,00	$ 57.200,00			10	$ 57.200			10,00	$ 57.200
1.3.20	PICADO DE MEMERANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	224,47	$ 9.724,00	$ 2.182.746,28							-	
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	3,80	$ 8.581,00	$ 32.607,80			3,8	$ 32.608			3,80	$ 32.608
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 4.241.699,09								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	174,02	$ 20.676,00	$ 3.598.037,52							-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	22,61	$ 28.468,00	$ 643.661,48							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES				$ 6.217.107,00								
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4", INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	14,00	$ 53.592,00	$ 750.288,00			7,2	$ 385.862			7,20	$ 385.862
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	5,00	$ 262.582,00	$ 1.312.910,00			5	$ 1.312.910			5,00	$ 1.312.910

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO	UN	5,00	$ 216.606,00	$ 1.083.030,00			5	$ 1.083.030			5,00	$ 1.083.030
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO	UN	2,00	$ 116.796,00	$ 233.592,00							-	
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE	UN	2,00	$ 337.681,00	$ 675.362,00			2	$ 675.362			2,00	$ 675.362
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES,	UN	2,00	$ 86.228,00	$ 172.456,00			2	$ 172.456			2,00	$ 172.456
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	15,00	$ 73.073,00	$ 1.096.095,00			7,28	$ 531.971			7,28	$ 531.971
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH	CAJA	60,00	$ 11.011,00	$ 660.660,00							-	
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A, INCLUYE PONCHADO EN LAS DOS	UN	2,00	$ 116.357,00	$ 232.714,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 8.698.077,64							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	219,46	$ 39.634,00	$ 8.698.077,64							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 24.314.746,00								
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	174,70	$ 139.180,00	$ 24.314.746,00			14,28	$ 1.987.490			14,28	$ 1.987.490
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 556.373,16								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	2,52	$ 220.783,00	$ 556.373,16							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.486.080,35								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	242,19	$ 10.265,60	$ 2.486.080,35			45,1	$ 462.952			45,10	$ 462.952
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 3.208.370,44								
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	33,86	$ 94.754,00	$ 3.208.370,44							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 32.256.884,36							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	219,46	$ 130.839,00	$ 28.713.926,94							-	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	87,78	$ 40.339,00	$ 3.540.957,42							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ 1.327.906,50								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	264,26	$ 5.025,00	$ 1.327.906,50							-	

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 85.738.367,53**		$ 0		$ 6.862.411		$ 0		$ 6.862.411
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		28,52%			$ 24.452.582,42		$ 0		$ 1.957.159		$ 0		$ 1.957.159
IMPREVISTO		1%			$ 857.383,68		$ 0		$ 68.624		$ 0		$ 68.624
UTILIDAD		5%			$ 4.288.918,38		$ 0		$ 343.121		$ 0		$ 343.121
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 29.598.884,48**		$ 0		$ 9.231.315		$ 0		$ 9.231.315
ANTICIPO		0%			$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 115.335.252,01**		$ 0		$ 9.231.315		$ 0		$ 9.231.315

VERDADERO

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO					
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL					
INFORME SST					
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 07 días del mes de febrero del año 2026.

CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: ING. GUSTAVO A. TORRES DUARTE
C.C. 19.321.988 de Bogotá D.C.
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nit. 901,886,750-6

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nombre: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogotá D.C
Rep legal. CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
Nit. 901.890.754-0

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

CASA LUZ DE ESPERANZA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D/C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	1178-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
JARDINERAS DE CUBIERTA									
Desmonte luminaria tipo tortuga con cableado en meteres						8.00	8.00		
Desmonte tomacorrientes con cableado en materas						4.00	4.00		

TOTAL EJECUTADO	12.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	12.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
12.00	0.00	12.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSICA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5165-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.21	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M3

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Paso				
CUBIERTA									
HUERTA 1		0.15	14.95	0.15			0.34		
HUERTA 2		0.15	9.80	0.15			0.22		
HUERTA 3		0.15	7.72	0.15			0.17		
HUERTA 4		0.15	9.37	0.15			0.21		

TOTAL EJECUTADO	0.94	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M3
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0.00	M3
PRESENTE ACTA	0.94	M3

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.94	0.00	0.94

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSICA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Area**				
CUBIERTA									
HUERTA 1					27,71	1,00	27,71		
HUERTA 4					16,49	1,00	16,49		

TOTAL EJECUTADO	44,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**44,20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
44,20	0,00	**44,20**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	907-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	855-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	3.8.05	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA									
HUERTA 1			14.95	0.20		1.00	2.99		
HUERTA 2			9.80	0.20		1.00	1.96		
HUERTA 3			7.72	0.20		1.00	1.54		
HUERTA 4			9.37	0.20		1.00	1.87		

TOTAL EJECUTADO	8.37	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	8.37	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8.37	0.00	8.37

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MEECHAN / ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA									
Interruptor reflectores						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.65**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA									
Salidas para reflectores en terraza						4,00	4,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.69**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA									
PUNTO FIJO ESCALERAS DE EMERGENCIA						1,00	1,00		
PUNTO FIJO ESCALERAS DE INGRESO						2,00	2,00		
TERCER PISO									
ESCALERA DE EMERGENCIA						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
ESCALERA DE EMERGENCIA						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
CUARTO TABLEROS						1,00	1,00		
CUARTO DE BOMAS						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.71.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERCER PISO									
OFICINAS COORDINACION						2,00	2,00		
CUARTO ARCHIVO						1,00	1,00		
PASILLO INGRESO A OFICINAS						1,00	1,00		
BAÑO HOMBRES						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
BAÑO HOMBRES						3,00	3,00		
BAÑO MUJERES						2,00	2,00		
PASILLO FRENTE BAÑO						1,00	1,00		
DEPOSITO						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
PORTERIA						1,00	1,00		
CUARTO DE TABLEROS EN ESCALERAS						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	14,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**14,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,00	0,00	**14,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.73**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA									
reflectores en terraza						4,00	4,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	LUIS FERNANDO RUIZ/MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEDE DE SABIDURIA LUZ ESPERANZA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9126-2024	FRENTE OBRA	CASA DE SABIDURIA - LUZ DE ESPERANZA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO / UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Cocina						11.00	11.00		

TOTAL EJECUTADO	11.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	11.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11.00	0.00	11.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

23

ENGATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			ACTA No:	001
ITEM	1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	demolición de mamposteria caminadores 1 para ventana			1.80	0.80			1.44		

TOTAL EJECUTADO	1.44	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	1.44	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.44	0.00	1.44

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9376-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001	
ITEM	1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

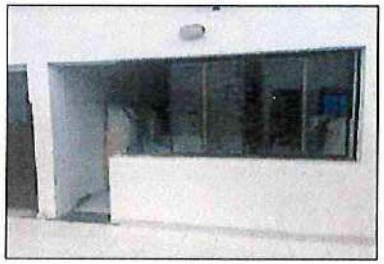ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Desmonte de ventana en salon de comedores 1			2.60	1.17		1.00	3.04		

TOTAL EJECUTADO	3.04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	3.04	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3.04	0.00	3.04

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9374-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	000
ITEM	1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Desmonte de cubierta existente en comedor		3.94	13.65			2.00	107.56		
Desmonte de cubierta existente en zona de colchonetos		2.70	8.50			1.00	22.95		

TOTAL EJECUTADO	130.51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	130.51	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
130.51	0.00	130.51

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA LACOUTURE
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
retiro de tanques						2.00	2.00		

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	2.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	0.00	2.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
Picado en Placa de tanques		2.31	2.72				6.28		
menos columna 1		0.30	0.2			-2.00	-0.12		
menos columna 2		0.20	0.2			-2.00	-0.08		

TOTAL EJECUTADO	6.08	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	6.08	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6.08	0.00	6.08

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORES GT	CONTRATO No:	5176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de enero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	3.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDUCHE O RONDOF , INCLUYE TORNILLOS SURSANACION DE GOTERAS	UNIDAD	M2

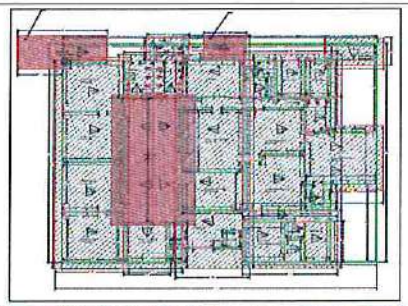
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN							CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	A1	A2	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE												
PREJARDIN 1 Y 2, PARVULOS 1 Y 2.			7.06	0.60	7.07	22.80				161.23		
PARVULOS 3			5.09	0.90	5.30	5.71				29.11		
OFICINA, ENTRADA PORTERIA PASILLO, CAMINADORES 1, SALA MATERNA, PASILLO, COCINA			7.16	0.70	7.39	23.43				168.34		
BAÑOS 1 Y 2			4.76	0.90	4.84	5.72				27.71		
BAÑOS 3			4.10	0.90	4.20	2.70				11.38		
CAFETERIA, BODEGA, DESPENSA 1 Y 2, CUARTO DE ASEO			8.95	0.70	8.65	4.65				41.63		
CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS			3.01	0.70	3.02	5.58				16.83		
CAMINADORES 2,3 Y 4, PASILLO, SALA AMIGA, BAÑOS, LAVACOLAS			13.49	1.40	13.56	12.47				169.12		
OFICINA COORDINADORA, PASILLO, ATMACEN, ARCHIVO Y W.C+			9.11	1.70	9.27	6.29				58.29		

TOTAL EJECUTADO	683.60	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION ADELANTO ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	683.60	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
683.60	0.00	683.60

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSICA PAOLA MERCHAN / ALEJANDRO CARRILLO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 07	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	9.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Paso				
COMEDOR									
M1			5.71	2.60		1.00	14.85		
DESCUENTO PUERTA			0.91	2.00		-1.00	-1.82		
DESCUENTO VENTANA			2.00	1.15		-1.00	-2.30		
M2			13.80	2.85		1.00	38.19		
DESCUENTO PUERTA			0.90	2.02		-1.00	-7.27		
M3			13.60	2.84		1.00	38.06		
DESCUENTO PUERTA 1			0.91	2.00		-1.00	-1.82		
DESCUENTO PUERTA 2			1.80	2.02		-1.00	-3.64		
DESCUENTO VENTANA			3.97	1.16		-1.00	-4.61		
DESCUENTO PUERTA 3			1.80	2.02		-1.00	-3.64		
M4			5.72	2.62		1.00	14.99		
DESCUENTO PUERTA 1			0.88	2.02		-1.00	-1.78		
DESCUENTO PUERTA 2			0.88	1.97		-1.00	-1.73		
SALA DE REUNIOENS									
SALA DE REUNIOENS									
M1			4.00	4.04		1.00	16.16		
M2			5.70	3.28		1.00	18.70		
M3			4.03	3.68		1.00	14.83		

TOTAL EJECUTADO	127.16	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION(ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	127.16	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
127.16	0.00	127.16

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSICA PAOLA MERCHAN / ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9178-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UNIDAD	UN

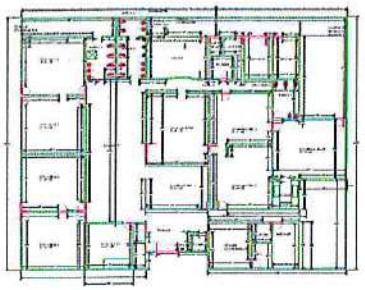ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
COMEDOR									
Luminaria tipo tortuga pasillo (cocina a sala amigo)						1.00	1.00		

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	1.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	1.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	


51

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 67	CONTRATO No.	313-2023	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	305-2023		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	10 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:		001
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	#ves				
	PRIMER PISO									
	SALA MATERNA									
	luminaria panel del 120x 30 cm						2.00	2.00		
	BAÑOS 4									
	luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
	PREJARDIN 1									
	luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
	PREJARDIN 2									
	luminaria panel del 120x 30 cm						2.00	2.00		
	PARVULOS 2									
	luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
	CAMINADORES 1									
	luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		
	CAMINADORES 2									
	luminaria panel del 120x 30 cm						1.00	1.00		











TOTAL EJECUTADO	9.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA E	0.00	UN
PRESENTE ACTA	9.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9.00	0.00	9.00


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / EMERSAIN GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSICA PAOLA MEDINA / ALEJANDRO GARZÓN MONTAÑA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001	
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	**PRIMER PISO**									
	COCINA									
	luminaria hermetica de sobreponer						2.00	2.00		

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	2.00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	0.00	2.00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

153

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
Pendientado con alistado de piso en Placa de tanques		2.31	2.72				6.28		
menos columna 1		0.30	0.20			-2.00	-0.12		
menos columna 2		0.30	0.20			-2.00	-0.08		

TOTAL EJECUTADO	6.08	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROTECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	6.08	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6.08	0.00	6.08

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

154

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	10 de enero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALON CAMINADORES 1									
puerta muro en drywall		0.80		2.02		1.00	1.62		
ventana en salon de caminadores 1			2.48	1.17		1.00	2.90		

TOTAL EJECUTADO	4.52	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	4.52	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4.52	0.00	4.52

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

155

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	19.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
pañete para ventana en caminadores 1			1.80			2.00	3.60		
pañete para ventana en caminadores 2			0.84			2.00	1.68		

TOTAL EJECUTADO	5.28	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML
PRESENTE ACTA	5.28	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5.28	0.00	5.28

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSIKA PAOLA MERCHAN/ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

156

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIRRES GT	CONTRATO No.	5374-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355 2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	29 de enero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.7.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (EXCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENCIA











LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
cubierta ecoroof para comedor			3.94	13.65			2.00	107.56		

TOTAL EJECUTADO	107.56	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA 3	0.00	M2
PRESENTE ACTA	107.56	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
107.56	0.00	107.56

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA DUVEZ GOMEZ	NOMBRE	HELIANA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONDON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: SEDE JARDIN ENGATIVA

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN ENGATIVA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de diciembre de 2024

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	DIAGNOSTICO	
ITEM	17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
caballete cubierta ecoroof en comedor			13.65			1.00	13.65		

TOTAL EJECUTADO	13.65	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	13.65	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13.65	0.00	13.65

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA MARCELA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ GOMEZ	NOMBRE	JESSICA PAOLA MERCHAN/ ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

CENTRO CRECER FONTIBON

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Version: 01 Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM 3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE			UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Muro 1			2,31	1,1		1,00	2,54		
Muro 2			2,34	1,1		1,00	2,57		
Muro 3			1,98	1,1		1,00	2,18		
Muro 4			2,18	1,1		1,00	2,40		
Muro 5			2,335	1,1		1,00	2,57		
Columnas			0,405	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,34	1,1		2,00	0,75		
Columnas			0,635	1,1		1,00	0,70		
Columnas			0,705	1,1		2,00	1,55		
Columnas			0,1	1,1		2,00	0,22		
Columnas			0,5	1,1		2,00	1,10		
Columnas			0,33	1,1		2,00	0,73		
Columnas			0,5	1,1		1,00	0,55		
Columnas			0,41	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,45	1,1		1,00	0,50		
Columnas			0,45	1,1		1,00	0,50		

TOTAL EJECUTADO	19,7400	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,0000	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,0000	M2	
PRESENTE ACTA	19,7400	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19,74	0,00	19,74


OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita. Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Ferero González
FIRMA			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C			
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024		FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024			
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025	

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

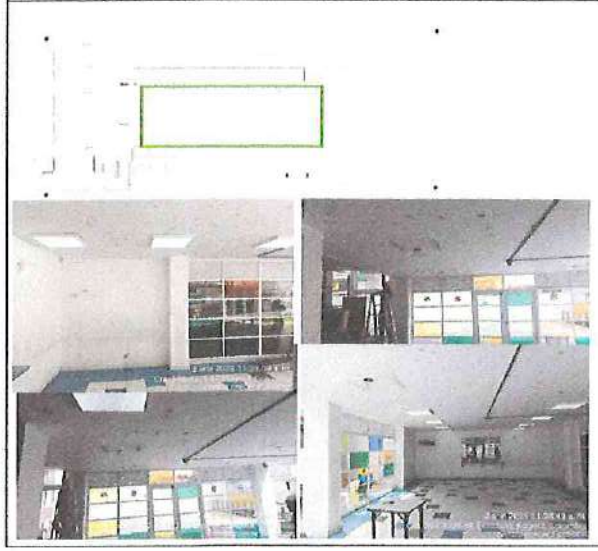ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	COMEDOR									
	Techo			8,90	9,10		1,00	80,99		

TOTAL EJECUTADO	80,99	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	80,99	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
80,99	0,00	80,99

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9376-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
Rampa - Desmonte luminaria emergencia						1,00	1,00		
Escalera - Desmonte luminaria existente emergencia						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
Rampa - Desmonte luminaria existente emergencia						1,00	1,00		
Pasillo - Desmonte luminaria existente emergencia						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
Pasillo - Desmonte luminaria existente emergencia						2,00	2,00		
							0,00		

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	6,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM 5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Corredor cocina						6,00	6,00		

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	6,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.71.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
Pasillo 2						2,00	2,00		
Baño pasillo - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
Baño - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
Baño pasillo - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
Entrada pasillo - luminaria sobreponer 24 W						5,00	5,00		
Baño portería - luminaria sobreponer 24 W						1,00	1,00		
Recepcion						4,00	4,00		
						3,00	3,00		
					TOTAL EJECUTADO		18,00	UN	
					MENOS ACTAS ANTERIORES		0,00	UN	
					MENOS PROTECCION (ADELANTO) ACTA K		0,00	UN	
					PRESENTE ACTA		18,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,00	0,00	18,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01

Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9175-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
Salon amarillo - panel led 120x30						1,00	1,00		
Pasillo - panel led 120x30						5,00	5,00		
SEGUNDO PISO									
Bodega - Luminaria existente Panel 120x30						1,00	1,00		
Pasillo - Luminaria existente Panel 120x30						1,00	1,00		
PRIMER PISO									
Pasillo - Panel led 120x30						13,00	13,00		
						11,00	11,00		

TOTAL EJECUTADO	32,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	32,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
32,00	0,00	**32,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	PRIMER PISO									
	PATIO						4,00	4,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	4,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	4,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.74**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERCER PISO									
Cocina						4,00	4,00		
Pasillo						1,00	1,00		
PRIMER PISO							0,00		
Cocina						2,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COMEDOR PRIMER PISO									
Techo			8,9	9,1		1,00	80,99		
Muro 1			2,31	1,1		1,00	2,54		
Muro 2			2,34	1,1		1,00	2,57		
Muro 3			1,98	1,1		1,00	2,18		
Muro 4			2,18	1,1		1,00	2,40		
Muro 5			2,335	1,1		1,00	2,57		
Columnas			0,405	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,34	1,1		2,00	0,75		
Columnas			0,635	1,1		1,00	0,70		
Columnas			0,705	1,1		2,00	1,55		
Columnas			0,1	1,1		2,00	0,22		
Columnas			0,5	1,1		2,00	1,10		
Columnas			0,33	1,1		2,00	0,73		
Columnas			0,5	1,1		1,00	0,55		
Columnas			0,41	1,1		1,00	0,45		
Columnas			0,45	1,1		1,00	0,50		

TOTAL EJECUTADO	100,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**100,23**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
100,23	0,00	**100,23**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025


CAPITULO		PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
   	COMEDOR									
	Muro 1			2,31	1,50		1,00	3,47		
	Muro 2			2,34	1,50		1,00	3,51		
	Muro 3			1,98	1,50		1,00	2,97		
	Muro 4			2,18	1,50		1,00	3,27		
	Muro 5			2,34	1,50		1,00	3,50		
	Columnas			0,41	1,50		1,00	0,61		
	Columnas			0,34	1,50		2,00	1,02		
	Columnas			0,64	1,50		1,00	0,95		
	Columnas			0,71	1,50		2,00	2,12		
	Columnas			0,10	1,50		2,00	0,30		
	Columnas			0,50	1,50		2,00	1,50		
	Columnas			0,33	1,50		2,00	0,99		
	Columnas			0,50	1,50		1,00	0,75		
	Columnas			0,41	1,50		1,00	0,62		
	Columnas			0,45	1,50		1,00	0,68		

TOTAL EJECUTADO	26,24	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**26,24**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
26,24	0,00	**26,24**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

1.1.3	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER FONTIBON
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**20.1.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	**PRIMER PISO (COMEDOR)**		8,90	9,1				80,99		

TOTAL EJECUTADO	80,99	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**80,99**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
80,99	0,00	**80,99**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

SHUSH UREK

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSHUFIKA KUSREKICYA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES			ACTA No:	001
ITEM	1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	M

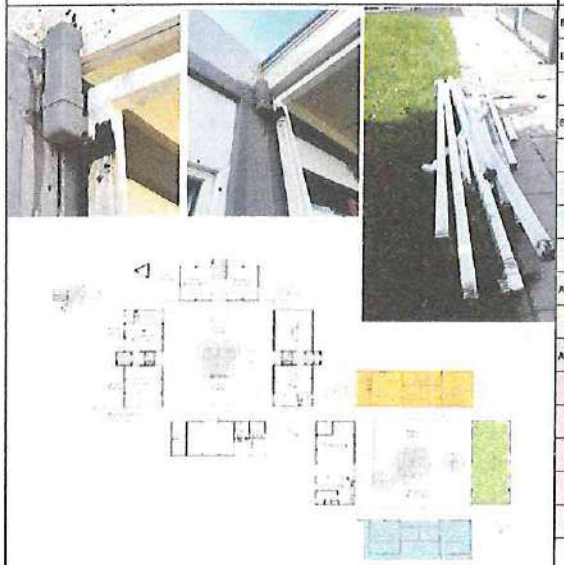ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Pasa				
BLOQUE 2							0,00		
Espacio educativo				2,6		1,00	2,60		
				0,55		1,00	0,55		
Bajante área baño				0,8		1,00	0,80		
				0,3		1,00	0,30		
				4,8		1,00	4,80		
				2,6		1,00	2,60		
				1,4		1,00	1,40		
Aula multiple				2,6		2,00	5,20		
				1,48		2,00	2,96		
Aulas zonas verdes				2,6		1,00	2,60		
				1,5		1,00	1,50		
				0,9		1,00	0,90		
				0,6		1,00	0,60		
				2,6		1,00	2,60		
				1,68		1,00	1,68		
							0,00		

TOTAL EJECUTADO	30,89	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PRO RESCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	30,89	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,89	0,00	30,8900

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / margarita Gomez	NOMBRE	Ing. Carol Fonseca Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK KUSREIK YA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.43**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**BLOQUE 2**							0,00		
	Espacio educativo		2,44	6,06			1,00	14,79		
			4,84	7,81			1,00	37,80		
			3,50	6,04			1,00	21,14		
			5,40	7,81			1,00	42,17		
	Aula multiple		7,81	14,64			1,00	114,34		
	Aulas zonas verdes		4,88	7,82			1,00	38,16		
			3,25	6,06			1,00	19,70		
			4,88	7,82			1,00	38,16		
								0,00		
								0,00		
							TOTAL EJECUTADO	288,10	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**288,10**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
288,10	0,00	**288,1000**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK KUSREIK YA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Baño MR prejardín		2,28		2,47		0,00	0,00		
		1,93		2,47		0,00	0,00		
Puerta		0,80		2,02		0,00	0,00		
Techo		1,93	2,28			0,00	0,00		
Baños prejardín		2,28		2,47		0,00	0,00		
		3,97		2,47		0,00	0,00		
Puerta		0,80		2,02		0,00	0,00		
Techo		2,28	3,97			0,00	0,00		
Salón pre jardín		5,82		2,47		2,00	28,75		
		4,72		2,47		2,00	23,32		
Puerta		0,80		2,02		-1,00	-1,62		
Ventana		2,14	2,13			-4,00	-18,23		
Piuerta baño		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Cuchillas		0,60	5,80			2,00	6,96		
Techo		4,72	5,82			1,00	27,47		
Bodega		2,20		2,47		2,00	10,87		
		3,06		2,47		2,00	15,12		
Piuerta bodega		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Cuchillas		0,60	5,80			2,00	6,96		
Techo		2,20	3,60			1,00	7,92		
Salón pre jardín 2		5,83		2,47		2,00	28,80		
		4,68		2,47		2,00	23,12		
Puerta		0,80		2,02		-1,00	-1,62		
Ventana		2,14	2,13			-4,00	-18,23		
Piuerta baño		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Cuchillas		0,60	5,80			2,00	6,96		
Techo		4,68	5,83			1,00	27,28		
Bodega 2		3,00		2,47		2,00	14,82		
		2,00		2,47		2,00	9,88		
Puerta bodega		0,80		2,47		-1,00	-1,98		
Techo		2,00	3,00			1,00	6,00		
Aula multiple		14,48		2,47		2,00	71,53		
		5,82		2,47		2,00	28,75		
Muro puerta		1,20		2,47		-2,00	-5,93		
Muro lateral		1,24		2,47		2,00	6,10		
Puerta		0,80		2,02		-2,00	-3,23		
Ventana		2,14	2,13			-6,00	-27,35		
Techo		5,82	14,48			1,00	84,27		
Prejardín		4,66		2,47		2,00	23,02		
		5,84		2,47		2,00	28,85		
Puerta		0,80		1,99		-1,00	-1,59		
Ventana		2,14	2,13			-3,00	-13,67		
Techo		4,66	5,84			1,00	27,21		
Bodega		2,22		2,47		2,00	10,97		
		3,06		2,47		2,00	15,12		
Puerta		0,80		1,98		-1,00	-1,58		
Techo		2,22	3,06			1,00	6,79		
Bodega		2,22		2,47		2,00	10,97		
		3,02		2,47		2,00	14,92		
Puerta		0,80		1,98		-1,00	-1,58		
Techo		2,22	3,02			1,00	6,70		
Prejardín		4,70		2,47		2,00	23,22		
		5,83		2,47		2,00	28,80		
Puerta		0,80		1,99		-1,00	-1,59		
Ventana		2,14	2,13			-3,00	-13,67		
Techo		4,70	5,83			1,00	27,40		

TOTAL EJECUTADO	541,04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**541,04**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

541,04	0,00	**541,04**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK KUSREIK YA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M

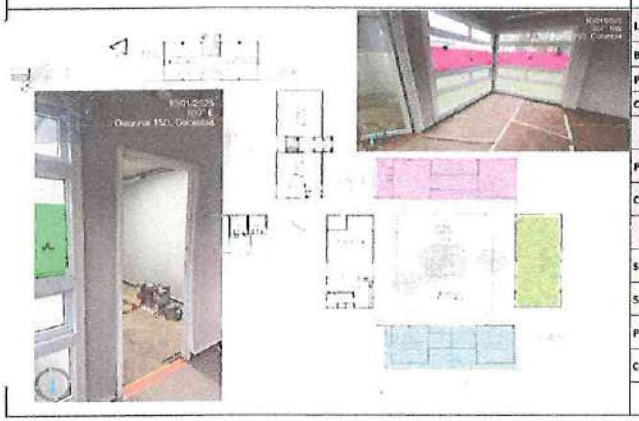ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Lateral ventana				2,14		2,00	4,28		
Baños pre jardín				2,14		2,00	4,28		
Prejardín - lateral ventana				2,47		4,00	9,88		
Columnas				2,47		2,00	4,94		
				2,47		4,00	9,88		
Prejardín - lateral ventana				2,47		4,00	9,88		
Columnas				2,47		2,00	4,94		
				2,47		4,00	9,88		
Salón lúdico - lateral ventanas				2,47		3,00	7,41		
Salón lúdico - lateral ventanas				2,47		1,00	2,47		
Prejardín - lateral ventana				2,47		6,00	14,82		
Columnas				2,47		2,00	4,94		
				2,47		4,00	9,88		

TOTAL EJECUTADO	97,48	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	97,48	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
97,48	0,00	97,48

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

OSO DE ANTEOJOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	1135-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL DIO DE ANZOICO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1055-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	001
ITEM	1.1.2.0	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO / UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CUBIERTA TERCER NIVEL									
Comedor		17,00	6,03			1,00	102,51		
Comedor		0,54	3,2			1,00	1,73		
Comedor		0,70	2,85			1,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	106,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	106,23	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
106,23	0,00	106,23

OBSERVACIONES:
Pendiente por cobrar área

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez Duván Tarraya	NOMBRE	Margarita Gomez. Arq. Carol Forero Garavito
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9135-2024	FRENTE OBRA	UNIDAD INVENTARIO DE ANTEJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ÍTEM	3.2.33	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENCIA







LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
TERCER PISO									
Comedor		3,71		0,50		1,00	1,86		
Puerta		1,20		0,50		-1,00	-0,60		
		1,93		0,50		1,00	0,97		
		6,08		0,50		1,00	3,04		
		1,13		0,50		1,00	0,57		
		4,00		0,50		1,00	2,00		
		0,69		0,50		1,00	0,35		
		0,35		0,50		2,00	0,35		
		2,21		0,50		1,00	1,11		
		0,65		0,50		1,00	0,33		
		4,00		0,35		1,00	1,40		
		0,71		0,50		1,00	0,36		
		1,75		0,50		1,00	0,88		
		1,77		0,50		1,00	0,89		
		5,74		0,50		1,00	2,87		
		3,28		0,50		1,00	1,64		
		1,71		0,50		1,00	0,86		
		0,65		0,50		2,00	0,65		
		3,75		0,50		1,00	1,88		
		1,07		0,50		1,00	0,54		
		1,07		0,50		1,00	0,54		
		0,67		0,50		1,00	0,34		
		1,00		0,50		1,00	0,50		
		2,00		0,50		1,00	1,00		
		4,00		0,35		1,00	1,40		
		1,53		0,50		1,00	0,77		
Escaleras costado sur		4,00		2,70		1,00	10,80		
			6,2	2,70			16,74		
						TOTAL EJECUTADO	53,97	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCIÓN ADELANTO ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	53,97	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
53,97	0,00	53,97

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTOR		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9126-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/ UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
TERCER PISO									
Comedor fecha		1,93	5,54				10,69		
		3,75	9,48				35,55		
		2,62	8,70				22,79		
		5,28	5,55				29,30		
Lavado		2,22	3,06				6,78		
Cocina fría		3,87	4,37				16,91		
Refrigeración		1,30	3,30				4,29		
Cocina		3,86	4,37				16,87		
Despensa		2,22	3,26				7,24		
Hall cocina		1,35	3,94				5,32		
Deposito		2,40	3,54				8,50		
Lavado		2,22	3,54				7,85		
Hall vestier		1,50	3,76				5,64		
Hall		0,75	1,52				1,14		
Acceso cocina		0,80	1,57				1,26		
Escaleras costado sur		4,00	6,20				24,80		

TOTAL EJECUTADO	204,94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	204,94	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
204,94	0,00	204,94


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ÍTEM	5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

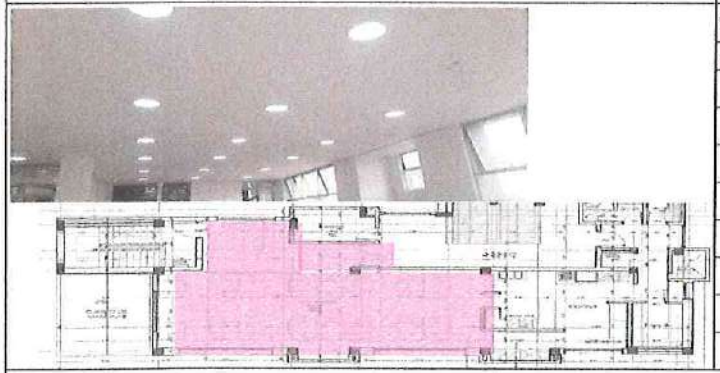ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	TERCER PISO									
	Comedor - luminaria 24W						27,00	27,00		

TOTAL EJECUTADO	27,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	27,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,00	0,00	27,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

03

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO		**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.2**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**CUBIERTA TERCER NIVEL**									
	Comedor		17,00	6,03			1,00	102,51		
	Comedor		0,54	3,2			1,00	1,73		
	Comedor		0,70	2,85			1,00	2,00		
										

TOTAL EJECUTADO	106,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,23**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
106,23	0,00	**106,23**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ÍTEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
      	TERCER PISO									
	Techo comedor		1,93	5,54				10,69		
			3,75	9,48				35,55		
			2,62	8,70				22,79		
			5,28	5,55				29,30		
	Hall cocina		1,35	3,94				5,32		
	Deposito		2,40	3,54				8,50		
	Hall		3,10	9,40				29,14		
	Hall vestier		1,50	3,76				5,64		
	Hall		0,75	1,52				1,14		
	Acceso cocina		0,80	1,57				1,26		
	Comedor primera mano para epóxica		3,71		1,50		0,33	1,86		
	Puerta		1,20		1,50		-0,33	-0,60		
			1,93		1,50		0,33	0,97		
			6,08		1,50		0,33	3,04		
			1,13		1,50		0,33	0,57		
			4,00		0,74		0,33	0,99		
			0,69		1,50		0,33	0,35		
			0,35		1,50		0,67	0,35		
			2,21		1,50		0,33	1,11		
			0,65		1,50		0,33	0,33		
			4,00		0,74		0,33	0,99		
			0,71		1,50		0,33	0,36		
			1,75		1,50		0,33	0,88		
			1,77		1,50		0,33	0,89		
			5,74		1,50		0,33	2,87		
			3,28		1,50		0,33	1,64		
			1,71		1,50		0,33	0,86		
			0,65		1,50		0,33	0,33		
			3,75		0,74		0,33	0,93		
			1,07		1,50		0,33	0,54		
			1,07		1,50		0,33	0,54		
			0,67		1,50		0,33	0,34		
			1,00		1,50		0,33	0,50		
			2,00		1,50		0,33	1,00		
			4,00		0,74		0,33	0,99		
			1,53		1,50		0,33	0,77		

TOTAL EJECUTADO	172,64	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**172,6400**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
172,64	0,00	**172,64**

OBSERVACIONES: En relación al capítulo denominado "Comedor Primera mano para Epóxica", se señala lo siguiente: Corresponde a la primera mano que fue necesario aplicar como base para la posterior aplicación de la pintura epóxica. Es importante señalar que, para la correcta aplicación de la pintura epóxica, se requiere una base de vinilo que garantice su adecuada adherencia.Dado que se trata de la aplicación de la base, se debe considerar que dicha mano de vinilo debe ser multiplicada por un factor de 0.33, lo que equivale a la aplicación de una sola mano de pintura vinilo tipo uno.

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025


CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ÍTEM	13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN							
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
Tercer piso								0,00		
Comedor			3,71		1,50		1,00	5,57		
Puerta			1,20		1,50		-1,00	-1,80		
			1,93		1,50		1,00	2,90		
			6,08		1,50		1,00	9,12		
			1,13		1,50		1,00	1,70		
			4,00		0,74		1,00	2,96		
			0,69		1,50		1,00	1,04		
			0,35		1,50		2,00	1,05		
			2,21		1,50		1,00	3,32		
			0,65		1,50		1,00	0,98		
			4,00		0,74		1,00	2,96		
			0,71		1,50		1,00	1,07		
			1,75		1,50		1,00	2,63		
			1,77		1,50		1,00	2,66		
			5,74		1,50		1,00	8,61		
			3,28		1,50		1,00	4,92		
			1,71		1,50		1,00	2,57		
			0,65		1,50		2,00	1,95		
			3,75		0,74		1,00	2,78		
			1,07		1,50		1,00	1,61		
			1,07		1,50		1,00	1,61		
			0,67		1,50		1,00	1,01		
			1,00		1,50		1,00	1,50		
			2,00		1,50		1,00	3,00		
			4,00		0,74		1,00	2,96		
			1,53		1,50		1,00	2,30		

TOTAL EJECUTADO	70,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**70,91**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
70,91	0,00	**70,91**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	001
ÍTEM	17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	UNIDAD: M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA TERCER NIVEL									
Área punto fijo			1,1			26,00	28,60		
			0,7			40,00	28,00		
			0,3			15,00	4,50		
			0,6			12,00	7,20		
Área cocina			1,5			3,00	4,50		
			1,7			6,00	10,20		
			1,35			4,00	5,40		
			0,9			8,00	7,20		
			0,55			12,00	6,60		

TOTAL EJECUTADO	102,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	102,20	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
102,20	0,00	102,20

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

107

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**ACTA No:**	**DIAGNOSTICO**
ÍTEM	**20.1.3**	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)**		**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  	Emulsión asfáltica					25	6,00	150,00		

TOTAL EJECUTADO	150,00	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**150,00**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
150,00	0,00	**150,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	


SABANA GRANDE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5126-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	001
ITEM	1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC., CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M

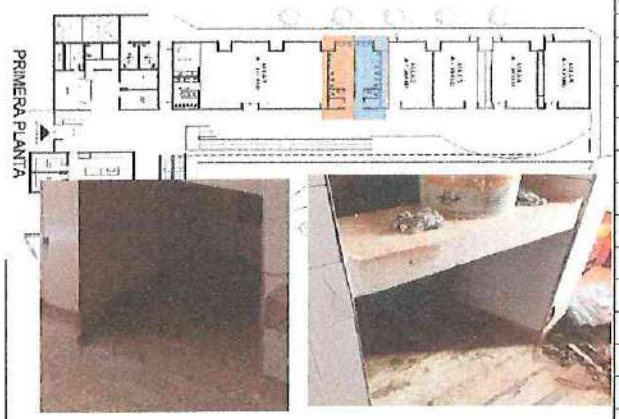ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
POYOS DUCHAS			0,8			2,00	1,60		

TOTAL EJECUTADO	1,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	1,60	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,60	0,00	1,60

OBSERVACIONES:

FIRMA	PRESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	PRESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez.	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	1	PRELIMINARES		ACTA No:	001
ITEM	1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	M2

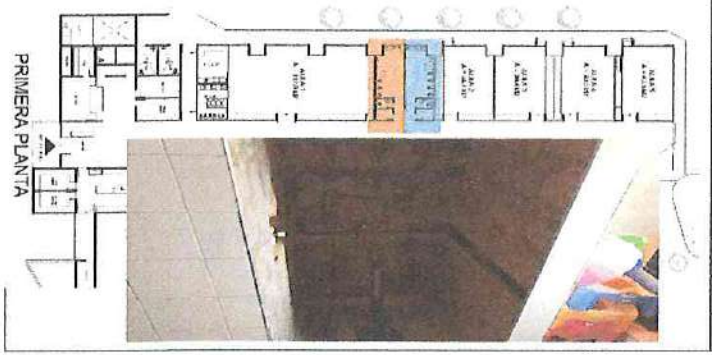ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DUCHAS PRIMER PISO							0,00		
Muros		0,80		2,00		4,00	6,40		
Muros			0,80	2,00		2,00	3,20		
Piso		0,80	0,80			2,00	1,28		

TOTAL EJECUTADO	10,88	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	10,88	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,88	0,00	**10,88**


OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ Y MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**UN**

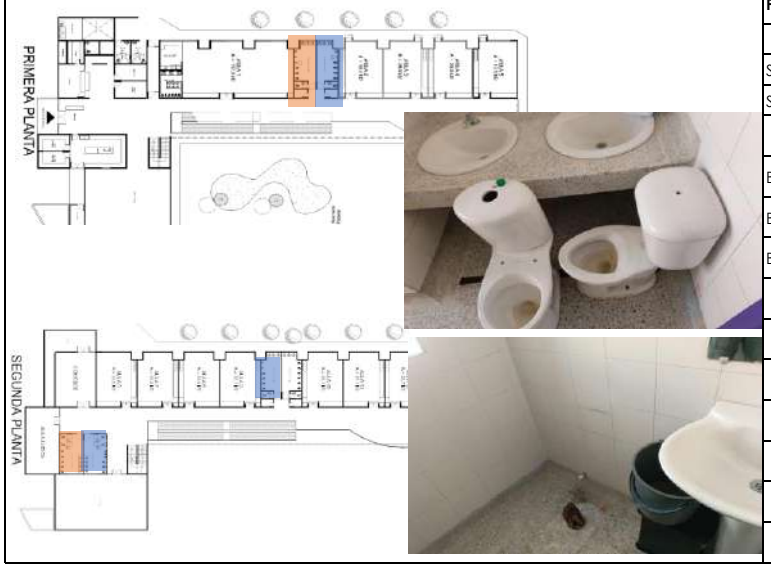ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**PRIMER PISO**									
	Sanitario baño caminadores #2						1,00	1,00		
	Sanitario Baño párvulos 1-A-B						3,00	3,00		
	SEGUNDO PISO									
	Baños mixtos #1						2,00	2,00		
	Baños pasillo A						3,00	3,00		
	Baños profesores #2						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	10,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN	


PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,00	0,00	**10,00**

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**


CAPITULO	**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.8**	**DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M**

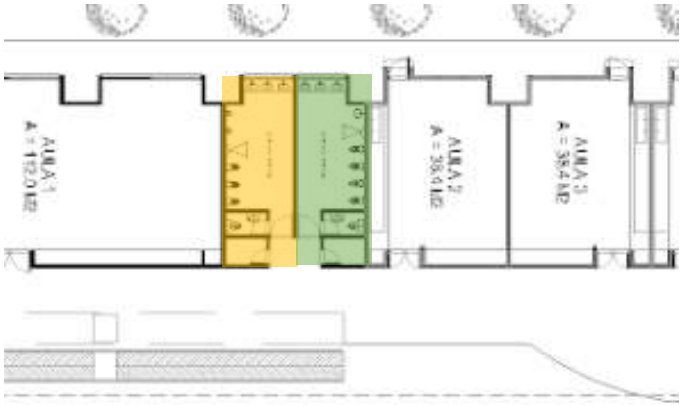ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**PRIMER PISO**									
	DUCHAS			1,8			2,00	3,60		

TOTAL EJECUTADO	3,60	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**3,60**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,60	0,00	**3,60**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:			
FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	PRELIMINARES			ACTA No:	001
ITEM	3.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)			UNIDAD	M

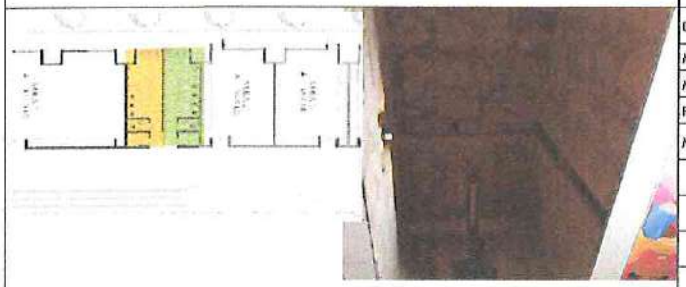ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DUCHAS PRIMER PISO									
Muros			1			1,00	1,00		
Muro desague			1,1			1,00	1,10		
Piso			0,55			1,00	0,55		
MESON									

TOTAL EJECUTADO	2,65	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	2,65	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,65	0,00	2,65


OBSERVACIONES:
Pendiente cantidades por cobrar

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACIÓN**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.5.2**	**ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI**	**UNIDAD**	**KG**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	**REFUERZOS MESONES**									
	Varilla 1/2"			0,8		0,99	5,00	3,98		
	Varilla 1/2"									
	Varilla 6mm									

TOTAL EJECUTADO	3,98	KG	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG	
PRESENTE ACTA	**3,98**	KG	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,98	0,00	**3,98**

OBSERVACIONES:

Pendiente cantidades por cobrar

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

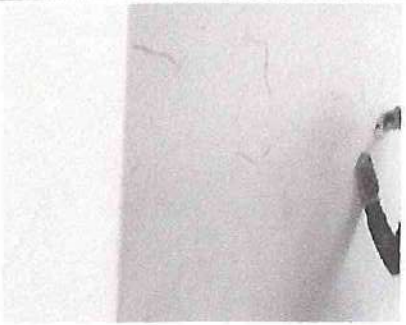ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Comedor		8,45	8,65			1,00	73,09		
Menos puerta			1,6	2,7		-1,00	-4,32		
Columnas			1,13	2,7		6,00	18,31		
SEGUNDO PISO						1,00	1,00		
Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
Lateral baño 2		2,73		2,7		1,00	7,37		
				2,7		1,00	2,70		
Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		
Lateral baño 1		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
Lateral baño 2		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		

TOTAL EJECUTADO	152,55	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	152,55	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
152,55	0,00	152,55

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

30

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SAMANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	9.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/ UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PRIMER PISO									
	Techo cocina		5,00	7,65			1,00	38,25		
	Techo comedor		9,30	11,35			1,00	105,55		
	Vano			2,25			-1,00	-2,25		
	Vano			6,03			-1,00	-6,03		
	Vano			2,54			-1,00	-2,54		
	Baño Mixto		3,00	4,1			1,00	12,30		
	Movilidad reducida		2,04	2,44			1,00	4,98		
	Aseo		1,16	1,88			1,00	2,18		
	Baño mixto 2		3,71	4,5			1,00	16,70		
			1,10	2,8			1,00	3,08		

TOTAL EJECUTADO	172,22	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	172,22	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
172,22	0.00	172,22

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Rivera González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	CIMENTACIÓN	ACTA No:	001
ITEM	3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	UNIDAD: M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
REEMPLAZO DUCHAS/LAVACOLAS			0.8			2,00	1,60		

TOTAL EJECUTADO	1,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	1,60	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,60	0,00	1,60

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTFUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	4.1.15	PUNTO AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2"	UNIDAD	UN

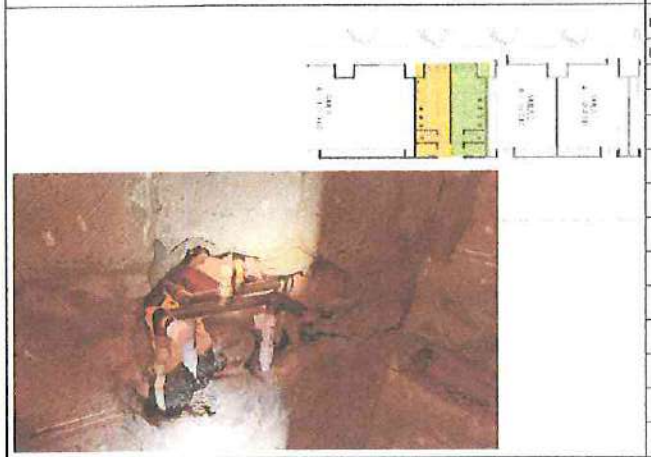ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ASEA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO							0,00		
LAVACOLAS						2,00	2,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
						TOTAL EJECUTADO	2,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	2,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ /MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Fonseca Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM 4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2"	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑO PRIMER PISO									
	Lavacolas						2,00	2,00		
	TOTAL EJECUTADO							2,00	UN	
	MENOS ACTAS ANTERIORES							0,00	UN	
	MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X							0,00	UN	
	PRESENTE ACTA							2,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00


OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ.	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GI	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	001
ITEM	4.1.58	PUNTO SANITARIO 2"		UNIDAD	UN

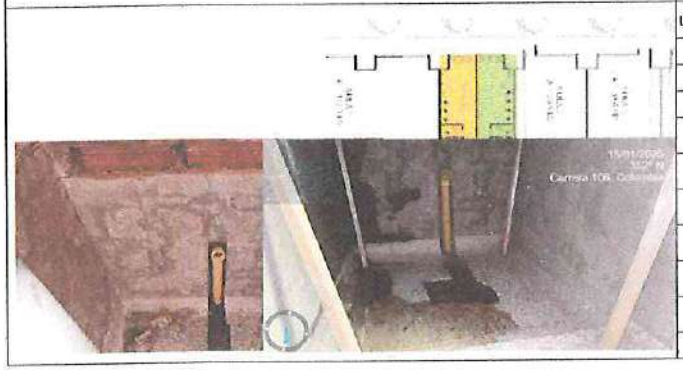ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	Lavacolas nuevos						2,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

125

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	VIGENCIA	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	DESCRIPCIÓN		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025


CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
AREAS	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Pasillo de ingreso y sala						1,00	1,00		
Sala de juntas						1,00	1,00		
Salon Parvulo 1						1,00	1,00		
Pasillo primer piso						1,00	1,00		
Baño 2 de primer piso						1,00	1,00		
Baño 3 de primer piso						1,00	1,00		
Salon parvulos 2						1,00	1,00		
Salon parvulos 3						1,00	1,00		
Salon parvulos 4						1,00	1,00		
Salon parvulos 5						1,00	1,00		
SEGUNDO PISO									
Pasillo segundo piso						1,00	1,00		
Escalera						1,00	1,00		
Salon 1						1,00	1,00		
Salon 2						1,00	1,00		
Salon 3						1,00	1,00		
Salon 4						1,00	1,00		
Salon 5						1,00	1,00		
Baño 4 segundo piso						1,00	1,00		
Baño 6 segundo piso						1,00	1,00		
Salon 6						1,00	1,00		
Salon 7						1,00	1,00		
Salon 8						1,00	1,00		
Salon 9						1,00	1,00		
Bodega de insumos y varios						1,00	1,00		
						TOTAL EJECUTADO	30,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA 1	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	30,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,00	0,00	30,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Fernanda Gomez V.
FIRMA		FIRMA	

126

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9335-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SEGUNDO PISO									
Comedor						12,00	12,00		
Prejardin 5A 5B						2,00	2,00		
Aula ludica						14,00	14,00		

TOTAL EJECUTADO	28,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	28,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,00	0,00	28,00

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERREZ / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	1176-2024		
INTERVENTORI:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

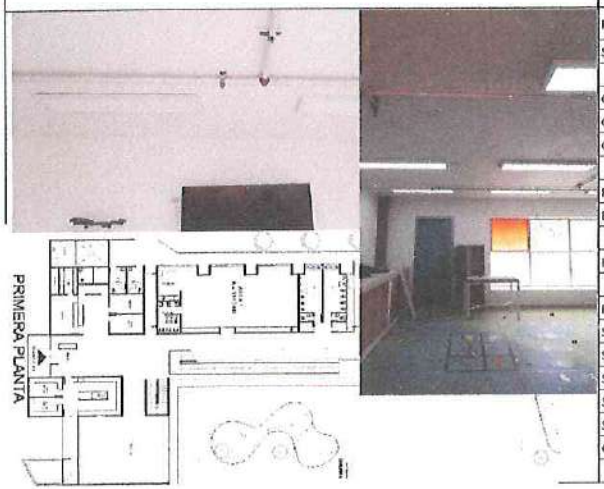ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Sala de juntas						1,00	1,00		
Cuarto de psicología						2,00	2,00		
Oficina Archivo						2,00	2,00		
Cuarto de Bombas						2,00	2,00		
Pasillo de Ingreso y sala						3,00	3,00		
Bodega						3,00	3,00		
Baño 3 de primer piso						3,00	3,00		
Pasillo primer piso						3,00	3,00		
Salon parvulos 3						4,00	4,00		
Salon parvulos 5						6,00	6,00		
Salon parvulos 2						7,00	7,00		
Salon parvulos 4						8,00	8,00		
Salon Parvulos 1						8,00	8,00		
Comedor						12,00	12,00		

TOTAL EJECUTADO	64,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	64,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
64,00	0,00	64,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ADRIANA GUTIERRE / MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	Arq. Coral Forero González
FIRMA		FIRMA	

8 11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SEGUNDO PISO									
TERRAZA CUPULAS						4,00	4,00		
PRIMER PISO									
FACHADA						5,00	5,00		

TOTAL EJECUTADO	9,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	9,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	9,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025
CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PRIMER PISO									
	Cocina						5,00	5,00		
	Baño mixto primer piso						3,00	3,00		
	Baño mixto primer piso						3,00	3,00		
	Cuarto aseo primer piso						1,00	1,00		
	Baño mixto parvulos						4,00	4,00		
	Neveras						2,00	2,00		
	Cuarto de maquinas						2,00	2,00		
	Pasillo cocina						1,00	1,00		
	Despensa						1,00	1,00		
							TOTAL EJECUTADO	22,00	UN	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
							PRESENTE ACTA	22,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
22,00	0,00	22,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero González
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	5175-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
Pasillo para lavanderia						3,00	3,00		
Lavanderia						6,00	6,00		
SEGUNDO PISO									
PASILLO ESCALERAS						2,00	2,00		
Luminaria de sobreponer 18 W						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	12,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	12,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
12,00	0,00	12,00

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9353-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UNIDAD	UN

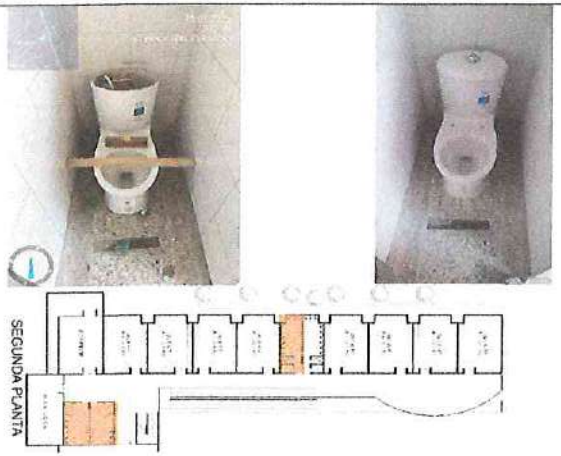ESQUEMA / FOTOFIJACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SEGUNDO PISO									
Baños mixtos #1						2,00	2,00		
Baños pasillo A						3,00	3,00		

TOTAL EJECUTADO	5,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	5,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	5,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**11.1.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)**	**UNIDAD**	**UN**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**PRIMER PISO**							0,00		
	Baño Movilidad Reducida						1,00	1,00		
	Caminadores						1,00	1,00		
	Baño Movilidad Reducida						1,00	1,00		
	BAÑOS SEGUNDO PISO							0,00		
	Baños mixtos						2,00	2,00		
	Salon parvulos 1						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González

FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**11.1.15**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL**	**UNIDAD**	**UN**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**SEGUNDO PISO**							0,00		
	Baño pasillo A						1,00	1,00		
	Baño pasillo A						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González

FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**



CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**11.1.26**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	**BAÑOS PRIMER PISO**							0,00		
	Baño profesores						4,00	4,00		
	Baño lavanderia 1						1,00	1,00		
	Baño lavanderia 2						1,00	1,00		
	Baño movilidad reducida						1,00	1,00		

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS IBT	CONTRATO No.	5176-2024	FUENTE OBRA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	20 de enero de 2025


CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
Comedor		8,45	8,65			1,00	73,09		
Menos puerta			1,6	2,7		-1,00	-4,32		
Columnas			1,13	1,5		6,00	10,17		
SEGUNDO PISO						1,00	1,00		
Lateral baño 1		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		
Lateral baño 1		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Frontal MR			3,84	2,7		1,00	10,37		
Lateral baño 2		4,00		2,7		1,00	10,80		
				2,7		1,00	2,70		
Menos puertas		0,90		1,9		-2,00	-3,42		

TOTAL EJECUTADO	147,84	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	147,84	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
147,84	0,00	147,84

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	Arq. Carol Forero Gonzalez
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPÓXICA A DOS MANOS**		**UNIDAD**	**M2**

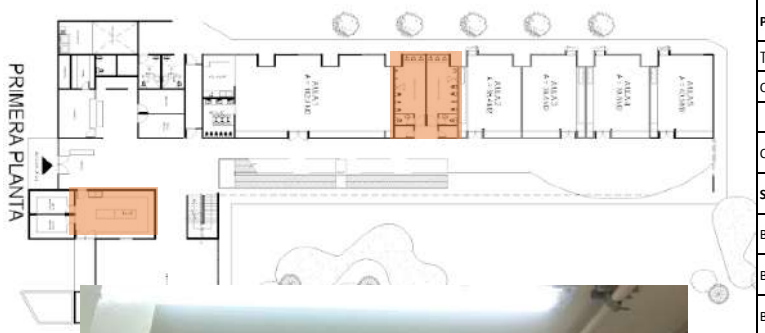ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PRIMER PISO							0,00		
Techo cocina		5,00	7,65			1,00	38,25		
Comedor		8,45		1,50		2,00	25,35		
			7,10	1,50		1,00	10,65		
Columnas		1,30		1,50		6,00	11,70		
SEGUNDO PISO							0,00		
Baño mixto techo		2,87	4,85			1,00	13,92		
Baño mixto muro		2,87		1,00		2,00	5,74		
Baño mixto muro			4,85	1,00		2,00	9,70		
Baño mixto muro			1,00	1,00		4,00	4,00		
Baño mixto muro		0,17		1,00		2,00	0,34		
Baño mixto muro				1,00		1,00	1,00		
Cuarto aseo techo		1,10	1,85	1,00		2,00	4,07		
Cuarto aseo muro			1,85	1,00		2,00	3,70		
Cuarto aseo muro		1,10		1,00		2,00	2,20		
Baño mixto techo		2,87	4,85			1,00	13,92		
Baño mixto muro		2,87		1,00		2,00	5,74		
Baño mixto muro			4,85	1,00		2,00	9,70		
Baño mixto muro			1,00	1,00		4,00	4,00		





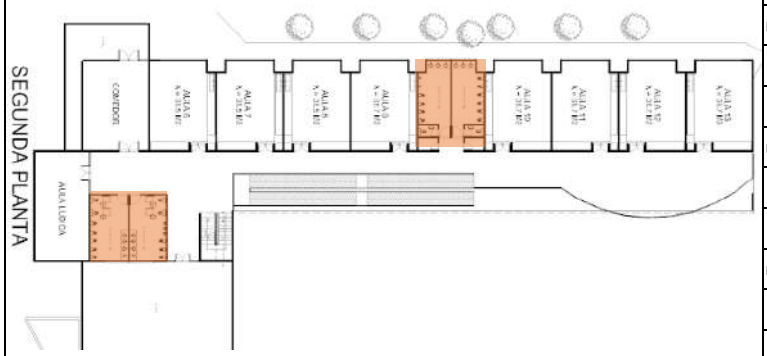

Baño mixto muro		0,17		1,00		2,00	0,34		
Baño mixto muro				1,00		1,00	1,00		
Baño MR		3,00	3,00			1,00	9,00		
			3,00	1,00		2,00	6,00		
		3,00		1,00		2,00	6,00		
Baño mixto		3,00	5,00			1,00	15,00		
			5,00	1,00		1,00	5,00		
		3,00		1,00		1,00	3,00		
Baño mixto		3,00	5,00			1,00	15,00		
			5,00	1,00		1,00	5,00		
		3,00		1,00		1,00	3,00		

TOTAL EJECUTADO	232,32	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**232,32**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
232,32	0,00	**232,32**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Arq. Carol Forero González
FIRMA		**FIRMA**	


KENNEDY

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	914-2024	FRENTE OBRA	11 TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTR. CODINES	CONTRATO No:	5555-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	30 de enero de 2024

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

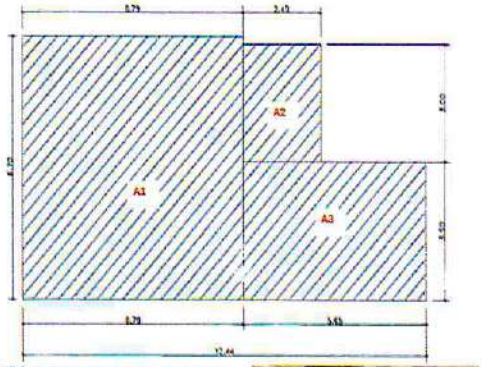ESQUEMA / GEOLOCALIZACIÓN AREA INTERVENTIA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DESMONTE DE CUBIERTA A1		6.50	6.79			44,14	44,14	M2	
DESMONTE DE CUBIERTA A2		3.00	2.40			7,20	7,20	M2	
DESMONTE DE CUBIERTA A3		3.40	5.65			19,21	19,21	M2	
TOTAL DE CUBIERTA DESMONTADA							70,55	M2	
DESCUENTO POR REALIZARSE DISPOSICIÓN FINAL COMO MATERIAL DE TEJA DE ASBESTO SEGÚN MANIFIESTO DE CARGA No. D3A12327.						-13,06	-13,06	M2	

TABLA ACLARATORIA No.1

1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		M2	$	30.942,00
	1. Materiales	Unidad	Rend.	Precio	Valor Unitario
	2. Herramienta Menor				$ -
	HERRAMIENTA MENOR		0.05	$ 30.456,00	$ 847,92
	3. Equipo y Herramientas				
4004.007	ALQUILER DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS H=10M B=2M X 3M.	DIAM	0.01	$ 1.763.564,00	$ 9.817,02
	4. Transporte				
EQUI005	TRANSPORTE CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 7 TONS	DIA	0.01	$ 572.373,00	$ 6.701,73
	5. Mano de obra				
MMM005	CUADRILLA AA ALBAÑILERIA (OFIC. + AYUD. + PEON)	HO	0.62	$ 24.320,00	$ 15.575,45

TABLA ACLARATORIA No.2

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR FINAL
Desmonte de todo tipo de cubierta	$ 30.942,00	70,55	M2	$ 2.182.058,10
Descuento por disposicion final como teja de asbesto según manifiesto de carga No.D3A12327	$ 5.723,73	70,55	M2	$ 403.809,15
DIFERENCIA DE VALORES				$ 1.779.148,95

CANTIDAD A DESCONTAR EN MEMORIA POR DISPOSICION COMO TEJA DE ASBESTO.	$ 30.942,00	13,06	M2	$ 404.102,52

* DESCUENTO DE TRANSPORTE PARA EL APU DEL ITEM 13.1.11 .

TOTAL EJECUTADO	57,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	57,49	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
57,49	0,00	57,49

OBSERVACIONES: Se ha aplicado un ajuste de -13,06 m² a este item, considerando que el APU abarca tanto el retiro como la disposición final del material. Este ajuste responde a que la cubierta retirada corresponde a material de asbesto, tal como se indica en el manifiesto de carga No. D3A12327. Dado que el asbesto es clasificado como material peligroso, conforme a lo establecido en la Ley 1968 de 2019, el Decreto 1076 de 2015 y el Decreto 1079 de 2015, se procederá a su disposición final a través del ítem 20.1.2 "DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO". En la Tabla Aclaratoria No. 1 se presenta el APU aprobado para el item 1.3.11, y en la Tabla Aclaratoria No. 2 se detallan las operaciones realizadas para justificar el descuento aplicado.
Este ajuste se lleva a cabo con el objetivo de evitar un doble cobro por el retiro y la disposición final del material de asbesto, el cual, por su naturaleza, ha sido reconocido como peligroso.

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGENIERO DE PROYECTOS/ ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARTESANO EN DIBUJO SENIOR - TECNOLOGO EN EDUCACION
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CT	CONTRATO No.	5370-2024	FRENTE OBRA	11. TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	4055-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	30 de enero de 2024

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	001
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (RIPLASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSION					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DORMITORIO		4,02	6,90			27,22	27,22	M2	
PUNTOFIJO1		3,27	0,99			3,24	3,24	M2	
PUNTOFIJO2		1,86	2,06			3,83	3,83	M2	
BAÑO		3,23	2,05			9,86	9,86	M2	
COORDINACION		2,26	1,87			4,23	4,23	M2	
PREPARION1		1,05	4,20			5,67	5,67	M2	
PREPARION2		3,27	3,19			10,41	10,41	M2	

NOTA CORRO TOTAL 64,50 SE REALIZA EL AJUSTE DEL RESTANTE

TOTAL EJECUTADO	64,45	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROTECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	64,45	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
64,45	0,00	64,45

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ		
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS / INGMARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SOTO - INTERVENTORIA OBRAS CT
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 01	CONTRATO No.	1076-2024	FRENTE OBRA	11 TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	1055-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	001
ITEM	2.1.13	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS))	UNIDAD	UNO

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PLANTA DE SEGUNDO PISO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUNTO FIJO		1,00				1,00	1,00	UNO	
PRE ANDEN		1,00				1,00	1,00	UNO	
COORDINACION		1,00				1,00	1,00	UNO	
BAÑO		1,00				1,00	1,00	UNO	
PASILLO		1,00				1,00	1,00	UNO	
DORMITORIO		1,00				1,00	1,00	UNO	

TOTAL EJECUTADO	6,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	6,00	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	6,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER PENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAMPO SEGUL / ING ALVARO GARCIA MUNOZ
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CF	CONTRATO No.	5126-2024	FRENTE OBRA	11 TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SCRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	26 de enero de 2024

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

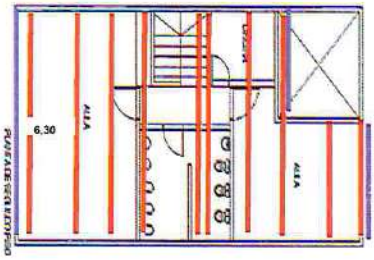ESQUEMA / FOTOLOCALIZACIÓN ANTES DE LA INTERVENTORIA







LOCALIZACION	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA EXT.			6,11		2,00	12,23	12,23	M	
ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA EXT.			3,20		2,00	6,40	6,40	M	
ESMALTE SOBRE CANAL DORMITORIO			6,30		1,00	6,30	6,30	M	
ESMALTE SOBRE CANAL PRE-JARDIN			3,20		1,00	3,20	3,20	M	
ESMALTE SOBRE CANAL OFICINA			1,87		1,00	1,87	1,87	M	

CORTE TOTAL 30,17 M.

TOTAL EJECUTADO	30,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	30,00	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,00	0,00	30,00


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ALEJANDRO PENAGOS / ING NAVIDAD PEREZ GOMEZ	NOMBRE	ARQ. SHARON CHAPARRO SEGURA Y ING. ALEJANDRO GARCIA MORENO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CT	CONTRATO No.	9178-2024	FRENTE OBRA	21 TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIAS 9178	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	ACTA No:	001
ITEM	13.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BARANDAS Y CANALES SEGUN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANCLAJE CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2

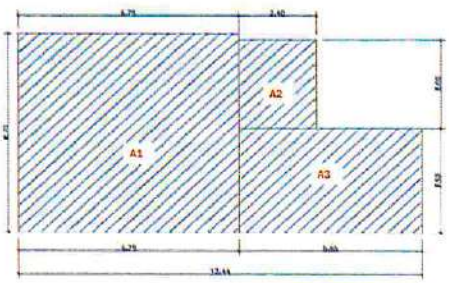ESQUEMA / FOTOLOCALIZACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTO
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CUBIERTA TIPO ECOROOF A1		6,50	6,79			44,14	44,14	M2	
	CUBIERTA TIPO ECOROOF A2		3,00	2,40			7,20	7,20	M2	
	CUBIERTA TIPO ECOROOF A3		2,40	8,60			19,21	19,21	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	79,55	M2
MENOS ACTA(S) ANTERIOR(ES)	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	79,55	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
79,55	0,00	79,55


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEJANDRO RAGOS / INGMARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON LIZARAZO SEGURA / ING ANDRES GARCIA MORUZA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CT	CONTRATO No:	9176-2024	FRENTE OBRA	ALTOBELLO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9255-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)	ACTA No:	001
ITEM	17.3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA DE BARRO FORMATO 1 CON LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	UNIDAD	M

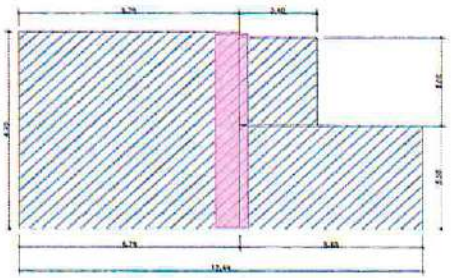ESQUEMA / FOTO UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTO
	LUGAR	FACTOR	ANCHO	LARGO	ALTO	PESO				
	CABELLETE CUBIERTA A DOS AGUAS		6,50				6,50	6,50	M	
										
										

TOTAL EJECUTADO	6,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADICIONAR EN ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	6,50	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,50	0,00	6,50

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEJANDRO PENAGOS / ING. MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS G1	CONTRATO No.	9140-2024	FRENTE OBRA	11 TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9305-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPITULO		ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	ACTA No:	001
ITEM	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	UNIDAD	KG

ESQUEMA / FOTOLOCALIZACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSION					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	DISPOCISION FINAL TEJA DE ASBESTO		120.00	1.80			52,50	945,00	KG	



TOTAL EJECUTADO	945.00	KG	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	KG	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA A	0.00	KG	
PRESENTE ACTA	945,00	KG	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
945,00	0,00	945,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEJANDRO RENGIFO / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SEGUA / ING ALEJANDRO GARCIA MORENO
FIRMA		FIRMA	

CARACOL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	SDIS 2024	TIPO DE OBRA	(MEJORAMIENTO O CAMBIO)
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCTORES	CONTRATO No	SDIS 2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2024

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ACTA No	001
ÍTEM	1.1.1 DEMOLICIÓN DE ACABADO Y AJUSTADO DE PISO E HASTA 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTOGRAFÍAS DEL SECTOR





UBICACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Descuento	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
SALÓN G A1		5,59	7,70			43,04	43,04	M2	
SALÓN G A2		0,60	0,15			0,12	0,12	M2	
SALÓN G DESCUENTO 1		0,28	0,39			0,11	0,11	M2	
SALÓN G DESCUENTO 2		0,11	0,3			0,03	0,03	M2	
SALÓN G DESCUENTO 3		0,11	0,44			0,05	0,05	M2	
SALÓN G DESCUENTO 4		0,36	0,43			0,15	0,15	M2	
SALÓN G DESCUENTO 5		1,22	0,82			1,00	1,00	M2	
SALÓN H A1		5,40	7,30			39,42	39,42	M2	
SALÓN H A2		0,81	0,12			0,10	0,10	M2	
SALÓN H A3		0,41	2,00			0,82	0,82	M2	
SALÓN H DESCUENTO 1		0,33	0,24			0,08	0,08	M2	
SALÓN H DESCUENTO 2		0,32	0,24			0,08	0,08	M2	
SALÓN H DESCUENTO 3		0,32	0,42			0,07	0,07	M2	
SALÓN H DESCUENTO 4		0,33	0,40			0,05	0,05	M2	
SALÓN H DESCUENTO 5		1,20	0,83			1,00	1,00	M2	
SEGUNDO PISO							0,00		
PARVULOS 4 A1		5,48	7,80			42,74	42,74	M2	
PARVULOS 4 A2		0,81	0,14			0,11	0,11	M2	
PARVULOS 4 DESCUENTO 1		1,16	0,89			1,03	1,03	M2	
PARVULOS 3 A1		5,51	7,64			42,10	42,10	M2	
PARVULOS 3 A2		0,81	0,14			0,11	0,11	M2	
PARVULOS 3 DESCUENTO 1		1,16	0,89			1,03	1,03	M2	
PARVULOS 2 A1		5,42	7,30			39,57	39,57	M2	
PARVULOS 2 A2		0,80	0,12			0,10	0,10	M2	
PARVULOS 2 DESCUENTO 1		1,16	0,88			1,02	1,02	M2	
PARVULOS 2 DESCUENTO 2		0,86	0,29			0,25	0,25	M2	

NOTA: EL PISO EXISTENTE ES PISO CAUCHO FORRO A CUENTO SE DEMUESTRA CON PRACTICAS, SE DETERMINA QUE ES RESISTENCIA EL CAUCHO POR EL ITEM 2.5.1 SE INCLUYE UN PORCENTAJE EL CUAL ES EL 30% ACORDADO ENTRE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA EN VISITA CONTRATO.

TOTAL EJECUTADO	114,50	M2	ACCIONA REAL 105,15
AFECTACION DE ESPECTATIVAS	0,00	%	
METROS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
METROS PROYECTADOS (AZULEJOS) ACTA N	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	114,50	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
114,50	0,00	114,50

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/VEEDURIA DELEGADA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	Adriana Gutierrez / Margarita Gomez	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL CARACOL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	1.1.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

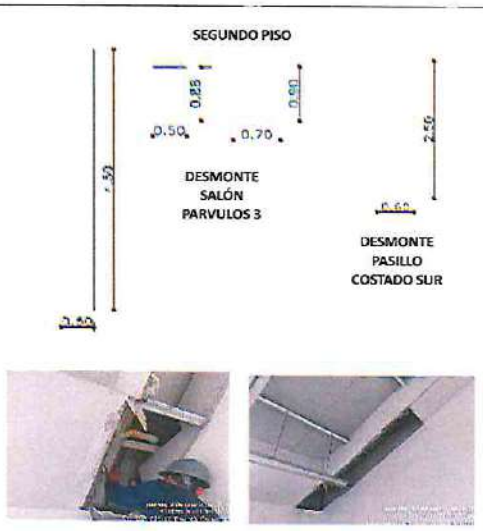ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENCION



LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Descuento	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SEGUNDO PISO									
PARVULOS 3 LAMINA 1			0,50	4,50		2,00	4,50	4,50	M2	
PARVULOS 3 LAMINA 2			0,50	0,88		2,00	0,88	0,88	M2	
PARVULOS 3 LAMINA 3			0,70	0,90		2,00	1,26	1,26	M2	
PASILLO COSTADO SUR			0,60	2,50		1,00	1,50	1,50	M2	

TOTAL EJECUTADO	8,14 M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00 M2
MENOS PROYECCION (ACUMULADO) ACTA X	0,00 M2
PRESENTE ACTA	8,14 M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,14	0,00	8,14

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER PENAGOS / ING MARICARMEN GOYAZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SOLVE / ING ALEJANDRO GARCIA MUNOZ
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRISALCO	CONTRATO No.	1572-2024	FRENTE OBRA	ANTONIO NARIÑO
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES 2024-1	CONTRATO No.	1573-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SUBES Y PISOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O PRIMERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	10 de enero de 2025

CAPITULO	SUMINISTRO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No.	001
ITEM	3.2.10	RESANE DE FISURAS EMBEBIDOS, DISIMPE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE			UNIDAD M2

ESCANEO / FOTOGRAFIA ANTES DE INTERVENIR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN				CANTIDAD	SUBTOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
	LUGAR	Elemento	Ancho	Longitud	Altura	No.					
PASILLO NORTE	CORREDOR PINTURA ALA NORTE										
	MURO 1										
	MURO PARTE SUPERIOR			4.85	1.20	1.00	5.82	5.82	M2		
	MURO PARTE CENTRAL			4.80	1.50	1.00	7.20	7.20	M2		
	MURO PARTE INFERIOR			2.40	1.50	1.00	3.60	3.60	M2		
	VOLUMEN SUPERIOR PUERTA			0.04	0.48	1.00	0.02	0.02	M2		
	MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"			0.41	1.00	1.00	0.41	0.41	M2		
	MURO 2										
	CILORRADO V1			5.17	0.45	1.00	2.33	2.33	M2		
	CILORRADO V2			0.55	0.36	1.00	0.19	0.19	M2		
	MURO PARTE SUPERIOR			5.57	1.21	1.00	6.74	6.74	M2		
	MURO PARTE INFERIOR			2.50	1.25	1.00	3.12	3.12	M2		
	MURO 3								M2		
	MURO "ALTURA PROMEDIO 3.71"			0.74	1.66	1.00	1.60	1.60	M2		
	MURO 2			1.70	1.25	1.00	2.04	2.04			
	MURO 4										
	MURO PARTE SUPERIOR			8.76	1.54	1.00	8.11	8.11	M2		
	MURO PARTE CENTRAL			3.00	1.40	1.00	4.20	4.20	M2		
	MURO PARTE INFERIOR			2.50	1.20	1.00	3.50	3.50	M2		
	MURO 5										
	CILORRADO			8.21	0.45	1.00	2.24	2.24	M2		
	MURO PARTE SUPERIOR			3.40	1.15	1.00	4.11	4.11	M2		
	MURO PARTE CENTRAL			3.20	1.20	1.00	3.84	3.84	M2		
	MURO PARTE INFERIOR			1.40	1.54	1.00	2.15	2.15	M2		

TOTAL EJECUTADO	56.85	M2
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0.00	M2
ACTA PROVISIONAL DE LIQUIDACIÓN No.	0.00	M2
PRESENTE ACTA	56.85	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
56.85	0.00	56.85



OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA/SUPERVISOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATO/SUPERVISOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SIT	CONTRATO No:	9128-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL CHAPUC
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEX CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9155-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	30 de enero de 2025

CAPITULO		RAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO		UNIDAD	M2

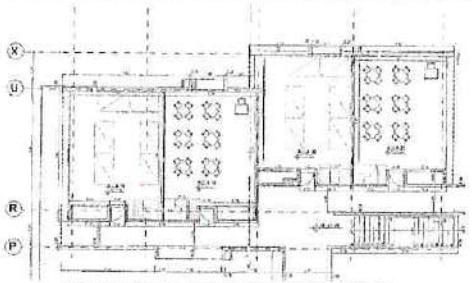ESQUEMA / FOTOFIJACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Descuento	Ancho	Largo	Alto	%				
	CORREDOR PINTURA ALA NORTE									
	M1	5,72		13,60	2,12	50%	31,55	11,55	M2	
	VOLUMEN POSTERIOR 1	0,00		10,55	0,98	50%	5,17	5,17	M2	
	VOLUMEN POSTERIOR 2	0,00		0,38	0,98	50%	0,19	0,19	M2	
	VOLUMEN POSTERIOR 3	0,00		1,30	0,98	50%	0,64	0,64	M2	
	M2	0,00		3,81	2,12	50%	4,04	4,04	M2	
	M3	1,76		4,73	2,12	50%	4,16	4,16	M2	
	M4	0,00		2,53	2,12	50%	2,68	2,68	M2	
	M5	5,44		11,54	2,12	50%	9,51	9,51	M2	
										

TOTAL EJECUTADO	37,95	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION [ADELANTO] ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	37,95	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
37,95	0,00	37,95

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SUAVE / ING ALEJANDRA GARCIA MONSON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	RAZÓN SOCIAL:	NIT:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 4	CONTRATO No.:	NOVEDAD:		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES 4	CONTRATO No.:	NOVEDAD:	FRENTE OBRA	INTERVENTORÍA ESTRUCT.
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SITIOS Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	10 diciembre de 2024

CAPITULO	PINTURA Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM	10.2.3	VINILO TIPO 1 A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN APROXIMACIÓN ÁREA EJECUTADA

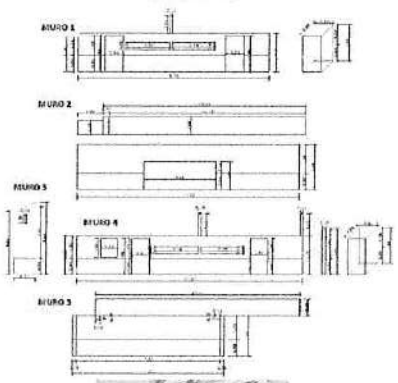PASILLO NORTE







UBICACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	OBRA
LUGAR	Descuento	Ancho	Largo	Alto	%				
CORREDOR ENTRE RA ALA NORTE									
MURO 1								M2	
MURO		9,76	1,22	100%	1,00	11,90	11,90	M2	
DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,93	1,09	100%	2,00	-2,03	-2,03	M2	
DESCUENTO VENTANA 1		2,2	0,39	100%	1,00	-0,86	-0,86	M2	
DESCUENTO VENTANA 2		2,19	0,4	100%	1,00	-0,88	-0,88	M2	
VOLUMEN SUPERIOR MURO		0,12	0,96	100%	1,00	0,12	0,12	M2	
MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,84	1,09	100%	4,00	3,78	3,78	M2	
DINTEL PUERTAS "DOS PUERTAS"	0,93	0,84		100%	2,00	1,63	1,62	M2	
MURO 2									
CILORRADO V1		10,01	0,98	100%	1,00	10,12	10,11	M2	
CILORRADO V2		1,30	0,78	100%	1,00	1,01	1,01	M2	
MURO		11,82	1,50	100%	1,00	17,80	17,85	M2	
DESCUENTO VANO		3,68	0,84	100%	1,00	-2,54	-2,54	M2	
MURO 3									
MURO "ALTURA PROMEDIO 2,61"		1,09	2,61	100%	1,00	3,01	3,01	M2	
DESCUENTO VIGA		0,18	0,28	100%	1,00	-0,06	-0,06	M2	
MURO 4									
MURO		11,94	1,22	100%	1,00	14,54	14,64	M2	
DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,92	1,01	100%	2,00	-2,01	-2,01	M2	
DESCUENTO VENTANA 1		2,19	0,39	100%	1,00	-0,85	-0,85	M2	
DESCUENTO VENTANA 2		2,20	0,40	100%	1,00	-0,88	-0,88	M2	
DESCUENTO GABINETE		0,80	1,05	100%	1,00	-0,87	-0,87	M2	
VOLUMEN SUPERIOR MURO		0,12	1,22	100%	1,00	0,28	0,28	M2	
MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,86	1,09	100%	4,00	3,75	3,76	M2	
DINTEL PUERTAS "DOS PUERTAS"	0,92	0,86		100%	2,00	3,58	3,56	M2	
MURO FINAL		0,2	1,61	100%	1,00	0,32	0,33	M2	
MURO 5									
CILORRADO		10,66	0,9	100%	1,00	9,40	9,42	M2	
MURO		7,97	1,35	100%	1,00	9,97	9,97	M2	
DESCUENTO VIGAS		0,24	0,28	100%	2,00	-0,30	-0,13	M2	

TOTAL EJECUTADO	77,25	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ACTUALES) ACTA 2	0,00	M2
PRESENTE ACTA	77,25	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO INTERIOR	ACUMULADO TOTAL
77,25	0,00	77,25

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CHARS 07	CONTRATO No.	5179-2024	PUNTO OBRA	JARDIN INFANTIL CAFAGOL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5193-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	14.7.3 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	Total	UNIDAD	COSTE
	AREAS	Descuento	Ancho	Largo	Alto	%				
PASILLO NORTE	CORREDOR PINTURA ALA NORTE									
MURO 1	MURO 1								M2	
	MURO		9,78	0,9	100%	1,00	8,78	8,78	M2	
	DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,93	0,9	100%	2,00	-1,67	-1,67	M2	
	MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,86	0,9	100%	4,00	3,10	3,10	M2	
MURO 2	MURO 2								M2	
	MURO		11,13	0,9	100%	1,00	10,02	10,02	M2	
	DESCUENTO VANO		3,64	0,9	100%	1,00	-3,28	-3,28	M2	
MURO 3	MURO 3								M2	
	MURO "ALTURA PROMEDIO 90		1,07	0,9	100%	1,00	0,96	0,96	M2	
MURO 4	MURO 4								M2	
	MURO		11,51	0,9	100%	1,00	10,36	10,36	M2	
	DESCUENTO PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,92	0,9	100%	2,00	-1,66	-1,66	M2	
	MUROS INTERNOS PUERTAS "DOS PUERTAS"		0,86	0,9	100%	4,00	3,10	3,10	M2	
	MURO FINAL		0,2	0,9	100%	3,00	0,18	0,18	M2	
MURO 5	MURO 5								M2	
	MURO		7,29	0,9	100%	1,00	6,56	6,56	M2	

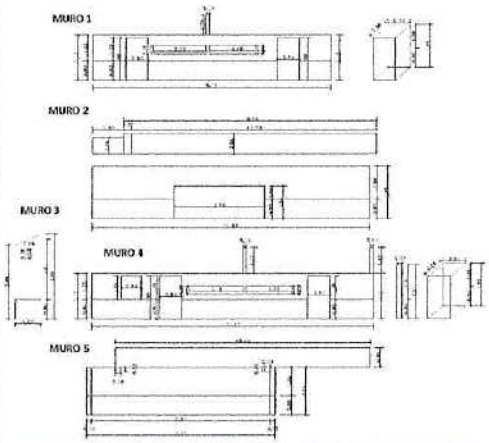





TOTAL EJECUTADO	39,44	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIONES ADELANTO ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	39,44	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
39,44	0,00	39,44

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECCIÓN INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECCIÓN OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS/ANA MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAVARRO SEGUE / INGALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

CAMPO ALEGRE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	3170-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CIELOS CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	3059-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	1.1.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UNIDAD	UND

ESQUEMA / FOTOLOCALIZACION AREA INTERVENIDA	LOCALIZACION	DIMENSION					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
   	DESMONTE DE PUNTOS EN CANALETAS ELECTRICAS SALA DE COORDINACIÓN						9,00	9,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	9,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	9,00	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	9,00


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SIMON CHAPARRO SCO.E - INGCALIXTO GARCIA MUNOZ
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS ST	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9255-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	1 de febrero de 2025

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	RETIRO DE PELICULAS ZONA DE COORDINACIÓN			10,00		1,00	10,00	10,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	10,00	M2	SE MIDE 33,42 SOLO SE PASA 10 M2 SEGUN ACTA
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ACTA ANT) ACTA 2	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	10,00	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,00	0,00	10,00

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALLEANDRO PINAGOS / INGMARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CIFUENTES SCOUL / INGALLEANDRO GARCIA MENDOS
FIRMA		FIRMA	

202

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 01	CONTRATO No.	3170-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	3356-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	001
ITEM	13.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACION	DIMENSION					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	DESMONTE DE CANALETAS ELECTRICAS SALA DE COORDINACIÓN			1,90		2,00	3,80	3,80	M	

TOTAL EJECUTADO	3,80	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ANTICIPO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	3,80	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,80	0,00	3,80

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SACRE / ING.ALEJANDRO GARCIA MORON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS G1	CONTRATO No.	3176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	3359-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTAQION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	#IREF!	#IREF!	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACION AREA INTERVENIDA







LOCALIZACION	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CONTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
RED DE EMERGENCIA			5,10		1,00	5,10	5,10	M	
			1,5		1,50	1,50	1,50	M	
			0,6		0,50	0,60	0,60	M	

TOTAL EJECUTADO	7,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	7,20	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,20	0,00	7,20


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING ALEXANDER PENAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SEGURA / ING ALEJANDRO GARCIA MORA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS G1	CONTRATO No.	9176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CASA NEIVANA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9355-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTOUBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Porcentaje	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	PUNTOS DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL SOBRE CANALETA DEL AULA COORDINACION			5,00		1,00	5,00	5,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	5,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	5,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	5,00


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING.ALEJANDRO PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SEGUI / ING.ALEJANDRO GARCIA MONTOYA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 01	CONTRATO No.	5170-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	6350-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACION	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CONTE
	LUGAR	Porcentaje	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	PUNTOS DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA SOBRE CANALETA DEL AULA COORDINACIÓN			5,00		1,00	5,00	5,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	5,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	5,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	5,00

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	ING ALEXANDER PINAGOS / ING MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ SHARON CHAPARRO SEGUR / ING ALBERTO GARCIA NARANJO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS SI	CONTRATO No.	6176-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	5555-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COMTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUNTOS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIAS SALA DE COORDINACIÓN			2,00		1,00	2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROTECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	INGALEXANDER NUNAGOS / INGMARCAVICA GOMEZ	NOMBRE	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUL / INGWILLIANCHO GARCIA MONZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	CONTRATO No.	9195-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	CONTRATO No:	9205-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	20 de enero de 2025

CAPITULO		INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
LUMINARIAS DE EMERGENCIAS SALA DE COORDINACIÓN			2,00		1,00	2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:


	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. ALEXANDER PENAGOS / ING. MARGARITA GOMEZ	NOMBRE	ARQ. SHARON CHAPARRO SECUE / ING. ALEJANDRO GARCIA MORZON
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.78**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CANALETA TROQUELADA PROPUESTA EN AULA DE COORDINACIÓN		4,80			1,00	4,80	4,80	M	
		2,48			1,00	2,48	2,48	M	

TOTAL EJECUTADO	7,28	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**7,28**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,28	0,00	**7,28**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/ DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	Sharon Chaparro


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT	**CONTRATO No.**	9176-2024	**FRENTE OBRA**	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES	**CONTRATO No:**	9355-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**20 de enero de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.3**	**MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

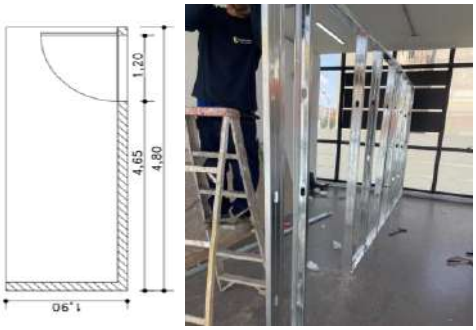ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO 1		1,76	2,40		1,00	4,22	4,22	M2	
MURO 2		4,94	2,40		1,00	11,86	11,86	M2	
DESCUENTO DE PUERTA		0,90	2,00		-1,80	-1,80	-1,80	M2	

TOTAL EJECUTADO	14,28	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**14,28**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,28	0,00	**14,28**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING.ALEXANDER PENAGOS / ING.MARGARITA GOMEZ	**NOMBRE**	ARQ.SHARON CHAPARRO SECUE / ING.ALEJANDRO GARCIA MONZON
FIRMA		**FIRMA**	Sharon Chaparro

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA DIAGO	CONTRATO No.	3175-2024	FRENTE OBRA	CENTRO CRECER CALANDAIMA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES	CONTRATO No.	3895-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			FECHA	29 de enero de 2025

CAPÍTULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No.	001
ITEM	13.2.1	VOBO TIPO 1 A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTOGRAFÍA DE LA INTERVENCIÓN	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	OBRA
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PROPUESTA MURO EJE DRYWALL PARA ARCHIVO Y COORDINACIÓN									
	MURO 1 EXTERNA			1,76	2,20		4,22	3,87		
	MURO 2 EXTERNA			4,30	2,10		11,66	9,03		
	DESCUENTO DE PUERTA			0,90	2,00		1,80	1,80		
	MURO 1 INTERNA			1,65	2,00		3,95	3,30		
	MURO 2 INTERNA			4,30	2,10		11,63	9,03		
	DESCUENTO DE PUERTA			0,90	2,00		1,80	1,80		
	MARCO PUERTA			4,30	0,20		0,59	0,86		
	MURO EXISTENTE			5,31	2,90		18,55	15,41		
										
										

TOTAL EJECUTADO	45,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA #	0,00	M2
PRESENTE ACTA	45,10	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45,10	0,00	45,10

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	EVA ALEXANDER ESTUPIÑAN / EDWIN MARCANO GOMEZ	NOMBRE	ARLEY MARCIN OLAYA ROJAS / EDGAR ALFREDO GARCIA MONTOYA
FIRMA		FIRMA	

1.9 Balance financiero del contrato.

BALANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 9176-2024- GRUPO 3

OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ,SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

VALOR DEL CONTRATO			$ 1,299,753,000.00	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR SEDE		PRESUPUESTO AJUSTADO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA	PRESUPUESTO AJUSTADO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA Enlazado con presupuestos aprobados
LOCALIDAD FONTIBON	$ 223,517,303.01		$ 223,517,313.17	$ 223,517,313.17
JI OSO DE ANTEOJOS	$ 36,895,524.00		$ 68,682,112.39	$ 68,682,112.39
JI SABANA GRANDE	$ 51,490,747.00		$ 93,332,262.87	$ 93,332,262.87
CENTRO CRECER FONTIBON	$ 83,446,259.78		$ 16,262,871.63	$ 16,262,871.63
CPI SHUS	$ 51,684,772.23		$ 45,240,066.28	$ 45,240,066.28
LOCALIDAD KENNEDY	$ 360,687,431.15		$ 360,687,390.27	$ 360,687,390.27
JI TINTALITO	$ 90,213,940.69		$ 84,940,409.30	$ 84,940,409.30
JI BRITALIA	$ 58,406,228.01		$ 54,667,970.36	$ 54,667,970.36
JI CARACOL	$ 74,877,725.55		$ 79,053,808.00	$ 79,053,808.00
CDC KENNEDY	$ 54,708,220.50		$ 56,286,835.08	$ 56,286,835.08
CENTRO CRECER ALEGRIA CALANDAIMA	$ 82,481,316.40		$ 85,738,367.53	$ 85,738,367.53
LOCALIDAD ENGATIVA	$ 271,528,044.00		$ 382,010,725.81	$ 382,010,725.81
JI ENGATIVA	$ 67,838,913.00		$ 106,417,690.11	$ 106,417,690.11
JI LOS SAUCES	$ 89,096,908.00		$ 89,096,884.01	$ 89,096,884.01
CASA JUVENTUD	$ 34,850,140.00		$ 97,290,100.00	$ 97,290,100.00
CENTRO LUZ ESPERANZA	$ 79,742,083.00		$ 89,206,051.69	$ 89,206,051.69
SUMATORIA COSTO DIRECTO	$ 855,732,778.16		$ 966,215,429.25	$ 966,215,429.25
ADMINISTRACION	28.52%	$ 244,054,988.33	275,564,640.42	275,564,640.42
IMPREVISTO	1%	$ 8,557,327.78	9,662,154.29	9,662,154.29
UTILIDAD	5.00%	42,786,638.91	48,310,771.46	48,310,771.46
TOTAL DE AIU	34.52%	295,398,955.02	333,537,566.18	333,537,566.18
AJUSTE AL PESO			4.57	4.57
VALOR TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTAL POR SEDES SDIS		$ 1,151,131,733.18	$ 1,299,753,000.00	$ 1,299,753,000.00

VALOR CONTRATO

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$	1,299,753,000.00
VALOR TOTAL DE PRESUPUESTOS	$	1,299,753,000.00
DIFERENCIA DE VALORES	$	-

1.10 Copia digital de los informes semanales correspondientes al mes, incluyendo soportes fotográficos

ENGATIVA

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24
11. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días					
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24
22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días					
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificación de cantidades. Se revisa las pareas a intervenir de picado y reito de manto de terraza.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de rejillas para sifones en cubierta.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para fachada, resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

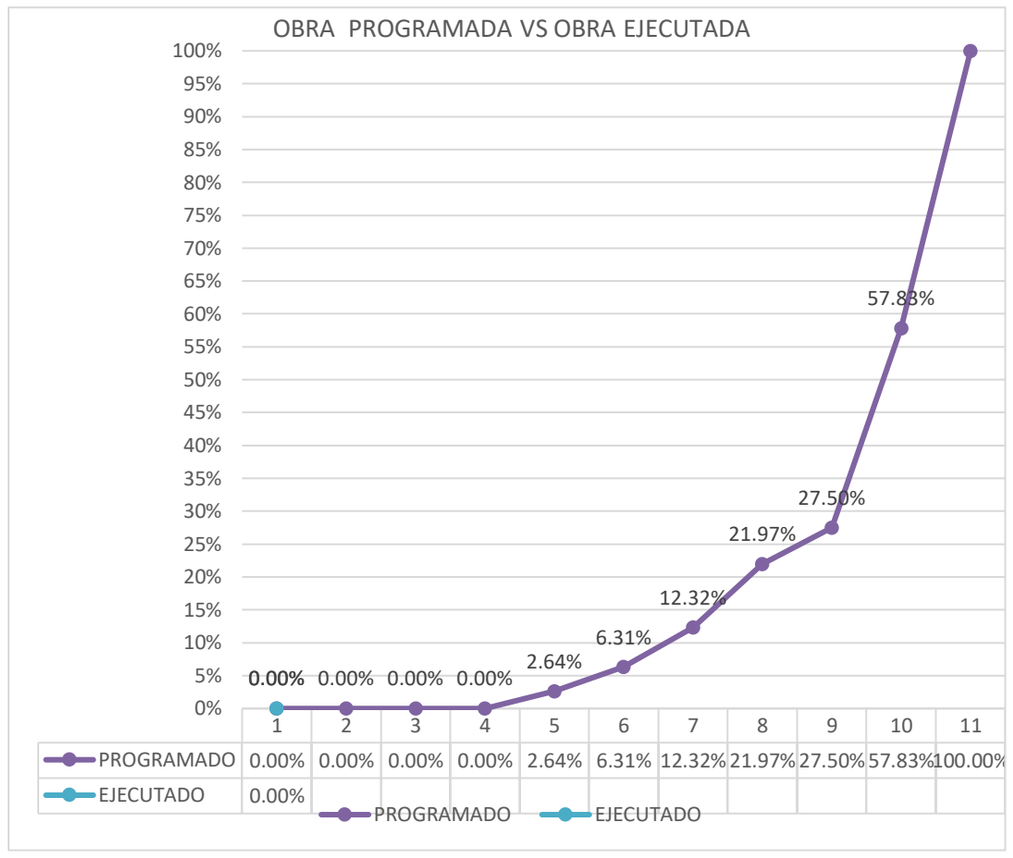34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Retiro de manto impermeabilizado existente en cubierta en las áreas a intervenir
Retiro y disposición de material manto imperemeabilizante de cubierta

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de fachada principal



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual cubierta con manto impermeabilizante



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado inicial fachada interior Jardín los Sauces



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual techos



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de techo en salones



FECHA FOTO: 26/11/24
DESCRIPCIÓN: Estado actual de techo en corredores

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25
11. PLAZO:	23 de febrero	Meses/días					
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25
22. PLAZO:	23 de febrero	Meses/días					
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificación de cantidades. Se revisa las pareas a intervenir de picado y reito de manto de terraza.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de rejillas para sifones en cubierta.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para fachada, resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Retiro de manto impermeabilizado existente en cubierta en las áreas a intervenir
Retiro y disposición de material manto impermeabilizante de cubierta.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	2	SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



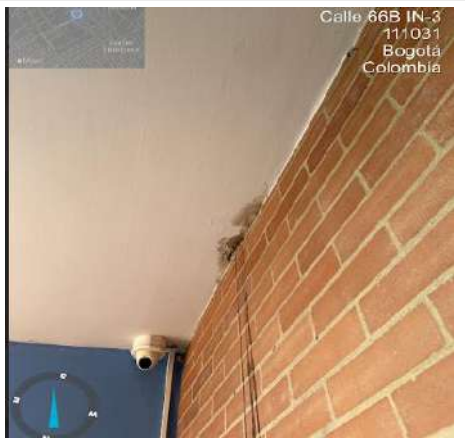FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de techos en corredores y salones que presentan humedad para intervención de resanes y pinturas



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de techos en corredores y salones que presentan humedad para intervención de resanes y pinturas



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de fachada principal que requiere intervención de resanes y pinturas



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de fachada principal que requiere intervención de resanes y pinturas



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de techos internos para intervención de pintura



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de techos internos en salones para intervención de pintura

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificación de cantidades. Se revisa las pareas a intervenir de picado y reito de manto de terraza.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de rejillas para sifones en cubierta.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para fachada, resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

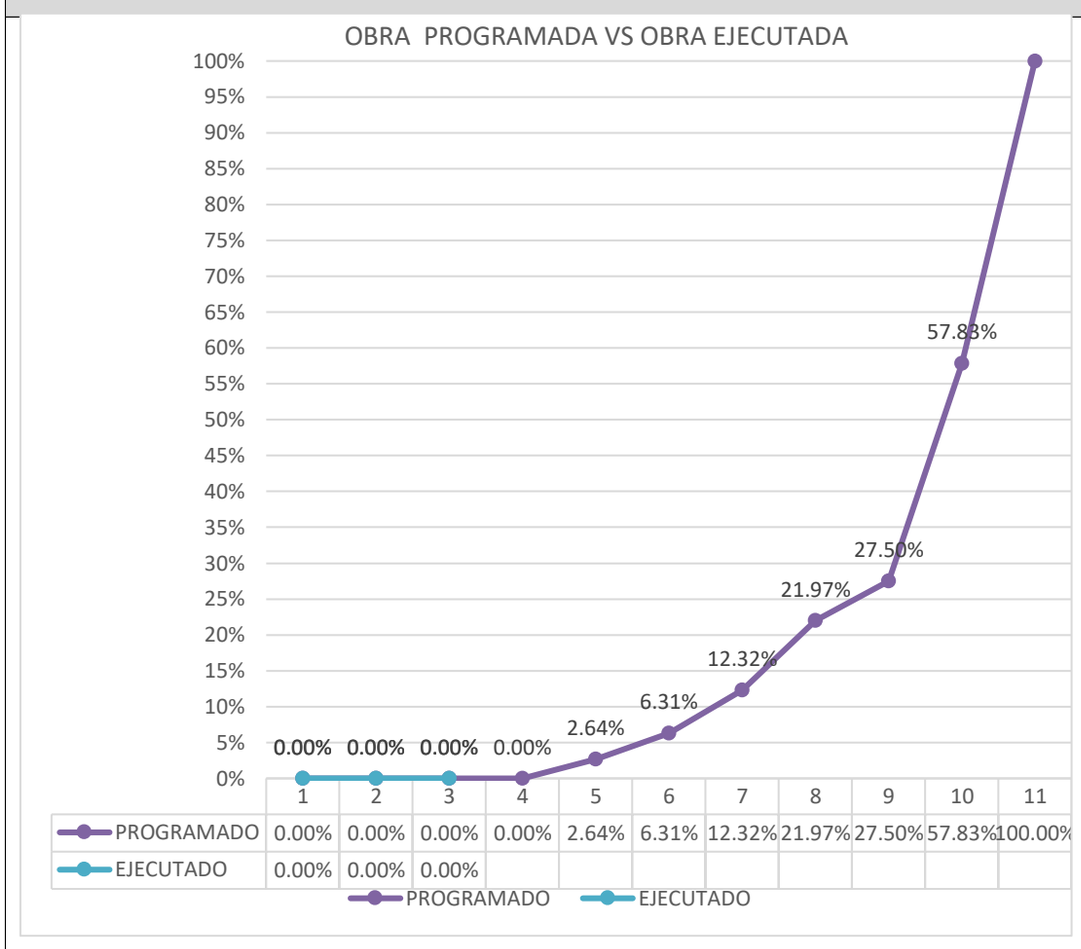34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Retiro de manto impermeabilizado existente en cubierta transitable en las áreas a intervenir
Retiro y disposición de material manto imperemeabilizante de cubierta transitable

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión conjunta con la interventoría de las áreas a intervenir para instalación de manto impermeabilizado



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión conjunta con la interventoría de las áreas a intervenir para instalación de manto impermeabilizado



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión conjunta con la interventoría de las áreas a intervenir para instalación de manto impermeabilizado



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión conjunta con la interventoría de las áreas a intervenir para instalación de manto impermeabilizado



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión conjunta con la interventoría de las áreas a intervenir para instalación de manto impermeabilizado



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión conjunta con la interventoría de las áreas a intervenir para instalación de manto impermeabilizado

1. FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL LOS SAUCES	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	23 de febrero Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	22. PLAZO:	23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificación de cantidades. Se revisa las pareas a intervenir de picado y reito de manto de terraza.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de rejillas para sifones en cubierta.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para fachada, resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

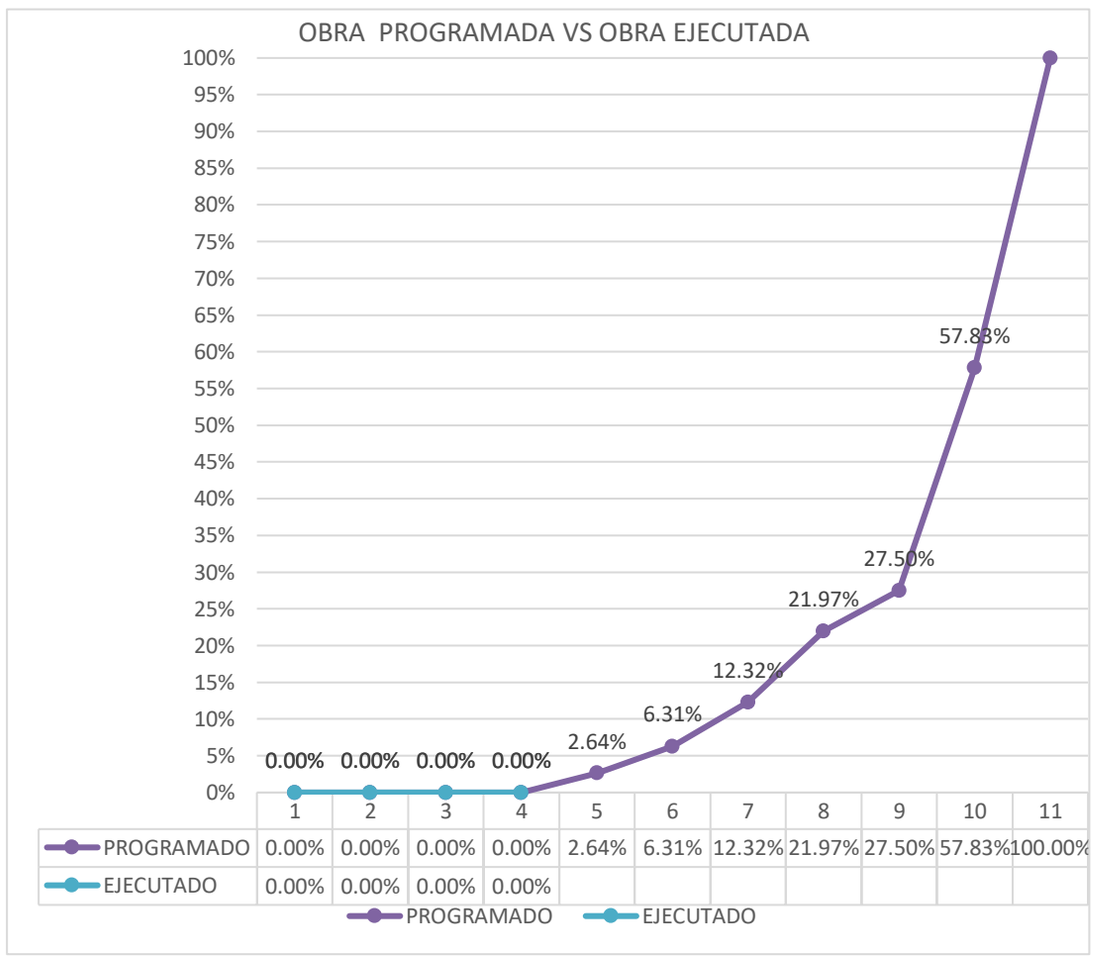34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Retiro de manto impermeabilizado existente en cubierta transitable en las áreas a intervenir
Retiro y disposición de material manto imperemeabilizante de cubierta transitable

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Suministro de elementos de protección personal para intervención de sedes



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducciones a personal administrativo



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducciones a personal de ingreso a frentes de obra para intervención



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducciones a personal de ingreso a frentes de obra para intervención



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducciones a personal de ingreso a frentes de obra para intervención



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducciones a personal de ingreso a frentes de obra para intervención

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL LOS SAUCES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2.64%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificación de cantidades. Se revisa las pareas a intervenir de picado y reito de manto de terraza.	Se adelantan actividades preliminares para cambio de presupuesto de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	interventoría informa bajar las cantidades de resanes en interiores a cero e incrementar cantidades de intervención de impermeabilizacion de terraza. Esta en proceso de revisión.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de rejillas para sifones en cubierta.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para fachada, interventoría informa bajar las cantidades de pinturas en interiores a cero e incrementar cantidades de intervención de impermeabilizacion de terraza. Esta en proceso de revisión y aprobación el nuevo presupuesto.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	2.64%	0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	2.64%	-2.64%
Acumulado Actual	0%	2.64%	-2.64%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2.64%	2.64%
Valor de la Obra Programada	$ 2,355,394.66	$ 2,355,394.66

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

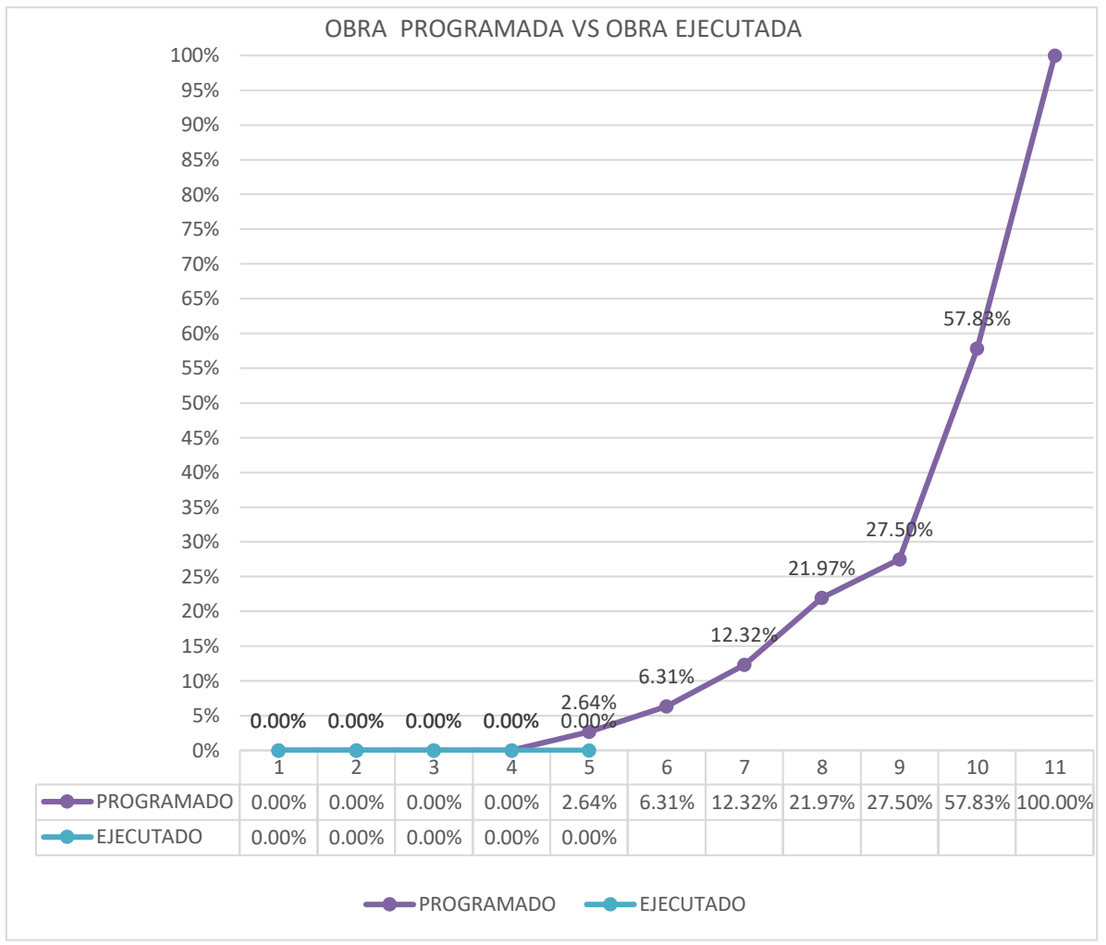34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Retiro de manto impermeabilizado existente en cubierta transitable en las áreas a intervenir
Retiro y disposición de material manto impermeabilizante de cubierta

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se realza verificación de sifones de cubierta
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio
La interventoría solicita ajuste de presupuesto del jardin los sauces donde se quiten las actividaddes de resanes, pinturas en interiores del centro y subir cantidades en actividades de impermeabilización de la terraza. Se encuentra en proceso de revisón y aprobación, debido aque no se ha tenido claridad de las áreas de intervenció por lo tanto no se han podido empezar labores en cubierta.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13 / 1 / 25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 07/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza cerramiento para acopio de materiales y andamios



FECHA FOTO: 07/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza cerramiento para acopio de materiales y andamios



FECHA FOTO: 07/01/2025
DESCRIPCIÓN: Verificación de zonas de ingreso a cubierta para intervención



FECHA FOTO: 07/01/2025
DESCRIPCIÓN: Verificación de zonas de ingreso a cubierta para intervención, se revisa nuevamente áreas de intervención debido a que el presupuesto se incrementan cantidades en actividades de imermeabilización.



FECHA FOTO: 07/01/2025
DESCRIPCIÓN: Verificación de sifones de cubierta impermeabilizada



FECHA FOTO: 07/01/2025
DESCRIPCIÓN: Verificación de áreas en mal estado de impermeabilización enterrazas.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	3 MESES	Meses/días	
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificacion de demoliciones y desmontes.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de redes.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Recorrido de inicio para verificación de red electrica	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Recorrido de inicio para verificación de actividades de piso.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de muros.	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de actividades de carpinteria en aluminio.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de teleduchas y accesorios.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de zona de tanques.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

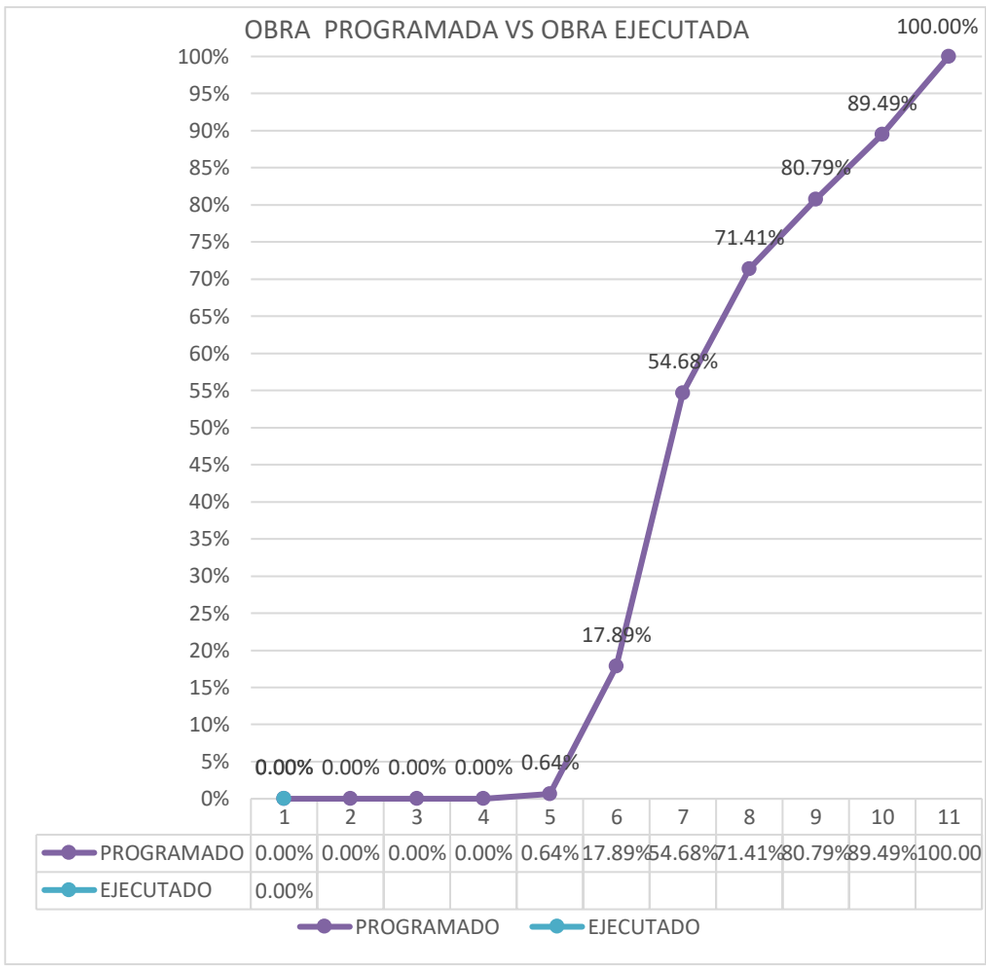34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA 1	0			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Desmonte de cubierta existente teja plástica en corredor salones
Se proeyecta el retiro y disposición de material de teja plástica de cubierta en corredor salones

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de cubierta teja plástica corredor



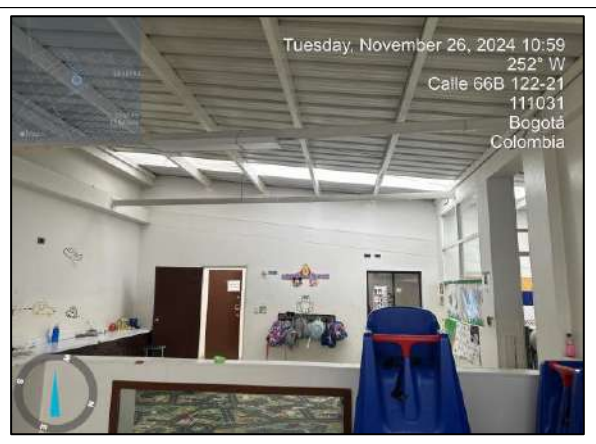
FECHA FOTO: 30/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual cubierta en teja plástica de bodega patio



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado inicial fachada principal Jardín Engativá



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual placa de tanques en patio



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Luminarias existentes



FECHA FOTO: 26/11/24
DESCRIPCIÓN: Estado actual de muro a intervenir en salón niños

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 66B # 122-03		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25
11. PLAZO:	3 MESES	Meses/días					
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25
22. PLAZO:	23 de febrero	Meses/días					
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificacion de demoliciones y desmontes.	Se continua con actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de redes.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Recorrido de inicio para verificación de red eléctrica.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	verificación de actividades de piso.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de muros.	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de actividades de carpintería en aluminio.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de teleduchas y accesorios.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pañete adicionalmente pintura para resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades impermeabilización de zona de tanques.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

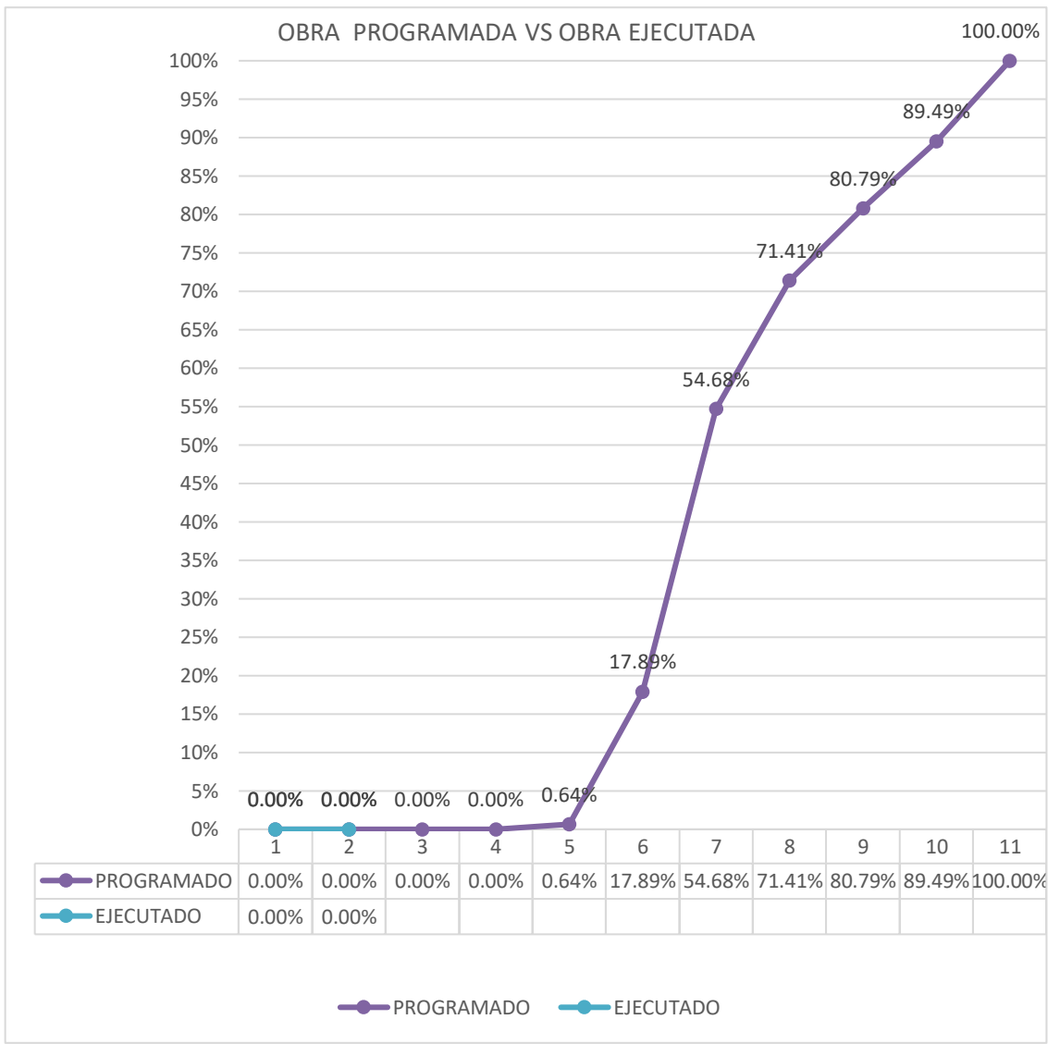34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja plástica en corredor salones
Desmonte y retiro de aparatos electricos y luminarias por parte de la entidad
Retiro y disposición de material de teja plástica de cubierta corredor y salones

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se realiza inventario, inspección y revisión de la red eléctrica existente y aparatos de luminarias que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en comedor para retiro de cubiertas.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	No. INFORME	2	SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de zona de lavanderia y placas de tanques en mal estado



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual cocina para intervención de pintura y luminaria



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de zona de baños para intervención



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión de baño en porteria para instalación de lavamanos



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de zona de baños para intervención



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de luminarias a intervenir

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 66B # 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, verificacion de demoliciones y desmontes.	Se continua con actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de redes.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Recorrido de inicio para verificación de red eléctrica.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	verificación de actividades de piso.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de muros.	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de actividades de carpintería en aluminio.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de teleduchas y accesorios.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pañete adicionalmente pintura para resanes y pintura para zonas	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades impermeabilización de zona de tanques.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

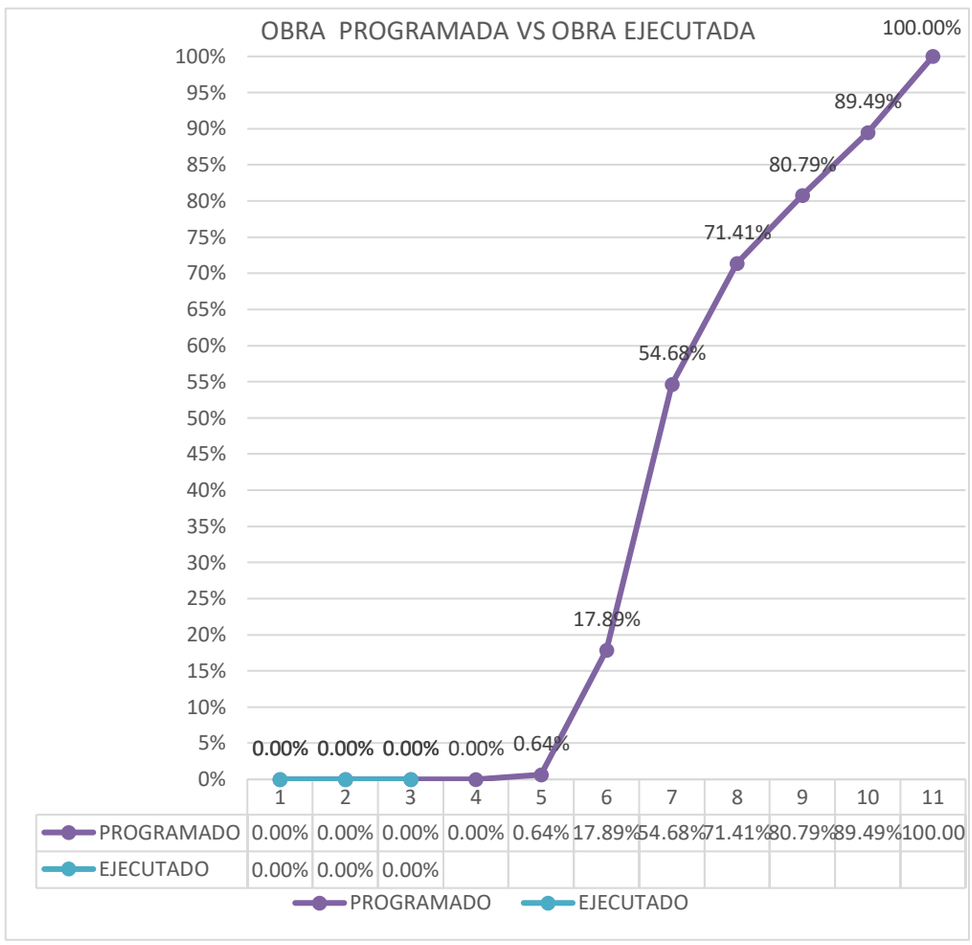34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja plástica en corredor salones
Desmonte y retiro de aparatos electricos y luminarias por parte de la entidad
Retiro y disposición de material de teja plástica de cubierta corredor y salones

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se realiza inventario, inspección y revisión de la red eléctrica existente y aparatos de luminarias que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en comedor para retiro de cubiertas.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.
Se realiza documentación de inducciones y demas formatos pertienentes de SST a personal de obra.
Se continua con el analisis de presupuestos para revision y aprobación.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 1 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducción a personal de ingreso



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realizan charlas y entrega de dotación a personal de ingreso



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducción a personal de ingreso



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realizan charlas y entrega de dotación a personal de ingreso



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza inducción a personal de ingreso



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realizan charlas y entrega de dotación a personal de ingreso

1. FECHA ELABORACIÓN:	7 1 25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL ENGATIVÁ	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 66B # 122-03		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 2 25	11. PLAZO:	3 MESES	Meses/días	
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 2 25	22. PLAZO:	23 de febrero	Meses/días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede,	
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de redes.	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Recorrido de inicio para verificación de red eléctrica.	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	verificación de actividades de piso.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de muros.	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de actividades de carpintería en aluminio.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de teleduchas y accesorios.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pañete adicionalmente pintura para resanes y pintura para	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades impermeabilización de zona de tanques.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

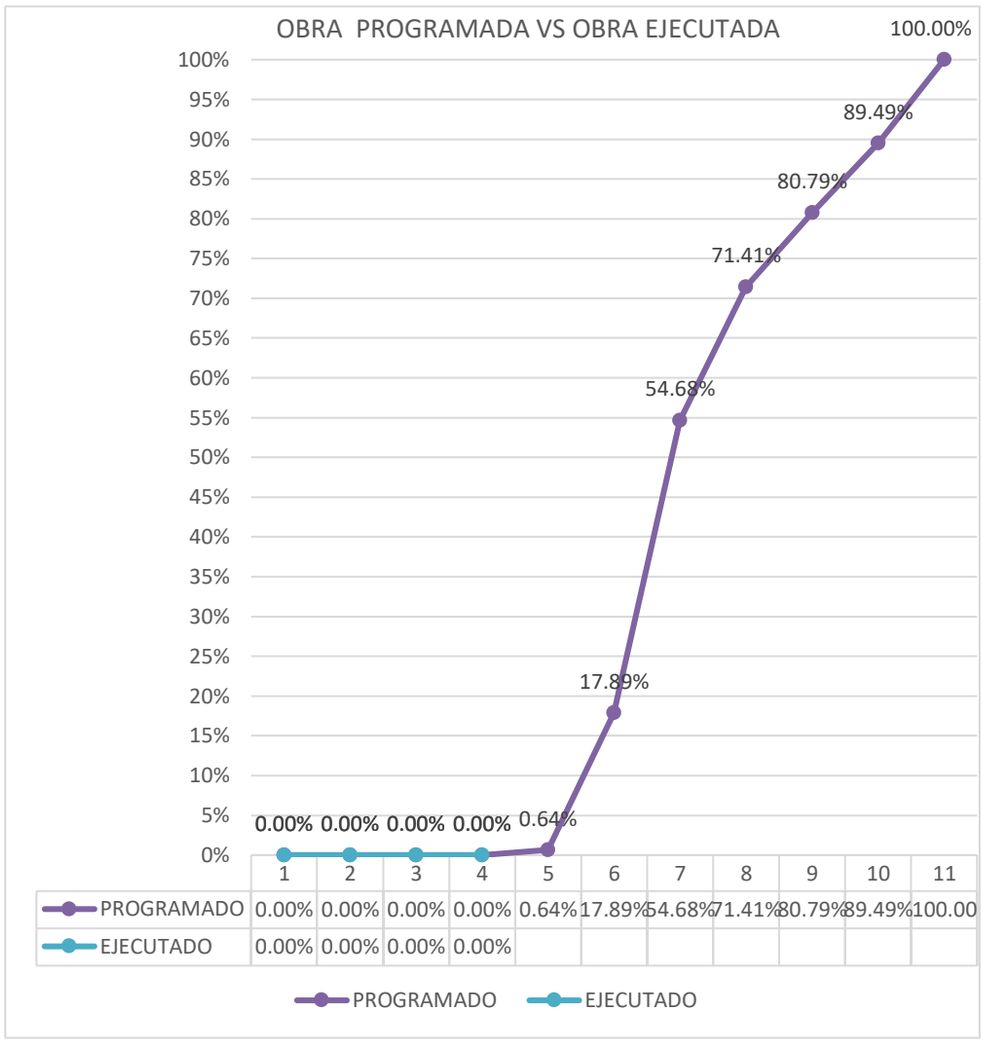34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja plástica en corredor salones
Desmonte y retiro de aparatos electricos y luminarias por parte de la entidad
Retiro y disposición de material de teja plástica de cubierta corredor y salones

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se realiza inventario, inspección y revisión de la red eléctrica existente y aparatos de luminarias que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos
Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.
Se organiza la logistica para materiales, equipos y personal para la obra.
Se realiza documentación de inducciones y demas formatos pertienentes de SST a personal de obra que va ingresar.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 1 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de luminarias en mal estado por parte de la entidad

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTÍL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 66B # 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0.26%	3.97%	se empieza con actividades de desmonte de cubierta existente.	Se adelantan actividades de obra
CIMENTACIÓN	0.00%	0.00%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0.07%	0.00%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0.00%	0.00%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0.00%	0.00%	Se realiza revisión de aparatos eléctricos para cambio	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0.00%	0.00%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.00%	0.00%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0.16%	0.00%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras	
CARPINTERÍA METÁLICA	0.00%	0.00%	Verificación de estructura de aluminio en cubierta	
CARPINTERÍA MADERA	0.00%	0.00%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0.06%	0.00%	Verificación de lavamanos en baño	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0.00%	0.00%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0.09%	0.00%	Verificación de áreas y cantidades de estuco impermeabilizado adicionalmnete pintura para resanes y pintura para zonas interiores.	
CIELOS RASOS	0.00%	0.00%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0.00%	0.00%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0.00%	0.00%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0.00%	0.00%	Verificación de áreas y cantidades de zona de tanques	
EQUIPOS	0.00%	0.00%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0.00%	0.00%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0.00%	0.00%	verificacion de áreas a intervenir.	
TOTAL	0.64%	3.97%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	0.00%
Durante el periodo	3.97%	0.64%	3.34%
Acumulado Actual	3.97%	0.64%	3.34%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0.64%	0.64%
Valor de la Obra Programada	$ 625,279.30	$ 625,279.30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3.97%	3.97%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 3,907,728.39	$ 3,907,728.39

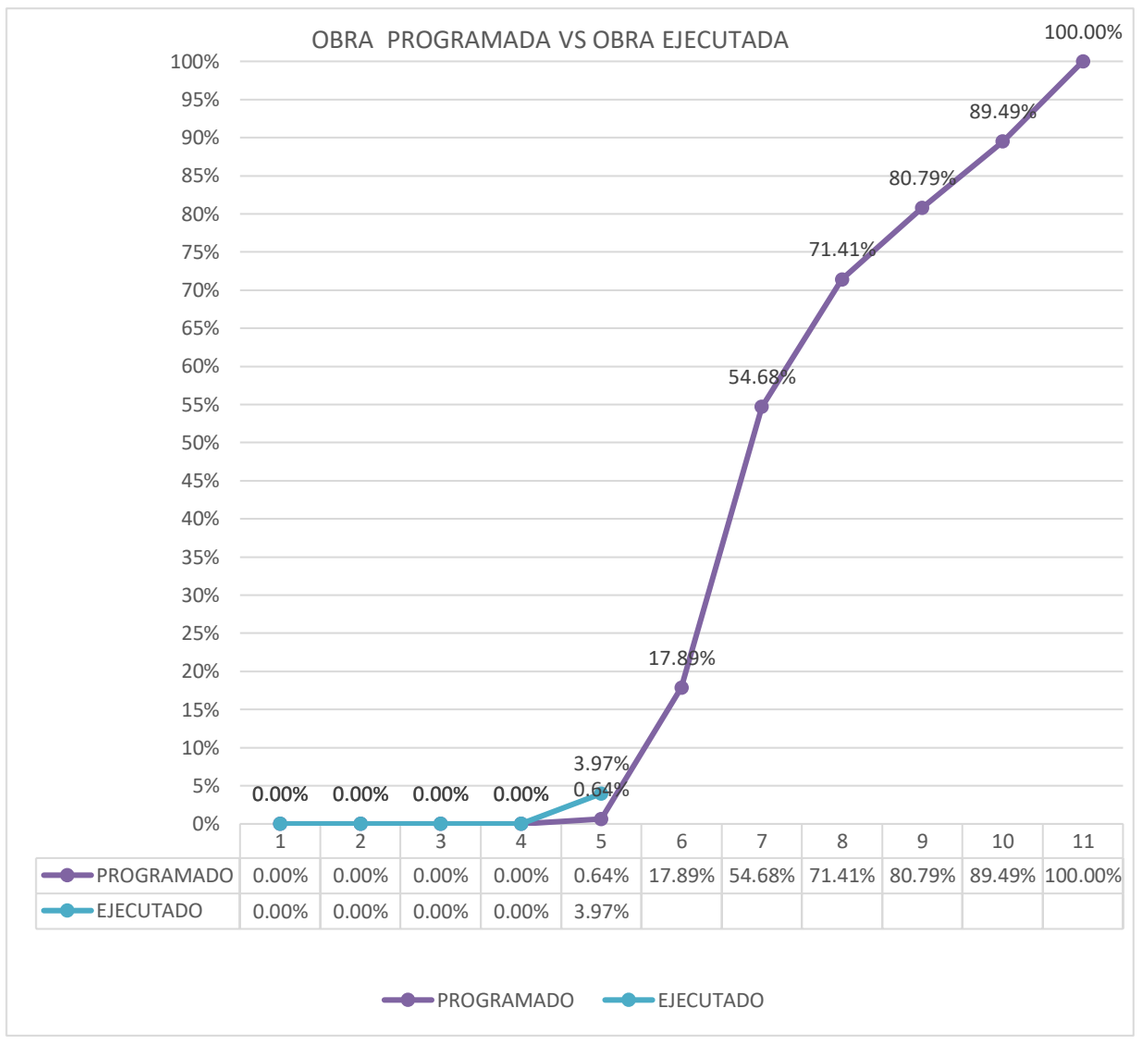34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja plástica en corredor salones.
Desmonte y retiro de aparatos electricos y luminarias por parte de la entidad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra
Se realiza el retiro de cubierta existente en teja plástica de corredor del comedor.
Se realiza el retiro de cubierta existente en teja plástica de patio en bodega.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	11 / 1 / 25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de cubierta existente en teja plástica de comedor



FECHA FOTO: 11/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de cubierta existente en teja plástica de comedor



FECHA FOTO: 11/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de cubierta existente en teja plástica de comedor



FECHA FOTO: 11/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de cubierta existente en teja plástica de zona de patio bodega



FECHA FOTO: 11/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de cubierta existente en teja plástica de zona de patio bodega



FECHA FOTO: 11/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de cubierta existente en teja plástica de zona de patio bodega

1. FECHA ELABORACIÓN:	16/12/24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19/11/24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11/12/24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/24	11. PLAZO:	3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26/11/24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11/12/24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/24	22. PLAZO:	23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede , verificación de áreas y cantidades de demoliciones y desmontes.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	verificación de áreas y cantidades para carcamo en cocina.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	verificación de áreas y cantidades para resanes en muros y techos.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	verificación de sifones para cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	verificación de áreas y cantidades para actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	verificación de pisos en cubierta terraza para intervención.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	verificación de áreas y cantidades carpinteria metálica.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	verificación de zonas y cantidades tapas de registro y rejillas para sifones.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	verificación de zona y cantidades de lavaplatos para cocina.	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pinturas exteriores e interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para cubierta en punto fijo y cubierta transitable.	
EQUIPOS	0%	0%		
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%		
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

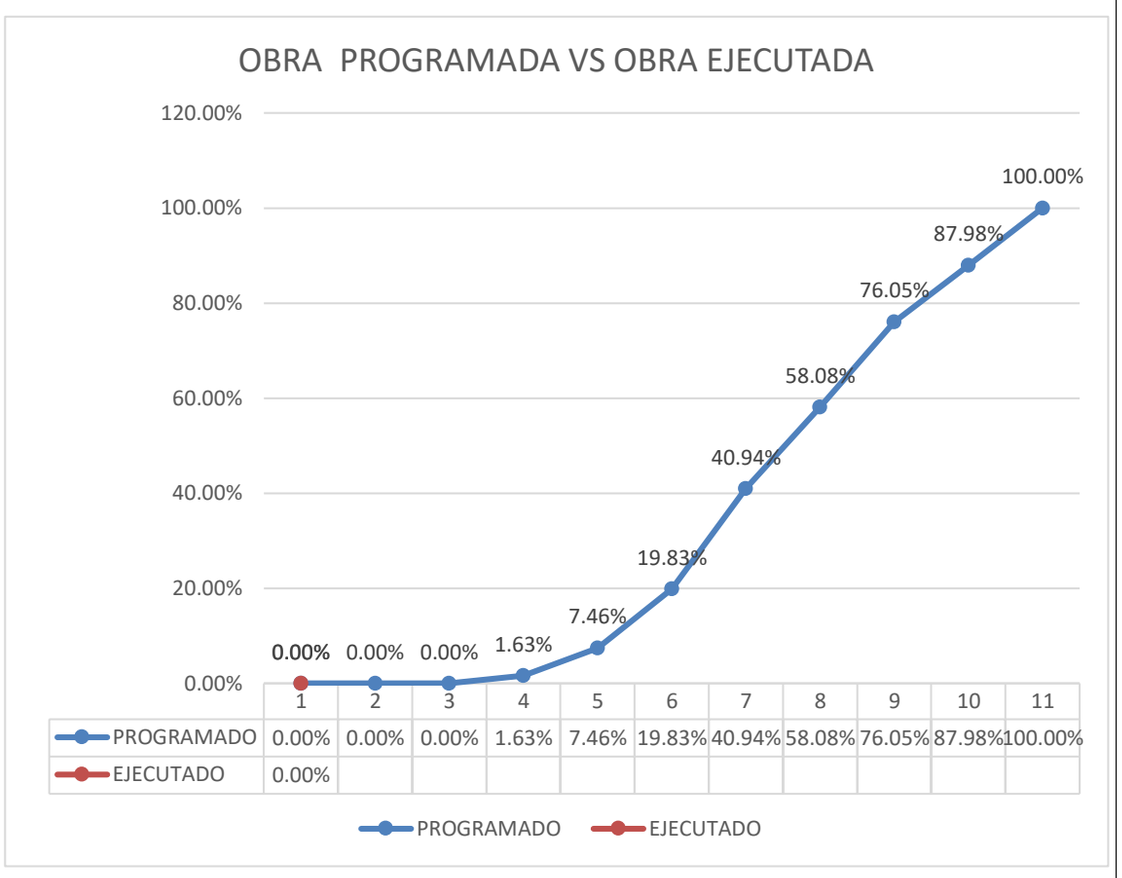34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTORA DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio.
Demolición de piso en baldosa terraza.
Retiro de material de demolición en terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual zona de terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de fachada prinicipal



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado inicial de matera para huerta en terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de áreas piso en terraza



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de techo corredores



FECHA FOTO: 26/11/24
DESCRIPCIÓN: Estado actual de puerta ventana ingreso terraza

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de demoliciones y desmontes en general en la sede.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para carcamo en cocina.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para resanes en muros y techos.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones para cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de pisos en cubierta terraza para intervención.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades carpinteria metálica.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de zonas y cantidades tapas de registro y rejillas para sifones.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de zona y cantidades de lavaplatos para cocina.	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pinturas exteriores e interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para cubierta en punto fijo y cubierta transitable.	
EQUIPOS	0%	0%		
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%		
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

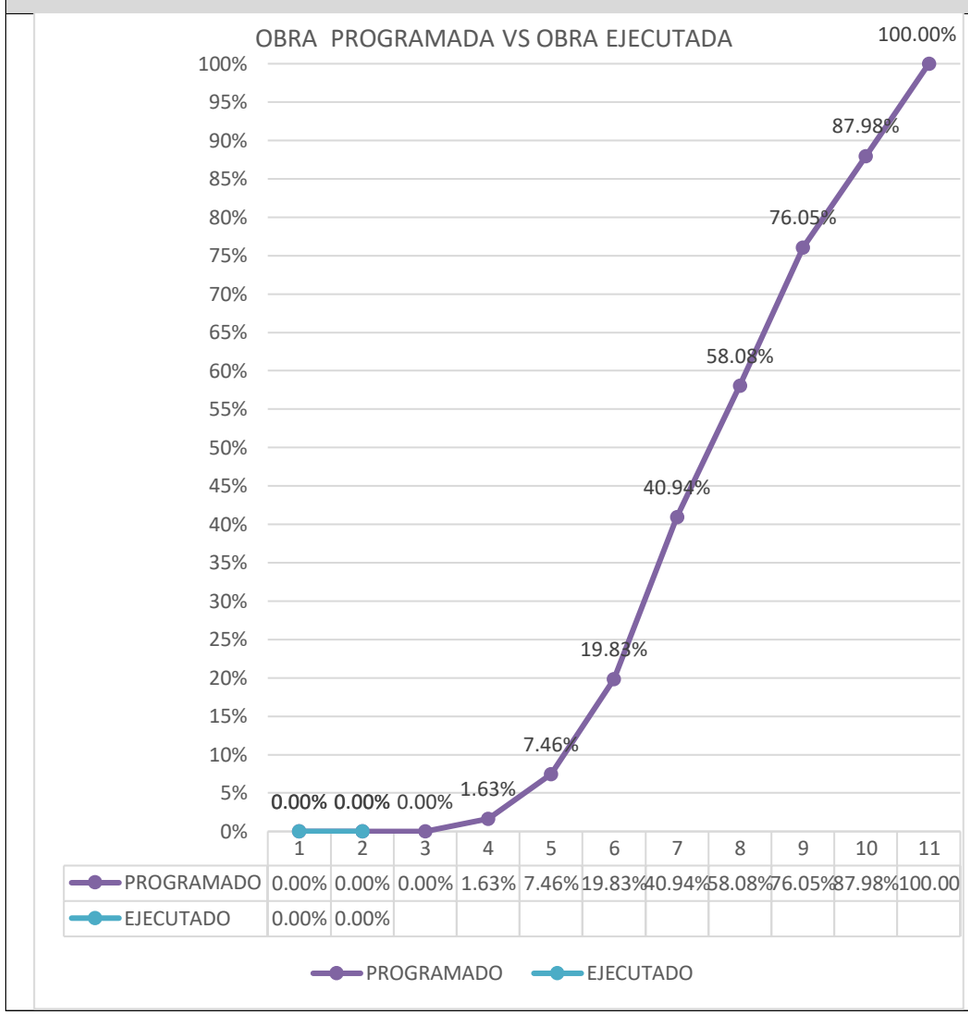34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Demolición de piso en baldosa terraza
Desmonte y retiro de aparatos electricos y luminarias por parte de la entidad
Retiro de material de demolición en terraza

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se raealiza inventario, inspección y revisión de la red eléctrica existente y aparatos de luminarias que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en terraza de cubierta.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	No. INFORME	2	SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

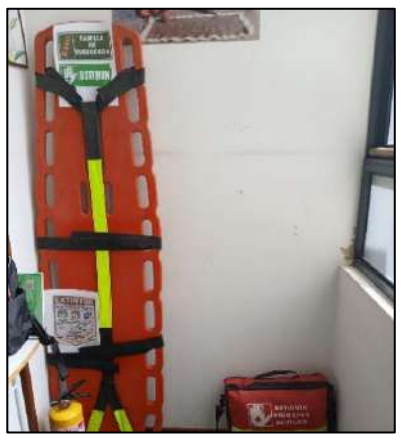
F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalación de señalización en zona de de terraza.



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalación de punto ecológico



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza suministro de camilla



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza suministro de extintor



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza suministro de botiquín primeros auxilios



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza instalación de señalización en zona de de terraza.

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de demoliciones y desmontes en general en la sede.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para carcamo en cocina.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para resanes en muros y techos.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones para cubierta.	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de pisos en cubierta terraza para intervención.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades carpinteria metálica.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de zonas y cantidades tapas de registro y rejillas para sifones.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de zona y cantidades de lavaplatos para cocina.	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pinturas exteriores e interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para cubierta en punto fijo y cubierta transitable.	
EQUIPOS	0%	0%		
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%		
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

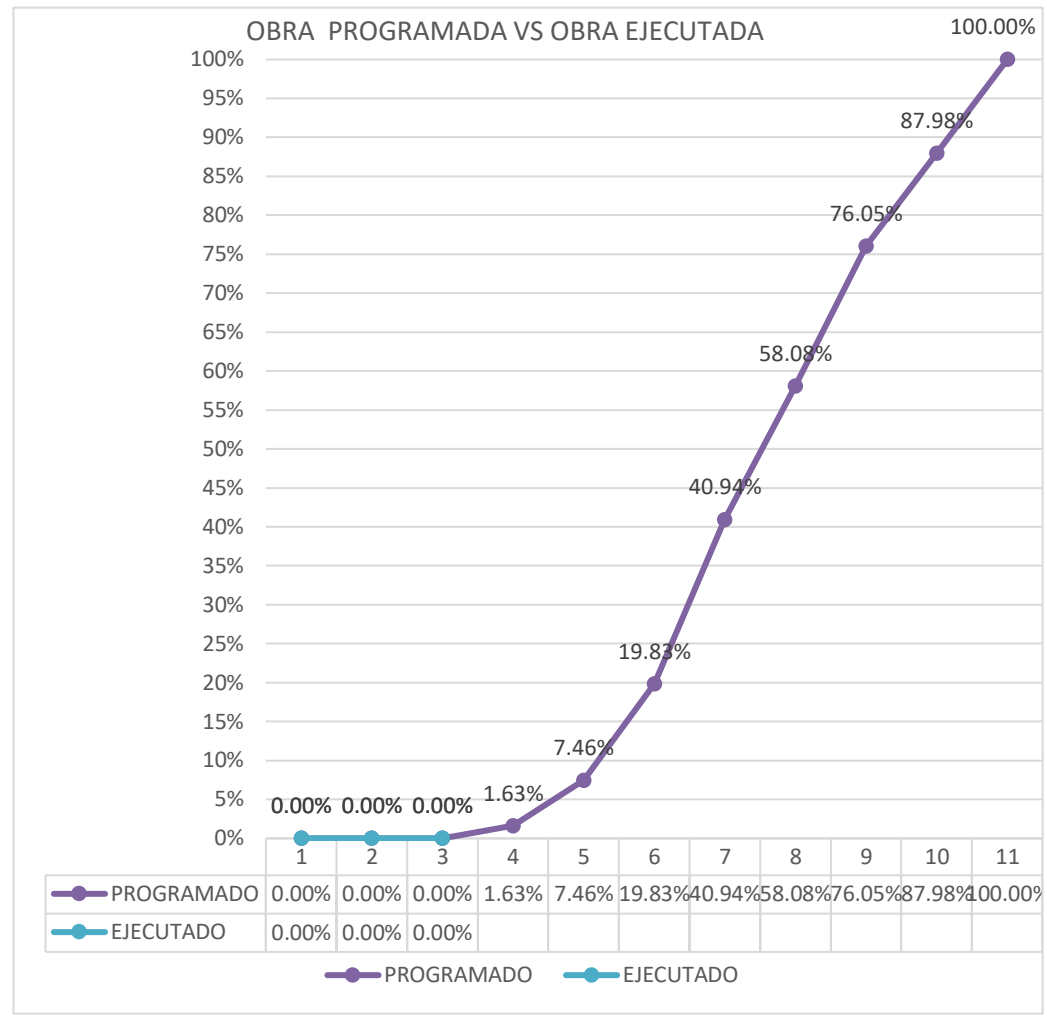34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Demolición de piso en baldosa terraza
Desmonte y retiro de aparatos electricos y luminarias por parte de la entidad
Retiro de material de demolición en terraza

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se realiza capacitación de personal que ingreso para el inicio de la ejecución de actividades de obra.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en terraza de cubierta.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 23/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza capacitación de ingreso de personal para ejecución de actividades de obra



FECHA FOTO: 23/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza capacitación de ingreso de personal para ejecución de actividades de obra



FECHA FOTO: 23/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de elementos de protección personal a trabajadores



FECHA FOTO: 23/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de elementos de protección personal a trabajadores



FECHA FOTO: 23/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza capacitación de ingreso de personal para ejecución de actividades de obra



FECHA FOTO: 23/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se realiza entrega de elementos de protección personal a trabajadores

1. FECHA ELABORACIÓN:	7/1/25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19/11/24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11/12/24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23/2/25	11. PLAZO:	3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26/11/24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11/12/24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23/2/25	22. PLAZO:	23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	1.63%	0.24%	Verificación de áreas y cantidades de demoliciones y desmontes en general en la sede. Se realiza el desmonte de salidas electricas con aparatos y accesorios de luminarias tipo tortuga y tomacorrientes de materas en terraza.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para carcamo en cocina.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para resanes en muros y techos.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones para cubierta.	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	Verificación de pisos en cubierta terraza para intervención.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades carpinteria metálica.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de zonas y cantidades tapas de registro y rejillas para sifones.	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de zona y cantidades de lavaplatos para cocina.	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pinturas exteriores e interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para cubierta en punto fijo y cubierta transitable.	
EQUIPOS	0%	0%		
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%		
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	1.63%	0.24%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	0.00%
Durante el periodo	0.24%	1.63%	-1.39%
Acumulado Actual	0.24%	1.63%	-1.39%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1.63%	1.63%
Valor de la Obra Programada	1,449,618.66	$ 1,449,618.66

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0.24%	0.24%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 214,092.00	$ 214,092.00

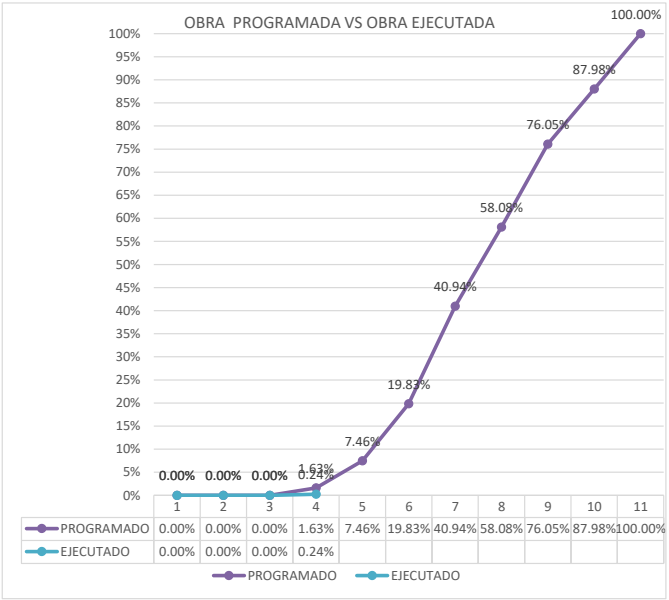34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Demolición de piso en baldosa terraza
Retiro de material de demolición en terraza

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de cronogramas de las actividades a intervir por sede.
Se raealiza retiro de aparatos de luminarias eléctricas que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos por parte del personal de la entidad
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en terraza de cubierta
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra
Desmonte de luminaria tortuga y retiro de cableado existente ubicado en materas de terraza cubierta para posterior demolición
En este centro casa sabiduria luz esperanza nos han solcitado varias veces cambios en el presupuesto, donde fue necesario no dar inicio a la actividad de demoliciones en terraza de cubierta transitable; debido a que no se ha tenido un alcance final de las actividades a ejecutar.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/12/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de aparatos electricos en mal estado por parte de la entidad SDIS



FECHA FOTO: 03/12/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de aparatos electricos en mal estado por parte de la entidad SDIS



FECHA FOTO: 03/12/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de aparatos electricos en mal estado por parte de la entidad SDIS



FECHA FOTO: 03/12/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de luminarias tortuga ubicadas en materas de terraza en cubierta para demolición



FECHA FOTO: 03/12/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza desmonte de luminarias tortuga ubicadas en materas de terraza en cubierta para demolición



FECHA FOTO: 03/12/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza retiro de cableado de cicruito eléctrico de luminarias tortuga ubicadas en materas de terraza en cubierta.

1. FECHA ELABORACIÓN:	11	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	5.69%	0.54%	Verificación de áreas y cantidades de demoliciones y desmontes en general en la sede. Se realiza demolición en materas de cubierta terraza y retiro de manto existente. Se suspende las actividades de demolición de pisos y acabado de baldosa existente.	Se adelantan algunas actividades en obra, otras estan suspendidas hasta definición de preliminares de aprobación de presupuesto para intervención.
CIMENTACIÓN	0.00%	0%	Verificación de áreas y cantidades para carcamo en cocina.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para resanes en muros.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	1.77%	0.88%	Se realiza suministro e instalación de panel led circular de 24 w de sobreponer y luminarias de emergencia.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de pisos en cubierta terraza para intervención.	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades carpinteria metálica, proceso de fabricación para shut de basura	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de zona y cantidades de lavaplatos para cocineta.	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de pinturas interiores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades para cubierta en punto fijo y cubierta transitable.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	7.46%	1.41%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0.24%	1.63%	-1%
Durante el periodo	1.17%	5.84%	-5%
Acumulado Actual	1.41%	7.46%	-6.05%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5.84%	7.46%
Valor de la Obra Programada	$ 5,205,690.64	$ 6,655,309.30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1.17%	1.41%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1,047,235.51	$ 1,261,327.51

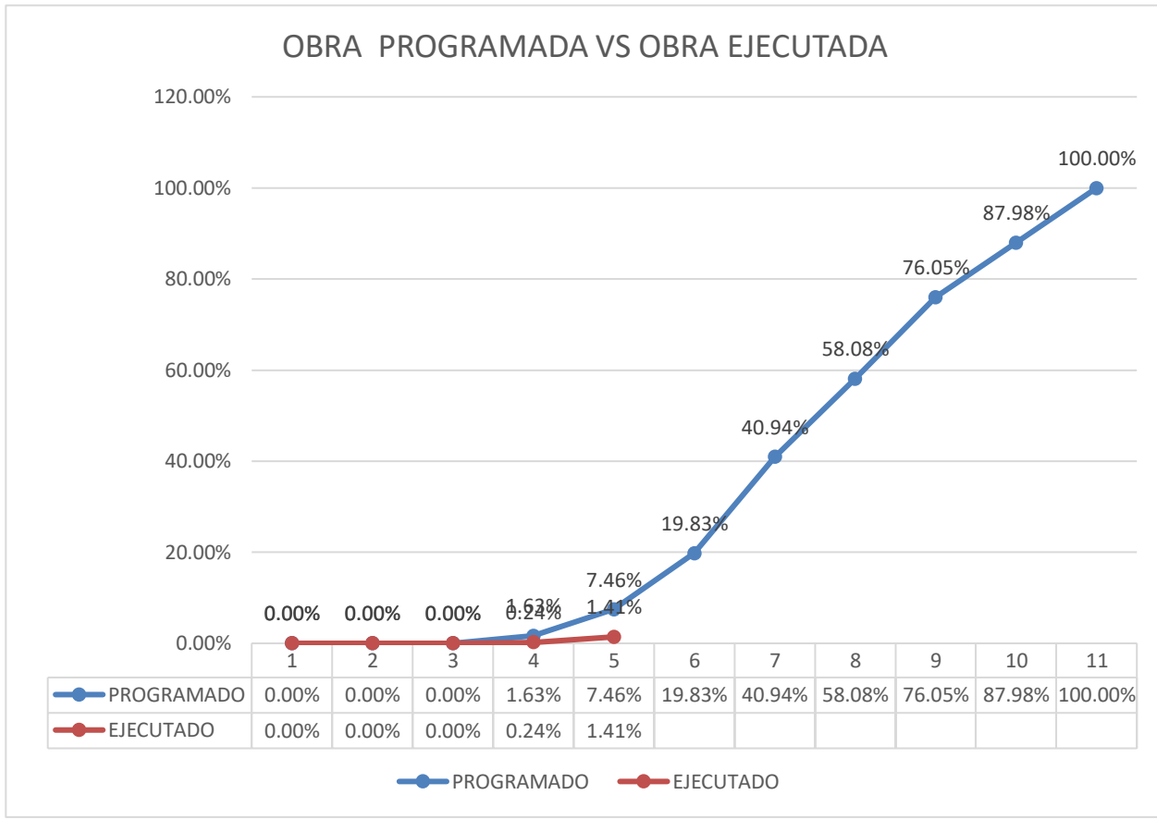34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTORA DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Demolición de piso en baldosa terraza e inicio de actividades para cubierta transitable..
Retiro de material de demolición en terraza.
Actividades de demoliciones y desmontes.
Actividades para cocina y cocineta.
Actividades de carpintería metálica.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en terraza de cubierta.
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.
En este centro casa sabiduria luz esperanza nos han solcitado varias veces cambios en el presupuesto, donde fue necesario no dar inicio a la actividad de demoliciones en terraza de cubierta transitable; debido a que no se ha tenido un alcance final de las actividades a ejecutar. Debido a estas solictudes y mientras el proceso de revisión y aprobación algunas actividades se suspenden trabajos mientras se definen los alcances lo cual va genererar un retraso de obra.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	11 / 1 / 25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FECHA FOTO: 06/01/2025 DESCRIPCIÓN: Se realiza demolición de muro externo huertas en zona de terraza y acopio de material proveniente de la excavación	FECHA FOTO: 06/01/2025 DESCRIPCIÓN: Se realiza demolición y retiro de manto impermeabilizado existente en huerta costado sur y huerta costado norte
	
FECHA FOTO: 06/01/2025 DESCRIPCIÓN: Se realiza demolición y desmonte de viga de amarre en muro exterior de huertas	FECHA FOTO: 06/01/2025 DESCRIPCIÓN: Se realiza demolición de muro externo huertas en zona de terraza
	
FECHA FOTO: 10/01/2025 DESCRIPCIÓN: Se realiza Instalación de luminarias panel circular led de 24W de sobreponer en los tres pisos en zonas puntuales donde se requirió cambio.	FECHA FOTO: 10/01/2025 DESCRIPCIÓN: Se realiza Instalación de luminarias de emergencia en los tres pisos en zonas puntuales donde se requirió cambio.

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 74 Días Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 74 Días Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Actividades de recorrido para reconocimiento de la sede, áreas a intervenir, demoliciones y desmontes.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Se identifica la necesidad de realizar una viga perimetral en concreto con refuerzo y/o remates en mamposteria para encorazado de la nueva instalación de cubierta.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Se identifica la intervención de remate en ladrillo para cubierta y resanes en muros de teatro y vestier.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Recorrido de inicio para verificación de actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Revisión de ventanas y puertas que presentan oxidación.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir de pinturas y/o esmalte en interiores o exteriores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de cubierta en asbesto para intervención.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

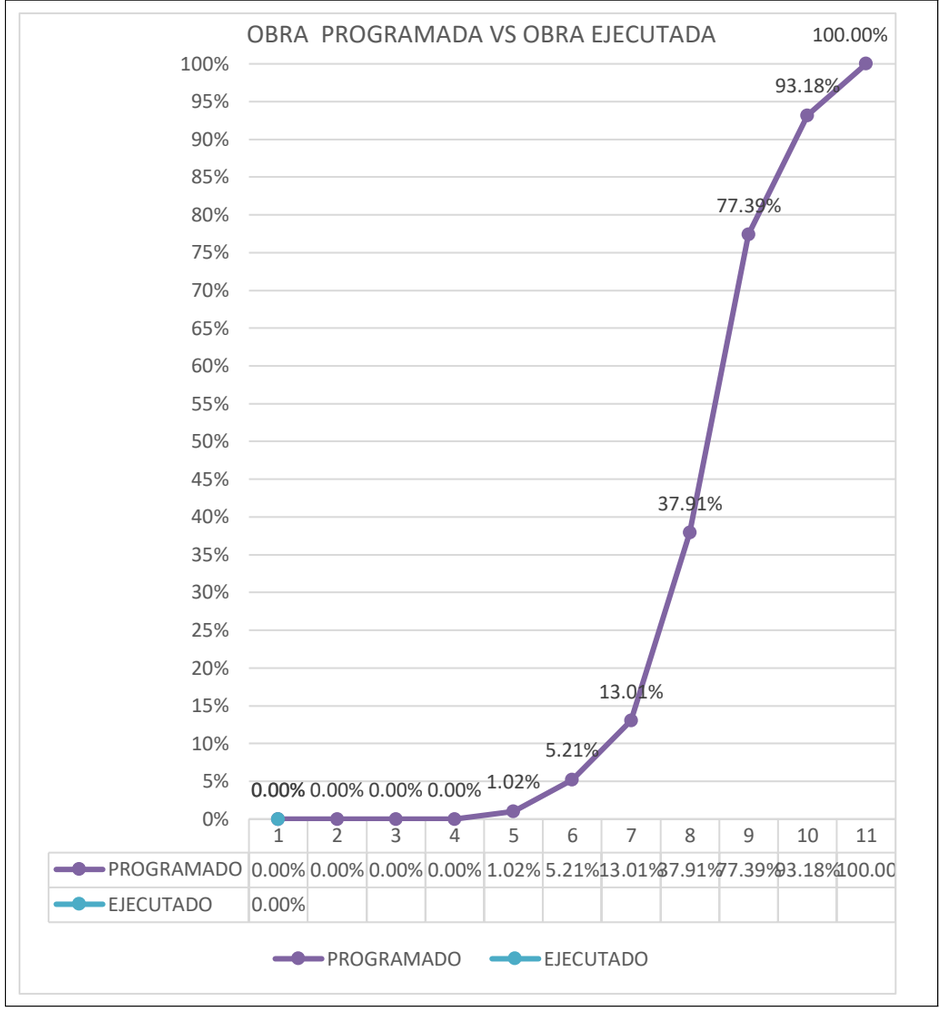34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1		1	LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Desmonte de cubierta existente en asbesto cemento en salón de teatro
Retiro y disposición de material de teja en asbesto cemento de cubierta salones de teatro

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se requiere dar viabilidad técinica para ordenes de servicio

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	11/12/24 al 15/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de cubierta en asbesto cemento



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de fachada prinicipal



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado inicial fachada exterior de salon de teatro



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual ventanas con angeo en salón de teatro



FECHA FOTO: 26/11/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de canal aguas lluvias segundo piso



FECHA FOTO: 26/11/24
DESCRIPCIÓN: Estado actual salón artes plásticas

1. FECHA ELABORACIÓN:	7 | 1 | 25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 | 11 | 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 | 12 | 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 | 2 | 25	11. PLAZO:	3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 | 11 | 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 | 12 | 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 | 2 | 25	22. PLAZO:	74 Días Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de cantidades, zonas a intervenir, demoliciones y desmontes.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de cantidades de viga perimetral en concreto con refuerzo y/o remates en mamposteria para encorazado de la nueva instalación de cubierta.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de cantidades para remate en ladrillo para cubierta y resanes en muros de teatro y vestier.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades en actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de cantidades en ventanas y puertas que presentan oxidación, donde se dedice realizar pintar con esmalte que se encuentra en capitulo de pinturas.	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de cantidades en áreas a intervenir de pinturas y/o esmalte en interiores o exteriores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades y zonas de cubierta en asbesto para intervención, siendo el teatro y vestier.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

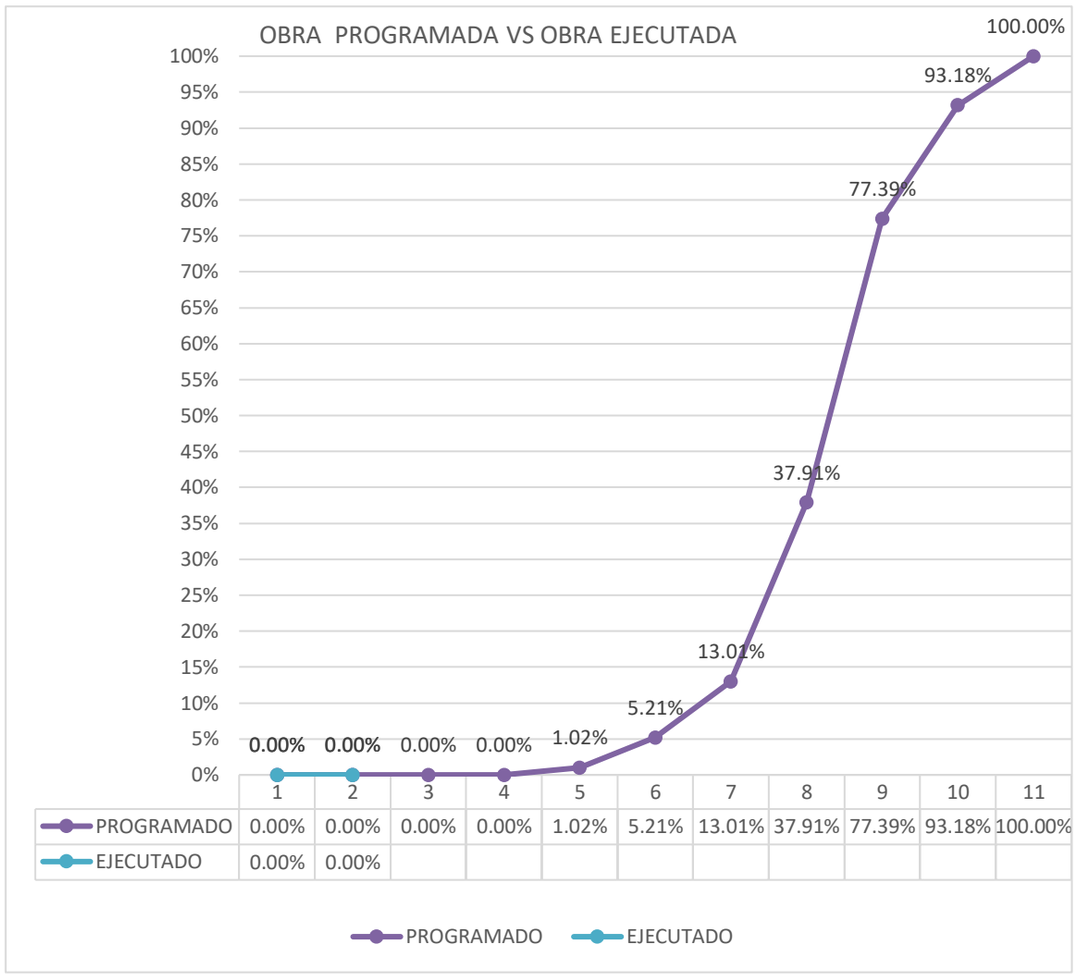34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja en asbesto cemento en salón teatro y salón vestier
Retiro y disposición de material de teja en asbesto cemento de cubierta salón teatro y salón vestier

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se raealiza inventario, inspección y revisión de la red eléctrica existente y aparatos de luminarias que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en comedor para retiro de cubiertas
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 1 25	No. INFORME	2	SEMANA No.	16/12/24 al 22/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión eléctrica para salidas tomacorrientes



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión eléctrica para instalación luminarias



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión eléctrica para instalación de luminarias



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión de ventanas y rejas metálicas que presentan corrosión



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión de ventanas y rejas metálicas que presentan corrosión



FECHA FOTO: 27/12/2024
DESCRIPCIÓN:Revisión de red eléctrica para instalación de luminarias

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 74 días Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de cantidades, zonas a intervenir, demoliciones y desmontes.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de cantidades de viga perimetral en concreto con refuerzo y/o remates en mamposteria para encorazado de la nueva instalación de cubierta.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de cantidades para remate en ladrillo para cubierta y resanes en muros de teatro y vestier.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades en actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de cantidades en áreas a intervenir de pinturas y/o esmalte en interiores o exteriores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades y zonas de cubierta en asbesto para intervención, siendo el teatro y vestier.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja en asbesto cemento en salón teatro y salón vestier
Retiro y disposición de material de teja en asbesto cemento de cubierta salón teatro y salón vestier

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Se raealiza inventario, inspección y revisión de la red eléctrica existente y aparatos de luminarias que presentan fallas o que requieren el cambio de los elementos
Revisión de estado del sitio de trabajo en zona de salon teatro y vestier
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 1 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	23/12/24 al 29/12/24
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

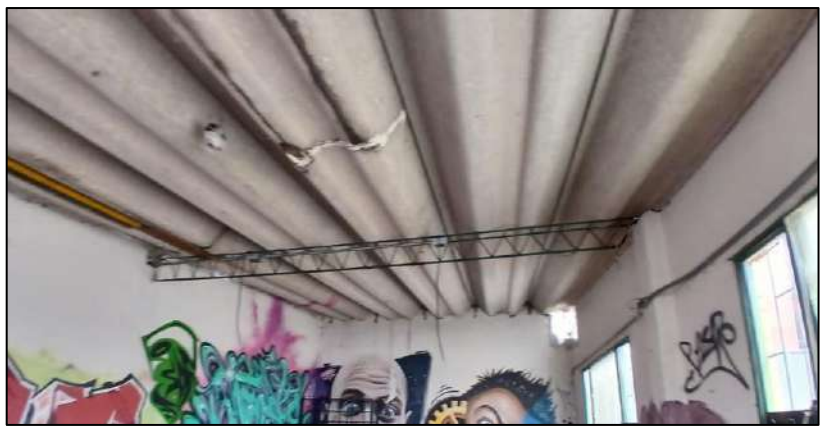F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Estado actual de cubierta en asbesto cemento.



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión en conjunto con equipo tecnico de resanes y pinturas en interiores.



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión en conjunto con proveedor de cubierta de proceso constructivo.



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de estado actual de la estructura en concreto general existente que sostienen la cubierta existente en asbesto cemento.



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de la pintura exterior en el cual se mantiene la misma a la misma existete se indica solo pintar los remates lineales en mamposterial adicional al encorozado de la cubierta.



FECHA FOTO: 24/12/2024
DESCRIPCIÓN: Se indica que las cerchas existentes en teatro y vestier en cubierta se dejaran montadas en el sitio como se encontro inicialmente.

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1,299,753,000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284,642,402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de cantidades, zonas a intervenir, demoliciones y desmontes.	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de cantidades de viga perimetral en concreto con refuerzo y/o remates en mamposteria para encorazado de la nueva instalación de cubierta.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de cantidades para remate en ladrillo para cubierta y resanes en muros de teatro y vestier.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades en actividades eléctricas.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de cantidades en áreas a intervenir de pinturas y/o esmalte en interiores o exteriores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades y zonas de cubierta en asbesto para intervención, siendo el teatro y vestier.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

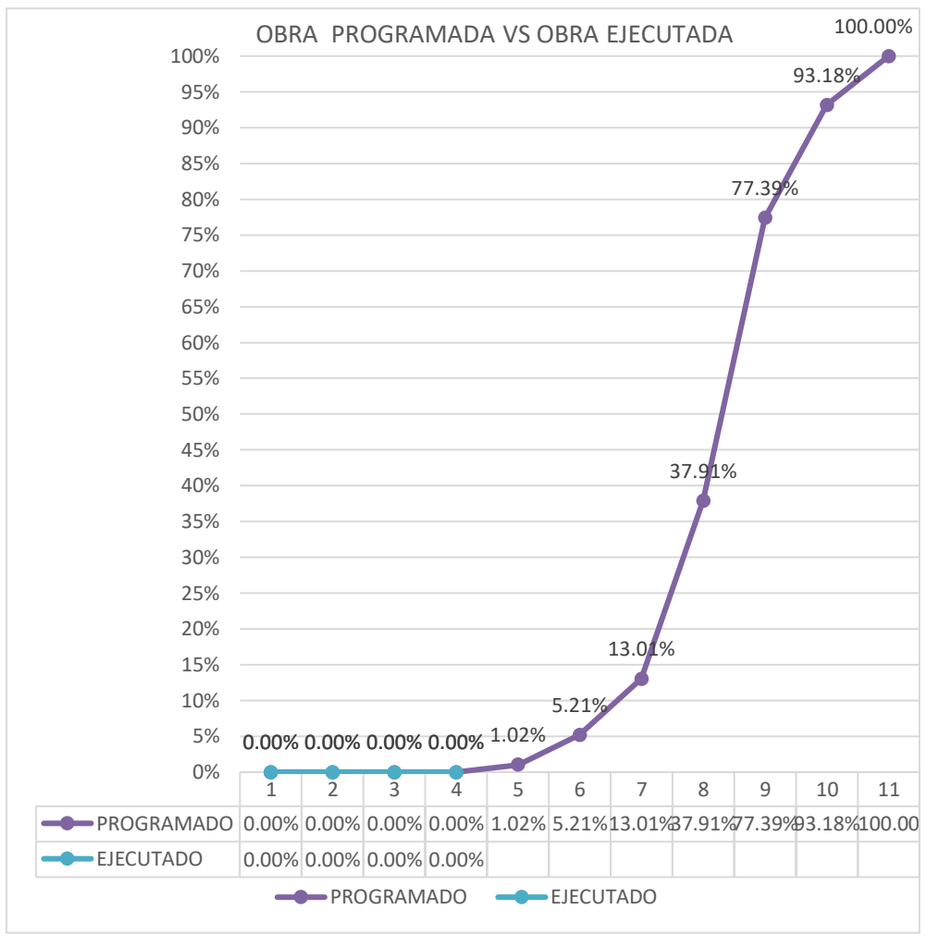34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio
Realizar el desmonte de cubierta existente teja en asbesto cemento en salón teatro y salón vestier
Retiro y disposición de material de teja en asbesto cemento de cubierta salón teatro y salón vestier

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede.
Desmonte de salidas red electrica por parte de la entidad.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en comedor para retiro de cubiertas
Recorrido e inspección por parte del área SST para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

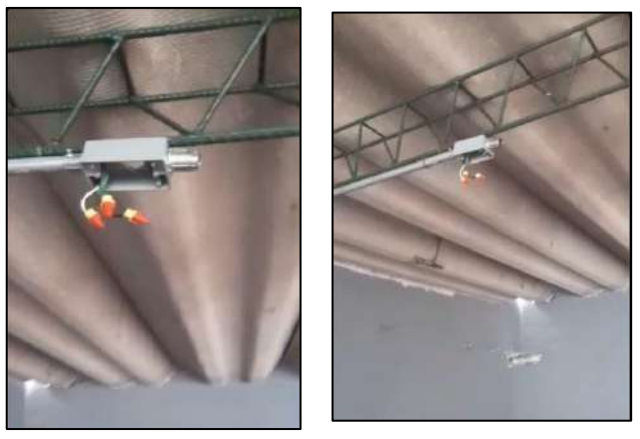F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza actividad de desmonte de aparatos eléctricos y accesorios por la entidad.



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se continua con la verificación de cantidades para cubierta.



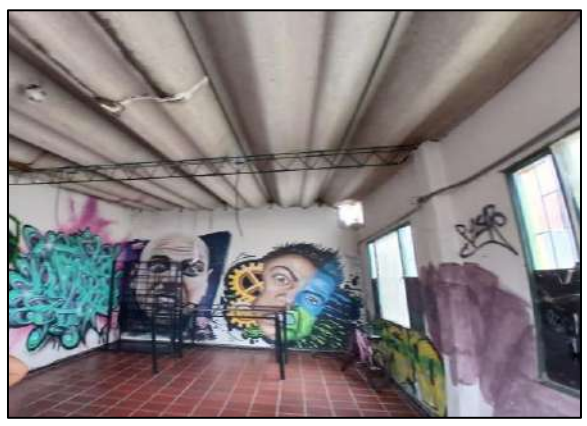
FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza actividad de desmonte de aparatos eléctricos y accesorios por la entidad



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza actividad de desmonte de cableado y salidas eléctricas por la entidad.



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se continua con la verificación de cantidades de pinturas exteriores y/o mantenimientos.



FECHA FOTO: 03/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se continua con verificación de cantidades para áreas interiores en teatro y vestier.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	7	1	25	2. No. INFORME	5			3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1,299,753,000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	3 MESES	Meses/días	
12. PRORROGAS:				13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,642,402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero	Meses/días	
23. PRORROGAS:	1			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	1.02%	1.15%	verificación con proveedores para el proceso constructivo de desmonte de cubierta existentes y manejo de dispocision final en acompañamiento del área tecnica, ambiental y SST, revisón con subcontratista del mantenimientos a ventanas en teatro y vestier.	Se adelantan actividades de obra.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación con subcontratista en acompañamiento del equipo técnico, ambiental y SST de proceso constructivo de viga perimetral en concreto con refuerzo para encorazado de la nueva instalación de cubierta.	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación con subcontratista en acompañamiento del equipo técnico, ambiental y SST de proceso constructiv para remate en ladrillo para cubierta y resanes en muros de teatro y vestier.	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación con prefesional eléctrico en actividades eléctricas, pedidos de materiales y equipos necesarios.	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación con subcontratista en áreas a intervenir de pinturas y/o esmalte en interiores o exteriores.	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación con subcontratista cantidades y zonas de cubierta en asbesto para intervención, manejo de proceso constructivo, siendo el teatro y vestier, en compañía del área técnica, ambiental y SST.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir.	
TOTAL	1.02%	1.15%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	0.00%
Durante el periodo	1.15%	1.02%	0.13%
Acumulado Actual	1.15%	1.02%	0.13%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1.02%	1.02%
Valor de la Obra Programada	$ 997,142.99	$ 997,142.99

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1.15%	1.15%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1,121,785.86	$ 1,121,785.86

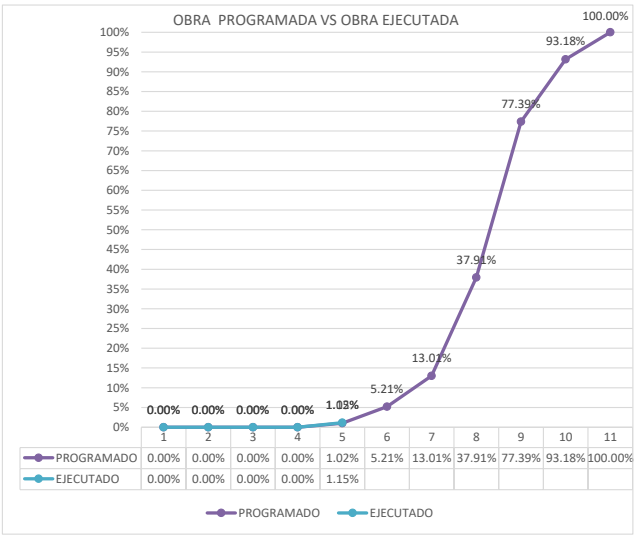34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de obra en la sede, adecuación de espacios de trabajo, instalación de cerramientos y/o señalización requerida en el sitio.
Realizar el desmonte de cubierta existente teja en asbesto cemento en salón teatro y salón vestier.
Retiro y disposición de material de teja en asbesto cemento de cubierta salón teatro y salón vestier.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana se realizó recorrido de inicio al frente de obra, revisión de intervenciones técnicas.
Se realizaron mesas de trabajo y revisión de presupuestos. Revisión de alcances de las intervenciones a realizar por sede donde se dio aprobación a la actividades.
Desmonte de salidas red electrica por parte de la entidad.
Revisión de estado del sitio de trabajo para adecuación de los espacios en comedor para retiro de cubiertas.
Recorrido e inspección por parte del área SST y ambiental para verificación de las condiciones de trabajo en alturas y demas actividades de obra.
Recorridos con subcontratista de cubierta, subcontratista de obra civil, profesional eléctrico, área técnica, área ambiental y parea de SST.

Nombre: Ing. Jessika Paola Merchan Adame
CONTRATISTA DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza visita con proveedor de cubierta toma de medidas de material y revision de proceso constructivo en teatro y vestier.



FECHA FOTO: 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza visita con proveedor de cubierta toma de medidas de material y revision de proceso constructivo en teatro y vestier.



FECHA FOTO: 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza visita con proveedor de cubierta toma de medidas de material y revision de proceso constructivo en teatro y



FECHA FOTO: 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza visita con proveedor de cubierta toma de medidas de material y revision de proceso constructivo en teatro y vestier.





FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza revisión acometida existente y se verifica pedidos de material y equipos para actividades electricas.



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se tiene enobra disponible material eléctrico para teatro y vestier.

FONTIBÓN

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	2025	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Centro Crecer Fontibón			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Calle 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	NO APLICA	
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	96%	100%	Se realiza resane de fisuras en muros y techos.	Se completa actividad
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	31%	Se instalan paneles 120x30, luminarias de emergencia	Se adealnta actividad
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	100%	Se realiza aplicación de vinilo en muros y techo del área del comedor	Se completa actividad
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	NO APLICA	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%		
TOTAL	16%	42%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	20%	5%	15%
Durante el periodo	22%	11%	11%
Acumulado Actual	42%	16%	26%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11%	16%
Valor de la Obra Programada	$ 2.406.463	$ 3.500.309,70

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	22%	42%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.812.926	$ 9.188.312,96

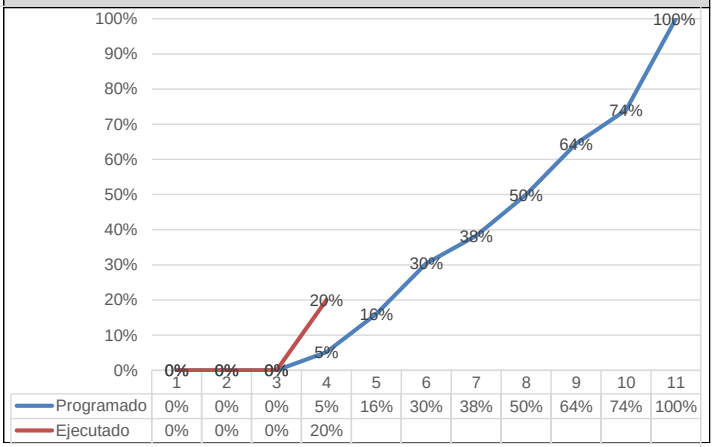34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	2			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación panel 120x30
Instalación luminarias hermeticas
Instalación panel redondo

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	12 / 1 / 2025	No. INFORME	5	SEMANA No.	5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 07 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilica



FECHA FOTO: 07 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilica



FECHA FOTO: 09 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura epóxica a H=1,5m



FECHA FOTO: 09 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura epóxica a H=1,5m



FECHA FOTO: 10 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación luminarias de emergencia.



FECHA FOTO: 10 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación luminarias de emergencia.

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Centro Crecer Fontibón			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Calle 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	NO APLICA	
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	31%	100%	Se realiza resane de fisuras en muros y techos.	Se realiza avance significativo en esta actividad
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	3%	Llega a sitio luminarias, se realiza instalación de rerflectores en el patio.	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	22%	Se realiza aplicación de vinilo en muros y techo del área del comedor	Se realiza avance significativo en esta actividad
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	NO APLICA	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%		
TOTAL	5%	20%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	20%	5%	15%
Acumulado Actual	20%	5%	15%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5%	5%
Valor de la Obra Programada	$ 1.093.847	$ 1.093.846,78

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	20%	20%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.380.601	$ 4.380.601,43

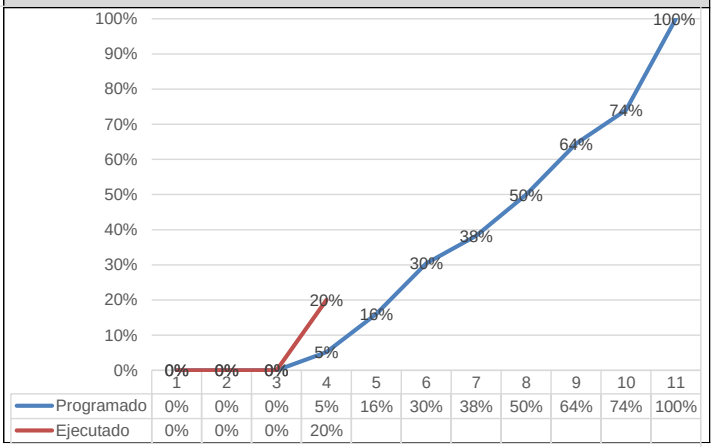34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	5%	16%	30%	38%	50%	64%	74%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%	20%							

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	2			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de luminarias led de emergencia.
Aplicación de pintura vinilo en muros y techo del comedor.
Aplicación de pintura epóxica en muros del comedor.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 / 1 / 2025	No. INFORME	4	SEMANA No.	4
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de esquinero para resane de áreas.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de accesorios y preparación para resane de techo.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muros.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Resane de techo.





FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de primera mano de vinilo.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de reflectores en patio.

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Centro Crecer Fontibón			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Calle 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	NO APLICA	
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	31%	100%	Se realiza resane de fisuras en muros y techos.	Se realiza avance significativo en esta actividad
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	3%	Llega a sitio luminarias, se realiza instalación de rerflectores en el patio.	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	22%	Se realiza aplicación de vinilo en muros y techo del área del comedor	Se realiza avance significativo en esta actividad
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	NO APLICA	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%		
TOTAL	5%	20%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	20%	5%	15%
Acumulado Actual	20%	5%	15%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5%	5%
Valor de la Obra Programada	$ 1.093.847	$ 1.093.846,78

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	20%	20%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.380.601	$ 4.380.601,43

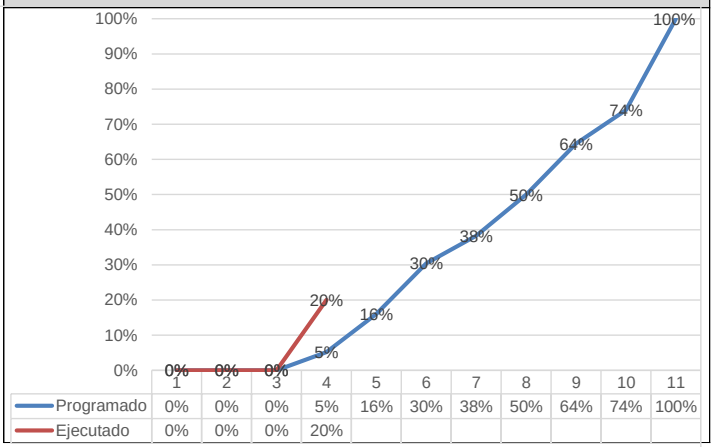34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	5%	16%	30%	38%	50%	64%	74%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%	20%							

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	2			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de luminarias led de emergencia.
Aplicación de pintura vinilo en muros y techo del comedor.
Aplicación de pintura epóxica en muros del comedor.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 / 1 / 2025	No. INFORME	4	SEMANA No.	4
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de esquinero para resane de áreas.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de accesorios y preparación para resane de techo.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muros.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Resane de techo.





FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de primera mano de vinilo.



FECHA FOTO: 02 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de reflectores en patio.

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	2024	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Centro Crecer Fontibón			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Calle 22F #106-26		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025
11. PLAZO:	74	Meses/días					
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025
22. PLAZO:	74	Meses/días					
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnósticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de muros y techo área cocina	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Revisión y verificación de sistema de iluminación	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	rificación de muros y techo área cocina, toma de medid	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	NO APLICA	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

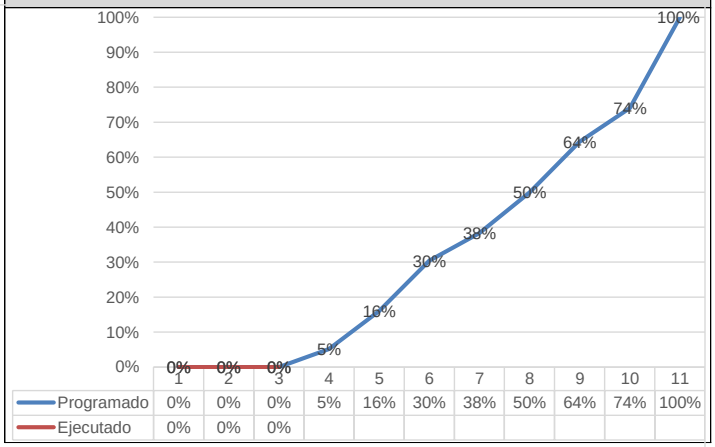34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	5%	16%	30%	38%	50%	64%	74%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%								

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de luminarias.
Preparación de superficies a resanar y pintar.
Resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29 / 12 / 2024	No. INFORME	3	SEMANA No.	3

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 28 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir - comedor



FECHA FOTO: 28 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir - comedor



FECHA FOTO: 28 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir - comedor



FECHA FOTO: 28 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir - comedor



FECHA FOTO: 28 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir - comedor



FECHA FOTO: 28 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir - comedor

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	2024	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Centro Crecer Fontibón			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Calle 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO: 23/02/2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO: Hasta el 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de muros y techo área cocina	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Revición y verificación de sistema de iluminación	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	rificación de muros y techo área cocina, toma de medid	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	NO APLICA	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

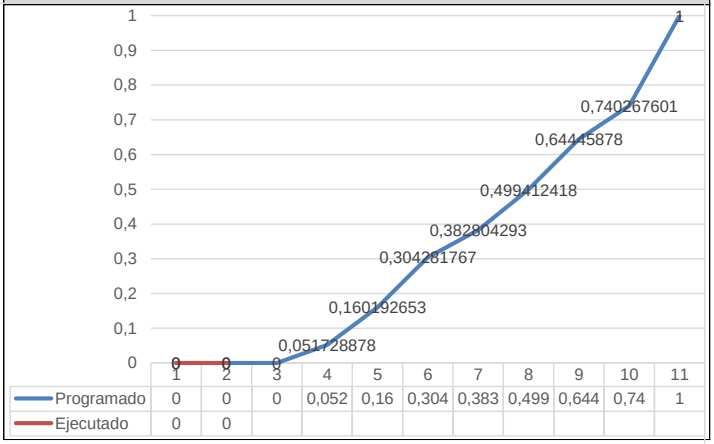34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Inducción y capacitación al personal de obra.
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	22 12 2024	No. INFORME	2	SEMANA No.	2
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de espacios para actas de vecindad.



FECHA FOTO: 13 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de espacios para actas de vecindad.



FECHA FOTO: 13 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de espacios para actas de vecindad.



FECHA FOTO: 13 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de espacios para actas de vecindad.



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Reconocimiento e identificación de espacios



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Reconocimiento e identificación de espacios

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	2024	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Centro Crecer Fontibón			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Calle 22F #106-26		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024
11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días					
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024
22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días					
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de muros y techo área cocina	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Revición y verificación de sistema de iluminación	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	rificación de muros y techo área cocina, toma de medid	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	NO APLICA	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

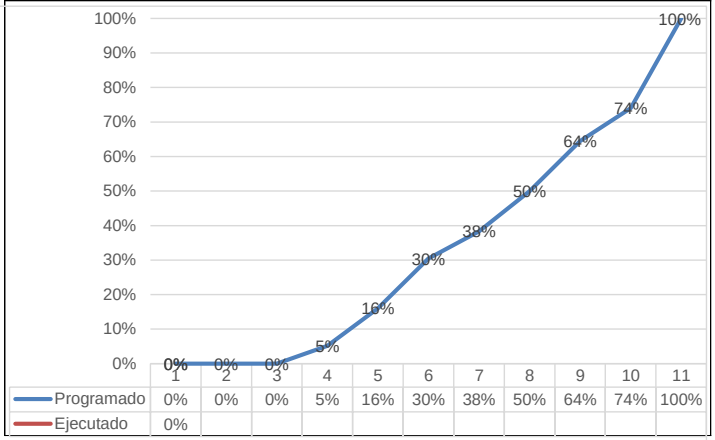34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	5%	16%	30%	38%	50%	64%	74%	100%
Ejecutado	0%										

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Levantamiento de actas de inicio
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Entrega diagnóstico del frente
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15 12 2024	No. INFORME	1	SEMANA No.	1
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11 de Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Revisión de redes electricas



FECHA FOTO: 11 Diciembre 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de tableros de contactores



FECHA FOTO: 27 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Recorrido con entidad e interventoría



FECHA FOTO: 27 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Recorrido con entidad e interventoría





FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Reconocimiento e identificación de espacios





FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Reconocimiento e identificación de espacios

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	2025	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Oso de Anteojos			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Cra. 100 # 23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	100%	100%	Verificación de cantidades	La actividad se encuentra culminada
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	76%	53%	Se adelantan actividades de resane de muros y preparación de superficies.	Dadas las condiciones climaticas se adelantan actividades al interior
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	19%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Llega luminarias a sitio	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	100%	20%	Verificación de niveles cubierta	Se presentan lluvias que retrasan las actividades preliminares en cubierta
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	50%	Verificación de sifones en cubierta	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	16%	74%	Aplicación de primera mano de pintura en algunas áreas del comedor.	Se adelantan actividades de resane de muros y preparación de superficies.
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	35%	35%	Llega material de impermeabilización a sitio.	Se presentan lluvias que retrasan las actividades de impermeabilización y sello de fisuras
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL	42%	38%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	18%	16%	2%
Durante el periodo	20%	26%	-6%
Acumulado Actual	38%	42%	-4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	26%	42%
Valor de la Obra Programada	$ 24.021.504	$ 38.803.968,71

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	20%	38%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 28.779.629	$ 35.108.352,65

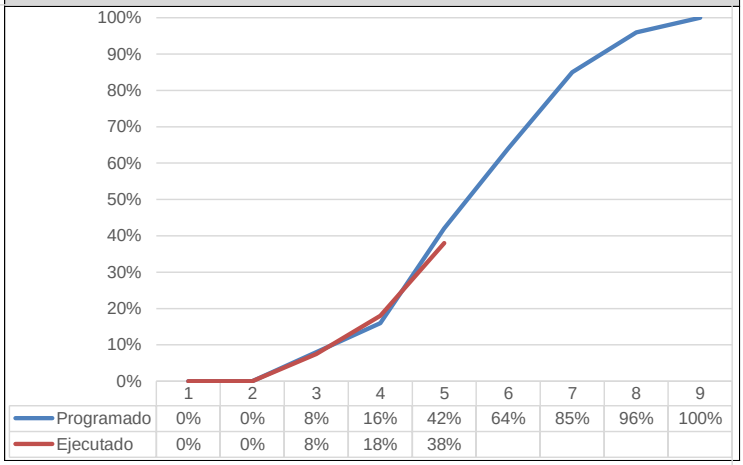34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	2	Hidro lavadora	1	MIÉRCOLES	L
MAESTRO	0	Pulidora	2	JUEVES	L
OFICIAL	2	Soplete	1	VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aplicación de pintura epóxica en área de cocina y despensa
Instalación de luminarias de 24W en comedor, cocina y despensa
Fundida de mortero de piso
Tratamiento de grietas y fisuras en placa con sellante elastomerico monocomponente

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar mantenimiento y tratamiento al área que no se interviene para evitar llenar de sedimentes los desagües y crear estancamiento de agua.

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	12 / 1 / 2025	No. INFORME	5	SEMANA No.	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 07 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento de fisuras y grietas en muros.



FECHA FOTO: 07 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento de fisuras y grietas en muros.



FECHA FOTO: 08 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento de fisuras y grietas en muros.



FECHA FOTO: 08 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento de fisuras y grietas en muros.



FECHA FOTO: 10 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Enlonado de residuo de demolición



FECHA FOTO: 11 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Enlonado de residuo de demolición

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Oso de Anteojos					5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Cra. 100 # 23-22				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO:	74	Meses/días	
12. PRORROGAS:	1			13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO:	74	Meses/días	
23. PRORROGAS:	1			24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	100%	30%	Verificación de cantidades	Se presentan lluvias que retrasan las actividades preliminares en cubierta
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	60%	Se adelantan actividades de resane de muros y preparación de superficies.	Dadas las condiciones climaticas se adelantan actividades al interior
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Llega luminarias a sitio	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de niveles cubierta	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	8%	15%	Aplicación de primera mano de pintura en algunas áreas del comedor.	Se adelantan actividades de resane de muros y preparación de superficies.
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	5%	Llega material de impermeabilización a sitio.	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL	16%	18%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8%	8%	-1%
Durante el periodo	11%	8%	3%
Acumulado Actual	18%	16%	2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8%	16%
Valor de la Obra Programada	$ 7.391.232	$ 14.782.464,27

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	11%	18%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 15.109.305	$ 16.630.272,31

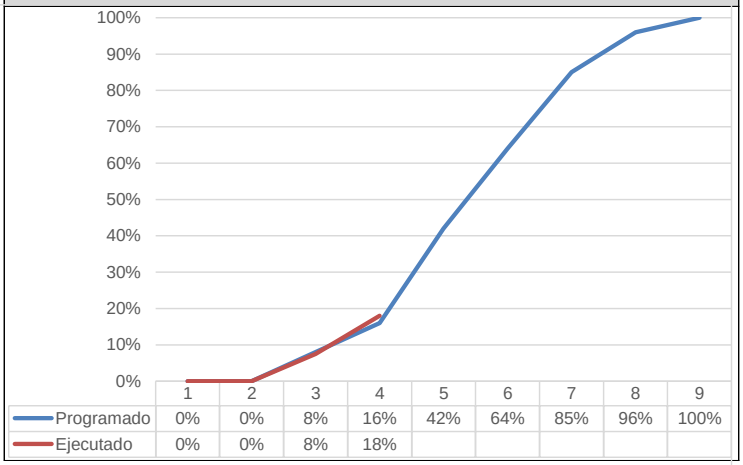34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	2	Hidro lavadora	1	MIÉRCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	2			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Demolición de mortero en cubierta
Resane de fisuras de placa con sellador elastómero mono componente
Instalación de manto asfaltico
Aplicación de pintura vinilo y epóxica en área de comedor

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 / 1 / 2025	No. INFORME	4	SEMANA No.	4
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 02 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento de fisuras y grietas en techo.



FECHA FOTO: 02 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento de fisuras y grietas en muros.



FECHA FOTO: 02 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Resane de grietas y fisuras en muros.



FECHA FOTO: 03 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Resane de grietas y fisuras en techo.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Verificación empozamientos en cubierta.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Verificación empozamientos en cubierta.

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	2024	2. No. INFORME	3		3. SEMANA No.	3			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Oso de Anteojos						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Cra. 100 # 23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO:	74	Meses/días	
12. PRORROGAS:	1			13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO:	74	Meses/días	
23. PRORROGAS:	1			24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	17%	10%	Raspado de emulsión asflatica, verificación de niveles	Se presentan lluvias que retrasan las actividades preliminares en cubierta
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	6%	Identificación de fisuras y tratamiento de las mismas en muros	Se adelantan actividades de resane de muros y preparación de superficies.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	8%	8%	Limpieza de muros y preparación de superficies	Se adelantan actividades de resane de muros y preparación de superficies.
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	NO APLICA	
TOTAL	8%	8%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	8%	8%	-1%
Acumulado Actual	8%	8%	-1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8%	8%
Valor de la Obra Programada	$ 7.391.232	$ 7.391.232,14

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8%	8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.929.280	$ 6.929.280,13

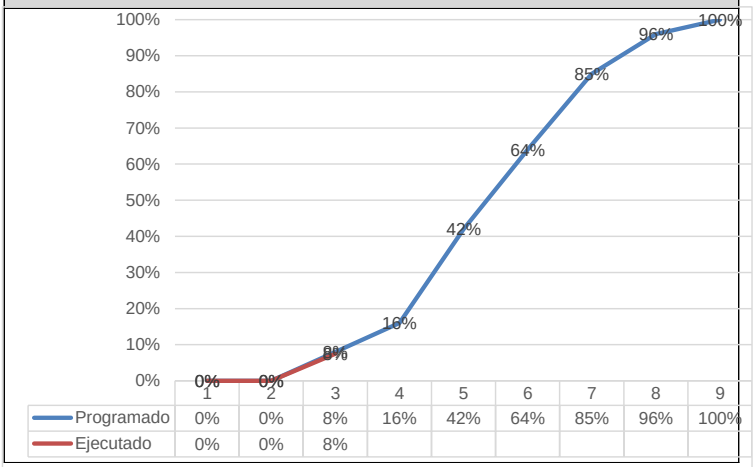34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Hidrolavadora	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	4			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Retiro de emulsión asfaltica
Definición de áreas a demoler mortero
Tratamiento de grietas y fisuras en muros
Desmonte de luminarias

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29 / 12 / 2024	No. INFORME	3	SEMANA No.	3
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Identificación de fisuras en cubierta.



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Identificación de fisuras en cubierta.



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Raspado de emulsión asfáltica.



FECHA FOTO: 27 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Raspado de emulsión asfáltica.



FECHA FOTO: 28 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de niveles de pendiente de cubierta.



FECHA FOTO: 28 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de niveles de pendiente de cubierta.

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	2024	2. No. INFORME	2		3. SEMANA No.	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Oso de Anteojos						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Cra. 100 # 23-22			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:	0			13. SUSPENSIONES:	0		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:	0			24. SUSPENSIONES:	0		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de cantidades	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de niveles cubierta	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

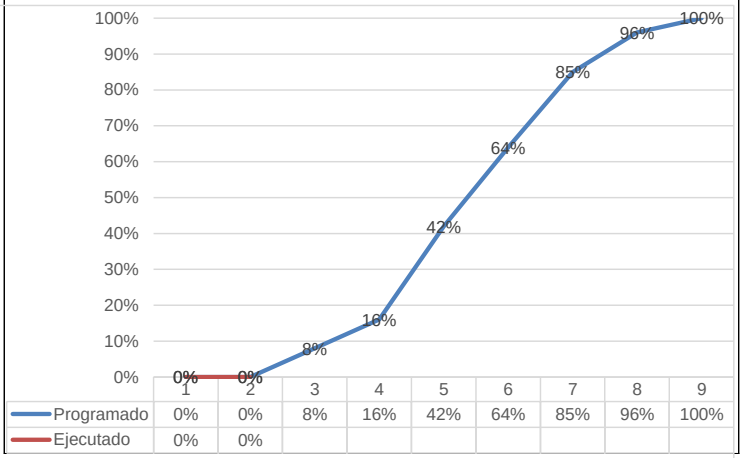34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Inducción y capacitación al personal de obra.
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 | 1 | 24	No. INFORME	2	SEMANA No.	2
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 13 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación inmueble previo inicio de actividades.



FECHA FOTO: 13 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación inmueble previo inicio de actividades.



FECHA FOTO: 17 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación empozamientos en cubierta.



FECHA FOTO: 13 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación inmueble previo inicio de actividades.



FECHA FOTO: 17 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación empozamientos en cubierta.



FECHA FOTO: 13 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación inmueble previo inicio de actividades.

1. FECHA ELABORACIÓN:	15 12 2024	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Oso de Anteojos	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Cra. 100 # 23-22		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 2024	11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0 Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 2024	22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0 Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de cantidades	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades de resane de fisuras	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de niveles cubierta	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de sifones en cubierta	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA	34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

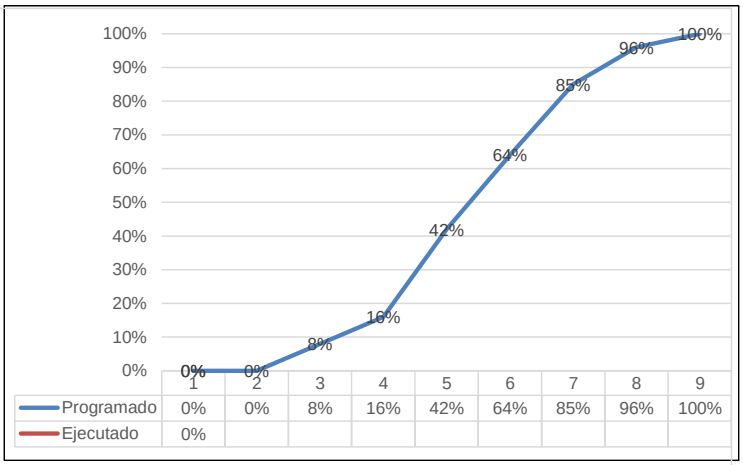

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Levantamiento de actas de inicio
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Entrega diagnóstico del frente
Realización de actas de vecindad

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15 12 2024	No. INFORME	1	SEMANA No.	1
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación estado cubierta



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación afectaciones por humedad



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación afectaciones por humedad



FECHA FOTO: 6 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de grifería y desagües



FECHA FOTO: 6 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección sistema de iluminación



FECHA FOTO: 10 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección sistema de iluminación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 -27/07/2021 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	2025	2. No. INFORME	5		3. SEMANA No.	5			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek						5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Diagonal 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO:	74	Meses/días	
12. PRORROGAS:	1			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO:	74	Meses/días	
23. PRORROGAS:	1			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	23%	100%	Se completan desmontes de tubería y mantenimiento de cubierta	Actividad completa
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Aún no inicia actividad	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	25%	Se realiza pintura de muros de aulas y bodegas	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	17%	Llega material a obra	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	
TOTAL	6%	45%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	45%	6%	39%
Acumulado Actual	45%	6%	39%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6%	6%
Valor de la Obra Programada	$ 3.651.436	$ 3.651.435,52

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	45%	45%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 27.385.766	$ 27.385.766,42

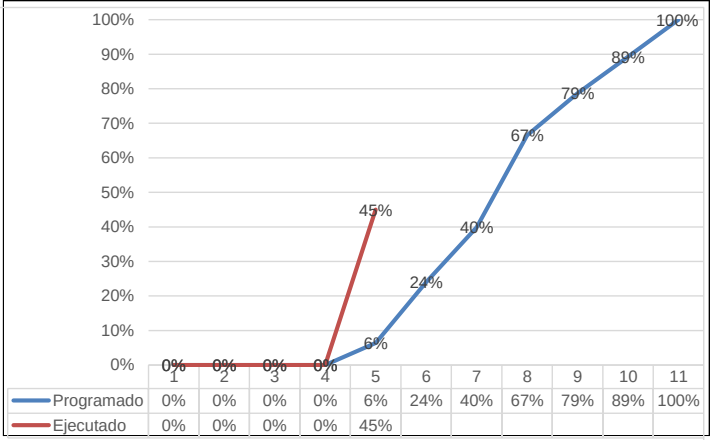34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0	Compresor de aire	1	MIERCOLES	L
MAESTRO	0	Pistola de calafateo	2	JUEVES	L
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pintura con esmalte de interior de aulas
Corte y presentación de bajantes
Sondeo de puntos sanitarios

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	12 / 1 / 2025	No. INFORME	5	SEMANA No.	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 09 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de cubierta



FECHA FOTO: 09 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de tubería de bajantes



FECHA FOTO: 07 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento de cubierta



FECHA FOTO: 10 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura en esmalte en muros



FECHA FOTO: 08 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir.



FECHA FOTO: 10 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura en esmalte en muros

1. FECHA ELABORACIÓN:	5 / 1 / 2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek	5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Diagonal 15D #98-40				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 2025	11. PLAZO:	74	Meses/días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23 / 2 / 2025	22. PLAZO:	74	Meses/días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Inspección de bajantes	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir y toma de medidas	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Inspección de bajantes	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%


	SEMANA	ACUMULADO

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0	Compresor de aire	1	MIERCOLES	L
MAESTRO	0	Pistola de calafateo	2	JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio de actividades de mantenimiento de cubierta, sello de goteras y cambio de tornillo
Desmonte de bajantes cuadradas
Preparación de áreas a pintar.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 / 1 / 2025	No. INFORME	4	SEMANA No.	4

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Llegada de material a sitio.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Llegada de material a sitio.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir.



FECHA FOTO: 04 de enero de 2025
DESCRIPCIÓN: Inspección de áreas a intervenir.

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	2024	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Diagonal 15D #98-40		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 2024	11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 2024	22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Inspección de bajantes	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir y toma de medidas	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Inspección de bajantes	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%


	SEMANA	ACUMULADO

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIÉRCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Alistamiento de áreas a intervenir.
Inducción y capacitación al personal de obra.
Recepción de material.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29 12 2024	No. INFORME	3	SEMANA No.	3
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de afectación en áreas.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de afectación en áreas.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de afectación en áreas.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de afectación en áreas.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de afectación en áreas.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de afectación en áreas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	2024	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Diagonal 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO: Hasta el 31 de diciembre Meses/días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO: Hasta el 31 de diciembre Meses/días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnósticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Inspección de bajantes	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir y toma de medidas	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Inspección de bajantes	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%


	SEMANA	ACUMULADO

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIÉRCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajustes a diagnósticos y cronogramas por frente de obra.
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Inducción y capacitación al personal de obra.
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	22 12 2024	No. INFORME	2	SEMANA No.	2
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de canales



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección y verificación de cubiertas



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección y verificación de cubiertas



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección y verificación de cubiertas



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección y verificación de cubiertas



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección y verificación de cubiertas

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	2024	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Casa de Pensamiento Intercultural Shush Urek			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Diagonal 15D #98-40		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 2024	11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT						
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11 12 2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 2024	22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -	
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES						
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnósticos y presupuestos de intervención
CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Inspección de bajantes	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	NO APLICA	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	NO APLICA	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir y toma de medidas	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Inspección de bajantes	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de espacios a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%


	SEMANA	ACUMULADO

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Levantamiento de actas de inicio
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Entrega diagnóstico del frente
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15 12 2024	No. INFORME	1	SEMANA No.	1
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 02 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección de cerramiento



FECHA FOTO: 02 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación filtraciones de agua



FECHA FOTO: 10 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación acabado de piso y empozamientos



FECHA FOTO: 10 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación acabado de piso y empozamientos



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de cubierta



FECHA FOTO: 16 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de canales

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	2025	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Sabana Grande			5. DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO:	Carrera 106 # 15A-32.			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHÓRQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	28%	100%	Se realizan demoliciones y desmontes	Se ejecutan actividades con cuadrilla de obra civil, acabados y eléctrica, de manera tal, que se puedan adelantar mayor cantidad de actividades.
CIMENTACIÓN	0%	50%	Se ejecutan armados de mesones	
MAMPOSTERÍA	0%	38%	Se ejecuta resane de muros y techos	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	22%	Se realizan instalación de salidas hidráulicas	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES	18%	64%	Se realiza instalación de luminarias	
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	NO APLICA	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	NO APLICA	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	13%	Se realiza instalación de sifones	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
PAÑETE Y PINTURA	0%	38%	Se ejecuta pintura del área del comedor en muros y techo	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	29%	Se realiza sello de ventanas redondas en primer piso	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	NO APLICA	
TOTAL	5%	31%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	31%	5%	26%
Acumulado Actual	5%	5%	26%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5%	5%
Valor de la Obra Programada	$ 6.277.455	$ 6.277.454,71

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	31%	5%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 38.920.219	$ 6.277.454,71

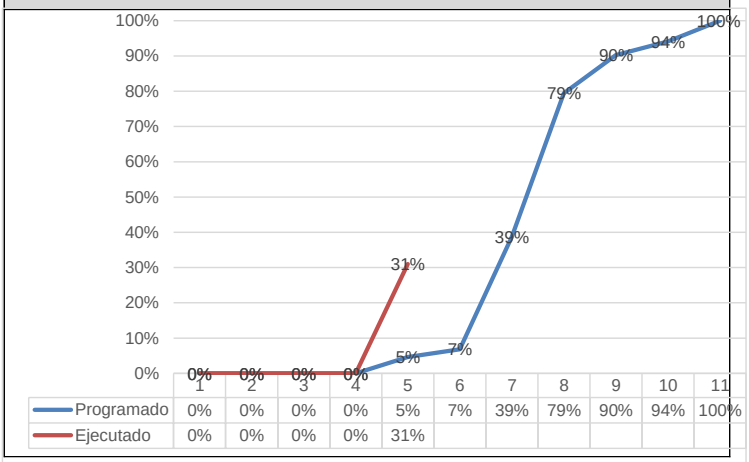34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	0%	5%	7%	39%	79%	90%	94%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%	0%	31%						

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO/ HIDRÁULICO	2	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0	Pulidora	2	MIÉRCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de luminarias tipo panel 120x30
Instalación de luminarias herméticas
Fundida de mesones
Instalación de sifones
Instalación de griferías

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	12 / 1 / 24	No. INFORME	5	SEMANA No.	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 7 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de poyos



FECHA FOTO: 7 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de luminarias 60x60 de incrustar



FECHA FOTO: 9 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Pintura de comedor con vinilo y pintura epóxica



FECHA FOTO: 9 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Pintura de comedor con vinilo y pintura epóxica



FECHA FOTO: 10 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de enchape de muros



FECHA FOTO: 7 de enero 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de reflectores

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Sabana Grande			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Carrera 106 # 15A-32.			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO: 74 Meses/días
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO: 74 Meses/días
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Llegada de luminarias a sitio.	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA	34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

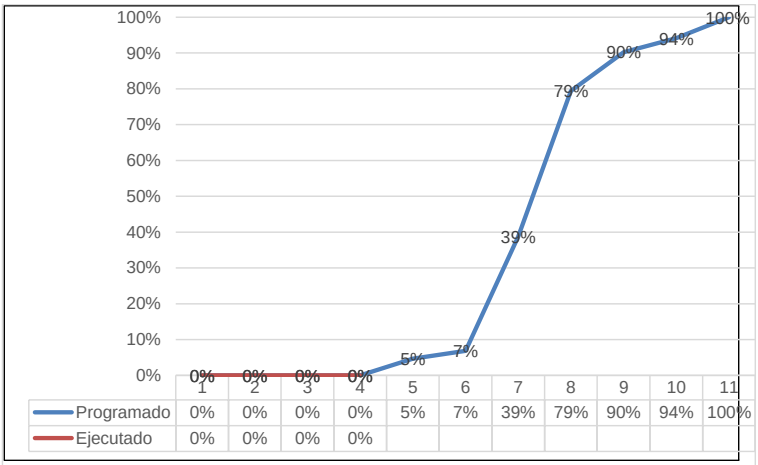

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Taladro	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Demolición de lavamanos, lavaderos, bañeras, orinales, etc, corridos, poyos, mesones, prefabricados, (incluye cargue y retiro de residuos de construcción
a sitios autorizados)
Demolición de enchape de muros y pega
Desmonte de puertas existentes todo tamaño madera
Instalación de luminaria de emergencia led
Instalación de panel led 60 x 60cm de incrustar

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 | 1 | 24	No. INFORME	4	SEMANA No.	4
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 30 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Llegada de luminarias a sitio.



FECHA FOTO: 30 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Llegada de luminarias a sitio.



FECHA FOTO: 30 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Llegada de luminarias a sitio.



FECHA FOTO: 30 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Llegada de luminarias a sitio.



FECHA FOTO: 30 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Llegada de luminarias a sitio.





FECHA FOTO: 30 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Llegada de luminarias a sitio.

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	2024	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Sabana Grande			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Carrera 106 # 15A-32.						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	11. PLAZO:	74	Meses/días	
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	2025	22. PLAZO:	74	Meses/días	
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA	34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

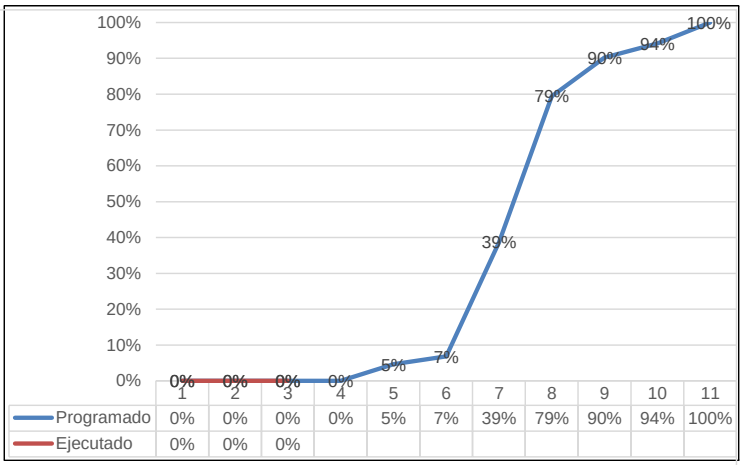

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Hidrolavadora	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1	Extensiones	1	MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	0			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actas de vecindad.
Llegada de materiales de obra civil y electricos a sitio.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En recorrido con profesionales de la Secretaria Distrial de Integración Social, se define no intervenir luminarias descolgadas, de igual manera, se define que,
se deben sustituir los paneles 120x30 de la cocina por luminarias hermeticas.
Se recomienda realizar mantenimiento de cubierta, ya que esta presenta filtración por deterioro de sello entre flanche y muro.

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29 12 24	No. INFORME	3	SEMANA No.	3
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección trampa de grasa.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de áreas a intervenir.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Inspección trampa de grasa.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de áreas.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de luminarias.



FECHA FOTO: 23 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de luminarias.

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	2024	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Sabana Grande			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Carrera 106 # 15A-32.						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:	0	13. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:	0	24. SUSPENSIONES:	0	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

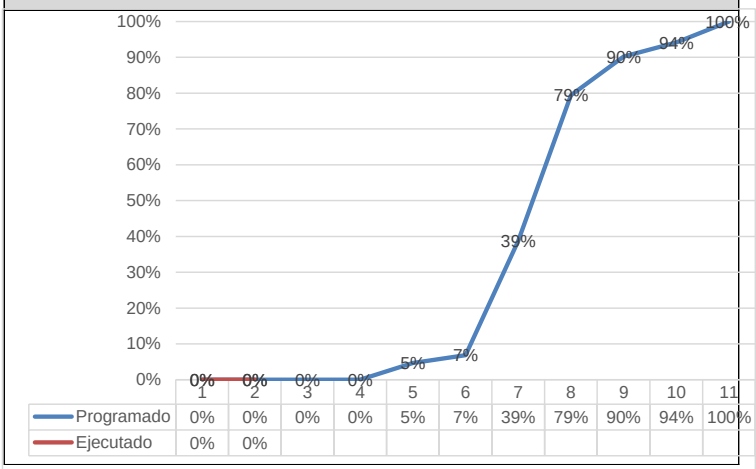34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	0%	5%	7%	39%	79%	90%	94%	100%
Ejecutado	0%	0%									

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	L
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Inducción y capacitación al personal de obra.
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	22 12 24	No. INFORME	2	SEMANA No.	2
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 20 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación



FECHA FOTO: 20 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación



FECHA FOTO: 20 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación



FECHA FOTO: 20 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación



FECHA FOTO: 20 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación



FECHA FOTO: 20 de diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	1		3. SEMANA No.	1			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	Jardín Infantil Sabana Grande						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	Carrera 106 # 15A-32.			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
12. PRORROGAS:	0			13. SUSPENSIONES:	0		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	22. PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre	Meses/días	
23. PRORROGAS:	0			24. SUSPENSIONES:	0		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos y presupuestos de intervención
CIMENTACIÓN	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA	0%	0%	NO APLICA	
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Verificación de áreas y cantidades a intervenir	
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

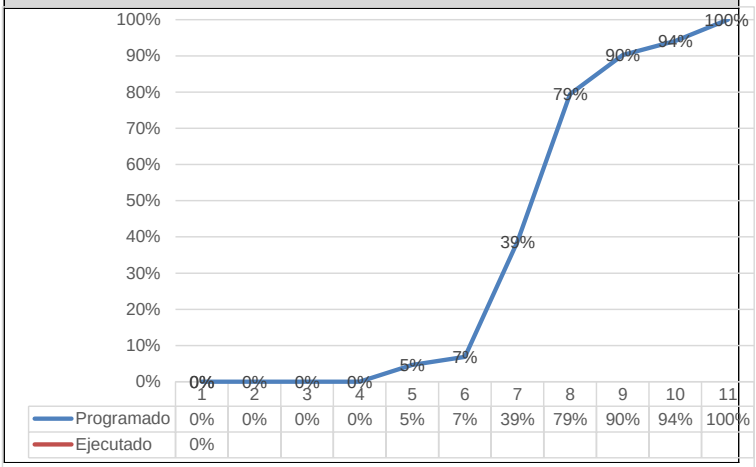34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	0%	5%	7%	39%	79%	90%	94%	100%
Ejecutado	0%										

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	0			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Levantamiento de actas de inicio
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Entrega diagnóstico del frente
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Arq. Carol Forero González
RESIDENTE DE OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	Realizar la optimización de la infraestuctura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distriral de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES		

###

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 05 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de redes eléctricas



FECHA FOTO: 05 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de redes eléctricas



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de redes eléctricas



FECHA FOTO: 02 diciembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación cantidades win



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de redes hidrosanitarias



FECHA FOTO: 29 de noviembre de 2024
DESCRIPCIÓN: Verificación de iluminación

KENNEDY

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	1		3. SEMANA No.	1			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

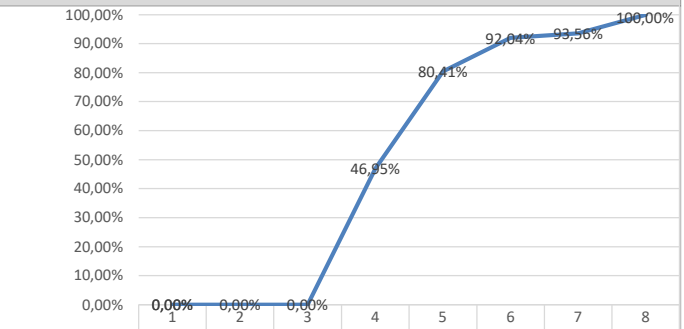
28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8
Programado	0,00%	0,00%	0,00%	46,95%	80,41%	92,04%	93,56%	100,00%
Ejecutado	0,00%							

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ELABORACIÒN DE ACTA DE VECINDAD DEL EQUIPAMIENTO EVALUADO EN EL PRESENTE INFORME.
ELABORACIÒN DE DIAGNOSTICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO Y EL ALCANCE SOLICITADO POR LA SDIS.
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
SE REALIZAN ACTAS DE RECORRIDO ENTRE EN CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA
SE REALIZA RECORRIDO CON EL TÉCNICO ELECTRICO PARA LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CORRIENTE
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 05/12/2024 INTERVENTORIA CONTRATISTA
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 13/12/2024 SIS INTERVENTORIA CONTRATISTA-SDIS

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL SALA DE COORDINACIÓN YA ARCHIVO



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PLACA DE CUBIERTA INTERIOR, SALÓN DE LÚDICA



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PLACA DE CUBIERTA INTERIOR, SALÓN DE LÚDICA



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL FACHADA DE SALÓN DE ESPACIOS MULTIFUNCIONALES



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PLACA DE CUBIERTA EXTERIOR, SALÓN DE LÚDICA



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PLACA DE CUBIERTA EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, SALÓN DE LÚDICA

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Verificacion de puntos de datos o electricos;se identifica punto de red inhabilitado**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Verificacion de medida de puerta 2.00 *0.90**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

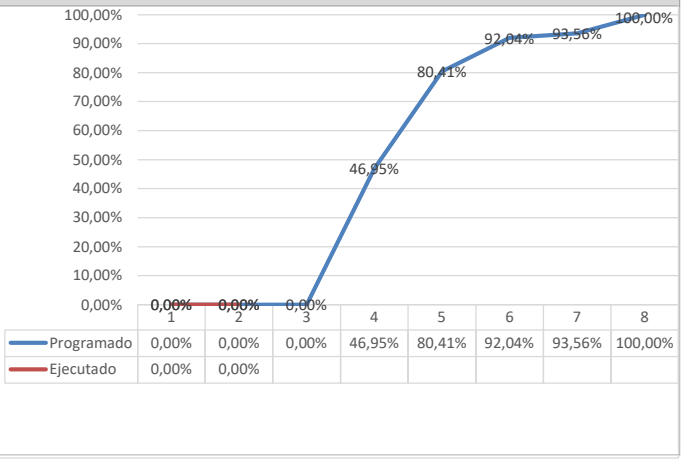34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8
Programado	0,00%	0,00%	0,00%	46,95%	80,41%	92,04%	93,56%	100,00%
Ejecutado	0,00%	0,00%						

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Registro fotografico a nivel general de la sede

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	22	12	24	No. INFORME	2	SEMANA No.	2

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

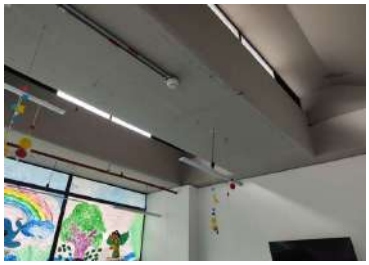
F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA SEDE

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Verificacion de puntos de datos o electricos;se identifica punto de red inhabilitado**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Verificacion de medida de puerta 2.00 *0.90**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

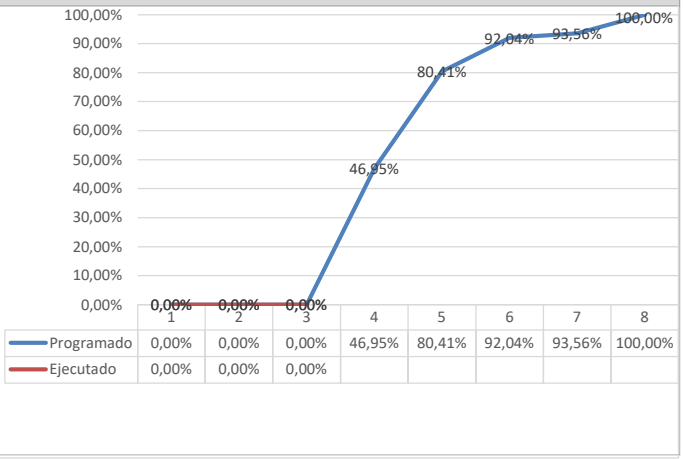34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8
Programado	0,00%	0,00%	0,00%	46,95%	80,41%	92,04%	93,56%	100,00%
Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%					

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Registro fotografico a nivel general de la sede

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	3

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 29/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESPACIO SIN HABILITAR PARA INICIAR ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 29/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESPACIO SIN HABILITAR PARA INICIAR ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 29/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESPACIO SIN HABILITAR PARA INICIAR ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 29/12/2024
DESCRIPCIÓN: SE REALIZA RETIRO DE APANTALLAMIENTO

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	100%	20%	**Verificacion de puntos de datos o electricos;se identifica punto de red inhabilitado, desmonte de canaleta existente**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	100%	20%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	20%	100%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	46.85%	20%
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	20%	0%
Valor de la Obra Ejecutada		

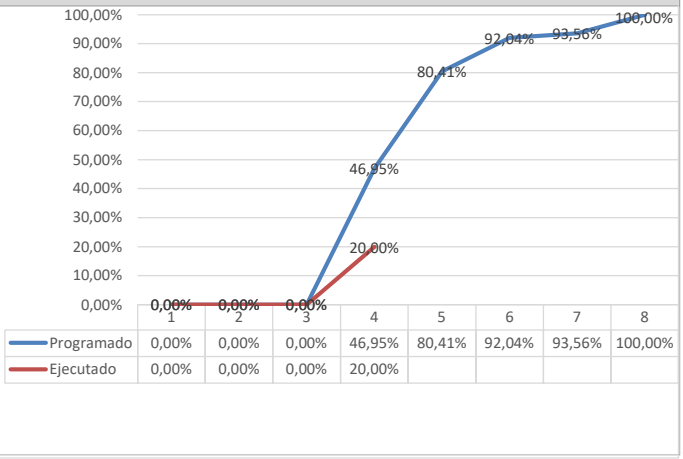34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8
Programado	0,00%	0,00%	0,00%	46,95%	80,41%	92,04%	93,56%	100,00%
Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%				

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Desmonte de canaleta existente,validacion de puntos retirados

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	4

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

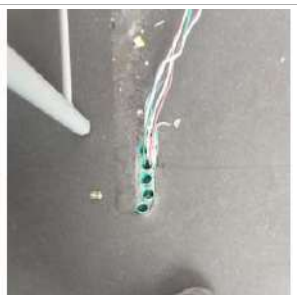F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 02/01/2025
DESCRIPCIÓN:DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE



FECHA FOTO: 02/01/2025
DESCRIPCIÓN:DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE



FECHA FOTO: 02/01/2025
DESCRIPCIÓN:DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE



FECHA FOTO: 02/01/2025
DESCRIPCIÓN:DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	2025	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	100%	60%	**Verificacion de puntos de Lampara de emergencia existente instalacion de red de nuevas lamparas.**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	100%	60%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	20%	100%	
Durante el periodo	60%	100%	
Acumulado Actual	60%	100%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	46.85%	80%
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	80%	0%
Valor de la Obra Ejecutada		

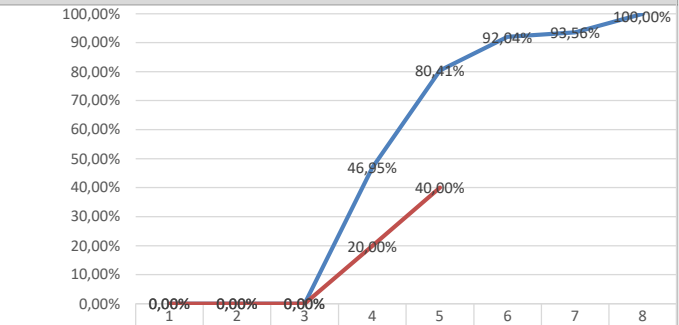34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8
Programado	0,00%	0,00%	0,00%	46,95%	80,41%	92,04%	93,56%	100,00%
Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%			

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajuste de Flujos de inversion y cronogramas
Instalacion de red electrica para lamparas de emergencia nuevas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN:INSTALACION DE RED ELECTRICA NUEVA



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN:INSTALACION DE RED ELECTRICA NUEVA



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN:INSTALACION DE RED ELECTRICA NUEVA

1. FECHA ELABORACIÓN:	19	1	2025	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	6				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	30%	15%	**Verificacion de puntos de Lampara de emergencia existente instalacion de red de nuevas lamparas.**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15%	12%	**Instalacion estructura para muro drywall**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	45%	27%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	20%	100%	
Durante el periodo	10%	100%	
Acumulado Actual	27%	45%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	46.85%	50%
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	50%	50%
Valor de la Obra Ejecutada		

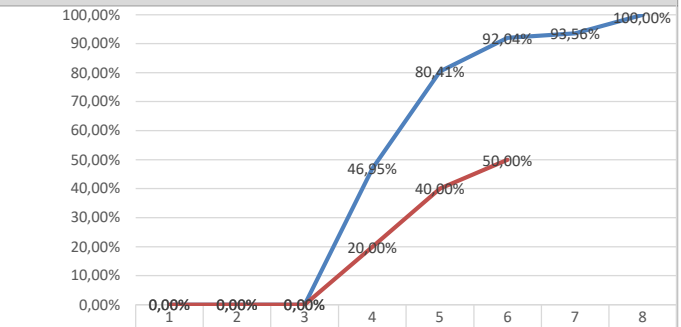34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8
Programado	0,00%	0,00%	0,00%	46,95%	80,41%	92,04%	93,56%	100,00%
Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	50,00%		

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Construccion de Muro en Drywall .
Instalacion de red electrica para lamparas de emergencia nuevas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	19	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	6

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN:INSTALACION DE ESTRUCTURA MURO



FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN:INSTALACION DE MURO DRYWALL



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN:CONTINUA EL TRASLADO PUNTOS CANALETA PERIMETRAL

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO: 97 días Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 90 días Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

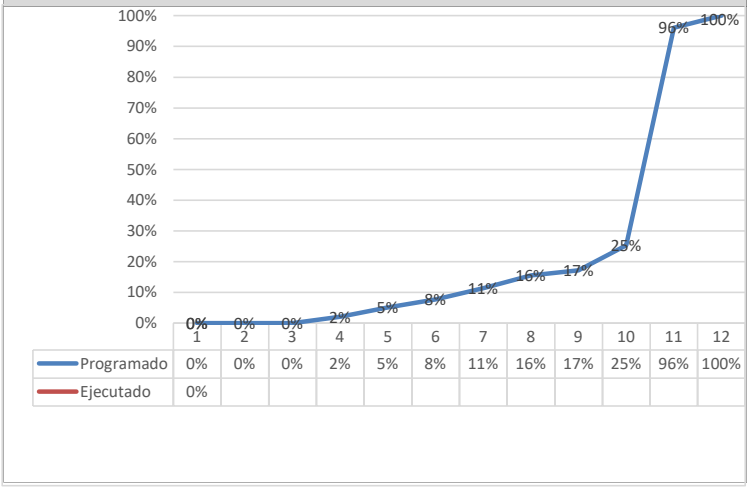34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ELABORACIÒN DE ACTA DE VECINDAD DEL EQUIPAMIENTO EVALUADO EN EL PRESENTE INFORME.
ELABORACIÒN DE DIAGNOSTICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO Y EL ALCANCE SOLICITADO POR LA SDIS.
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
SE REALIZAN ACTAS DE RECORRIDO ENTRE EN CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA-SDIS
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 05/12/2024 INTERVENTORIA CONTRATISTA
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 13/12/2024 SIS INTERVENTORIA CONTRATISTA-SDIS

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	6	SEMANA No.	6

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL CUBIERTA DE RAMPA DE ACCESO AL MODULO 2



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL LAMINAS DE POLICARBONATO EN EL DOMO



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL LAMINAS DE POLICARBONATO EN EL DOMO



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA METÁLICA DEL DOMO



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL ACABADO DE PISO DEL DOMO



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL ACABADO ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PANELES EN POLICARBONATO DEL DOMO

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

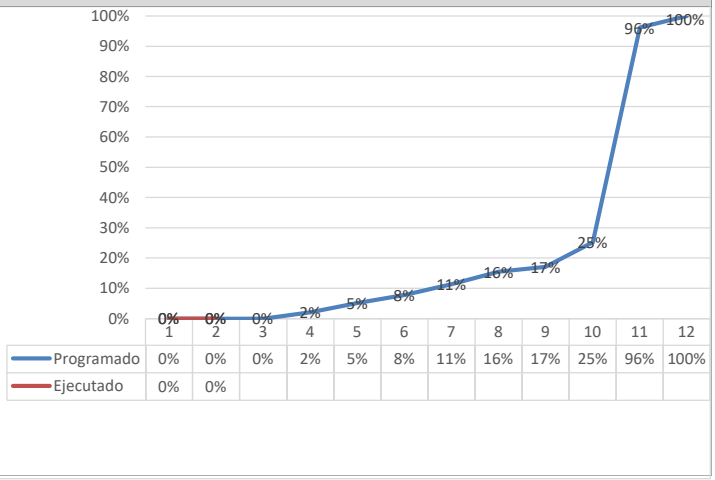34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Verificacion de espacios internos o colindantes

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	6	SEMANA No.	6

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

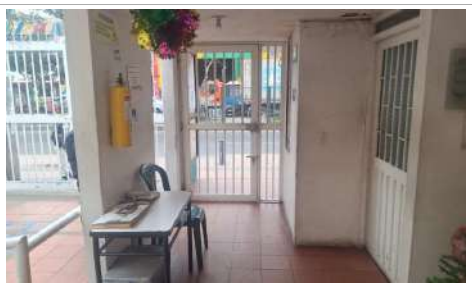F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA VERIFICACION DE SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA VERIFICACION DE SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA VERIFICACION DE SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA VERIFICACION DE SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA VERIFICACION DE SEDE



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA VERIFICACION DE SEDE

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	
Durante el periodo	0%	0%	
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

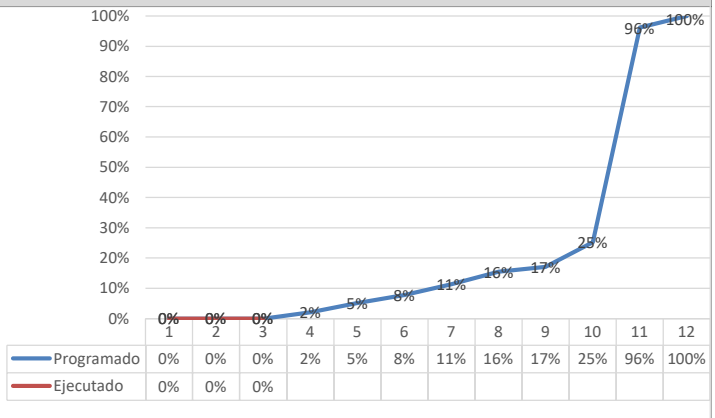34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Verificacion de espacios internos o colindantes insumo para acta

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	
Durante el periodo	0%	0%	
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

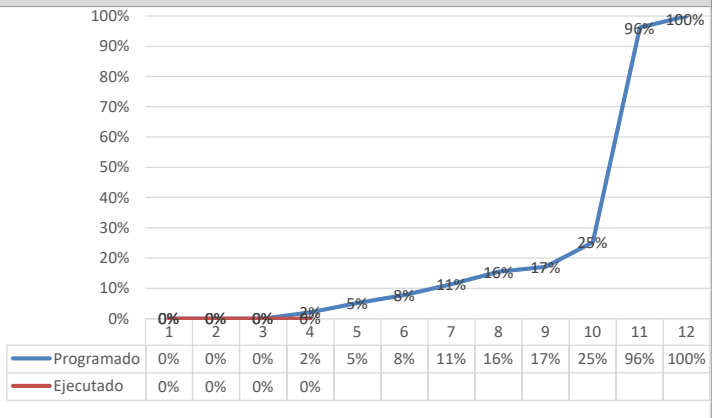34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Sin inicio de actividades

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	
Durante el periodo	0%	0%	
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

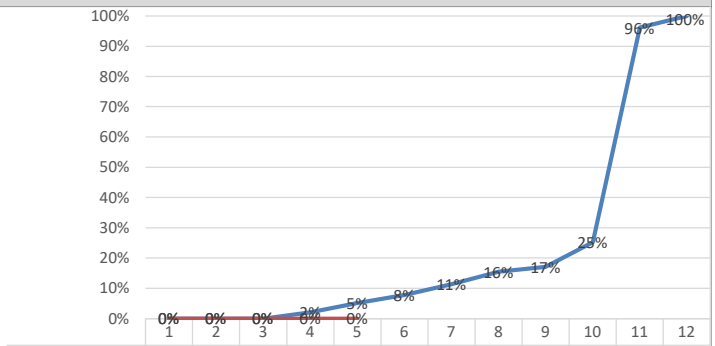34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Sin inicio de actividades

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	19	1	25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	6	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO: 97 días Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 90 días Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	
Durante el periodo	0%	0%	
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

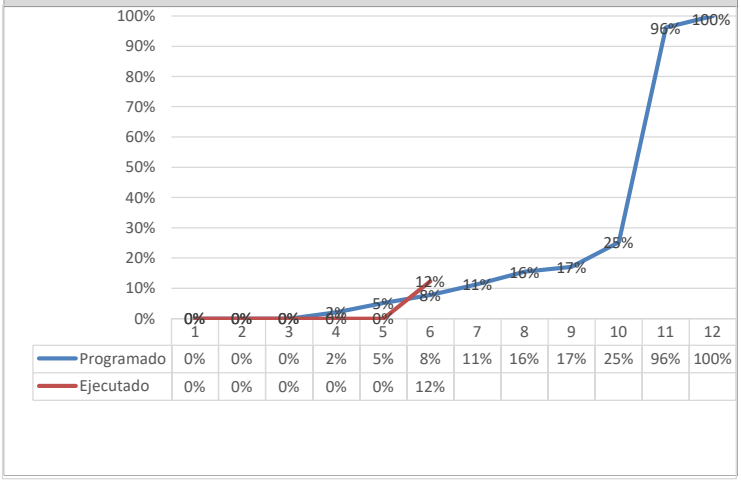34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.
Sin inicio de actividades

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	1		3. SEMANA No.	1			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

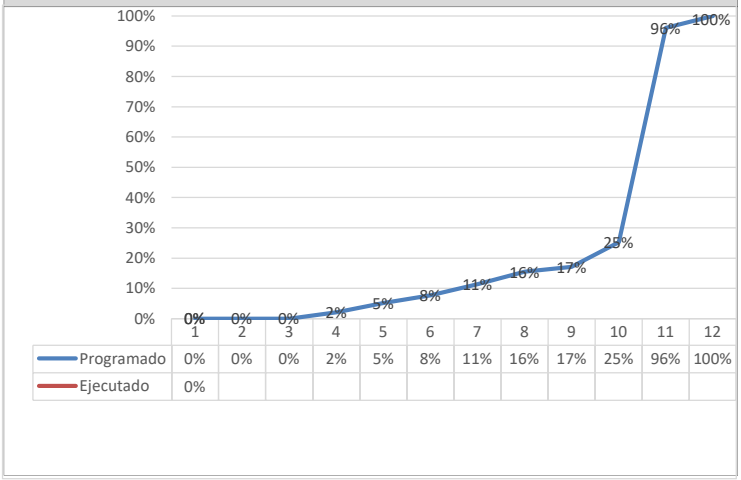34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ELABORACIÒN DE ACTA DE VECINDAD DEL EQUIPAMIENTO EVALUADO EN EL PRESENTE INFORME.
ELABORACIÒN DE DIAGNOSTICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO Y EL ALCANCE SOLICITADO POR LA SDIS.
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
SE REALIZAN ACTAS DE RECORRIDO ENTRE EN CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA
SE REALIZA RECORRIDO CON EL TÉCNICO ELECTRICO PARA LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CORRIENTE
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 05/12/2024 INTERVENTORIA CONTRATISTA
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 13/12/2024 SIS INTERVENTORIA CONTRATISTA-SDIS

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PINTURA DE MUROS SALÓN DE PÁRVULOS 1



FECHA FOTO: 13/12/2024
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL CUBIERTA SALÓN DE PÁRVULOS 2



FECHA FOTO: 13/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PINTURA DE MUROS Y ACABADO DE PISO SALÓN CAMINADORES



FECHA FOTO: 13/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL CUBIERTA SALÓN CAMINADORES



FECHA FOTO: 12/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON AFECTACIÓN



FECHA FOTO: 13/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PINUTRA EPOXICA SOBRE MUROS DE CUARTO DE REFRIGERACIÓN

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	2		3. SEMANA No.	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	0%	0%	**Verificacion de puntos de vanos.**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Verificacion de estado de redes hidraulicas en zona de tanque.**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Se determina dimension de ventana 1.20*0.80**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

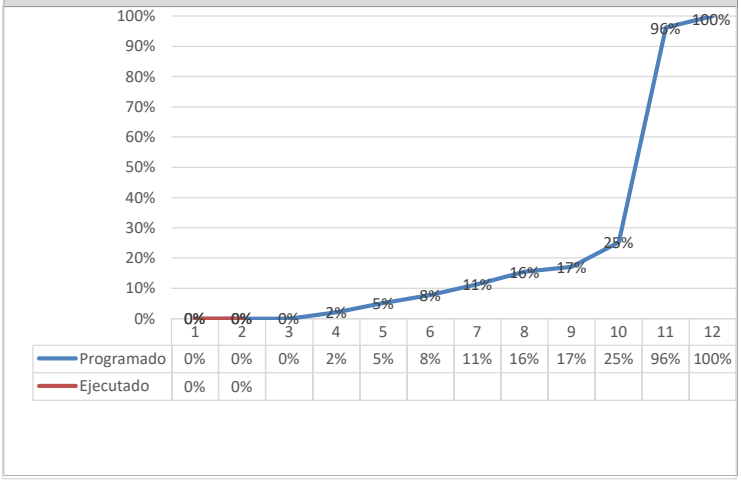34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	2	SEMANA No.	2

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFIICACION DE NUEVO ALCANCE PINTURA EN COCINA



FECHA FOTO: 16/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFIICACION DE NUEVO ALCANCE PINTURA EN COCINA



FECHA FOTO: 16/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFIICACION DE NUEVO ALCANCE PINTURA EN COCINA



FECHA FOTO: 16/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFIICACION DE NUEVO ALCANCE PINTURA EN COCINA



FECHA FOTO: 16/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFIICACION DE NUEVO ALCANCE PINTURA EN COCINA

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Verificacion de placa de zona de placa en tanques**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**Medicion de areas en las cuales se realizara pintura**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

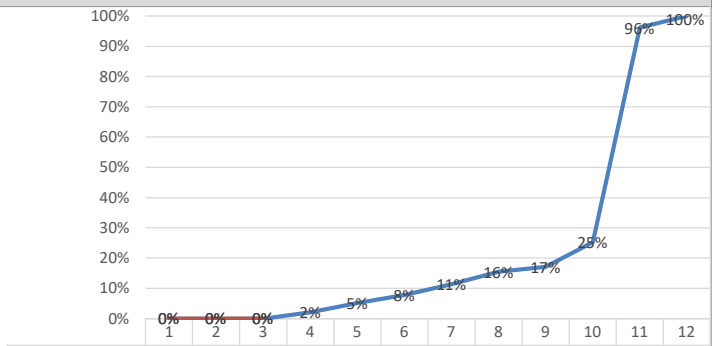34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Programado	0%	0%	0%	2%	5%	8%	11%	16%	17%	25%	96%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%									

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Verificacion de Nuevos alcances.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29	12	24	No. INFORME	3	SEMANA No.	3

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 29/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA Y VERIFICACIONES



FECHA FOTO: 29/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA Y VERIFICACIONES



FECHA FOTO: 29/12/24
DESCRIPCIÓN: VISITA Y VERIFICACIONES

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	24	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

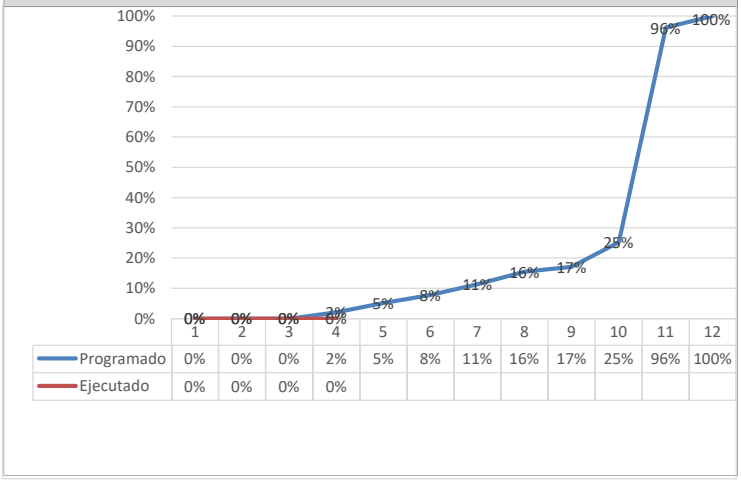34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
No se inican actividades de obra sin registro fotografico

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

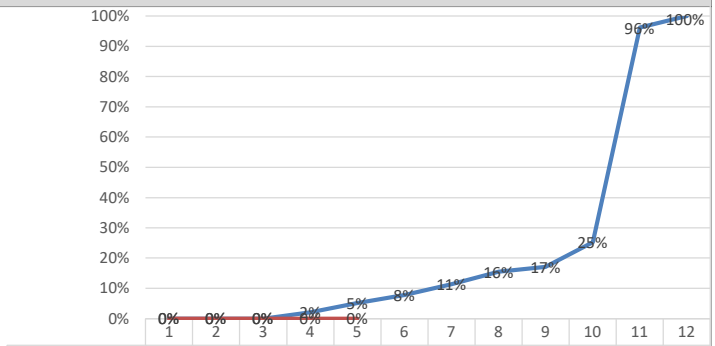34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
No se inican actividades de obra sin registro fotografico

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Residente Obra. Sharon Danay Chaparro Secue
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	19	1	25	2. No. INFORME	6		3. SEMANA No.	6			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL BRITALIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 56 SUR # 81-26						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

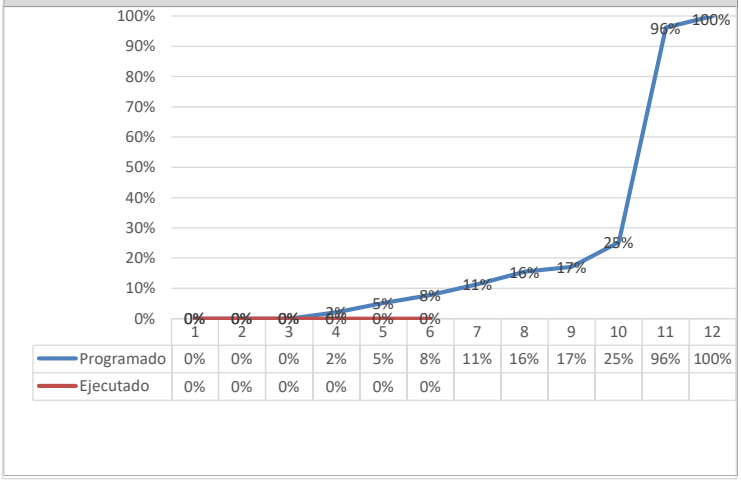34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
No se inican actividades de obra sin registro fotografico

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre:

CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	1		3. SEMANA No.	1			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL	0%	0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	
Durante el periodo	0%	0%	
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

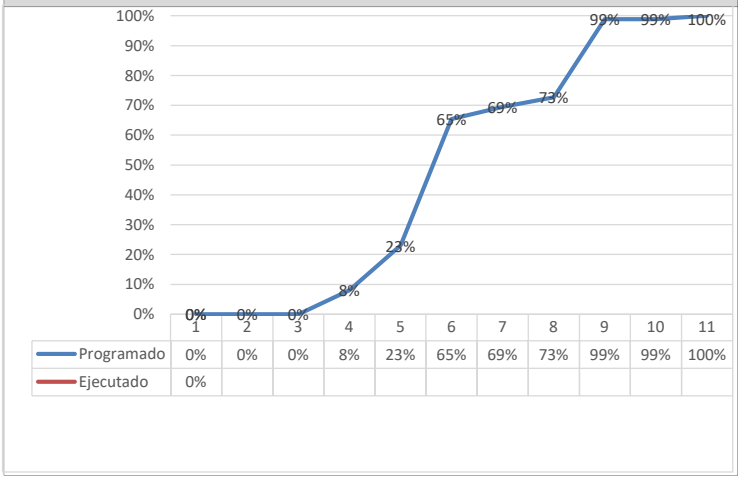34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	8%	23%	65%	69%	73%	99%	99%	100%
Ejecutado	0%										

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ELABORACIÒN DE ACTA DE VECINDAD DEL EQUIPAMIENTO EVALUADO EN EL PRESENTE INFORME.
ELABORACIÒN DE DIAGNOSTICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO Y EL ALCANCE SOLICITADO POR LA SDIS.
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
SE REALIZAN ACTAS DE RECORRIDO ENTRE EN CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA-SDIS
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 05/12/2024 INTERVENTORIA CONTRATISTA
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 13/12/2024 SIS INTERVENTORIA CONTRATISTA-SDIS

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Sharon Danay Chaparro Secue.
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ACABADO DE PISO, SALÓN H PRIMER PISO.



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ACABADO DE PISO, SALÓN PÁRVULOS 2 SEGUNDO PISO.



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: PIEZAS FALTANTES EN ACABADO DE PISO, SALÓN PÁRVULOS 1 SEGUNDO PISO.



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: PERDIDA DE MATERIAL DE ACABADO DE MURO POR PRESENCIA DE HUMEDAD Y FALLO DE BAJANTES, PASILLO SUR SEGUNDO PISO.



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL PINTURA DE MUROS, PASILLO NORTE SEGUNDO PISO



FECHA FOTO: 10/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL GUARDA ESCOBAS , SALÓN F PRIMER PISO.

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES								
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	0%	Verificación de cantidades de piso a remplazar	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de cantidades de muros a intervenir	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS			NO APLICA	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES			NO APLICA	
6. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación de cantidades de piso a remplazar	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA			NO APLICA	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de cantidades de muros a intervenir	
14. CIELOS RASOS	0%	0%	Verificación del cielorraso afectado por goteras en la cubierta	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de puntos que presentan goteras en la cubierta	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ -

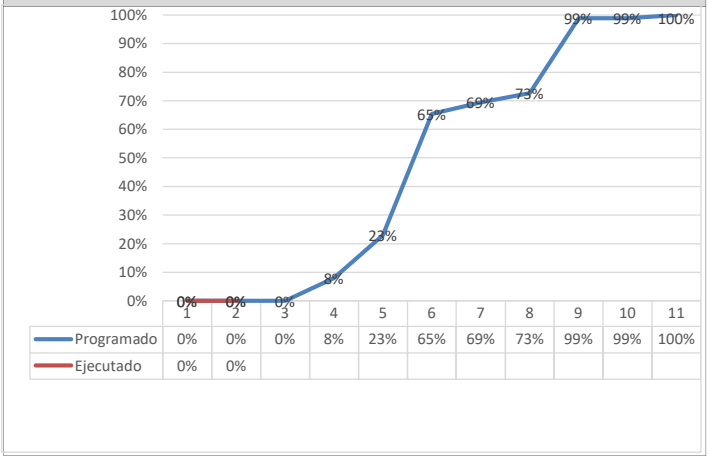34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	8%	23%	65%	69%	73%	99%	99%	100%
Ejecutado	0%	0%									

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desmonte de Piso caucho de las aulas
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Inducción y capacitación al personal de obra.
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Sharon Danay Chaparro Secue.
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	22 12 24	No. INFORME	2	SEMANA No.	2
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN DE PISOS Y MUROS SALA DE MATERNIDAD



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN DE PISOS Y MUROS SALÓN H



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN DE PISOS Y MUROS SALÓN G



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN DE PISOS Y MUROS SALÓN PÁRVULOS 4



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN DE PISOS Y MUROS SALÓN PÁRVULOS 3



FECHA FOTO: 17/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN DE PISOS Y MUROS SALÓN PÁRVULOS 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	29	12	24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	13%	Desmonte piso existente	Se adelantan actividades de retiro de material de acabado de piso
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	0%	Verificación de cantidades de muros a intervenir	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS			NO APLICA	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES			NO APLICA	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades de piso a remplazar	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA			NO APLICA	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Verificación de cantidades de muros a intervenir	
14. CIELOS RASOS	0%	0%	Verificación del cielorraso afectado por goteras en la cubierta	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de puntos que presentan goteras en la cubierta	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

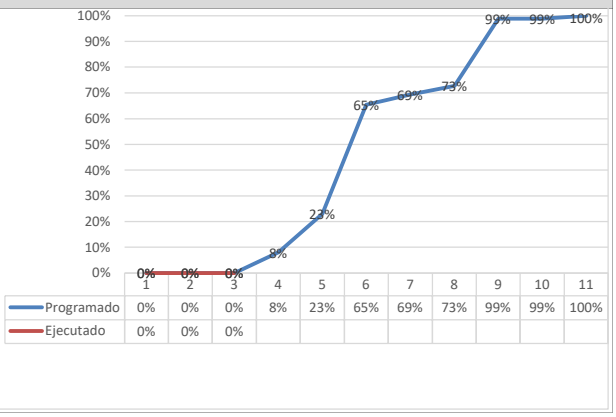34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	8%	23%	65%	69%	73%	99%	99%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%								

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	2			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desmonte de Piso caucho de las aulas
Ejecución de actividades preliminares
Inicio resane de muros
Desmonte de cielorraso existente

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Sharon Danay Chaparro Secue.
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29 12 24	No. INFORME	3	SEMANA No.	3
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE ACABADO DE PISO SALÓN DE PÁRVULOS 4



FECHA FOTO: 28/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE ACABADO DE PISO SALÓN DE PÁRVULOS 4



FECHA FOTO: 28/12/24
DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE CIELORRASO SALÓN PÁRVULOS 3



FECHA FOTO: 28/12/24
DESCRIPCIÓN: IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES SOBRE CIELORRASO SALÓN PÁRVULOS 3



FECHA FOTO: 28/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE ACABADO DE PISO SALÓN DE PÁRVULOS 4



FECHA FOTO: 28/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE ACABADO DE PISO SALÓN DE PÁRVULOS 4

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	41%	Desmonte piso existente	Se adelantan actividades de retiro de material de acabado de piso
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	10%	Resane de muros	Se inicia el resane de muros en el pasillo norte del segundo piso
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS			NO APLICA	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES			NO APLICA	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades de piso a remplazar	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Retiro de protector de esquinas	se realiza el retiro de los protectores de esquinas para el resane de muros
9. CARPINTERÍA METÁLICA			NO APLICA	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Llegada de insumos para pintura de muros a obra	
14. CIELOS RASOS	0%	0%	Verificación del cielorraso afectado por goteras en la cubierta	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de puntos que presentan goteras en la cubierta	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	4%	8%	-4%
Durante el periodo	-4%	-8%	4%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-8%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	-4%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

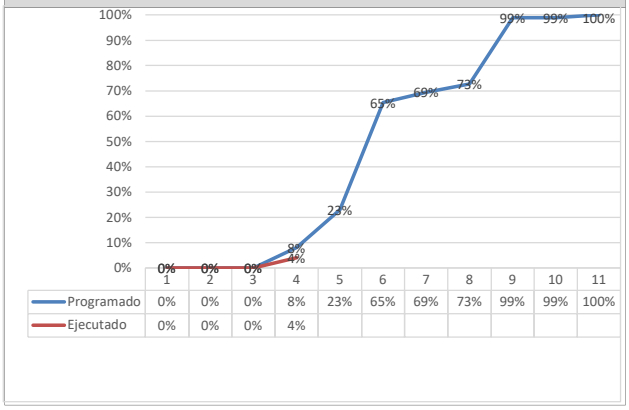34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	8%	23%	65%	69%	73%	99%	99%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%	4%							

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO	1	Andamios certificados	1	MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	2			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Resane de muros pasillo costado norte
Retiro acabado de piso aulas restantes
Aplicación de pintura tipo vinilo en muros pasillo costado norte

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Sharon Danay Chaparro Secue.
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	No. INFORME	4	SEMANA No.	4

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE ACABADO DE PISO SALÓN DE PÁRVULOS 3



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE ACABADO DE PISO SALÓN DE PÁRVULOS 2



FECHA FOTO: 02/01/24
DESCRIPCIÓN: DEMOLICIÓN DE CIELORRASO PARA INSPECCION DE BAJANTES PÁRVULOS 3



FECHA FOTO: 03/01/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE PROTECTORES DE ESQUINA PASILLO COSTADO NORTE



FECHA FOTO: 03/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO NORTE



FECHA FOTO: 03/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO NORTE

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	5			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	50%	Se finaliza el retiro del acabado de piso de los salones a intervenir	
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	30%	Resane de muros	Se inicia el resane de muros en el pasillo norte y sur del segundo piso
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS			NO APLICA	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES			NO APLICA	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades de piso a remplazar	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Retiro de protector de esquinas	se realiza el retiro de los protectores de esquinas para el resane de muros
9. CARPINTERÍA METÁLICA			NO APLICA	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	4%	Aplicación de vinilo en muros	se inicia la aplicación de pintura tipo vinilo sobre muros del pasillo norte
14. CIELOS RASOS	0%	0%	Verificación del cielorraso afectado por goteras en la cubierta	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	

16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de puntos que presentan goteras en la cubierta	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

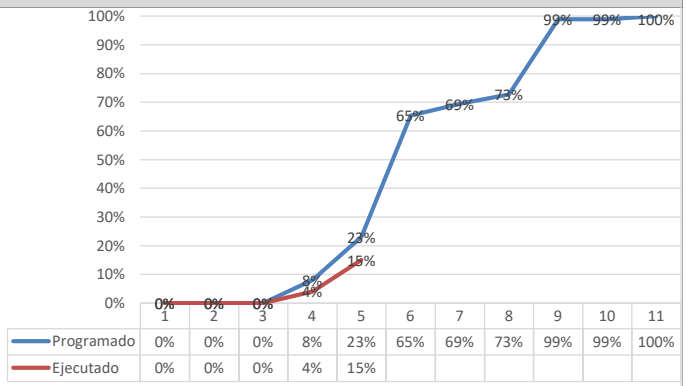34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	5			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Resane de muros pasillo costado norte y sur
aplicación de pintura vinilo muros pasillo costado sur
aplicación de pintura epoxica muros pasillo costado norte y sur

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Sharon Danay Chaparro Secue.
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	12	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE FILOS SOBRE MUROS PASILLO COSTADO NORTE



FECHA FOTO: 11/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO SUR



FECHA FOTO: 11/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE FILOS SOBRE MUROS PASILLO COSTADO NORTE



FECHA FOTO: 11/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO NORTE



FECHA FOTO: 11/01/24
DESCRIPCIÓN: RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO SUR



FECHA FOTO: 11/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE PINTURA VINILO PASILLO NORTE

1. FECHA ELABORACIÓN:	19	1	25	2. No. INFORME	6		3. SEMANA No.	6		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	58%	Se finaliza el retiro del acabado de piso de los salones a intervenir	
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	50%	Resane de muros	Se continúa el resane de muros en el pasillo norte y sur del segundo piso
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS			NO APLICA	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES			NO APLICA	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades de piso a remplazar	Se valida el patrón del piso a instalar por parte de la supervición
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Retiro de protector de esquinas	se realiza el retiro de los protectores de esquinas para el resane de muros
9. CARPINTERÍA METÁLICA			NO APLICA	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	54%	Aplicación de vinilo en muros, aplicación de pintura epóxica	se continúa la aplicación de pintura tipo vinilo sobre muros del pasillo norte, se inicia la aplicación de pintura epóxica
14. CIELOS RASOS	0%	10%	Llegada de material de cielorraso a obra	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Verificación de puntos que presentan goteras en la cubierta	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL		0%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	
Acumulado Actual	0%	0%	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

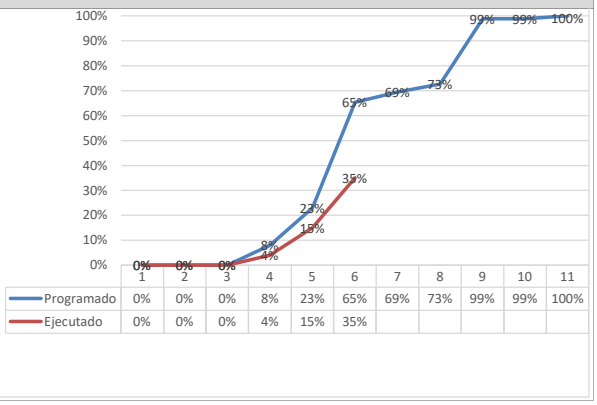34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Programado	0%	0%	0%	8%	23%	65%	69%	73%	99%	99%	100%
Ejecutado	0%	0%	0%	4%	15%	35%					

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO	1	Andamios certificados	1	MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	5			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Resane de muros salones primer y segundo piso
aplicación de pintura vinilo salones primer y segundo piso
aplicación de pintura epoxica muros pasillo costado norte y sur segunda mano y salones primer y segundo piso

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre Sharon Danay Chaparro Secue.
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	19	1	25	No. INFORME	6	SEMANA No.	6

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 19/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA SOBRE MUROS PASILLO COSTADO NORTE



FECHA FOTO: 19/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN PINTURA VINILO SOBRE CIELORRASO PASILLO COSTADO SUR



FECHA FOTO: 19/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN PINTURA VINILO SOBRE MUROS PASILLO COSTADO SUR



FECHA FOTO: 19/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN PINTURA VINILO SOBRE CIELORRASO PASILLO COSTADO SUR



FECHA FOTO: 19/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN PINTURA VINILO FILOS SOBRE MUROS PASILLO COSTADO SUR



FECHA FOTO: 19/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN PINTURA EPÓXICA SOBRE MUROS PASILLO COSTADO SUR

1. FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO: 97 días Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO: 90 días Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	ADRIANA M. VELANDIA B.							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
2. CIMENTACIÓN	0%	0%	**N/A**	**N/A**
3. MAMPOSTERÍA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	**N/A**	**N/A**
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	**N/A**	**N/A**
9. CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
10. CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	**N/A**	**N/A**
14. CIELOS RASOS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	**N/A**	**N/A**
18. EQUIPOS	0%	0%	**N/A**	**N/A**
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	**N/A**	**N/A**
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	**N/A**	**N/A**
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada		
Valor de la Obra Programada		

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada		
Valor de la Obra Ejecutada		

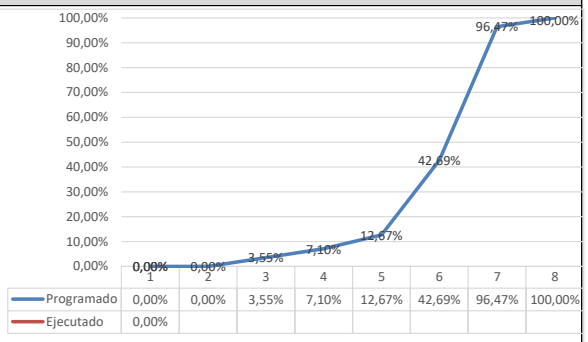34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ELABORACIÒN DE ACTA DE VECINDAD DEL EQUIPAMIENTO EVALUADO EN EL PRESENTE INFORME.
ELABORACIÒN DE DIAGNOSTICO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO Y EL ALCANCE SOLICITADO POR LA SDIS.
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA.
SE REALIZAN ACTAS DE RECORRIDO ENTRE EN CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA
SE REALIZA RECORRIDO CON EL TÉCNICO ELECTRICO PARA LA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PUNTOS DE CORRIENTE
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 05/12/2024 INTERVENTORIA CONTRATISTA
MESA DE TRABAJO REVISION DE PRESUPUESTOS 13/12/2024 SIS INTERVENTORIA CONTRATISTA-SDIS

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Res. Sharon D Chaparro S
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	15	12	24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/12/24
DESCRIPCIÓN: DIAGNÓSTICO SALÓN DE PARVULOS 2DO PISO



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: DIAGNÓSTICO SALÓN DE PREJARDÍN 2DO PISO



FECHA FOTO: 12/12/24
DESCRIPCIÓN: DIAGNÓSTICO CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO



FECHA FOTO: 12/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SOBRE CUBIERTA



FECHA FOTO: 12/12/24
DESCRIPCIÓN: ESTADO ACTUAL CLARABOYAS SOBRE CIELORRASO



FECHA FOTO: 13/12/24
DESCRIPCIÓN: DIAGNÓSTICO COMEDOR 1ER PISO PISO

1. FECHA ELABORACIÓN:	22	12	24	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	2				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	33%	Verificación de cantidades	Se adelantan actividades preliminares para diagnosticos, ajustes en presupuestos y cronogramas de intervención, levantamiento de actas de vecindad.
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA			NO APLICA	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de tanque de almacenamiento de agua	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades	
6. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0%	0%	Verificación placa de tanque de almacenamiento de agua	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	erificación de cantidades de reja sobre cubierta de cocir	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir	
14. CIELOS RASOS			NO APLICA	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Toma de medidas áreas a intervenir sobre la cubierta	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Inspección de áreas	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

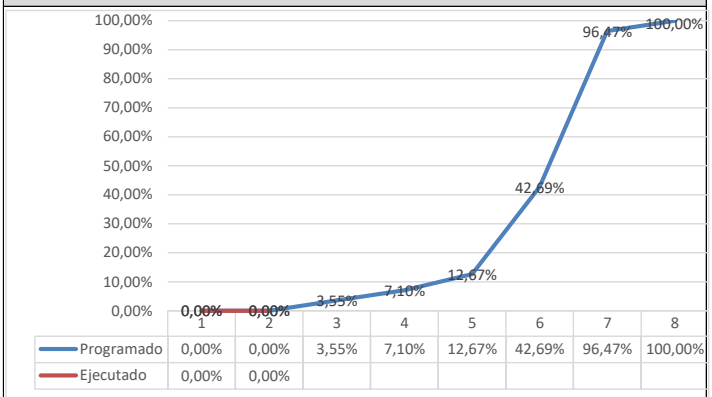34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	0			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desmonte de cielorraso
Cierre presupuestal
Entrega plan de trabajo del frente
Inducción y capacitación al personal de obra.
Inicio de ejecución de actividades preliminares

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Res. Sharon D Chaparro S
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	22 12 24	No. INFORME	2	SEMANA No.	2
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/12/24
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN PUNTO FIJO PRINCIPAL



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN SALA DE COORDINACIÓN PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN SALA CUNA PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN SALA CUNA PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN ACCESO PRINCIPAL PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES



FECHA FOTO: 16/12/2024
DESCRIPCIÓN: VERIFICACIÓN COMEDOR PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES

1. FECHA ELABORACIÓN:	29/12/24	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	3
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19/11/2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11/12/2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024	11. PLAZO:	97 días Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26/11/2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11/12/24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/24	22. PLAZO:	90 días Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	23%	Desmonte de cielorraso del segundo piso	Se adelantan actividades de retiro de cielorraso para desmonte posterior de cubierta
2. CIMENTACIÓN			NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA			NO APLICA	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de tanque de almacenamiento de agua	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	0%	Verificación de cantidades y materiales para la correcta instalación	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO			NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación placa de tanque de almacenamiento de agua	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de cantidades de reja sobre cubierta de cocina	
10. CARPINTERÍA MADERA			NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES			NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	0%	Requisición de materiales para la ejecución de actividades	
14. CIELOS RASOS	20%	23%	NO APLICA	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS			NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS			NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Requisición de materiales para la ejecución de actividades	
18. EQUIPOS			NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN			NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Acopio de material de retiro de cielorraso en obra.	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	50%	23%	27%
Acumulado Actual	50%	23%	27%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4%	4%
Valor de la Obra Programada	$ 3.015.385	$ 3.015.384,53

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	23%	23%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 267.831	$ 267.831,00

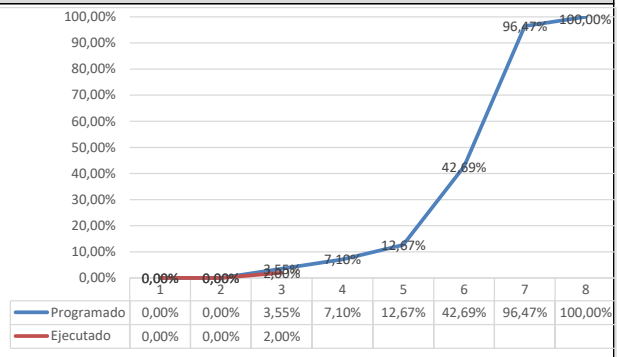34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	2			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Ajustes a diagnosticos y cronogramas por frente de obra.
Inducción y capacitación al personal de obra.
Desmonte de cielorraso del segundo piso.
Acopio de material de demolición de cielorraso en obra.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Res. Sharon D Chaparro S
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	29 12 24	No. INFORME	3	SEMANA No.	3
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 26/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CIELORRASO DEL DORMITORIO



FECHA FOTO: 26/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CIELORRASO DEL SALÓN PREJARDÍN



FECHA FOTO: 26/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES



FECHA FOTO: 26/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CIELORRASO BAÑO INFANTÍL



FECHA FOTO: 26/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CIELORRASO PUNTO FIJO



FECHA FOTO: 26/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE CIELORRASO SALA DE COORDINACIÓN

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	4				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024	11. PLAZO:	97 días	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	90 días	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	33%	Desmonte de conexiones electricas existentes y puntos de tomacorriente	Se adelantan actividades de retiro de instalaciones eléctricas para desmonte posterior de cubierta
2. CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de red de alimentación del tanque de almacenamiento de agua	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	25%	Llegada de materiales electricos al punto de obra	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación placa de tanque de almacenamiento de agua	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de cantidades de reja sobre cubierta de cocina	
10. CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	1%	Picado de muros	Se realiza picado de muros para aplicación de pañete
14. CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Inspección de cerchas metalicás existentes para soporte el de la cubierta propuesta.	
18. EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	0%	Acopio de material de retiro de cielorraso en obra.	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

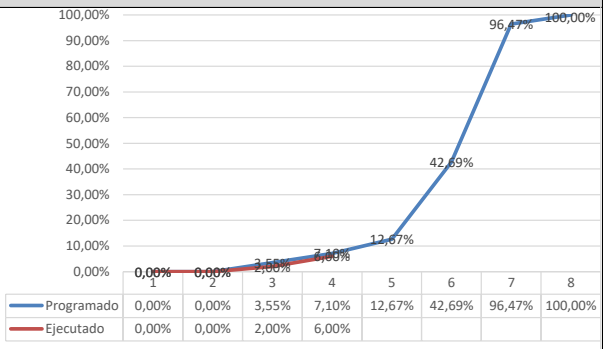34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO	1			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	2			VIERNES	F
AYUDANTE	0			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desmonte de cubierta del segundo piso.
embalaje y disposición de cubierta a sitio certificado.
Requisición de materiales para la ejecución de obra.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Res. Sharon D Chaparro S
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	5 1 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	4
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES SALÓN DE PREJARDÍN



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES DEL DORMITORIO



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: PICADO DE MUROS PARA APLICACIÓN DE PAÑETE SALA DE COORDINACIÓN



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES



FECHA FOTO: 30/12/24
DESCRIPCIÓN: INSPECCIÓN DE CERCHAS METÁLICAS PARA SOPORTE DE CUBIERTA PROPUESTA

1. FECHA ELABORACIÓN:	12 / 1 / 25	2. No. INFORME	5
3. SEMANA No.	5		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / 12 / 2024	11. PLAZO:	97 días Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / 12 / 24	22. PLAZO:	90 días Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	53%	Desmonte de cubierta de fibrocemento	Se adelantan actividades de retiro de cubierta para instalación de la nueva
2. CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de red de alimentación del tanque de almacenamiento de agua	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	20%	Llegada de tubería, paneles LED al punto de obra	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación placa de tanque de almacenamiento de agua	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de cantidades de reja sobre cubierta de cocina	
10. CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	9%	Aplicación de esmalte sobre perfiles de soporte de cubierta	se realiza aplicación de pintura en esmalte para estructura metalica
14. CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	0%	Inspección de cerchas metalicás existentes para soporte el de la cubierta propuesta.	
18. EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	67%	Acopio de material en obra	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

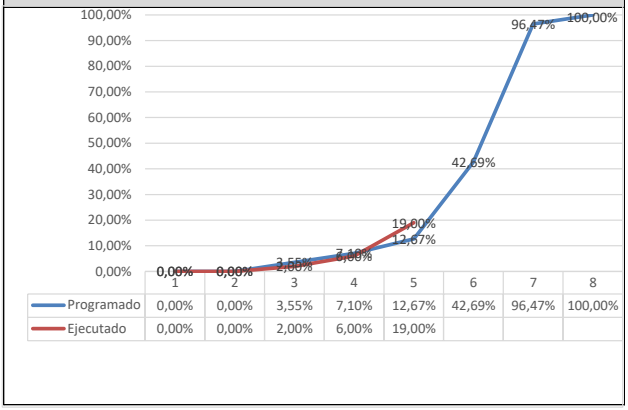34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO	1	Andamio certificado	1	MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0	compresor de aire	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	3			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de estructura metálica para cubierta propuesta
Instalación de cubierta nueva del segundo piso.
llegada de materiales para la ejecución de obra.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Res. Sharon D Chaparro S
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	12 / 1 / 25	No. INFORME	5	SEMANA No.	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 10/01/24
DESCRIPCIÓN: DESMONTE DE TEJA EXISTENTE PUNTO FIJO



FECHA FOTO: 10/01/24
DESCRIPCIÓN: DESMONTE DE TEJA EXISTENTE DORMITORIO



FECHA FOTO: 10/01/24
DESCRIPCIÓN: DESMONTE DE TEJA EXISTENTE SALA DE COORDINACIÓN



FECHA FOTO: 12/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE CERCHAS SALÓN DE PREJARDÍN



FECHA FOTO: 12/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE CERCHAS SALÓN DE COORDINACIÓN



FECHA FOTO: 10/01/24
DESCRIPCIÓN: DISPOCISIÓN FINAL DE TEJAS Y ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

1. FECHA ELABORACIÓN:	19/1/25	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	6
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19/11/2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11/12/2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024	11. PLAZO:	97 días Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2024	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26/11/2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11/12/24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/24	22. PLAZO:	90 días Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2024	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES				
27. SUPERVISOR SDIS:	ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. PRELIMINARES	0%	53%	Desmonte de cubierta de fibrocemento	Se adelantan actividades de retiro de cubierta para instalación de la nueva
2. CIMENTACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
3. MAMPOSTERÍA	0%	0%	NO APLICA	
4. INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0%	0%	Verificación de red de alimentación del tanque de almacenamiento de agua	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0%	20%	Verificación de instalaciones electricas propuestas	
6. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO	0%	0%	NO APLICA	
7. PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación placa de tanque de almacenamiento de agua	
8. MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0%	0%	Verificación de cantidades	
9. CARPINTERÍA METÁLICA	0%	0%	Verificación de cantidades de reja sobre cubierta de cocina	
10. CARPINTERÍA MADERA	0%	0%	NO APLICA	
11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0%	0%	NO APLICA	
12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES	0%	0%	NO APLICA	
13. PAÑETE Y PINTURA	0%	17%	Aplicación de esmalte sobre perfiles de soporte de cubierta	se realiza aplicación de pintura en esmalte para estructura metalica
14. CIELOS RASOS	0%	0%	NO APLICA	
15. CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%	NO APLICA	
16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS	0%	0%	NO APLICA	
17. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0%	71%	Instalacion de cubierta y caballetes	Se realiza la instalación total de la cubierta y caballetes en ecoroofpropuestos, con sus respectivos flanches
18. EQUIPOS	0%	0%	NO APLICA	
19. DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN	0%	0%	NO APLICA	
20. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0%	67%	Acopio de material en obra	
TOTAL				

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%
Durante el periodo	0%	0%	0%
Acumulado Actual	0%	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0%	0%
Valor de la Obra Programada	$ -	

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0%	0%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	

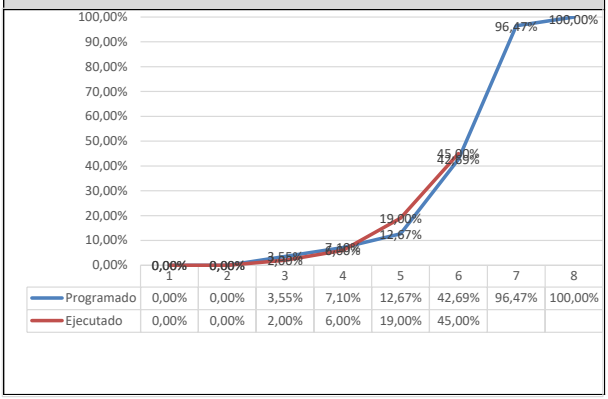34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR DE OBRA	1	Herramienta menor	1	LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO	1	Andamio certificado	1	MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0	compresor de aire	1	MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	0			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalación de red electrica del segundo piso
Resane de muros para aplicación de pintura del segundo piso
Requisición de materiales para las instalaciones hidráulicas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nombre: Res. Sharon D Chaparro S
CONTRATISTA DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	19 / 1 / 25	No. INFORME	6	SEMANA No.	6
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.				
CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 16/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE PERFILES PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA SALÓN PREJARDÍN



FECHA FOTO: 16/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE PERFILES PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA SALÓN COORDINACIÓN



FECHA FOTO: 16/01/24
DESCRIPCIÓN: APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE PERFILES PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA DORMITORIO



FECHA FOTO: 16/01/24
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL DORMITORIO



FECHA FOTO: 16/01/24
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SALÓN PREJARDÍN



FECHA FOTO: 16/01/24
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SALÓN DE COORDINACIÓN

1.11 Copia digital de los informes mensuales, incluyendo soportes fotográficos

CONSORCIO OBRAS GT
NIT. 901.886.750-6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
BOGOTÁ

INFORME MENSUAL TÉCNICO DE OBRA N°1

Correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025

CONTRATO DE OBRA 9176-2024

CONSORCIO OBRAS GT

REALIZ LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE IN GRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

ENERO 2025

CA E 99 No. 49-38 OF 509 TEL: 601 – 7458097 BOGOTA, D.C. – g.torres.d@hotmail.com

Información documental

Información general:

Título del Documento:	Informe mensual técnico de obra
Código del Documento:	
Fecha Redacción:	Enero 2025

Registro de aprobación:

Revisión: A	Elaboró (Contratista)	Revisó (Contratista)	Revisó y Aprobó (Interventor)	Aprobó (Supervisor)
Nombre:	Sharon Chaparro Carol Forero González Jessika Paola Merchán	Orlando Robles Montesino		
Cargo:	Residentes de obra	Director de obra		
Fecha:	Enero 2025	Enero 2025		

Registro de modificaciones:

# Revisión	Fecha	Descripción de las modificaciones
A	11/01/2025	Justificaciones de texto
B	28/01/2025	Se realizan las observaciones solicitadas

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO 7
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11
1.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
2. CRONOGRAMA 13
2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 13
2.1.1 KENNEDY 13
2.1.2 FONTIBÓN 13
2.1.3 ENGATIVÁ 14
3. PORCENTAJES PROGRAMADOS DE AVANCE Y PORCENTAJES EJECUTADOS 15
4. BALANCE DE OBRA 17
4.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 19
4.1.1 KENNEDY 19
4.1.2 FONTIBÓN 22
4.1.3 ENGATIVÁ 33
5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 38
5.1 COMITÉS DE OBRA 38
5.2 INFORMES SEMANALES PRESENTADOS 38
5.3 RELACIÓN DE PERSONAL 38
5.4 BITÁCORA DE OBRA 40
6. ESTADO ACTUAL DEL TIEMPO EN EL PERIODO COMPRENDIDO 40
7. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZA 40
7.1 PÓLIZAS DE OBRA DEL CONTRATO 40
8. SEGUIMIENTO Y CONTROL 41
8.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL **41.**
8.2 SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS LEGALES AMBIENTALES... 41
8.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41
9. CONTROL Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO URBANO 41
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Unidades operativas por intervenir 8
Tabla 2. Información general del contrato 12
Tabla 3. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado proyecto. 15
Tabla 4. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 15
Tabla 5. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 6. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 7. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 8. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 9. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 10. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 11. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 16
Tabla 12. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 17
Tabla 13. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 17
Tabla 14. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 17
Tabla 15. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 17
Tabla 16. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente 17
Tabla 17. Registro fotográfico Jardín Infantil Tintalito Mis Primeros Pasos 19
Tabla 18. Registro fotográfico Centro Crecer Campo Alegre Calandaima 20
Tabla 19. Registro fotográfico Jardín Infantil Caracol 21
Tabla 20. Registro fotográfico Jardín Infantil Oso De Anteojos 26
Tabla 21. Registro fotográfico Jardín Infantil Los Sauces 37
Tabla 22. Relación comités de obra 38
Tabla 23. Relación informes semanales contrato de obra 38
Tabla 24. Relación de personal administrativo 38
Tabla 25. Relación de personal operativo localidad Kennedy 39
Tabla 26. Relación de personal operativo localidad Fontibón 39
Tabla 27. Relación de personal operativo localidad Engativá 40
Tabla 28. Reporte de clima 40

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Mapa de localización localidad Kennedy. 9
Ilustración 2. Mapa de localización localidad Fontibón. 10
Ilustración 3. Mapa de localización localidad Engativá. 11
Ilustración 4. Desmonte de Cielo raso 19
Ilustración 5. Desmonte de Cielo raso 19
Ilustración 6. Desmonte de Cielo raso 19
Ilustración 7. Desmonte de Cielo raso 19
Ilustración 8. Desmonte de red electrica 19
Ilustración 9. Desmonte de Teja existente en fibrocemento. 19
Ilustración 10. Desmonte de Teja existente en fibrocemento. 20
Ilustración 11. Protección de piso . 20
Ilustración 12. Desmonte de canaleta Existente 20
Ilustración 13. Desmonte de canaleta Existente 20
Ilustración 14. Instalación red nuevas lámparas de Emergencia 20
Ilustración 15. Instalación red nuevas lámparas de Emergencia 20
Ilustración 16. Instalación de nuevo Muro en drywall 21
Ilustración 17. Instalación de nuevo Muro en drywall 21
Ilustración 18. Desmonte piso existente. 21
Ilustración 19. Desmonte piso existente. 21
Ilustración 20. Desmonte piso existente. 21
Ilustración 21. Desmonte piso existente. 21
Ilustración 22. Resane corredor Existente. 22
Ilustración 23. Resane corredor Existente. 22
Ilustración 24. **Retiro de pegante sobre piso.** 22
Ilustración 25. Resane corredor Existente. 22
Ilustración 27. Verificación de niveles de cubierta 22
Ilustración 28. Verificación de niveles de cubierta 22
Ilustración 29. Verificación de niveles de cubierta 23
Ilustración 30. Verificación de niveles de cubierta 23
Ilustración 31. Estado apantallamiento 23
Ilustración 32. Estado apantallamiento 23
Ilustración 33. Fisuras y grietas en placa de cubierta 23
Ilustración 34. Fisuras y grietas en placa de cubierta 23
Ilustración 35. Demolición de mortero 24
Ilustración 36. Retiro de emulsión 24
Ilustración 37. Demolición de mortero 24
Ilustración 38. Demolición de mortero 24
Ilustración 39. Verificación empozamientos 24
Ilustración 40. Verificación empozamientos 24
Ilustración 41. Demolición de mortero 25
Ilustración 42. Demolición de mortero 25
Ilustración 43. Resane de muros 25

Ilustración 44. Demolición de mortero 25
Ilustración 45. Resane de muros 25
Ilustración 46. Resane de techos 26
Ilustración 47. Pintura en vinilo 26
Ilustración 48. Pintura en vinilo 26

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las labores ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en los frentes de trabajo correspondientes a las localidades de Kennedy, Fontibón y Engativá, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.

Este informe detalla las actividades realizadas en obra, tomando en cuenta el cabal cumplimiento del objeto contractual y la adecuada disposición de los recursos necesarios para su ejecución, en cumplimiento del contrato cuyo objeto es:

CONTRATO DE OBRA 9176-2024

OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

A continuación, se presenta el estado actual del contrato de obra, junto con todos los procesos técnicos y administrativos que se están llevando a cabo. Este informe incluye una descripción detallada de los procesos administrativos, técnicos, financieros, ambientales y jurídicos que influyen y deben ser considerados en el desarrollo de las obras.

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO OBRAS GT
NIT.: 901.886.750-6
REPRESENTANTE LEGAL: Marinela Segura Téllez
C.C.: 52.452.705

INTERVENTORÍA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 9355 -2024
CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT. : 901.890.754-0
REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Eduardo Gómez Gómez
C.C.: 19.275.138

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Realizar reparaciones locativas a las unidades operativas de la Secretaria Distrital de Integración Social, en la ciudad de Bogotá dentro del objeto "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", con el fin de mantener el inmueble en las debidas condiciones sin afectar la estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales o volumétricas.

El proyecto tiene como objetivo realizar la atención de reparaciones locativas necesarias en trece (13) sedes, unidades operativas de la SDIS, con el propósito de garantizar espacios idóneos para la prestación de los servicios misionales de las sedes. El alcance de las intervenciones no generará cambios a la distribución arquitectónica o estructural ni en fachadas, y solo incluirá mantenimientos y reparaciones locativas que permitan superar fallas en las redes hidrosanitarias, eléctricas, cambios de acabados arquitectónicos y mobiliario sanitario, si se requiere, en cumplimiento de la normativa ambiental de ahorro de servicios públicos. Se evaluaron las necesidades de mantenimiento a atender, entre las que se encuentran cambios de cubierta, cambios de baterías sanitarias, cambio de luminarias por línea ahorradora y pintura general.

Unidad Operativa	Localización	Tiempo de ejecución
Jardín Infantil Tintalito Mis Primeros Pasos	Carrera 88ª No. 39-63 Sur	Hasta el veintitrés (23) de febrero de 2025
Centro Crecer Campo Alegre Calandaima	Carrera 88 No. 6A – 36	
Jardín Infantil Britalia Acunar	Calle 50 Sur No. 80 H-18	
Jardín Infantil Caracol	Carrera. 57a No. 48a Sur-67,	
Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy	Avenida Carrera 80 No. 43 - 43 Sur	
Jardín Infantil Oso De Anteojos	Carrera 100 No. 23-22	
Jardín Infantil Sabana Grande	Carrera 106 No. 15 A – 32	
Centro De Pensamiento Intercultural Shush Urek	Carrera. 98a No.15a-99	
Centro Crecer Fontibón	Calle 22 F No.106-26	
Casa Luz De Esperanza	Calle 63L No. 124-38	
Jardín Infantil Engativá	Calle 68b No. 122-3	
Jardín Infantil Los Sauces	Calle 75 No.113A -41	
Casa De La Juventud Aldea De Pensadores	Carrera 88A No. 69B-61	

Tabla 1. Unidades operativas por intervenir

Para el proceso de ejecución se inicia con una visita técnica en donde el contratante presenta al contratista las diferentes necesidades; el contratista realiza el levantamiento de medidas y presenta diferentes opciones de solución. Esta visita se llevó a cabo con el fin de un informe diagnostico acompañado de presupuesto, memoria de cálculo y programación de actividades.

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LUGAR DE EJECUCIÓN: LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

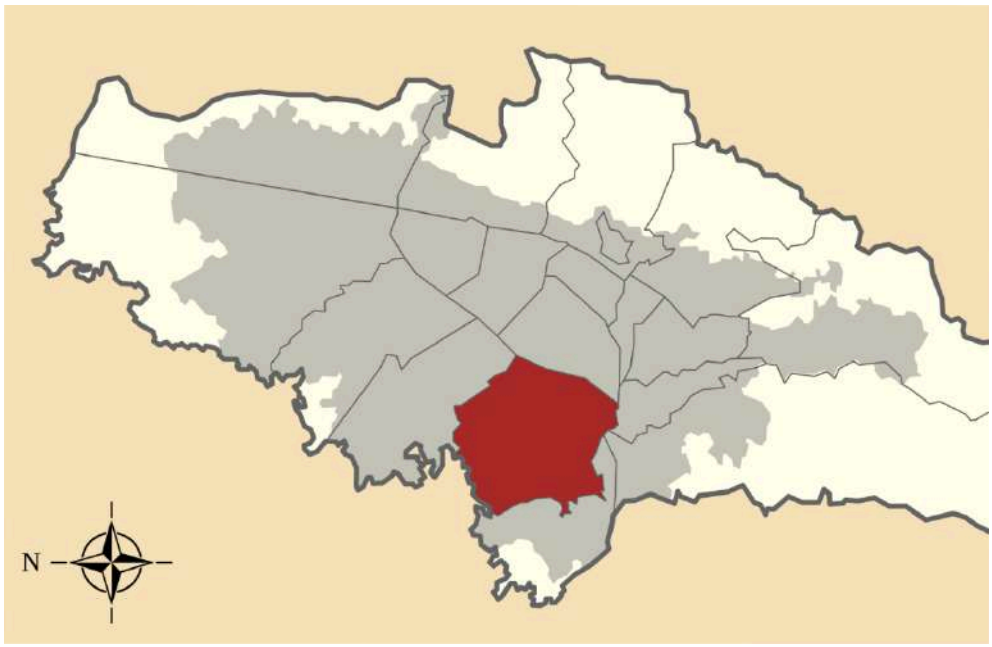


Ilustración 1. Mapa de localización localidad Kennedy.

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEMOS PASOS
UPZ: PATIO BONITO
BARRIO: TINTALITO

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA
UPZ: CALANDAIMA
BARRIO: GALÁN

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL BRITALIA ACUNAR
UPZ: GRAN BRITALIA
BARRIO: GRAN BRITALIA

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL CARACOL
UPZ: CALANDAIMA
BARRIO: GALÁN

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: CENTRO DE DESARROLLO KENNEDY
UPZ: GRAN BRITALIA
BARRIO: PASTRANA

LUGAR DE EJECUCIÓN: LOCALIDAD DE FONTIBÓN

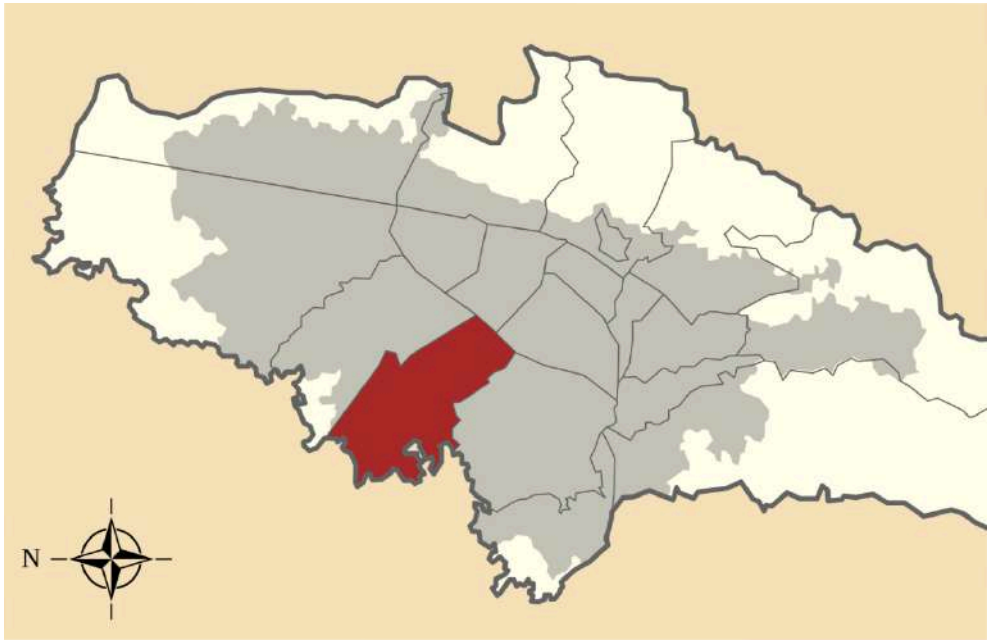


Ilustración 2. Mapa de localización localidad Fontibón.

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS
UPZ: FONTIBÓN
BARRIO: SAN JOSÉ DE FONTIBÓN

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE
UPZ: ZONA FRANCA
BARRIO: SABANA GRANDE

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK
UPZ: ZONA FRANCA
BARRIO: SABANA GRANDE

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: CENTRO CRECER FONTIBÓN
UPZ: FONTIBÓN
BARRIO: LA GIRALDA

LUGAR DE EJECUCIÓN: LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

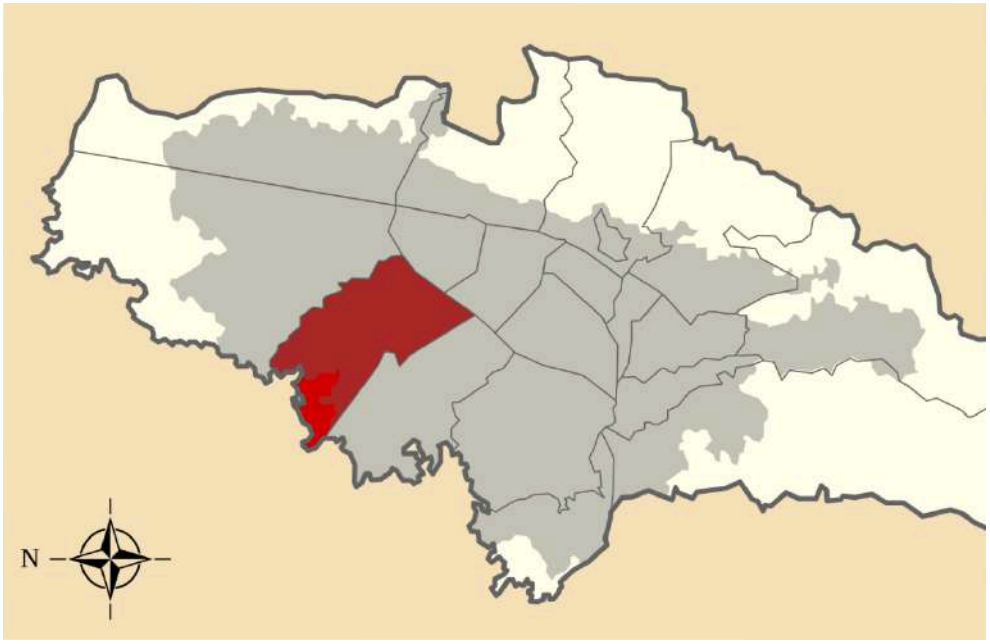


Ilustración 3. Mapa de localización localidad Engativá.

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: CASA LUZ DE ESPERANZA
UPZ: ENGATIVÁ
BARRIO: ENGATIVÁ ZONA URBANA

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ
UPZ: ENGATIVÁ
BARRIO: ENGATIVÁ ZONA URBANA

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES
UPZ: ENGATIVÁ
BARRIO: ENGATIVÁ ZONA URBANA

UNIDADES DE INTERVENCIÓN: CASA DE LA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES
UPZ: BOYACÁ REAL
BARRIO: FLORIDA BLANCA

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA 9176-2024
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT
OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

Al 31 de diciembre de 2024 ya se cuenta con un balance de obra de acuerdo con los diagnósticos iniciales, con cantidades de obra reales las cuales fueron extraídas de las labores de levantamiento y medición adelantadas posterior a la firma del acta de inicio en cada frente de obra y conforme a las necesidades de cada una de las unidades operativas.

1.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA 9176-2024**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	
CONTRATE	**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
OBJETO	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
VALOR DEL CONTRATO	Mil doscientos noventa y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil pesos con cero centavos.($ 1.299.753.000,00)
FECHA DE ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 11 DE 2024
FECHA INICIAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO	DICIEMBRE 31 DE 2024
PRORROGA	54 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	FEBRERO 23 DE 2025
TIEMPO TRANSCURRIDO	Treinta y un (31) días
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**15,30%**

Tabla 2. Información general del contrato

2. CRONOGRAMA

Las actividades programadas para la ejecución de la obra se están desarrollando conforme a los cronogramas establecidos, aunque con ciertas variaciones. Durante el presente mes, se han ejecutado actividades correspondientes a los capítulos de preliminares. Asimismo, se están implementando planes de contingencia para mitigar posibles riesgos de atraso. Por el momento, no se reportan retrasos significativos que puedan afectar la fecha de finalización prevista del proyecto.

Es importante destacar que el cronograma ha sufrido modificaciones debido a cambios en las actividades originados por la naturaleza de la obra y las condiciones climáticas. Sin embargo, estas adaptaciones no han alterado ni prolongado los tiempos de entrega ni la fecha de finalización del proyecto.

Se anexan programaciones de obra por unidad operativa.

2.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las siguientes actividades en cada uno de los frentes:

2.1.1 KENNEDY

Jardín Infantil Tintalito Mis Primeros Pasos

- Desmonte de cielo raso.
- Desmonte de red y salidas eléctricas.
- Desmonte de teja en fibrocemento.
- Disposición de teja en sitio autorizado.
- Pintura de cerchas y canales existentes.

Centro Crecer Campo Alegre Calandaima

- Desmonte de canaleta existente.
- Desmonte de puntos de cableado estructurado.
- Prolongación de circuito de red de emergencia.
- Instalación de canaleta.

Jardín Infantil Caracol

- Resanes en muros y techos.
- Desmonte de piso existente (polyfoam).
- Limpieza de superficie de piso.
- Aplicación de primera mano de pintura tipo vinilo.
- Desmonte de superboard en puntos con humedad.

2.1.2 FONTIBÓN

Jardín Infantil Oso de Anteojos

- Retiro de emulsión asfáltica.
- Demolición parcial de alistado de piso en áreas de empozamiento.
- Desmonte de luminarias tipo panel de sobreponer.
- Resane de fisuras y grietas en muros y techos.
- Demolición de pañete.
- Pañete en áreas afectadas por humedad.
- Aplicación de pintura tipo vinilo en el área del comedor.
- Aplicación de pintura epóxica en el área de la cocina.

- Tratamiento de fisuras en placa con sellante elastomérico.

Jardín Infantil Sabana Grande

- Demolición de enchape de muros.
- Regatas para salidas hidrosanitarias.
- Desmonte de luminarias.
- Instalación de luminarias de emergencia.
- Desmonte de duchas en baños del primer piso.
- Instalación de reflectores.
- Instalación de luminarias herméticas.
- Resane de grietas y fisuras en muros y techos.
- Aplicación de pintura tipo vinilo en área de comedor.
- Aplicación de pintura epóxica en área de comedor a H=1.50 m.
- Desmonte de espejos.
- Desmonte de sanitarios.

Centro de Pensamiento Intercultural Shush Urek

- Mantenimiento de cubierta: sello de tornillería y reparación de goteras en teja y canal.
- Limpieza de canales.
- Desmonte de tubería cuadrada.
- Preparación de superficies y limpieza con thinner.
- Pintura en esmalte del interior de las aulas.
- Llegada de material.

Centro Crecer Fontibón

- Desmonte de luminarias.
- Instalación de reflectores en patio.
- Resane de fisuras y grietas en muros y techos del área del comedor.
- Aplicación de pintura en vinilo blanco tipo 1.
- Aplicación de pintura epóxica en muros del comedor a H=1.50 m.

2.1.3 ENGATIVÁ

Casa Luz de Esperanza

- Demolición de viga cinta en concreto con acero de refuerzo.
- Demolición de materas en mampostería.
- Retiro de manto existente en materas.
- Demolición de viga cinta en concreto con acero de refuerzo.
- Desmonte de salidas eléctricas en materas.
- Desmonte de luminarias tipo tortuga en materas.

Jardín Infantil Engativá

- Desmonte de cubierta de comedor y zona de colchonetas.
- Suministración e Instalación de teja tipo EcoRoof en área de comedor.

- Demolición de mampostería para apertura de ventana.
- Pañetes y filos.
- Desmonte de ventanería existente en sala de reuniones.
- Aplicación de resanes en muros.
- Aplicación de primera mano de pintura tipo vinilo.
- Aplicación de resanes en área de cocina.
- Desmonte de tanques de reserva.
- Llegada de material eléctrico para ejecución de actividades.

Jardín Infantil Los Sauces

- Llegada de material para acabados a sitio.

Casa de la Juventud Aldea de Pensadores

- Llegada de material eléctrico para ejecución de actividades.

3. PORCENTAJES PROGRAMADOS DE AVANCE Y PORCENTAJES EJECUTADOS

A continuación, se presentan los avances semanales correspondientes al periodo del mes de diciembre de 2024. En el informe se detalla tanto el progreso programado como el progreso ejecutado durante dicho periodo.

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25			15,30%	15,30%	

Tabla 3. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado proyecto.

3.1. KENNEDY

3.1.1 JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEMOS PASOS

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	**12,67%**	19.00%	19.00%	19.00%	N/A

Tabla 4. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.1.2 CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	46,55%	40,00%	40,00%	40,00%	6,55%

Tabla 5. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.1.3 JARDÍN INFANTIL BRITALIA ACUNAR

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	5.0%	0,0%	0,0%	0,0%	5.0%

Tabla 6. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.1.4 JARDÍN INFANTIL CARACOL

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	20.00%	5,00%	0.0%	0.0%	15,00%

Tabla 7. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.1.5 CENTRO DE DESARROLLO KENNEDY

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	8,0%	0.0%	0.0%	0.0%	8,0%

Tabla 8. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.2 FONTIBÓN

3.2.1 JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25			15,30%	15,30%	

Tabla 9. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.2.2 JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25			15,30%	15,30%	

Tabla 10. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.2.3 CENTRO DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25			15,30%	15,30%	

Tabla 11. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.2.4 CENTRO CRECER FONTIBÓN

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25			15,30%	15,30%	

Tabla 12. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.3 ENGATIVÁ

3.3.1 CASA LUZ DE ESPERANZA

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	7,46%	7,46%	1,41%	1,41%	

Tabla 13. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.3.2 JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	3,97%	3,97%	0,64%	0,64%	

Tabla 14. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.3.3 JARDÍN INFANTIL LOS SAUCES

	Periodo	Programado			acumulado	
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	2,64%	2,64%	0,00%	0,00%	

Tabla 15. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

3.3.4 CASA DE LA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES

	Periodo	Programado	Programado acumulado	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Atraso
DICIEMBRE	11/12/24 – 10/01/25	1,02%	1,02%	1,15%	1,15%	

Tabla 16. Porcentajes programados y porcentajes ejecutado frente

4. BALANCE DE OBRA

A continuación, se presenta balance presupuestal al 31 de diciembre de 2025.

BALANCE PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 9176-2024-GRUPO 3			
OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ,SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			
VALOR DEL CONTRATO			$ 1.299.753.000,00
DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO POR SEDE		PRESUPUESTO AJUSTADO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA
LOCALIDAD FONTIBON	$ 223.517.303,01		$ 223.517.313,17
JI OSO DE ANTEOJOS	$ 36.895.524,00		$ 68.682.112,39
JI SABANA GRANDE	$ 51.490.747,00		$ 93.332.262,87
CENTRO CRECER FONTIBON	$ 83.446.259,78		$ 16.262.871,63
CPI SHUS	$ 51.684.772,23		$ 45.240.066,28
LOCALIDAD KENNEDY	$ 360.687.431,15		$ 360.687.390,27
JI TINTALITO	$ 90.213.940,69		$ 84.940.409,30
JI BRITALIA	$ 58.406.228,01		$ 54.667.970,36
JI CARACOL	$ 74.877.725,55		$ 79.053.808,00
CDC KENNEDY	$ 54.708.220,50		$ 56.286.835,08
CENTRO CRECER ALEGRIA CALANDAIMA	$ 82.481.316,40		$ 85.738.367,53
LOCALIDAD ENGATIVA	$ 271.528.044,00		$ 382.010.725,81
JI ENGATIVA	$ 67.838.913,00		$ 106.417.690,11
JI LOS SAUCES	$ 89.096.908,00		$ 89.096.884,01
CASA JUVENTUD	$ 34.850.140,00		$ 97.290.100,00
CENTRO LUZ ESPERANZA	$ 79.742.083,00		$ 89.206.051,69
SUMATORIA COSTO DIRECTO	$ 855.732.778,1600		$ 966.215.429,2500
ADMINISTRACION	28,52%	$ 244.054.988,33	275.564.640,42
IMPREVISTO	1%	$ 8.557.327,78	9.662.154,29
UTILIDAD	5,00%	42.786.638,91	48.310.771,46
TOTAL DE AIU	34,52%	295.398.955,02	333.537.566,18
AJUSTE AL PESO			4,57
VALOR TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTAL POR SEDES SDIS		$ 1.151.131.733,18	$ 1.299.753.000,00
VALOR CONTRATO			
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 1.299.753.000,00		
VALOR TOTAL DE PRESUPUESTOS	$ 1.299.753.000,00		
DIFERENCIA DE VALORES	$ -		

4.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

4.1.1 KENNEDY

Jardín Infantil Tintalito Mis Primeros Pasos



Ilustración 4. Desmonte de Cielo raso



Ilustración 5. Desmonte de Cielo raso



Ilustración 6. Desmonte de Cielo raso



Ilustración 7. Desmonte de Cielo raso



Ilustración 8. Desmonte de red electrica



Ilustración 9. Desmonte de Teja existente en fibrocemento.





Ilustración 10. Desmonte de Teja existente en fibrocemento.	Ilustración 11. Protección de piso .

Tabla 17. Registro fotográfico Jardín Infantil Tintalito Mis Primeros Pasos

Centro Crecer Campo Alegre Calandaima



Ilustración 12. Desmonte de canaleta Existente



Ilustración 13. Desmonte de canaleta Existente



Ilustración 14. Instalación red nuevas lámparas de Emergencia



Ilustración 15. Instalación red nuevas lámparas de Emergencia



Ilustración 16. Instalación de nuevo Muro en drywall



Ilustración 17. Instalación de nuevo Muro en drywall

Tabla 18. Registro fotográfico Centro Crecer Campo Alegre Calandaima

Jardín Infantil Caracol



Ilustración 18. Desmonte piso existente.



Ilustración 19. Desmonte piso existente.



Ilustración 20. Desmonte piso existente.



Ilustración 21. Desmonte piso existente.



Ilustración 22. Resane corredor Existente.



Ilustración 23. Resane corredor Existente.



Ilustración 24. **Retiro de pegante sobre piso.**



Ilustración 25. Resane corredor Existente.

Tabla 19. Registro fotográfico Jardín Infantil Caracol

4.1.2 FONTIBÓN

Jardín Infantil Oso De Anteojos



Ilustración 26. Verificación de niveles de cubierta



Ilustración 27. Verificación de niveles de cubierta



Ilustración 28. Verificación de niveles de cubierta



Ilustración 29. Verificación de niveles de cubierta



Ilustración 30. Estado apantallamiento



Ilustración 31. Estado apantallamiento



Ilustración 32. Fisuras y grietas en placa de cubierta



Ilustración 33. Fisuras y grietas en placa de cubierta



Ilustración 34. Demolición de mortero



Ilustración 35. Retiro de emulsión



Ilustración 36. Demolición de mortero



Ilustración 37. Demolición de mortero



Ilustración 38. Verificación empozamientos

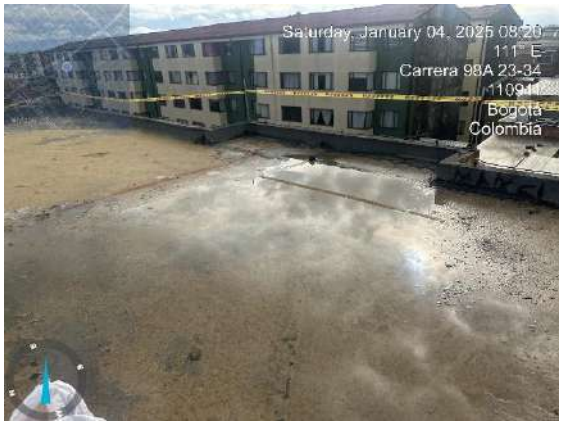


Ilustración 39. Verificación empozamientos





	
Ilustración 40. Demolición de mortero	Ilustración 41. Demolición de mortero
	
Ilustración 42. Resane de muros	Ilustración 43. Demolición de mortero
	
Ilustración 44. Resane de muros	Ilustración 45. Resane de techos
	
Ilustración 46. Pintura en vinilo	Ilustración 47. Pintura en vinilo

Tabla 20. Registro fotográfico Jardín Infantil Oso De Anteojos

Jardín Infantil Sabana Grande

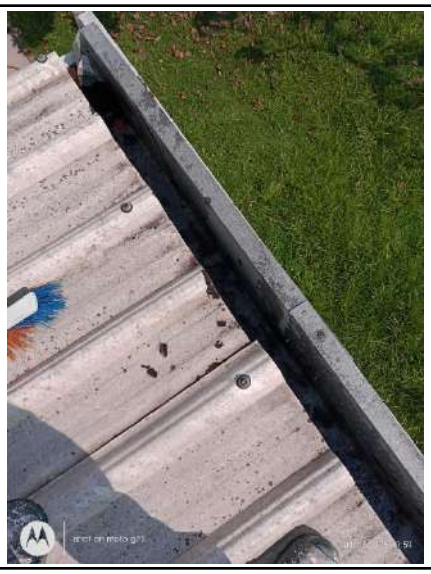
	
	
	
	

Tabla 8. Registro fotográfico Jardín Infantil Sabana Grande

Centro De Pensamiento Intercultural Shush Urek



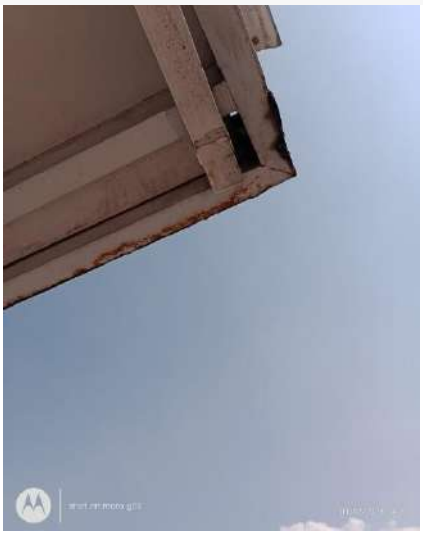
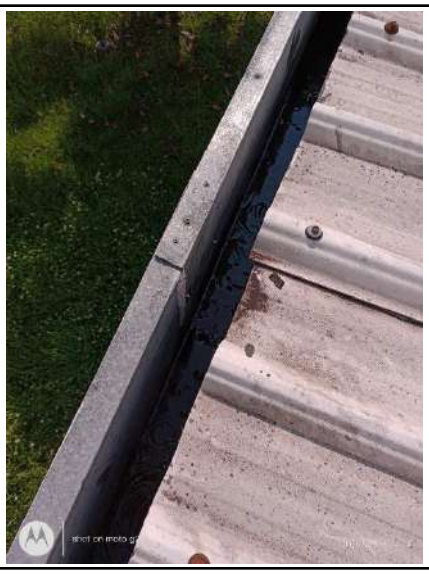











	
	 10/01/2025 307° NW Colombia, 15D, Colombia
	

Tabla 9. Registro fotográfico Centro De Pensamiento Intercultural Shush Urek

Centro Crecer Fontibón


	



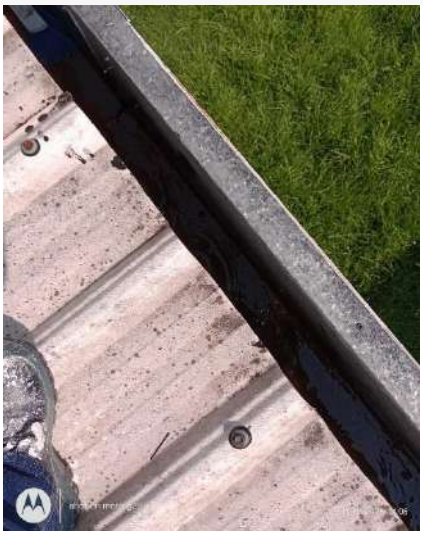





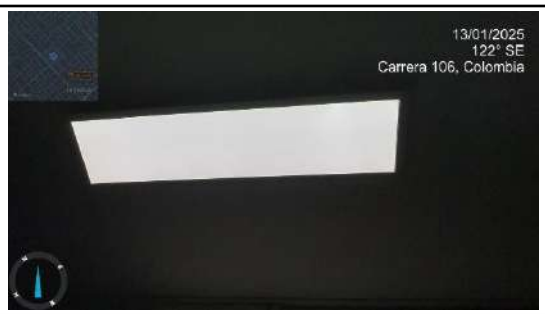



Tabla10. Registro fotográfico Centro Crecer Fontibón

4.1.3 ENGATIVÁ

Casa Luz De Esperanza


Carrera 125 63L-30
111031
Bogotá
Colombia


Carrera 125 63L-30
111031
Bogotá
Colombia









Tabla 11. Registro fotográfico Casa Luz De Esperanza

Jardín Infantil Engativá


29° NE
Calle 66B 122-3
111031
Bogotá
Colombia








Calle 66B 122-3
111031
Bogotá
Colombia


Calle 66B 122-3
111031
Bogotá
Colombia




Calle 66B 122-3
111031
Bogotá
Colombia

Tabla 12. Registro fotográfico Jardín Infantil Engativá

Jardín Infantil Los Sauces

Tabla 21. Registro fotográfico Jardín Infantil Los Sauces

Casa De La Juventud Aldea De Pensadores

Tabla 3. Registro fotográfico Casa de la juventud "Aldea de pensadores"

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5.1 COMITÉS DE OBRA

COMITÉ N°	PERIODO	HORA
Comité de obra N°1	3 de enero de 2025	10:30 am
Comité de obra N°2	9 de enero de 2025	8:00 am
Comité de obra N°3	17 de enero de 2025	11:00 am

Tabla 22. Relación comités de obra

5.2 INFORMES SEMANALES PRESENTADOS

COMITÉ N°	PERIODO	FECHA PRESENTACIÓN
SEMANA N°1	11 al 15 de diciembre de 2024	16 de diciembre de 2024
SEMANA N°2	16 al 22 de diciembre de 2024	7 de enero de 2025
SEMANA N°3	23 al 29 de diciembre de -2024	7 de enero de 2025
SEMANA N°4	30 de diciembre 2024 al 05 de enero de 2025	7 de enero de 2025
SEMANA N°5	6 al 12 de enero de 2025	13 de enero de 2025

Tabla 23. Relación informes semanales contrato de obra

5.3 RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se hace relación del personal:

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	LOCALIDAD
Orlando Robles Montesino	Director de obra	
Sharon Chaparro	Residente de obra	Kennedy
Carol Forero González	Residente de obra	Fontibón
Jessika Paola Merchán	Residente de obra	Engativá
Johana Catherine Chisacá	Residente SSTA	
Daniel Talero	Inspector de obra	Kennedy
Juan Camilo Quintero	Inspector de obra	Fontibón
Adriana Castellanos	Inspector de obra	Engativá
Camilo Cárdenas	Inspector de obra	
William Nemeguen	Inspector SST	Kennedy
Yamile Andrea Mora	Inspector SST	Fontibón

Tabla 24. Relación de personal administrativo

PERSONAL OPERATIVO

KENNEDY

NOMBRE	CARGO	CEDULA
William Nemeguen	Inspector SST	79.829.872
Fabio Nelson Gómez Gutiérrez	Técnico eléctrico	79.924.627
Oscar Eduardo Uñate Villar	Contratista estructuras	3.017.955
Luis David Martínez Pineda	Instalador de cubierta	92.545.019
Carlos Eduardo Medina Cardona	Instalador de cubierta	8.541.121
Luis David Martínez Pineda	Instalador de cubierta	92.545.019
Luis Daniel Tique	Pintor estructura.	80.141.076
Juan David Valdiri	Aux. Pintor estructura.	1.041.255.571
Roberto Rafael Palacios González	Obra civil	1.124.513.333
José Leonardo Gonzales	Obra civil	25.251.092
José Darío Castro	Personal de logística materiales	4.198.494

Tabla 25. Relación de personal operativo localidad Kennedy

FONTIBÓN

NOMBRE	CARGO	CEDULA
Wilson Díaz Rojas	Encargado de obra	79.805.093
Harol Sneider Cubillo	Oficial de obra	1.000.348.247
Winder Ballesteros	Maestro general	80.878.816
Sebastián Moreno	Ayudante de obra	1.010.225.639
Andrés Felipe Jiménez	Pintor	1.023.960.348
Jhoan Sebastián Álvarez	Ayudante de obra	1.000.774.521
Luis Javier Ozuna	Maestro general	79.378.935
Fredy Cubillos	Ayudante de obra	1.023.911.526
Wilmar Hernández	Oficial de obra	1.073.968.408
Jhon Fredy Romero	Pintor	80.739.184
Anderson Zapata	Oficial de obra	1.000.801.767
Jairo Ávila	Técnico eléctrico	4.249.282
José Alfonso Barbosa	Técnico eléctrico	79.597.144
José Darío Castro	Personal de logística materiales	4.198.494

Tabla 26. Relación de personal operativo localidad Fontibón

ENGATIVÁ

NOMBRE	CARGO	CEDULA
William Duarte Rueda	Subcontratista de obra	1.098.659.052
Jhoan Sebastián Álvarez	Ayudante de construcción	1.000.774.521
José Alfonso Barbosa	Técnico electricista	79.597.144
Fabio Nelson Gómez Gutiérrez	Técnico electricista	79.924.627
José Darío Castro	Personal de logística materiales	4.198.494
Oliverio Barrera Becerra	Subcontratista de cubierta	1.057.570.636
Oscar Eduardo Uñate	Oficial de cubierta	3.017.955
Luis David Martínez	Oficial de cubierta	92.545.019
Carlos Eduardo Medina	Oficial de cubierta	8.541.121

Tabla 27. Relación de personal operativo localidad Engativá

5.4 BITÁCORA DE OBRA

Se anexa copia de las bitácoras de obra

ANEXO 2. Copia bitácora frentes en ejecución.

6. ESTADO ACTUAL DEL TIEMPO EN EL PERIODO COMPRENDIDO

El clima predominante en la ciudad donde se ejecuta el proyecto, durante el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, presentó condiciones variables. Se registraron episodios de precipitaciones fuertes, alternados con días de cielo mayormente despejado.

S: Soleado **L:**Lluvioso **N:**Nublado

ESTADO	DICIEMBRE																						ENERO									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AM	S	N	N	S	N	L	L	S	N	N	N	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	S	N	N	L	L	S	S	L	L	L	S
PM	S	N	N	N	N	N	L	N	N	L	N	N	L	L	L	L	L	L	L	L	L	N	N	N	L	L	N	N	L	L	L	N

Tabla 28. Reporte de clima

7. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZA

7.1 PÓLIZAS DE OBRA DEL CONTRATO

Las pólizas emitidas por la compañía aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** presentadas por el contratista CONSORCIO OBRAS GT, cumplen con los requisitos de valor amparado y vigencia establecidos en el contrato de obra 9176-2024. A continuación, se detallan las fechas de vigencia de las pólizas actualizadas, junto con el valor asegurado correspondiente:

POLIZAS SEGÚN Acta de inicio	**COMPAÑÍA DE SEGUROS**		**POLIZA No.**
	Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100356421 No. Anexo 2
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/12/2024	23/08/2025	259.950.600,00
Prestaciones Sociales	11/12/2024	23/02/2028	129.975.300,00
Estabilidad de la Obra	23/02/2025	23/02/2030	259.950.600,00
FECHA DE APROBACIÓN		30/12/2024	
ESTADO DE LA POLIZA		**ACTUALIZADA**	
POLIZAS SEGÚN Acta de inicio	**COMPAÑÍA DE SEGUROS**		**POLIZA No.**
	Compañía Mundial de Seguros S.A.		NB-100091415 No. Anexo 3
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	19/11/2024	23/02/2025	260.000.000,00
Patronal	19/11/2024	23/02/2025	260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	19/11/2024	23/02/2025	260.000.000,00
Vehículos Propios y No Propios	19/11/2024	23/02/2025	260.000.000,00
FECHA DE APROBACIÓN		30/12/2024	
ESTADO DE LA PÓLIZA		ACTUALIZADA	

Hasta la fecha, no se han realizado modificaciones de ningún tipo a las garantías presentadas.

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL

8.1 CONTROL Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO URBANO

Durante la ejecución de la obra, se implementaron los controles y medidas necesarias para garantizar el bienestar urbano y la seguridad de la población cercana. Se adoptaron mecanismos para reducir riesgos, tales como la instalación de señales, cintas para delimitar áreas de circulación restringida a los transeúntes no autorizados, construcción de pasos temporales para peatones y vehículos (cuando sea necesario), colocación de vallas y/o carteles de identificación, así como otras acciones de señalización, protección y seguridad requeridas según las necesidades específicas de cada frente de obra intervenido.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- El contratista permanece atento a cualquier inquietud que surja durante el desarrollo del contrato, reafirmando su compromiso con el cumplimiento íntegro de las responsabilidades asignadas.
- El avance en la ejecución de la obra alcanzó un 15,30% durante este mes. No se registraron atrasos generales en las labores; sin embargo, se presentaron inconvenientes puntuales en algunas actividades exteriores debido a condiciones externas.
- A la fecha no se ha presentado ninguna acta parcial de cobro, para el pago de las obras ejecutadas durante el período de referencia.
- Durante este período, se cumplió con el cronograma establecido para charlas, capacitaciones e inspecciones en las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental. El acompañamiento constante al personal en obra permitió que no se reportaran accidentes ni incidentes laborales. Se implementaron procedimientos de trabajo seguro para actividades de alto riesgo, como trabajos en alturas y labores eléctricas, de acuerdo con la normatividad vigente.

Finalmente, las actividades programadas fueron ejecutadas de manera parcial conforme a lo planeado.


Para constancia de lo anterior, se firma el presente bajo la responsabilidad expresa de los que en este intervinieron, a los once (11) días de mes de enero de 2025.



ING. JESSIKA MERCHÁN
Residente de obra – Localidad Engativá



ARQ. SHARON CHAPARRO
Residente de obra – Localidad Kennedy



ARQ. CAROL FORERO G.
Residente de obra – Localidad Fontibón

ARQ. ORLANDO ROBLES MONTESINO
Director de obra

ANEXOS

- FICHAS TÉCNICAS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
- BALANCE DE OBRA AL 31-12-2024
- PROGRAMACIÓN DE OBRA
- BITÁCORAS DE OBRA

BITÁCORAS DE OBRA

FONTIBÓN

Jardín Infantil Oso De Anteojos

Contrato de obra N° 9176-2024

Objeto: Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

Unidad Operativa: Jardín Infantil Oso de Anteojos
Carrera 100 # 23-22

Contratista de Obra: Consorcio Obras GT

Contrato de interventoría No. 9355-2024

Interventoría: Consorcio Intersedes

Objeto: Realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

Arq. Orlando Robles
Director de Obra

Arq. Carol Forero
Residente de Obra

Ing. Margarita Gomez
Directora de Interventoría

Ing. Divan Tamayo
Residente de Interventoría

Jueves 26 de diciembre de 2024

Se realiza recorrido por áreas a intervenir, se solicita a la sdis el retiro de sellos de seguridad y retiro de elementos del área de bodega, despensa comedor y cocina.

Se realiza inducción al personal de obra.

Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 4 oficiales de obra, 1 técnico electrico.

Tiempo: se presentan lluvias ligeras llovizna.

Carol Farero G
Carol Farero González
E Arquitecta

Duvan Tamayo
Inventario

Viernes, 27 de diciembre de 2024

Inician actividades de reconocimiento y retiro de emulsión asfaltica en el área de la cubierta, se encuentra que bajo la emulsión asfaltica no hay morteros idoneos, ya que este esta construido mayormente con arena amarilla.

Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, técnico eléctrico, 4 oficiales de Obra.

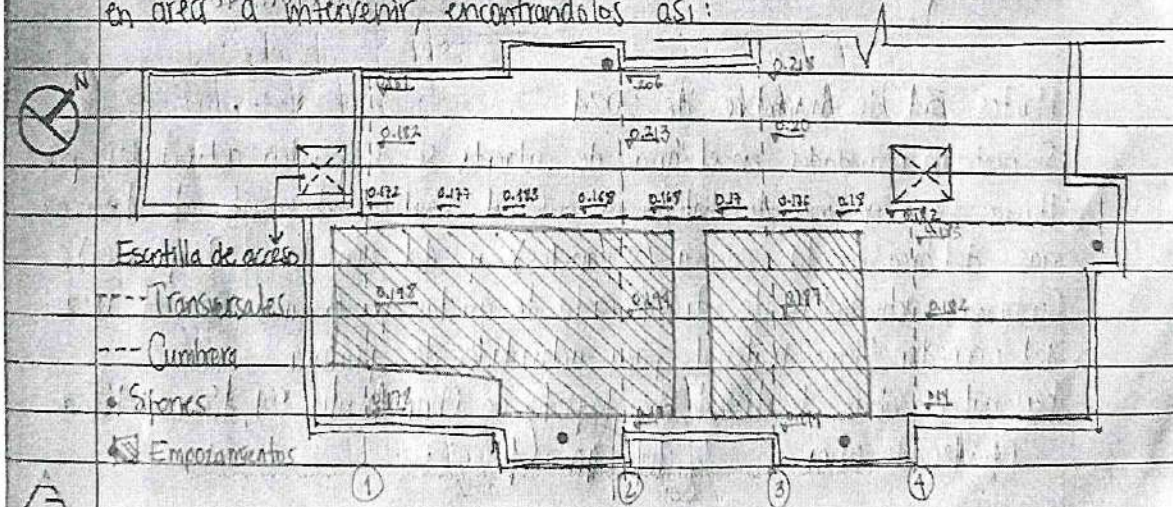
Tiempo: Se presentan fuertes lluvias en la noche.

Carol Farero G
Carol Farero González
E Arquitecta

Duvan Tamayo
Inventario

Sábado, 28 de diciembre de 2024

Continuan actividades de raspado, retiro y disposición de emulsión asfaltica, se evidencian varias fisuras en el mortero y en los bordillos delimitadores de áres. Se realiza verificación de niveles en área a intervenir, encontrandolos así:




Miércoles 1 de enero 2025
Día festivo, no se ejecutan actividades.
Jueves 2 de enero de 2025
Se realiza revisión de áreas críticas de cubierta en compañía del Ing. Duvan Tamayo - Interventoría, continúan actividades de retiro de emulsión asfaltica en cubierta y tratamiento de fisuras en área de comedor llega a sitio luminarias (Pareles redondos).
Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, técnico eléctrico, oficiales de Obra, residente de interventoría.
Tiempo:

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tamayo
Interventoría

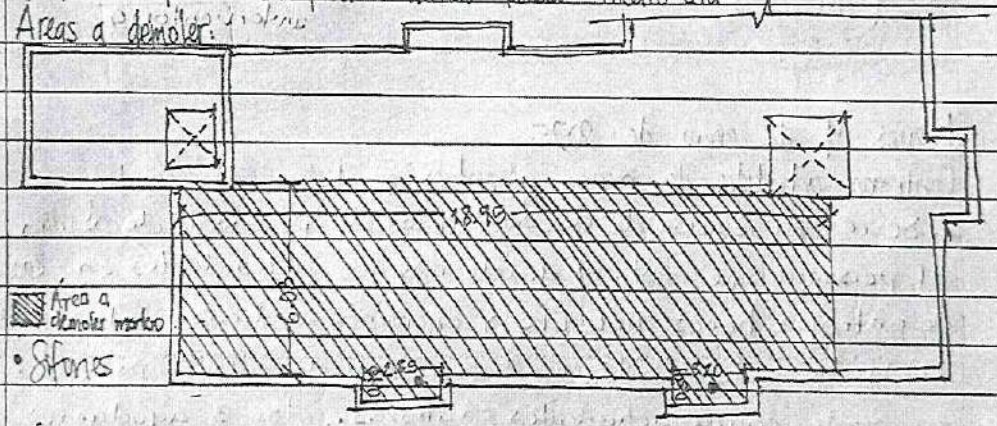Viernes 3 de enero de 2025
Continúan actividades de obra blanca en el área del comedor, retiro de fisuras, se realiza enbrado y fraguado de emulsión asfaltica retirada. Se realiza demarcación de áreas de mortero a demoler.
Personal en obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, oficiales de obra.
Tiempo: Se presentan fuertes lluvias pasado medio día
Áreas a demoler:



Área total a picar mortero: 117,99 m².
Esta área corresponde al área aferente a los dos sifones marcados y es en esta donde se presentan los empozamientos de mayor nivel.

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tamayo
Interventoría

Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 3 Oficiales.
Tiempo: Seco.

Carol Forero González
Arquitecta

Devan Tamayo
Interventoria

Viernes 10 de Enero de 202:
Continuan actividades de demolicion de muros, se realiza enlonado y trasiego de residuo de demolicion, inicia tratamiento de fisuras y grietas en placa con calfador elastomerico monocomponente (Sikaflex PRO 3)
Continuan actividades en el area de comedor y cocina.
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de obra, Auxiliar SST, 3 oficiales

Carol Forero González
Arquitecta

Devan Tamayo
Inta.

Sábado 11 de Enero de 2025
Continuan actividades de enlonado y trasiego de escombros, se realizan actividades de sello de grietas en placa. Se realiza pintura de muros con vinilo tipo 1 y pintura epóxica a h= 1.50m en el área del comedor.
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, Técnico Eléctrico, 3 oficiales

Carol Forero González
Arquitecta

Devan Tamayo
Inta.

Lunes 13 de Enero de 2025.

Jardín Infantil Sabana Grande

Contrato de Obra N° 9176-2024

Objeto: Realizar la optimización de la infraestructura de los centros sedes y predios donde la secretaria Distrital de Integración social presta sus servicios o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de Cuidado

Unidad Operativa: Jardín Infantil Sabana Grande
Cra 106 # 15A-32

Contratista de Obra: Consorcio Obras GT
Carrera 106 N° 15A-

Contrato de Interventoría: N° 9355-2024

Interventoria: Consocio Intersedes

Objeto: Realizar la interventoria técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaria distrital de Integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado.

Arq. Orlando Robles
Director de Obra

Arq. Carol Forero G.
Residente de Obra.

Ing. Margarita Gomez
Directora de Interventoria

Ing Duvan Tamayo
Residente de Interventoria

Lunes 30 de diciembre de 2024
Se realiza desmonte de luminarias por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, llega a sitio luminarias para reemplazo e instalación (Panel 120x30, luminarias de emergencia, luminarias herméticas, entre otras) así como material electrico complementario.
Personal en Obra: Residente de obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, técnico electricista
Tiempo: Se presentan lluvias fuertes en horas de la tarde.

Carol Forero González
Arquitecta

Juan Tamayo
Interventoria

Sábado 4 de enero de 2025
Llega a sitio material hidrosanitario y de obra civil para ejecución de actividades
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra.
Tiempo: Se presentan lluvias ligeras.

Carol Forero González
Arquitecta

Juan Tamayo
Interventoria

Martes 7 de enero de 2025
Se realiza instalación de panel 60x60 de incrustar en áreas de segundo piso, se realiza corte con pulidora para regatas de adecuaciones en baño. Llegan marcos para luminarias. Inician actividades de preparación de superficies en el área del comedor para pintura. Llega material a sitio.
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST 1 Oficial electrico 2 oficiales.

Juan Tamayo
Interventoria

Miércoles 8 de enero de 2025
Continuan actividades de instalación de luminarias, se instalan lámparas de emergencia; resane de muros y techo.
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, SST, 3 Oficiales

Juan Tamayo
Interventoria

Carol Forero González
Arquitecta

Tiempo: Seco, no se presentan lluvias.

Carol Forero G.
Carol Forero González
Arquitecta

Devon Tamayo
Interventoría

Lunes 13 de enero de 2025.

Se realizan actividades en la zona de los baños, amarre de hierro y encofrado para vaciado de mesón en el baño occidental del primer piso, se realiza encofrado para mesón de baño oriental, Se realiza vaciado de meson en baño occidental; llega a obra material hidrosanitario. Continua instalación de luminarias.

Personal en obra: residente de obra, inspector de obra, auxiliar sst, técnico eléctrico, 3 oficiales.

Tiempo: seco con leves lluvias.

Carol Forero G.
Carol Forero González
Arquitecta

Devon Tamayo
Interventoría

Martes 14 de enero de 2025

Se realiza cambio de sifones flexibles de plástico, se realiza instalación de hierros de refuerzo en el baño oriental, continua instalación de luminarias instalación de sifones tipo botella.

Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, auxiliar sst, tecnico electrico, 3 oficiales.

Tiempo: Seco

Carol Forero G.
Carol Forero González
Arquitecta

Devon Tamayo
Interventoría

Miércoles 15 de enero 2025

Centro De Pensamiento Intercultural Shush Urek

Contrato de Obra N° 9176-2024

Objeto: Realizar la optimización de la infraestructura de los centros sedes y predios donde la secretaría distrital de Integración social presta sus servicios sociales o requiera su intervención en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

Unidad Operativa: CPI Shush Urek Kusreik Ya
Diagonal 15D #98-40

Contratista de Obra: Consorcio Obras GT

Contrato de Interventoría N° 9355-2024

Interventoría: Consorcio Intersedes

Objetivo: Realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención en el marco de la implementación del sistema distrital de Cuidado.

Arq Orlando Robles
Director de obra.

Arq. Carol Foros G.
Residente de Obra.

Ing. Margarita Gomez
Directora de Interventoría

Ing Duvan Tamayo
Residente de Interventoría

Sábado 4 de Enero de 2025
Llega a sitio material hidrosanitario y de obra civil, se realiza descargue de compresor para preparar inicio de actividades internas de las aulas. Se realiza recorrido por los tres modulos a intervenir, se evidencia que el guardaescobas presenta deterioro, desprendimiento e incluso hay zonas que no tienen guardaescobas, de igual manera, se evidencian láminas de easy panel desprendidas y hundidas, forros de cubierta abollados y desprendidos.
Personal en sitio: Residente de Obra, Inspector de Obra, 1 Oficial
Tiempo: Se presentan lluvias ligeras.

Carol Forero González
Arquitecta

Dayan Tamayo
Interventoria

Martes, 7 de enero de 2025
Inician actividades de mantenimiento de cubierta, sello con sikaflex de goteras, limpieza de canales
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 1 Oficial de Obra + 1 ayudante.

Dayan Tamayo
Interventoria

Miércoles, 8 de enero de 2025
Inician actividades de tratamiento, limpieza con thinner de muros interiores, continuan actividades de mantenimiento de cubierta, limpieza de canales, sello de goteras y filtraciones
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, 2 oficiales. Tiempo: Lluvias en la tarde.

Dayan Tamayo
Interventoria

Jueves 9 de enero de 2025
Se realiza visita observando actividades de mantenimiento de cubierta, limpieza muros internos de los 8 aulas objeto de intervencion y proteccion de piso se recomienda organizar en cubierta (incluido en el mantenimiento) la tubería q se encuentra expuesta

PASOS

Supervisor

Centro Crecer Fontibón

Contrato de Obra N° 9176-2024

Objeto: Realizar la optimización de la infraestructura de los centros sedes y predios donde la secretaría distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado

Unidad Operativa: Centro Crecer Fontibón
Calle 22 F # 106-26

Contratista de Obra: Consorcio Obras GT

Contrato de Interventoría N° 9355- 2024

Interventoría: Consorcio Intersedes

Objeto: Realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaría distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de Cuidado.

Arq Orlando Robles
Director de Obra

Arq. Carol Forero G.
Residente de Obra.

Ing. Margarita Gomez
Directora de Interventoría

Ing. Duvan Tamayo
Residente de Interventoría.

Lunes 30 de diciembre de 2024
Se realiza desmonte de luminaria por parte de la secretaria de integración social, llega a sitio luminarias nuevas para instalar (panel 120x30, luminarias de emergencia, luminaria hermetica Led).
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Auxiliar SST, Técnico electricista
Tiempo: Se presentan lluvias fuertes en horas de la tarde

Carol Forero González
Arquitecta

Jhon Tovar
Interventoria

Sábado 4 de enero de 2025
Llega material hidrosanitario y de obra civil para ejecución de actividades
Personal en obra: Residente de Obra, Inspector de Obra
Tiempo: Se presentan ligeras lluvias

Carol Forero González
Arquitecta

Jhon Tovar
Interventoria

Martes 7 de enero de 2025

Lunes 30 de diciembre de 2024
Llega material eléctrico a la sede Centro Crecer, se realiza descargue de material, a la fecha aun no se realiza retiro de las luminarias por parte de la SDIS.
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Tecnico Electrico Auxiliar SST.

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tarazo
Interventoria

Jueves, 02 de Enero de 2025
Se realiza desmonte de luminarias por parte de la SDIS, se realiza preparación de superficies (muros y techos) para iniciar actividades de resane.
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Tecnico Electrico Auxiliar SST, 2 oficiales

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tarazo
Interventoria

Viernes, 03 de Enero de 2025
Se ejecutan actividades de tratamiento de fisuras y grietas, se realiza resane en muros y techos.
Personal en Obra: Residente de Obra, Inspector de Obra, Tecnico Electrico Auxiliar SST, 2 oficiales.

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tarazo
Interventoria

Sábado, 04 de Enero de 2025
Continuan actividades de resane y lijado en muros y techos, se realiza primera mano de vinilo en muros y techos. Se realiza instalación de reflectores en patio.
Personal en Obra: Residente SST, Residente de Obra, Inspector de Obra, Tecnico Electrico, Auxiliar SST, 2 Oficiales

Carol Forero González
Arquitecta

Duvan Tarazo
Interventoria

Martes, 07 de Enero de 2025
Se realizan actividades de pintura en muros y techo del comedor

Sábado, 11 de enero de 2025
Se realiza pintura de muros y techo en el área del comedor.
Se realiza instalación de panel 120 x 30.
Personal en obra: Residente de obra, inspector de obra, auxiliar SST
2 oficiales. Tiempo: Seco

Carol Forero G.
Carol Forero González
Arquitecta

Devon Tamayo
Interventoría

Lunes, 13 de enero de 2025
Se hace instalación de luminarias tipo panel 120 x 30, se realiza verificación y localización de luminarias a instalar.
Personal en obra: Residente de Obra, inspector de obra, auxiliar SST técnico electrico

Carol Forero G.
Carol Forero González
Arquitecta

Devon Tamayo
Interventoría

Martes, 14 de enero de 2025

KENNEDY

2811

Jardín Infantil Tintalito Mis Primeros Pasos

SECE: J.I Tintalito mis Primeras Pasos.

Contratista:
Consorcio Obras GT Nº de Contrato: 9176-2024

Interventoría:
Consorcio Inter Construcciones Nº de contrato: 9355-2024

y EPP correspondientes, y los Tejas desmontados deben embalarse para su disposición final.

Sisoma Interventoría

09/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS. ACOPIO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN Y ESTRUCTURA DE CIERRRASO

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST 1 INSPECTOR TÉCNICO, 2 OFICIALES

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 DIRECTORA, 2 RESIDENTES, 1 RESIDENTA SST, 1 INSPECTORA SST.


MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE.

OBSERVACIONES:

10/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO COMPLETO DE CUBIERTA DEL 2DO PISO, DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE CUBIERTA, CIELORRASO Y TUBERÍA ELECTRICA EN PVC A SITIO AUTOR CASC

PERSONAL DE CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO 3 OFICIALES DE OBRA.



MAQUINARIA Y EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR.

TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE: SOLEADO.

OBSERVACIONES:

La supervisión y esta interventoria le recuerda al contratista de obra que cualquier costo adicional que incurra en la prestación de servicio de la vigilancia de la institución, será asumida por el contratista de obra. De igual manera si se presentan daños en el piso existente del segundo piso por causa de las lluvias por el desmonte de la cubierta, y demas areas de la unidad operativa, seran responsabilidad del contratista de obra.

Interventoria

Se identifica personal en alturas no aprobado para esta actividad, por lo que se hará requerimiento de manera oficial y se solicita al contratista el envio del registro fotografico de la actividad de desmonte y retiro de los tejas de asbesto - cemento.

SISOMA- INTERVENTORIA

Con base a la novedad que dió interventoria se hace corrección de la actividad y se realizan labores acordes a la norma, cabe resaltar que el material de cubierta desmontado no era asbesto sino fibra-cemento. una aleación de material diferente.

Centro Crecer Campo Alegre Calandaima

CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALARCA/QUIMBAYA.

Contratista

Consorcio OBRAS GT N° Contrato: 9176-2024

Interventoria

Consorcio INTERCONSTRUCCIONES N° contrato: 9355-2024

7/01/2025 No se realizan actividades llegada de material eléctrico tubería Galvanizado luces de emergencia cableado, accesorios. R.O Sub S

8/01/2025 No se realizan actividades. R.O Sub S

9/01/2025 No se realizan actividades R.O Sub S

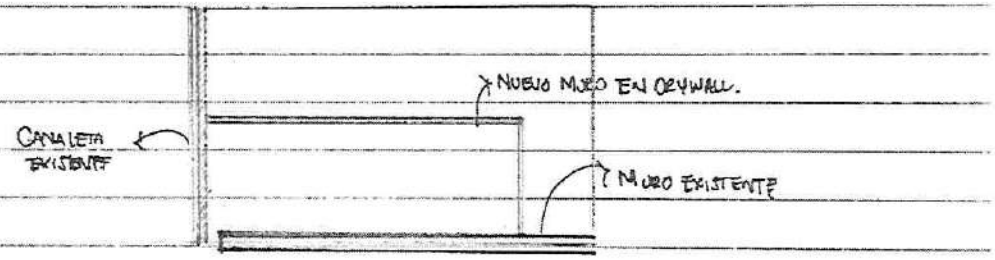
10/01/2025 Se realiza ajuste en cable existente y estructurado existente para dejar sobre la canaleta principal se realiza plateo de la nueva canaleta perimetral R.O Sub S

11/01/2025 Se realiza instalación de canaleta nueva instalada perimetralmente se ajusta red de emergencia para instalación de nuevas lamparas de emergencia, tubería de EMT con cableado. R.O Sub S

12/01/2025 No se realizan actividades R.O Sub S

13/01/2025 No se realizan actividades R.O Sub S

14/01/2025 Se inicia actividad de muro en Drywall instalación de Estructura e instalación de luminas. instalación de cinta malla, cinta papel y cinta fibra. R.O Sub S



Se informa a la interventoria desde que punto se realizara el arranque del muro en drywall si se respetaba el muro existente alineandose al mismo o de lo contrario si se alineaba desde el borde interno de la canaleta Existente por lo que se depone que la segunda opción es mas viable dejandose conjunto de partida de la canaleta existente. R.O Sub S

Jardín Infantil Britalia Acunar

27/12/2024	SE DA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA EN la SEDE DE JARDIN ACUNAR EL CARACOL - LOCALIDAD KENNEDY. ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO DE ACABADO DE PISO. SALON PARVULOS 4 PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCN. 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: 3pm a 4:30pm FAVORABLE R.O
28/12/24	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO DE ACABADO DE PISO. SALÓN PARVULOS 4 PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCN. 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: FAVORABLE R.O
30/12/24	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO DE ACABADO DE PISO, SALÓN PARVULOS 3 Y 2 PERSONAL DEL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR TECNICO, 2 OFICIALES 1 INSPECTOR SST. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLUVIA R.O
31/12/24	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO ACABADO DE PISO, SALÓN PÁRVULOS 2 Y 1ER P.S SALÓN CAMINADORES 1 PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO 2 OFICIALES DE OBRA. MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR. TIEMPO: FAVORABLE. R.O
02/01/2025	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO ACABADO DE PISO SALON CAMINADORES 2 PERSONAL CONTENTISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, INSPECTOR TÉCNICO 1 OFICIAL DE OBRA PERSONA INTERVENTORÍA: 1 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA MAQUINARIA Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR TIEMPO: MAÑANA FAVORABLE., TARDE LLUVIA R.O
03/01/2025	ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO ACABADO DE PISO SALÓN CAMINADORES 4, RESANE DE MUROS PASILLO NORTE 2DO PISO, PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE TÉCNICA, 1 INSPECTOR SST, 2 OFICIA 1 INSPECTOR TÉCNICO. TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: LLUVIAS FUERTES. R.O

Powered by CamScanner

Se solicita presentar los certificados de los andamios y las hojas de seguridad de los productos químicos usados.

Se reinicia con parte de la inventoria al contratista la revision de los puntos de humedad.

09/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO ACABADO DE PISO SALÓN CAMINADORES 1 ER P. RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO SUR 2DO PISO.

PERSONAL CONTRATISTA: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO, 3 OFICIALES DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 DIRECTORA, 2 RESIDENTES, 1 SST, 1 INSPECTOR SST.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: ANDAMIOS CERTIFICADOS, HERRAMIENTA MENOR.

TIEMPO: MAÑANA: FAVORABLE, TARDE: FAVORABLE

OBSERVACIONES:

P.O Sulls — Dubian Tamayo Interventor

10/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO ACABADO DE PISOS SALÓN CAMINADORES 1 ER P. RESANE DE MUROS PASILLO COSTADO SUR 2DO PISO, APLICACIÓN DE PINTULA COSTADO SUR "VINILO"

PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO 3 OFICIALES DE OBRA.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: ANDAMIOS CERTIFICADOS, HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO, TARDE:

OBSERVACIONES:

P.O Sulls — Dubian Tamayo Interventor.

11/01/25 ACTIVIDADES EJECUTADAS: RETIRO ACABADO DE PISO SALÓN CAMINADORES 2 ER P. RESANE DE MUROS COSTADO SUR PASILLO 2DO PISO, APLICACIÓN PINTURA VINILE PASILLO COSTADO SUR 2DO PISO.

PERSONAL CONTRATISTA: 1 RESIDENTE TÉCNICO, 1 INSPECTOR SST, 1 INSPECTOR TÉCNICO 5 OFICIALES DE OBRA.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: ANDAMIOS CERTIFICADOS, HERRAMIENTA MENOR

TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ENGATIVA

2011

Jardín Infantil Los Sauces

Miercoles 11 de diciembre 2024

Se realiza comité de obra con el fin de dar Acta de inicio, en conjunto con el Representante Legal Gustavo Adolfo Torres Duarte del contratista Consorcio Obras GT, el Representante Legal Cesar Eduardo Gomez Gomez de interventoría Consorcio Inter construcciones y la entidad contratante La Secretaría Distrital De Integración Social, se realiza Acta de Inicio de Obra.

Residente Obra

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Semana del 11 - 12 - 2024 al 15 - 12 - 2024

Se realizan inducciones, capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a personal administrativo del contratista de obra, recorridos a los frentes de obra de la localidad de Engativá para identificar las intervenciones técnicas con el fin de definir alcances para la elaboración de los presupuestos.

Residente Obra

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Semana del 16 - 12 - 2024 al 22 - 12 - 2024

Se realizan mesas de trabajo en conjunto con la interventoría del contrato para revisión de presupuestos de las sedes, se realizan informes de diagnósticos los cuales contienen un recuento de las principales actividades concernientes a los aspectos básicos de la etapa preliminar y reconocimiento en campo de las zonas a intervenir indicadas por la secretaría de integración social donde se identifican y se priorizan las intervenciones necesarias para mejorar y/o adecuar los espacios.

Residente Obra

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scanned with

Semana del 23-12-2024 al 29-12-2024

Se realiza verificación de cubierta transitable en conjunto con la interventoría, se realiza toma de medidas de las áreas a intervenir, verificación de los puntos críticos en manto impermeabilizado, se realiza la verificación por parte de profesional SST para revisión de elementos de seguridad necesa durante la ejecución de las actividades en alturas En cuanto a la parte administrativa se realiza la revisión de presupuestos, así mismo subsanación de las observaciones de acuerdo a las indicaciones por parte de la interventoría y la entidad, el día 26 de diciembre 2024 se realiza la aprobación del presupuesto

Residente de Obra

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Semana del 30-12-2024 al 05-01-2025

Se realizan capacitaciones a personal de ingreso a obra, se realizan requerimientos de materiales de pintura en fachada exterior, así como requerimie de materiales para impermeabilización de cubiertas requerimientos de equipos y andamios para trabajo en alturas.

Residente de Obra

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Semana del 06-01-2025 al 12-01-2025

Suministro de materiales a frente de obra para intervención, de acuerdo a solicitud por parte de la Secretaría de Integración social se retira del presupuesto todas las actividades relacionadas con pintura de salones y pinturas interiores y se solicita c mentar areas de intervención en impermeabilización cubierta.

Residente de Obra

CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Scanned with

Jardín Infantil Engativá

Miercoles 11 de diciembre 2024 Estado Clima: Nublado

Se realiza comité de obra con el fin de dar Acta de Inicio en conjunto con el representante legal Gustavo Adolfo Torres Duarte del contratista Consorcio Obras 6T, el representate legal Cesar Eduardo Gomez Gomez de Interventoria Consorcio Inter Construcciones y la entidad contratante La Secretaría Distrital De Integración Social, se realiza Acta de Inicio al contrato de obra.

Jessica Marichon
Residente Obra

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Semana del 11-12-2024 al 15-12-2024

Se realiza inducciones, capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a personal administrativo del contratista de obra, recorridos a los frentes de obra de la localidad de Engativá para identificar las intervenciones técnicas con el fin de definir alcances para la elaboración de presupuestos.

Jessica Marichon
Residente Obra

CONTRATISTA INTERVENTORIA

semana del 16-12-2024 al 22-12-2024

Se realizan mesas de trabajo en conjunto con la interventoría del contrato para revisión de presupuestos de las sedes, Se realizan informes de diagnósticos el cual contiene un recuento de las principales actividades concernientes a los aspectos básicos de la etapa preliminar y reconocimiento en campo de las zonas a intervenir indicadas a ejecutar por la Secretaría de Integración Social donde se identificarán y priorizaran intervenciones necesarias para mejorar y/o adecuar estos espacios.

Jessica Marichon
Residente Obra

CONTRATISTA INTERVENTORIA

Semana del 23-12-2024 al 29-12-2024

Se realiza revisión de la red electrica con profesional electricista del contratista para verificación de luminarias que requieren cambio, revisión de cubiertas en jardín, cotizaciones de materiales, adicionalmente se hace la verificación por parte de profesional SST para revisión de elementos de seguridad necesarios durante la ejecución de actividades en altoras. En cuanto a la parte administrativa se realiza revisión de presupuestos asi mismo subsanación de acuerdo a la indicaciones por parte de la interventoria y la entidad. El día 26-12-2024 se realiza radicación de presupuesto de obra.

Jessica Merchan
Residente de Obra

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Semana 30-12-2024 al 05-01-2025

Se realiza capacitaciones a personal de ingreso a obra inducciones, se realizan requerimientos de materiales para aparatos electricos, Se realiza desmonte de luminarias las cuales presentan fallas y se encuentran para cambio por parte del personal de la entidad el día 03-enero-2025.

Jessica Merchan
Residente Obra

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Semana del 06-01-2025 al 10-01-2025

Se realiza suministro de luminarias para la reposición y cambio de aparatos que requieren cambio, se realiza adecuación de los espacios para realizar actividades se continúa con requerimientos de los materiales a utilizar como andamios para cambios de las cubiertas de jardín en patio y corredor, requerimiento de material para teja de cubierta.

Jessica Merchan
Residente Obra

CONTRATISTA

INTERVENTORIA
