CONTRATO	**026**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**6**	**INFORME FINAL**	

1. DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	034 DE FEBRERO 24 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	FEBRERO 21 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO PESADO, MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VÍAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE.
CONTRATISTA	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
NIT/CC	1113311986-2
REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	TULIO FERNEL CEBALLOS MONTOYA
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	4923 Transporte de carga por carretera

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 27.500.000	
ADICION EN VALOR	$ - 0 -	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Actas parciales de avance de actividades aprobadas por el supervisor con su respectiva factura y planilla de seguridad social pagada.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	DICIEMBRE 30 DE 2024	
ADICION EN TIEMPO		
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO	
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO		
CUANTOS DIAS		
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO		
NOMBRE DEL CESIONARIO		
NIT/CC		
REPRESENTANTE LEGAL		
GARANTIAS SI O NO	NO	
NUMERO DE POLIZA		
TIPO DE GARANTIAS		
Supervisión e Interventoría	Nombre	CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

N° CDP	0000050	Valor(es)	$ 27.500.000	FECHA(S)	ENERO 22 DE 2024

Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP

Nº RP	0000277	Valor (es)	$ 27.500.000	FECHA (S)	FEBRERO 21 DE 2024

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.3.2.02.02.0092402112979904 - Propósito General Libre Inversión
Valor contratado	$ 27.500.000
Valor Primer pago parcial	$ 2.750.000
Valor Segundo pago parcial	$ 2.750.000
Valor Tercer pago parcial	$ 2.750.000
Valor Cuarto pago parcial	$ 2.750.000
Valor Quinto pago parcial	$ 2.750.000
Valor Sexto pago parcial	$ 2.750.000
Saldo ejecutado a la fecha	$ 13.750.000
Saldo por Ejecutar	$ 11.000.000

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	4561718605	JULIO
PENSION	4561718605	JULIO
ARL		

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2024	

ACTIVIDADES CONTRATADAS (A 10 MESES)

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	No.	264	28.000	**7.392.000**
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	No.	44	90.000	**3.960.000**
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	No.	44	367.000	**16.148.000**
TOTAL				**$27.500.000**

ACTIVIDADES EJECUTADAS (A 1 MES)

DETALLE	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
Realizar inspección Motoniveladora	N°	26.4	28.000	**739.200**
Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora	N°	4.4	90.000	**396.000**
Cumplir con el cronograma de actividades suscritos con la supervisión	N°	4.4	367.000	**1.614.800**
TOTAL				**$2.750.000**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESULTADO	% DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Realizar inspección Motoniveladora y Retroexcavadora	Inspección de: niveles de aceite motor e hidráulico, líquido de frenos. Filtros, correas, combustible, batería, luces, pito, alarma, llantas, frenos, espejos, equipo de carretera, extintor, botiquín, cinturón de seguridad **(Cant. 26.4)**	**10%** **10%**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

	Mantenimiento preventivo sistemas Motoniveladora y Retroexcavadora	Realización de mantenimientos preventivos **(Cant. 4.4)**	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS RURALES	**Atención de 135.5 Kms de vías rurales** Mediante la operación de los equipos: motoniveladora (según se requiera) en vías rurales - Limpieza de cunetas y conformación de vía - Limpieza de barrancos (bermas) - Cargue de material de afirmado para disponerlo en las vías	Sector Crucero hacia Guadalajara, primavera y vía Jardin de María hasta llegar al Club de Campo y pesca. Conformación de vía. **8 km**. Sector Vía Barragán. Longitud **4 km**. Limpieza de sumideros y andenes	**9%**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y RUTINARIO VÍAS URBANAS	**Atención de 4Km de vías urbanas** Mediante la operación de los equipos: retroexcavadora, Retroexcavadora (según se requiera) en vías urbanas. - Conformación de cunetas, - Conformación de banca. -Aplicación riego y compactación de material sobre las vías	Sector barrio La Esperanza. Longitud de vía **1 km**. se conformaron las calles sin pavimento. Sector Calle 13 con carrera 14. Longitud **0.100km.** Se conformó la vía. Sector Vía al Club de Campo y Pesca. Longitud **0.400 km**. Limpieza de orillas de hojarasca a causa de fuerte vendaval. Sector pista de motos Veloarena, Parque Agroindustrial. Longitud **0.300km**. Mantenimiento de pista, conformación y realce de peraltes. Sector Villas del Café, Calle 20 con Carrera 13. Longitud **0.100km.** Conformación de vía con limpieza de sobrante vegetal y tierra.	**50%**


			Sector vía la Esperanza. Longitud **0.100km.** Recuperación de vía inutilizada, aperturando la vía.	
		Atención de vías en asfalto 10M3. Aplicación de asfalto, tipo reparcheo en las vías que lo requiera en una longitud existente de 2,6KM de vías asfaltadas en la zona urbana	Sector puntos varios de Caicedonia, calle segunda, rotonda salida para barragán, zonas céntricas, vía Verdún entre otros lugares que presentaban deterioro en asfalto. Longitud **260ml.** Se realizó reparcheo con asfalto frío usando 500 bultos de 25kg cada uno.	**15%**
	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	Mediante la operación de Retroexcavadora, Cargador, (según se requiera) dado en M3:	Sector Crucero hacia Guadalajara, primavera y vía Jardin de María hasta llegar al Club de Campo y pesca. Esparcimiento de material para conformación de vía. **56 m3.** Sector Calle 13 con carrera 14. Se conformó la vía con material roca muerta. **21 m3.** Sector Parque Agroindustrial. Excavación para búsqueda de recamara. **21 m3.** Sector Vía San Gerardo Bajo después de las placa huellas. Ampliación de vía por perdida de la banca. **49 m3.** Sector Vía al Club de Campo y Pesca. Limpieza de orillas de hojarasca a causa de fuerte vendaval.	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

		Residuos vegetales **14 m3**. Sector Parque Agroindustrial. Movimiento de tierra y nivelación del lugar. **400 m3.** Sector pista de motos Veloarena, Parque Agroindustrial. Mantenimiento de pista, conformación y realce de peraltes. **200 m3** Sector Villas del Café, Calle 20 con Carrera 13. Conformación de vía con limpieza de sobrante vegetal y tierra. **4 m3.**	
	Otras Actividades de Apoyo	Cargue de vallas de transito luego de las fiestas aniversarias. Sector frente al CDA (Centro de Diagnóstico automotor) Olmo. Con la ayuda de las 2 retroexcavadoras, se bajó valle de información de tránsito, ya en suelo se desarmó, se retira pilastra donde estaba anclada uno de los postes. Sector Calle 13, se desarmó y removió valla caída debido a fuerte vendaval.	

Registro Fotográfico

Conformación de vía, barrio la Esperanza

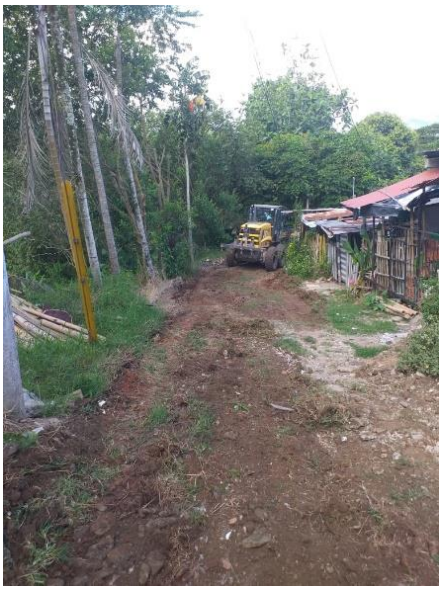



Remoción de reductor y reparcheo, Calle 3 con Carrera 9






CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Conformación de vía y esparcimiento de material, Crucero-Club Campo y pesca





Apoyo cargue vallas de tránsito fin fiestas aniversarias

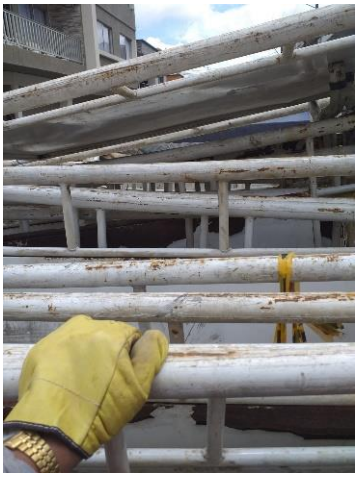



CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Desmonte de valla publicitaria frente CDA El Olmo







Desarme y remoción de valla, Calle 13





CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Conformación entrada Calle 13 Carrera 14






Excavación Parque Agroindustrial búsqueda recamara



CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Ampliación de vía, Vía San Gerardo Bajo



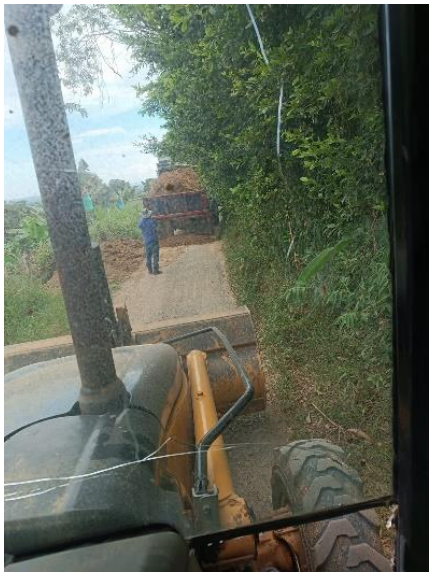


Limpieza orillas de hojarasca, vía al Club de Campo y Pesca





CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Movimiento de tierra y Nivelación del área, Parque Agroindustrial

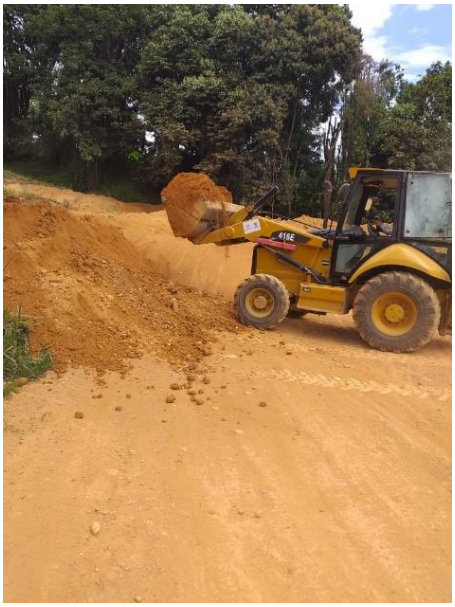



Mantenimiento y conformación pista motocross, Parque Agroindustrial






CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Recuperación vía inutilizada, apertura vía La Esperanza



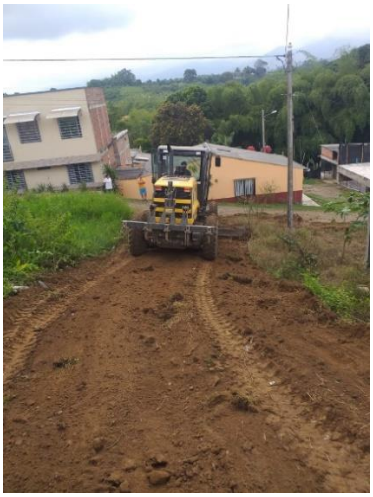

Reparcheo en diferentes puntos de Caicedonia







CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Limpieza sumideros y andenes, Vía Barragán





Conformación y limpieza sobrante vegetal, Calle 20 Carrera 13






CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

Mantenimiento Preventivo Motoniveladora y Retroexcavadora







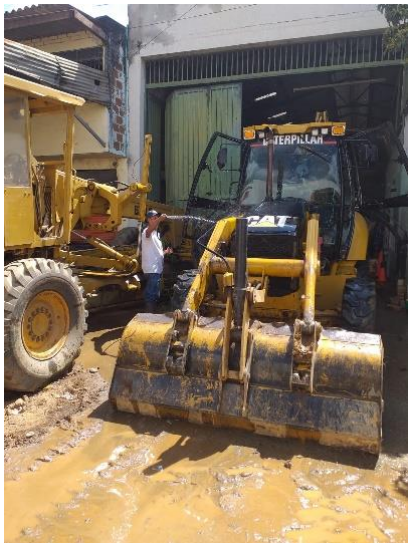

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

Mantenimiento Preventivo de motoniveladora y retroexcavadora. se realizó inspección pre operativa diariamente de la retroexcavadora Cat

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.

	416e y la motoniveladora New Holand RG140b antes de cada labor y se realizó mantenimiento preventivo semanal (4 veces en el mes) con engrase a partes móviles, limpieza, verificación de pernos y tornillos con correcto ajuste y calibración de aire a las llantas de los equipos. (se cambió filtro de aire). Sector Crucero hacia Guadalajara, primavera y vía Jardin de María hasta llegar al Club de Campo y pesca, Conformación de vía 8 km. Sector Vía Barragán, Longitud 4 km, Limpieza de sumideros y andenes. Sector barrio La Esperanza, Longitud de vía 1 km, se conformaron las calles sin pavimento. Sector Calle 13 con carrera 14, Longitud 0.100km, Se conformó la vía. Sector Vía al Club de Campo y Pesca, Longitud 0.400 km, Limpieza de orillas de hojarasca a causa de fuerte vendaval. Sector pista de motos Veloarena, Parque Agroindustrial, Longitud 0.300km, Mantenimiento de pista, conformación y realce de peraltes. Sector Villas del Café, Calle 20 con Carrera 13, Longitud 0.100km, Conformación de vía con limpieza de sobrante vegetal y tierra. Sector vía la Esperanza. Longitud 0.100km, Recuperación de vía inutilizada, aperturando la vía. Sector diferentes puntos de Caicedonia incluidos la calle segunda, rotonda salida para barragán, zonas céntricas, vía Verdún entre otros lugares que presentaban deterioro en asfalto, Longitud 260ml, Se realizó reparcheo con asfalto frío usando 500 bultos de 25kg cada uno. Sector Crucero hacia Guadalajara, primavera y vía Jardin de María hasta llegar al Club de Campo y pesca, Esparcimiento de material para conformación de vía, 56 m3. Sector Calle 13 con carrera 14, Se conformó la vía con material roca muerta, 21 m3. Sector Parque Agroindustrial. Excavación para búsqueda de recamara, 21 m3. Sector Vía San Gerardo Bajo después de las placa huellas, Ampliación de vía por perdida de la banca, 49 m3. Sector Vía al Club de Campo y Pesca, Limpieza de orillas de hojarasca a causa de fuerte vendaval, residuos vegetales 14 m3. Sector Parque Agroindustrial, Movimiento de tierra y nivelación del lugar, 400 m3. Sector pista de motos Veloarena, Parque Agroindustrial, Mantenimiento de pista, conformación y realce de peraltes, 200 m3. Sector Villas del Café, Calle 20 con Carrera 13, Conformación de vía con limpieza de sobrante vegetal y tierra, 4 m3. Cargue de vallas de transito luego de las fiestas aniversarias. Sector frente al CDA (Centro de Diagnóstico automotor) Olmo, Con la ayuda de las 2 retroexcavadoras, se bajó valle de información de tránsito, ya en suelo se desarmó, se retira pilastra donde estaba anclada uno de los

	postes. Sector Calle 13, se desarmó y removió valla caída debido a fuerte vendaval.
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	$ 2.750.000 Dos millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte.

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO_X_

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO_X_

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_X_ NO____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_X_ NO____

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 27 de agosto de 2024
Firma del interventor y/o supervisor:	**CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO** Secretario de Obras Públicas Supervisión

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
