
PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS INFORME SEMANAL

INFORME No. 25	**NOMBRE DEL PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
	CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**FECHA DE INICIO**	1/03/2024
	GERENTE DE PROYECTOS	ING. ANDRES FELIPE MARTINEZ	**FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2024
	PERIODO DEL PRESENTE INFORME	Del 17/08/2024 al 23/08/2024	**VALOR DEL PROYECTO**	$ 7.026.813.053,98
	SEMANAS TRANSCURRIDAS	25	**SEMANAS POR TRASCURRIR**	19

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA	ESTADO DEL PROYECTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	08/23/24	ACTIVO	21,63%	23,40%

CRONOLOGÍA DE TAREAS

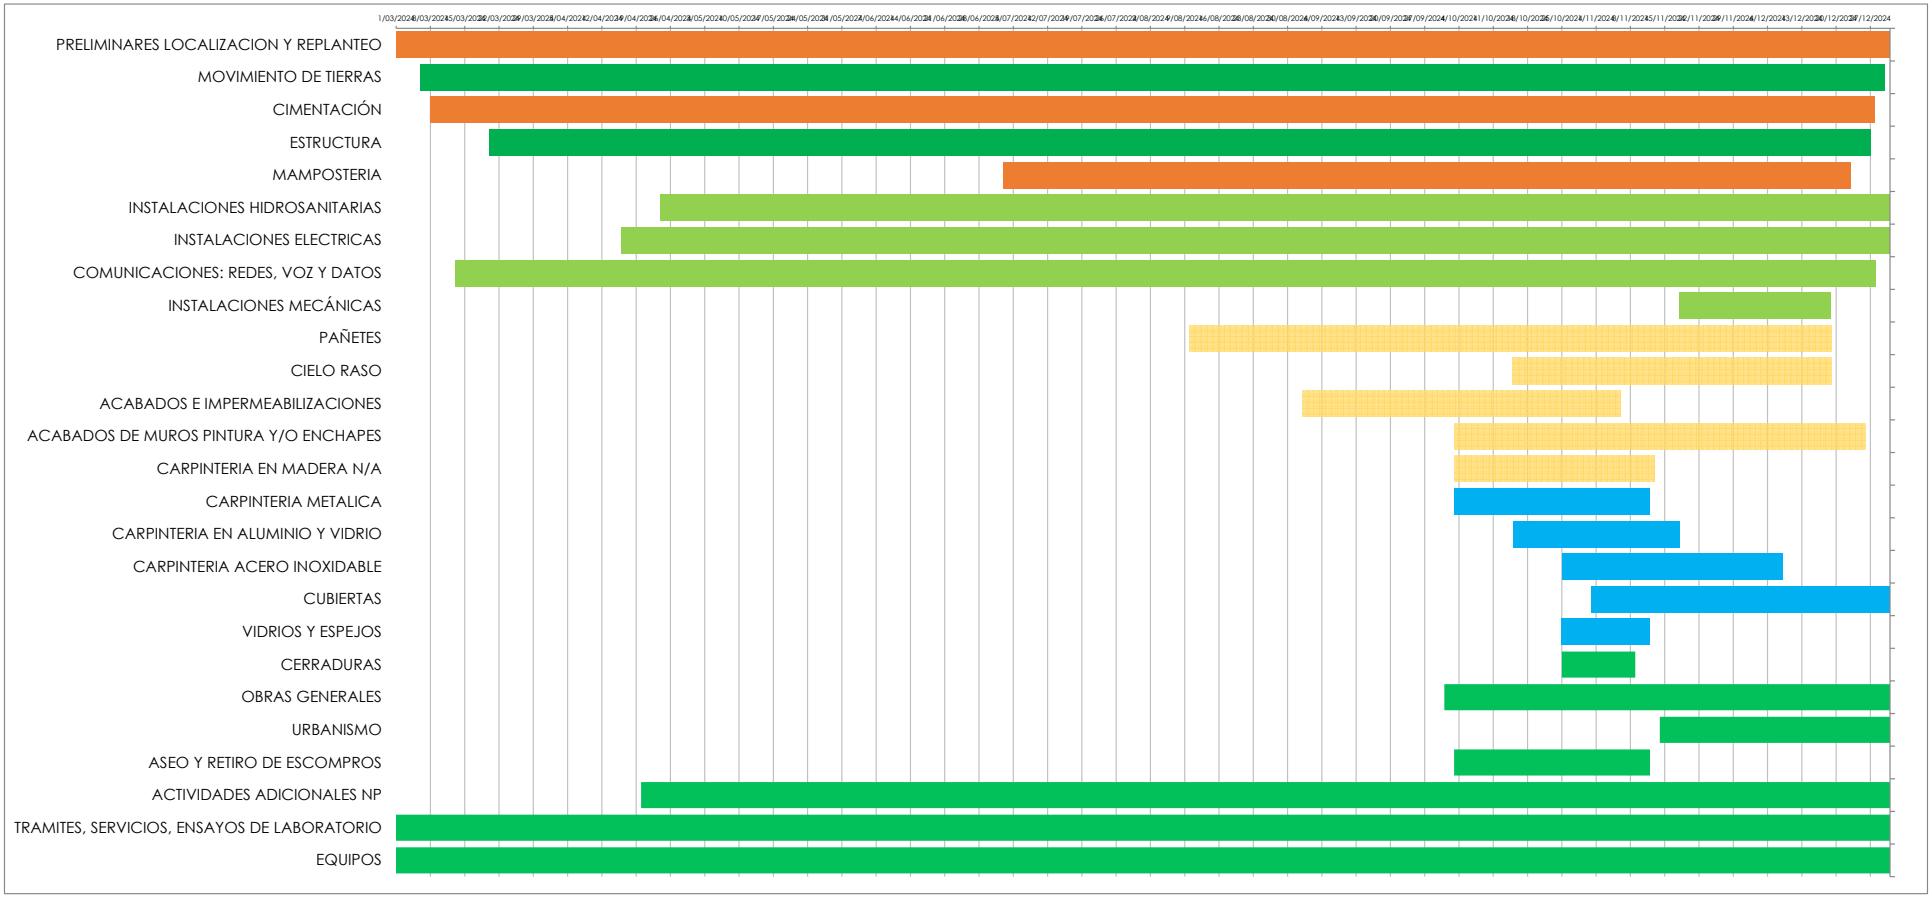

PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS INFORME SEMANAL


INFORME No. 25	**NOMBRE DEL PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
	CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**FECHA DE INICIO**	1/03/2024
	GERENTE DE PROYECTOS	ING. ANDRES FELIPE MARTINEZ	**FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2024
	PERIODO DEL PRESENTE INFORME	Del 17/08/2024 al 23/08/2024	**VALOR DEL PROYECTO**	$ 7.026.813.053,98
	SEMANAS TRANSCURRIDAS	25	**SEMANAS POR TRASCURRIR**	19


TABLA DE JECUCION POR CAPITULOS

NOMBRE DE LA TAREA	ASIGNADO A	EMPEZAR FECHA	FIN FECHA	DURACIÓN en días	ESTADO	PRIORIDAD	COMENTARIOS
PRELIMINARES LOCALIZACION Y REPLANTEO	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**1/03/2024**	**31/12/2024**	305	En Ejecucion	Alto	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**6/03/2024**	**30/12/2024**	299	En Ejecucion	Alto	
CIMENTACIÓN	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**8/03/2024**	**28/12/2024**	295	En Ejecucion	Medio	
ESTRUCTURA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**20/03/2024**	**27/12/2024**	282	En Ejecucion	Bajo	
MAMPOSTERIA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**3/07/2024**	**23/12/2024**	173	En Ejecucion	Bajo	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**24/04/2024**	**31/12/2024**	251	En Ejecucion	Bajo	
INSTALACIONES ELECTRICAS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**16/04/2024**	**31/12/2024**	259	En Ejecucion	Alto	
COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**13/03/2024**	**28/12/2024**	290	En espera	Alto	
INSTALACIONES MECÁNICAS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**18/11/2024**	**19/12/2024**	31	No iniciado	Medio	
PAÑETES	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**10/08/2024**	**19/12/2024**	131	En Ejecucion	Bajo	
CIELO RASO	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**15/10/2024**	**19/12/2024**	65	No iniciado	Alto	
ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**2/09/2024**	**6/11/2024**	65	No iniciado	Alto	
ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**3/10/2024**	**26/12/2024**	84	No iniciado	Medio	
CARPINTERIA EN MADERA N/A	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**3/10/2024**	**13/11/2024**	41	No iniciado	Alto	
CARPINTERIA METALICA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**3/10/2024**	**12/11/2024**	40	No iniciado	Alto	
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**15/10/2024**	**18/11/2024**	34	No iniciado	Alto	
CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**25/10/2024**	**9/12/2024**	45	No iniciado	Alto	
CUBIERTAS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**31/10/2024**	**31/12/2024**	61	En Ejecucion	Medio	
VIDRIOS Y ESPEJOS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**25/10/2024**	**12/11/2024**	18	No iniciado	Alto	
CERRADURAS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**25/10/2024**	**9/11/2024**	15	No iniciado	Bajo	
OBRAS GENERALES	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**1/10/2024**	**31/12/2024**	91	No iniciado	Medio	
URBANISMO	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**14/11/2024**	**31/12/2024**	47	En espera	Medio	
ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**3/10/2024**	**12/11/2024**	40	En espera	Bajo	
ACTIVIDADES ADICIONALES NP	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**20/04/2024**	**31/12/2024**	255	En Ejecucion	Alto	
TRAMITES, SERVICIOS, ENSAYOS DE LABORATORIO	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**29/02/2024**	**31/12/2024**	306	No iniciado	Bajo	
EQUIPOS	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**29/02/2024**	**31/12/2024**	306	No iniciado	Bajo	

PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS INFORME SEMANAL

INFORME No. 25	**NOMBRE DEL PROYECTO**	CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
	CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**FECHA DE INICIO**	1/03/2024
	GERENTE DE PROYECTOS	ING. ANDRES FELIPE MARTINEZ	**FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2024
	PERIODO DEL PRESENTE INFORME	Del 17/08/2024 al 23/08/2024	**VALOR DEL PROYECTO**	$ 7.026.813.053,98
	SEMANAS TRANSCURRIDAS	25	**SEMANAS POR TRASCURRIR**	19

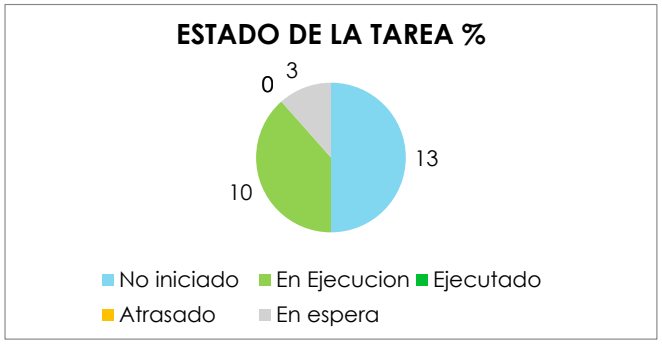

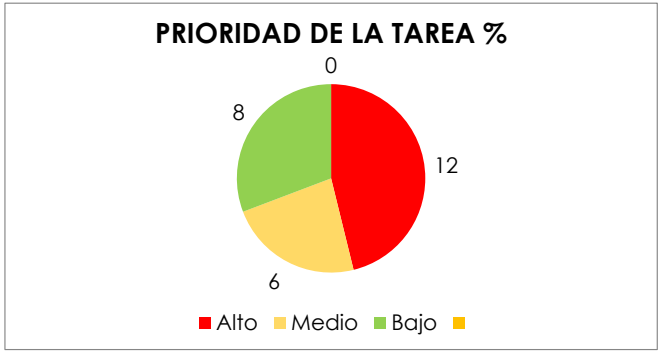


ESTADO DE LA TAREA % se rellena automáticamente

ESTADO	CONTAR	%
No iniciado	13	50%
En Ejecucion	10	38%
Ejecutado	0	0%
Atrasado	0	0%
En espera	3	12%
TOTAL	**26**	**100%**

PRIORIDAD DE LA TAREA % se rellena automáticamente

PRIORIDAD	CONTAR	%
Alto	12	46%
Medio	6	23%
Bajo	8	31%
	0	0%
TOTAL	**26**	**100%**

PRESUPUESTO	
PLANIFICADO	1.519.997.462,91
EJECUTADO	1.643.960.177,05



Arq. JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
CC. 84.034.926 DE RIOHACHA
Representante Legal

Ing. ANDRES FELIPE MARTINEZ
CC.1.072.656.954 DE CHIA
Gerente de Proyectos

PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS INFORME SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**FECHA DE INICIO**	1/03/2024
GERENTE DE PROYECTOS	ING. ANDRES FELIPE MARTINEZ	**FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2024
PERIODO DEL PRESENTE INFORME	Del 17/08/2024 al 23/08/2024	**VALOR DEL PROYECTO**	$ 7.026.813.053,98
SEMANAS TRANSCURRIDAS	25	**SEMANAS POR TRANSCURRIR**	19

INFORME No. 25


ESTADO DEL PROYECTO PRESENTE SEMANA

EN GENERAL PROYECTO ESTADO	ADELANTADO SEGÚN CRONOGRAMA	**RESUMEN**	Durante el presente periodo se realizó la ejecución de los capítulos de preliminares, movimientos de tierras, cimentación, estructura, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas y actividades no previstas, las cuales se ejecutaron sin ningún contratiempo de acuerdo a lo proyectado a ejecutar por la presente firma contratista dentro del período transcurrido.
ACTIVIDADES EJECUTADAS	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, SARDINELES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO		
	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION		
	EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION		
	TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.		
	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO		
	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.		
	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS		
	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR		
	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO		
	MURO EN BLOQUE REF CONCRETODO BLOQUE SPLIT 15 X 20 X 40, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO, PEGA Y ANCLAJES.		
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"		
	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"		
	MURO EN BLOQUE N°5 PV , liso; e=12 cm, largo= 29 cm, alto 21 cm, INCLUYE, MORTERO RELLENO DE DOVELAS CON SEPARACIÓN ENTRE 1m y 2m, PEGA ANCLAJES Y ACERO DE REFUERZO.		
	VIGA CINTA 0,12 x 0,15 m EN CONCRETO F'C 3000 PSI		

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	NOVEDADES Y EJECUCION
PRESUPUESTO	Adelantado en ejecución según lo Programado	Para el presente periodo se ejecutaron $ 62.383.090,52 teniendo un acumulado ejecutado al final del periodo de $ 1.643.960.177,05, lo que equivale al 23,40% del valor del proyecto
RECURSOS	Implementados todos los recursos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto	Durante el presente periodo, se contó con los siguientes recursos para la ejecución del proyecto: - 1 Excavadora - 4 Equipos de Compactación - 6 Profesionales con dedicación del 100% en el proyecto - 26 personas de mano de obra no calificada - Suministrado todo el material e insumos necesarios para la ejecución de actividades
TIEMPO	En ejecución según lo Programado	Para el presente periodo transcurrieron 7 días del tiempo contractual, acumulando con ello 175 días del tiempo establecido para la ejecución del contrato, quedando por transcurrir 130 días calendario para finalizar el tiempo contractual.
ALCANCE	En ejecución de acuerdo a las condiciones contractuales	Para el presente periodo se encuentra en ejecución el presente proyecto teniendo en cuenta el alcance con los dos modificatorios contractuales que se han realizado

DIAGRAMA DE FLUJO PROGRAMADO EN EL PRESENTE PERIODO

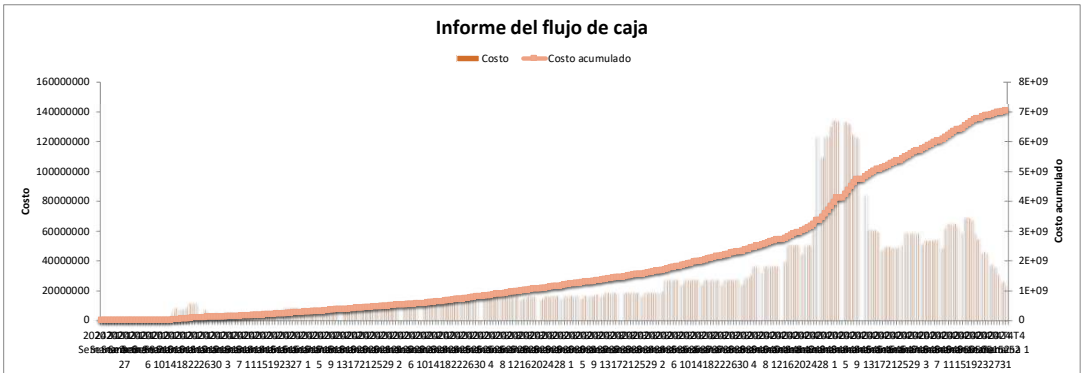

PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS INFORME SEMANAL

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	**CÓDIGO DEL PROYECTO**	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS	**FECHA DE INICIO**	1/03/2024
GERENTE DE PROYECTOS	ING. ANDRES FELIPE MARTINEZ	**FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2024
PERIODO DEL PRESENTE INFORME	Del 17/08/2024 al 23/08/2024	**VALOR DEL PROYECTO**	$ 7.026.813.053,98
SEMANAS TRANSCURRIDAS	25	**SEMANAS POR TRANSCURRIR**	19

INFORME No. 25

RIESGOS PREVISTOS EN EL PERIODO

NÚMERO DE RIESGO	CAUSA	CATEG.	EVENTO	Riesgo Materializado?	OBJETIVO IMPACTADO	EFECTO
1	La Temporada de lluvias en la región empiezan después de agosto	Ambiental	Dificultad para desarrollar las actividades de obra y urbanismo	No Materializado en el periodo	Cronograma	Retrasos en la programación de obra
2	Agregados pétreos fuera de la norma	Insumos	Las fuentes de material no están cumpliendo con los requerimientos de calidad	No Materializado en el periodo	Costos del Contrato	Se tendrá que buscar nuevas fuentes de materiales fuera del área de influencia
3	Se le solicita a la Base Asignar una espacio para el deposito temporal de materiales provenientes de las demoliciones que realizaran	Deposito Temporal de materiales	Aun no se identifica que lugares cercanos a los sectores de trabajo se pueden hacer dichos depósitos temporales	No Materializado en el periodo	La Organización	Se puede generar mayores distancias de acarreos
4	Alto flujo de Cadetes en algunos sectores en donde se desarrollaran los Trabajos	SST	Puede llegar a generarse dificultades de manejo de trafico peatonal y vehicular	No Materializado en el periodo	Los estándares SST asignados para el proyecto	se tiene que intensificar las medidas de control y señalización en las zonas afectadas con los trabajos
5	El continuo trabajo de maquinaria puede llegar afectar a la población circundante del proyecto	Contaminación Auditiva	La maquinaria que se usa puede llegar en un momento dado a superar los decibeles y el tiempo de tolerancia al ruido	No Materializado en el periodo	Relacionamiento con la comunidad	Quejas de la base hacia las labores que se realizan
6	La demora en la aprobación de los estudios de seguridad radicados a la base	Mano de Obra	El no ingreso oportuno del personal para hacer actividades de mano e obra	No Materializado en el periodo	Cronograma	Retrasos en el cronograma debido a la falta de personal, donde afecta los rendimientos por la renuncia del personal, ya que, hasta que no ingresen a trabajar no empieza a correr el tiempo para el pago de salario.
7	Observaciones de forma y fondo para realizar la epata de construcción	Diseños Entregados por la entidad	El no cierre de la etapa de revisión de diseños y aprobación final a los componentes del diseño	No Materializado en el periodo	Cronograma y costo del proyecto	Retrasos para el inicio de algunas actividades hasta no tener claro la aclaración de observaciones y afectación al presupuesto de la obra por mayores cantidades

ASPECTOS DESTACADOS Y CONCLUSIONES CLAVE

Teniendo en cuenta que para el presente periodo, se ejecutaron $ 62.383.090,52 llegando a un acumulado de ejecución al final del periodo de $ 1.643.960.177,05, lo que equivale al 23,40% del valor del proyecto y teniendo en cuenta que para el mismo periodo se tenia programado $ 1.519.997.462,91 lo que equivale al 21.63%, se puede concluir que el presente proyecto se encuentra en una porcentaje de adelanto positivo del 1.77%.
Por otro lado, es importante mencionar que se deben incorporar las actividades no previstas al presupuesto contractual que se han presentado a la interventoría, con el objeto de poder ejecutar Estas actividades y evitar posibles retrasos al cronograma y sistema constructivo de las mismas actividades
De la misma manera podemos determinar que para el presidente periodo fue posible el suministro, de todos los recursos necesarios para poder ejecutar las actividades contractuales y que no fuimos afectados por ningún agente externo lo que generó que se ejecutara la proyección que se tenía establecida por la firma contratista para el presente periodo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS COMO GERENTE DE PROYECTOS EN EL PERIODO

PERIODO	ACTIVIDAD	DEDICACION Y EJECUCION
Del 17/08/2024 al 23/08/2024	Presencia y participación en comités de Gerencia con el director de Obra y Representante Legal de la Firma contratista.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2025	Presencia y participación reuniones internas con el equipo contratista para hacer seguimiento al cronograma.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2026	Planificación de la gestión de recursos y costos	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2027	Estimación de los recursos y costos de las actividades.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2028	Seguimiento y gestión en las actividades No previstas, con el objeto de mantener en línea el alcance del proyecto	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2029	Coordinación junto con el equipo técnico	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2030	Control los recursos y costos.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2031	Monitoreo al desempeño del trabajo con relación a los gastos incurridos.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2032	Monitoreo el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base de costos aprobada.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2033	Seguimiento para evitar que se incluyan cambios no aprobados.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2034	Gestión y coordinación de la correspondencia verbal, física y virtual entre la interventoría, la entidad contratante y la firma contratista	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2035	Gestión con el tramite de actas parciales en aras de mantener el flujo económico en equilibrio del proyecto.	100%
Del 17/08/2024 al 23/08/2036	Reuniones formales e informales entre la respectiva interventoría y la entidad contratante.	100%



Arq. JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
CC. 84.034.926 DE RIOHACHA
Representante Legal

Ing. ANDRES FELIPE MARTINEZ
CC.1.072.656.954 DE CHIA
Gerente de Proyectos
