INFORME FINAL Y DE LIQUIDACION DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONVENIO N° 2024205

Fecha de presentación **(23-12-2024)** Período del informe: Desde **(01-12-2024) Hasta (31-12-2024)**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO

NOMBRE SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ

DATOS DEL CONTRATO

CONVENIO No: CPS 2024205

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL SERVICIO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE VÍAS Y CAMINOS VEREDALES, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA "CAMINEROS" EN EL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA".

PLAZO: hasta 31 de diciembre del 2024

VALOR APORTE ALCALDIA	$308.734.797,35
VALOR APORTE COOPERATIVA	$ 16.249.199,65
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 324.983.997**

FECHA DE INICIO: 05 de agosto del 2024 **FECHA DE TERMINACIÓN; 31 de diciembre del 2024**

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 557 DEL 24 DE JUNIO DEL 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL: 826 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2024
RUBRO FUENTE DE FINANCIACION: 2.3.2.01.01.001.03.02-1.2.4.3.03
FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERS TRANSPORTE

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $_____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición:

Prórroga al Plazo:_____Fecha de la Prórroga: _____

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ Ejecución de Anticipo $
Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados: $ 0

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	s
4.1. El asociado en desarrollo del objeto del convenio realizara la Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, puentes, barandas, calzada, señales,	La cooperativa presentó evidencia de ejecución de actividades las cuales se encuentran descritas en el informe técnico presentado donde se puede evidenciar con registros fotográficos, de igual manera la secretaria de infraestructura ha realizado recorridos de veridficacion en campo corroborando que el contratista esta realizando las actividades de acuerdo a las necesidades identificadas en cada de la via en la vereda o corregimiento intervenida, a continuación se describe lo ejecutado en cada tramo Se puede evidenciae que el contratista el dia 02 al dia 04 de diciembre 2024 se continúa con la intervención en la vía **CONTINUACION DE LA VIA DEPARTAMENTAN 3201-1,** con las siguientes actividades: • 12500m avance en rocería • Limpieza de alcantarillas • 35 descoles Limpieza • 50 cajas limpieza • 1510m limpieza de cunetas (revestidas) • 230m recuperación de cunetas (revestidas) • 30 árboles podados • 240m limpieza de cuneta en placa huella	registro fotográfico Pantallazos Documentos en físico

mojones, defensas metálicas, y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.

4.2. El asociado en desarrollo del objeto del convenio realizara Roceria y desmonte manual Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.

4.3. Poner a disposición del proyecto, el personal requerido para el desarrollo del objeto del convenio. Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Asociado en forma autónoma, por lo tanto, corre a su cargo el pago de los salarios, indemnizaciones , bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Asociado se

- Limpieza de basura (Residuos de roceria)

Nota: estas actividades fueron realizadas por el frente 01 limpieza de obras y 02 de camineros roceria

Se puede evidenciar que el contratista el día 04 al día 19 de diciembre 2024 se inicia la intervención de la vía **QUEREMAL KM 30,** con las siguientes actividades:

- 5537m avance en roceria
- 6 árboles podados
- Limpieza de basura (Residuos de roceria.

Se puede evidenciar que el contratista el día 04 diciembre 2024, por un día se realiza actividad en esta vía; dando continuidad el día 17 hasta el 19 de diciembre 2024; día en el cual se finaliza la intervención.
Nota: para esta actividad (roceria) se unen los dos frentes de camineros.

Se puede evidenciar que el contratista el día 05 diciembre 2024 se realiza la intervención en la vía **EL PALMAR KM 30** con las siguientes actividades:

- 4110m avance en roceria
- Limpieza de alcantarillas
- 30 encoles Limpieza
- 50m limpieza de cunetas (revestidas)
- Limpieza de basura (Residuos de roceria)
- Nota: estas actividades fueron realizadas por el frente 01 limpieza de obras y 02 de camineros roceria.

Se puede evidenciar que el contratista el dia 06 al 16 de diciembre 2024 se realiza la intervención en la via ***DAGUA-PROVIDENCIA-SANTA MARIA EL ESCOVAL***
con las siguientes actividades:

- 17700m avance en roceria
- Limpieza de alcantarillas
- 62 descoles Limpieza
- 25 encoles limpieza
- 65 cajas
- 2065m limpieza de cunetas (revestidas)
- 60 árboles podados
- Limpieza de basura (Residuos de roceria)
- Nota: estas actividades fueron realizadas por el frente 01 limpieza de obras y 02 de camineros roceria.

AVANCE DE TRABAJO
(20,098 %)_(39,847 km)

CRONOGRAMA DE INTERVENCION DE CAMINEROS

ACTIVIDA A DESARROLLAR	LONGITUD (km)	NOMBRE DE LA VIA
ROCERIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLES Y DESCOLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS	17,700	DAGUA-PROVIDENCIA-SANTA MARIA EL ESCOVAL (Nota: actividades realizadas por el frente 01 roceria y frente 02 limpieza de obras)
ROCERIA, DESPEJE DE CURVAS	5,537	EL QUEREMAL KM 30 (Nota: actividad realizada por el frente 01 y 02 de camineros)
ROCERIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLES Y DESCOLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS	12,500	CONTINUACION DE LA VIA DEPARTAMENTAN 3201-1 (Nota: actividades realizadas por el frente 01 roceria y frente 02 limpieza de obras)

obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordad

4.4. El Asociado durante la ejecución del Convenio debe contar con las herramientas necesarias, para cumplir con el programa de trabajo, el cual debe ser aprobado por el Supervisor del Convenio.

4.5. El asociado deberá disponer de la herramienta mínima en condiciones óptimas de funcionamiento, para la debida ejecución del objeto del convenio.

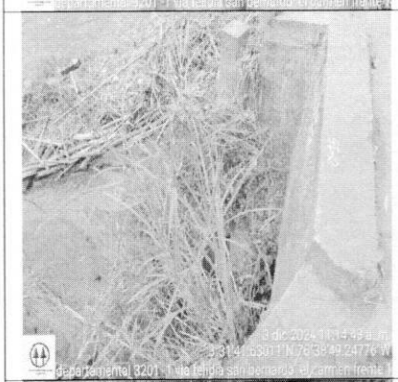
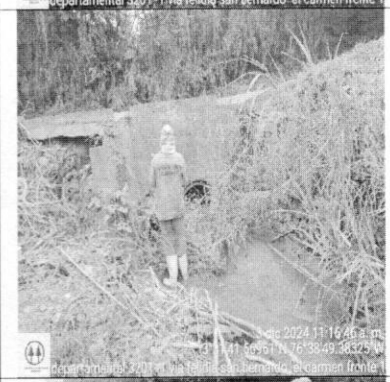
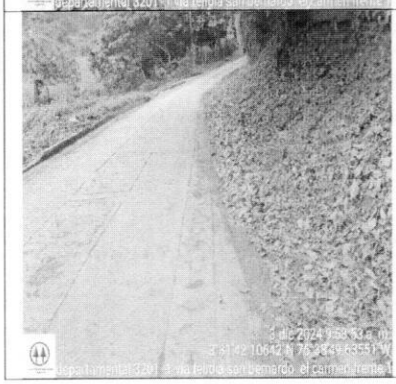
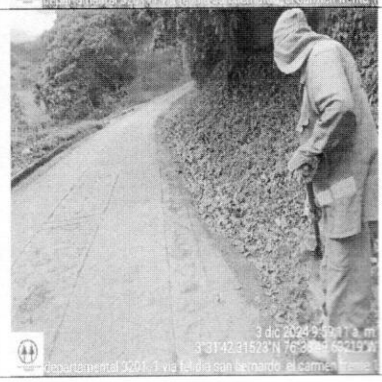
4.6. El oferente interesado deberá contar en la vía con la herramienta necesaria y suficiente, adecuada en capacidad, condiciones tecno-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas.

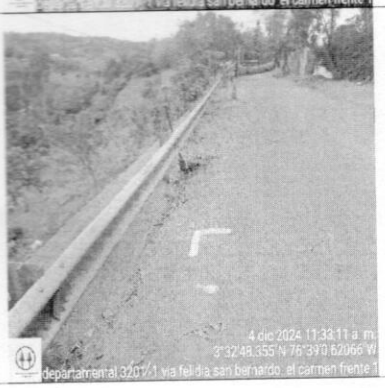
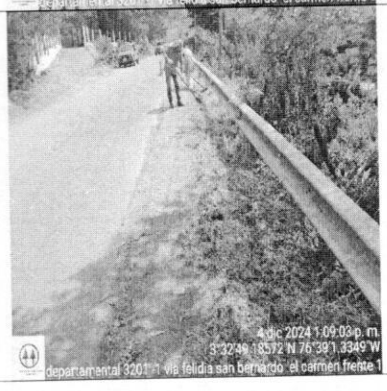
ROSERIA Y CORTE DE ARBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCOLES Y DESCOLES, LIMPIEZA DE CUNUETAS	4,110	EL PALMAR-KM 30 (Nota: actividades realizadas por el frente 02 rocería y frente 01 limpieza de obras)	2,23

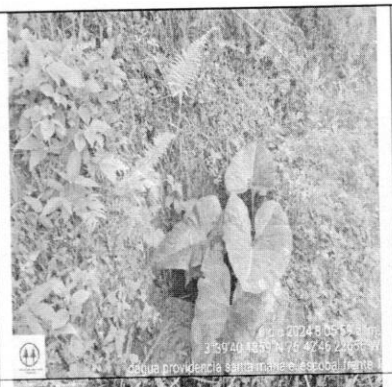
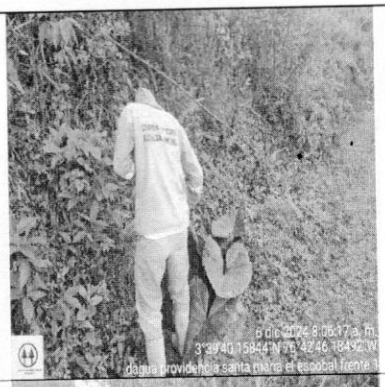
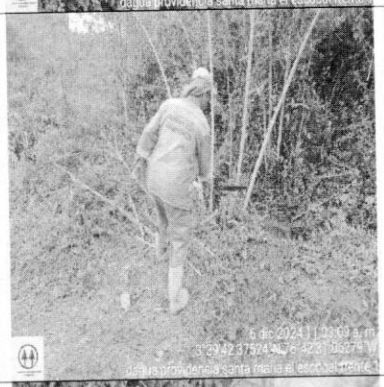
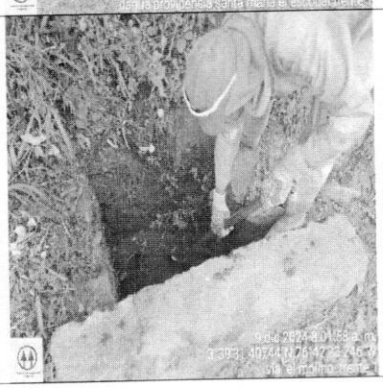


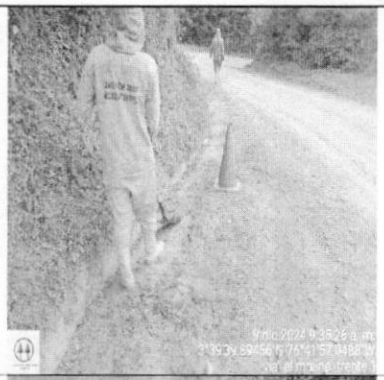


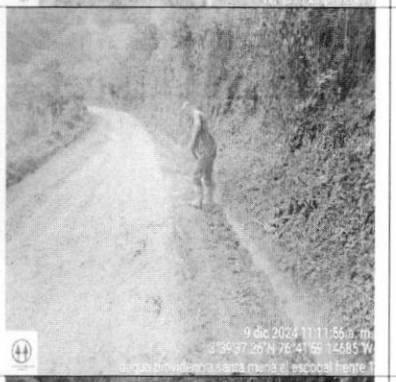



plazos y especificaciones técnicas. 4.7. Invertir los recursos única y exclusivamente en la ejecución del presente convenio de acuerdo con la distribución pactada, para llevar a cabo el objeto del presente convenio. 4.8. Disponer del personal que se requiera para desarrollar las actividades a ejecutar. 4.9. Presentar evidencia fotográfica de cada una de las actividades que se vayan a realizar. 4.10. Certificar el pago de la seguridad social y en caso de subcontratar personal, deberá acreditar también su afiliación y pago a la seguridad social. 4.11. Autorizar al Municipio para que por parte de la tesorería se realicen los descuentos de ley. 4.12. Informe de ejecución de actividades, que incluya; registro fotográfico,	 	 		
	 	 		
	 	 		

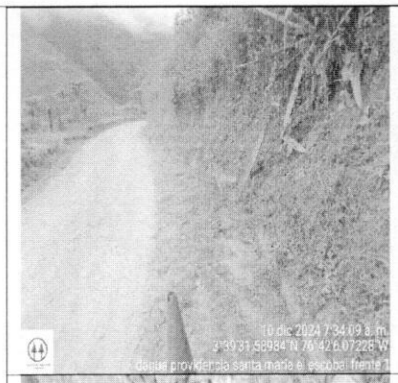
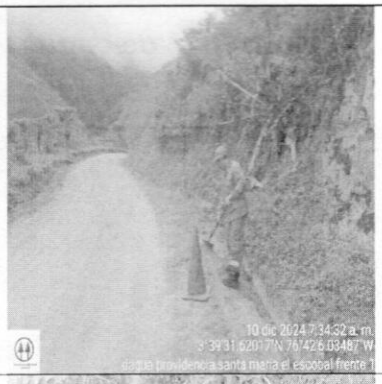
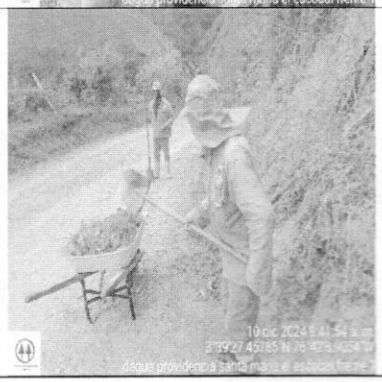
descripción de actividad, kilómetros de vías intervenidos, tipo de infraestructura municipal intervenida, y demás que considere necesario el supervisor del contrato. 4.13. El Asociado debe presentar Cronograma de actividades semanal de la intervención de la infraestructura vial y la intervención de infraestructura municipal, de acuerdo a las necesidades prioritarias del Municipio en coordinación con el secretario de Infraestructura. 4.14. Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el supervisor del contrato. 4.15. Cuando los trabajos objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Asociado está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la				
				
				

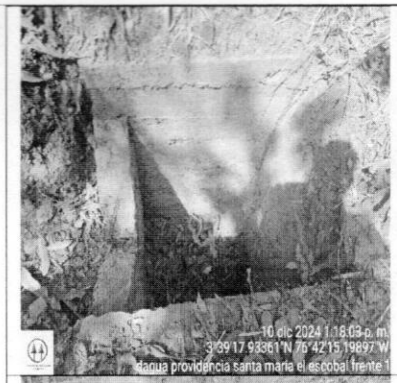
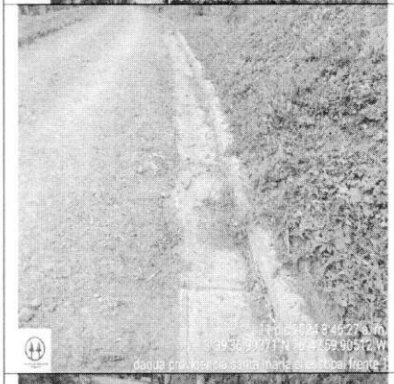
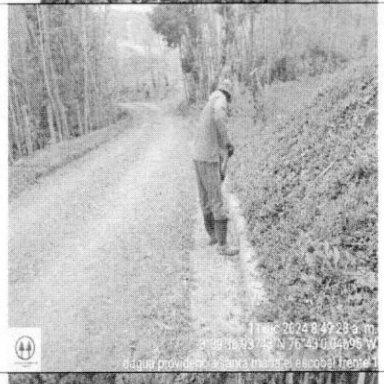
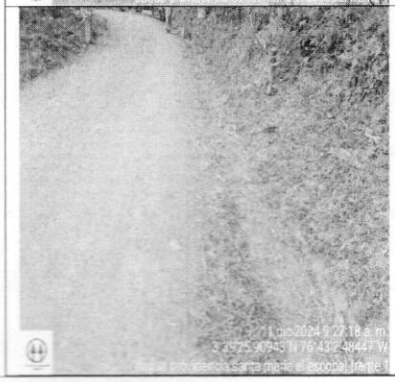
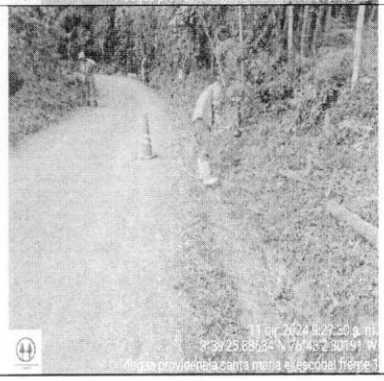
ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la norma vigente y/o concordante. El Asociado deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad da ESA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.				
				
				


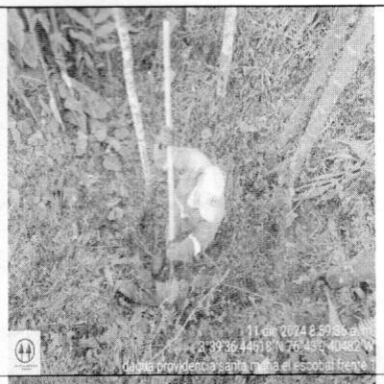
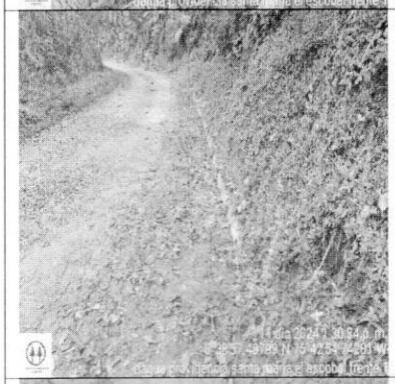
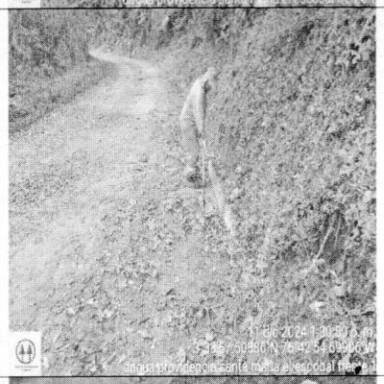
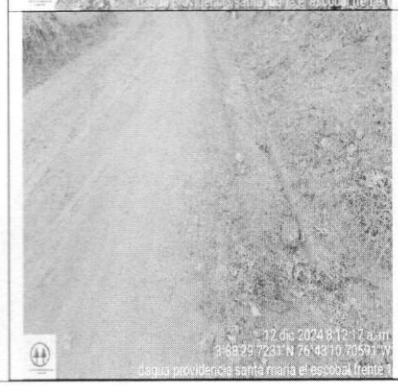



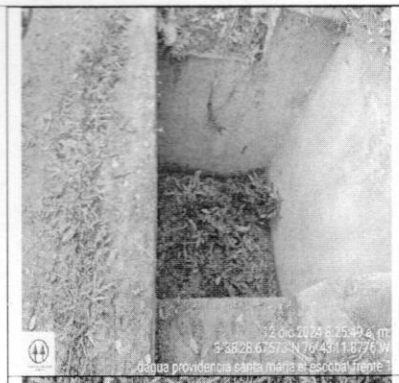


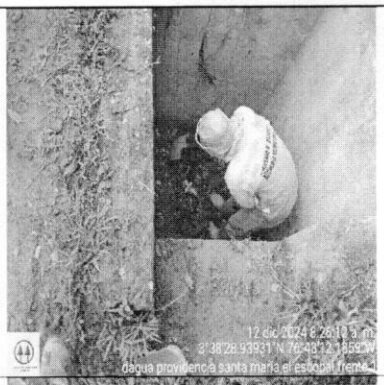


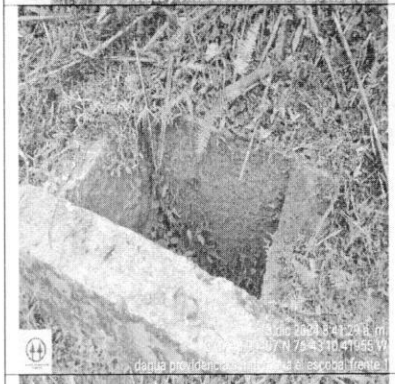
	10 dic 2024 7:34:09 a. m. 3°39'31.58984"N 76°42'6.07226"W dagua providencia santa maria el escobal frente 1	10 dic 2024 7:34:32 a. m. 3°39'31.62017"N 76°42'6.03487"W dagua providencia santa maria el escobal frente 1	-	
	10 dic 2024 7:55:54 a. m. 3°39'30.40507"N 76°42'8.20685"W dagua providencia santa maria el escobal frente 1	10 dic 2024 7:56:28 a. m. 3°39'30.37857"N 76°42'8.17939"W dagua providencia santa maria el escobal frente 1	-	
	10 dic 2024 9:41:40 a. m. 3°39'27.88784"N 76°42'8.97209"W dagua providencia santa maria el escobal frente 1	10 dic 2024 9:41:54 a. m. 3°39'27.45285"N 76°42'8.9054"W dagua providencia santa maria el escobal frente 1	-	

			-	
			-	
			-	

		-	
		-	
		-	


12 dic 2024 8:25:49 a. m.
dagua providencia santa maria el escobal frente

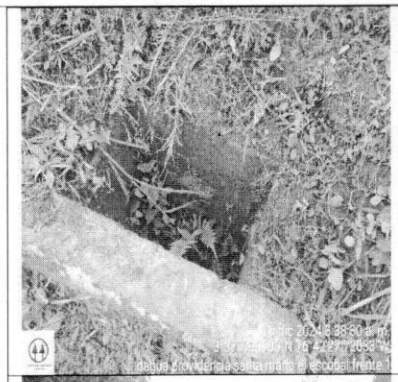

12 dic 2024 8:26:10 a. m.
dagua providencia santa maria el escobal frente

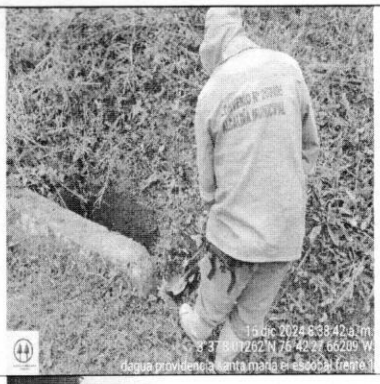

dagua providencia santa maria el escobal frente


13 dic 2024 8:41:35 a. m.
dagua providencia santa maria el escobal frente

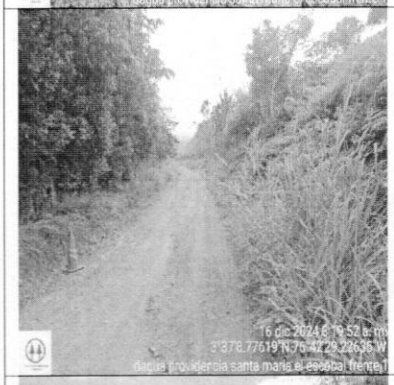

13 dic 2024 2:00:28 p. m.
dagua providencia santa maria el escobal frente


13 dic 2024 2:00:36 p. m.
dagua providencia santa maria el escobal frente



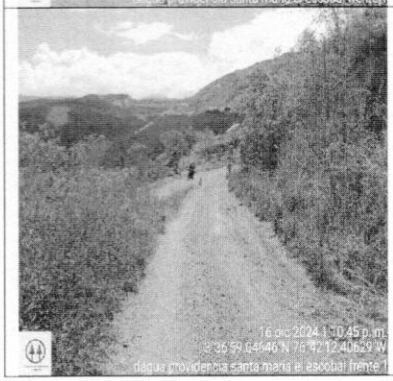


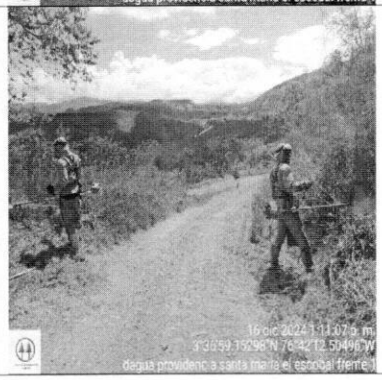
-





-





-

Se puede evidenciar que el contratista cumple con todas las actividades y compromisos en el convenio el contratista anexa un informe final de todas la actividades realizada en las zona urbana y rural del municipio

CUADRO DE TOTALES POR ACTIVIDAD :

ACTIVIDAD	AVANCE
ROCERIA(INCLUYE LA RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA ACTIVIDAD)	202,040 km
ALCANTARILLAS	
LIMPIEZA DESCOLES	536 und
LIMPIEZA ENCOLES	381 und
RECUPERACION ENCOLES	6 und
RECUPERACION DESCOLE	1 und
LIMPIEZA CAJAS	573 und
CUENTAS	
LIMPIEZA Revestida	10868 m
LIMPIEZA en tierra	470 m
RECUPERACION revestida	1835 m
RECUPERACION en tierra	16 m
OTRAS ACTIVIDADES	
LIMPIEZA DE BERMAS	2710 m
LIMPIEZA DE PUENTE	109 m
PODA DE ARBOLES	433 und
PODA DE SINGLA	240 m
LIMPIEZA SEÑALES	19 und
LIMPIEZA PLACA HUELLA	2451 m

AUTORIZACION DE PAGO

Por su parte en el Municipio de Dagua, a los (23) días del mes de DICIEMBRE del año 2024, El doctor **FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ** identificado con **C.C.6.248.473** De Dagua valle , como supervisor del convenio No **2024205** nombre de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO **Identificado** con cedula de ciudadanía Hit. 800080865-8, una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante, por lo cual autoriza a la oficina de presupuesto y tesorería el **pago FINAL # 5**, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato principal por valor : **$ 61.746.959,75** (SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 75 CENTAVOS)

FORMA DE PAGO

El valor del convenio será pagado mediante la presentación de actas parciales las cuales deben ser refrendadas por el Supervisor anexando informe de actividades

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

Valor aporte alcaldía	$ 308.734.797,35
Valor aporte cooperativa	$ 16.249.199,65
Valor total convenio	**$ 324.983.997**
Pagos realizados cooperativa	$ 12.999.359,7
Pagos realizados alcaldía	$ 246.987.837,6
Aporte a realizar cooperativa	$ 3.249.839,95

Pago a realizar	alcaldia	$ 61.746.959,75
Saldo a pagar	cooperativa	$ 00.0
Saldo a pagar	alcaldía	$ 00.0

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

La secretaria de infraestructura del municipio de Dagua certifica que, en el archivo de contratación, expediente del contrato **2024205** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe final de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio fisico	X	Relación de aprobación de póliza	X
Informe de actividades. (, registros fotográficos, y demás soportes)	X	Entrada a almacén	NA
Cuenta de Cobro	X		

Anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN CPS 2024205

El suscrito contratista **DIEGO ASTAIZA VALENCIA** declara que: SI ___ / NO X__ es responsable de IVA.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ C.C.6.248.473 De Dagua valle Supervisor contrato Secretaria de infraestructura	Diego Astaiza V 94.265.607 **DIEGO ASTAIZA VALENCIA** **C.C 94.265.607.** **Representante legal Cooperativa de Trabajo Asociado Loboguerrero** **Pago 5**
