INFORME DE OBRA

REPÙBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTE DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO SIMIJACA

ALCALDIA MUNICIPAL

INFORME ACTA N°1
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SAMC-003-2024

“MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON MODULOS INDEPENDIENTES DE HABITACION EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022”

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
CONSTRATISTA

Calle 4 B # 4 –118 (Chiquinquirá Boyacá)
deltriobras@gmail.com

GENERALIDADES

Las actividades de construcción de mejoramientos de habitaciones para familias vulnerables del municipio, dentro de las cuales se pretende a desarrollar módulos independientes de habitaciones para darle una mejor calidad de vida a cada uno de los beneficiarios. Por lo tanto, se hace necesario el **"MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON MODULOS INDEPENDIENTES DE HABITACION EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022"**, obra que beneficiara a la comunidad del MUNICIPIO DE SIMIJACA, con el fin de mejorar las condiciones de los habitantes



Figura N. ª 1; Localización del proyecto en diferentes sectores y veredas del Municipio de Simijaca

LOCALIZACION

Simijaca es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Ubaté, a 135 km de Bogotá y a 12 km de Chiquinquirá. El territorio, rodeado por el vecino departamento de Boyacá en su gran parte, es bañado por los ríos Simijaca y Suárez, este último afluente de la laguna de Fúquene.

A Simijaca se conecta desde el municipio de Chía por la Ruta Nacional 45A que atraviesa Zipaquirá y Ubaté, desviándose por la variante de la Calle 9 hasta el casco urbano simijense y se retoma a la troncal por la Carrera 8 hacia Chiquinquirá al norte. Entre ambas entradas, sale a San Miguel de Sema y de allí a Tinjacá y Guachetá. Hacia los municipios boyacenses de Buenavista y Caldas, se puede salir por la Calle 9 al occidente

.



Figura N. ª 2; Localización Municipio de Simijaca

ANTECEDENTES

Que el Municipio de Simijaca, tiene como responsabilidad atender los diferentes requerimientos que presentan y así lograr elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que con conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades registradas.

Dentro de las funciones que le corresponde at MUNICIPIO están las de velar por ayudar a solucionar la problemática de déficit en saneamiento básico asociado a la falta de elementos mínimos en las viviendas de algunos de sus habitantes, lo que contribuye con el desarrollo del municipio además de mejorar la calidad de vida de la comunidad y satisfacer las necesidades básicas esenciales para et diario vivir. Es así como se han identificado necesidades de construcción de unidades sanitarias, cocinas y habitaciones.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

Se han priorizado las familias con las necesidades más latentes y que dentro de los planes y proyectos del municipio no habían sido beneficiadas, los lugares para la intervención serán los siguientes:

1. Centro sector Los Tanques
2. Centro sector Los Tanques
3. El Salitre
4. Hato Chicho sector San Rafael
5. Centro sector Los Tanques
6. Centro sector Capitolio
7. Hato Chicho sector Puerto Mazorca
8. Hato Chicho sector San Rafael
9. Aposentos
10. Aposentos
11. Taquira
12. Centro
13. Centro

Teniendo en cuenta las constantes solicitudes por parte de la comunidad en cuanto a diferentes necesidades y falta de habitaciones, se realizará la construcción de 10 habitaciones las cuales cuentan con un área independiente construida de 12,6 m2 aproximadamente.

CONDICIONES INICIALES GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No SAMC-003-2024 DE 2024
OBJETO	"MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON MODULOS INDEPENDIENTES DE HABITACION EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022.".
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VEINTITRES (23) DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato será Hasta Veintitrés (23) de diciembre de 2024 y/o hasta agotar monto, lo primero que suceda, contado el mismo a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (Registro Presupuestal).
VALOR CONTRATO	$ 141.868.511,00
ADICIÓN AL CONTRATO	$ 42.560.560,00
TOTAL, CONTRATO	$ 184.429.071,00
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANA PAOLA MONZÓN MURCIA
SUPERVISOR	ING. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
CONTRATISTA	DELTRI INGEOBRAS S.A.S.
NIT	901.759.170-0
REPRESENTANTE LEGAL	JANDERSON DELGADO PEÑA C.C 80´777.624 DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ

CUADRO PÓLIZAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL.
NIT: 860.037.013-6
PÓLIZA No: CBO-100023945
ANEXO:
AMPAROS:

AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2024	23/06/2025	$ 36.885.814,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/10/2024	23/12/2027	$ 18.442.907,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/12/2024	23/12/2027	$ 55.328.721,30

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL.
NIT 860.009.578-6
PÓLIZA No: CBO 100006075
ANEXO: 0
AMPAROS:

AMPARA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	22/10/2024	31/10/2024	$ 260.000.000,00

RELACION DE TRABAJADORES

En el presente periodo se da inicio a las actividades correspondientes y se tiene un frente de trabajos distribuidos en la zona a intervenir y están conformados así:

PROFESIONALES

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	GARGO
DIEGO FERNANDO ROMERO TRIANA	C.C.	1.053.329.716 de Chiquinquirá (Boyacá)	DIRECTOR
JOSE JOHAN GOMEZ VERANO	C.C.	7.185.922 de Tunja (Boyacá)	RESIDENTE
JANDERSON DELGADO PEÑA	C.C.	C.C: 80.777.624 de Bogotá D.C.	INSPECTOR

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO
GERMAN MONROY AREVALO	C.C.	7.319.301 de Maripi (Boyacá)

RELACION DE BENEFICIAROS

LISTA JEFES DE HOGAR			
N°	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	VEREDA
1	ISAAC ISMAEL PÁEZ PARRA	7.302.219	CENTRO - TANQUES
2	ANATILDE RODRIGUEZ CAÑON	20.930.957	HATO CHICO - SAN RAFAEL
3	PEDRO PABLO RODRÍGUEZ MURCIA	3.172.560	HATO CHICO - SAN RAFAEL
4	MARLENI SUAREZ TORRES	20.931.667	APOSENTOS
5	MARCO AURELIO GUERRERO CASTILLO	388,83	APOSENTOS
6	GLADYS QUINTERO PIMIENTO	37.833.295	SALITRE
7	JOSE DOMINGO ALARCON	3,173087	PANTANO
8	LUIS JAVIER SUAREZ HERNANDEZ	3.174.133	HATO CHICO
9	MARTHA LUCIA ESPEJO BALLEN	20.976.003	CENTRO
10	JOSE IGNACIO ALBORNOZ VILLAMIL	7.311.273	CHURNICA
ADICCIÓN MUNICIPIO			
11	MARIA ANGELITA SUA FUQUENE		TAQUIRA
12	CARLOS GABRIEL RONCO RUBIANO		CENTRO
13	MARIA GRACIELA SICACHA		CENRO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO

De acuerdo al avance de obra y mediciones realizadas por residentes de obra la supervisión teniendo en cuanta los diseños del proyecto se tiene las siguientes cantidades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES			
		UNIDAD	CANT	VLOR UNT	VALOR TOTAL
1.0	**PRELIMINARES**				
1.1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	159.84	$ 4,372.00	$ 698,820.00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	37.20	$ 33,158.00	$ 1,233,478.00
2.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	31.44	$ 123,551.00	$ 3,884,443.00
3.0	**CIMIENTOS**				
3.1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	8.28	$ 755,518.00	$ 6,255,689.00
4.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1088.52	$ 8,473.00	$ 9,223,030.00
4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	183.84	$ 10,622.00	$ 1,952,748.00
5.0	**PISOS Y BASES**				
5.1	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	126.72	$ 55,362.00	$ 7,015,473.00
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
6.1	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	2890.68	$ 17,976.00	$ 51,962,864.00
6.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	20.52	$ 249,112.00	$ 5,111,778.00
6.3	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	UND	12.00	$ 175,531.00	$ 2,106,372.00
6.4	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UND	12.00	$ 138,809.00	$ 1,665,708.00
6.5	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	16.20	$ 149,510.00	$ 2,422,062.00
6.6	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	14.88	$ 50,851.00	$ 756,663.00
7	**MAMPOSTERÍA**				
7.1	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	349.56	$ 44,896.00	$ 15,693,846.00
8	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				
8.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	31.20	$ 22,037.00	$ 687,554.00
9	**CUBIERTAS**				
9.1	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	240.60	$ 59,313.00	$ 14,270,708.00
9.2	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	48.60	$ 68,842.00	$ 3,345,721.00
10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
10.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	12.00	$ 67,414.00	$ 808,968.00
10.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	24.00	$ 65,143.00	$ 1,563,432.00
11	**PINTURAS**				
11.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	31.20	$ 8,729.00	$ 272,345.00
COSTO DIRECTO					**$ 130,931,702.00**
ADMINISTRACION				**20%**	**$ 26,186,340.00**
IMPREVISTO				**5%**	**$ 6,546,585.00**
UTILIDAD				**5%**	**$ 6,546,585.00**
				TOTAL	**$170,211,212.00**

DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES COCINAS

1. PRELIMINARES

1.01 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el contratista con la supervisión del interventor determinara en terreno y según lo estipulado en planos, una línea básica debidamente amojonada y acotada con referencias distantes y bien protegidos y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el contratista, utilizando personal experto y equipos de precisión. Antes de iniciar las obras, el contratista someterá a la aprobación del interventor la localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras.





2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.01 *EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M*

Son los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta profundidades establecidas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Así mismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros.






2.02RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE

Es la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación con plancha vibratoria por capas, de los materiales autorizados por el supervisor para la realización del relleno de zanjas y de excavaciones para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la Supervisión.



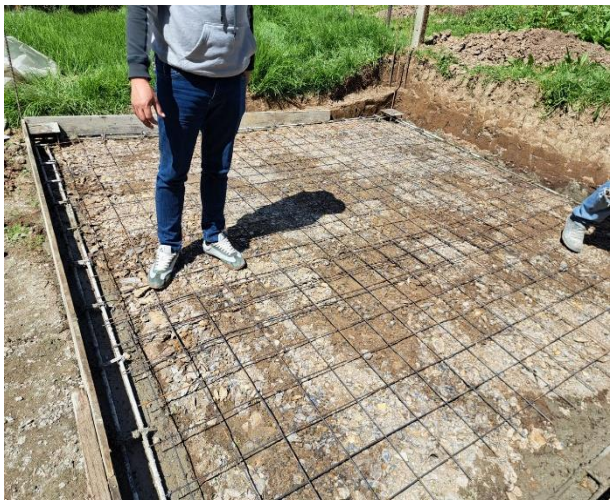

3. CIMENTOS

3.01 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI

Esta actividad se refiere a construcción de vigas de amarre de sección rectangular en concreto reforzado, según localización y dimensiones expresadas en los planos Arquitectónicos y Estructurales. El concreto premezclado será de f'c=3.500 PSI. Para su construcción se rectificará la localización y la dimensión de las vigas en cada uno de los niveles de la estructura para lo cual se replanteará nuevamente el cruce de los ejes correspondiente, así como su dimensión*.*





4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

4.01 ACERO FIGURADO 60000 PSI

Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Supervisión.





4.02 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

Se refiere al suministro de acero de refuerzo malla electro soldada de 5mm 150x150mm, para el reforzamiento de cada uno de los elementos estructurales, según despieces y detalles. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.





5. PISOS Y BASES

5.01 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

Sobre el relleno en recebo compactado y preparado a los niveles indicados en planos arquitectónicos, se ejecutará una losa maciza de contrapiso en concreto reforzado con una resistencia a la compresión del concreto de 2500 PSI, que funcionara como placa para el piso de la vivienda; la cual permitirá la instalación del material final de acabado y en los niveles que el Proyecto Arquitectónico lo describa.





6. CARPINTERIA METALICA

6.01 CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CORTAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA CONTEMPLADA TAMBIEN: FABRICACION, SUMINISTRO, MONTAJE


Es el suministro e instalación perfilería metálica para estructura de la habitación. Dimensiones y calibres según diseño, construida según los diseños y planos, la instalación de la cubierta y de los demás elementos de remate y cierre contemplados en dichos diseños y definidos por la Interventoría.





6.02 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de puertas metálicas en lámina cold rolled calibre 18 de acero, de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

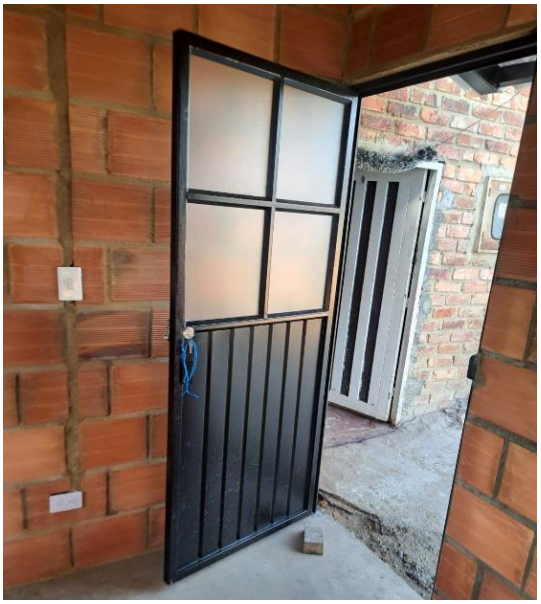



6.03 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8

Se refiere al suministro e instalación de marcos en láminas en los vanos dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de ventanas o puertas, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos arquitectónicos.





6.04 "CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO"

Se refiere al suministro e instalación de cerradura doble cilindro, esta instalación se hará de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos arquitectónicos.





6.05 VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

Se refiere al suministro e instalación de ventana en lámina en los vanos dispuestos en la construcción de muros para estas, con el fin de obtener paso de luz natural hacia la parte interior de la edificación, este proceso se hará de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos arquitectónicos.





6.06 VIDRIO TRASPARENTE 4 MM

Se realiza el suministro e instalación de vidrio incoloro para el cubrimiento de los vanos de los marcos de ventanas, estas instalaciones deben ejecutase con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. El vidrio debe quedar a la medida del marco de la ventana, y no deberá quedar con rayones.





7. MAMPOSTERIA

7.01 MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M

Es el levantamiento de muros a base de bloques de arcilla cocinada, estos se unen utilizando un mortero compuesto de cemento, arena poco y agua, disponiendo las proporciones adecuadas para la aplicación.





8. PAÑETE, REVOQUES Y REPELLOS

8.01 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamado mortero, con el fin de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como estucos, pinturas, entre otros brindando mayor resistencia y estabilidad a los muros. A este proceso también se le conoce como revoque o repello.





9. CUBIERTAS

9.01 TEJA TERMOACUSTICA

Es el suministro e instalación de cubierta en teja termoacustica para el cubrimiento de la parte superior a la que previamente se le ha realizado una estructura metálica para su colocación, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.





9.02 CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA

Es el suministro e instalación del caballete de teja termo acústica para el cubrimiento de la parte superior a la que previamente se le ha realizado una estructura metálica para su colocación, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.





10. INSTALACIONES ELECTRICAS

10.01 SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA

Es el suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión.




10.02 SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

Es el suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético que posteriormente llevara una toma instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos eléctricos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión.




11. PINTURAS

11.01 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

Se refiere a la aplicación de un acabado en pintura vinilo sobre pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes de la edificación, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.





CONTROL DE MATERIALES

Para la ejecución de las obras que comprende desde el 24 de Octubre de 2024 hasta el 11 de Diciembre de 2024 se presenta lo siguientes materiales utilizados en la construcción del proyecto como son:

- Cemento
- Arena amarilla
- Arena lavada
- Gravilla
- Recebo
- Alambre negro
- Ladrillo común
- Teja termo acústica
- Bloque N° 4
- Estructura metálica
- Puertas en lamina calibre 18
- Ventanas en lamina calibre 18
- Aparatos eléctricos
- Cable eléctrico de diferentes colores

EQUIPO UTILIZADO EN LA OBRA

HERRAMIENTA MENOR:

Toda la instrumentación básica que se utiliza en la construcción como: masetas, baldes, cintas métricas, martillos, pulidoras, seguetas, escalera metálica, etc.

MAQUINARIA Y EQUIPO:
Equipo de andamiaje, Vibrio compactador manual mezcladora etc.

- ***CONDICIONES DE ORDEN***

No se presentan problemas de orden público.

- ***CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS***

Las obras se desarrollaron según las instrucciones dadas por la supervisión del municipio, además, se doto el personal con elementos tales como: cascos, gafas, chalecos, guantes, tapa bocas, brindando seguridad a nuestros trabajadores.

El suministro de materiales, insumos y herramientas se ha dado de manera oportuna, se ha brindado rapidez y cumplimiento en el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos constructivos.

- ***MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA.***

Los principales objetivos de las medidas de seguridad en el proyecto fueron:

- Salvaguardar la vida del personal del proyecto.
- Salvaguardar la vida de la comunidad que transiten por las zonas en construcción.
- Procurar el menor deterioro en la zona donde se está haciendo la construcción.

AVANCE DEL PROYECTO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 141,868,511.00	
ANTICIPO		N/A
VALOR CONTRATOS ADICIONALES	$ 42,560,560.00	
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1		$ 170,211,212.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 14,217,859.00
SUMAS IGUALES	**$ 184,429,071.00**	**$ 184,429,071.00**

El contrato de obra se encuentra ejecutado en un 90 %, de acuerdo al desarrollo de cada ítem, lo que corresponde al 90 % del presupuesto oficial. Se cumplió con el plazo estipulado para la ejecución de la obra, ya que el porcentaje de tiempo desde la fecha del acta de inicio a la fecha del informe acta parcial 1 es de 90 %, se realizara entregables 9 unidades habitaciones correspondientes al convenio "CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022", adicional de 3 tres unidades habitacionales correspondiente de la adición presupuestal del municipio de Simijaca para un total de 12 habitaciones.

DELTRI INGEOBRAS S.A.S
REP/L JANDERSON DELGADO PEÑA
Contratista

PLANILLAS DE SEGURIDAD

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759170	0	DELTRI INGEOBRAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 4 B 4 118	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3232528232	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478602540	9478602540	E	2024/12/17	2024/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	$805,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80777624	DELGADO PEÑA JANDERSON	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	7319301	MONROY AREVALO GERMAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$805,000	$0	$0	$805,000

2024/12/17 05:54 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901759170	0	DELTRI INGEOBRAS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 4 B 4 118	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3232528232	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9479220265	9479220265	E	2025/01/20	2024/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$993,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80777624	DELGADO PEÑA JANDERSON	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1055963688	MONROY RINCON CRISTIAN JEFERSON	230301	21	$910,000	$145,600	ESSC24	21	$910,000	$36,400	CCF10	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
3	CC	7319301	MONROY AREVALO GERMAN	230301	23	$996,667	$159,500	EPS041	23	$996,667	$39,900	CCF10	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$3,206,667**	**$513,100**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$3,206,667**	**$223,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$513,100	$0	$0	$513,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$305,100	$0	$0	$305,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$223,300	$0	$0	$223,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$223,300	$0	$0	$223,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$128,300	$0	$0	$128,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$128,300	$0	$0	$128,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$128,300	$0	$0	$128,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$39,900	$0	$0	$39,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				3	$993,000	$0	$0	$993,000

2024/12/20 03:15 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053329716		ROMERO TRIANA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 27 N 9-24	CHIQUINQUIRA-BOYACA	4799345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	9478716403	9478716403	I	2024/12/05	2024/12/17	BANCO DE BOGOTA	12	$203,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1053329716	ROMERO TRIANA DIEGO FERNANDO	230301	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0	14-11	16	$693,334	$3,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$693,334**	**$111,000**			**$693,334**	**$86,700**			**$0**	**$0**			**$693,334**	**$3,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,000	$900	$0	$111,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$111,000	$900	$0	$111,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$100	$0	$3,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,700	$100	$0	$3,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,700	$700	$0	$87,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$86,700	$700	$0	$87,400
TOTAL				**1**	**$201,400**	**$1,700**	**$0**	**$203,100**

2024/12/17 05:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053329716		ROMERO TRIANA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 27 N 9-24	CHIQUINQUIRA-BOYACA	4799345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9479269711	9479269711	I	2025/01/08	2024/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$264,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1053329716	ROMERO TRIANA DIEGO FERNANDO	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$113,800		0	$0	$0	14-11	21	$910,000	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$910,000	$145,600			$910,000	$113,800			$0	$0			$910,000	$4,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,600	$0	$0	$145,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,600	$0	$0	$145,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,800	$0	$0	$113,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,800	$0	$0	$113,800
TOTAL				1	$264,200	$0	$0	$264,200

2024/12/20 03:17 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7185922		GOMEZ VERANO JOSE JOHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 21 No. 12-14	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3162718944	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1134349908	9479041761	I	2024/12/06	2024/12/17	BANCOLOMBIA	11	$464,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC 7185922	GOMEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7185922		GOMEZ VERANO JOSE JOHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 21 No. 12-14	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3162718944	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1134349908	9479041761	I	2024/12/06	2024/12/17	BANCOLOMBIA	11	$464,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,600	$0	$209,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,600	$0	$209,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$700	$0	$91,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$700	$0	$91,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$1,200	$0	$163,700
TOTAL				1	$461,000	$3,500	$0	$464,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7185922		GOMEZ VERANO JOSE JOHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 21 No. 12-14	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3162718944	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9479239100	9479239100	I	2025/01/09	2024/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$90,500**		**$0**	**$0**		**$461,000**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$90,500**		**$0**	**$0**		**$461,000**
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	7185922	GOMEZ JOSE	X	X															25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7185922		GOMEZ VERANO JOSE JOHAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 21 No. 12-14	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3162718944	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9479239100	9479239100	I	2025/01/09	2024/12/23	BANCO DE BOGOTA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$461,000**	**$0**	**$0**	**$461,000**

FACTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32bbc049f979fe44c0fe6b6de5dd89432ff55b6ef18fbc12fb0d9c996f146dd03999baf5a8ee8068ced1a7dece952da0

Número de Factura: FV-4
Fecha de Emisión: 18/12/2024
Fecha de Vencimiento: 18/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DELTRI INGEOBRAS S.A.S.
Nombre Comercial: DELTRI INGEOBRAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901759170
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Chiquinquirá
Dirección: CL 4 B 4 118
Teléfono / Móvil: 3124150687
Correo: DELTRIOBRAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SIMIJACA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 899999384
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Simijaca
Dirección: calle 8 7 39
Teléfono / Móvil: 3219877075
Correo: planeacion@simijaca-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	ACTA PARCIAL DE PAGO 1 CONTRATO Nº: SAMC-003-2024 OBJETO: MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON MODULOS INDEPENDIENTES DE HABITACION EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022	NIU	1,00	$ 170.211.212,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.211.212,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2024 11:51:32
Documento validado por la DIAN:
18/12/2024 11:51:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	170211212
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	170211212
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	170211212
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 170211212

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	170.211.212,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	170.211.212,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	170.211.212,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$170.211.212,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063084537 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-12-30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9dbbe99df91261b5e98e2e2dcbbf0ffa2df69bdb474118fbd4a0260268a94a01d99adc5a20cad1651756ef7a80c07849

Número de Factura: FV-7
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DELTRI INGEOBRAS S.A.S.
Nombre Comercial: DELTRI INGEOBRAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901759170
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Chiquinquirá
Dirección: CL 4 B 4 118
Teléfono / Móvil: 3124150687
Correo: DELTRIOBRAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SIMIJACA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 899999384
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Simijaca
Dirección: calle 8 7 39
Teléfono / Móvil: 3219877075
Correo: planeacion@simijaca-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No SAMC-003-2024 OBJETO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA CON MÓDULOS INDEPENDIENTES DE HABITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL CONVENIO SHVS-CDCVI-106-2022	NIU	1,00	$ 14.184.269,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.184.269,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 11:25:08
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 11:25:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14184269
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14184269
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	14184269
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14184269

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.184.269,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.184.269,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	14.184.269,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.184.269,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063084537 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-12-30
