







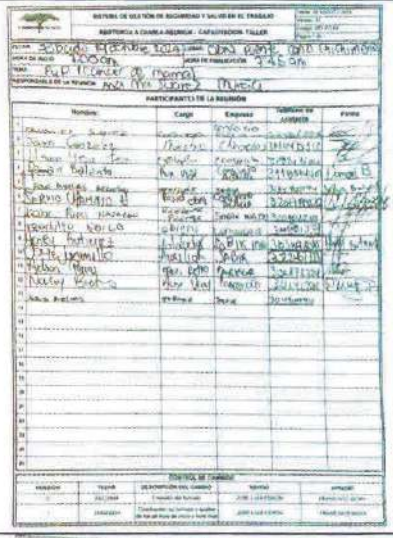

CHARLAS PRE OPERACIONALES	PERIODO	FECHA
Actividad realizada por la profesional SISO del contratista	Octubre-2024	22-10-2024

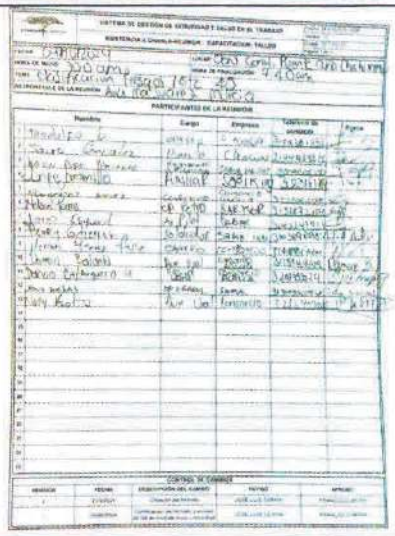

5.7. Supervisión de Interventoría inspecciones de herramienta y maquinaria.

Se realiza por parte de interventoría la inspección la inspección a maquinaria amarilla y herramienta general.

INSPECCIONES GENERALES DE SST.	PERIODO	FECHA
Inspección de maquinaria y herramientas	Octubre-2024	22-10-2024





5.8. Supervisión documental al personal autorizado para vinculación y retirado.

No se realiza entrega a la interventoría por parte del contratista.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES / PENDIENTES

5.9. Pagos de seguridad social del contratista.


Mes		Empresa	Planilla No	Referencia de pago	Pago Total
Mayo	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	806459961	9470681500	$153,600,00
Mayo	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	740717841	9468427551	$49,600,00
Mayo	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9470677609	806465961	$112,400

Mayo	Mi Planilla	Uriel Andres Escalante Rueda	78601096	N.A.	$377.300
Mayo	SOI	Rodrigo Suarez Quiñonez	7925800621	731778316	
Junio	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9470681163	806452432	$368,600,00
Junio	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9469704123	755449332	$1,847,000,00
Junio	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	78865994	N.A.	$197.200,00
Junio	Mi Planilla	Uriel Andres Escalante Rueda	78601096	N.A.	$377.300
Junio	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7935697705	806560376	$ 404.400,00
Junio	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	78780800	N.A.	$505.100,00
Julio	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9471085372	827124161	$2,876,300,00
Julio	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9471085167	827116158	$369,000,00
Julio	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	79215946	N.A	$175.000,00
Julio	Mi Planilla	Uriel Andres Escalante Rueda	79292829	N.A	$377.300
Julio	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7937335266	831158996	$398.500,00
Julio	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	78780786	N.A	$505.100,00
Julio	Aportes en Línea	Figuarmar S.A.S	9471132910	830993970	$713,800,00
Agosto	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9472748784	890988462	$2,876,300,00
Agosto	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9472748970	890995210	$369,900,00
Agosto	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	79465596	N.A	$175.000,00
Agosto	Mi Planilla	Uriel Andres Escalante Rueda	80026713	N.A	$377.300
Agosto	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7940362134	892618767	$398.500,00
Agosto	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	80027315	N.A	$505.100,00
Agosto	Aportes en Línea	Figuarmar S.A.S			$713.800,00
Agosto	SOI	Sabik Ingenieria SAS			
Agosto	Aportes en Línea	Parker SAS	9473334803	916394572	$1,422,400
Septiem	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9475330634	974938616	$4,468,800,00
Septiem	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	974954375	9475330903	$370,900,00
Septiem	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	80229175	N. A	$177.400,00
Septiem	Mi Planilla	Uriel Andres Escalante Rueda	81103199	N. A	$378.800
Septiem	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7940727094	997069677	$402.300,00
Septiem	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	81117502	N. A	$378.500,00
Septiem	SOI	Sabik Ingenieria SAS	7945789748	981526277	$6.064.900,00
Septiem	Aportes en Línea	Parker SAS	9476547846	1013317116	$1,869,800,00
Octubre	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9477216674	1044955986	$4,542,200,00
Octubre	Aportes en Línea	Consorcio Acacia	9477216523	1044950062	$370,400,00
Octubre	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	81526341	N. A	$175.000,00
Octubre	Mi Planilla	Uriel Andres Escalante Rueda	81752921	N. A	$377.300,00
Octubre	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7946428579	1045142666	$ 398.700,00
Octubre	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	81588707	N. A	$377.300,00
Octubre	SOI	Sabik Ingenieria SAS	7949357893	1048841654	$6.559.600,00
Octubre	Aportes en Línea	Parker SAS	9476928435	1034491555	$1,861,000,00

5.10. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría en sus funciones de control y supervisión al contratista, en la implementación de cada uno de los ítems relacionados, no evidencia cumplimiento.

	ESTADO			
DESCRIPCIÓN	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**	**OBSERVACIONES**
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa	X			Se cuenta con personal y se ha entregado dotación acorde a la necesidades
Buen estado	X			
Uso según zona de trabajo	X			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
Dotación completa	X			Se cuenta con campamento ubicado en predio cercano a la localización del puente
Buen estado	X			
Fácil acceso y operación	X			
Uso según zona de trabajo	X			
Existencia de elementos primeros auxilios	X			
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo	X			Solamente se cuenta con una maquinaria encargada de excavaciones y descapote
Regularidad del mantenimiento	X			
Vibraciones /Ruidos		X		
Protecciones / Guardas / Frenos		X		
Idoneidad operarios	X			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN.				
Uso permanente	X			Se encuentra debidamente señalizada y delimitada
Uso según zona de trabajo	X			
VIGILANCIA				
Personal suficiente		X		Solamente se cuenta con vigilancia nocturna para maquinaria
Diurna			X	
Nocturna	X			
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia			X	No han aportado documentación
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP			X	

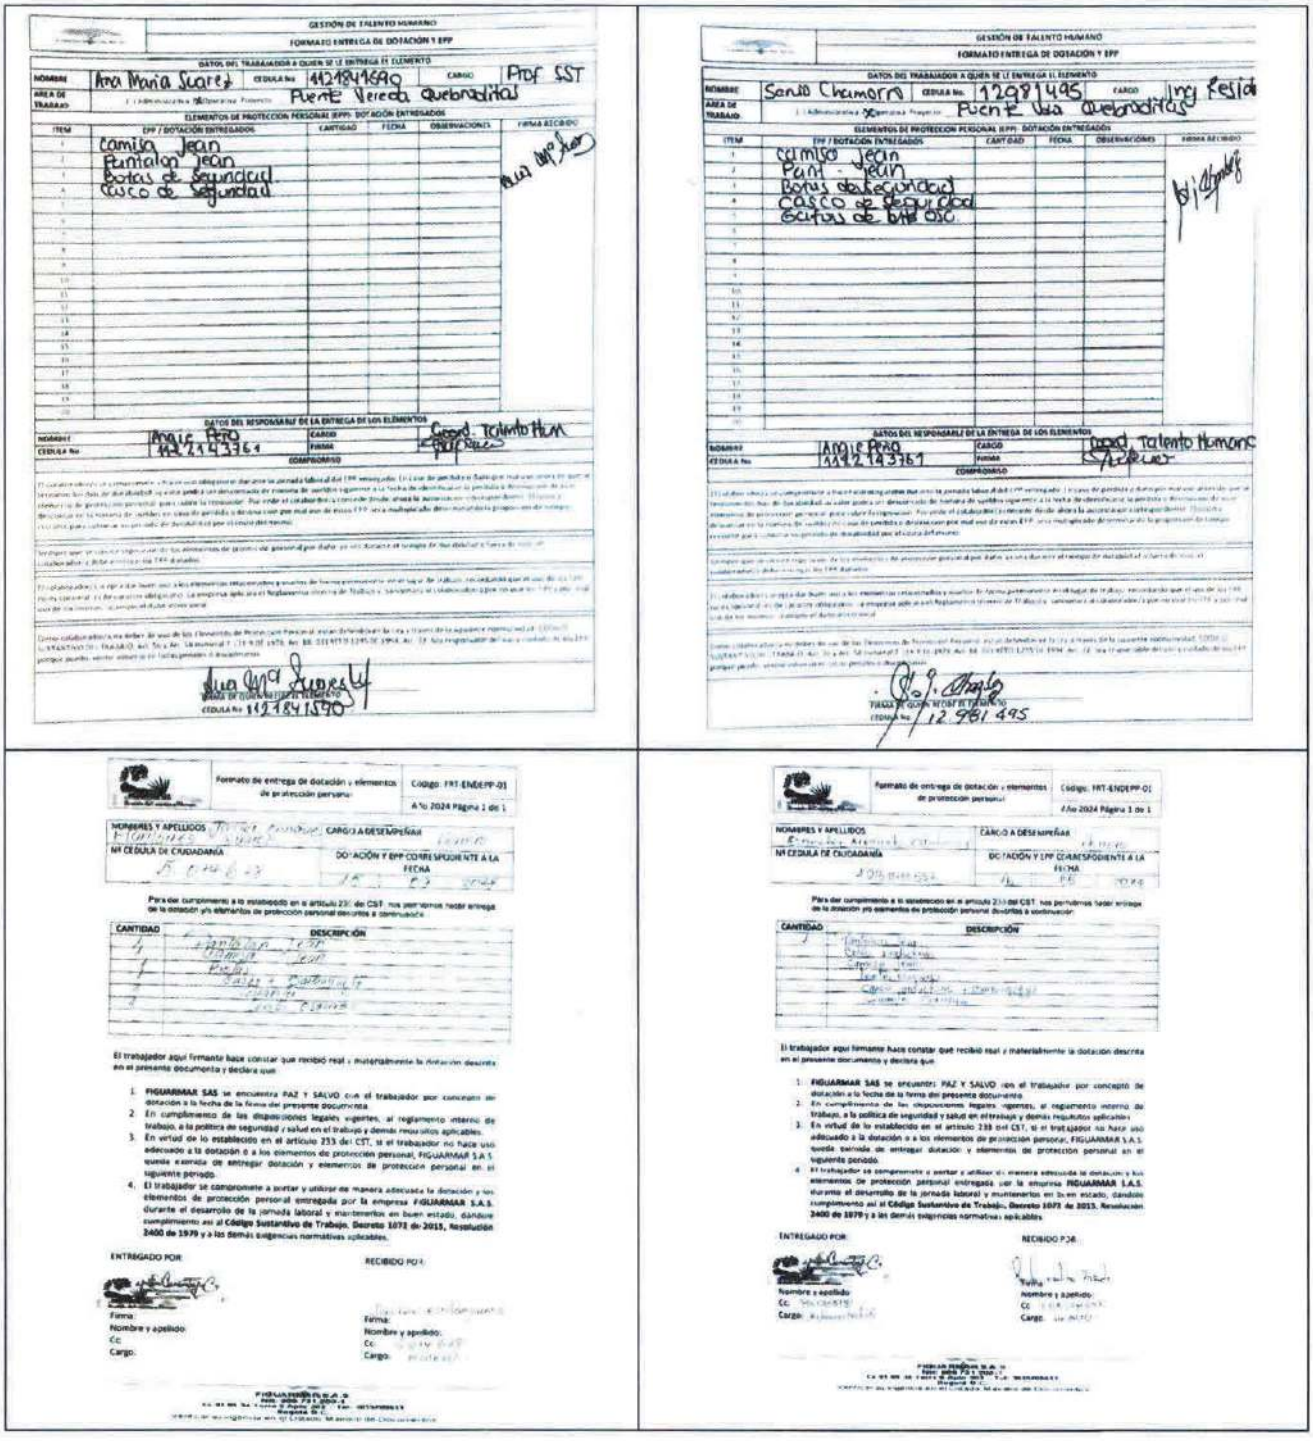

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Ana María Suarez — CEDULA No: 1121841590 — CARGO: Prof SST

AREA DE TRABAJO: Administrativa — Operativa — Proyecto: Puente Vereda Quebraditas

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)- DOTACIÓN ENTREGADOS

ITEM	EPP / DOTACIÓN ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES	FIRMA RECIBIDO
1	Camisa Jean				
2	Pantalon Jean				
3	Botas de Seguridad				
4	Casco de Seguridad				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Angie Pino — CARGO: Coord. Talento Hum

CEDULA No: 1121743761 — FIRMA: — COMPROMISO

Ana María Suarez

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO

CEDULA No: 1121841590

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Sonia Chamorro — CEDULA No: 12981495 — CARGO: Ing Residente

AREA DE TRABAJO: Administrativa — Operativa — Proyecto: Puente Vda Quebraditas

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)- DOTACIÓN ENTREGADOS

ITEM	EPP / DOTACIÓN ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES	FIRMA RECIBIDO
1	Camiso Jean				
2	Pant - Jean				
3	Botas de seguridad				
4	Casco de Seguridad				
5	Gafas de Bate OSC				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE: Angie Pino — CARGO: Coord. Talento Humano

CEDULA No: 1121743761 — FIRMA: — COMPROMISO

TALENTO HUMANO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO

CEDULA No: 12 981 495

Formato de entrega de dotación y elementos de protección personal — Código: FRT-ENDEPP-01 — A°o 2024 Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS — CARGO A DESEMPEÑAR

Nº CEDULA DE CIUDADANÍA — DOTACIÓN Y EPP CORRESPONDIENTE A LA FECHA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del CST, nos permitimos hacer entrega de la dotación y/o elementos de protección personal descritos a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Pantalon Jean
1	Camisa Jean
1	Botas de Seguridad
1	Casco de Seguridad
1	Gafas Transparentes

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:

1. **FIGUARMAR SAS** se encuentra PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.
2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, al reglamento interno de trabajo, a la política de seguridad y salud en el trabajo y demás requisitos aplicables.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso adecuado a la dotación o a los elementos de protección personal, **FIGUARMAR S.A.S.** queda exenta de entregar dotación y elementos de protección personal en el siguiente periodo.
4. El trabajador se compromete a portar y utilizar de manera adecuada la dotación y los elementos de protección personal entregada por la empresa **FIGUARMAR S.A.S.** durante el desarrollo de la jornada laboral y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento así al **Código Sustantivo de Trabajo. Decreto 1072 de 2015, Resolución 2400 de 1979** y a las demás exigencias normativas aplicables.

ENTREGADO POR:

Firma:
Nombre y apellido:
Cc:
Cargo:

RECIBIDO POR:

Firma:
Nombre y apellido:
Cc:
Cargo:

FIGUARMAR S.A.S.
Nit. 900.751.200-2
Bogotá D.C.

Formato de entrega de dotación y elementos de protección personal — Código: FRT-ENDEPP-01 — A°o 2024 Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS — CARGO A DESEMPEÑAR

Nº CEDULA DE CIUDADANÍA — DOTACIÓN Y EPP CORRESPONDIENTE A LA FECHA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del CST, nos permitimos hacer entrega de la dotación y/o elementos de protección personal descritos a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	

El trabajador aquí firmante hace constar que recibió real y materialmente la dotación descrita en el presente documento y declara que:


1. **FIGUARMAR SAS** se encuentra PAZ Y SALVO con el trabajador por concepto de dotación a la fecha de la firma del presente documento.
2. En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, al reglamento interno de trabajo, a la política de seguridad y salud en el trabajo y demás requisitos aplicables.
3. En virtud de lo establecido en el artículo 233 del CST, si el trabajador no hace uso adecuado a la dotación o a los elementos de protección personal, FIGUARMAR S.A.S. queda exenta de entregar dotación y elementos de protección personal en el siguiente periodo.
4. El trabajador se compromete a portar y utilizar de manera adecuada la dotación y los elementos de protección personal entregada por la empresa **FIGUARMAR S.A.S.** durante el desarrollo de la jornada laboral y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento así al **Código Sustantivo de Trabajo., Decreto 1072 de 2015, Resolucion 2400 de 1979** y a las demás exigencias normativas aplicables.

ENTREGADO POR:

Nombre y apellido:
Cc:
Cargo:

RECIBIDO POR:

Nombre y apellido:
Cc:
Cargo:

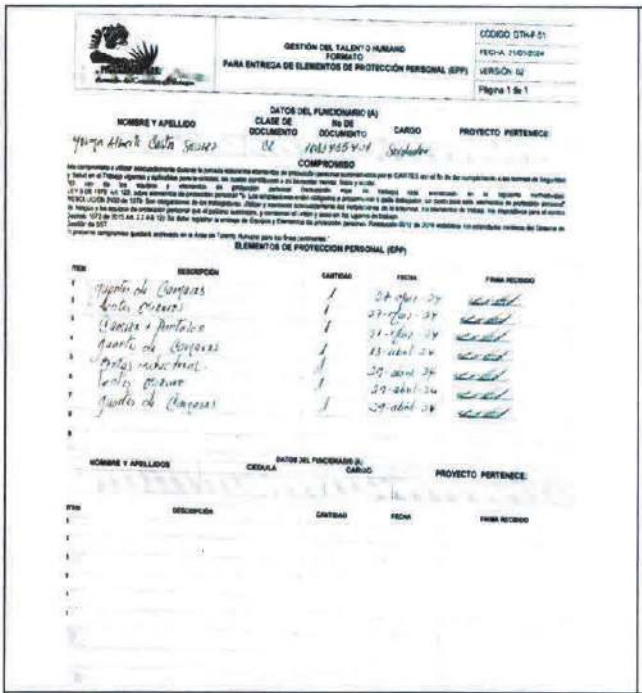

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
FORMATO
PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CÓDIGO GTH-F-51
FECHA 21/01/2024
VERSIÓN 02
Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDO	CLASE DE DOCUMENTO	No DE DOCUMENTO	CARGO	PROYECTO PERTENECE
Yenny Alberth Cueto Suarez	CC	1083955404	Soldador	

COMPROMISO


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Uniforme de Overoles	1	24-abril-24	
2	Botas (Pantalon)	1	24-abril-24	
3	Camisa y Pantalon	1	24-abril-24	
4	Guante de Cargueo	1	24-abril-24	
5	Botas reflectivas	1	24-abril-24	
6	Tapa oidos	1	24-abril-24	
7	Guantes de Cargueo	1	24-abril-24	
8				

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	PROYECTO PERTENECE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1				
2				
3				
4				
5				
6				

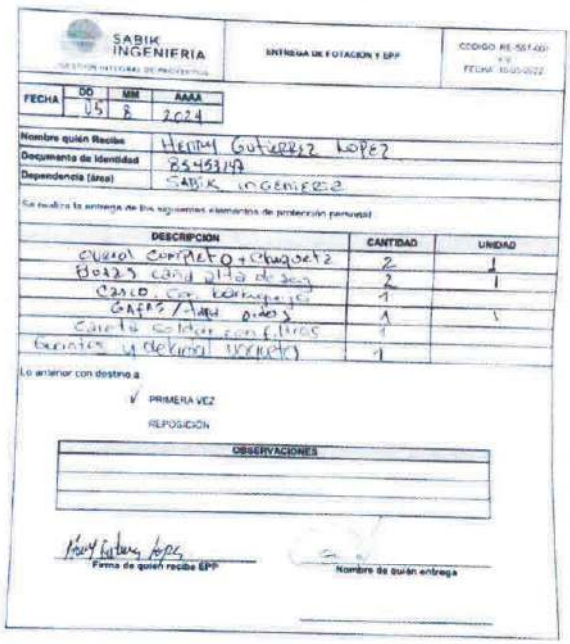

SABIK INGENIERIA

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

CODIGO RE-SST-001
V.0
FECHA 10/05/2022

FECHA	DD	MM	AAAA
	05	2	2024

Nombre quién Recibe	Henny Gutierrez Lopez
Documento de identidad	85453147
Dependencia (área)	SABIK INGENIERIA

Se realiza la entrega de los siguientes elementos de protección personal

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
Overol completo + Chaqueta	2	1
Botas cana alta de cuero	2	1
Casco con barbuquejo	1	
Gafas	1	1
Careta soldar con filtros	1	
Guantes de cuero	1	

Lo anterior con destino a


✓ PRIMERA VEZ


REPOSICIÓN

OBSERVACIONES

Henny Gutierrez Lopez
Firma de quién recibe EPP

Nombre de quién entrega

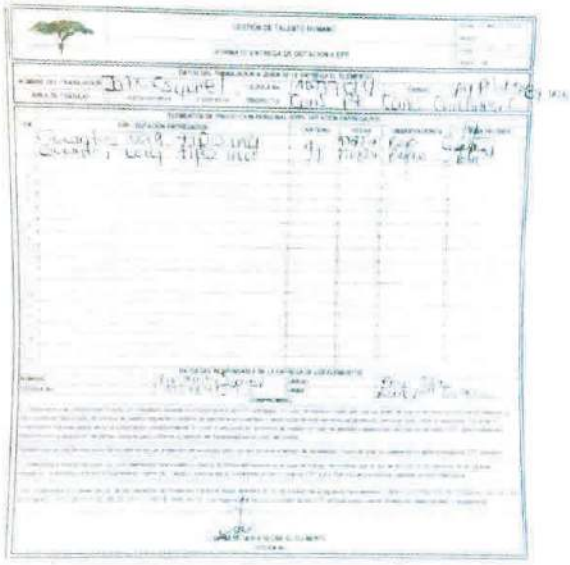

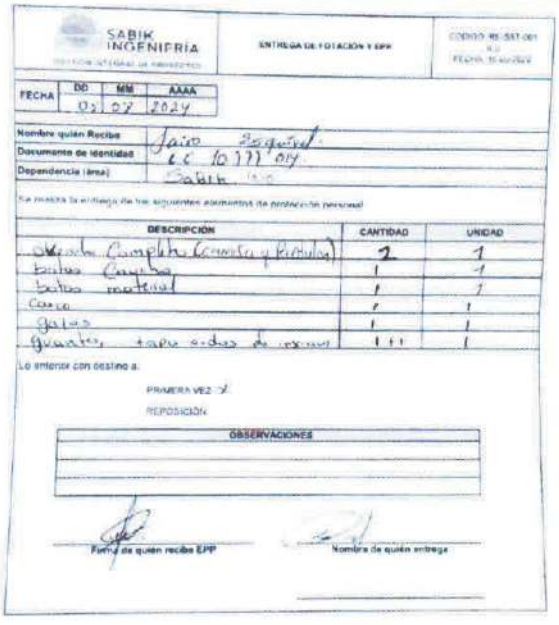

SABIK INGENIERIA

ENTREGA DE DOTACION Y EPP

CODIGO RE-SST-001
V.0
FECHA 10/05/2022

FECHA	DD	MM	AAAA
	02	07	2024

Nombre quién Recibe	Jairo Izquierdo
Documento de identidad	CC 10777 014
Dependencia (área)	Sabik

Se realiza la entrega de los siguientes elementos de protección personal

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
Overol Completo (Camisa y Pantalon)	2	1
Botas Caucho	1	1
Botas material	1	1
Casco	1	1
Gafas	1	1
Guantes, tapa oidos de ruido	1	1

Lo anterior con destino a


PRIMERA VEZ ✓

REPOSICIÓN

OBSERVACIONES

Firma de quién recibe EPP

Nombre de quién entrega

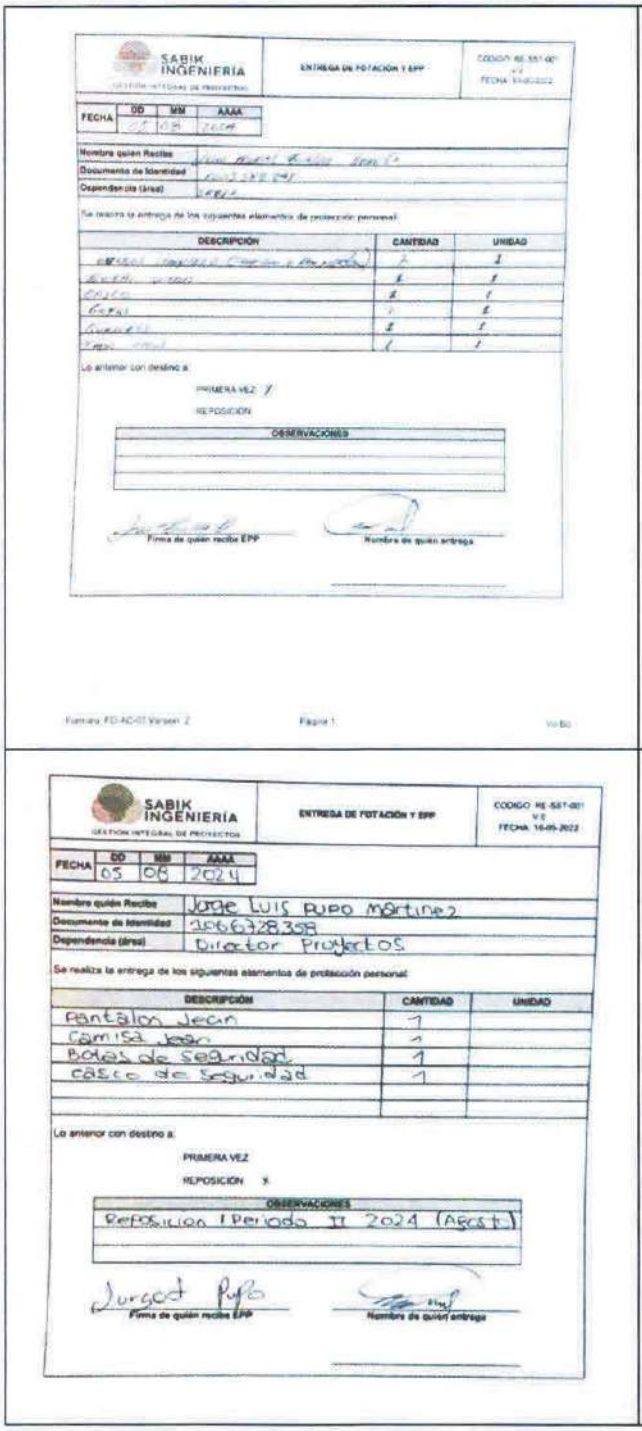

SABIK INGENIERÍA — ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP — CODIGO HS-SST-001 V2 FECHA 16-05-2022

FECHA: DD 05 MM 08 AAAA 2024

Nombre quién Recibe: Jorge Luis Rupo Martinez
Documento de Identidad: 1066728398
Dependencia (área): Director Proyectos

Se realiza la entrega de los siguientes elementos de protección personal:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
Pantalon Jean	1	
Camisa Jean	1	
Botas de seguridad	1	
casco de seguridad	1	


Lo anterior con destino a:

PRIMERA VEZ
REPOSICIÓN X

OBSERVACIONES: Reposicion 1 Periodo II 2024 (Agost.)

Firma de quién recibe EPP — Nombre de quién entrega


Formato FO-AC-07 Version 2 — Página 1 — Vo.Bo

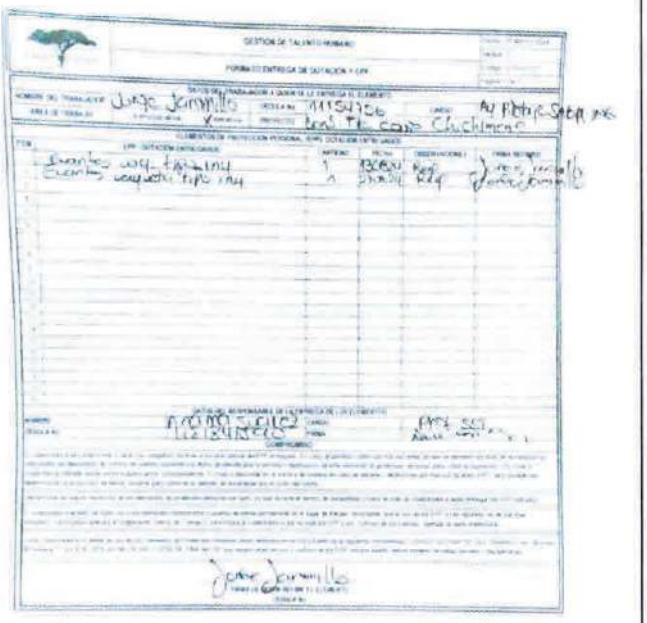

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO — FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Jorge Jaramillo — 1115475126 — Ayudante SSGA — Inst. Plc. Cons. Chichimene


Guantes vaqueta tipo ing 1 — Botas tipo ing 1 — Jorge Jaramillo

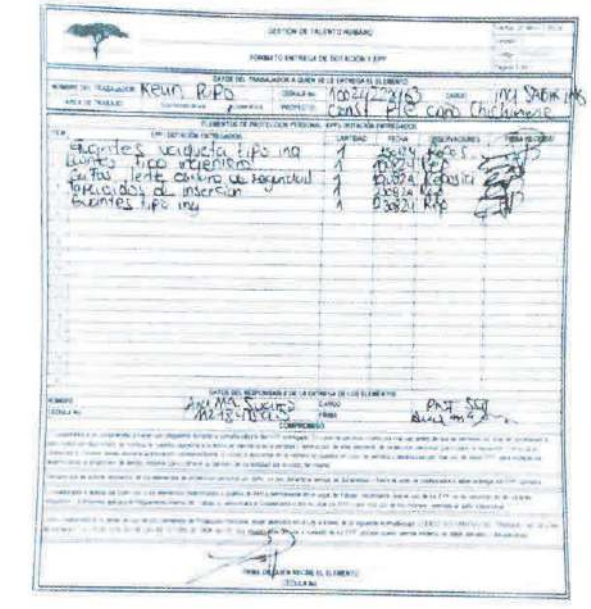



GESTIÓN DE TALENTO HUMANO — FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP

Reun. Rupo — 1006722818 — INV SABIK INK — Const. Plc. Cons. Chichimene

Guantes vaqueta tipo ing 1 — Botas tipo ing 1 — Gafas lente contra de seguridad 1 — Tapa oidos de insercion 1 — Guantes tipo ing 1

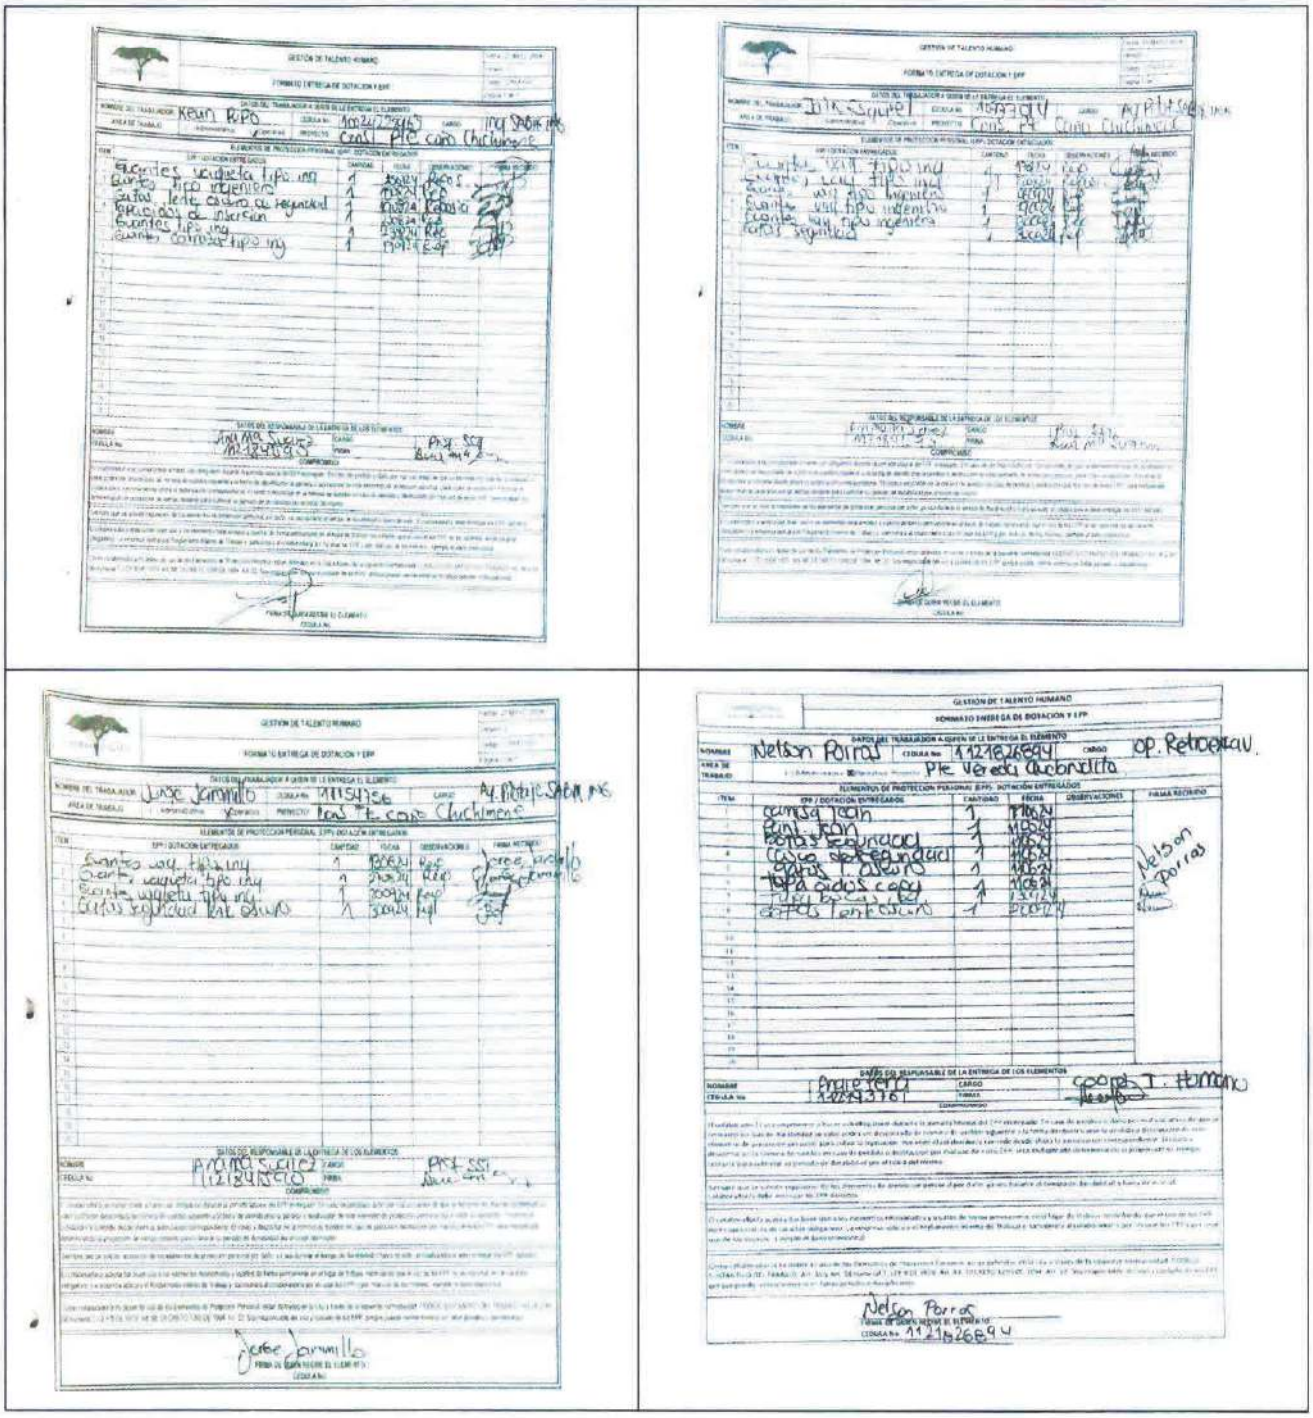


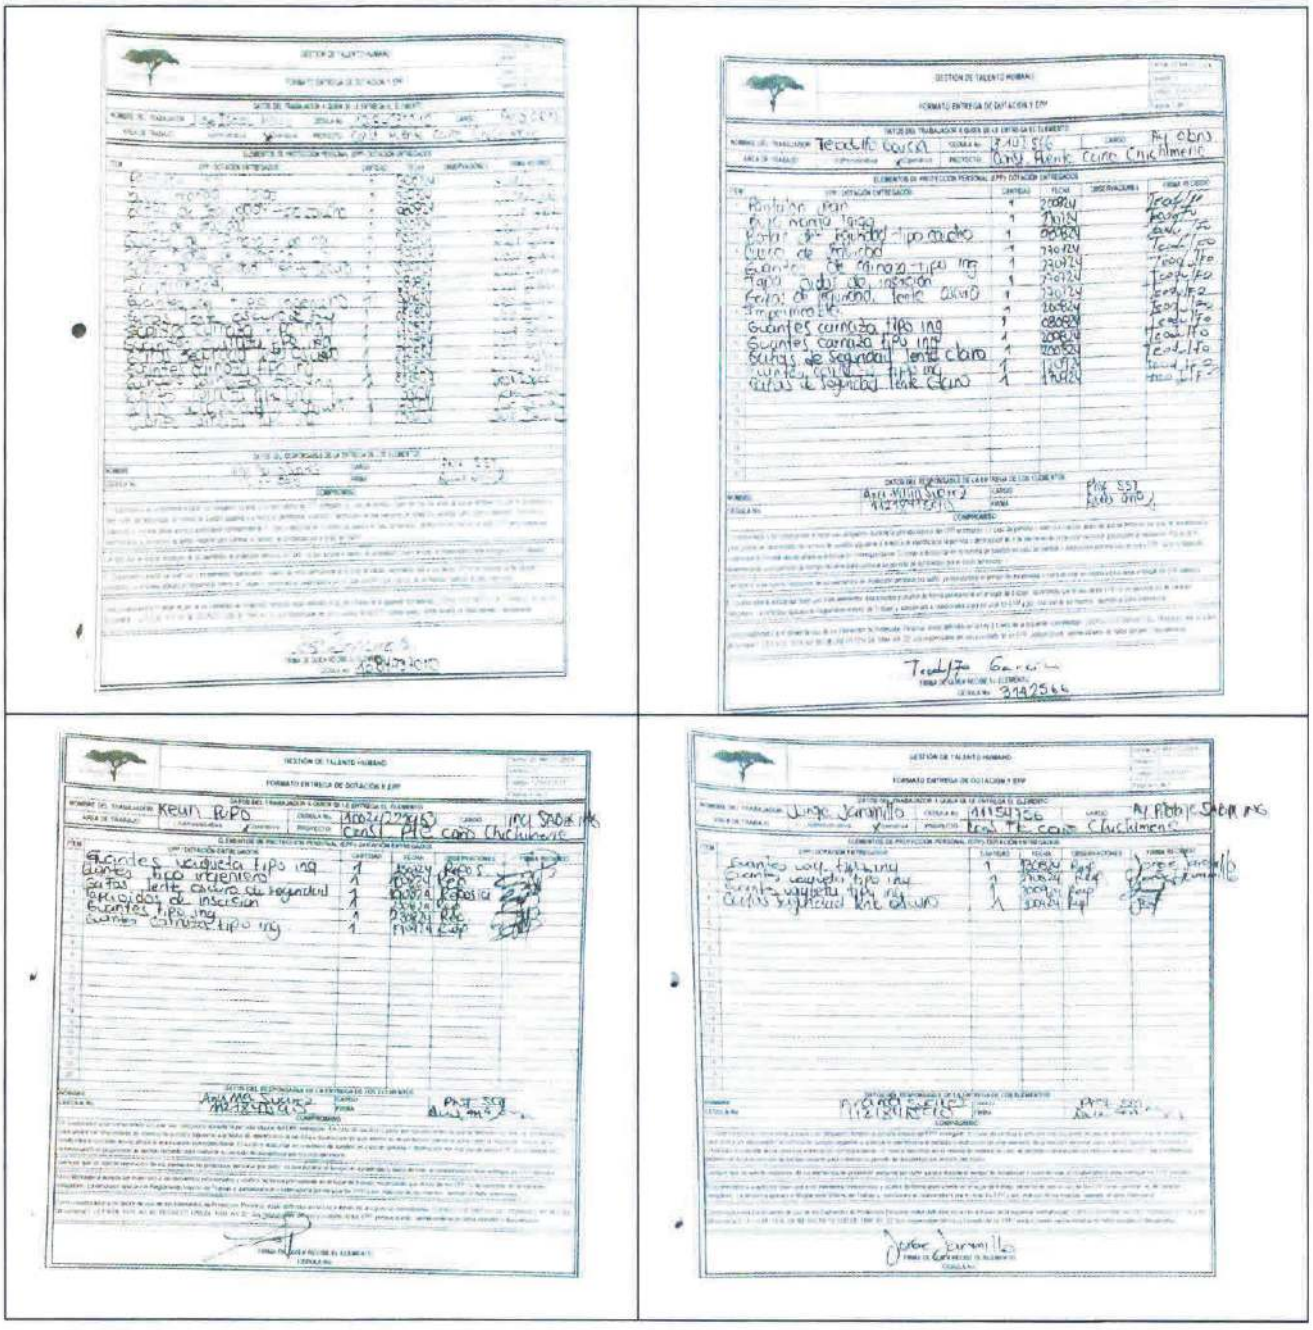

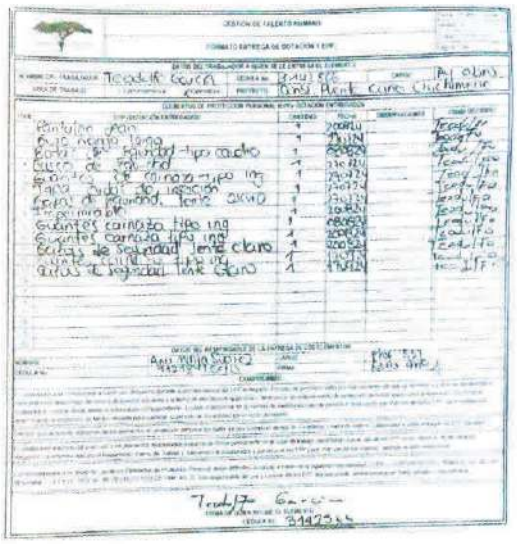

INDICADORES HSE			
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
Total, de HHTT Mes:	0	Total, HHTT acumuladas:	0
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR (SI SE PRESENTO)			

5.11. Certificado de accidentalidad de la ARL del contratista.

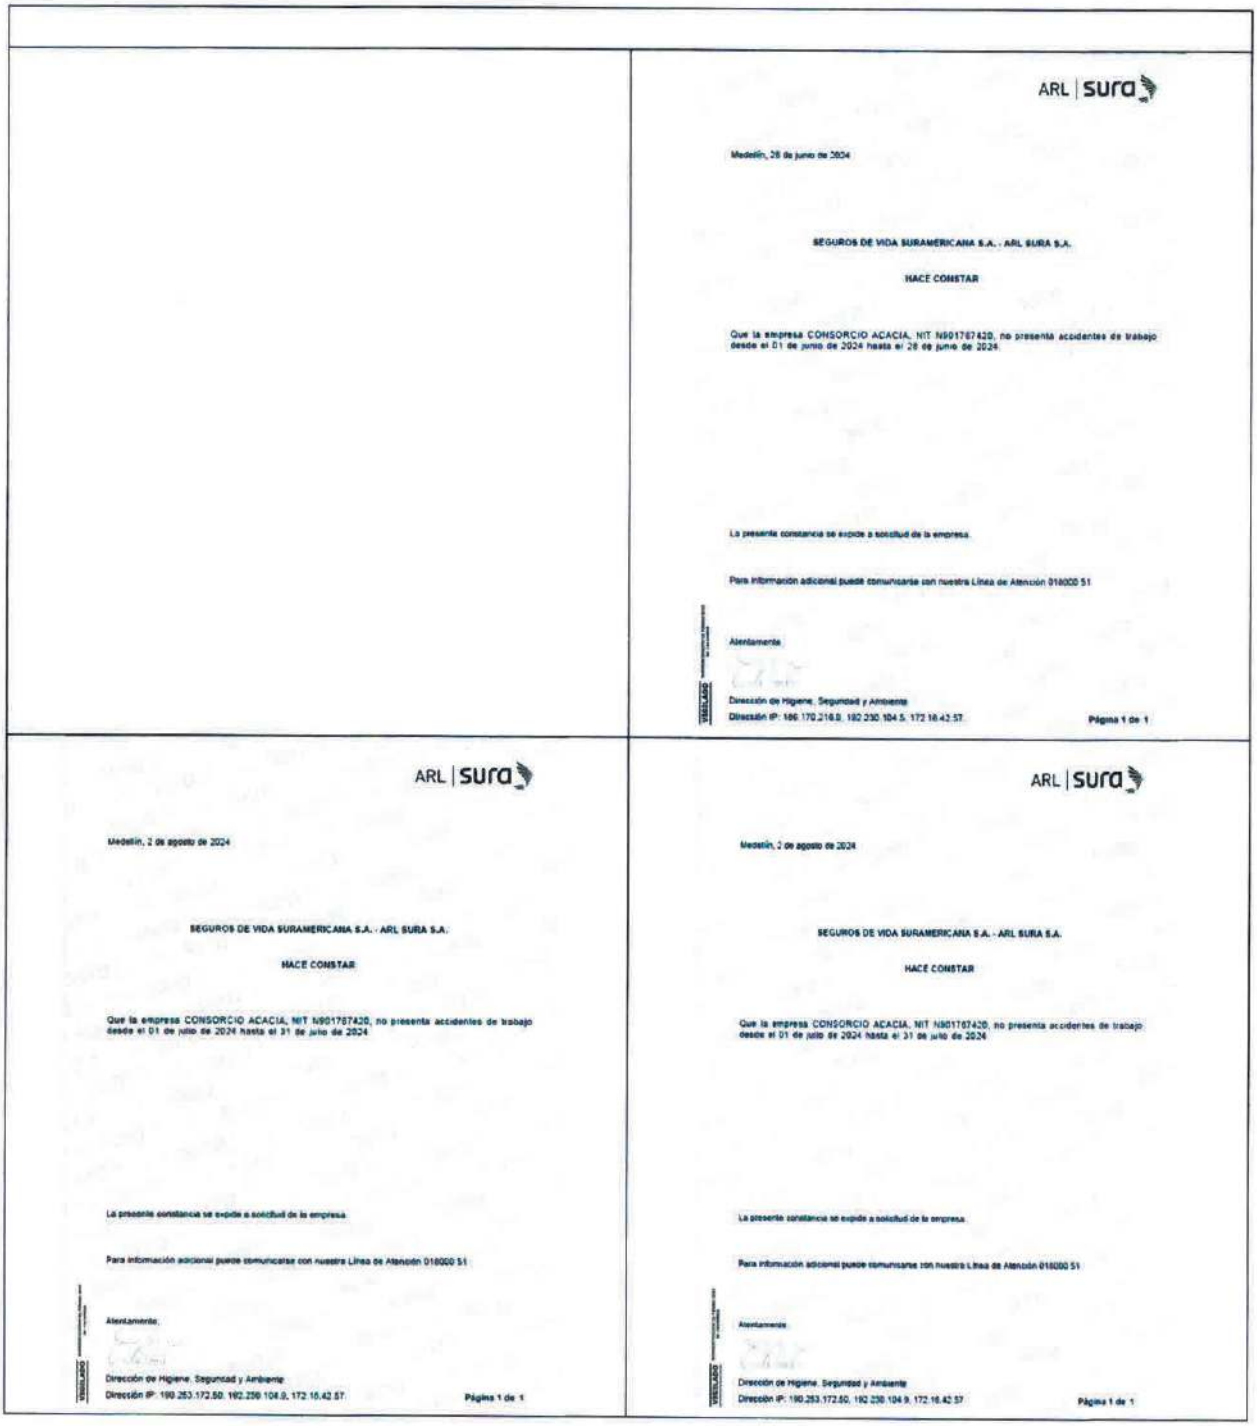

ARL | sura

Medellín, 28 de junio de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ACACIA, NIT N901787420, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de junio de 2024 hasta el 28 de junio de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

VIGILADO

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.170.218.8, 192.230.104.5, 172.16.42.57

Página 1 de 1

ARL | sura

Medellín, 2 de agosto de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ACACIA, NIT N901787420, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

VIGILADO

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.253.172.50, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Página 1 de 1

ARL | sura

Medellín, 2 de agosto de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ACACIA, NIT N901787420, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51


Atentamente,

VIGILADO

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.253.172.50, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Página 1 de 1

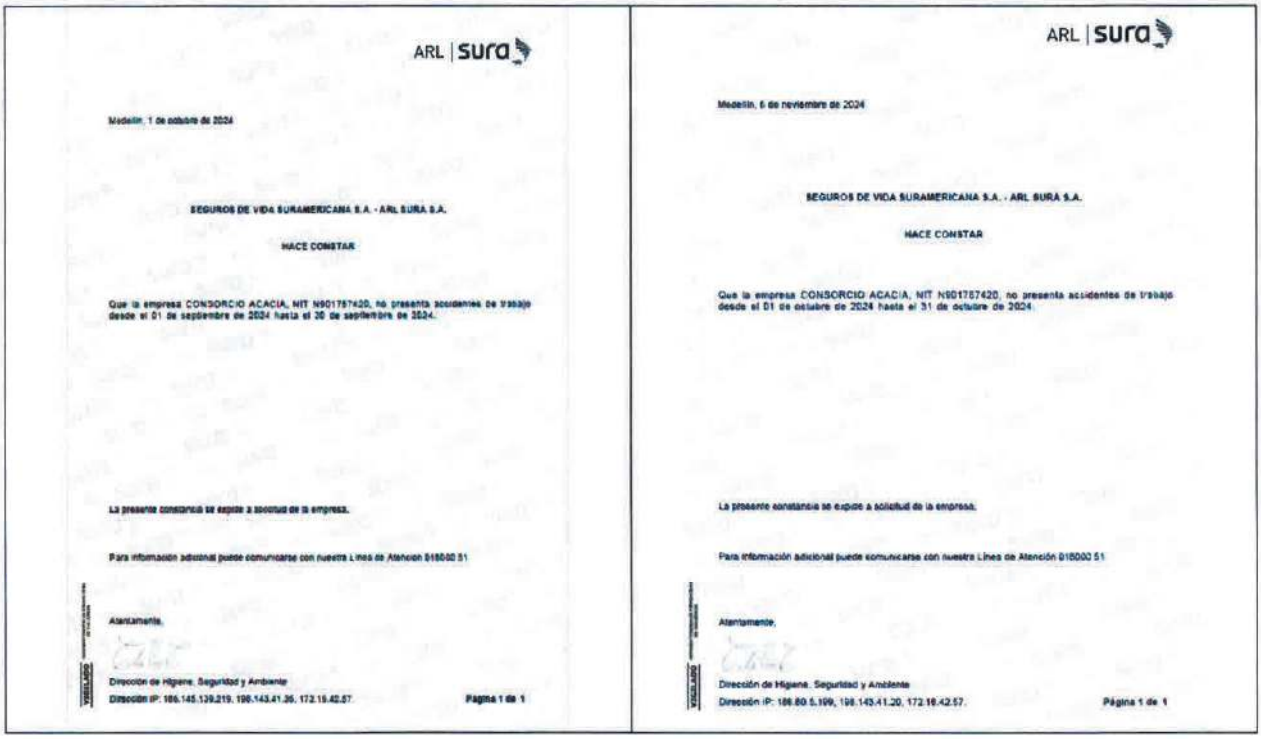

ARL | sura

Medellín, 1 de octubre de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ACACIA, NIT N901787420, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.145.139.219, 190.143.41.26, 172.19.42.57

Página 1 de 1

ARL | sura

Medellín, 6 de noviembre de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ACACIA, NIT N901787420, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.80.5.199, 190.143.41.20, 172.16.42.57.

Página 1 de 1

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE SST

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN OBRA



COMITÈ REUNIONES DE INTERVENTORÍA



VERIFICACION DE ELEMENTOS, DOTACIONES Y DEMAS



VERIFICACION DE ELEMENTOS, DOTACIONES Y DEMAS



Observaciones:

7. CONCLUSIONES

En el presente informe se establece las capacidades y el personal, con el que cuenta la interventoría el cual está capacitado y soporta la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos que son requeridos para realizar cada una de las tareas del proyecto.

Así mismo se evidencia el control realizado por la sección de Salud y seguridad en el trabajo, de la interventoría el cual presenta en el informe los diferentes puntos de inspección y supervisión, lo anterior con las directrices y normas exigidas para un proyecto de estas características dentro de la normatividad colombiana.

Adicional, se establece puntos para mejorar por parte del contratista como: - entrega total de la documentación del personal, soportes de afiliación a seguridad social, cumplimiento en la entrega de EPP, formatos de inspección, charlas preoperacionales, señalización adecuada y pagos de seguridad social.

Firma	Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**FLOR ANGELA NARVÁEZ CASTRO**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

9.8 Soportes de costos interventoría

JR JORGE AUGUSTO RIDRIGUEZ REINA

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	1.300.000
Auxilio de transporte	162.000
¿Está exonerado del pago de aporte	No

Periodo de pago
junio 01 2024- junio 30 2024
Fecha de liquidación
30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA OCA-978-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre del empleado	Devengado								Deducciones					Neto pagado	Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Prima de servicio	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones		
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.845.284,00		$ 153.811,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.691.472,64	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.905.213,00		$ 236.208,52	$ 59.052,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.952,35	
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.829.384,00		$ 66.695,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.762.688,64	
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 0,00	$ 378.834,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Pedro Eladio Perez	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.611.395,00		$ 57.975,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.419,20	
Totales			$ 16.466.520	$ 0	$ 1.600.756	$ 0	$ 972.000	$ 19.039.276	$ 0	$ 722.691	$ 59.052	$ 0	$ 0	$ 18.257.533	

Parafiscales: aportes a salud			
SENA	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	APORTES A SALUD
$ 0,00	$ 0,00	$ 153.811,36	$ 153.811,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,52	$ 738.151,63
$ 0,00	$ 0,00	$ 66.695,36	$ 66.695,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 57.975,80	$ 57.975,80
$ 0,00	$ 0,00	$ 722.691,04	$ 1.224.634,15

Neto pagado: $18.257.533

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	domingo, 30 de junio de 2024

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Heidy Alejandra Lancheros Canty	Heidy Alejandra Lancheros Canty	Jorge A. Rodriguez
Contadora	Contadora	Contratista

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	$ 2.197.990,20
Aportes a salud	$ 1.224.634,15
Aportes a riesgos laborales	$ 1.257.482,41
Sena	$ 0,00
Icbf	$ 0,00
Cajas de compensación	$ 722.691,04
Prima de servicios	$ 1.585.971,69
Cesantía	$ 1.585.971,69
Intereses sobre cesantías	$ 190.316,60
Provisón de vacaciones	$ 753.405,41
Total provisiones	$ 9.518.463,18

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.

812

JORGE AUGUSTO RIDRIGUEZ REINA

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	1.300.000
Auxilio de transporte	162.000
¿Está exonerado del pago de aporte	No

Periodo de pago
julio 01 2024- julio 31 2024
Fecha de liquidación
31/07/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA OCA-978-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre del empleado	Devengado								Deducciones					Neto pagado	Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Prima de servicio	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones		
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.845.284,00		$ 153.811,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.691.472,64	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.905.213,00		$ 236.208,52	$ 59.052,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.952,35	
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.829.384,00		$ 66.695,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.762.688,64	
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 0,00	$ 378.834,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Pedro Eladio Perez	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.611.395,00		$ 57.975,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.419,20	
Totales			$ 16.466.520	$ 0	$ 1.600.756	$ 0	$ 972.000	$ 19.039.276	$ 0	$ 722.691	$ 59.052	$ 0	$ 0	$ 18.257.533	

Parafiscales aportes a salud			
SENA	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	APORTES A SALUD
$ 0,00	$ 0,00	$ 153.811,36	$ 153.811,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,52	$ 738.151,63
$ 0,00	$ 0,00	$ 66.695,36	$ 66.695,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 57.975,80	$ 57.975,80
$ 0,00	$ 0,00	$ 722.691,04	$ 1.224.634,15

Neto pagado: $18.257.533

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de: miércoles, 31 de julio de 2024

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Heidy Alejandra Lancheros Canty	Heidy Alejandra Lancheros Canty	Jorge A. Rodriguez
Contarista	Contarista	Contarista

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	$ 2.197.990,20
Aportes a salud	$ 1.224.634,15
Aportes a riesgos laborales	$ 1.257.482,41
Sena	$ 0,00
Icbf	$ 0,00
Cajas de compensación	$ 722.691,04
Prima de servicios	$ 1.585.971,69
Cesantía	$ 1.585.971,69
Intereses sobre cesantías	$ 190.316,60
Provisón de vacaciones	$ 753.405,41
Total provisiones	$ 9.518.463,18

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno e ingresar los datos manualmente en esta hoja.

319

JR JORGE AUGUSTO RIDRIGUEZ REINA

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	1.300.000
Auxilio de transporte	162.000
¿Está exonerado del pago de aportes	No

Periodo de pago
agosto 01 2024- agosto 31 2024
Fecha de liquidación
31/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA OCA-978-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre del empleado	Devengado								Deducciones					Neto pagado	Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Prima regional	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones		
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.845.284,00		$ 153.811,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.691.472,64	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.905.213,00		$ 236.208,52	$ 59.052,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.952,35	
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.829.384,00		$ 66.695,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.762.688,64	
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 0,00	$ 378.834,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Pedro Elodio Perez	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.611.395,00		$ 57.975,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.419,20	
Totales			$ 16.466.520	$ 0	$ 1.600.756	$ 0	$ 972.000	$ 19.039.276	$ 0	$ 722.691	$ 59.052	$ 0	$ 0	$ 18.257.533	

Parafiscales aportes a salud			
SENA	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	APORTES A SALUD
$ 0,00	$ 0,00	$ 153.811,36	$ 153.811,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,52	$ 738.151,63
$ 0,00	$ 0,00	$ 66.695,36	$ 66.695,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 57.975,80	$ 57.975,80
$ 0,00	$ 0,00	$ 722.691,04	$ 1.224.634,15

Neto pagado: $18.257.533

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	sábado, 31 de agosto de 2024

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Heidy Alejandra Lancheros Canly	Heidy Alejandra Lancheros Canly	Jorge A. Rodriguez
Contador@	Contadora	Contratista

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	$ 2.197.990,20
Aportes a salud	$ 1.224.634,15
Aportes a riesgos laborales	$ 1.257.482,41
Sena	$ 0,00
Icbf	$ 0,00
Cajas de compensación	$ 722.691,04
Prima de servicios	$ 1.585.971,69
Cesantía	$ 1.585.971,69
Intereses sobre cesantías	$ 190.316,60
Provisón de vacaciones	$ 753.405,41
Total provisiones	$ 9.518.463,18

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.

320

JORGE AUGUSTO RIDRIGUEZ REINA

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	1.300.000
Auxilio de transporte	162.000
¿Está exonerado del pago de aporte	No

Periodo de pago
septiembre 01 2024- septiembre 30 2024
Fecha de liquidación
30/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA OCA-978-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre del empleado	Devengado								Deducciones					Neto pagado	Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Prima regional	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones		
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.845.284,00		$ 153.811,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.691.472,64	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.905.213,00		$ 236.208,52	$ 59.052,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.952,35	
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.829.384,00		$ 66.695,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.762.688,64	
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 0,00	$ 378.834,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Pedro Eladio Perez	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.611.395,00		$ 57.975,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.419,20	
Totales			$ 16.466.520	$ 0	$ 1.600.756	$ 0	$ 972.000	$ 19.039.276	$ 0	$ 722.691	$ 59.052	$ 0	$ 0	$ 18.257.533	

Parafiscales aportes a salud			
SENA	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	APORTES A SALUD
$ 0,00	$ 0,00	$ 153.811,36	$ 153.811,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,52	$ 738.151,63
$ 0,00	$ 0,00	$ 66.695,36	$ 66.695,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 57.975,80	$ 57.975,80
$ 0,00	$ 0,00	$ 772.691,04	$ 1.224.634,15

Neto pagado: $18.257.533

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de lunes, 30 de septiembre de 2024

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Heidy Alejandra Lancheros Canly	Heidy Alejandra Lancheros Canly	Jorge A. Rodriguez
Contadora	Contadora	Contratista

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	$ 2.197.990,20
Aportes a salud	$ 1.224.634,15
Aportes a riesgos laborales	$ 1.257.482,41
Sena	$ 0,00
Icbf	$ 0,00
Cajas de compensación	$ 722.691,04
Prima de servicios	$ 1.585.971,69
Cesantía	$ 1.585.971,69
Intereses sobre cesantías	$ 190.316,60
Provisón de vacaciones	$ 753.405,41
Total provisiones	$ 9.518.463,18

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.

JR

JORGE AUGUSTO RIDRIGUEZ REINA

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	1.300.000
Auxilio de transporte	162.000
¿Está exonerado del pago de aporte	No

Periodo de pago
octubre 01 2024- octubre 31 2024
Fecha de liquidación
31/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA OCA-978-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICUAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre del empleado	Devengado								Deducciones					Neto pagado	Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Prima regional	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones		
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.845.284,00		$ 153.811,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.691.472,64	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.905.213,00		$ 236.208,52	$ 59.052,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.952,35	
Flor Angela Harvaez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.829.384,00		$ 66.695,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.762.688,64	
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 0,00	$ 378.834,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Pedro Eladio Perez	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.611.395,00		$ 57.975,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.419,20	
Totales			$ 16.466.520	$ 0	$ 1.600.756	$ 0	$ 972.000	$ 19.039.276	$ 0	$ 722.491	$ 59.052	$ 0	$ 0	$ 18.257.533	

Parafiscales aportes a salud			
SENA	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	APORTES A SALUD
$ 0,00	$ 0,00	$ 153.811,36	$ 153.811,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,52	$ 738.151,63
$ 0,00	$ 0,00	$ 66.695,36	$ 66.695,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 57.975,80	$ 57.975,80
$ 0,00	$ 0,00	$ 722.691,04	$ 1.224.634,15

Neto pagado: $18.257.533

Comprobante de Pago Nº:

Fecha de jueves, 31 de octubre de 2024

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Heidy Alejandra Lancheros Canty	Heidy Alejandra Lancheros Canty	Jorge A. Rodriguez
Contadora	Contadora	Contratista

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	$ 2.197.990,20
Aportes a salud	$ 1.224.634,15
Aportes a riesgos laborales	$ 1.257.487,41
Sena	$ 0,00
Icbf	$ 0,00
Cajas de compensación	$ 722.691,04
Prima de servicios	$ 1.585.971,69
Cesantía	$ 1.585.971,69
Intereses sobre cesantías	$ 190.316,60
Provisón de vacaciones	$ 753.405,41
Total provisiones	$ 9.518.463,18

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno e ingresar los datos manualmente en esta hoja.

JR

JORGE AUGUSTO RIDRIGUEZ REINA

Diligencie los siguientes valores de referencia:	
Salario mínimo	1.300.000
Auxilio de transporte	162.000
¿Está exonerado del pago de aporte	No

Periodo de pago
noviembre 01 2024- noviembre 30 2024
Fecha de liquidación
30/11/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA OCA-978-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS

Nombre del empleado	Devengado								Deducciones						Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Prima regional	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retención en la fuente	Otras deducciones	Neto pagado	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.845.284,00		$ 153.811,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.691.472,64	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.905.213,00		$ 236.208,52	$ 59.052,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.609.952,35	
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.829.384,00		$ 66.695,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.762.688,64	
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 0,00	$ 246.754,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 0,00	$ 378.834,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	9	$ 171.475,80	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 48.600,00	$ 948.489,80		$ 35.995,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 912.494,21	
Rafel Mauricio Pinto B.	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 0,00	$ 728.414,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.462.000,00		$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.410.000,00	
Pedro Eladio Perez	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.000,00	$ 1.611.395,00		$ 57.975,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.553.419,20	
Totales			**$ 16.637.996**	**$ 0**	**$ 2.329.170**	**$ 0**	**$ 1.020.600**	**$ 19.987.766**	**$ 0**	**$ 758.687**	**$ 59.052**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.170.027**	

Parafiscales aportes a salud			
SENA	ICBF	CAJA COMPENSACIÓN	APORTES A SALUD
$ 0,00	$ 0,00	$ 153.811,36	$ 153.811,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.208,52	$ 738.151,63
$ 0,00	$ 0,00	$ 66.695,36	$ 66.695,36
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 35.995,59	$ 35.995,59
$ 0,00	$ 0,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
$ 0,00	$ 0,00	$ 57.975,80	$ 57.975,80
$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 758.686,63**	**$ 1.260.629,74**

Neto pagado: $19.170.027

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	sábado, 30 de noviembre de 2024

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Heidy Alejandra Lancheros Canly	Heidy Alejandra Lancheros Canly	Jorge A. Rodriguez
Contadora	Contadora	Contratista

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Aportes a pensión	$ 2.307.489,50
Aportes a salud	$ 1.260.629,74
Aportes a riesgos laborales	$ 1.320.114,74
Sena	$ 0,00
Icbf	$ 0,00
Cajas de compensación	$ 758.686,63
Prima de servicios	$ 1.664.980,89
Cesantía	$ 1.664.980,89
Intereses sobre cesantías	$ 199.797,71
Provisón de vacaciones	$ 790.930,81
Total provisiones	$ 9.967.610,91

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y especificar si está o no exonerado del pago de aportes parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad social y parafiscales.

Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan automáticamente considerando si el empleador está o no exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite automatizar parte de ese proceso.

Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

CONTRATO DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)

CONTRATANTE	**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** NIT. 9.658.796-1
CONTRATISTA	**OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON** C.C. 93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)
OBJETO	CONTRATO DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS) CON UNA DEDICACION DEL 40%
FECHA DE CONTRATO	27 DE MAYO DE 2023

Entre los suscritos a saber: el señor **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** mayor de edad y vecino de la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.658.796 expedida en la ciudad de Yopal (Casanare), y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte, y por la otra, el señor **OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 93.293.568 expedida en el municipio del Líbano (Tolima), quien en adelante para efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de **SERVICIO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)**

CLAÚSULAS

PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es CONTRATO DE SERVICIO DE **TOPOGRAFÍA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)** PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 978 DE 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

SEGUNDA. VALOR: El valor mensual de **SERVICIO DE TOPOGRAFÍA** será de **UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($1.384.000,00),** por un periodo de **ONCE (11) MESES**, para un valor total del contrato de **QUINCE MILLONES DOSCIENTOD QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($15.215.856,00).**

TERCERA. PROYECTOS EN QUE SE UTILIZARÁ: El contrato en el cual se utilizará el servicio, así como su plazo y dedicaciones corresponden al contrato de interventoría No. 118 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

Parágrafo uno: El término de duración del presente contrato es de **TRES MESES (03)**, contados a partir de la firma y suscripción del mismo, el cual podrá cuantificarse por periodos acumulables, de acuerdo a las necesidades que surjan durante la ejecución del contrato de interventoría No. 978 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

CUARTA. FORMA DE PAGO: Se pagará mediante pagos parciales de avance a solicitud del contratista, previa entrega a satisfacción del levantamiento topográfico, el porcentaje de avance se calculará en función de los números de días que se haya realizado acompañamiento en obra, siendo el 100% de avance UN MES completo.

PARÁGRAFO: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA realizará en cada pago parcial los descuentos correspondientes a los tributos que cause este contrato.

QUINTA. El **ARRENDATARIO** se constituye como depositario y por ende custodio del equipo, asumiendo todas las responsabilidades, hasta tanto proceda la debida devolución al **ARRENDADOR**.

SEXTA. DEVOLUCIÓN: Al finalizar el término del contrato, el ARRENDATARIO deberá devolver los equipos en el mismo estado en que fue recibido.

SEPTIMA. DOMICILIO - Para todos los efectos de este contrato las partes han convenido adoptar el Municipio de Castilla la Nueva, como domicilio contractual.

En constancia de lo anterior y para todos los efectos legales, se firma el presente contrato en el Municipio de Villavicencio (Meta), a los (27) días del mes de mayo del año (2023), en dos (2) ejemplares de igual valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las Partes.

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON
C.C. 93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)
CONTRATISTA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
C.C 9.658.796 DE YOPAL (CASANARE)
CONTRATANTE

JMENDOZA Equipos S.A.S	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: 0-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada

SERVICIO DE LABORATORIO
OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO
NO. C1732

INSTRUMENTO:	GPS	**FECHA DE REVISIÓN:**	28 DE ENERO DE 2024
MARCA:	E-SURVEY	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	28 DE JULIO DE 2024
REFERENCIA:	E600	**CLIENTE:**	LAN INGENIERÍA SAS
SERIAL:	E6003120200406	**CC:**	901230010
		CIUDAD:	VILLAVICENCIO. Meta
		CELULAR:	3106739759

JMENDOZA EQUIPO SAS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

TÉCNICO JMEQUIPOS SAS
Este certificado no es válido sin firma.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Calle 30B # 71 - 42 PBX: (574) 3220619 Ext 102 Cel: 310-7983526 www.jmequipos.com
auxlaboratorio@jmequipos.com - acuervo@jmequipos.com - ventas@jmequipos.com
Medellín – Colombia

GALILEO INSTRUMENTS	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S.	Código: IC&T-9001-574-298-06/19
		Versión: 02
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS	Fecha de Vigencia: 18-03-24
		Página:1/2

Bogotá D. C, 18 de marzo de 2024 **No. 17-071/2024**

EQUIPO: **GPS L1+L2, GLONASS + GALILEO+COMPASS+BEIDU** MARCA: **CHCNAV**

REF: **GNSS X91+** No SERIAL. **951442**

Proprietário: _____ CC/NIT: _____

Ciudad: **Villavicencio-Meta**

Teléfono: _____

Certificado vigente hasta: **18 DE MARZO DEL 2025,** bajo buen uso guardando las precauciones propias para esta clase de instrumentos.

El Mantenimiento se efectúo siguiendo las indicaciones del fabricante, según sus catálogos.
DIAGNOSTICO Y AJUSTE

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
Firmware Interno				X
Configuración de Software				X
Hardware				X
Sistema de Coordenadas				X
Datum de Mapa				X
Conexión Baterías				X
Conexión Cables				X
Puertos de Descarga				X
Revisión de Antena				X
Revisión Cables				X

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
Registro de Información				X
Volcado de Memoria				X
Ajustes de Coordenadas				X
Teclado de Operación				X
Pantalla Grafica				X
Operación				X
Revisión de Teclado				X
Programación de Parámetros				X
Entrada y Salida de Datos				X
Configuración Básica				X

1. Cambio de Grasas 2. Ajuste y/o limpieza 3. Requiere Cambio 4. Correcto Funcionamiento

Nota el numeral 4 indica que el componente está en buen estado

OBSERVACIONES:

Web: www.galileoinstruments.com.co
Mail : soporte@galileoinstruments.com.co - cmejia@galileoinstruments.com.co
aardila@galileoinstruments.com.co
Dirección: Carrera 13 # 71-69 Quinta Camacho Teléfono: 7028440
Bogotá D.C

No. 17-071/2024

TEST DE VERIFICACIÓN DE POSICIONAMIENTO HORIZONTAL

Patrón Referencia (Vértice Geodésico de Referencia) **BOGOTA-10** Coordenadas Geodésicas:

	LATITUD	LONGITUD
Datos Patrón	**4° 40' 02.37000" N**	**74° 03' 37.93262" W**
Datos GPS	**4° 40' 02.37296" N**	**74° 03' 37.93442" W**

Error RMS Tolerable= 50 cm. + 1ppm, Error RMS encontrado **0.014 m**

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión de posicionamiento.

TEST DE VERIFICACIÓN DE POSICIONAMIENTO VERTICAL

Patrón Referencia (Vértice Geodésico de Referencia):

PATRÓN **2579.030 mts.**

LECTURA **2579.065 mts.**

ERROR ESTADÍSTICO EN ALTURA= +/- **0.035 m.**

El equipo cumple bajo los parámetros de tolerancia en la precisión según parámetros establecidos por el fabricante.

PARAMETRO O COMPONENTE	ERROR PERMITIDO	CUMPLE		AJUSTE	
		SI	NO	SI	NO
ALTÍMETRO	+/- 1 mts.	X			
PROYECCIÓN	Por Azimut y Coordenadas	X			
TIEMPO DE RECEPCIÓN	Inferior al metro	X			
RELOJ DE PRECISIÓN	Con la hora local	X			
RECEPCIÓN DE SATÉLITES	+/- 3	X			

ASPECTOS ENCONTRADOS:

El equipo es apto para posicionamiento GPS, con buenas condiciones de rastreo satelital. Las pruebas se realizaron con el equipo totalmente nuevo.

ALEJANDRO ARDILA
Ingeniero de Soporte

V/B: JULIAN RODRIGUEZ
Gerente Comercial

Web: www.galileoinstruments.com.co
Mail : soporte@galileoinstruments.com.co - cmejia@galileoinstruments.com.co
aardila@galileoinstruments.com.co
Dirección: Carrera 13 # 71-69 Quinta Camacho Teléfono: 7028440
Bogotá D.C

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901 346 434-7

Bogotá, 16 de mayo del 2024

Señor (es)
LAND INGENIERIA ESTUDIOS DISEÑOS SAS
NIT: 901230010-9

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN No. GG 9195
Descripción del instrumento (Equipo, Marca, Referencia, Número serial, Precisión):
NIVEL ELECTRONICO MARCA DADI REF- DAL 32 SERIAL C510859
"Precisión 1.0 mm"

1. Inspección Óptico Mecánico y Automático:

1.1 Sensor auto Nivelante	** Buen Funcionamiento*
1.2 Sistema punteros laser	** Centrados*
1.3 Sistema HOLD, ROTATIVO	** Chequeados*
1.4 Sistema de SENSOR	** Chequeado*
1.5 Lecturas de cierres	** Chequeado y calibrado*

INSTRUMENTOS DE INGENIERIA
GGP SAS
NIT. 901346434-7

1.10 Lecturas de control para nivelación:

**** Lectura inicial de control a 0,7608m.:0,701mm***	**** Lectura inicial de control a 0,751 m.:0,050mm***
Error promedio inicial 0,685mm	***Error promedio final 0.050mm***
Calibración Lectura inicial: 0,685 mm	***Calibración Lectura final: 0,685mm***

INSTRUMENTOS DE INGENIERIA GGP S.A.S con NIT: 901.346.434 -7, Quien es exclusivo para COLOMBIA de STONEX es CERTIFICADO por fábrica como técnico capacitado y apto para reparar y corregir instrumentos topográficos anexamos certificado de cursos en fabrica ITALIA.

Así mismo nuestra firma CERTIFICA que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento de los fabricantes.

Nota: Los equipos son recibidos para su Revisión, Calibración y Certificación, posteriormente chequeados y corregidos bajo un patrón llamado Colimador marca STONEX, este instrumento nos determina una distancia infinita; posteriormente es revisado en una pista con unas reglas y distancias predeterminadas las cuales nos determinan el error promedio, corregido este error, el instrumento es chequeado nuevamente, tanto en el colimador como en la pista, para verificar la veracidad en la corrección y calibración realizada.


Bogota: Calle 66B # 59-45 Barrio Modelo Norte, Fijo (+57 1) 937 2559 (+57) 316 274 3279
Medellin: Cra. 67 # 42-18 Of.201 San Joaquin , Cel. +57 3142961893
Cali: Cra.40A # 5c-05 Of.305, Cel. +57 350 2738753
Bucaramanga: Cra. 24 #105-08 Barrio Provenza, Cel. +57 315 8302271
Barranquilla Cra. 51B # 84-121 Of. 20 Edf. Soho Barrio San Vicente, Cel. (+57) 350 273 8893
Cúcuta: Av.2 #1-40 Barrio Llano, Cel. +57 320 5893797
www.instrumentosggp.com
E-mail: geyogo@yahoo.es

Instrumentos de Ingeniería
GGP S.A.S.
NIT. 901 346 434-7

Expedida a solicitud del interesado a los dieciséis (16) día del mes de mayo del año Dos Mil . VEINTICUATRO (2024), y tiene una vigencia de Seis meses (06) meses a partir de la fecha.

Anexamos parámetros de la pista, colimador, respuesta de la SUPERINTENDENCIA a las calibraciones. Cabe anotar que en los manuales se indican los pasos para calibrar y corregir un equipo.



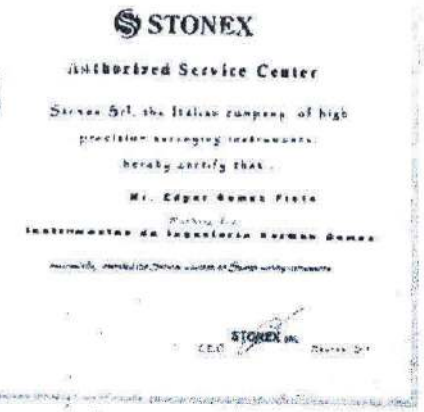

CAPACITACIÓN ITALIA

Certificación Técnico en ITALIA

CERTIFICACIÓN DE PATRONAMIENTO Y CALIBRACIÓN No. GG 9195
NIVEL ELECTRONICO ***MARCA DADI*** *REF. DAL 32 SERIAL C510859*

Cordialmente,

INSTRUMENTOS DE INGENIERIA
GGP SAS
NIT. 901346434-7

GERMAN GOMEZ PINTO
Técnico en mantenimiento

Bogota: Calle 66B # 59-45 Barrio Modelo Norte. Fijo. (+57 1) 937 2559 (+57) 316 274 3279
Medellín: Cra. 67 # 42-18 Of.201 San Joaquin . Cel. +57 3142961893
Cali: Cra.40A # 9C-05 Of.305, Cel. +57 350 2738753
Bucaramanga:Cra. 24 #103 08 Barrio Provenza, Cel. +57 315 8302271
Barranquilla Cra. 51B # 84-121 Of. 2D.Edf. Soho Barrio San Vicente, Cel. (+57) 350 273 8892
Cucuta: Av.2 #1-40 Barrio Lleras, Cel. +57 320 5893797

055/24

CERTIFICAMOS QUE:

LA ESTACION TOTAL TOPCON GTS-GTS-236W No.285524

Fue verificada y colimada en nuestro taller de mantenimiento, encontrándose en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Revisión del sistema mecánico

- Conjunto nivelante.....
- Ejes Hz y Ver.....
- Desplazamiento de tornillo de movimiento fino.....
- Desplazamiento del enfoque.....
- Verticalidad .....

Revisión del sistema electrónico

- Procesamiento y calculo.....
- Medición de distancias (fina, intermitente y normal).....
- Medición de coordenadas.....

Revisión del sistema óptico

- Ausencia de humedad y hongos.....
- Eje óptico.....
- Desplazamiento de plomada laser en 180 Grados..... .....+2.0mm

Ángulos Horizontales ,
verticales y mediciones efectuadas con colimador óptico.....

- Angulo vertical (cierre 360 Grados)..... + 45seg
- Angulo Horizontal (cierre 180 Grados)..... + 05seg

Medición en distancia

- En distancias medias y larga (160 mts. 1.000 mts patronados)..... +1.4mm

Mediciones efectuadas en campo

Angulo Vertical		Angulo Horizontal	
Posición 1:	82° 54′ 15″	Posición 1:	90° 28′ 05″
Posición 2:	277° 05′ 00″	Posición 2:	89° 31′ 50″
	359° 59′ 15″		179° 59′ 55″

Cl.5B No. 33B-01. – 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
Villavicencio-Meta.

Especificaciones

Alcance: Con un prisma..... 3000 Mts
Con tres prismas..... 5000 Mts

Capacidad de memoria interna..... .....10.000 Pts

Anteojo: Imagen directa de..... 30X
Precisión: En distancia..... (+5mm + 5ppm)
En medición angular..... 1 seg.

Patrón utilizado: Colimador óptico marca KERNGK-23 No 265608 con micrómetro óptico y exactitud de 0.7mm

Se expide a solicitud de: **Srs. LAND NG INGENIERIA.**

Fecha de Calibración: 09 de Marzo 2.024
Recomendamos revisión: **09 de Septiembre 2.024**

Cordialmente.

PEDRO E. GARNICA LOPEZ.
Técnico Opto-Mecánico.
RUT.80367285-9.

Cl.5B No. 33B-01. – 3108032568
E-mail topografiapp@hotmail.com
Villavicencio-Meta.

CUENTA DE COBRO 1

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

CEDULA

93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

LA SUMA DE $1.613.900,00 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 27 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

FIRMA:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

C.C. 93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

CUENTA DE COBRO 2

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

CEDULA

93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

LA SUMA DE $2.770.000,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 01 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

FIRMA:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

C.C. 93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

CUENTA DE COBRO 3

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

CEDULA

93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

LA SUMA DE $2.770.000,00 (DOSMILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024

FIRMA:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

C.C. 93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

CUENTA DE COBRO 4

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

CEDULA

93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

LA SUMA DE $1.390.000,00 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

FIRMA:

OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

C.C. 93.293.568 DEL LÍBANO (TOLIMA)

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-3

FECHA		
2	7	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 27 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	$ 1.300.000,00	
	Valor total pagado	$ 1.300.000,00	

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

CHEQUE No.		EFECTIVO	Si
BANCO			
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	93293568		
BENEFICIARIO DEL PAGO	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

337

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-04

FECHA		
2	9	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023	$ 2.770.000,00	
	OBJETO "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,		
	CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE		
	PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA		
	QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 01 DE JULIO DE		
	2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024		
	Valor total pagado	$ 2.770.000,00	

Valor en letras: DOSMILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CHEQUE No.

EFECTIVO Si

BANCO

NIT O CC DEL BENEFICIARIO: 93293568

BENEFICIARIO DEL PAGO: OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

338

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-04

FECHA		
4	11	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	$ 2.770.000,00	
	Valor total pagado	$ 2.770.000,00	

Valor en letras: DOSMILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

CHEQUE No.		EFECTIVO	SI
BANCO			
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	93293568		
BENEFICIARIO DEL PAGO	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

339

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-04	FECHA		
	2	12	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 1.390.000,00	
	Valor total pagado	$ 1.390.000,00	

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

CHEQUE No.		EFECTIVO	SI
BANCO			
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	93293568		
BENEFICIARIO DEL PAGO	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

340

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE

Entre los suscritos a saber **JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.007.854.302 quien en adelante se denominará **El ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra parte **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** identificado con 9.658.796 de Yopal. quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. El **ARRENDADOR** entrega al **ARRENDATARIO** en alquiler un Vehículo Automotor de las siguientes características:

Placa: HBV 493
Marca: NISSAN
Línea: D22/NP300
Color: BLANCO
Modelo: 2014

SEGUNDA. El vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

TERCERA. El valor del arrendamiento mensual del vehículo automotor de la referencia será de $5.849.422,00 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M-7CTE, pagaderos durante los primeros diez (10) días de cada mes.

Parágrafo uno: El término de duración del presente contrato es ONCE (11) MESES, a partir de la suscripción del presente documento el cual podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo durante TRES (3) MESES previo acuerdo de las partes.

CUARTA. **Destinación:** El **ARRENDATARIO** destinará el vehículo automotor al transporte de personas, de tal manera, que el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, el **ARRENDATARIO** no puede violar los límites pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor.

QUINTA. Conducción: El vehículo automotor será conducido por JORGE AUGUSTO RODRIGUE REINA y/o a quien este delegue), con fines de transportar a personas dentro del territorio colombiano con fines exclusivos para el desarrollo del contrato de interventoría No 978 de 2023, para el proyecto cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

SEXTA. El ARRENDATARIO se constituye como depositario y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al **ARRENDADOR**.

SÉPTIMA. Devolución: Al finalizar el término del contrato, el **ARRENDATARIO** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste

natural del vehículo automotor. La devolución del vehículo deberá realizarse en lugar acordado por las partes.

OCTAVA. Responsabilidades del ARRENDATARIO, mientras esté en poder del **ARRENDATARIO** el vehículo automotor, éste será responsable de:

1. Por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**
2. Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**
3. Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**
4. Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **ARRENDATARIO.**
5. Mantener en buen estado el vehículo automotor.
6. Dar uso al mismo, de manera exclusiva para el fin por el cual fue tomado en arrendamiento.

Parágrafo: En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el **ARRENDATARIO** quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar previamente al **ARRENDADOR.**

NOVENA. Responsabilidades del **ARRENDADOR**. Estas corresponden a:

1. Entregar en óptimas condiciones técnicas el vehículo para el uso por el cual esta ha sido contratado.
2. Garantizar su derecho de dominio sobre el bien mueble objeto del presente contrato.
3. Realizar el pago del seguro SOAT, el cual tiene como obligación mantenerlo siempre vigente.

Parágrafo: En caso de que el **ARRENDADOR** deje vencer el SOAT, el **ARRENDATARIO** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

DÉCIMA. El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato da derecho al **ARRENDADOR** a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento.

DECIMA PRIMERA: Gastos: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

DECIMA SEGUNDA. Notificaciones: Todos los avisos, notificaciones y comunicaciones entre **LAS PARTES** en relación con el presente contrato se consideran debidamente efectuados, si lo son por escrito, entregados a mano, o enviados por correo electrónico o fax a la dirección de la parte de quien se trate, indicada a continuación:

EL ARRENDADOR: JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA
Teléfono 3134826364
EL ARRENDATARIO: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Teléfono 313 482 6364
Correo Electrónico interpuentechichimene@gmail.com
Dirección CALLE 49 No 30-16 OF 203 Villavicencio-Meta

DECIMA TERCERA: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el convocante.

DECIMA CUARTA- Narcotráfico o lavado de activos. Las **PARTES** manifiestan de manera expresa que no tiene o ha tenido relación alguna con actividades prohibidas o calificadas por la ley como delictivas. Cualquieras de las **PARTES** podrá dar por terminada la relación comercial en cualquier tiempo, sin previo aviso y sin que haya lugar al reconocimiento de ningún tipo de indemnización o pago por dicho concepto, en caso que cualquiera de las partes llegare a ser: (i) incluido en listas para el control de lavado de activos administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera; o (ii) condenado en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos y/o conexos.

Parágrafo. El **ARRENDADOR** manifiesta que el origen del vehículo automotor, mencionado en la referencia puesto arrendamiento es licito y no tiene conexión alguna con actividades relacionadas con lavados de activos y financiación del terrorismo.

DECIMA QUINTA- Cumplimiento de la ley, corrupción y antisoborno. EL ARRENDADOR se obliga a no realizar ninguna acción que esté vinculada o pueda vincularse a su relación con **EL ARRENDATARIO**, que implique una violación de las leyes de la República de Colombia, así como **EL CONTRATANTE** ha no solicitar ninguna acción o servicio que implique una violación a la normativa colombiana vigente.

En Villavicencio, a los 27 días del mes de mayo de 2023

JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA REINA
C.C 1.007.854.302

R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ

C.C 9.658.796

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021899714

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HBV493	NISSAN	D22/NP300	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	1000 - 5

NÚMERO DE MOTOR
YD25-436539T

REG
N

VIN
3N6PD23Y0ZK924697

NÚMERO DE SERIE
3N6PD23Y0ZK924697

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
3N6PD23Y0ZK924697

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
RODRIGUEZ MEDINA JORGE ESTEBAN Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1007854302

344

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
131

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352013000095515

I/E
I

FECHA IMPORT.
01/04/2013

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
31/05/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
21/12/2020

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT06003314859

345

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO :

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA

CEDULA

1.007.854.302 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE $23.515.567,00 (VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ANTICIPO 1 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

FIRMA:

JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA

C.C. 1.007.854.302 DE BOGOTA D.C

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-3

FECHA		
31	7	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO ANTICIPO 1 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE. EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"	$ 23.515.567,00	
Valor total pagado		$ 23.515.567,00	

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CHEQUE No.	EFECTIVO	Si
BANCO		
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	1007854302	
BENEFICIARIO DEL PAGO	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

347

CUENTA DE COBRO 2

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA

CEDULA

1.007.854.302 DE BOGOTA D.C

LA SUMA DE $23.515.567,00 (VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ANTICIPO 2 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

FIRMA:

JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA

C.C. 1.007.854.302 DE BOGOTA D.C

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-04

FECHA		
31	8	2024

CODIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	PAGO ANTICIPO 2 ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"	$ 23.515.567,00	
Valor total pagado		$ 23.515.567,00	

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CHEQUE No.	EFECTIVO SI	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO		
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	1007854302	
BENEFICIARIO DEL PAGO	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	CC O NIT.

349

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES E IMPRESORAS

Entre los suscritos a saber mayor de edad, **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.658.796 de Yopal, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, por una parte, y por la otra parte **JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA** identificado con NIT: 9.658.796-1, quien en adelante se denominará **El CONTRATANTE** se ha celebrado el contrato de **ALQUILER DE COMPUTADORES E IMPRESORAS.**

PRIMERA. El **CONTRATISTA** prestará al **CONTRATANTE** sus servicios de **ALQUILER DE COMPUTADORES E IMPRESORAS.**

SEGUNDA. El valor total del contrato será de $ 27.500.000,00 VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, los cuales serán pagos mediante los porcentajes presentados en las actas parciales del contrato de interventoría N° 978 de 2023.

TERCERA: PROYECTOS EN QUE SE UTILIZARÁ. - El contrato en el cual se utiiizarán sus servicios de **ALQUILER DE COMPUTADORES E IMPRESORAS**, así como su plazo y dedicaciones corresponden al contrato de interventoría N° 978 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

Parágrafo uno: El término de duración del presente contrato es de ONCE MESES (11) contados a partir de la firma y suscripción del mismo, el cual podrá cuantificarse por periodos acumulables, de acuerdo a las necesidades que surjan durante la ejecución del contrato de interventoría N° 978 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

CUARTA. EL CONTRATISTA se constituye como depositario y por ende custodio de los equipos a usar en la prestación de servicios, asumiendo todas las responsabilidades, hasta tanto proceda la debida devolución.

SEXTA. DEVOLUCIÓN: Al finalizar el término del contrato, el **CONTRATANTE** deberá devolver los equipos usados en la prestación de servicios en el mismo estado en que fue recibido.

SEPTIMA: GASTOS: Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

OCTAVA. NOTIFICACIONES: Todos los avisos, notificaciones y comunicaciones entre **LAS PARTES** en relación con el presente contrato se consideran debidamente efectuados, si lo son por escrito, entregados a mano, o enviados por correo electrónico o fax a la dirección de la parte de quien se trate, indicada a continuación:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

EL CONTRATISTA: JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
Teléfono 313 482 6364

EL CONTRATANTE: JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
Teléfono 313 482 6364

NOVENO: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de servicio de **ALQUILER DE COMPUTADORES E IMPRESORAS**, relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del contratista, el cual será pagado por el convocante.

En Villavicencio (Meta), a los 27 días del mes de mayo de 2023.

JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
REPR. LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NIT: 9.658.796-1
CONTRATANTE

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
CONTADOR PUBLICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
T.P. 189521-T

JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA
C.C 9.658.796 Yopal
CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO 1

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

CEDULA

9.658.796 DE YOPAL

LA SUMA DE $14.109.400,00 (CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ANTICIPO ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

FIRMA:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

C.C. 9.658.796 DE YOPAL

CUENTA DE COBRO 1

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT

9.658.796-1

DEBE:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

CEDULA

9.658.796 DE YOPAL

LA SUMA DE $1.230.000,00 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE) POR CONCEPTO DE ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", PERIODO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

FIRMA:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

C.C. 9.658.796 DE YOPAL

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-1

FECHA		
31	7	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	ANTICIPO ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".	$ 14.109.400,00	
	Valor total pagado	$ 14.109.400,00	

Valor en letras: CATORCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CHEQUE No.		EFECTIVO	Si
BANCO			
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	9658796		
BENEFICIARIO DEL PAGO	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

254

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.

OF-04

FECHA		
2	12	2024

CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL CONTRATO OCA-978-2023 OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", PERIODO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	$ 1.230.000,00	
	Valor total pagado	$ 1.230.000,00	

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

CHEQUE No.		EFECTIVO	SI
BANCO			
NIT O CC DEL BENEFICIARIO	9658796		
BENEFICIARIO DEL PAGO	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC O NIT.

355

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO

Graciela María Olarte Tapias, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.021.545 Castilla la Nueva (Meta), obrando en su calidad de representante legal de INGEGAR INGENIERIA S.A.S, sociedad por acciones simplificada, legalmente constituida e identificada con NIT 900.055.611-1 con domicilio en la ciudad de Villavicencio (Meta), quien para los efectos del presente Contrato se denominará **El Contratista** por una parte, y de otra por parte el señor Jorge Augusto Rodríguez Reina identificado con cédula de ciudadanía No. 9.658.796 Yopal (Casanare) y domiciliado en la ciudad de Villavicencio (Meta) quien en adelante se denominará **El Contratante**, quienes individualmente se denominarán una "Parte" y conjuntamente las "Partes", hemos acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios de Laboratorio (en adelante el "Contrato"), regido por las cláusulas que se establecen a continuación y en lo no previsto en ellas, por las normas legales vigentes sobre la materia:

Primera - Objeto: El Contratista se obliga para el Contratante a prestar los servicios de Laboratorio, consistentes en la realización de ensayos de laboratorio para el contrato de interventoría N°978 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", por parte del contratante.

Parágrafo - Para la prestación de los servicios materia de este Contrato el Contratista deberá actuar atendiendo los principios de calidad, idoneidad, eficacia y eficiencia que deben regir su actividad, para lo cual deberá utilizará sus propios recursos humanos, tecnológicos y de cualquier otra índole de manera directa bajo su total responsabilidad y autonomía, sin perjuicio de la vigilancia que puede realizar en Contratante a la ejecución del objeto contratado.

Segunda - Condiciones Generales de la Prestación de los Servicios: La prestación de los servicios objeto del presente Contrato, por parte del Contratista, se regirá de conformidad con lo establecido en las siguientes condiciones generales:

2.1 Las Partes acuerdan que la toma de muestras, así como los elementos necesarios para ejecutar la actividad, será responsabilidad única y exclusivamente del contratante, el cual deberá tener en cuenta la norma NTC 454 para dicho propósito.

2.2 Las Partes acuerdan que las muestras respecto de las cuales se prestarán los servicios objeto de este Contrato, serán retiradas por parte del Contratista en cada uno de los sitios en los que se ejecutan el proyecto del Contratante figura como Interventor, de manera que el Contratista será el único y exclusivo responsable por los perjuicios que se pudieran causar al Contratante, o a terceros, por daños derivados del traslado de las referidas muestras desde los puntos de entrega, hasta el lugar de realización de las pruebas. En todo caso, el Contratante se compromete a realizar el embalaje de las muestras de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.

2.3 El procesamiento de las muestras que sean remitidos por el Contratante, así como la realización de las pruebas solicitadas y la entrega de resultados, se regirá de conformidad con los plazos establecidos según las edades y las normas aplicables como lo son la NTC 550 y NTC 1377. El

Contratista se comprometa a entregar al Contratante los informes escritos Parciales, y finales de resultado de las muestras que sean remitidas por el Contratante, de tres (3) a ocho (8) días hábiles después de realizarse el ensayo a cada muestra, para lo cual el Contratista deberá enviar la información exclusivamente al correo electrónico interpuentechichimene@gmail.com

2.4 El Contratista es el único y exclusivo responsable de preservar y mantener las muestras respecto de las cuales se realizarán las pruebas objeto de este Contrato, desde el momento que las mismas sean entregadas por el personal autorizado del Contratante, de manera que el Contratista deberá responder ante el Contratante, o terceros por los daños que le sean causados, y que se deriven de la indebida preservación de las muestras. Así mismo, el Contratista se obliga a conservar los testigos de muestras, en caso de existir, por un periodo de dos meses contados a partir del momento de su recepción.

2.5 Para ensayos de laboratorio sobre concreto hidráulico, el contratista entregará un total de cuatro (4) muestras por elemento, de las cuales tres (3) muestras se deberán ensayar a los 7, 14 y 28 días después de tomadas las muestras. La cuarta muestra será tomada como testigo en caso de que se requiera corroborar resultados.

2.6 El Contratista deberá disponer de los insumos, equipos y demás elementos necesarios para la realización de las pruebas de que trata la cláusula primera de este documento, los cuales deben contar con las condiciones técnicas requeridas que permitan garantizar la calidad de las pruebas diagnosticadas a realizar.

Tercera - Responsabilidad y Garantía de Calidad: El Contratista prestará los servicios materia del presente Contrato, con plena autonomía profesional, técnica y administrativa, sin restricciones, límites ni formalidades que puedan reñir con el libre ejercicio de su actividad profesional, asumiendo el Contratista total y exclusivamente la responsabilidad que se derive de la calidad e idoneidad de los mismos, al igual que por sus compromisos legales frente a terceros. Por lo tanto, el Contratista asume la responsabilidad que le sea imputable por los actos y omisiones que se presenten con ocasión de la prestación de los servicios que trata la cláusula primera de este Contrato.

Parágrafo. - En consecuencia, el Contratista mantendrá indemne y defenderá al Contratante de cualquier pleito, queja o demanda de cualquier naturaleza, provenientes de actuaciones negligentes y omisiones comprobadas del Contratista en la prestación de los servicios materia del presente Contrato.

Cuarta - Valor estimado del Contrato: Para todos los efectos, el valor total del presente contrato corresponde a la suma de VEINTI TRES MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.023.375,00) para el contrato de interventoria No.978 de 2023 que tiene por objeto, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", el cual tendrá una duración de 11 meses que es el tiempo para la prestación de servicios de laboratorios para el contrato mencionado anteriormente.

CONTRATO	No	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	978 de 2023	11	$ 23.023.375,00

Quinta. – Naturaleza del Contrato. Y Exclusión de Relación Laboral: El presente Contrato es de naturaleza comercial, excluye en toda la relación laboral, relación alguna de mandato, de dependencia o de representación, de tal forma que el Contratista y/o el personal a su cargo, no estarán sujetos a reglamentos, ni a otros factores de subordinación, razón por la cual no existe ni se genera entre ellos y el Contratante ninguna clase de relación o vínculo laboral. Las partes aquí contratantes declaran de buena fe que conocen suficientemente las normas legales que regulan la actividad del Contratista y que el contrato del que da cuenta el presente documento es de naturaleza estrictamente comercial, de tal forma que el Contratista y/o sus empleados o sub contratistas, no serán en ningún caso empleados ni trabajadores del Contratante.

Sexta. – Clausula Penal: En el evento que se presente incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones a su cargo previstas en este Contrato, deberá reconocer a favor de la otra parte a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor estimado del Contrato, sin necesidad de requerimientos privados o judiciales a los cuales renuncia las partes, y sin perjuicio de la correspondiente indemnización de los perjuicios que tal incumplimiento cause a algunas partes.

Séptima. – Cesión del Contrato: Las Partes no podrán ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones provenientes del Contrato, salvo autorización previa y estricta de la otra.

Octava. – Merito Ejecutivo: El presente Contrato, así como las facturas derivadas de los servicios prestados presentan merito ejecutivo

Octava Primera. – Solución de Controversias: Las partes realizaran sus mejores esfuerzos para solucionar amigablemente cualquier controversia, o reclamo que surja entre ellas con motivo de la interpretación, aplicación, cumplimiento ejecución o terminación de este Contrato. Si a pesar de ello cualquiera de las partes considera que la controversia no puede solucionarse amigablemente en un periodo de treinta (30) días a través de negociaciones directas, las partes podrán acudir ante la jurisdicción ordinaria.

Octava Segunda. – Domicilio Contractual y Notificaciones: Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Castilla La Nueva (Meta). Para todos los efectos del presente Contrato, las partes serán notificadas en las siguientes direcciones:; El Contratista en la Cra 32 No. 5B-03 (Villavicencio-Meta), teléfono 6601564.

Parágrafo. – Si alguna de las Partes cambia de lugar para recibir comunicaciones o notificaciones, así lo hará saber a la otra parte mediante aviso escrito entregado personalmente o dirigido por correo certificado a la dirección registrada en esta cláusula por la otra parte.

Para constancia de lo anterior, las Partes firman en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día (27) de mayo de (2023).

Contratista

INGEGAR INGENIERIA SAS
NIT 900.055.611-1
R/L Graciela María Olarte Tapias
C.C 31.021.545 de Castilla La Nueva (Meta)

Contratante

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1
C.C 9.658.796 de Yopal (Casanare)

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorio de Suelos, Concretos y Pavimentos
Nit. 900055611-1

Villavicencio, 10 de julio del 2024

Señores:
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Ciudad

Asunto: Disponibilidad para la prestación de servicios de laboratorio

Respetados señores,

Por medio del presente me permito informar que **INGEGAR INGENIERÍA S.A.S** se encuentra con total disponibilidad para la prestación de sus servicios de laboratorio al señor **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA.**

En espera de poder servirle, quedamos atento a cualquier duda

Cordialmente.

Ing. HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Especialista en ingeniería de fundación E.C.I
Gerente

Applus®

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17021-1:2015
11-CSG-003

Applus-Colombia Ltda
Bogota D.C
Calle 17 No 69 46
PBX (1) 7441133 Ext 92004
Fax (1) 7441133

Applus® ISO 9001 Systems Certification

Número ECCO-0204/14

Applus+ Colombia Ltda.
Certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización:

INGEGAR INGENIERÍA S.A.S.

Carrera 32 N°. 5B-03 Barrio La Vega, Villavicencio, Colombia, Suramérica.

Para las actividades de:

Servicio de consultoría en laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, estudio geotécnicos, diseños de pavimento y cimentaciones.

Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015

Fecha de Emisión: 6 de diciembre del 2022
Fecha de vencimiento del ciclo actual: 07 de Noviembre de 2025
Empresa certificada desde 08 de Noviembre de 2019.
Fecha de vencimiento de último ciclo: 07 de Noviembre de 2022
Fecha de finalización de auditoría de recertificación: 28 de octubre de 2022
Edición 2

JAIR HERNANDO AMAYA VILLALOBOS
Director certificación Colombia
B.U. certificación de sistemas

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual este certificado forma parte. cualquier verificación deberá realizarse directamente con APPLUS COLOMBIA.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD

Por medio de la presente yo, **GRACIELA MARÍA OLARTE TAPIAS** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.021.545 de castilla la nueva, obrando en mi calidad de representante legal INGENGAR INGENIERIA S.A.S legalmente constituida con NIT: 900.055.611-1 con domicilio en la ciudad de Villavicencio (Meta), me permito prestar los servicios para las actividades de consultoría de laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, estudios geotécnicos, diseños de pavimentos y cimentaciones conforme los requisitos ISO 9001:2025, para el proyecto de Interventoría No. 978 de 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS", representado legalmente por el Ing. **JORGE AUGUSTO RODRIGEZ REINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.658.796 de Yopal, desde el 27 de mayo de 2024 hasta que finalice su ejecución.

En constancia, se firma en Villavicencio a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024.

R/L GRACIELA MARÍA OLARTE TAPIAS
C.C 3.021.545 de castilla la nueva
INGEGAR INGENIERIA S.A.S
NIT: 900.055.611-1

10 CUADROS ANEXOS

- *10.1 CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.*
- *10.2 CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO.*
- *10.3 CONTROL PERSONAL QUE LABORA INTERVENTORIA.*
- *10.4 CONTROL SEGURIDAD INDUSTRIAL*
- *10.5 CONTROL CORRESPONDENCIA*
- *10.6 CONTROL EQUIPOS CONTRATISTA*
- *10.7 CONTROL IMPLEMENTACION PMA*

10.1 Control estado general del tiempo.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

NOVIEMBRE DEL 2024

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Tiempo en la mañana																															
Soleado	X	X						X	X		X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas					X		X																								
Lluvias intensas						X								X							X										
Tiempo en la Tarde																															
Soleado	X	X			X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas								X																							
Lluvias intensas																															

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 30 de noviembre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

365

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

OCTUBRE DEL 2024

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tiempo en la mañana																															
Soleado	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Tiempo en la Tarde																															
Soleado	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

993

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	SEPTIEMBRE																													
DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Tiempo en la mañana																														
Soleado		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Lluvias moderadas																														
Lluvias intensas																														
Tiempo en la Tarde																														
Soleado		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Lluvias moderadas																														
Lluvias intensas																														

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 30 de septiembre de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

367

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT:	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT:	NIT 9658796-1

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

AGOSTO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tiempo en la mañana																															
Soleado	X	X	X		X	X		X		X				X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas									X			X	X																		X
Lluvias intensas																															
Tiempo en la Tarde																															
Soleado	X	X	X		X	X		X	X	X				X	X	X	X			X	X	X		X					X	X	X
Lluvias moderadas												X	X													X	X				
Lluvias intensas																							X					X			

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de septiembre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

893

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	JULIO																												
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tiempo en la mañana																															
Soleado	X	X		X	X			X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas						X			X	X																					X
Lluvias intensas			X																												
Tiempo en la Tarde																															
Soleado		X		X					X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X					X	X
Lluvias moderadas	X		X		X			X																		X	X	X	X		
Lluvias intensas																															

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de agosto de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

369

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

JUNIO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo												X			X		X		X	X						X					
Soleado	X			X	X	X				X	X		X					X			X	X		X	X		X		X		
Lluvias moderadas			X				X	X						X															X		
Lluvias intensas																															

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de julio de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

370

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	MAYO																									JUNIO			
DIA	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**
Clase de tiempo																														
Soleado																														
Lluvias moderadas																										X				
Lluvias intensas																							X	X	X					

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 01 de junio de 2024

Firma
Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

371

10.2 Control ensayos de laboratorio

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	**929 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2023500060004**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
5/11/2024	Interventoria	CONCRETO TRMIE 4000 PSI PARA PILOTES	RESISTENCIA A LA COMPRESION	C8753 Pilote 5	INGEGAR INGENIERIA SAS	NORMA: INV-E-410	7 dias (58-72)	74,00%	SI	Cumpe
5/11/2024	Interventoria			C8754 Pilote 5		NORMA: INV-E-410	14 dias (79-86)	87,70%	SI	Cumpe
12/11/2024	Interventoria			10240 Pilote 6		NORMA: INV-E-410	7 dias (58-72)	67,00%	SI	Cumpe
12/11/2024	Interventoria			10241 Pilote 6		NORMA: INV-E-410	14 dias (79-86)	84,10%	SI	Cumpe
13/11/2024	Interventoria			10243 Pilote 8		NORMA: INV-E-410	7 dias (58-72)	73,80%	SI	Cumpe
13/11/2024	Interventoria			10244 Pilote 8		NORMA: INV-E-410	14 dias (79-86)	88,10%	SI	Cumpe
15/11/2024	Interventoria			10246 Pilote 1		NORMA: INV-E-410	7 dias (58-72)	73,80%	SI	Cumpe
18/11/2024	Interventoria			10300 Pilote 7		NORMA: INV-E-410	7 dias (58-72)	70,80%	SI	Cumpe
20/11/2024	Interventoria			10300 Pilote 2		NORMA: INV-E-410	7 dias (58-72)	72,00%	SI	Cumpe

* Contratista / Interventor

En el presente periodo se tomo una muestra de concreto y se realizo las prueba de los especimenes que se anexan en el informe.

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha	Ensayo realizado por	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
	C / I*						Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo se tomo una muestra de concreto pero la prueba de los especimenes se realiza en el siguiente periodo

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

374

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos adicionales de laboratorio.

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

375

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos adicionales de laboratorio.

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

376

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	**929 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2023500060004**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos adicionales de laboratorio.

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	**929 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2023500060004**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
	C / I*						Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos adicionales de laboratorio.

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

348

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Fecha	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
							Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo no se realizaron pruebas ni ensayos adicionales de laboratorio.

Firma

Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

379

10.3 Control personal de Interventoría

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	978 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT No 9.658.796-1		
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA		

PLANILLA No	9478123755 - 9478120489	REFERENCIA DE PAGO	202411291046206020962024112910450760209 2	DIAS LABORADOS	30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	a 01 DE NOVIEMBRE	a 30 DE NOVIEMBRE

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Dias cotizados	AFILIACION Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 dias
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoria	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	30,00	$ 153.811,36	4%	$ 615.245,44	16%	$ 267.631,77	6,96%	$ 153.811,36	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoria	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	30,00	$ 738.151,63	12,5%	$ 944.834,08	16%	$ 411.002,82	6,96%	$ 118.104,26	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narváez Castro	Tecnólogo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	30,00	$ 66.695,36	4%	$ 266.781,44	16%	$ 116.049,93	6,96%	$ 66.695,36	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	Topógrafo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	30,00	$ 36.846,64	4%	$ 147.386,56	16%	$ 64.113,15	6,96%	$ 36.846,64	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024	9/11/2024	$ 1.428.965,00	40%	9,00	$ 22.863,44	4%	$ 91.453,76	16%	$ 39.782,39	6,96%	$ 22.863,44	4%	$ 571.586,00
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra	Cadenero	1.121.966.765	Dependiente	1/11/2024		$ 1.428.965,00	40%	30,00	$ 22.863,44	4%	$ 91.453,76	16%	$ 39.782,39	6,96%	$ 22.863,44	4%	$ 571.586,00
Pedro Eladio Alférez R.	Operario	3.274.632	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	30,00	$ 57.975,80	4%	$ 231.903,20	16%	$ 100.877,89	6,96%	$ 57.975,80	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	$ 1.183.467,35		$ 2.726.096,96		$ 1.185.852,18		$ 563.419,98	

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los dias laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, asi mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen diente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el articulo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 4.899.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 5.906.000,00
Flor Angela Narváez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 2.100.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 4.899.000,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.700.000,00
Pedro Eladio Alférez R.	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 1.700.000,00
Rafael Mauricio Pinto Bocanegra	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.700.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	978 DE 2023	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT No 9.658.796-1		
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA		

PLANILLA No	9477029275 - 9476894346	REFERENCIA DE PAGO	2024110712550560128 9 2024110515275760245 9	DIAS LABORADOS	30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	a 01 DE OCTUBRE	a 31 DE OCTUBRE

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Dias cotizados	AFILIACION Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 días
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoria	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	30,00	$ 153.811,36	4%	$ 615.245,44	16%	$ 267.631,77	6,96%	$ 153.811,36	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Residente de Interventoria	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	30,00	$ 738.151,63	12,5%	$ 944.834,08	16%	$ 411.002,82	6,96%	$ 118.104,26	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narváez Castro	Tecnólogo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	30,00	$ 66.695,36	4%	$ 266.781,44	16%	$ 116.049,93	6,96%	$ 66.695,36	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	Topógrafo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	30,00	$ 36.846,64	4%	$ 147.386,56	16%	$ 64.113,15	6,96%	$ 36.846,64	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024		$ 1.428.965,00	40%	30,00	$ 22.863,44	4%	$ 91.453,76	16%	$ 39.782,39	6,96%	$ 22.863,44	4%	$ 571.586,00
Pedro Eladio Alférez R.	Operario	3.274.632	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	30,00	$ 57.975,80	4%	$ 231.903,20	16%	$ 100.877,89	6,96%	$ 57.975,80	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	$ 1.160.603,91		$ 2.634.643,20		$ 1.146.069,79		$ 540.556,54	

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los días laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, así mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen diente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el artículo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 4.899.000,00
Jorge Augusto Rodríguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 5.906.000,00
Flor Angela Narváez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 2.100.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 4.899.000,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.700.000,00
Pedro Eladio Alférez R.	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 1.700.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

382

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	978 DE 2023		PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS			
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
NIT:	NIT No 9.658.796-1			
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023			
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA			

PLANILLA No	9474781971- 9474770191	REFERENCIA DE PAGO	74781971 - 20241004150321602259	DIAS LABORADOS	30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	a 01 DE SEPTIEMBRE	a 30 DE SEPTIEMBRE

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Días cotizados	AFILIACIÓN Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 días
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoría	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	30,00	$ 153.811,36	4%	$ 615.245,44	16%	$ 267.631,77	6,96%	$ 153.811,36	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Residente de Interventoría	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	30,00	$ 738.151,63	12,5%	$ 944.834,08	16%	$ 411.002,82	6,96%	$ 118.104,26	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narváez Castro	Tecnólogo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	30,00	$ 66.695,36	4%	$ 266.781,44	16%	$ 116.049,93	6,96%	$ 66.695,36	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	Topógrafo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	30,00	$ 36.846,64	4%	$ 147.386,56	16%	$ 64.113,15	6,96%	$ 36.846,64	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024		$ 1.428.965,00	40%	30,00	$ 22.863,44	4%	$ 91.453,76	16%	$ 39.782,39	6,96%	$ 22.863,44	4%	$ 571.586,00
Pedro Eladio Alférez R.	Operario	3.274.632	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	30,00	$ 57.975,80	4%	$ 231.903,20	16%	$ 100.877,89	6,96%	$ 57.975,80	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	$ 1.160.603,91		$ 2.634.643,20		$ 1.146.069,79		$ 540.556,54		

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los días laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, así mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen diente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el artículo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 4.899.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 5.906.000,00
Flor Angela Narváez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 2.100.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 4.899.000,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.300.000,00
Pedro Eladio Alférez R.	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 1.450.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

383

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	978 DE 2023		PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS			
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
NIT:	NIT No 9.658.796-1			
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023			
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA			

PLANILLA No	9472693167- 9472694956	REFERENCIA DE PAGO	20240909143843601467 - 20240904182008601161	DIAS LABORADOS	30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	a 01 DE AGOSTO	a 31 DE AGOSTO

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Días cotizados	AFILIACIÓN								Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 días
									Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoria	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	30,00	$ 153.811,36	4%	$ 615.245,44	16%	$ 267.631,77	6,96%	$ 153.811,36	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoria	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	30,00	$ 738.151,63	12,5%	$ 944.834,08	16%	$ 411.002,82	6,96%	$ 118.104,26	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narváez Castro	Tecnólogo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	30,00	$ 66.695,36	4%	$ 266.781,44	16%	$ 116.049,93	6,96%	$ 66.695,36	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	Topógrafo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	30,00	$ 36.846,64	4%	$ 147.386,56	16%	$ 64.113,15	6,96%	$ 36.846,64	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024		$ 1.428.965,00	40%	30,00	$ 22.863,44	4%	$ 91.453,76	16%	$ 39.782,39	6,96%	$ 22.863,44	4%	$ 571.586,00
Pedro Eladio Alférez R.	Operario	3.274.632	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	30,00	$ 57.975,80	4%	$ 231.903,20	16%	$ 100.877,89	6,96%	$ 57.975,80	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	$ 1.160.603,91		$ 2.634.643,20		$ 1.146.069,79		$ 540.556,54		

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los dias laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, asi mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen diente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el articulo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 4.899.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 5.906.000,00
Flor Angela Narváez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 1.670.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 4.899.000,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.300.000,00
Pedro Eladio Alférez R.	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 1.450.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

384

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	978 DE 2023		PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS			
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
NIT:	NIT No 9.658.796-1			
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023			
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA			

PLANILLA No	9471162319- 9470984510	REFERENCIA DE PAGO	20240813094005602025 - 20240806112630602136	DIAS LABORADOS	30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:	a 01 DE JULIO 2024	a 31 DE JULIO 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Días cotizados	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 días
									Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoria	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	30,00	$ 153.811,36	4%	$ 615.245,44	16%	$ 267.631,77	6,96%	$ 153.811,36	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoria	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	30,00	$ 738.151,63	12,5%	$ 944.834,08	16%	$ 411.002,82	6,96%	$ 118.104,26	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narváez Castro	Tecnólogo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	30,00	$ 66.695,36	4%	$ 266.781,44	16%	$ 116.049,93	6,96%	$ 66.695,36	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 42.129,84	4%	$ 168.519,36	16%	$ 73.305,92	6,96%	$ 42.129,84	4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	Topógrafo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	30,00	$ 36.846,64	4%	$ 147.386,56	16%	$ 64.113,15	6,96%	$ 36.846,64	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024		$ 1.428.965,00	40%	30,00	$ 22.863,44	4%	$ 91.453,76	16%	$ 39.782,39	6,96%	$ 22.863,44	4%	$ 571.586,00
Pedro Eladio Alférez R.	Operario	3.274.532	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	30,00	$ 57.975,80	4%	$ 231.903,20	16%	$ 100.877,89	6,96%	$ 57.975,80	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	$ 1.160.603,91		$ 2.634.643,20		$ 1.146.069,79		$ 540.556,54		

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los días laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, así mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen diente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el artículo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 4.899.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 5.906.000,00
Flor Angela Narváez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 1.670.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 4.899.000,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.300.000,00
Pedro Eladio Alférez R.	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 1.450.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

385

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO Nº	978 DE 2023		PROYECTO Nº	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS			
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
NIT:	NIT No 9.658.796-1			
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023			
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA			

PLANILLA No	9469880891- 9469579669		REFERENCIA DE PAGO		20240724151710602080 - 20240704094846602976		DIAS LABORADOS	30 DIAS	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				a 01 DE JUNIO 2024		a 30 DE JUNIO 2024		
									AFILIACIÓN								
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial Según propuesta	% Dedicación propuesta	Dias cotizados	Salud	%	Pensión	%	ARL	%	Caja de Compensación	%	Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 dias
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoría	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	30,00	$ 196.000,00	4%	$ 783.900,00	16%	$ 341.000,00	6,96%	$ 196.000,00	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoría	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	30,00	$ 519.800,00	12,5%	$ 665.300,00	16%	$ 289.400,00	6,96%	$ 83.200,00	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narváez Castro	Tecnólogo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	30,00	$ 66.800,00	4%	$ 267.200,00	16%	$ 116.300,00	6,96%	$ 66.800,00	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	30,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	Topógrafo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	30,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024		$ 1.428.965,00	40%	30,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 571.586,00
Pedro Eladio Alférez R.	Operario	3.274.632	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	30,00	$ 66.900,00	4%	$ 267.400,00	16%	$ 116.400,00	6,96%	$ 66.900,00	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	$ 1.057.500,00		$ 2.815.800,00		$ 1.225.100,00		$ 620.900,00		

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los dias laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, así mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen diente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el articulo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	30	$ 3.845.284,00	$ 4.899.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	30	$ 5.905.213,00	$ 4.158.000,00
Flor Angela Narváez Castro	$ 1.667.384,00	30	$ 1.667.384,00	$ 1.670.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	30	$ 1.053.246,00	$ 4.899.000,00
Oscar Hernán Alarcón Ortegón	$ 921.166,00	30	$ 921.166,00	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	30	$ 571.586,00	$ 1.300.000,00
Pedro Eladio Alférez R.	$ 1.449.395,00	30	$ 1.449.395,00	$ 1.450.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

386

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA

JR

CONTRATO N°	**978 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2023500060004**
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT No 9.658.796-1		
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA		

PLANILLA No	**9468488971 - 9468309561**		**REFERENCIA DE PAGO**		**F 20240613140816602137 - 20240606093435602040**		**DIAS LABORADOS**	**4 Dias**	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**				**a 27 DE MAYO 2024**		**a 31 DE MAYO 2024**	
									AFILIACIÓN							
Nombres y Apellidos	**Cargo y/o oficio**	**Cedula**	**Tipo de Vinculacion**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de Retiro**	**Asignación Salarial Según propuesta**	**% Dedicacion propuesta**	**Dias cotizados**	**Salud**	**%**	**Pensión**	**%**	**ARL**	**%**	**Caja de Compensación**	**%**	**Ingreso Base de Cotización Según Propuesta 30 dias**
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoria	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 7.690.568,00	50%	5,00	$ 94.400,00	4%	$ 377.300,00	16%	$ 164.200,00	6,96%	$ 94.400,00	4%	$ 3.845.284,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoria	9.658.796	Independiente	27/5/2024		$ 5.905.213,00	100%	5,00	$ 519.800,00	12,5%	$ 665.300,00	16%	$ 289.400,00	6,96%	$ 83.200,00	2%	$ 5.905.213,00
Flor Angela Narvaez Castro	Tecnologo en HSEQ	1.121.891.768	Dependiente	27/5/2024		$ 3.334.768,00	50%	5,00	$ 66.800,00	4%	$ 267.200,00	16%	$ 116.300,00	6,96%	$ 66.800,00	4%	$ 1.667.384,00
Karol Paola Santana Torres	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	5,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 1.053.246,00
Jimmy Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en estructuras	86.063.202	Dependiente	27/5/2024		$ 5.266.230,00	20%	5,00		4%		16%		6,96%		4%	$ 1.053.246,00
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	Topografo	93.293.568	Dependiente	27/5/2024		$ 2.302.915,00	40%	5,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 921.166,00
Michell Vanessa Trujillo	Cadenero	1.006.820.696	Dependiente	27/5/2024		$ 1.428.965,00	40%	5,00	$ 52.000,00	4%	$ 208.000,00	16%	$ 90.500,00	6,96%	$ 52.000,00	4%	$ 571.586,00
Fabian Antonio Perez	Operario	1.121.878.344	Dependiente	27/5/2024		$ 1.449.395,00	100%	5,00	$ 66.900,00	4%	$ 267.400,00	16%	$ 116.400,00	6,96%	$ 66.900,00	4%	$ 1.449.395,00
								TOTAL	**$ 903.900,00**		**$ 2.201.200,00**		**$ 967.800,00**		**$ 467.300,00**	

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectacion de los dias laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, asi mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependendiente corresponde a lo establecido como exenciones de acuerdo con el Estatuto Tributario, en el artículo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PRPUESTA 30 DIAS	DIAS LABORADOS	IBC PROPUESTA DIAS LABORADOS	IBC PLANILLA
Jimmy Andres Torres Castro	$ 3.845.284,00	5	$ 640.880,67	$ 2.358.000,00
Jorge Augusto Rodriguez Reina	$ 5.905.213,00	5	$ 984.202,17	$ 4.158.000,00
Flor Angela Narvaez Castro	$ 1.667.384,00	5	$ 277.897,33	$ 1.670.000,00
Karol Paola Santana Torres	$ 1.053.246,00	5	$ 175.541,00	$ 1.300.000,00
Jimmy Andres Torres Castro	$ 1.053.246,00	5	$ 175.541,00	$ 2.358.000,00
Oscar Hernán Alarcon Ortegon	$ 921.166,00	5	$ 153.527,67	$ 1.300.000,00
Michell Vanessa Trujillo	$ 571.586,00	5	$ 95.264,33	$ 1.300.000,00
Fabian Antonio Perez	$ 1.449.395,00	5	$ 241.565,83	$ 1.671.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

387

10.4 Control seguridad industrial

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO N°	978 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION:	01-11-2024 al 30-11-2024	N° DE TRABAJADORES:	8

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP			x		
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	x				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)		x			
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.			x		
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.)					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgación de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	30	15	6	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	84%				
ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos		x			
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias	x				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Está demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				
ÍTEM	GESTION DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc.)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				
ÍTEM	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		x			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro		x			
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado		x			
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico	x				
	SUBTOTAL	30	15	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	75%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo			x		
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	x				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	x				
	SUBTOTAL	100	5	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	90%				
ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				
ÍTEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.			x		
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	40	0	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	86%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	64%	30	15	6	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	90%	100	5	3	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	83%	20	5	0	0	4
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	86%	40	0	3	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	75%	30	15	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO ALTO / MEDIO / BAJO	83,1%	260	45	12	0	10



GRAFICO DE GESTION SISO

Firma
Nombre: JHON ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: ELOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO N°	978 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCIÓN	01-10-2024 al 31-10-2024	N° DE TRABAJADORES	8

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP		x			
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	x				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de (Herramientas, EPP)		x			
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades			x		
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.)					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgación de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	30	20	3	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	86%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.		x			
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias	x				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo ésta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	x				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro		x			
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado		x			
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	x				
	SUBTOTAL	40	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	83%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo			x		
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	x				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	x				
	SUBTOTAL	100	5	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	90%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores. Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.			x		
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	40	0	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	86%				



GRAFICO DE GESTION SISO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	66%	30	20	3	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	90%	100	5	3	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	83%	20	5	0	0	4
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	86%	40	0	3	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	83%	40	10	0	0	0

RESULTADO DE NUESTRA GESTION EN CAMPO						
ALTO	MEDIO	BAJO	84,6%	270	45	9	0	10
x								

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JR

CONTRATO Nº	978 DE 2023	PROYECTO Nº	BPIN 2023500060004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION	01-09-2024 al 30-09-2024	Nº DE TRABAJADORES	8

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	x				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso) y capacitación			x		
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de (Herramientas, EPP)	x				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc)					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo,(divulgación de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	40	15	3	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	73%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos	x				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	x				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo está en órden y aseo	x				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	4
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	GESTION DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	¡Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		x			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	x				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	x				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico	x				
	SUBTOTAL	50	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	92%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo		x			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respirstoria adecuada para la labor.		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.		x			
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		x			
	SUBTOTAL	80	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	83%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				



GRAFICO DE GESTION SISO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACIÓN EN CAMPO	73%	40	15	3	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	83%	80	20	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	30	0	0	0	4
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	92%	50	5	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTION EN CAMPO	90,1%	290	45	3	0	10

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: ELOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCALDIA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO N°	978 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500080004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION:	01-08-2024 al 31-08-2024	N° DE TRABAJADORES:	8

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el Item.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	x				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación			x		
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	x				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgación de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	40	15	3	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	73%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					x
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	20	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		x			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	x				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	x				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	x				
	SUBTOTAL	50	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	92%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo		x			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.		x			
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		x			
	SUBTOTAL	80	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	83%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	73%	40	15	3	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	83%	80	20	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	20	0	0	0	5
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	92%	50	5	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO		280	45	3	0	11

ALTO	MEDIO	BAJO	90,1%
x			

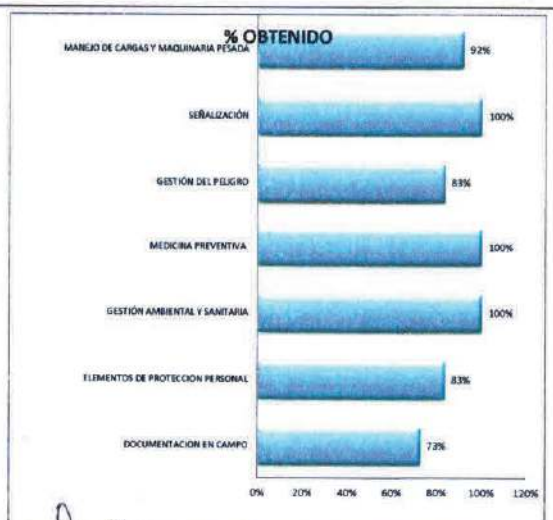


GRAFICO DE GESTION SISO

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO N°	978 DE 2023	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION	01-07-2024 al 31-07-2024	N° DE TRABAJADORES:	8

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A (10)	B (5)	C (3)	D (0)	E (N.A)
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	x				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación			x		
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	x				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgación de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	40	15	3	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	73%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					x
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	20	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	GESTION DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		x			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	x				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	x				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico	x				
	SUBTOTAL	50	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	92%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A (10)	B (5)	C (3)	D (0)	E (N.A)
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo		x			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.		x			
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		x			
	SUBTOTAL	80	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	83%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

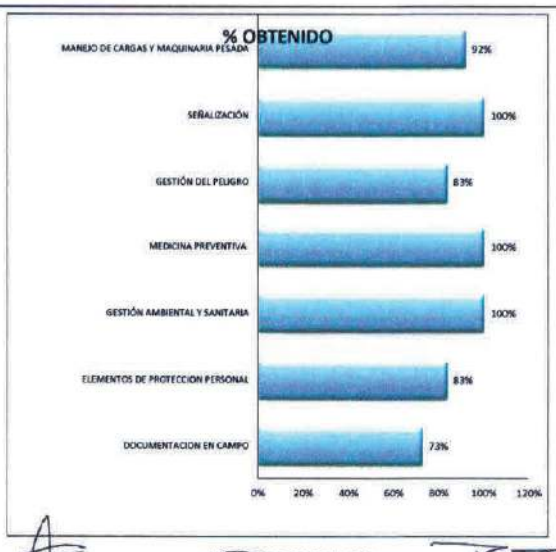


GRAFICO DE GESTION SISO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	73%	40	15	3	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	83%	80	20	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	20	0	0	0	5
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	92%	50	5	0	0	0

RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO						
ALTO	MEDIO	BAJO	90,1%	280	45	3	0	11
x								

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO N°	978 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION:	01-06-2024 al 30-06-2024	N° DE TRABAJADORES:	7

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	x				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación					x
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	x				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa.	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgación de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	40	15	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	79%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					x
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	20	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ITEM	GESTION DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc.)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ITEM	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		x			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	x				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	x				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	x				
	SUBTOTAL	50	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	92%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo		x			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.		x			
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		x			
	SUBTOTAL	80	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	83%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores. Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

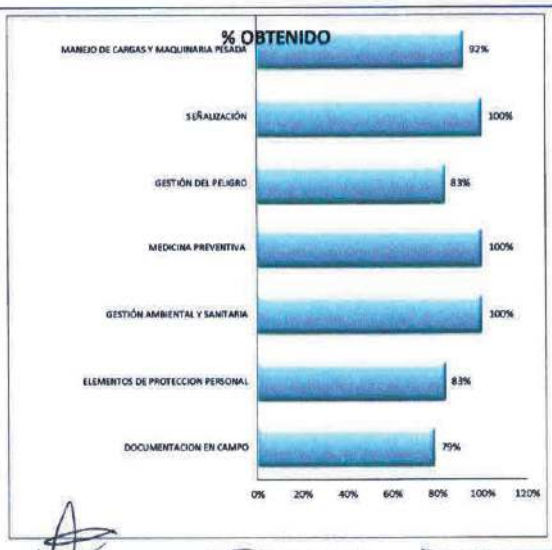


GRAFICO DE GESTION SISO

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	79%	40	15	0	0	2
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	83%	80	20	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	20	0	0	0	5
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	92%	50	5	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	91,0%	280	45	0	0	12

ALTO	MEDIO	BAJO
x		

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JR

CONTRATO Nº	978 DE 2023	PROYECTO Nº	BPIN 2023500060004
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO	27 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	Nº DE TRABAJADORES:	7

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA

Escribe el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 dias) ARP, EPS y AFP	x				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación					x
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	x				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	x				
	SUBTOTAL	40	15	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	79%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.					x
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					x
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.					x
14	Los equipos y herramientas están organizados					x
15	las herramientas de trabajo estan cubiertas y protegidas					x
16	El sitio de trabajo esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	20	0	0	0	5
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ITEM	GESTION DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					x
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	20	5	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	83%				

ITEM	PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	x				
30	¡Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización		x			
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	x				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	x				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	x				
	SUBTOTAL	50	5	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	92%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo		x			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		x			
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.		x			
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.		x			
	SUBTOTAL	80	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	83%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					x
	SUBTOTAL	20	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vias, etc	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	x				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	79%	40	15	0	0	2
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	83%	80	20	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	20	0	0	0	5
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	20	0	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	83%	20	5	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	92%	50	5	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTION EN CAMPO	91,0%	280	45	0	0	12

ALTO	MEDIO	BAJO
x		



GRAFICO DE GESTION SISO

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

10.5 Control correspondencia

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
12 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-123	Radicación de informe semanal No 22 y 23	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
12 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-124	Solicitud plan de contingencia por atraso del contrato de obra	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
12 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-125	Reiteración de obligaciones generales, específicas y multas establecidas contractualmente	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
13 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-126	Radicación de informe No.5 de obra, y Radicación de informe No.5 de inter a obra	consorcioacacia.info23@gmail.com,	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
18 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-127	Radicación comité de obra No 26 y 27	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
22 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-128	Radicación de informes semanales No 24 y 25 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
25 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-129	Reiteración solicitud plan de contingencia por atraso, programación actividades de descabece de pilotes y demolición puente.	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
28 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-129	Radicación de informe semanal No 26 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
28 de noviembre de 2024	CI- OCA-978.2023-130	Solicitud del borrado de ejecución en el cargue del aplicativo GESPROY del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 30 de noviembre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

379

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
19 de noviembre de 2024	C-7636	Resultados de laboratorio	ingegar_ingenieria@yahoo.com com	interpuentechichimene@gmail.com
28 de noviembre de 2024	11927	Resultados de laboratorio	ingegar_ingenieria@yahoo.com com	interpuentechichimene@gmail.com
28 de noviembre de 2024	11928	Resultados de laboratorio	ingegar_ingenieria@yahoo.com com	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 30 de noviembre de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-114	Radicación de informe semanal No 23	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-115	Respuesta a oficio CA-075 de fecha 2 de octubre de 2024	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-116	Reiteración solicitud entrega de procedimiento constructivo, notificación de laboratorio, documentación planta de concreto.	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-117	Respuesta a oficio CA-070 orden de operación No 10 recursos de anticipo	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
9 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-118	Radicación de informes semanales No 18 y 19 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
9 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-119	Radicación comité de obra No 24 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
16 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-120	Solicitud cumplimiento compromisos pactados en el comité de obra No 24	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
23 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-121	Radicación de informes semanales No 20 y 21 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
23 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-122	Radicación comité de obra No 25 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
23 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-123	Radicación de informes semanales No 22 y 23 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

399

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02 de octubre de 2024	CA-077	Solicitud de aprobación ítems no previsto	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de octubre de 2024	CA-078	Cambio plan de inversión de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de octubre de 2024	CA-078	Refuerzo transversal pilotes	infraestructura@acacias.gov.co>	interpuentechichimene@gmail.com, consorcioacacia.info23@gmail.com,
02 de octubre de 2024	CA-079	Procedimiento de pilotaje	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de octubre de 2024	CA-080	Certificado calibración piloteadora	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
05 de octubre de 2024	CA-081	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No. 13 recursos de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de octubre de 2024	CA-082	Respuesta oficio CI- OCA-978.2023-120	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de octubre de 2024	CA-084	Informe plan PAGA	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de octubre de 2024	CA-085	Diseño geométrico vía	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
15 de octubre de 2024	CA-086	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No.13 recursos de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
25 de octubre de 2024	CA-088	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No.14 recursos de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de octubre de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

400

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
03 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-098	Radicación de informe semanal No 14	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
03 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-099	Respuesta a oficio CA-047 del 29 de agosto de 2024 hallazgos suelos	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
03 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-100	Requisito para la autorización de recursos de anticipo del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
03 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-101	Traslado oficio CA-048 de fecha 03 de septiembre de 2024	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
05 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-102	Radicación informe mensual obra No 3	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
06 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-103	Solicitud cierre y prohibición paso puente colapsado	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
06 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-104	Radicación de informe mensual No 4 del contrato de interventoria	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
06 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-105	Radicación comité de obra No 21 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-106	Respuesta a oficio CA-054 solicitud desembolso recursos de anticipo del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com,
16 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-107	Incumplimiento entrega de informe mensual No 4 mes de agosto del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
16 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-108	Requerimiento compromisos ambientales permiso de ocupación de cauce del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
19 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-109	Radicación de informe semanal No 15 y 16 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
23 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-110	Radicación comité de obra No 22 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
24 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-111	Radicación de informe mensual obra No 4 del contrato de obra No. 929 del 2023	interpuentechichimene@gmail.com	Oficina de Infraestructura en forma fisica

401

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
24 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-112	Radicación de informe semanal No 17 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
24 de septiembre de 2024	CI- OCA-978.2023-113	Radicación reprogramación de obra del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de octubre del 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

402

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	**929 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2023500060004**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
01 de septiembre de 2024	CA-048	Respuesta Oficio 099	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
07 de septiembre de 2024	CA-050	INFORME No. 4 AGOSTO	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
11 de septiembre de 2024	16.01/0560	Solicitud de informes mensuales	infraestructura@acacias.gov.co>	interpuentechichimene@gmail.com, consorcioacacia.info23@gmail.com,
12 de septiembre de 2024	CA-054	Desembolso Anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
12 de septiembre de 2024	CA-055	Desembolso Anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-056	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No1 recursos de anticipo, por valor de $ 414.450.100,00 para RICH CONSTRUCTORA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-056	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 6 recursos de anticipo, por valor de $ 550.000.007,00 para GRAVAS Y CONCRETOS S.A	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-057	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No2 recursos de anticipo., por valor de $ 118.257.016,47 reembolso a HISO INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-058	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 3 recursos de anticipo, reembolso por valor de $ 245.463.680,00 para HISO INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-059	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 4 recursos de anticipo, reembolso por valor de $ 142.711.867,73 para HISO INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-060	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 5 recursos de anticipo, reembolso por valor de $ 50.992.931,00 para HISO INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-061	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 6 recursos de anticipo, por valor de $ 550.000.007,00 para GRAVAS Y CONCRETOS S.A	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
13 de septiembre de 2024	CA-062	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 7 recursos de anticipo, por valor de $ 105.278.123,00 para SABIK INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-063	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 8 recursos de anticipo., por valor de $ 150.000.000,00 reembolso a HISO INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-064	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 9 recursos de anticipo., por valor de $ 49.404.784,00 reembolso a HISO INGENIERIA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-065	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No1 recursos de anticipo, por valor de $ 250.940.012,00 para HISO INGENIERIA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
13 de septiembre de 2024	CA-066	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No 11 recursos de anticipo, por valor de $ 350.000.470,00 para GRAVAS Y CONCRETOS S.A	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
19 de septiembre de 2024	CA-067	Solicitud de reprogramación.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
20 de septiembre de 2024	CA-068	Solicitud de reprogramación.	consorcio.acacia@geotecnia.co	infraestructura@acacias.gov.co>
20 de septiembre de 2024	CA-069	Novedad Orden de Opresión No. 8	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
25 de septiembre de 2024	CA-070	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No10 recursos de anticipo, por valor de $ 300.000.000,00 para CONSTRUCTORA HORCA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
25 de septiembre de 2024	CA-071	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No11 recursos de anticipo, por valor de $ 18.000.000,00 para CONSTRUCTORA HORCA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
25 de septiembre de 2024	CA-072	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No12 recursos de anticipo, por valor de $ 129'591.000,00 para HISO INGENIERIA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
27 de septiembre de 2024	CA-073	Novedad Orden de Operación No. 6	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
27 de septiembre de 2024	CA-074	Respuesta Oficio 108 Requerimientos ambientales	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
30 de septiembre de 2024	CA-070-R	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No10 recursos de anticipo, por valor de $ 300.000.000,00 para CONSTRUCTORA HORCA SAS	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
30 de septiembre de 2024	CA-071-R	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No. 11 recursos de anticipo, por valor de $ 18.000.000,00 para DELTA 360 SASA	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
30 de septiembre de 2024	CA-072-R	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No12 recursos de anticipo, por valor de $ 129'591.000,00 para HISO INGENIERIA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elaboro con corte al dia 04 de octubre de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

405

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
01 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-071	Radicación comité de obra No 16 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
02 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-072	Radicación informes mensual de interventoria a obra No 1 y 2 para el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
05 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-073	Certificado de Cumplimiento del Anticipo contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
05 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-074	Radicación de informe semanal No 10 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-075	Radicación de informe mensual No 3 del contrato de interventoria No. OCA-978 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-076	Radicación informes mensual de interventoria a obra No 3 para el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-077	Radicación informes mensual obra No 1 y 2 del contratista del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
12 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-078	Radicación de informe semanal No 11 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
13 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-079	Radicación comité de obra No 17 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
13 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-080	Segunda reiteración solicitud entrega de informe mensual No 3 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
13 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-081	Reiteración Cumplimiento obligaciones contractuales área de seguridad y salud en el trabajo en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
13 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-082	Reiteración Cumplimiento implementación del plan de manejo ambiental o PAGA y plan de manejo de tránsito en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
13 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-083	Reiteración solicitud entrega de procedimiento constructivo, notificación de laboratorio, documentación planta de concreto para la construcción de pilotes en el	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
20 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-084	Recomendación riesgos en el uso de piloteadora en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

406

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
20 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-085	Respuesta a oficio CA-044 informe No.3 julio del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
20 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-086	Radicación de informe semanal No 12 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
20 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-087	Radicación comité de obra No 18 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-088	Observaciones información entregada oficio 041 del 14 de agosto de 2024 y documentación empresa de laboratorio para el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-089	Observaciones procedimiento pilotaje enviado a través del oficio 040 del 14 de agosto de 2024 contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-090	Características especiales del concreto a utilizar en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-091	Segunda reiteración solicitud entrega de procedimiento constructivo, notificación de laboratorio, documentación planta de concreto para la construcción de pilotes en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-092	Tercera reiteración solicitud entrega de informe mensual No 3 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-093	Radicación comité de obra No 19 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com
22 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-094	Incumplimiento a compromisos pactados en comités realizados en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com
27 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-095	Radicación de informe semanal No 13 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
27 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-096	Radicación comité de obra No 20 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de agosto de 2024	CI-OCA-978.2023-097	Solicitud copia del contrato suscrito de Interventoría No. OCA-978 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de septiembre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

407

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
01 de agosto de 2024	Correo electronico	Concepto de viabilidad cesión contrato de obra pública N° OCA-	infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
14 de agosto de 2024	CA-040	PROCEDIMIENTO PILOTAJE	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
14 de agosto de 2024	CA-041	Documentos Gravicon SA	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
15 de agosto de 2024	CA-044	INFORME No.3 JULIO	infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
22 de agosto de 2024	CA-045	INFORME No.3 JULIO	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
24 de agosto de 2024	CA-046	Coordenadas Control Puente	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
29 de agosto de 2024	CA-047	Hallazgos suelos	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de septiembre de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

408

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
04 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-046	Retroalimentación y reiteración fechas de entrega de informes mensuales del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-047	Radicación de informes semanales del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-048	Respuesta a oficio CA-021 de fecha 27 de junio de 2024 camisas A-36 pilotes.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-049	Radicación de informe semanal No 6 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-050	Reiteración observaciones documentos enviados por correo electrónico y en físico del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-051	Observaciones informes mensuales No 1 y No 2 enviados por correo electrónico el viernes 5 de julio de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-052	Radicación de Solicitud de Anticipo del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
11 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-053	Radicación de informe mensual del contrato de interventoria No 1 periodo 27 de mayo al 31 de mayo de 2024	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
11 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-054	Radicación de informe mensual del contrato de interventoria No 2 periodo 01 de junio al 30 de junio de 2024	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
15 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-055	Radicación de informe semanal No 7 del contrato de obra 929 de 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
15 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-056	Observaciones informes mensuales No 1 y No 2 enviados por correo electrónico el jueves 11 de julio de 2024 del contrato de obra 929 de 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
15 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-057	Respuesta a oficio 10 de julio de 2024 concepto modificación consorciados del contrato de obra 929 de 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
19 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-058	Concepto modificación integrante del consorcio contratista del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-059	Concepto solicitud de aval de afiliación al sistema de seguridad social y parafiscales de personal de las empresas subcontratistas del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

409

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
22 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-060	Respuesta a oficio CA-033 de fecha 18 de julio de 2024 Coordenadas pilotes contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
22 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-061	Radicación de informe semanal No 8 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
23 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-062	Radicación comités de obra realizados a la fecha del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
23 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-063		interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-064	Radicación de informe semanal No 9 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-065		interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-066	Radicación comité de obra No 15 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-067	Radicación de informe mensual No 1 No 2 del contrato de interventoria No. OCA-978 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-068	Modificación de la relocalización de coordenadas de pilotes del contrato de interventoria No. OCA-978 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-069	Subsanación y reiteración concepto modificación integrante del consorcio contratista del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
31 de julio de 2024	CI-OCA-978.2023-070	Reiteración solicitud entrega de informes mensuales No 1, No 2 y No 3 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de agosto de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

410

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
04 de julio de 2024	CA-022	Cambio de profesional Gerente de Proyectos	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
05 de julio de 2024	CA-024	Informe mensual N° 01	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
05 de julio de 2024	CA-025	Informe mensual N° 02	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
08 de julio de 2024	N.A.	Traslado de solicitud de cesión de la posición contractual / Consorcio Acacia	infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
15 de julio de 2024	CA-027	Acero de refuerzo para pilotes.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
15 de julio de 2024	CA-028	Oficinas casco urbano	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de julio de 2024	CA-029	Solicitud de aval de afiliación al sistema de seguridad social y parafiscales de personal de las empresas subcontratistas	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
19 de julio de 2024	N.A.	Requerimiento No.2 - Cesión de la Posición Contractual N°OCA-929-2023	infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de julio de 2024	CA-030	Certificación vinculación comercial con la empresa SABIK INGENIERIA SAS.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de julio de 2024	CA-031	Documentación personal para labores de pilotaje	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
18 de julio de 2024	CA-032	Coordenadas pilotes.	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
18 de julio de 2024	CA-033	Respuesta oficio No. 060	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
23 de julio de 2024	CA-034	Información técnica maquina Piloteadora	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
23 de julio de 2024	CA-035	Incidente maquinaria piloteadora	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
30 de julio de 2024	CA-038	Certificado de calidad acero A- 36	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de agosto de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

411

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-031	Reiteración de la relación de obligaciones establecidas en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-032	Reiteración solicitud y requerimiento entrega inmediata de documentación contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-033	Cumplimiento obligaciones contractuales área de seguridad y salud en el trabajo en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-034	instalación valla informativo del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-035	Definición fechas de entrega de informes mensuales del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-036	Solicitud entrega protocolos, fichas ambientales y demás requerimientos para el cumplimiento de permiso ambiental de ocupación de cauce en ejecución del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-037	Cumplimiento obligaciones contractuales ampliación de garantías según acta de inicio contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
04 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-038	Requerimiento informe técnico de revisión de estudios y diseños entregados del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
	CI-OCA-978.2023-039		interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
06 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-040	Observaciones documentos físico radicados mediante oficio CA-016 de fecha 4 de junio de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
17 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-041	Reiteración observaciones documentos físico radicados mediante oficio CA-016 de fecha 4 de junio de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
17 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-042	Reiteración de la relación de obligaciones establecidas y posible incumplimiento en la ejecución del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

412

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
17 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-043	Radicación de informes semanales del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
18 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-044	Citación a comité técnico de obra de obra modo presencial, del contrato 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
20 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-045	Notificación por posible incumplimiento a obligaciones establecidas en la ejecución del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
24 de junio de 2024	CI-OCA-978.2023-046	Retroalimentación y reiteración fechas de entrega de informes mensuales del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de julio de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

413

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
04 de junio de 2024	CA-016	Entrega de Documentos Físicos Respuesta oficio CI-OCA-978.2023-030	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
24 de junio de 2024	CA-018	Entrega de Documentos - Actualización Pólizas	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
27 de junio de 2024	CA-021	Camisas A-36 Pilotes camisas	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de julio de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

414

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
27 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-001	Solicitud requerimiento entrega de documentación contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
27 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-002	Relación de obligaciones establecidas en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
27 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-003	Cumplimiento obligaciones contractuales área de seguridad y salud en el trabajo en el contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
27 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-004	Solicitud de Formatos a implementar por la entidad para contratos de Interventoría y contratos de obra	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
27 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-005	Solicitud de copia de asignación de Supervisor y Apoyo a la supervisión del contrato en la referencia.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
28 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-006	Certificación cumplimiento numeral 15 obligaciones del contratista Factor de Sostenibilidad.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
28 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-007	Radicación de carpeta personal de interventoría, previo al inicio del contrato para aprobación por parte de supervisión.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
28 de diciembre de 2023	CI-OCA-978.2023-008	Entrega del Factor Multiplicador del contrato en la referencia	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de enero de 2024	CI-OCA-978.2023-009	Remisión de oficios CA-002 Solicitud de información y CA-003 Revisión de Información técnica enviados por el contratista de obra.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
13 de febrero de 2024	CI-OCA-978.2023-010	Reiteración de oficios CI- OCA-978.2023-001, CI-OCA-978.2023-002 y CI- OCA-978.2023-003 enviados el 27 de diciembre de 2023.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
15 de febrero de 2024	CI-OCA-978.2023-011	Remisión de oficio CA-005 Respuesta CI-OCA-978-.2023-010 - Solicitud de información técnica.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
20 de febrero de 2024	CI-OCA-978.2023-012	Remisión acta de comité de obra de fecha 15 de febrero de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
24 de febrero de 2024	CI-OCA-978.2023-013	Remisión acta de comité de obra de fecha 23 de febrero de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

415

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
04 de marzo de 2024	CI-OCA-978.2023-014	Remisión acta de comité de obra de fecha 04 de marzo de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
23 de marzo de 2024	CI-OCA-978.2023-015	Traslado oficio CA-008 de fecha 22 de marzo de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
23 de marzo de 2024	CI-OCA-978.2023-016	Respuesta a oficio CA-008 de fecha 22 de marzo de 2024 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
05 de abril de 2024	CI-OCA-978.2023-017	Remisión Coordenadas de ubicación de los pilotes a construir para el puente.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de abril de 2024	CI-OCA-978.2023-018	Remisión Permiso intervención de predio para construcción del puente	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
09 de abril de 2024	CI-OCA-978.2023-019	Remisión CA-009 Respuesta comunicados CI-OCA-978.2023-017 y CI-OCA-978.2023-018, enviado por el contratista CONSORCIO ACACIA R/L. RODRIGO SUÁREZ QUIÑÓNEZ correspondiente al contrato de obra No. OCA-929 de 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
25 de abril de 2024	CI-OCA-978.2023-020	Reiteración de documentación necesaria previo inicio del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de abril de 2024	CI-OCA-978.2023-021	Remisión de Remisión coordenadas de ubicación de los pilotes a construir para el puente	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
30 de abril de 2024	CI-OCA-978.2023-022	Información de la imposibilidad de suscripción del acta de inicio del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
03 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-023	Respuesta de oficio CA-010 Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-010 - Solicitud de información técnica del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
03 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-024	Respuesta de oficio CA-011 Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-022 - Solicitud de información técnica del contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
08 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-025	Respuesta de oficio CA-010 Y CA-012 Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-023 – Presentación personal profesional contrato de obra No. 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

416

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
24 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-025	Certificación cumplimiento numeral 15 obligaciones del contratista Factor de Sostenibilidad	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
24 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-026	Radicación de carpeta personal de interventoría, previo al inicio del contrato la cual ya se encuentra aprobada desde el 29 de diciembre de 2023.	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
24 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-027	Entrega del Factor Multiplicador del contrato en la referencia	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
24 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-028	Radicación de Actas de inicio del contrato de Obra No. OCA-929-2023, contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 y acta de socialización del presente proyecto	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
29 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-029	Notificación de actualización de garantías según firma del acta de inicio del contrato en la referencia en la plataforma SECOP II	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co
30 de mayo de 2024	CI-OCA-978.2023-030	: Reiteración de requerimiento entrega de documentación contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	ing@geotecnia.co - geotechnics.sa@hotmail.com infraestructura@acacias.gov.co

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 01 de junio de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

417

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
05 de enero de 2024	CA-001	Solicitud de Mesa Técnica	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
24 de enero de 2024	CA-002	Solicitud de Información	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
24 de enero de 2024	CA-003	Revisión de información técnica	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
31 de enero de 2024	CA-004	Revisión de información técnica	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
14 de febrero de 2024	CA-005	Respuesta CI-OCA-978-.2023-010 - Solicitud de información técnica	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
19 de febrero de 2024	CA-006	Solicitud de Visita técnica conjunta, para replanteo de actividades del contrato	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
27 de febrero de 2024	CA-007	olicitud de Visita técnica conjunta, para replanteo de actividades del contrato	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
22 de marzo de 2024	CA-008	Solicitud de información y definición de sitio de ejecución	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
08 de abril de 2024	N.A.	Permiso intervención de predio para construcción del puente	profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
09 de abril de 2024	CA-009	Respuesta comunicados CI-OCA-978.2023-017 y CI-OCA-978.2023-018	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
03 de abril de 2024	N.A.	Remisión coordenadas de ubicación de los pilotes a construir para el puente	profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
12 de abril de 2024	N.A.	Permiso intervención de predio para construcción del puente	profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de mayo de 2024	CA-010	Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-010 - Solicitud de información técnica	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de mayo de 2024	CA-011	Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-022 - Solicitud de información técnica	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
07 de mayo de 2024	CA-012	Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-023 – Presentación Personal Profesional	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

A18

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004	
8 de mayo de 2024	CA-013	Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-023 – Presentación Personal Profesional. Respuesta a comunicado CI-OCA-978-.2023-024 – Maquinaria Mínima proyecto	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
17 de mayo de 2024	CA-014	Aprobación Profesional Estructural	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
30 de mayo de 2024	N.A.	Valla informativa - Construcción Puente	profespecializado.infraestructura@acacias.gov.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se diligencia con corte al día 01 de junio de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

414

10.6 Control equipos

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

MES DE NOVIEMBRE 2024

TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Motoniveladora																														
Retroexcavadora																														
Vibrocompactador																														
Volquetas																				X	X									
Piloteadora	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Exacavadora	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Vehiculo pick up																														
Herramienta menor	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Equipos de topografia	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Equipo de soldadura	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Motobomba	X	X			X	X		X	X			X	X		X				X	X	X	X				X		X	X	X

Nota: Se aclara que el presente documento se elábora con corte al dia 30 de noviembre de 2024

Firma

Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

421

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

MES DE OCTUBRE 2024

TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora																															
Retroexcavadora																															
Vibrocompactador																															
Volquetas		X															X								X						
Piloteadora	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Exacavadora	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Vehiculo pick up																															
Herramienta menor	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Equipos de topografia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Equipo de soldadura	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Motobomba	X	X	X		X				X													X									X

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

422

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

	SEPTIEMBRE																													
TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Motoniveladora																														
Retroexcavadora																														
Vibrocompactador																														
Volquetas																			X	X				X						
Piloteadora		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Exacavadora		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Vehiculo pick up																														
Herramienta menor		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Equipos de topografia		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Equipo de soldadura		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Motobomba																											X	X		X

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 30 de septiembre de 2024

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

423

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

	AGOSTO																													
TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora																															
Retroexcavadora																															
Vibrocompactador																															
Volquetas						X				X						X				X				X							
Piloteadora						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Exacavadora	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X	X			X		X	X	X		X	X		X	X	X
Vehiculo pick up																															
Herramienta menor	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X	X			X		X	X	X		X	X		X	X	X
Equipos de topografia		X			X				X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Equipo de soldadura						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Motobomba												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 01 de septiembre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

424

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

	JULIO																													
TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora																															
Retroexcavadora																															
Vibrocompactador																															
Volquetas			X			X				X						X				X				X						X	
Piloteadora																															
Exacavadora	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Vehiculo pick up																															
Herramienta menor	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Equipos de topografia		X		X	X			X	X	X		X			X			X	X			X	X		X	X			X		

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 01 de agosto de 2024

Firma
Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

425

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

	JUNIO																													
TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora																															
Retroexcavadora																															
Vibrocompactador																															
Volquetas																															
Piloteadora																															
Exacavadora								X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Vehiculo pick up																															
Herramienta menor	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Equipos de topografia	X			X		X						X			X			X			X					X			X		

Nota: Se aclara que el presente documento se ~~elabora~~ con corte al dia 01 de junio de 2024, periodo en el cual no hubo disponbilidad de maquinaria

Firma
Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

426

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	MAYO																									JUNIO			
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
Motoniveladora																														
Retroexcavadora																														
Vibrocompactador																														
Volquetas																														
Piloteadora																														
Exacavadora																														
Vehiculo pick up																														
Herramienta menor																														

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 01 de junio de 2024, periodo en el cual no hubo disponbilidad de maquinaria

Firma

Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

427

10.7 Control implementación plan de manejo ambiental

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/11/2024 a 30/11/2024

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2235 Hasta el 10 de octubre de 2024	En ejecución	Se radico solicitud de proroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Pendiente de entrega de autorización del privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descapote, en un predio privado el cual cuenta con autorización.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO	Concesión minera No 19099 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030, Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030		Se ha aportado documentacion de la mina que suministrara material granular
Permiso de cierres temporales de vias	NO		No se han realizado cierres viales	No se ha ejecutado obras que requieran cierres viales
Pago de tasas y/o regalías	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	50%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Pla ambiental General Ajustado presentado y avalado por interventoria
Manejo integral de residuos sólidos	SI	0%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos
Manejo integral de materiales de construcción	SI	20%	Los materiales de construcción (aceros) se le dado manejo adecuado según PMA.
Explotación fuentes de materiales	SI	0%	No se ha suministrado material ni explotación de estos para la ejecución de la obra
Manejo integral de aguas y residuos líquidos	SI	10%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos y se ha dado un manejo adecuado a las aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión ni afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El lugar de acopio de material es ubicado en un predio privado en cercanía con la ejecución del proyecto
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	N/A	0%	El contrato no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se compara a proveedores autorizados por la corporación ambiental
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	90%	El manejo y control de los equipos y vehículos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación a la vegetación de la zona
Manejo de fauna	SI	0%	No s e ha presentado afectación a la fauna de la zona
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garanticen la protección de fauna
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto
Plan de Gestión Social	SI	60%	Se ha implementa el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento enviado.
Otros	SI	100%	Se ha cumplido lo establecido en el PMA

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

429

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/11/2024 a 30/11/2024

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A
Localización:	N/A
No. de individuos sembrados	N/A
Estado fitosanitario de los individuos	N/A
	N/A
Área empradizada (m^2)	N/A

Observaciones: No es requerido la restauracion de atreas intervenidas, sin embargo se evaluara el impacto durante la ejeuccion de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperacion si existe afectacion.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO				Observaciones
	Aplica	unidad	Localización	Periodo	
Tala	NO				
Poda	NO				
Otro, cual?	N.A				

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Material	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
Sobrante de excavación	144	Finca los cerezos

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	NO			

INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	NO
Nombre	NO
Tipo de Intervención:	NO
Medidas para su recuperación:	NO

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE

RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

¿Cuales?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACION DE CAUCE

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

430

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO DE INSPECCIÓN:	01/11/2024 a 30/11/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA				
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	2	No s eha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	3	No se ha dado cumplimiento
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	0	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	4	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	4	Se cumple almacenaminto lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	0	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	29	
				PROMEDIO	2,9	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	SI	4	Se ha capacitado el personal
	Manejo Escorrentía		X	NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	SI	0	No se ha implementado la proteccion por sustancias
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No se ha realziado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	0	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático		X	SI	5	Manejado con bonbas mecanicas
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	9	
				PROMEDIO	1,1	

RESOLUCIONES		NUMERO	VIGENCIA
CONCESIÓN DE AGUAS		N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCE	Permiso ocupación de cauce Del caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga· de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del· municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Capacitación Personal		X	SI	4	Se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	0	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	4	Se protejen con plasticos los aceros acopiados

431

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Uso de mallas protectoras		X	SI	4	Se ha implementado
	No exceder volúmenes del volcó de los camiones	X		SI	5	Se ha trasnsportado material
	Olores desagradables	X		SI	6	No se ha presentado
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5	Se ha contado con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La mquianaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo		X	SI	6	Se tiene definidios horarios
	Medidas de Contingencia		X	SI	4	No se ha capacitado personal, ni se ha informado el plan
				SUMATORIA	43	
				PROMEDIO	3,91	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	3	No se ha iniciado ejecucion fisica de obra
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	3	Se cuenta con bodega retirada del cualquier posible afectacion
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	6	Cuenta con cercania a la obra toiene deficiente señalizacion
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Cuenta con elementos de seguridad y atencion
	Obras de contención		X	N/A	0	No es requerido para el proyecto
	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
				SUMATORIA	22	
				PROMEDIO	3,67	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	4	Se han dado capacitaciones y charlas
	Demarcación del perímetro	X		SI	6	Se tiene cerramiento y aislamiento del area de trabajo.
	Zonificación de la obra	X		SI	5	Se tiene zona de operatividad y zona de administracion.
	Lona de Cerramiento	X		SI	5	Se tiene cerramiento con lona en un 80 % del perimetro.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	5	Los elementos de señalizacion cuentan con cinta reflectiva
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Se tiene señalización preventiva en toda el area y de aproximacion.
	Uso de Paleteros	X		SI	6	Permanecen dos conttolasdores viales

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Iluminación Nocturna		X	SI	3	Cuenta con Iluminacion nocturna
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	40	
				PROMEDIO	5	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	1	No se ha capcitado personal
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	Se ha entregado elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	Se cuenta con plan aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se ha dispuesto oficina para ello
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con oficina en campamento
	Socializaciones	X		SI	6	Se ha realizaod socializacion del proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	29	
				PROMEDIO	4,8333	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se ha capacitado el operador
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimeintos preventivos a la maquinaria
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	se han definidio los horarios
	Ficha de control de actividades	X		SI	4	Se lleva el control de actividades
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	La maquianria esta en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Se cuenta con EPP
	Extintores	X		SI	6	Se tiene dispobildiad de extintores
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	No se ha programado medidas
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	43	
				PROMEDIO	5,375	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	SI	1	Ni se ha capacitado personal
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realzado mantenimeinto de volquetas y excavadora
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	3	Se han definido horarios de cargue
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No se cuenta con fichas
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	Se cuenta con equipos en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con elementos
	Extintores	X		SI	6	Se cuenta con extintores

433

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No se ha entregado
	Volumen de material (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
	Volumen de excavación (m3)	X		SI	5	Se ha cuentificado material
	Volumen de demolición (m3)		X	SI	0	No se ha realizado demolicion
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	41	
				PROMEDIO	3,42	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	NO SE HA REALIZADO ENTREGA	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	NO SE HA REALIZAOD ENTREGA	

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	0	No se ha presentado
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se cuenta con elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4	Se cuenta con manual aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se cuenta en oficina con espacio para la comunidad
	Programa de información a la comunidad	X		SI	6	Se cuenta con constante coomunicacion
	Socializaciones	X		SI	6	Se han realizado socialziaciones
	Arboles talados		X	N/A	0	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	3,714	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	30,52	56,5	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO DURANTE EL RPESENTE PERIODO LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A REALIZAR, HA IMPLEMENTADO CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS REALIZADAS

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/10/2024 a 31/10/2024

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2235 Hasta el 10 de octubre de 2024	En ejecución	Se radico solicitud de proroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Pendiente de entrega de autorización del privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descapote, en un predio privado el cual cuenta con autorización.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO	Concesión minera No 19099 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030, Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030		Se ha aportado documentacion de la mina que suministrara material granular
Permiso de cierres temporales de vias	NO		No se han realizado cierres viales	No se ha ejecutado obras que requieran cierres viales
Pago de tasas y/o regalias	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	50%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Pla ambiental General Ajustado presentado y avalado por interventoria
Manejo integral de residuos sólidos	SI	0%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos
Manejo integral de materiales de construcción	SI	20%	Los materiales de construcción (aceros) se le dado manejo adecuado según PMA.
Explotación fuentes de materiales	SI	0%	No se ha suministrado material ni explotación de estos para la ejecución de la obra
Manejo integral de aguas y residuos liquidos	SI	20%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos y se ha dado un manejo adecuado a las aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión ni afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El lugar de acopio de material es ubicado en un predio privado en cercania con la ejecución del proyecto
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	N/A	0%	El contrato no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se compara a proveedores autorizados por la corporación ambiental
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	100%	El manejo y control de los equipos y vehiculos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación a la vegetación de la zona
Manejo de fauna	SI	0%	No s e ha presentado afectación a la fauna de la zona
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garanticen la protección de fauna
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto
Plan de Gestión Social	SI	70%	Se ha implementa el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento enviado.
Otros	SI	100%	Se ha cumplido lo establecido en el PMA

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

435

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/10/2024 a 31/10/2024

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A
Localización:	N/A
No. de individuos sembrados	N/A
Estado fitosanitario de los individuos	N/A
	N/A
Área empradizada (m^2)	N/A

Observaciones: No es requerido la restauracion de atreas intervenidas, sin embargo se evaluara el impacto durante la ejeuccion de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperacion si existe afectacion.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO				Observaciones
	Aplica	unidad	Localización	Periodo	
Tala	NO				
Poda	NO				
Otro, cual?	N.A				

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Material	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
Sobrante de excavación	144	Finca los cerezos

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	NO			

INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	NO
Nombre	NO
Tipo de Intervención:	NO
Medidas para su recuperación:	NO

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE

RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
¿Cuales?	

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACION DE CAUCE

Firma

Nombre: JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

436

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO DE INSPECCIÓN:	01/10/2024 a 31/10/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA				
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	1	No s eha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	1	No se ha dado cumplimiento
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	0	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	4	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	4	Se cumple almacenaminto lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	0	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
				SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	2,6	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	SI	4	Se ha capacitado el personal
	Manejo Escorrentía		X	NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	SI	0	No se ha implementado la proteccion por sustancias
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No se ha realziado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	0	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático		X	SI	5	Manejado con bonbas mecanicas
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
				SUMATORIA	9	
				PROMEDIO	1,1	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESOLUCIONES		NUMERO	VIGENCIA
CONCESIÓN DE AGUAS		N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCE	Permiso ocupación de cauce Del caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga· de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del· municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Capacitación Personal		X	SI	3	Se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	0	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	5	Se protejen con plasticos los aceros acopiados

437

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Uso de mallas protectoras		X	SI	5	Se ha implementado
	No exceder volúmenes del volcó de los camiones	X		SI	5	Se ha trasnsportado material
	Olores desagradables	X		SI	6	No se ha presentado
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5	Se ha contado con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La mquianaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo		X	SI	6	Se tiene definidios horarios
	Medidas de Contingencia		X	SI	4	No se ha capacitado personal, ni se ha informado el plan
				SUMATORIA	44	
				PROMEDIO	4,00	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	3	No se ha iniciado ejecucion fisica de obra
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	5	Se cuenta con bodega retirada del cualquier posible afectacion
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	6	Cuenta con cercania a la obra toiene deficiente señalizacion
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Cuenta con elementos de seguridad y atencion
	Obras de contención		X	N/A	0	No es requerido para el proyecto
	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
				SUMATORIA	24	
				PROMEDIO	4,00	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	4	Se han dado capacitaciones y charlas
	Demarcación del perimetro	X		SI	6	Se tiene cerramiento y aislamiento del area de trabajo.
	Zonificación de la obra	X		SI	5	Se tiene zona de operatividad y zona de administracion.
	Lona de Cerramiento	X		SI	5	Se tiene cerramiento con lona en un 80 % del perimetro.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	5	Los elementos de señalizacion cuentan con cinta reflectiva
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Se tiene señalización preventiva en toda el area y de aproximacion.
	Uso de Paleteros	X		SI	6	Permanecen dos conttolasdores viales

438

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Iluminación Nocturna		X	SI	3	Cuenta con Iluminacion nocturna
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	40	
				PROMEDIO	5	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	1	No se ha capcitado personal
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	Se ha entregado elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	Se cuenta con plan aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se ha dispuesto oficina para ello
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con oficina en campamento
	Socializaciones	X		SI	6	Se ha realizaod socializacion del proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	29	
				PROMEDIO	4,8333	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se ha capacitado el operador
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimeintos preventivos a la maquinaria
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	se han definidio los horarios
	Ficha de control de actividades	X		SI	4	Se lleva el control de actividades
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	La maquianria esta en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Se cuenta con EPP
	Extintores	X		SI	6	Se tiene dispobildiad de extintores
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	No se ha programado medidas
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	43	
				PROMEDIO	5,375	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	SI	1	Ni se ha capacitado personal
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimeinto de volquetas y excavadora
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	3	Se han definido horarios de cargue
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No se cuenta con fichas
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	Se cuenta con equipos en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con elementos
	Extintores	X		SI	6	Se cuenta con extintores

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No se ha entregado
	Volumen de material (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
	Volumen de excavación (m3)	X		SI	5	Se ha cuentificado material
	Volumen de demolición (m3)		X	SI	0	No se ha realizado demolicion
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	41	
				PROMEDIO	**3,42**	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	NO SE HA REALIZADO ENTREGA	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	NO SE HA REALIZAOD ENTREGA	

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	0	No se ha presentado
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se cuenta con elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4	Se cuenta con manual aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se cuenta en oficina con espacio para la comunidad
	Programa de información a la comunidad	X		SI	6	Se cuenta con constante coomunicacion
	Socializaciones	X		SI	6	Se han realizado socialziaciones
	Arboles talados		X	N/A	0	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	**3,714**	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	30,65	56,8	**Aceptable**

OBSERVACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO DURANTE EL RPESENTE PERIODO LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A REALIZAR, HA IMPLEMENTADO CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS REALIZADAS

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA

440

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/09/2024 a 30/09/2024

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2235 Hasta el 10 de octubre de 2024	En ejecución	Se radico solicitud de proroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Pendiente de entrega de autorización del privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descapote, en un predio privado el cual cuenta con autorización.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO	Concesión minera No 19099 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030, Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030		Se ha aportado documentacion de la mina que suministrara material granular
Permiso de cierres temporales de vías	NO		No se han realizado cierres viales	No se ha ejecutado obras que requieran cierres viales
Pago de tasas y/o regalías	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	65%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Pla ambiental General Ajustado presentado y avalado por interventoria
Manejo integral de residuos sólidos	SI	0%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos
Manejo integral de materiales de construcción	SI	15%	Los materiales de construcción (aceros) se le dado manejo adecuado según PMA.
Explotación fuentes de materiales	SI	10%	No se ha suministrado material ni explotación de estos para la ejecución de la obra
Manejo integral de aguas y residuos liquidos	SI	15%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos y se ha dado un manejo adecuado a las aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión ni afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El lugar de acopio de material es ubicado en un predio privado en cercania con la ejecución del proyecto
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	N/A	0%	El contrato no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se compara a proveedores autorizados por la corporación ambiental
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	100%	El manejo y control de los equipos y vehículos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación a la vegetación de la zona
Manejo de fauna	SI	0%	No s e ha presentado afectación a la fauna de la zona
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garanticen la protección de fauna
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto
Plan de Gestión Social	SI	80%	Se ha implementa el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento enviado.
Otros	SI	100%	Se ha cumplido lo establecido en el PMA

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

441

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/09/2024 a 30/09/2024

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A
Localización:	N/A
No. de individuos sembrados	N/A
Estado fitosanitario de los individuos	N/A
	N/A
Área empradizada (m^2)	N/A

Observaciones: No es requerido la restauracion de atreas intervenidas, sin embargo se evaluara el impacto durante la ejeuccion de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperacion si existe afectacion.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO				Observaciones
	Aplica	unidad	Localización	Periodo	
Tala	NO				
Poda	NO				
Otro, cual?	N.A				

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Material	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
Sobrante de excavación	144	Finca los cerezos

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	NO			

INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	NO
Nombre	NO
Tipo de Intervención:	NO
Medidas para su recuperación:	NO

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE

RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

¿Cuales?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACION DE CAUCE

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

442

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO DE INSPECCIÓN:	01/09/2024 a 30/09/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA				
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	2	No s eha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	2	No se ha dado cumplimiento
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	4	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	5	Se cumple almacenaminto lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	5	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
				SUMATORIA	39	
				PROMEDIO	3,9	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	SI	3	No se ha capacitado el personal
	Manejo Escorrentía		X	NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	SI	3	No se ha implementado la proteccion por sustancias
	Medidas de contingencia		X	SI	4	No se ha realziado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	3	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático		X	SI	5	No se ha manejado
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
				SUMATORIA	18	
				PROMEDIO	2,3	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESOLUCIONES		NUMERO	VIGENCIA
CONCESIÓN DE AGUAS		N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCE	Permiso ocupación de cauce Del caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga· de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del· municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Capacitación Personal		X	SI	3	No se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	2	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	5	Se protejen con plasticos los aceros acopiados

443

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

[redacted]ATMOSFERICO Y [redacted]ONTROL DE RUIDO	Uso de mallas protectoras		X	SI	5	No se ha implementado
	No exceder volúmenes del volcó de los camiones	X		SI	0	No se ha trasnsportado material
	Olores desagradables	X		SI	5	no se ha presentado
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5	Se ha contado con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La mquianaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo		X	SI	4	Se tiene definidios horarios
	Medidas de Contingencia		X	SI	4	No se ha capacitado personal, ni se ha informado el plan
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	38	
				PROMEDIO	3,45	

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	5	No se ha iniciado ejecucion fisica de obra
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	5	Se cuenta con bodega retirada del cualquier posible afectacion
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	6	Cuenta con cercania a la obra toiene deficiente señalizacion
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Cuenta con elementos de seguridad y atencion
	Obras de contención		X	N/A	0	No es requerido para el proyecto
	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	4,33	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5	Se han dado capacitaciones y charlas
	Demarcación del perimetro	X		SI	6	Se tiene cerramiento y aislamiento del area de trabajo.
	Zonificación de la obra	X		SI	5	Se tiene zona de operatividad y zona de administracion.
	Lona de Cerramiento	X		SI	5	Se tiene cerramiento con lona en un 80 % del perimetro.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	5	Los elementos de señalizacion cuentan con cinta reflectiva
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Se tiene señalización preventiva en toda el area y de aproximacion.
	Uso de Paleteros	X		SI	6	Permanecen dos conttolasdores viales

444

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Iluminación Nocturna		X	SI	1	No cuenta con Iluminacion nocturna
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	39	
				PROMEDIO	4,875	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	4	No se ha capcitado personal
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	Se ha entregado elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	Se cuenta con plan aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se ha dispuesto oficina para ello
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con oficina en campamento
	Socializaciones	X		SI	6	Se ha realizaod socializacion del proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5		Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	32	
				PROMEDIO	5,3333	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se ha capacitado el operador
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimeintos preventivos a la maquinaria
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	se han definidio los horarios
	Ficha de control de actividades	X		SI	3	Se lleva el control de actividades
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	La maquianria esta en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Se cuenta con EPP
	Extintores	X		SI	6	Se tiene dispobildiad de extintores
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	No se ha programado medidas
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5		Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	42	
				PROMEDIO	5,25	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	SI	3	Ni se ha capacitado personal
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	4	Se ha realzado mantenimeinto de volquetas y excavadora
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	3	Se han definido horarios de cargue
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No se cuenta con fichas
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	Se cuenta con equipos en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	5	El personal cuenta con elementos
	Extintores	X		SI	5	Se cuenta con extintores

445

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Medidas de Contingencia		X	SI	2	No se ha entregado
	Volumen de material (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
	Volumen de excavación (m3)	X		SI	5	Se ha cuentificado material
	Volumen de demolición (m3)		X	SI	2	No se ha realizado demolicion
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	3	No se ha cuantificado material
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	42	
				PROMEDIO	**3,5**	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	NO SE HA REALIZADO ENTREGA	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	NO SE HA REALIZAOD ENTREGA	

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	2	No se ha presentado
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se cuenta con elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4	Se cuenta con manual aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	3	Se cuenta en oficina con espacio para la comunidad
	Programa de información a la comunidad	X		SI	3	Se cuenta con constante coomunicacion
	Socializaciones	X		SI	6	Se han realizado socialziaciones
	Arboles talados		X	N/A	0	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	23	
				PROMEDIO	**3,285714286**	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	32,68	60,5	**Aceptable**

OBSERVACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO DURANTE EL RPESENTE PERIODO LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A REALIZAR, HA IMPLEMENTADO CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS REALIZADAS

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA

446

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO N°	929 DE 2022	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACA
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/08/2024 a 31/08/2024

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2235 Hasta el 10 de octubre de 2024	En ejecución	Se radico solicitud de proroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Pendiente de entrega de autorización del privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descapote, en un predio privado el cual cuenta con autorización
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO			No se ha radicado permisos mineros ni ambientales
Permiso de cierres temporales de vías	NO		No se han realizado cierres viales	No se ha ejecutado obras que requieran cierres viales
Pago de tasas y/o regalías	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	60%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Pla ambiental General Ajustado presentado y avalado por interventoria
Manejo integral de residuos sólidos	SI	0%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos
Manejo integral de materiales de construcción	SI	15%	Los materiales de construcción (aceros) se le dado manejo adecuado según PMA.
Explotación fuentes de materiales	SI	0%	No se ha suministrado material ni explotación de estos para la ejecución de la obra
Manejo integral de aguas y residuos liquidos	SI	0%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos y se ha dado un manejo adecuado a las aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión ni afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El lugar de acopio de material es ubicado en un predio privado en cercanía con la ejecución del proyecto
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	N/A	0%	El contrato no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se compara a proveedores autorizados por la corporación ambiental
Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos	SI	100%	El manejo y control de los equipos y vehiculos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación a la vegetación de la zona
Manejo de fauna	SI	0%	No s e ha presentado afectación a la fauna de la zona
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garanticen la protección de fauna
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto
Plan de Gestión Social	SI	80%	Se ha implementa el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento enviado.
Otros	SI	100%	Se ha cumplido lo establecido en el PMA

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A
Localización:	N/A
No. de individuos sembrados	N/A
Estado fitosanitario de los individuos	N/A
	N/A
Área empradizada (m^2)	N/A

447

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACA
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/08/2024 a 31/08/2024

Observaciones: No es requerido la restauracion de atreas intervenidas, sin embargo se evaluara el impacto durante la ejeuccion de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperacion si existe afectacion.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO				Observaciones
	Aplica	unidad	Localización	Periodo	
Tala	NO				
Poda	NO				
Otro, cual?	N.A				

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Material	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
Sobrante de excavación	144	Finca los cerezos

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	SI			

INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	NO
Nombre	NO
Tipo de Intervención:	NO
Medidas para su recuperación:	NO

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE

RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

¿Cuales?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACION DE CAUCE

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

448

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO DE INSPECCIÓN:	01/08/2024 a 31/08/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA				
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	2	No s eha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	2	No se ha dado cumplimiento
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	4	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	5	Se cumple almacenaminto lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	5	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	39	
				PROMEDIO	3,9	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	SI	3	No se ha capacitado el personal
	Manejo Escorrentía		X	NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	SI	3	No se ha implementado la proteccion por sustancias
	Medidas de contingencia		X	SI	4	No se ha realziado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	3	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático		X	SI	5	No se ha manejado
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	18	
				PROMEDIO	2,3	

RESOLUCIONES		NUMERO	VIGENCIA
CONCESIÓN DE AGUAS		N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCE	Permiso ocupación de cauce Del caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Capacitación Personal		X	SI	3	No se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	2	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales		X	SI	4	No haymaterial acopiado

449

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

[redacted]ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Uso de mallas protectoras		X	SI	5	No se ha implementado
	No exceder volúmenes del volcó de los camiones	X		SI	0	No se ha trasnsportado material
	Olores desagradables	X		SI	5	no se ha presentado
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5	Se ha contado con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La mquianaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo		X	SI	4	Se tiene definidios horarios
	Medidas de Contingencia		X	SI	4	No se ha capacitado personal, ni se ha informado el plan
				SUMATORIA	37	
				PROMEDIO	3,36	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	5	No se ha iniciado ejecucion fisica de obra
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	5	Se cuenta con bodega retirada del cualquier posible afectacion
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	6	Cuenta con cercania a la obra toiene deficiente señalizacion
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Cuenta con elementos de seguridad y atencion
	Obras de contención		X	N/A	0	No es requerido para el proyecto
	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
				SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	4,33	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal		X	SI	5	No se ha iniciado ejecución fisica de la obra
	Demarcación del perímetro		X	SI	6	No se ha demarcado el perimetro de la obra
	Zonificación de la obra		X	SI	4	No se ha iniciado ejecución ni se ha vinculado personal
	Lona de Cerramiento		X	SI	5	No se ha delimitado la zona de trabajo
	Cinta de Reflectiva		X	SI	5	No se ha instalado cinta
	Señales Informativas y preventivas		X	SI	6	No cuenta con señales preventivas
	Uso de Paleteros		X	SI	6	No cuenta con conttolasdores viales

450
