Continuación Informe Interventoría Nº 1 Etapa Nº 2

		
		
Reapracion estructura cubierta polideportivo	Reapracion estructura cubierta polideportivo	Reapracion estructura cubierta polideportivo
		
Reapracion estructura cubierta polideportivo	Reapracion estructura cubierta polideportivo	Reapracion estructura cubierta polideportivo
		
Reapracion estructura cubierta polideportivo	Reapracion estructura cubierta polideportivo	Reapracion estructura cubierta polideportivo

4. INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL



AVANCE DE LA OBRA

		
Demolición Anden	Demolición Anden	Demolición Anden
		
Desmonte de Cielo Raso	Desmonte de Cielo Raso	Desmonte de Cielo Raso

		
Demolición Pañete	Desmonte de Puertas y Marcos	Desmonte de Cielo raso
		
Demolición Anden	Demolición Pañete	Demolición Pañete
		
Demolición Pañete	Excavación Viga cimiento anden	Demolición Piso
		
Acero y Solado viga anden	Sobrecimiento anden	Sobrecimiento anden

		
Sobrecimiento anden	Malla electrosoldada anden	Plantilla en Concreto anden
		
Malla Electrosoldada, para plantilla	Plantilla en Concfeto Area Administrativa	Plantilla en Concfeto Area Administrativa
		
Levante de Muro	Pañete en muro	Instalaciones Eléctricas
		
Instalaciones Eléctricas	Instalación Cubierta Área Administrativa	Instalación Cubierta Área Administrativa

		
Levante yViga Superior Area Administrativa	Levante yViga Superior Area Administrativa	Levante yViga Superior Area Administrativa

5. INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES - SEDE COL. MPAL DE BTO. DE LOS GARZONES

PATIO INTERNO EN TIERRA (parqueadero)








TRAMOS PARA CONSTRUCCION DE MUROS





6. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA, SEDE I.E. LA PRADERA

CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE COLISEO



7. INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO - SEDE RURAL MIXTA EL CONGO

AREA DE LOTE DISPONIBLE PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS



El día 08 de noviembre entrego en curaduría urbana primera de Montería la documentación del frente I.E EL CONGO; se recibe el link de pago para iniciar las revisiones de los diseños propuestos entregados y se deja radicado formalmente el día 23 de noviembre. (Radicado No 23001-1-23-0228).

8. NSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL - SEDE RURAL MIXTA LA FLORIDA

VISTAS EXTERNAS DE AULAS EXISTENTES PARA ADECUACION DE COCINA Y COMEDOR





AREA PARA PROYECCION COCINA





AREA PARA PROYECCION COMEDOR







INTERVENICONES

		
Area para proyecto de cocina Comedor	Levante de Muro - Cocina Comedor	Levante de Muro - Cocina Comedor

		
Area para proyecto de cocina Comedor	Levante de Muro - Cocina Comedor	Levante de Muro - Cocina Comedor
		
Viga para Andenes	Material compactado Anden	Viga para Andenes
		
Anden en Concreto	Instalaciones hidrosanitarias	Instalaciones hidrosanitarias


9. INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO

VISTAS EXTERNAS AULAS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO

Aula 1

MURO CERRAMIENTO

CUBIERTA POLIDEPORTIVO/ COLISEO





BATERIA SANITARIA









INTERVENCIONES



Excavación para Vigas Y Zapatas



Excavación para Vigas Y Zapatas



Excavación para Vigas Y Zapatas


		
Acero para Vigas, Zapatas y Columnas	Acero para Vigas, Zapatas y Columnas	Acero para Vigas, Zapatas y Columnas
		
Cocreto para Vigas y Zapatas	Concreto para Columnas	Concreto para Columnas


10- INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL

VISTAS DE PATIO LATERAL AL AIRE LIBRE

PROPUESTA DE DISEÑO





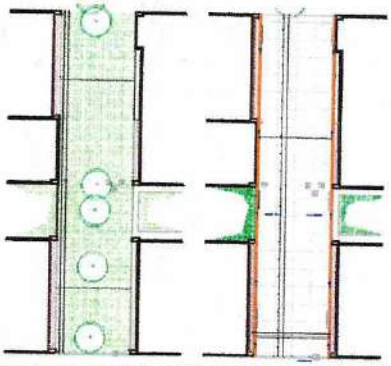DIEÑO DE LOSA CONTRAPIDO Y CUNETAS LATERALES


		
Adecuación Terreno	Adecuación Terreno	Adecuación Terreno
		
Relleno con material seleccionado	Relleno con material seleccionado	Compactación de terreno
		
Compactación de terreno y toma de muestra de densidades	Instalación Malla Electrosoldada	Instalación Malla Electrosoldada

		
Placa de contrapiso en concreto	Placa de contrapiso en concreto	Placa de contrapiso en concreto
		
Placa de contrapiso en concreto	Placa de contrapiso en concreto	Acero para Vida
		
Cuneta de Desagüe	Cuneta de Desagüe	Placa de contrapiso en concreto

11. INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HORIZONTE

COCINA COMEDOR EXISTENTE

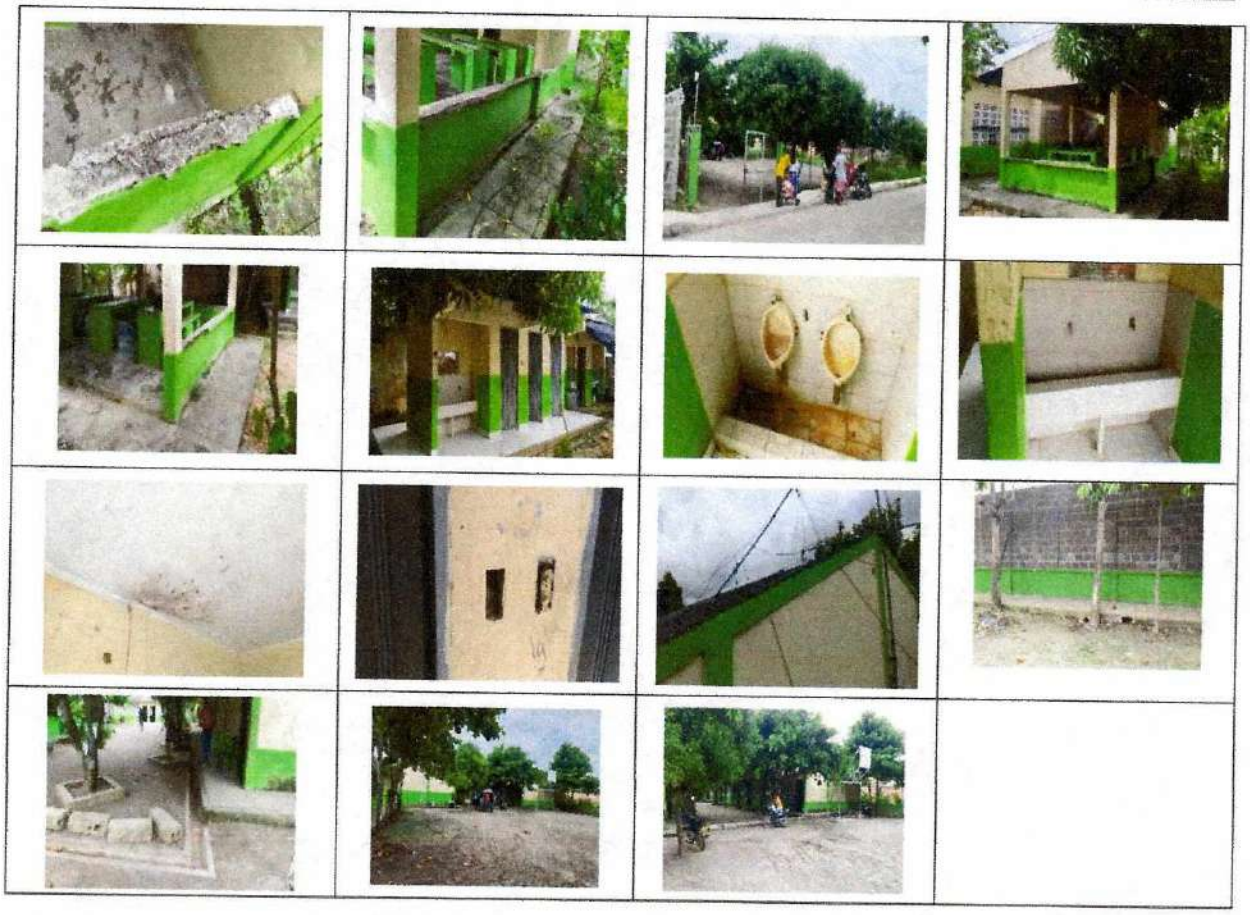

INTERVENCION




Concreto de Viga




Concreto Viga Cimiento

12. INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO- SEDE LOS PERICOS

COCINA COMEDOR EXISTENTE

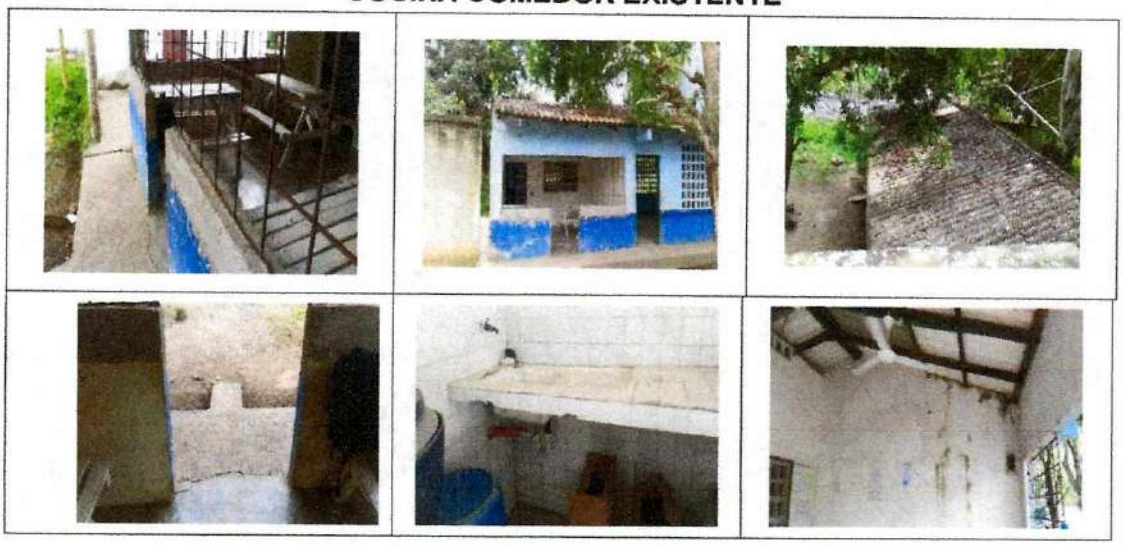


SALA DE INFORMATICA (PISO 1)




BLOQUE DE AULAS VARIAS (PISO 1 Y PISO 2)



SALA DE PROFESORES






BATERIA SANITARIA




INTERVENCIONES

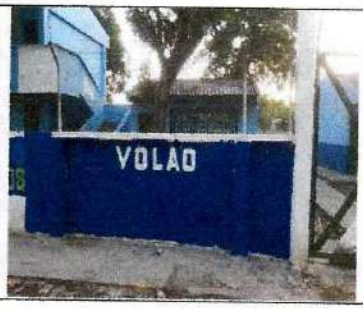
		
Reparacion Perfiles de cuebierta	Pintura estructura Cuebierta	Pintura de puertas
		
Pintura Cerramiento	Pintura Cerramiento y muros	Pintura Cerramiento

		
Pintura en Muros Exteriores	Pintura en Muros Exteriores	Pintura en Muros Exteriores

13. INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON- SEDE ESCUELA URBANA MIXTA GABRIELA MISTRAL

AREAS INTERIORIORES DE LA INSTITUCION

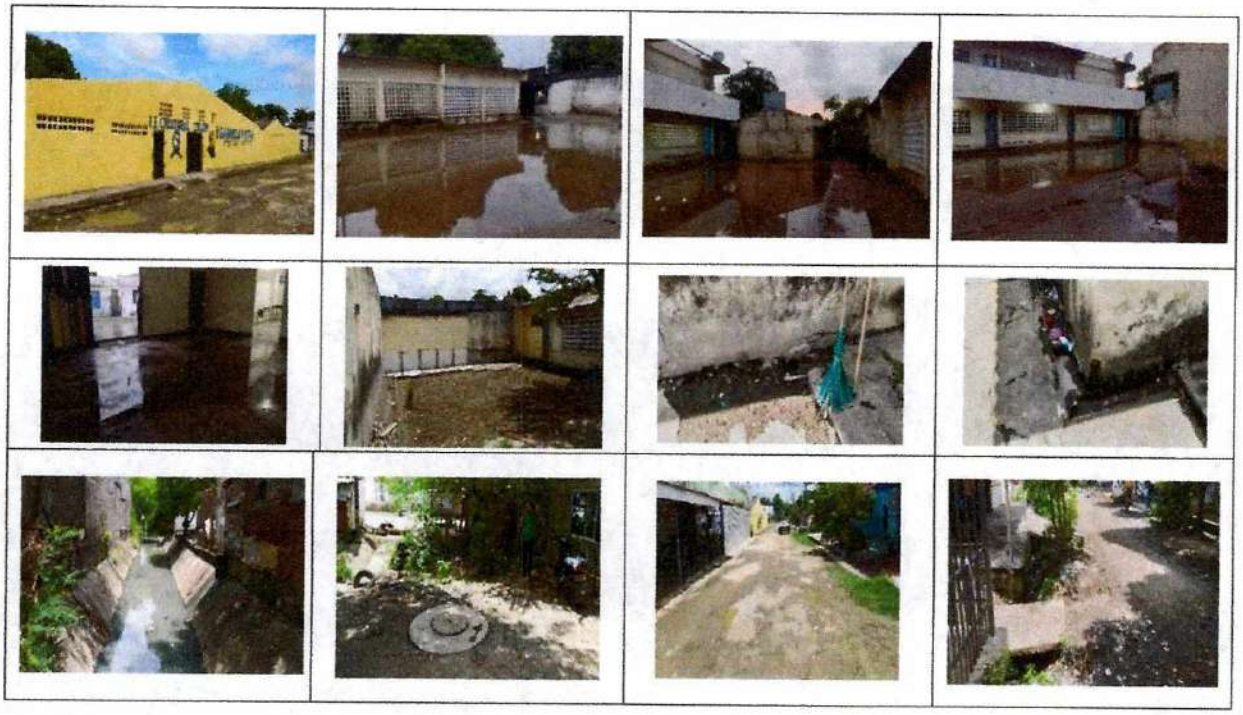

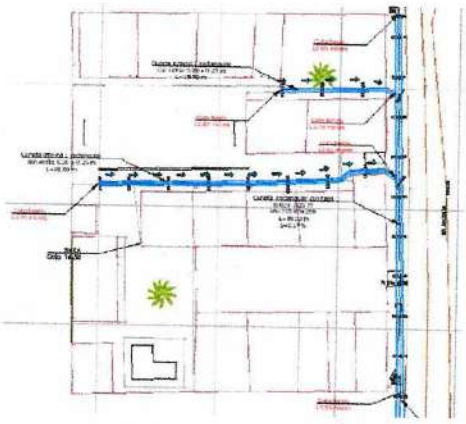

14. INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL- SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO

SALA DE INFORMATICA



OTRAS AREAS DE AUAS DE LA INSTITUCION



AVANCE DE OBRA

		
Desmonte de Cielo raso	Desmonte de Cielo raso	Remoción de pintura

		
Remoción de pintura	Remoción de pintura	Pintura en muros
		
Pinturas exteriores	Pinturas exteriores	Instalación perfiles
		
Remoción de pintura	Remoción de pintura	Pinturas exteriores
		
Pinturas exteriores	Pinturas exteriores	Pinturas exteriores
		
Pinturas exteriores	Pinturas exteriores	Pinturas exteriores

15. INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE- SEDE INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE

AREA DE LABORATORIO



AREA DE BIBLIOTECA CONTIGUA



AREA ADMINISTRACION



AVANCE DE OBRA

		
Remoción de pintura	Desmonte de cielo raso y cubierta área Laboratorio	Desmonte de cielo raso y cubierta laboratorio
		
Lavado de muros	Desmonte de cielo raso y cubierta área biblioteca	Desmonte de cielo raso y cubierta área biblioteca
		
Estructura Cubierta	Estructura Cubierta	Estructura Cubierta

		
Estructura Cubierta	Instalación cubierta	Instalación cubierta
		
Remoción de Pintura	Remoción de pañete	Remoción de pañete
		
Reparación Cubierta	Reparación Cubierta	Pañete en Muros
		
Instalaciones eléctricas	Protectores	Pintura en muros

16. INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO- SEDE INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO

COLISEO POLIDEPORTIVO (CUBIERTA Y PISO CANCHA)






DRENAJES






MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL








AVANCE DE OBRA

		
Demolición Muro de cerramiento	Demolición Muro de cerramiento	Demolición Muro de cerramiento
		
Levante Muro de Cerramiento	Sobrecimiento para placa de contrapiso polideportivo	Sobrecimiento para placa de contrapiso polideportivo
		
Viga Superior Muro de Cerramiento	Viga Superior Muro de Cerramiento	Viga Superior Muro de Cerramiento

		
Pañete Muro de Cerramiento	Pañete Muro de Cerramiento	Relleno con Material Seleccionado
		
Compactación Terreno	Compactación Terreno	Compactación Terreno
		
Compactación Terreno	Compactación Terreno	Malla Electrosoldada
		
Malla Electrosoldada y Concreto	Placa de Contrapiso Polideportivo	Placa de Contrapiso Polideportivo

		
Malla electrosoldada	Placa de Contrapiso Polideportivo	Placa de Contrapiso Polideportivo

7. REVISIONES AL PLAN DE CALIDAD

El contratista de Obras realizó la entrega del informe de implementación de calidad del presente periodo.

7.1 PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Para este periodo, se realizan los laboratorios de suelos y concretos en las instituciones que lo requieran. Se anexan

FORMATO DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de corte del presente Informe el contratista de Obras presento a la Interventoría la programación de obras inicial.
De acuerdo a lo anterior se evidencia un 20.23% de avance.

	CONTRATO DE OBRA DE OBRA LP-SIM-012-20232		
	ETAPA N°2		
ITEM	PROGRAMADO	EJECUTADO	E/P
PERIODO 1: 17 OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	19.70%.	39.93%,	20.23%

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

8. AVANCE FINANCIERO VS AVANCE PROGRAMADO


Avance financiero en el periodo (Flujo programado vs flujo ejecutado), el cual consiste en comparar y determinar cuál es el comportamiento del flujo de caja, según la programación de obras N°1 presentada, a esta Interventoría, contra el flujo real de caja en obra, según cantidades ejecutadas por el contratista por periodo, que para este informe es: mes a mes.


8.1 AVANCE MENSUAL

A la fecha del periodo 01 del informe de Interventoría y según la programación N°1, el contratista CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 ejecuto actividades para la etapa N°2 -Obra por un valor de $1.077.373.845. M/CTE. COL, en cuya programación de obra y flujo financiero corresponde a un avance del 39.93% vs un flujo financiero programado de $ 531.616.668 correspondiente al 19.70%, presentando un 20.23% de avance con respecto a lo programado.

AVANCE MENSUAL ACUMULADO

La programación y la ejecución financiera del periodo se muestran en los gráficos a continuación:

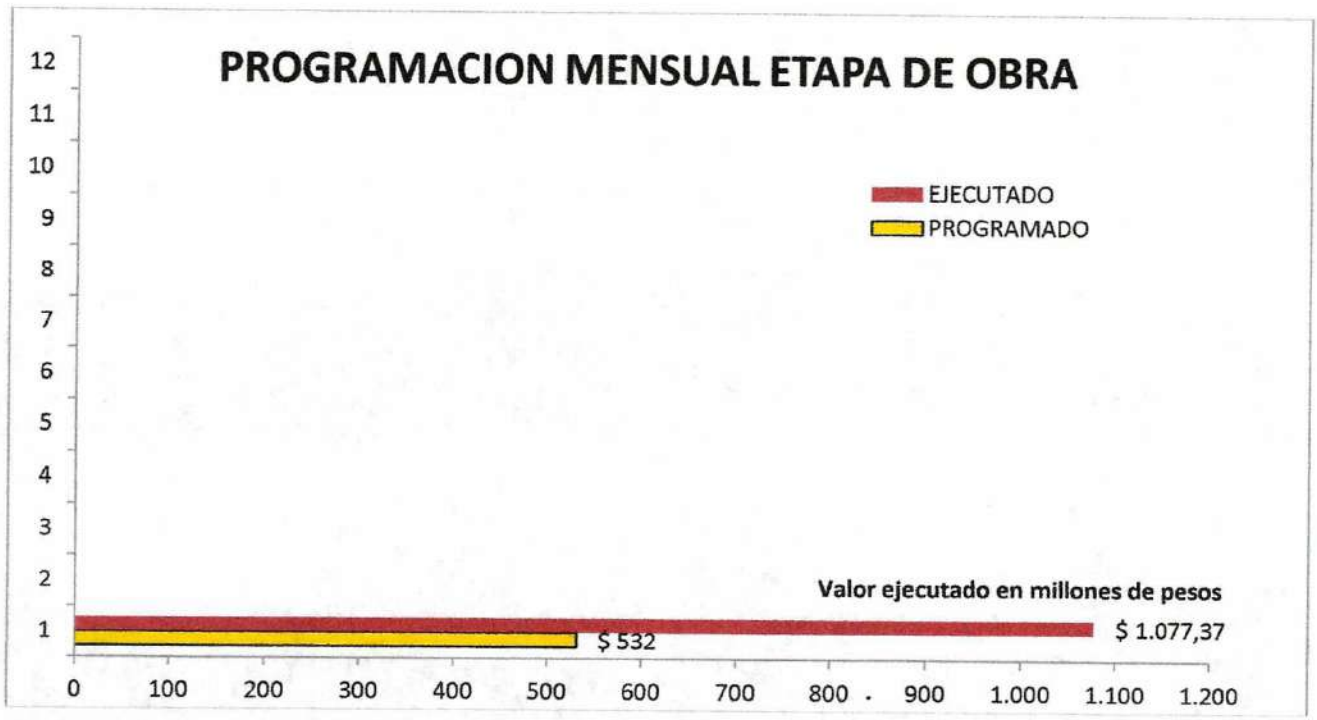

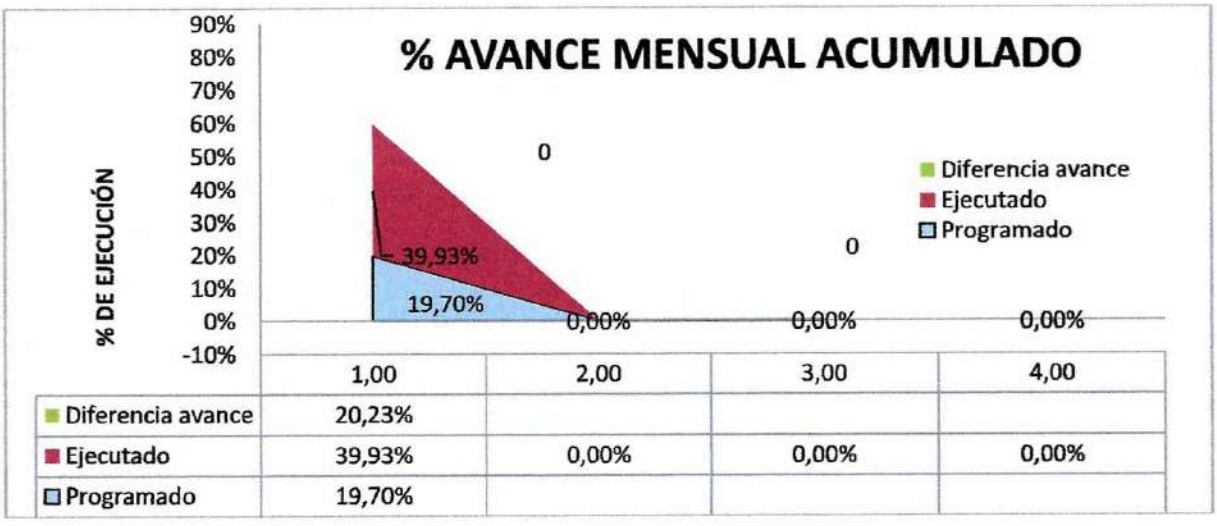

	1,00	2,00	3,00	4,00
Diferencia avance	20,23%			
Ejecutado	39,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Programado	19,70%			

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. A la fecha del periodo 01 del informe de Interventoría y según la programación N°1, el contratista CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 ejecuto actividades para la etapa N°2 -Obra por un valor de $1.077.373.845. M/CTE. COL, en cuya programación de obra y flujo financiero corresponde a un avance del 39.93% vs un flujo financiero programado de $ 531.616.668,45 correspondiente al 19.70%, presentando un 20.23% de avance con respecto a lo programado, informacion arrojada del informe semanal N°4, del 6 de noviembre al 12 de noviembre de 2023.

2. Teniendo en cuenta que este informe va comprendido entre el 17 de octubre al 16 de noviembre de 2023, se presenta un porcentaje aproximado correspondiente a los dias del 13 al 16 de nviembre de 2023 con el fin de llevar el seguimiento respectivo con la programacion de obra. Porcentaje de avance 53.39% y porcentaje programado 31.75%



3. Teniendo en cuenta que la programacion de obras entregada por el contratista establece el inicio de contstruccion de obras nuevas (I.E Maria Goretty-I.E El Congo),para el 15 de noviembre de 2023 y que a la fecha aun se encuentra en tramite ante la curaduria urbana los tramites para expedicion de las licencias de construccion, el contratista presentara de

manera formal a la interventoria la solicitud para suspender el contrato de obras de tal forma que pueda cumplirse a cabalidad el objeto contractual dentro del plazo establecido.

4. El contratista de obras ejecutó la primera Fase del contrato de obra LP-SIM-012-2023 en un 100%. Este informe contempla el desarrollo de la etapa de estudios y diseños de 16 instituciones educativas, de las cuales dos 2 hacen tienen prevista la construcción de obra nueva, construcción de aulas escolares.

5. Como se pudo observar en las actas de los comités de obras quedan plasmados los compromisos adquiridos y que fueron cumplidos por el contratista, sin embargo, en virtud de nuestras funciones como Interventoría, mantendremos una constante intervención preventiva y correctiva, si es el caso, con el fin de garantizar una correcta y adecuada ejecución de la obra encomendada.

6. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato de obras N° LP-SIM-012-2023 : DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, abarca la intervención 16 instituciones para dar cumplimiento a su alcance, luego de la realizacion de los Estudios y Diseños, se evidencia que los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la Institución educativa el Congo no son suficientes con los recursos dispuestos dentro del valor contractual, por tal razón el contratista solicita las directrices a la entidad contratante en cuanto a la intervención de esta Institución. Asi mismo solicita a la interventoría, realizar conjuntamente un balance de obras con el fin de llevar a cero los recursos estipulados para la institución del Congo con el fin de brindar un uso complementario según las necesidades solicitadas, y propone abrir un contrato a parte para la intervención de la institución, para la cual los productos entregados en la Etapa N°1 de estudios y diseños, quedan como soporte y base.

Así mismo el contratista solicita sea estudiada la solicitud presentada, para así tener claro el alcance total del proyecto.

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
REPRESENTANTE LEGAL
BUSERCO S.A.S

ANEXOS

1.CONTRATOS

1.1 CONTRATO DE OBRA

Alcaldía de Montería

CONTRATO DE OBRA N° LP-SIM-012-2023

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MONTERÍA.**
CONTRATISTA	**CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023** identificado con NIT: 901752045-6, conformado por 4 TOWERS S.A.S. con un porcentaje de participación del 10%, y DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS con un porcentaje de participación del 90%.
REPRESENTANTE LEGAL	**DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS** identificado con C.C. N° 72.236.745 de Barranquilla.
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($2.847.134.379) M/CTE.
PLAZO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes consideraciones y cláusulas que conforman el Contrato:

CONSIDERACIÓN PRIMERA: Que el MUNICIPIO realizó de conformidad con la Ley, especialmente el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos necesarios para la determinación de la necesidad, la consecuente realización del proceso de selección y la suscripción presente contrato **CONSIDERACIÓN SEGUNDA:** Que el presente contrato se celebra en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Adjudicación No. 682 de 8 de septiembre de 2023, proferida en desarrollo del proceso de selección de contratista bajo la modalidad de Licitación Pública No LP-SIM-012-2023, publicada en la página web. www.contratos.gov.co, Portal Único de Contratación. **CONSIDERACIÓN TERCERA:** Que el contratista seleccionado acreditó poseer la capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia necesaria para ejecutar el objeto contractual y el valor de su oferta no superó el presupuesto oficial. **CONSIDERACIÓN CUARTA:** Que existe dentro del presupuesto de la entidad la disponibilidad presupuestal necesaria para la presente contratación. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se celebra el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA– OBJETO**: El objeto del contrato que se celebra es "ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA". **PARÁGRAFO:** El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con el estudio previo, las fichas técnicas, la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA – VALOR**: El valor de este contrato es la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($2.847.134.379) M/CTE**, los cuales se cancelarán con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 23000977 del 27 de abril de 2023, por valor de ($2.847.134.381,00) M/CTE, expedido por el Jefe de Presupuesto Municipal. **RUBROS QUE COMPONEN ESTA CONTRATACIÓN:** El rubro que compone la presente contratación es el siguiente:

Alcaldía de Montería

MONTERÍA
Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	23001171
CDP No.	23000977
jueves 27 abril 2023	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor C.D.P.	Valor Disponible.
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios Educativos	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2201052	2201	$ 2.847.134.381,00	$ 2.847.134.381,00
				Totales...	$ 2.847.134.381,00	$ 2.847.134.381,00

Total CDP en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y UNO Pesos

El certificado No. 23000977 se emite en Monteria el dia jueves 27 de abril de 2023 como requisito previo a ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Badoya
Profesional Universitario

CLAUSULA TERCERA - El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagará así:

1.- ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, El valor de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($148.977.992,00), correspondientes a la etapa I, Estudios y Diseños, será pagada una vez culminada esta etapa, previo certificado expedido por el interventor y el MUNICIPIO DE MONTERÍA.

2.- ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El valor previsto para esta etapa, es decir la suma de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 2.698.156.387,00 00) se desembolsará de la siguiente manera:

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA CUARTA – PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO: VIGENCIA**: Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. **CLAUSULA QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: **I. GENERALES:** 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 16. Cumplir e implementar los protocolos de bioseguridad.

II. ESPECÍFICAS: El oferente deberá realizar las actividades que a continuación se detallan:

ALCANCE DEL PROYECTO:

El proyecto contempla dos fases: Una de estudios y diseños y otra de construcción de las obras resultantes de los estudios y diseños.

Las actividades a realizar son las que a continuación se detallan:

2.1. FASE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Plazo UN (1) mes.

- Suscribir Acta de Inicio y Ejecución de Estudios Técnicos y Diseños.
- La etapa de estudios y diseños finaliza una vez el Contratista haya hecho entrega de los mismos, y en este orden, se procede a los tramites ante curaduría municipal, para la obtención de la Licencia Urbanística de Construcción de las sedes que lo requieran.
- Si como resultado de los estudios y diseños, existe la necesidad de Licencia de Construcción, esta será tramitada y gestionada por el constructor, y el valor de dicha

licencia será cancelada por el municipio de los recursos pertenecientes a la etapa 2 Ejecución de la obra.

- Es importante anotar que, la aprobación de los estudios y diseños entregados por el Contratista, deberán estar avalados tanto por el Interventor del Contrato como por la Administración Municipal – Secretaría de Infraestructura, quedando constancia de ello en Acta de recibo de estudios y diseños.

El Alcance y entregables por parte del contratista en la Etapa de los Estudios y Diseños Técnicos son como mínimo los siguientes:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

Se debe elaborar el levantamiento topográfico detallado del predio en donde se desarrollarán las obras de construcción de las edificaciones proyectadas según se indica a continuación:

- Levantamiento altimétrico: el contratista calculará curvas de nivel en caso de terreno con pendientes.
- El plano topográfico contará con el Cuadro de áreas, respectivo.
- En la memoria topográfica se deben anexar las carteras topográficas de campo, cálculos de coordenadas georreferenciadas.
- El Contratista deberá anexar a su informe copia del plano donde se determine el límite del polígono del proyecto.
- Cálculo de áreas verdes y su localización y levantamiento de los árboles existentes.
- Levantamiento de los postes de energía eléctrica si los hay;
- Levantamiento de las redes internas de alcantarillado, punto de conexión de la red de alcantarillado interna al sistema de alcantarillado o de no existir alcantarillado localización de pozos sépticos.
- Redes internas de agua potable y punto de conexión del servicio de acueducto o del sistema de abastecimiento de agua potable en caso de no existir acueducto.

ESTUDIO DE SUELOS

El contratista deberá realizar el estudio de suelos para el proyecto, para investigar y definir las propiedades geo mecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, evaluar el estado de interacción suelo-estructura y entregar las recomendaciones para su cimentación. El Contratista deberá realizar sondeos, pruebas de campo y laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones.

El estudio de suelos debe comprender:

- Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
- Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseño estructural para el proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.
- El trabajo de campo, previa consulta y aprobación del Municipio, debe comprender como mínimo perforaciones mecánicas, en número y profundidad adecuada que permita conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura.
- Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas y/o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse pruebas de campo, para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada.
- Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio

- El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, pero no limitarse, a los siguientes ensayos:
- Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico de sólidos.
- Comprensión inconfinada.
- Prueba de compresibilidad: Consolidación
- Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.
- El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y diseño necesarios que permitan garantizar la estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos.
- Con los resultados del estudio de suelos, se suministrará la información necesaria para el desarrollo de los diseños técnicos.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

El diseño arquitectónico, deberá respetar la descripción espacial de los ambientes y las recomendaciones mínimas de construcción (especificaciones técnicas), el contratista a partir de dicha información, debe realizar los diseños arquitectónicos, su implantación en el espacio destinado para la ejecución del proyecto y los diseños urbanísticos al interior del mismo.
El desarrollo del diseño del proyecto, deberá obedecer a procedimientos de diseño estandarizados basados en estimación de parámetros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente (NTC 4595 y demás normas complementarias). No se aceptarán diseños no argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente. La Formulación del diseño arquitectónico del proyecto, contemplará como mínimo el siguiente programa de actividades:

- Definición de la implantación arquitectónica en el lote.
- Determinación de la estructura de circulaciones.
- Definición de los accesos.
- Definición a nivel de detalles de las principales zonas del proyecto.
- Elaboración de los planos arquitectónicos y de detalles como puertas, ventanas, enchapes, pisos, pintura, cubiertas, barandas, cerramientos, cocinas, closets, entrepaños, etc, de acuerdo con en el programa arquitectónico y la descripción espacial de los ambientes.
- Cuantificación de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren para la construcción del proyecto. Se debe adjuntar memorias de cálculo.
- Elaboración de especificaciones técnicas.

ENTREGA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Planos y detalles constructivos:

- El Contratista deberá entregar el juego de planos el cual deberá contener cuadro de áreas, las plantas, cortes y fachadas necesarias y suficientes para una debida comprensión y construcción del proyecto según lo requerido por curaduría municipal.
- El Contratista deberá entregar como mínimo los siguientes productos adicionales:
  - Detalles constructivos necesarios para la ejecución de las obras, a escalas indicadas que definan dimensiones, localización, especificaciones de materiales y demás información requerida para la construcción de las obras. Estos detalles deben incluir planos de puertas, ventanas, enchapes, pisos, pintura, cubiertas, cerramiento, barandas, closets, entrepaños, cocina, etc.
  - Elaboración de tres perspectivas desde tres diferentes ángulos del proyecto en las cuales se puedan detallar aspectos importantes del diseño. Estas perspectivas deben ser elaboradas en método de tres dimensiones digital (3D studio, Acad, archicad, etc.) o renders.

ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES

Con base en el estudio de suelos, el levantamiento topográfico, el diseño arquitectónico, la implantación del proyecto y la información recopilada y analizada, el Contratista deberá desarrollar el análisis estructural de las edificaciones proyectadas, así como de todos los elementos portantes y no portantes con criterios de economía y estabilidad en el tiempo.

- En consecuencia, los estudios y diseños estructurales, se realizarán acatando la Norma Sismo Resistente del 2010 (NSR-2010), los Decretos de Microzonificación Sísmica del Municipio (Si los hay) y demás normas complementarias vigentes.
- Los diseños deben contemplar los análisis previos, las memorias de cálculo y análisis de resultados, información sobre el software utilizado, los planos de diseño para la construcción de los elementos portantes y no portantes; así mismo debe incluir las correspondientes cantidades de obra, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, listas de refuerzo y figuración y despieces de estructuras. Estos estudios y diseños se realizarán para todos los elementos que lo requieran.

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ESTRUCTURAL

Planos y detalles constructivos: El Contratista deberá entregar el juego de planos correspondiente al diseño estructural, el cual deberá contener, todas las plantas, cortes necesarios y suficientes para una debida comprensión y construcción del proyecto. El Contratista deberá entregar:

- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción y toda la información que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural.
- Cuadro resumen de cantidades de obra.
- Listas de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos.
- Carta de responsabilidad del Diseñador de las estructuras.
- La información correspondiente al Diseño Estructural debe estar firmada por el Ingeniero encargado y debe incluir número de matrícula profesional.

ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS

Comprende el estudio y diseño de las redes hidráulicas, sanitarias, de drenaje superficial y subterráneo y demás estructuras, necesarias para el óptimo suministro de agua potable; el sistema de tratamiento; la evacuación y disposición de las aguas negras y lluvias de todas las estructuras y del proyecto en general. Para la elaboración de los diseños hidráulicos y sanitarios se deberá tener en cuenta las conexiones internas, externas y las redes principales del municipio. Se deberá propender por incluir un sistema de recolección de agua a partir de las cubiertas. También se debe tramitar la aprobación del proyecto Hidrosanitario ante la Empresa de servicios públicos respectiva (en caso de ser necesario). Los diseños Hidrosanitarios incluyen los diseños de las redes de distribución de agua potable y de alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras, con sus respectivos empates (conexiones) con las tuberías existentes.

- En general se establecen como Normas de diseño las de la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, el Código Colombiano de Fontanería (NTC-1500) y la NSR-2010 de Colombia.

Además de lo anterior, el Contratista deberá:

- Entregar las memorias de cálculo de la verificación, de los sistemas de desagües de aguas negras, lluvias y drenajes, sistema de suministro de agua potable, indicando los criterios, normas y metodología de diseño seguida.
- El Contratista deberá evaluar La red y el sistema de disposición final de Aguas Lluvias y Aguas negras con que cuentan los predios y en caso de requerirse una intervención

de los mismos, presentar los diseños y recomendaciones constructivas correspondientes.
- Cuantificación de las cantidades de obra, involucrando todas las actividades que se requieren para la construcción del proyecto. Se debe adjuntar memorias de cálculo.
- Elaboración de especificaciones técnicas.
- Elaboración de los planos de diseños, de acuerdo con lo indicado en el presente capítulo.
- Tramitar la aprobación del proyecto hidráulico y sanitario ante la Empresa.
- Prestadora del servicio en caso de requerirse de acuerdo al nivel de intervención.

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN HIDROSANITARIA

Planos y detalles constructivos: El Contratista deberá entregar el juego de planos correspondiente al diseño hidrosanitario, el cual deberá contener todos los planos de redes y de detalles necesarios y suficientes para una debida comprensión y construcción del proyecto.

El Contratista deberá entregar:

- Planta general de tuberías de suministro, indicando longitudes de tramos, diámetros, especificación de materiales y demás información necesaria para la perfecta ejecución del proyecto.
- Plantas generales de tuberías de desagües de aguas negras, lluvias y drenajes, indicando longitudes de tramos, diámetros, especificación de materiales, cotas claves, pendientes, cajas y pozos de inspección, cotas de tapas y demás información necesaria para la completa información del proyecto.
- Cuadros de cantidades de obra de los elementos nuevos.
- Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.

Nota: La información contenida en los planos suministrados debe permitir la construcción del proyecto.

ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS

Con base en el levantamiento topográfico del predio, el diseño arquitectónico y de implantación y los requerimientos de uso, se deben elaborar los diseños eléctricos, electrónicos y de teléfono necesarios para la construcción del proyecto, garantizando niveles adecuados de iluminación interior y exterior.

- Todos los diseños y planos deberán ajustarse a las Normas y Reglamentos de la empresa prestadora del servicio de electricidad y teléfonos, a los diseños arquitectónicos y de implantación, al uso y características propias de la obra.

El Contratista deberá:

- Diseñar los sistemas de alumbrado exterior, acorde con las diferentes áreas.
- Seleccionar los sistemas de alumbrado y niveles de iluminación de acuerdo a las diferentes áreas y sistemas de control seleccionados.
- Diseñar los sistemas seleccionados de control del alumbrado exterior.
- Diseño y cálculo de acometidas eléctricas a equipos y tableros de distribución.
- Especificaciones del tipo de Luminarias a utilizar en el proyecto.
- Diseños de recorrido de ductería y procedimientos constructivos.
- Identificación de características físicas y técnicas de los equipos y accesorios que se conectarán a las redes proyectadas.
- Elaboración de los planos de instalaciones eléctricas (interiores y externas), detalles y otros, en formatos y escalas acordados con el Municipio.
- Elaborar los planos en plantas y detalles de ubicación de salidas, trayectorias de tuberías, ductos, calibres y números de conductores, esquemas de acometidas

eléctricas a los diferentes sub-tableros y a los demás sistemas, cuartos de circuitos, detalles de tableros especiales, gabinetes, cajas, cámaras subterráneas.

- Elaborar planos con detalles y dimensiones de equipos, tableros de distribución, gabinetes para sistemas de cableado, y soportes para redes de distribución, sistemas de soportes de tuberías, cajas de paso y empalmes y sistemas de malla a tierra.
- Elaborar las especificaciones detalladas de materiales a utilizar, así como la descripción de las técnicas para la construcción de los Proyectos relacionados.
- Elaborar las memorias de cálculos eléctricos para determinar calibres de conductores, protecciones, caída de voltaje para cada circuito, factor de potencia y su cálculo para corrección, potencia de transformador, capacidades de corto circuito, selectividad y coordinación de protecciones.
- Elaborar cantidades detalladas de obra para el proyecto eléctrico, de acuerdo a los diferentes capítulos y etapas constructivas en que se divida el mismo.
- Elaborar el Presupuesto del proyecto eléctrico de acuerdo a las cantidades de obra y a las especificaciones técnicas.
- Todos los planos deberán ajustarse a las Normas y Reglamentos de la Norma ICONTEC 2050, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, el código eléctrico internacional, los diseños arquitectónicos y a las características propias de las obras.
- El diseño deberá contemplar todos los elementos que requiere un proyecto de este tipo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales que rigen al respecto.
- Tramitar la aprobación del proyecto Eléctrico ante la Empresa prestadora del servicio en caso de requerirse de acuerdo al nivel de intervención.
- Elaborar los diseños del sistema de voz y datos
- Elaborar los diseños del sistema pararrayos, en caso de ser requerido.

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Planos y detalles constructivos: El Contratista deberá entregar el juego de planos correspondiente al diseño eléctrico y de teléfonos, el cual deberá contener, todos los planos de redes, de diagrama unifilar y de detalles necesarios y suficientes para una debida comprensión y construcción del proyecto.

El Contratista deberá entregar como mínimo:

- Plantas generales con indicación de las redes públicas y los puntos de acometidas, eléctricas y telefónicas.
- Plantas de ducterías y cajas para todos los sistemas, indicando trayectorias, diámetros de ductos, calibre y número de conductores, luminarias, tomas, interruptores, etc.
- Plantas generales de tuberías, indicando longitudes de tramos, diámetros, materiales, cotas, cajas de empalmes, cámaras subterráneas, cotas de tapas y demás información necesaria para ejecución del proyecto.
- Planos de localización de equipos eléctricos, tableros de distribución, gabinetes para sistemas de cableado, cajas de paso y empalme, sistemas de puesta a tierra, subestación, si se requiere, y demás elementos.
- Diagramas unifilares y tablas de cableados, especificando calibres de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto. Igualmente se deberá indicar los aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta para la supervisión de los trabajos.
- Detalles de instalación de equipos, tableros y aparatos.
- Esquemas de acometidas a los tableros.

ENTREGABLES ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

- Informe de diagnósticos con registros fotográficos y actas de asistencia de todas las sedes priorizadas;
- Informe de estudios de suelos de las sedes que lo requieran de acuerdo al diagnóstico realizado por el consultor y aprobado por la interventoría y el municipio;

- Levantamientos topográficos, arquitectónicos, eléctricos, e hidrosanitarios
- Planos de diseños arquitectónicos, eléctricos, estructural, hidrosanitarios y estructurales de las sedes que lo requieran de acuerdo al diagnóstico realizado por el consultor y aprobado por la interventoría y el municipio.
- Memoria de cantidades de obra de acuerdo con los diseños y estudios realizados;
- Análisis de precios unitarios por ítem de cada una de las sedes.
- Presupuesto de obra de cada una de las sedes
- Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las sedes
- Programación de obra
- Flujo de inversiones

2.2. FASE 2 – EJECUCIÓN DE OBRAS: Plazo: DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

Una vez se haya recibido a satisfacción por parte de la supervisión del municipio la Etapa de Estudios y Diseños, el Contratista, deberá suscribir Acta de inicio de la segunda etapa correspondiente a ejecución de obra.

RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

El Contratista conjuntamente con el Municipio procederá a recibir los predios en el que va a ejecutar las obras. De este procedimiento se deberá dejar constancia mediante acta escrita como mínimo de lo siguiente:

- Acta de socialización con la comunidad, directivas de la institución, contratista, interventoría y municipio de Montería.
- Ficha técnica del estado de las construcciones existentes - (Actas de vecindad).
- Registro fotográfico.

DEMOLICIONES

En caso que se requiera ejecutar demoliciones, para su ejecución se deberán realizar las siguientes actividades conjuntamente entre el Contratista y el municipio:

Definir el inventario de elementos a retirar, en el cual se especifique lo siguiente:

- Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se produzcan daños en las estructuras adyacentes.
- Cantidad.
- Destino o disposición final (se debe definir con el municipio la disposición de los escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello).
- Registro fotográfico del procedimiento.

Acta de Autorización de del municipio para proceder con el retiro o demolición, suscrita por las partes.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

- Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programación y dentro del plazo del contrato.
- Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables y especificaciones técnicas.
- Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecución de las obras dentro del plazo contractual.
- Entregar las edificaciones aptas para su uso, es decir, con la totalidad de conexiones a servicios públicos listas y funcionando. El Contratista deberá coordinar con el Municipio dicho trámite y realizar los pagos de las aprobaciones y las obras de conexión de servicios públicos (En caso de ser necesario).

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL

Durante la ejecución de los trabajos descritos, el contratista deberá producir informes de avance del programa de trabajo mensual o cuando así lo requiera el municipio. Se divide en dos etapas:

a. **Informes de avance de la obra: Deberá entregar 1 original en físico y digital del documento, que deberá contener lo siguiente:**

- Descripción de las actividades ejecutadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registros fotográficos del antes, durante y después.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
- Certificaciones de calidad de materiales utilizados.
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social.
- Certificado de pago de seguridad social.
- Recomendaciones generales.
- Pólizas vigentes.

b. **Informe final de la obra: Deberá entregar 1 original en físico y digital del documento FINAL, que deberá contener lo siguiente:**

- Descripción de las actividades ejecutadas.
- Planos records.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registros fotográficos del antes, durante y después.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
- Certificaciones de calidad de materiales utilizados.
- Certificados de garantías.
- Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social.
- Paz y Salvos de pagos a proveedores.
- Certificado de pago de seguridad social.
- Manual de mantenimientos y recomendaciones generales.
- Pólizas vigentes.

CLAUSULA SEXTA – OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 3 del presente Contrato. **CLAUSULA SÉPTIMA – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, con el fin de ejercer la interventoría, se contratará una persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal externa, quien desempeñará, además de las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia, las que a continuación se detallan: a) Vigilar, controlar y supervisar, la correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato y el cabal cumplimiento de su objeto. b) Impartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo. c) Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados. d) Informar oportunamente al sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA OCTAVA – GARANTÍAS: A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

Características	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.

Asegurado/ beneficiario	MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1
Amparos, vigencia y valores asegurados	<table><tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr><tr><td>**Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del Contrato</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr><tr><td>**Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr><tr><td>**Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo final.</td><td>Veinte por ciento (20%) del valor del contrato correspondiente a la etapa 2 de ejecución de la obra</td></tr><tr><td>**Calidad del servicio**</td><td>Hasta la liquidación del Contrato</td><td>10% del valor del contrato correspondiente a la etapa 1 de estudios y diseño</td></tr></table>
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. **B). GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a (2500) SMMLV e inferior a (5000) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la

Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. **CLAUSULA NOVENA – INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA - INDEMNIDAD:** El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa sus actuaciones. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA - TERMINACIÓN BILATERAL:** Las partes podrán declarar la terminación bilateral del presente contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito, por interés público o conveniencia de las partes, casos en los cuales se procederá a terminar y liquidar el contrato en el estado en que se encuentre, sin lugar a reclamaciones de perjuicios por el CONTRATISTA y renunciando éste a toda acción judicial contra. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESIONES Y SUBCONTRATOS:** Este contrato se celebra en consideración a la calidad de EL CONTRATISTA y por lo tanto El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato ni subcontratar a persona alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. EL MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA – MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente al MUNICIPIO, mediante el presente documento para efectuar la tasación y cobro, previo procedimiento contemplado para el efecto, de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato por cada día de retraso, sin exceder el 10% del valor del mismo, **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos de que EL CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL MUNICIPIO lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le adeuden los valores correspondientes a las Multas. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, MUNICIPIO previo aviso escrito y adelantado el procedimiento establecido para el efecto, podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL MUNICIPIO pueda solicitar a EL CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA autoriza que EL MUNICIPIO descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción y demás mecanismos alternativos de solución de conflictos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – CADUCIDAD:** EL MUNICIPIO, previo requerimiento por escrito AL CONTRATISTA, declarará la caducidad del presente contrato, cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa su ejecución y amenace con su paralización. Igualmente la declarará, cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligación prevista en el numeral 5° del artículo 5° de la ley 80 de 1.993, **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA DE LA REVISIÓN DE PRECIOS:** En caso de romperse la ecuación contractual por cambios o alteraciones en las condiciones iniciales del Contrato, el Municipio podrá, efectuar una revisión de precios mediante acta suscrita, en la que se incluirán cuantía y condiciones de pago acordadas. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** Este contrato quedará perfeccionado con la suscripción de las partes y requerirá para dar inicio a su ejecución de la correspondiente presentación y aprobación de las garantías, la expedición del respectivo registro presupuestal y demás requisitos exigidos por el Municipio. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA– IMPUESTOS Y PUBLICACION:** EL CONTRATISTA se obliga a pagar las estampillas y demás impuestos Municipales a que haya

lugar en virtud del presente contrato y a publicarlo en el SECOP. **CLAUSULA VIGESIMA – LIQUIDACIÓN**: El presente contrato se liquidará dentro de los términos establecidos en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. **PARAGRAFO**: Los recursos sin ejecutar serán reintegrados al Municipio. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA – ASIGNACION DE RIESGOS:** EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO asumen los riegos en la ejecución del contrato establecidos en el Pliego de Condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo: **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA— SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción del presente contrato, en la presentación de cada cuenta de cobro y para la realización de cada pago derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensión, así como los aportes parafiscales al Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando haya lugar a ello. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la Ley (Art. 8 de la Ley 80 de 1993 y Ley 610 de 2000). Ni cursa en su contra procesos por inasistencia alimentaría. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - EXCLUSIÓN LABORAL Y PRESTACIONAL.** De conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, este contrato en ningún caso generará relación laboral ni prestaciones sociales, entre EL MUNICIPIO y EL CONTRATISTA. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA – DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual, para los efectos legales a que hubiere lugar, el Municipio de Montería.

Proyectó Jurídicamente: Mónica Cantillo G- Abogada Contratista OAJ.
Reviso Jurídicamente Katia Cabrales B- Asesora Externa OAJ
Vo.Bo. Karina Carrascal S – Jefe OAJ

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Montería

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CMA-SPM-008-2023

CONTRATO No.	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	BUSERCO S.A.S., identificado con NIT. 900805380-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA identificado con C.C. No 1.067.892.319 de Montería
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553) M/CTE valor que incluye: El precio básico (costos directos e indirectos) y el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar.
PLAZO	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes consideraciones y cláusulas que conforman el Contrato:

CONSIDERACIONES

a) Que EL MUNICIPIO, desarrolló el trámite del proceso de Selección de contratista, a través de la modalidad de Concurso de Méritos No. CMA-SIM-008-2023, con el objeto de contratar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA" lo cual se hizo cumpliendo con las disposiciones legales contempladas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 1082 de 2015. **b)** Que por Resolución No. 0630 de 31 de agosto de 2023 expedida por el Alcalde Municipal, se adjudicó el contrato en referencia a BUSERCO S.A.S., identificado con NIT. 900805380-4, y como consecuencia de ello se ordenó la suscripción y legalización del mismo. **c)** Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede a la suscripción del presente contrato, el cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA– OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA".** El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta, los pliegos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. **CLAUSULA SEGUNDA - VALOR:** El valor del contrato es por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553) M/CTE valor que incluye:** El precio básico (costos directos e indirectos) y el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar, el cual será cancelado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23000976 de fecha 27 de abril de 2023 por valor de ($247.576.883) expedido por el Jefe de Presupuesto Municipal. **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** El valor del contrato resultante de este proceso, se cancelará mediante pagos parciales, en la misma proporción de la ejecución del proyecto objeto de vigilancia, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Los porcentajes de pagos mensuales no podrán ser superiores a los porcentajes de los avances físicos de la obra. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte del Municipio de Montería – Secretaría de Infraestructura, el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. En éste último pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica y acta de liquidación del contrato. **PARÁGRAFO TERCERO. - EL CONTRATISTA** deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO CUARTO. -** El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir **EL CONTRATISTA**, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. **CLÁUSULA CUARTA- PLAZO:** El plazo de este contrato es de **TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS** contados a partir del acta de inicio. Sin embargo, las actividades objeto de interventoría, se darán por terminadas sólo cuando se hayan recibido la totalidad de las obras civiles indicadas anteriormente y liquidado el contrato de obra civil. **PARÁGRAFO: VIGENCIA:** El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. **CLAUSULA QUINTA: El CONTRATISTA** ha hecho sus propias

averiguaciones, estudios y proyecciones y en consecuencia se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisión de asumir totalmente a su riesgo las obligaciones derivadas de este contrato. **CLAUSULA SEXTA –OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** De conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el Artículo 2, Inciso 2 de la Ley 1882 de 2018. El contratista debe cumplir las siguientes **OBLIGACIONES ETAPA 1. ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS: 1.** Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. **2.** Actuar de manera diligente de tal manera que contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. **3.** Establecer la metodología de trabajo necesaria, práctica y eficiente para realizar la supervisión, que redunde en una eficaz ejecución del objeto del contrato sobre el cual se ejerzan funciones de interventoría. **4.** Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores **5.** Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo de EL CONTRATISTA, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la Etapa 1. **6.** Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. **7.** Realizar reuniones con EL CONTRATISTA, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. **8.** Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por EL MUNICIPIO. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. **9.** Dejar constancia escrita de todas las actuaciones, en especial de las observaciones que imparta que sean de su competencia, conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y en concordancia con la Ley. **10.** Informar a EL MUNICIPIO los hechos o circunstancias del CONTRATISTA que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. **11.** Abstenerse de adoptar decisiones que le corresponden a EL MUNICIPIO y que impliquen modificaciones a su contrato. **12.** Abstenerse de exonerar al CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones sin que el municipio lo haya aprobado. **13.** Verificar que los estudios y diseños se elaboren o hayan elaborado con base en las especificaciones y exigencias dadas por EL MUNICIPIO **14.** Solicitar al CONTRATISTA el cumplimento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes, decretos y normas técnicas que le apliquen. **15.** Verificar y garantizar a EL MUNICIPIO que los precios unitarios máximos resultantes de los estudios y diseños, corresponden a los precios manejados por EL MUNICIPIO. **16.** Proponer los ajustes necesarios a los estudios y diseños, que presente EL CONTRATISTA, según conceptos técnicos de sus profesionales. **17.** Estudiar y analizar el proyecto, los estudios y todos los diseños técnicos, cálculo de cantidades de obra, presupuesto, programación y especificaciones, con el objeto de realizar las respectivas recomendaciones y ajustes antes de la iniciación de las obras. **18.** Impartir aprobación final a los estudios y diseños ejecutados por EL CONTRATISTA, requisito previo indispensable para la suscripción de la correspondiente acta de inicio del contrato de obra. **OBLIGACIONES ETAPA 2. EJECUCIÓN DE OBRA:** El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales: **a.** Presentar a la Secretaría de Infraestructura el plan de trabajo de la interventoría en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoría. **b.** Presentar un Plan de Calidad para la interventoría. **c.** Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoría. **d.** Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el municipio de Materia para el personal de la interventoría. **e.** Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores; **f.** Presentar informes de interventoría en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad. **g.** Revisar y aprobar los estudios y diseños definitivos para la ejecución de la obra. **h.** Elaborar la lista y programación de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoría. **i.** Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer recomendaciones. **j.** Registro fotográfico y de video. **1. Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista del contrato de obra: a.** Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra. **b.** Revisar y aprobar, de conformidad con las

condiciones exigidas en el pliego de condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. **c.** Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable. **d.** Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo. **e.** Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría. **f.** Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. **g.** Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el Municipio de MONTERÍA, en ningún caso reconocerá suma alguna adicional. **h.** Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría. **i.** Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por el Municipio de MONTERÍA. **j.** Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría del Municipio de MONTERÍA y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. **k.** Consultar con el Municipio de MONTERÍA las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. **l.** Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones contractuales. **m.** Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. **n.** laborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. **o.** Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Municipio de MONTERÍA. Para efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. **p.** Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones del Municipio de MONTERÍA relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. **q.** Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las preactas suscritas con el contratista. **r.** Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra. **s.** Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente. **t.** Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Municipio de MONTERÍA la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **u.** Presentar al Municipio de MONTERÍA los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del Municipio de MONTERÍA. **2. Obligaciones de carácter técnico:** a. Verificación del estado de las zonas a intervenir como resultado del contrato objeto de esta interventoría, antes del inicio de la obra. **b.** Revisar y aprobar los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra. **c.** Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta crítica en método CPM usando el software PROJECT. **d.** Exigir al contratista del contrato objeto de vigilancia la reprogramación del cronograma de trabajo para mantener plazos contractuales. **e.** Verificar la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar. **f.** Hacer controles y seguimiento. **g.** Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia. **h.** Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia **3. Obligaciones de carácter ambiental. a.** Revisar el PMA presentado por el

contratista **b.** Hacerle seguimiento al PMA presentado por el contratista y revisado y aprobado por la interventoría. **c.** Revisar y aprobar los permisos de tala de árboles y disposición de escombros necesarios para el desarrollo de la obra. **d.** Hacer seguimiento al programa de monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los reportes mensuales al municipio. Ordenar los correctivos que sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. **e.** Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, la comunidad, el contratante, o empresas contratadas por el contratante. **f.** Presentar un informe mensual en donde se relacione toda la gestión de manejo ambiental realizada en cumplimiento del PMA del Proyecto, así como la gestión adelantada para responder a las exigencias u observaciones específicas de las autoridades ambientales, la comunidad, o el contratante. Debe incluir los resultados del programa de seguimiento y monitoreo ambiental del proyecto. **g.** Atender las responsabilidades referentes al incumplimiento ambiental asociado con las responsabilidades de su competencia, así como las sanciones contractuales derivadas de éste. **4. Obligaciones de Control financiero. a.** Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. **b.** Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. **c.** Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato. **5. Obligaciones Jurídicas: a.** Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. **b.** Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. **c.** Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al municipio de MONTERÍA, y de resultar pertinente, dar aviso a la compañía aseguradora. **B) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA: 1)** Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato; **2)** Recibir de parte del CONTRATISTA **los** informes relacionados con la ejecución del contrato; **3)** Expedir el cumplido correspondiente; **4)** Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación del contrato de consultoría; **5)** Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de condiciones; **CLÁUSULA SÉPTIMA - SUSPENSIÓN:** De común acuerdo entre las partes, cuando medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. **CLAUSULA OCTAVA-TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD.** El MUNICIPIO podrá dar por terminado total o parcialmente el presente contrato conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. **CADUCIDAD:** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley 80 de 1993 el MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del presente contrato. **CLAUSULA NOVENA - CLAUSULA PENAL DE APREMIO:** En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA cancelará al Municipio por cada día de retraso, el 1.0 % del valor total del contrato, sin exceder el 10% del valor del mismo, en caso contrario se acudirá al juez del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, el Municipio verificará los elementos vendidos según lo relacionado en los presentes términos de referencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que el Municipio lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. En caso contrario se acudirá al Juez del contrato para su cobro **CLAUSULA DECIMA –CESIÓN O SUB-CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN**: Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo ni subcontratarlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del Municipio. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA –SUPERVISIÓN**: La supervisión de la ejecución del objeto contractual será ejercida por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Montería, o por el profesional que se designe, toda vez que por la naturaleza del objeto no se requieren conocimientos especializados que ameriten la contratación de una supervisión externa. Para la supervisión, el Municipio podrá contar con personal de apoyo contratado a través de prestación de servicios, quien desempeñará, además de las funciones contempladas en la Ley 80 de 1993, las que a continuación se detallan: **a)** Vigilar, controlar y supervisar, el cabal cumplimiento de del objeto del contrato. **b)** Impartir las órdenes y sugerencias, por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, pero siempre enmarcados dentro de los términos del mismo. **c)** Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados. **d)** Informar oportunamente al Municipio sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su incumplimiento y las demás contempladas en el contrato y que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-GARANTÍAS**: El CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA una garantía de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, que otorgue los siguientes amparos: **A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en

original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	MUNICIPIO DE MONTERÍA con Nit. No. 800096734-1		
Amparos, vigencia y valores asegurados	**AMPARO**	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
	Calidad del servicio	Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la Obra objeto de esta interventoría	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
Tomador	Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	Número y año del contrato Objeto del contrato Firma del representante legal del Contratista En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421		

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las garantías expedidas a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA serán aprobadas, como requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas. **CLAUSULA DECIMA TERCERA-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden según los procedimientos establecidos por la ley. **CLAUSULA DECIMA CUARTA –PERFECCIONAMIENTO**: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. **CLAUSULA DECIMA QUINTA- LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN**: Perfeccionado el contrato, el CONTRATISTA deberá constituir las garantías, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato. El presente contrato se entiende legalizado con el cumplimiento de los siguientes requisitos: **1)** Con la constitución y pago por parte del CONTRATISTA de las garantías de que trata la cláusula décima segunda y su aprobación por parte del MUNICIPIO DE MONTERÍA. **2)** El respectivo certificado de apropiación presupuestal. **3)** El pago de las estampillas a que haya lugar. **4)** Paz y salvo por todo concepto con el MUNICIPIO DE MONTERÍA. **PARÁGRAFO:** Los gastos que demande el perfeccionamiento del contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá efectuar su trámite en el término no prorrogable de diez (10) días, contados a partir de la firma del contrato. Si el contratista no cumple con esta exigencia en el término antes indicado se considerará que la adjudicación queda sin valor ni efecto alguno, quedando el MUNICIPIO DE MONTERÍA facultado para proceder de conformidad. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. **CLAUSULA DECIMA SEXTA - LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común acuerdo por las partes contratantes, que contendrá un balance sobre la ejecución del contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen las partes sobre la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO**: Los recursos sin ejecutar serán reintegrados al MUNICIPIO DE MONTERÍA. **CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual, para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el Municipio de MONTERÍA.

Proyectó Jurídicamente: Mónica Cantillo G - Abogada Contratista
Revisó jurídicamente: Katya Cabrales B.- Asesora Externa OAJ
Aprobó: Karina Carrascal S.- Jefe Oficina Asesora Jurídica

2. ACTAS DE INICIO

2.1 ACTA DE INICIO OBRA

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
Contrato N°: LP-SIM-012-2023
Fecha: 15/09/2023

MONTERÍA

ACTA DE INICIO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No:	LP-SIM-012-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023, representado legalmente por DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR:	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.847.134.379) M/CTE
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	($148.977.992,00)
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	($2.698.156.387,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES y QUINCE (15) DÍAS
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	UN (1) MES
ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	DOS (02) MESES y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2023, y estando Firmado el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, el Interventor de la Obra **BUSERCO S.A.S.** Representado por **ANDRÉS BUELVAS SERPA** y el Contratista **CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023** Representado por **DABERLIS ARRIETA CÁRDENAS** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra LP-SIM-012-2023, previa verificación de los documentos tal como se presenta a continuación:

No.	Nombre del Documento	Si / N.A.
1	Relación del Personal Profesional Propuesto (Según Formato)	Si
2	Relación de afiliación del personal a Seguridad social (Según Formato)	Si
3	Cronograma de obra actualizado según fecha tentativa de Acta de Inicio	Si
4	Póliza del contrato y recibo de pago	Si
5	Aprobación de póliza	Si

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
Contrato N°: LP-SIM-012-2023
Fecha: 15/09/2023

MONTERÍA

6	Certificado de Registro presupuestal CRP	Si
7	Plan de Calidad	Si

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de ESTUDIOS Y DISEÑOS y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto.

Nombre Completo	Cargo	Correo	Dirección
DABERLIS ELÍAS CÁRDENAS ARRIETA	Representante legal	dabelisarrieta@yahoo.es	CR 45 27 28
ANDRÉS BUELVAS SERPA	Representante legal	gerenciabuserco@gmail.com	CR 8 N 45 35 CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS OF 813
IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de infraestructura	s.infraestructura@monteria.gov.co	Carrera 1w No. 32A - 49, Centro Verde

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los (15) días del mes de septiembre de 2023.

DABERLIS ARRIETA CÁRDENAS
CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023
CONTRATISTA

ANDRÉS BUELVAS SERPA
BUSERCO S.A.S.
INTERVENTOR

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Edwin Paternina A – Contratista SIM

ACTA DE INICIO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA
CONTRATO DE OBRA LP-SIM-012-2023

CONTRATO No:	LP-SIM-012-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023, representado por NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.847.134.379,00)
VALOR DEL CONTRATO ETAPA N°2 - EJECUCION	DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC/TE ($ 2.698.156.387,00 00)
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO ETAPA N°2:	16 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023, y estando vigente el contrato de obra identificado en el encabezamiento de la presente acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal, **Ing. IRIS SPATH CAMAÑO**, **EDWIN PATERNINA** apoyo a la supervisión, el interventor de la obra **BUSERCO S.A.S**. Representado legalmente por **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA** y el Contratista **CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023** Representado legalmente por **NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA**, con el propósito de suscribir el Acta de Inicio Etapa N°2 de Ejecución del contrato **LP-SIM-012-2023** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades de obra y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que el uniforme de los trabajadores que laboren en el desarrollo del proyecto, deberá ser portado por todo el personal en el sitio de la obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

2. Los Elementos de Protección Personal (EPP) establecidos en el Plan de Seguridad Industrial del Contrato de Obra deberá ser portado por el personal que labore en la Obra durante la jornada laboral a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

3. Que el contratista será responsable del mantenimiento de las Vallas de tal forma que se aseguré siempre su legibilidad.

4. Que el contratista mantenga el Área de construcción aislado y seguro, impidiendo la entrada de personal no autorizado.

Nota: Se suscribe la presente acta en fecha (17) de octubre de 2023, por ser el día hábil posterior, a la fecha de inicio de la Etapa N° 2.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los diecisiete (17) del mes de octubre de 2023.

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
R/L. NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA
Contratista de Obra

BUSERCO S.A.S
R/L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista de Interventoría

IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

EDWIN PATERNINA
Apoyo a la Supervisión
Municipio de Montería

2.2 ACTA DE INICIO INTERVENTORIA

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: 15/09/2023

MONTERÍA

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S., representado por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($247.186.553) M/CTE valor que incluye: El precio básico (costos directos e indirectos) y el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2023, y estando Firmado el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **IRIS SPATH CAMAÑO**, el Interventor de la Obra **BUSERCO S.A.S.** Representado por **ANDRÉS BUELVAS SERPA** y el Contratista **CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023** Representado por **DABERLIS ARRIETA CÁRDENAS** con el propósito de suscribir la presente Acta de Inicio del contrato de obra LP-SIM-012-2023, previa verificación de los documentos tal como se presenta a continuación:

No.	Nombre del Documento	Si / N.A.
1	Relación del Personal Profesional Propuesto (Según Formato)	Si
2	Relación de equipo ofrecido (Según Formato)	Si
3	Relación de afiliación del personal a Seguridad social (Según Formato)	Si
4	Plan de trabajo de la Interventoría	Si
5	Póliza del contrato y recibo de pago	Si
6	Aprobación de póliza	Si
7	Certificado de Registro presupuestal CRP	Si

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio a las actividades contempladas y queda bajo su

responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

1. Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto.

Nombre Completo	Cargo	Correo	Dirección
ANDRÉS BUELVAS SERPA	Representante legal BUSERCO SAS	gerenciabuserco@gmail.com	CR 8 N 45 35 CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS OF 813
IRIS SPATH CAMAÑO	Secretaria de infraestructura	s.infraestructura@monteria.gov.co	Carrera 1w No. 32A - 49, Centro Verde

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

ANDRÉS BUELVAS SERPA
Rep. Legal BUSERCO SAS-Interventor

Elaboró: Edwin Paternina A – Contratista SIM

ACTA DE INICIO ETAPA N°2 – EJECUCION DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA - CMA-SIM-008-2023

CONTRATO No:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA DE OBRA:	BUSERCO S.A.S, representado por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($247.186.553.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA FINAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	17 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023, y estando vigente el contrato de interventoría identificado en el encabezamiento de la presente acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal, **Ing. IRIS SPATH CAMAÑO**, el interventor de la obra **BUSERCO S.A.S**. Representado legalmente por **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA**, con el propósito de suscribir el Acta de Inicio Etapa N°2 de Ejecución del contrato **CMA-SIM-008-2023,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato citado, se deja a disposición del contratista para que dé Inicio de las actividades contempladas y queda bajo su responsabilidad el cumplimiento de los requerimientos legales mínimos establecidos dentro de la Minuta del Contrato; así como también:

- Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato será enviada a través de los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan a continuación, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO
Contrato N°: CMA-SIM-008-2023
Fecha: OCTUBRE 17 de 2023

MONTERÍA

Nombre y Apellidos	Cargo	Correo electrónico	Dirección
ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	Representante Legal **BUSERCO S.A.S**	interbusercoaulas@gmail.com	Carrera 8 # 45-35 Centro de Negocios Alamedas Ofi. 813
NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	Representante Legal **CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023**	aulas2023.12@gmail.com	Carrera 6 # 62B-32 Edificio Sexta Avenida Oficina 618
IRIS SPATH CAMAÑO	**Secretario de Infraestructura** Municipio De Montería	s.infraestructura@monteria.gov.co	Carrera 1W N°32ª-49, Centro Verde

Nota: Se suscribe la presente acta en fecha (17) de octubre de 2023, por ser el día hábil posterior, a la fecha de inicio de la Etapa N° 2.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los diecisiete (17) del mes de octubre de 2023

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

BUSERCO S.A.S
R/L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista de Interventoría

Elaboró: Edwin Paternina A – Apoyo a la Supervisión

3. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

3.1 CDP OBRA

1157

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	23001171
CDP No.	23000977
jueves 27 abril 2023	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios Educativos	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2201052	2201	$ 2.847.134.381,00	$ 2.847.134.381,00
				Totales...	$ 2.847.134.381,00	$ 2.847.134.381,00

Total CDP en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA y UNO Pesos

El certificado No. 23000977 se emite en Monteria el dia jueves 27 de abril de 2023 como requisito previo a ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Universitario

Solicito : CARLOS ORDOSGOITIA SANIN		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

3.2 CDP INTERVENTORIA

1158

MONTERÍA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	23001172
CDP No.	23000976
jueves 27 abril 2023	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2023 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
2.3.2.01.01.001.02.07	Edificios Educativos	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2201052	2201	$ 247.576.883,00	$ 3.094.711.264,00
				Totales...	$ 247.576.883,00	$ 3.094.711.264,00

Total CDP en letras: DOSCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y TRES Pesos

El certificado No. 23000976 se emite en Monteria el dia jueves 27 de abril de 2023 como requisito previo a INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Universitario

Solicito : CARLOS ORDOSGOITIA SANIN		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250

4.CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL

4.1 CRP OBRA

1159

MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

RP No.	
miércoles 13 septiembre 2023	

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 23001736

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 901752045 - CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 NIT: 901752045

No. del Certificado de disponibilidad 23000977 **Contrato No:** LP-SIM-012-2023

Tiempo de Ejecucion: 3 MESES Y 15 DIAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor R.P.
[illegible]	[illegible]	1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO	2201052	2201	$ 2.647.134.379,00
				Total Reserva..	$ 2.647.134.379,00

CONSITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA y NUEVE Pesos **Objeto**

ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Universitario

Solicito: MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ		
Elaboro: ALLORENTE	Imprimió: DAIRO MANUEL HOYOS BEDOYA	Hr Imprimió: 186:43:33:250

4.2 CRP INTERVENTORIA

1160

MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 23001735

RP No. [redacted]
miércoles 13 septiembre 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 900805380 - BUSERCO S A S **NIT:** 900805380

No. del Certificado de disponibilidad 23000976 **Contrato No:** CMA-SIM-008-2023

Tiempo de Ejecucion: 3 MESES Y 15 DIAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	Programa	Valor R.P.
[illegible]	Edificios Educativos	1.3.1.1.05 RECURSOS DE CREDITO INTERNO	7201052	7201	[illegible]
				Total Reserva..	$ 247.186.553,00

CON SITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: DOSCIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA y TRES Pesos

Objeto

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Universitario

5.POLIZAS Y RESOLUCION APROBACION DE POLIZAS

5.1 POLIZAS Y APROBACION OBRA

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

RESOLUCIÓN No. 0277 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que el Consorcio Aulas Montería 2023 identificado con NIT N° 901.752.045-6, representado legalmente por Daberlis Elías Arrieta Cárdenas, identificado (a) con C.C.72.236.745 expedida en Barranquilla, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. LP-SIM-012-2023, cuyo objeto es Estudios, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura física en las Instituciones Educativas del Municipio de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N° 540-47-994000027254, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, estabilidad y calidad de la obra y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 540-74-994000005641, mediante la cual se garantiza la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, las cuales fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día quince (15) de septiembre de 2023 y resolución N° 0243.

Que en fecha quince (15) de septiembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato.

Que el contratista actualizó las vigencias de los amparos conforme al acta de inicio del contrato, las cuales corresponden al anexo N° 1 de la póliza de seguro de cumplimiento 540-47-994000027254, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, estabilidad y calidad de la obra y el anexo N° 1 de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 540-74-994000005641, mediante la cual se garantiza la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Juridica

Que las anteriores actualizaciones de pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día veintiocho (28) de septiembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el anexo N° 1 de la póliza de seguro de cumplimiento N° 540-47-994000027254 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Aulas Montería 2023 identificado con NIT N° 901.752.045-6, representado legalmente por Daberlis Elías Arrieta Cárdenas, identificado (a) con C.C.72.236.745 expedida en Barranquilla, mediante la cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, estabilidad y calidad de la obra, del Contrato de Obra No. LP-SIM-012-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el anexo N° 1 de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 540-74-994000005641 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Aulas Montería 2023 identificado con NIT N° 901.752.045-6, representado legalmente por Daberlis Elías Arrieta Cárdenas, identificado (a) con C.C.72.236.745 expedida en Barranquilla, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. LP-SIM-012-2023.

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARÍA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: William Montes – Profesional Universitario OAJ

1163

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401635460

PÓLIZA No: 540-47-994000027254 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
21	09	2023	21	09	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6

DIRECCIÓN: CRA 45 27 28 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3213023037

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	15/09/2023	30/06/2024	284,713,437.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/09/2023	31/12/2026	284,713,437.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		569,426,875.80
CALIDAD DEL SERVICIO	15/09/2023	30/06/2024	284,713,437.90

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901567452 - 4 TOWERS S.A.S. - PART: 10.00%
CC 72236745 - ARRIETA CARDENAS, DABERLIS ELIAS - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SIM-012-2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,423,567,189.50	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -	9824	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070005401635460

Daberlis Arrieta C
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079090CF57F5C

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1164

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000027254 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

NOTA ACLARATORIA

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 15/09/2.023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

1165

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401635486

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000005641 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA — COD AGE: 540 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
21 / 09 / 2023		15 / 09 / 2023	23:59	31 / 12 / 2023	23:59	107	21 / 09 / 2023

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	A LAS	DIAS
	15 / 09 / 2023	23:59	31 / 12 / 2023	23:59	107

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6
DIRECCIÓN: CRA 45 27 28 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3213023037

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6
DIRECCIÓN: CRA 45 27 28 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3213023037
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 NIT : 901752045

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CORDOBA CIUDAD: MONTERIA

DIRECCION: VIA URBANA No. - DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 464,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SIM-012-2023 REFERENTE A ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:
"PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
"PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
"PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
"RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
"AMPARO PATRONAL.
"VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -	9824	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540163548

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

LJCABALLERO 0

CBDC2079090CF57E5A

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

1166

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No.PÓLIZA: 994000005641 ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.752.045-6
ASEGURADO:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.752.045-6
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MONTERIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.096.734-1

TEXTO ITEM 1

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICADO CON NIT 901.752.045-6 Y MUNICIPIO DE MONTERÍA IDENTIFICADO CON NIT 800.096.734-1

TOMADORES ASOCIADOS
CC 72236745 - ARRIETA CARDENAS, DABERLIS ELIAS - PART: 90.00%
NIT 901567452 - 4 TOWERS S.A.S. - PART: 10.00%

SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES MUNICIPIO DE MONTERÍA IDENTIFICADO CON NIT 800.096.734-1 Y TERCEROS AFECTADOS.

NOTA ACLARATORIA

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DE ACUERDO A ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 15/09/2.023.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

CLIENTE

1167

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

RESOLUCIÓN No. 0243 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que el Consorcio Aulas Montería 2023 identificado con NIT N° 901.752.045-6, representado legalmente por Daberlis Elías Arrieta Cárdenas, identificado (a) con C.C.72.236.745 expedida en Barranquilla, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Obra No. LP-SIM-012-2023, cuyo objeto es Estudios, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura física en las Instituciones Educativas del Municipio de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N° 540-47-994000027254, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, estabilidad y calidad de la obra y de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 540-74-994000005641, mediante la cual se garantiza la responsabilidad civil extracontractual, expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día quince (15) de septiembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la póliza de seguro de cumplimiento N° 540-47-994000027254 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Aulas Montería 2023 identificado con NIT N° 901.752.045-6, representado legalmente por Daberlis Elías Arrieta Cárdenas, identificado (a) con C.C.72.236.745 expedida en Barranquilla, mediante

1168

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

) cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, el pago le salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad del servicio, estabilidad y calidad de la obra, del Contrato de Obra No. LP-SIM-012-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Nº 540-74-994000005641 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, tomada a favor del Municipio de Montería por el Consorcio Aulas Montería 2023 identificado con NIT Nº 901.752.045-6, representado legalmente por Daberlis Elías Arrieta Cárdenas, identificado (a) con C.C.72.236.745 expedida en Barranquilla, mediante la cual se garantiza el amparo de responsabilidad civil extracontractual del Contrato de Obra No. LP-SIM-012-2023.

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los quince (15) días del mes de septiembre de 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: William Montes – Profesional Universitario DAI

1169

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401635460

PÓLIZA No: 540-47-994000027254 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA	MES	AÑO
	14	09	2023

FECHA DE IMPRESIÓN	DIA	MES	AÑO
	14	09	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6

DIRECCIÓN: CRA 45 27 28 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3213023037

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	12/09/2023	30/06/2024	284,713,437.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	12/09/2023	31/12/2026	284,713,437.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	569,426,875.80
CALIDAD DEL SERVICIO	12/09/2023	30/06/2024	284,713,437.90

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901567452 - 4 TOWERS S.A.S. - PART: 10.00%
CC 72236745 - ARRIETA CARDENAS, DABERLIS ELIAS - PART: 90.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SIM-012-2023 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *1,423,567,189.50	$ ********8,493,041	$****15,000.00	$ ****1,616,528	$ *******10,124,569

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -	9824	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000015(8020)000000000007000540163546

FIRMA ASEGURADOR

Daberlis Arrieta C.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079090CF97A59

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

1170

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000027254 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

1171

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401635486

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000005641 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD.AGE: 540 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA				FECHA DE IMPRESIÓN
DIA 14	DIA 12	09	2023 23:59	DIA 31	12	2023 23:59	110	DIA 14
MES 09	MES 09			MES 12				MES 09
AÑO 2023	AÑO 2023			AÑO 2023				AÑO 2023
	HORAS A LAS			HORAS A LAS			DIAS	

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA				
	DIA 12	09	2023 23:59	DIA 31	12	2023 23:59	110	
	MES			MES				
	AÑO			AÑO				
	HORAS A LAS			HORAS A LAS			DIAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6

DIRECCIÓN: CRA 45 27 28 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3213023037

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICACIÓN: NIT 901.752.045-6

DIRECCIÓN: CRA 45 27 28 CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA TELÉFONO: 3213023037

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 NIT : 901752045

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CORDOBA CIUDAD: MONTERIA

DIRECCION: VIA URBANA No. - DONDE SE EJECUTE EL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 464,000,000.00 464,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA N° LP-SIM-012-2023 REFERENTE A ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

SE CONFIRMA QUE LA PRESENTE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES AMPAROS SEGUN CONDICIONES DECRETO 1082 DE 2015:
"PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
"PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
"PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
"RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
"AMPARO PATRONAL.
"VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***464,000,000.00	$ **********419,507	$*****9,000.00	$ *******81,416	$ **********509,923

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -	9824	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540163548

Yaberlis Arrieta Q
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDC2079090CF97A57 CLIENTE LJCABALLERO 0

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174
Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1172

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000005641 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.752.045-6
ASEGURADO:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.752.045-6
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MONTERIA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.096.734-1

TEXTO ITEM 1

SE CONFIRMA QUE EL ASEGURADO ES CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 IDENTIFICADO CON NIT 901.752.045-6 Y MUNICIPIO DE MONTERÍA IDENTIFICADO CON NIT 800.096.734-1

TOMADORES ASOCIADOS
CC 72236745 - ARRIETA CARDENAS, DABERLIS ELIAS - PART: 90.00%
NIT 901567452 - 4 TOWERS S.A.S. - PART: 10.00%

SE CONFIRMA QUE EL BENEFICIARIO ES MUNICIPIO DE MONTERÍA IDENTIFICADO CON NIT 800.096.734-1 Y TERCEROS AFECTADOS.

CLIENTE

1173

RECIBO DE CAJA No. 540083868

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡ Siempre junto a ti !

AGENCIA MONTERÍA	TRANSACCIÓN Nro. 540129428	FECHA DE RECAUDO 19/09/2023	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			C.C o NIT 901752045
TOMADOR PÓLIZA CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000027254 - NRO. ELECTRÓNICO 5401635460			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS			VALOR RECIBO $ 10,124,569.00
PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000027254 - ANEXO 0 AGENCIA MONTERÍA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901752045 CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 . VALOR PAGADO $ 10,124,568.61 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 540129428			

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -

1174

RECIBO DE CAJA No. 540083869

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

AGENCIA MONTERÍA	TRANSACCIÓN NRO. 540129429	FECHA DE RECAUDO 15/09/2023	TIPO PAGADOR ASEGURADO
NOMBRE PAGADOR CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			C.C o NIT 901752045
TOMADOR PÓLIZA CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023			
DETALLE DE PAGO PAGO POLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000005641 - NRO. ELECTRÓNICO 5401635486			
VALOR EN LETRAS (en Pesos) QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS			VALOR RECIBO $ 509,923.00
PAGO PÓLIZA DE RESP CIVIL EXT PATRI 994000005641 - ANEXO 0 AGENCIA MONTERÍA, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901752045 CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 . VALOR PAGADO $ 509,923.15 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 540129429			

FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -

1175

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401624084

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000026948 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	08	2023	18	08	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: . **CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023** IDENTIFICACIÓN: CC

DIRECCIÓN: CL 8 50 67 S CIUDAD: MEDELLÍN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3017803101

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MONTERIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.734-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MONTERIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.734-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: SERIEDAD DE LA OFERTA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES SERIEDAD DE LA OFERTA	23/08/2023	23/11/2023	284,713,437.90

TOMADORES ASOCIADOS

CC 72236745 - ARRIETA CARDENAS, DABERLIS ELIAS - PART: 90.00%
NIT 901567452 - 4 TOWERS S.A.S. - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA EL PROCESO DE CONTRATACION N° LP-SIM-012-2023, RELACIONADA CON "ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA", CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,713,437.90	$ **********427,070	$****11,000.00	$ *******83,233	$ **********521,303

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
FARES AGENCIA DE SEGUROS LTDA -	9824	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070005401624O8

Daberlis Arrieta C.
FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBDC2079090DF87E57 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1176

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 836202

lunes, 21 de agosto de 2023, 5:08:36 PM

Detalle

$521,303.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	Aseguradora Solidaria de Colombia
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5766
Descripción:	POLIZAS
Fecha y hora inicio transacción	2023-08-21 5:07:35
NIT del comercio	8605246546
Número de factura	54016240840
Código Único de Seguimiento	114237483
Dirección IP:	181.52.64.218
Referencia 1:	192.230.104.9
Referencia 2:	5401624084
Referencia 3:	CC - 72236745

5.2 POLIZAS Y APROBACION INTERVENTORIA

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

R E S O L U C I Ó N No. 0301 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

C O N S I D E R A N D O:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que Buserco S.A.S., identificado con el NIT N°900.805.380-4, representado legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa, identificado (a) con C.C. 1.067.892.319 expedida en Montería, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-008-2023, cuyo objeto es Interventoría técnica administrativa, financiera y jurídica de estudios, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura en las Instituciones Educativas del Municipio de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N°CMT-100008448, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones sociales, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., la cual fue aprobada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día quince (15) de septiembre de 2023 y resolución N° 0244.

Que en fecha quince (15) de septiembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato.

Que el contratista actualizó las vigencias de los amparos conforme al acta de inicio, la cual corresponde al anexo N° 3 de la póliza de seguro de cumplimiento N°CMT-100008448, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones sociales, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., la cual se ajusta a las preceptivas legales y contractuales

Que la anterior póliza fue aprobada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día nueve (9) de octubre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el anexo N° 3 de la póliza de seguro de cumplimiento N° CMT-100008448, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por Buserco S.A.S., identificado con el NIT N° 900.805.380-4, representado legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa, identificado (a) con C.C. 1.067.892.139 expedida en Montería, mediante la cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones sociales del Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-008-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los nueve (9) días del mes de octubre del año 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: William Montes-Profesional Universitario oficina OAJ

1179

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.20 16:53:27 -05:00

Código de Seguridad: dkmS16bVhr3MzVA8+7itVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008448	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	489017490	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	15/09/2023	24:00 Horas Del	30/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	BUSERCO S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.805.380-4
DIRECCIÓN	CR 14 F 2 46 53 URB CALIFORNIA	TELÉFONO	3116846575
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMA-SPM-008-2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA INTERVENTORIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/09/2023	24:00 Horas Del 10/07/2024	24.718.655,30	50.622,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/09/2023	24:00 Horas Del 10/01/2027	24.718.655,30	205.368,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 30/12/2028	24.718.655,30	309.322,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 74.155.965,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	565.312,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	565.312,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	108.891,28
TOTAL A PAGAR	$	682.003,28

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 20/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

738
1180

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Plazas Panamerican Society Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100008448** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **BUSERCO S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **20/09/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **20** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Alcaldía de Montería
Oficina Asesora Jurídica

R E S O L U C I Ó N No. 0244 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

LA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

C O N S I D E R A N D O:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que Buserco S.A.S., identificado con el NIT N°900.805.380-4, representado legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa, identificado (a) con C.C. 1.067.892.319 expedida en Montería, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-008-2023, cuyo objeto es Interventoría técnica administrativa, financiera y jurídica de estudios, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura en las Instituciones Educativas del Municipio de Montería.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N°CMT-100008448, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones sociales, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., la cual se ajusta a las preceptivas legales y contractuales

Que la anterior póliza fue aprobada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día quince (15) de septiembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la póliza de seguro de cumplimiento N° CMT-100008448, expedida por La compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería por Buserco S.A.S., identificado con el NIT N° 900.805.380-4, representado legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa, identificado (a) con C.C. 1.067.892.139 expedida en Montería, mediante la cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios y

prestaciones sociales del Contrato de Interventoría No. CMA-SIM-008-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los quince (15) días del mes de septiembre del año 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Revisó: William Montes-Profesional Universitario oficina OAJ

1183

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.15 11:40:05 -05:00

Código de Seguridad: so2guDHlkTwb1P4ARgJvkg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008448	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	489017350	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2023	24:00 Horas Del	20/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	BUSERCO S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.805.380-4
DIRECCIÓN	CR 14 F 2 46 53 URB CALIFORNIA	TELÉFONO	3116846575
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMA-SPM-008-2023 ; CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA INTERVENTORIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	24.718.655,30	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	24.718.655,30	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 20/12/2028	24.718.655,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 74.155.965,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$ 0,00
DESCUENTOS	$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	$ 0,00
GASTOS EXP.	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

1184

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Parques Panamerican Security Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100008448** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **BUSERCO S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **15/09/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **15** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

1185

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 111202

lunes, 11 de septiembre de 2023, 5:01:11 PM

Detalle

$682,003.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	FAP MUNDIAL
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******5766
Descripción:	POLIZA
Fecha y hora inicio transacción	2023-09-11 5:00:06
NIT del comercio	8600370136
Número de factura	4469591228165647
Código Único de Seguimiento	154380044
Dirección IP:	191.108.149.177
Referencia 1:	CC10770721
Referencia 2:	191.108.149.177
Referencia 3:	4469591228165647

1186

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.08 11:11:45 -05:00

Código de Seguridad: /+UmAoF9787tvSTDKYDnWw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008448	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	489017170	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2023	24:00 Horas Del	05/09/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	BUSERCO S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	900.805.380-4
DIRECCIÓN	CR 14 F 2 46 53 URB CALIFORNIA	TELÉFONO	3116846575
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 3-16	TELÉFONO	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 3-16	TELÉFONO	7910720

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CMA-SPM-008-2023 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA INTERVENTORIA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 05/09/2023	24:00 Horas Del 30/06/2024	24.718.655,30	50.622,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 05/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	24.718.655,30	205.368,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 05/09/2023	24:00 Horas Del 05/09/2028	24.718.655,30	309.322,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 74.155.965,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	565.312,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	565.312,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	108.891,28
TOTAL A PAGAR	$	682.003,28

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

1187

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100008448** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **BUSERCO S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA** , expedida por la Compañía en **08/09/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **08** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

6.1 RUT OBRA

1188

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14949930502

(415)7707212489984(8020) 000001494993050 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 2 0 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 45 27 28

42. Correo electrónico aulas2023.12@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 1 9 9 8 4 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 8 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 22 / 11 : 34: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESPITIA VERGARA NATALY STEFANIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1189

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949930502

(415)7707212489984(8020) 000001494993050 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 2 0 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 8 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 8 1 6	
81. Hasta	2 6 3 2 0 8 1 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 3 0 9 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1190

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949930502

(415)7707212489984(8020) 000001494993050 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 2 0 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 9 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 7 3 3 9 3 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPITIA	VERGARA	NATALY	STEFANIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 6 7 9 7 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	ROMERO	JESUS	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1191

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14949930502

(415)7707212489984(8020) 000001494993050 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 2 0 4 5	6	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 6 7 4 5 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: 4 TOWERS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 8 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 2 2 3 6 7 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARRIETA	CARDENAS	DABERLIS	ELIAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 8 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

6.2 RUT INTERVENTORIA

1192

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888007288

(415)7707212489984(8020) 000001488800728 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 8 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BUSERCO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 N 45 35 CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS OF 813

42. Correo electrónico contabilidad.buserco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 5 1 1 7 8	3 0 1 5 0 1 6 7 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 1 2 2 2	7 1 1 2	2 0 1 4 1 2 1 2	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 13 / 09 : 18: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1193

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888007288

(415)7707212489984(8020) 000001488800728 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 8 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número	0 8	
73. Fecha	2 0 1 4 1 2 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1194

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888007288

(415)7707212489984(8020) 000001488800728 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 8 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 7 8 9 2 1 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUELVAS	SERPA	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 6 6 3 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUELVAS	SERPA	IVAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

1095

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14888007288

(415)7707212489984(8020) 000001488800728 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 8 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 6 5 4 6 8		1 7 2 4 4 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ZOLA	GONZALEZ	ESTEBAN	DAVID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 5 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 9 4 4 2 2		2 8 6 7 9 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SIBAJA	PEREZ	MAURICIO	JAVIER

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

7. CARTAS CONSORCIALES

7.1 CARTA CONSORCIAL OBRA

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

Licitación Pública No. LP-SIM-012-2023

FORMATO 2

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERÍA
Secretaría de Infraestructura, Cra. 1W # 32A - 49, Montería, Córdoba, segundo piso, Centro Verde Montería – Córdoba.

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP-SIM-012-2023, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Estimados Señores:

Los suscritos, JESUS DAVID DURAN ROMERO y DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 4 TOWERS S.A.S. y DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.

2. El Consorcio está integrado por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación

Nombre del integrante	Compromiso (%)
4 TOWERS S.A.S.	10%
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	90%

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

5. El representante del Consorcio es DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, identificado con C. C. No. 72.236.745 de BARRANQUILLA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio JESUS DAVID DURAN ROMERO, identificado con C. C. No. 15.679.759 de PLANETA RICA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El Señor DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023.

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: 4 TOWERS S.A.S. y DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS.

9. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo: Carrera 45 # 27 - 28
Dirección electrónica: daberlisearrieta@yahoo.es
Teléfono: 3213023037
Telefax: N/A
Ciudad: Montería

En constancia, se firma en Montería, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2023.

4 TOWERS S.A.S.
Nit 901567452-8
R/L Jesús David Duran Romero
C. C. No. 15.679.759 de Planeta Rica

DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
C. C. No. 72.236.745 de Barranquilla

DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
C. C. No. 72.236.745 de Barranquilla
Representante Legal del Consorcio Aulas Montería 2023

JESÚS DAVID DURAN ROMERO
C. C. No. 15.679.759 de Planeta Rica
Representante Legal Suplente del Consorcio Aulas Montería 2023

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

Montería, 20 de septiembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE MONTERÍA.

Referencia: **PROCESO DE CONTRATACION N°. LP-SIM-012-2023,** cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA".**

Asunto: CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023.

Reciba un cordial y respetuoso saludo, sírvase la presente para informar el cambio de representante legal del CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023, de acuerdo a el acta de reunión N.1 realizada del 20 de septiembre de 2022.

Se hace cambio de representante legal DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía No 72.236.745 de Barranquilla, por la Arq. NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA identificada con Cedula de ciudadanía N. 1.007.339.391 de Cotorra. Se mantiene como representante legal suplente a. JESUS DAVID DURAN ROMERO.

Cordialmente;

Jesus David Ducon R.

4 TOWERS S.A.S
Nit: 901567452-8
R/L Jesús David Duran Romero
C.C. 15.679.759 de Planeta Rica
Consorciado 1

Daberlis Arrieta C.

DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS.
C.C. 72.236.745 de Barranquilla
Consorciado 2

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

ACTA N.º 1
DE REUNION DE CONSORCIO

LUGAR: Montería
FECHA: 20/09/2023
HORA: 8:30 A:M

ANTECEDENTES A LA REUNION

El día 19 de septiembre de 2023 mediante llamada telefónica se citaron a los señores: JESUS DAVID DURAN ROMERO y DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, para celebrar reunión consorcial el día19 de septiembre de 2023, en la oficina del Consorcio ubicada en la CR 45 27-28, en la ciudad de Montería.

NATURALEZA Y CONFORMACION DEL CONSORCIO

1. Que el MUNICIPIO DE MONTERIA, el día 21 de julio de 2023 publicó aviso de convocatoria en el SECOP II, el concurso de méritos No. LP-SIM-012-2023, cuyo objeto es: "**ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA**.

2. Que el MUNICIPIO DE MONTERIA, mediante Resolución N. 05 51de 11 DE agosto de 2023, ordeno apertura al proceso de selección a través de la modalidad de concurso de méritos No. LP-SIM-012-2023, cuyo objeto es: **"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA**.

3. Que, a la convocatoria hecha por el MUNICIPIO DE MONETRIA, se presentó el CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023, cuyos integrantes son los siguientes:

Nombre de integrantes	Compromiso
4 TOWERS S.A.S	10%
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	90%

4. Que mediante Resolución No 682 del 08 de septiembre de 2023, el municipio de montería adjudica al CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023, cuyo representante legal es DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS identificada con c.c. No 72.236.745 de Barranquilla, por valor dos mil ochocientos cuarenta y siete millones ciento treinta y cuatro mil trescientos setenta y nueve pesos ($2.847.134.379) m/cte. y un plazo de cuatro (3) meses y 15 días cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA**.

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ULAS MONTERIA 2023.

DESARROLLO DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUOROM
   Se hicieron presentes a la reunión los siguientes miembros del consorcio:

   4 TOWERS S.A.S. 10%
   DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS 90%

   Para un total del 100% de participación, porcentaje que permite deliberar y decidir, conforme a las leyes del código de comercio y respetando los derechos de los consorciados minoritarios.

2. RATIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ULAS MONTERIA 2023.

   Por decisión del 100% de los consorciados se acordó en esta reunión el Cambio de Representante Legal DABERLIS ELIASS ARRIETA CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía No 72.236.745 de Barranquilla, por la Arq. NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA identificada con Cedula de ciudadanía N. 1.007.339.391 de Cotorra, quien tendrá todas las facultades legales y estatutarias, amplias y suficientes, para ejercer dicha función. Como representante legal suplente continúa

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

el señor JESUS DAVID DURAN ROMERO, identificado con C.C No. 15.679.759 de PLANETA RICA.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2023.

4 TOWERS S.A.S
Nit: 901567452-8
R/L Jesús David Duran Romero
C.C No. 15.679.759 de Planeta Rica
Consorciado 1

DABERLIS LIAS ARRIETA CARDENAS.
C. C. No. 72.236.745 de
Barranquilla Consorciado 2

NATALY STEFANIA ESPITIA V.
C.C. 1.007.339.391 de Cotorra R/L C.
AULAS MONTERIA 2023

JESUS DAVID DURAN ROMERO
N° 15.679.759 de Planeta Rica
R/L SUPLENTE C. AULAS MONTERIA 2023.

8. ACTA FINAL ETAPA - N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

8.1. ACTA FINAL ETAPA -N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS-OBRA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO - CONTRATO DE OBRA ETAPA N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO N°:	LP-SIM-012-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
REPRESENTANTE LEGAL	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.847.134.379,00)
VALOR ETAPA N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($148.977.992,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS.	UN (01) MES
FECHA DE INICIO ETAPA N°1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION ETAPA N°1	15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	17 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023, y estando vigente el contrato de obra identificado en el encabezamiento de la presente acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal, **Ing. IRIS SPATH CAMAÑO,** el interventor de la obra **BUSERCO S.A.S**. Representado legalmente por **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA** y el Contratista **CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023** Representado legalmente por **NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA**, con el propósito de suscribir el acta de Entrega y Recibo etapa N°1 de Estudios y Diseños del contrato **LP-SIM-012-2023,** dejando las siguientes constancias:

- Que el contratista presto sus servicios profesionales y garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución de la presente etapa N°1 de estudios y diseños, por sueldo, honorarios y todas las prestaciones sociales, acorde a la declaración juramentada presentada por el contratista.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Contrato N°: LP-SIM-012 - 2023
Fecha: OCTUBRE 17 DE 2023

MONTERÍA

- Que el contratista entregó todos y cada uno de los informes y diseños establecidos en la Minuta de Contrato para la etapa N°1, acatando las observaciones realizadas por la interventoría.

- Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato y de conformidad con las cláusulas del contrato.

- Que el contratista manifiesta que la Etapa N°1 del contrato de obra LP-SIM-012-2023, se ejecutó en su totalidad y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

- La Interventoría certifica la aprobación final a los Estudios y Diseños ejecutados por el contratista CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023 como se describe a continuación:

Si como resultado de los estudios y diseños, existe la necesidad de Licencia de Construcción, esta será tramitada y gestionada por el constructor, y el valor de dicha licencia será cancelada por el municipio de los recursos pertenecientes a la etapa N°2, Ejecución de la obra.
Teniendo en cuenta el Informe de Diagnostico es esta primera etapa, salió la necesidad de construcción de Aulas en las siguientes instituciones: INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY E INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO – ESCUELA RURAL MIXTA EL CONGO.

El Alcance y entregables por parte del contratista en la Etapa de los Estudios y Diseños Técnicos para estas dos instituciones son los siguientes:

1.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA GORETTY
1.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)
1.3 ESTUDIO DE SUELOS
1.4 DISEÑO ARQUITECTONICO (4 PLANOS)
1.5 DISEÑO ESTRUCTURAL (3 PLANOS)
1.6 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS (1 PLANO)
1.7 DISEÑO ELECTRICO (1 PLANO)
1.8 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

2.0 ESC RURAL MIXTA EL CONGO
2.1 INFORME DE DIAGNOSTICO
2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)
2.3 ESTUDIO DE SUELOS
2.4 DISEÑO ARQUITECTONICO (4 PLANOS)
2.5 DISEÑO ESTRUCTURAL (3 PLANOS)
2.6 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS (1 PLANO)
2.7 DISEÑO ELECTRICO (1 PLANO)
2.8 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

ENTREGABLES ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN GENERAL PARA LAS 14 INSTITUCIONES RESTANTES:

- Informe de diagnósticos con registros fotográficos y actas de asistencia de todas las sedes priorizadas
- Informe de estudios de suelos de las sedes que lo requieran de acuerdo al diagnóstico realizado por el consultor y aprobado por la interventoría y el municipio.
- Levantamientos topográficos, arquitectónicos, eléctricos, e hidrosanitarios
- Planos de diseños arquitectónicos, eléctricos, estructural, hidrosanitarios y estructurales de las sedes que lo requieran de acuerdo al diagnóstico realizado por el consultor y aprobado por la interventoría y el municipio.
- Memoria de cantidades de obra de acuerdo con los diseños y estudios realizados.
- Análisis de precios unitarios por ítem de cada una de las sedes.
- Presupuesto de obra de cada una de las sedes
- Especificaciones técnicas de construcción de cada una de las sedes
- Programación de obra
- Flujo de inversiones

A continuación, se describen por institución así:

3.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ - MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA
3.1 INFORME DIAGNOSTICO
3.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

4.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA MARGARITA
4.1 INFORME DIAGNOSTICO
4.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)
4.3 DISEÑO ESTRUCTURAL (2 PLANOS)
4.4 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS (1 PLANO)
4.5 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES
4.6 VISITA DIAGNOSTICO

5.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER
5.1 INFORME DIAGNOSTICO
5.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

6.0 INSTITUCION EDUCATIVA - GARZONES
6.1 INFORME DIAGNOSTICO
6.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)
6.3 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS (1 PLANO)
6.4 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

7.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRADERA
7.1 INFORME DIAGNOSTICO
7.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)

7.3 DISEÑO ESTRUCTURAL (2 PLANOS)
7.4 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

8.0 ESC RUR MIXTA LA FLORIDA
8.1 INFORME DIAGNOSTICO
8.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

9.0 ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO
9.1 INFORME DIAGNOSTICO
9.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

10.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RECUERDO
10.1 INFORME DIAGNOSTICO
10.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

11.0 ESC RURAL MIXTA HORIZONTE
11.1 INFORME DIAGNOSTICO
11.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

12.0 ESC RURAL MIXTA LOS PERICOS
12.1 INFORME DIAGNOSTICO
12.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

13.0 ESC URB MIXTA GABRIELA MISTRAL
13.1 INFORME DIAGNOSTICO
13.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)
13.3 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS (1 PLANO)
13.4 DISEÑO DE REDES ELECTRICAS (2 PLANOS)
13.5 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

14.0 ESC RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO
14.1 INFORME DIAGNOSTICO
14.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

15.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RANCHO GRANDE
15.1 INFORME DIAGNOSTICO
15.2 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

16.0 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO
16.1 INFORME DIAGNOSTICO
16.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (1 PLANO)
16.3 DISEÑO ESTRUCTURAL (2 PLANOS)
16.4 DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS 1 PLANO)
16.5 PRESUPUESTO, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Contrato N°: LP-SIM-012 - 2023
Fecha: OCTUBRE 17 DE 2023

MONTERÍA

- Que el supervisor por parte del Municipio manifiesta: Que el balance financiero del contrato de obra de la Etapa N°1 de Estudios y Diseños es el siguiente

PAGOS	VALOR ONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor Etapa N°1 Estudios y Diseños	$ 148.977.992,00	
Acta de Entrega y Recibo Etapa N°1		$ 148.977.992,00
BALANCE DEL CONTRATO	$ 148.977.992,00	$ 148.977.992,00

Nota: Se suscribe la presente acta en fecha (17) de octubre de 2023, por ser el día hábil posterior, a la fecha de terminación de la Etapa 1.

Para constancia se firma la presente acta en la ciudad de Montería, por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

BUSERCO S.A.S
R/L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista de Interventoría

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
R/L. NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA
Contratista de Obra

Proyectó: Edwin Paternina A – Contratista SIM

8.2 ACTA FINAL ETAPA -N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS- INTERVENTORIA

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Contrato N°: CMA-SIM-008 - 2023
Fecha: OCTUBRE 17 DE 2023

MONTERÍA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO N°:	CMA-SIM-008-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	BUSERCO S.AS, identificado con NIT No. 900805380-4, representado legalmente por ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con C.C No. 1.067.892.319 de Montería.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 247.186.553,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
PLAZO DE EJECUCION ETAPA N°1 ESTUDIOS Y DISEÑOS.	UN (01) MES
FECHA DE INICIO ETAPA N°1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACION ETAPA N°1	15 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA	17 DE OCTUBRE DE 2023

En la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023, y estando vigente el contrato de interventoría identificado en el encabezamiento de la presente acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal, **Ing. IRIS SPATH CAMAÑO**, el interventor de la obra **BUSERCO S.A.S**. Representado Legalmente por **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA**, con el propósito de suscribir el acta de Entrega y Recibo etapa N°1 de Estudios y Diseños del contrato **CMA-SIM-008-2023**, dejando las siguientes constancias:

1. El Interventor manifiesta que realizó los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

2. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los estudios y diseños se elaboraron con base en las especificaciones y exigencias dadas por el Municipio.

Alcaldía de Montería
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Contrato N°: CMA-SIM-008 - 2023
Fecha: OCTUBRE 17 DE 2023

MONTERÍA

3. El Interventor certifica que revisó y verificó que los precios unitarios máximos resultantes de los estudios y diseños, corresponden a los precios manejados por el Municipio.

4. El interventor certifica la aprobación final a los estudios y diseños ejecutados por el Contratista **CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023,** requisito previo indispensable para la suscripción de la correspondiente acta de inicio de ejecución de obra.

5. Balance financiero del contrato de interventoría:

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	PAGOS Y/O TRAMITES
Valor del Contrato	$ 247.186.553,00	
BALANCE DEL CONTRATO	$ 247.186.553,00	$ 247.186.553,00

Nota: se suscribe la presente acta en fecha (17) de octubre de 2023, por ser el día hábil posterior, a la fecha de terminación de la Etapa I.

Para constancia se firma la presente acta en la ciudad de Montería, por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año 2023.

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

BUSERCO S.A.S
R/L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista de Interventoría

Proyectó: Edwin Paternina A – Contratista SIM

9.RADICADOS EN CURADURIA

9.2 I. E SANTA MARIA GORETTY

1210

FORMATO DE RADICACION

Curaduría Urbana
Primera de Montería

WILLIAM ENRIQUE TABOADA DIAZ

Curador Urbano Primero de Montería
Cra 6 N°. 15-31 Local 1 Barrio Chuchurubí
Montería - Córdoba

Teléfonos: 789 28 42 - 301 501 6363

N° CONSECUTIVO
2095
NUMERO DE RADICACION
23001-1-23-0202
FECHA DE RADICACION
20 DE OCTUBRE DE 2023

TIPO DE SOLICITUD

LICENCIA URBANISTICA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE AMPLIACION DE EDICIACION INSTITUCIONAL / DOTACIONAL

INFORMACION DEL USUARIO

TITULAR	MUNICIPIO DE MONTERIA	C.C. / NIT:	8000947364-1
SOLICITANTE	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	C.C. / NIT:	1.007.339.391
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 No. 628 - 32		
DIRECCION DEL INMUEBLE	C 7 13 30		
CORREO ELECTRONICO	consorciocules2023.12@gmail.com	CEL / TELEFONO:	3103199848

INFORMACION DEL PREDIO

DIRECCION DEL PREDIO	C 7 13 30	BARRIO / URBANIZACION	PS
MATRICULA INMOBILIARIA	140-104582	ESTRATO	1
REFERENCIA CATASTRAL	01-03-0088-0001-000		
AREA DE ACTIVIDAD	DOTACIONAL		

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS GENERALES	SI	NO	N/A
COPIA DE CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DEL INMUEBLE.	X		
FORMULARIO UNICO NACIONAL (ADOPTADO POR EL MVCT).	X		
COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.		X	
PODER ESPECIAL DEBIDAMENTE OTORGADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.		X	
COPIA DE DOCUMENTO O DECLARACION PRIVADA DE IMPUESTO PREDIAL O IDENTIFICACION DEL PREDIO.	X		
COPIA MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL DE LOS PROFESIONALES INTERVINIENTES EN EL TRAMITE Y COPIA DE LAS CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA.	X		
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIA DE URBANIZACIÓN			
A. MODALIDAD DESARROLLO			
PLANO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DEL PREDIO.			X
PLANO DE PROYECTO URBANISTICO FIRMADO.			X
CERTIFICADO INDICANDO DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PUBLICOS O DECLARACION PRIVADA DE AUTOPRESTACION.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
B. MODALIDAD SANEAMIENTO			
COPIAS DE LICENCIAS DE URBANIZACION, SUS MODIFICACIONES Y REVALIDACIONES JUNTO CON LOS PLANOS URBANISTICOS APROBADOS CON BASE EN LOS CUALES LAS OBRAS DE URBANISMO FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPEREN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
CERTIFICACION BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LAS OBRAS DE URBANISMO FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPERAN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA			X
PLANO DE PROYECTO URBANISTICO FIRMADOS POR EL ARQUITECTO RESPONSABLE DEL DISEÑO.			X
COPIA DE SOLICITUD DE ENTREGA DE LAS AREAS DE CESION PUBLICA EJECUTADAS RADICADA ANTE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DISTRITALES COMPETENTES.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
C. MODALIDAD REURBANIZACION			
COPIA DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN, SUS MODIFICACIONES Y REVALIDACIONES O LOS ACTOS DE LEGALIZACION, CON LOS RESPECTIVOS PLANOS URBANISTICOS APROBADOS.			X
PLANO DEL NUEVO PROYECTO URBANISTICO FIRMADO POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.			X
PLANO TOPOGRAFICO CON EL CUAL SE TRAMITÓ LA LICENCIA O EL ACTO DE LEGALIZACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE REURBANIZACIÓN.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES LICENCIA DE PARCELACION			
PLANO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO DEL PREDIO. FIRMADO POR EL PROFESIONAL COMPETENTE.			X
PLANO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN, FIRMADO POR ARQUITECTO.			X
COPIAS DE LAS AUTORIZACIONES QUE SUSTENTAN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES, EN CASO DE AUTOABASTESIMIENTO.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIA DE PARCELACION PARA SANEAMIENTO			
COPIA DE LA LICENCIA VENCIDA DE PARCELACIÓN Y CONSTRUCCION EN SUELO RURAL, SU MODOFICACIONES Y REVALIDACIONES JUNTO CON LOS PLANOS APROBADOS CON BASE EN LOS CUALES LA OBRAS FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPEREN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LAS OBRAS FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPEREN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
PLANO DEL PROYECTO DE PARCELACION, FIRMADO POR UN ARQUITECTO RESPONSABLE DEL DISEÑO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES LICENCIA DE SUBDIVISIÓN			
A. MODALIDAD SUBDIVISIÓN URBANA Y RURAL			
PLANO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LA SUBDIVISIÓN.			X
B. MODALIDAD RELOTEO			
PLANO BASE EN EL CUAL SE URBANIZARON LOS PREDIOS OBJETO DE SOLICITUD.			X
PLANO QUE SEÑALE LOS PREDIOS RESULTANTES DE LA DIVISION PROPUESTA.			X
DOCUMENTOS RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES			
PLANO DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN, FIRMADOS POR ARQUITECTO RESPONSABLE.			X
COPIA DEL PERITAJE TECNICO QUE DETERMINE LA ESTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROPUESTA PARA LAS INTERVENCIONES.			X
DECLARACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, SUSCRITA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			
MEMORIA DE CALCULOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES.	X		
MEMORIAS DE DISEÑO DE LOS ELEMENTO NO ESTRUCTURALES.	X		
COPIA DE LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DE SUELOS / INVESTIGACION MINIMA TITULO E NSR-10.	X		
PLANO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO	X		
EL PROYECTO ARQUITECTONICO	X		
Revisión independiente de los diseños estructurales			
EDIFICACIONES QUE TENGAN O SUPEREN LOS 2.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.			X
EDIFICACIONES QUE EN CONJUNTO SUPEREN LOS 2.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.			X
EDIFICACIONES QUE DEBAN SOMETERSE A SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE.			X
EDIFICACIONES QUE TENGAN MENOS DE 2.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA, QUE CUENTEN CON LA POSIBILIDAD DE TRAMITAR AMPLIACIONES QUE ALCANCEN O SUPEREN LOS 2000 M2.			X
EDIFICACIONES DE MENOS DE 2000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA QUE DEBAN SOMETERSE A SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE.			X
EL PROYECTO CONSTRUCTIVO GENERA 5 O MÁS UNIDADES DE VIVIENDA PARA TRANSFERIR A TERCEROS.			X
Para las condiciones anteriores, adjuntar los siguientes documentos:			
MEMORIA DE LOS CÁLCULOS Y PLANOS ESTRUCTURALES, FIRMADOS POR EL REVISOR INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES.			X
MEMORIAL FIRMADO POR EL REVISOR INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, EN EL QUE CERTIFIQUE EL ALCANCE DE LA REVISIÓN.			X
BIEN DE INTERES CULTURAL			
ANTEPROYECTO O AUTORIZACIÓ DE INTERVENCIÓN APROBADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA O LA ENTIDAD COMPETENTE, EN INTERVENCIONES SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA ENTIDAD COMPETENTE.			X
PROPIEDAD HORIZONTAL			
COPIA DEL ACTA DEL ORGANO COMPETENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL O DEL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, AUTORIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS SOMETIDAS AL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.			X
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES EN RIESGO POR DAÑOS EN LA ESTRUCTURA			
CONCEPTO TÉCNICO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL O DISTRITAL ENCARGADA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO U ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE OPONE REFORZAR EL INMUEBLE.			X

1211

EQUIPAMIENTOS EN SUELOS OBJETO DE ENTREGA DE CESIONES ANTICIPADAS			
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.			X
INFORMACION QUE SOPORTE EL ACCESO DIRECTO AL PREDIO OBJETO DE CESIÓN D[illegible]SDE UNA VÍA PUBLICA VEHICULAR EN LAS CONDICIONES DE LA NORMA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE.			X
TRÁMITE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE OTORGÓ LA LICENCIA ORIGINAL			
LICENCIAS ANTERIORES O EL INSTRUMENTO QUE HAGA SUS VECES CON LOS RESPECTIVOS PLANOS.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIAS DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO			
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.			X
COPIA DE LOS PLANOS DE DISEÑO DEL PROYECTO.			X
DOCUMENTOS PARA OTRAS ACTUACIONES			
AJUSTES DE COTAS Y ÁREAS			
COPIA DEL PLANO CORRESPONDIENTE.			X
APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL			
PLANOS DE ALINDERAMIENTO.			X
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE OTORGÓ LA LICENCIA: COPIA DE LA LICENCIA Y DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.			X
PARA LICENCIAS URBANÍSTICAS QUE HAYAN PERDIDO SU VIGENCIA: MANIFESTACIÓN EXPRESA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO EN LA QUE CONSTE QUE LA OBRA APROBADA ESTÁ CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD.			X
CUADRO DE ÁREAS O PROYECTO DE DIVISIÓN.			X
BIENES DE INTERÉS CULTURAL: ANTEPROYECTO O AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN APROBADA.			X
AUTORIZACIÓN PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTÉCNICOS.			X
APROBACIÓN DE PISCINAS			
PLANOS DE DISEÑO Y ARQUITECTÓNICOS (NSR-10).			X
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DE SUELOS.			X
MODIFICACIÓN DEL PLANO URBANÍSTICO, DE LEGALITACION Y DEMAS PLANOS			
COPIA DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN, SUS MODIFICACIONES, PRÓRROGA Y/O REVALIDACIÓN, O EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APROBÓ EL DESARROLLO O ASENTAMIENTO Y LOS PLANOS QUE HACEN PARTE DE LAS MISMAS.			X
PLANOS QUE CONTENGAN LA NUEVA PROPUESTA URBANÍSTICA OBJETO DE APROBACIÓN.			X
CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA Y USO DE SUELO			
DIRECCIÓN OFICIAL DEL PREDIO O SU UBICACIÓN SI SE ENCUENTRA EN SUELO RURAL.			X
ANTECEDENTES URBANÍSTICOS COMO LICENCIAS Y DEMÁS, EN CASO DE EXISTIR.			X
BIENES DESTINADOS AL USO PÚBLICO O CON VOCACIÓN AL USO PÚBLICO			
PLANO RECORD DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE USO PÚBLICO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.			X

CONDICIÓN DE LA RADICACIÓN

RADICACIÓN EN LEGAL Y DEBIDA FORMA

RADICACION INCOMPLETA X

ACTUANDO EN CALIDAD DE SOLICITANTE ( ) APODERADO (X) MANDATARIO ( ) DE LA PRESENTE SOLICITUD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (O ACTO DE RECONOCIMIENTO) DEBIDAMENTE FACULTADO PARA ELLO, RECONOZCO QUE ÉSTA NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS REGLAMENTADOS, SIN PERJUICIO DE LO CUAL INSISTO EN SU RADICACIÓN INCOMPLETA, Y SOY RESPONSABLE DE COMPLETARLA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SO PENA DE ENTENDERSE DESISTIDA. (VER ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.2 IBÍDEM).

OBSERVACIONES

1. Falta firma de solicitante en formato de revisión de proyectos. Este se encuentra en las instalaciones de la curaduría primera.
2. Aportar documentos de identificación y representación legal del municipio de Manizales.
3. Aportar acta de titulación de inmuebles No. 0003 de 03 de febrero de 2005.
4. El poder presentado debe ser debidamente autenticado ante notaria.
5. Aportar copias completas de las resoluciones aprobadas inicialmente junto con sus respectivos planos arquitectónicos.
6. Aportar copia de tarjeta profesional, copia de certificación de vigencia (con fecha de expedición no mayor a seis meses) y copia de certificaciones que acrediten experiencia mínima de tres (3) años de ejercicio del Arquitecto relacionado como Director de la construcción responsable en el Formulario Único Nacional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional para tal fin, en uno o varias actividades, tales como construcción, diseño estructural, diseño de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos, interventoría o supervisión técnica, o acreditar estudios de posgrado en el área de construcción, estructuras, geotecnia o ingeniería sísmica.
7. Aportar copia de certificaciones que acrediten experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras o estudios de posgrado del Ingeniero Civil Estructural responsable del diseño estructural relacionado en el Formulario Único Nacional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional para tal fin.
8. Aportar copia de certificaciones que acrediten experiencia mayor de cinco (5) años en diseño geotécnico de fundaciones del Ingeniero Civil Geotecnista responsable relacionado en el Formulario Único Nacional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de posgrado en el área de geotécnica.
9. En el estudio de suelos falta firma o sello y tarjeta del profesional responsable.
10. Presentar planos arquitectónicos y estructurales en formato AutoCAD.
11. NO UTILIZAR PAPEL RECICLADO O PAPEL ECOLÓGICO, USAR PAPEL BLANCO NORMAL.
12. NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HUMEDA, USAR BOLIGRAFO NORMAL DE TINTA A BASE DE ACEITE (EJEMPLOS BOLIGRAFO BIC, KILOMETRICO ENTRE OTROS).
13. Se le informa que para subsanar las curas antes descrito de estas observaciones cuenta con un plazo máximo hasta el día 05 de diciembre del año 2023.
14. ESTAS OBSERVACIONES SON PRELIMINARES AL MOMENTO DE LA RADICACIÓN, PENDIENTE REVISIÓN TECNICA PARA DETERMINAR SI HAY OBSERVACIONES FALTANTES.

NOMBRE: NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA

CEDULA: 1.007.339.811 FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023

1212

WILLIAM ENRIQUE TABOADA DIAZ
NIT: 79657386-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 6 19 31 LC 1, Montería, Córdoba, Colombia
Tel. 7892842
Email. contabilidadc1monteria@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764054570664 válida desde 2023-08-25 hasta 2024-02-25 rango desde FEWT1701 hasta FEWT1860.

Cliente:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT :	901752045
Dirección:	CARRERA 45 # 27-28, Montería, Córdoba, Colombia
Teléfono:	3103199848
Email:	aulas2023.12@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	21/10/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEWT1774
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:51:00
FECHA FIRMADO:	20/10/2023 11:51:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	10	2023	21	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	03	CARGO FIJO	WSD	1,00	$353.348,00	19,00	0,00	$353.348,00

Notas:
CARGO FIJO RADICADO 23001-1-23-0202

SON: (cuatrocientos veinte mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 2f07074ccd713a75a5a23d9750246a91de1e797040ec7f4e3f26db64411dc63edd7ea6c122d72db8befaa3ccb79eacfd

Subtotal:	$353.348,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$67.136,00
Total:	$420.484,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$353.348,00	19,00%	$67.136,00

Firma Digital: ymCTYLmi1/CC+ZUbLjng1NOTu6lUA8XxcbiOtJn0Yo+UtYB2NhGDiBx6ls64bzv/Ok0gtbfNolx+C8NLid3v6g2t9lqkqk9APswKlpgIroR+VgbAQg
oDe4ElgRiO+XAn vTSk514y==5VRTcrBOJogXvCs9s6omSNTehqcAXXHydv+CPZYqsqR9wJW14+WTz RQETvpYx+Zn7nTyyH1GpDi4xGMmEyHSGf4R8
+mqqxOYpXTFaankTv72W3Qch69G loqBe9D0IpCJ84rrqOh7pwUhILq2n5zYpNekRnKBkRC0+JaxxoWCrXRzcM8oHEoTydWTF9rqKUHRB1YDuIAE
LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.959.534-0
© facturatech

1213

Bancolombia informa Transferencia en App Pymes por $420,484.00 desde cta *2814 a ct...

Transferencia exitosa

Comprobante No. 65106
19 Oct 2023 - 11:02 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 420.484,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Observaciones

Producto destino

Ahorros - Bancolombia
966 - 886058 - 97

Añadir a favoritos ☆

I.E. ESCUELA RURAL MIXTA EL CONGO

9.1 I.E ESCUELA RURAL MIXTA EL CONGO

1214

FORMATO DE RADICACION

Curaduría Urbana
Primera de Montería

WILLIAM ENRIQUE TABOADA DIAZ

Curador Urbano Primero de Montería

Cra 6 Nº. 19-31 Local 1 Barrio Chuchurubí
Montería - Córdoba

Teléfonos: 789 28 42 - 301 501 6263

N° CONSECUTIVO
02304
NUMERO DE RADICACION
23001-1-23-0228
FECHA DE RADICACION
23 DE NOVIEMBRE DE 2023

TIPO DE SOLICITUD

LICENCIA URBANÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN PARA EDIFICACIÓN DOTACIONAL EN UN (1) PISO EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO – SEDE EL CONGO

INFORMACION DEL USUARIO

TITULAR	MUNICIPIO DE MONTERÍA	**C.C. / NIT:**	800096734-1
SOLICITANTE	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	**C.C. / NIT:**	1.007.339.391
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	Cra 6 Nº 62B 32 Edificio Sexta Avenida Ofi. 618		
DIRECCION DEL INMUEBLE	LOTE CASERIO EL CONGO # CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO – SEDE E. CONGO		
CORREO ELECTRONICO	aulas2023.12@gmail.com	**CEL / TELEFONO:**	3103199848

INFORMACION DEL PREDIO

DIRECCION DEL PREDIO	LOTE CASERIO EL CONGO # CENTRO EDUCATIVO	**BARRIO/ URBANIZACION**	N/A
MATRICULA INMOBILIARIA	140-105505	**ESTRATO**	N/A
REFERENCIA CATASTRAL	N/A		
ÁREA DE ACTIVIDAD	AGROSILVOPASTORIL		

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS GENERALES	**SI**	**NO**	**N/A**
COPIA DE CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DEL INMUEBLE.	X		
FORMULARIO UNICO NACIONAL (ADOPTADO POR EL MVCT).		X	
COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.	X		
PODER ESPECIAL DEBIDAMENTE OTORGADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.	X		
COPIA DE DOCUMENTO O DECLARACION PRIVADA DE IMPUESTO PREDIAL O IDENTIFICACION DEL PREDIO.		X	
COPIA MATRICULA O TARJETA PROFESIONAL DE LOS PROFESIONALES INTERVINIENTES EN EL TRAMITE Y COPIA DE LAS CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS QUE ACREDITEN SU EXPERIENCIA.		X	
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIA DE URBANIZACIÓN			
A. MODALIDAD DESARROLLO			
PLANO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO DEL PREDIO.			X
PLANO DE PROYECTO URBANISTICO FIRMADO.			X
CERTIFICADO INDICANDO DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PUBLICOS O DECLARACION PRIVADA DE AUTOPRESTACION.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
B. MODALIDAD SANEAMIENTO			
COPIAS DE LICENCIAS DE URBANIZACION, SUS MODIFICACIONES Y REVALIDACIONES JUNTO CON LOS PLANOS URBANISTICOS APROBADOS CON BASE EN LOS CUALES LAS OBRAS DE URBANISMO FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPEREN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
CERTIFICACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LAS OBRAS DE URBANISMO FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPERAN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
PLANO DE PROYECTO URBANISTICO FIRMADOS POR EL ARQUITECTO RESPONSABLE DEL DISEÑO.			X
COPIA DE SOLICITUD DE ENTREGA DE LAS AREAS DE CESION PUBLICA EJECUTADAS RADICADA ANTE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DISTRITALES COMPETENTES.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
C. MODALIDAD REURBANIZACIÓN			
COPIA DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN, SUS MODIFICACIONES Y REVALIDACIONES O LOS ACTOS DE LEGALIZACIÓN, CON LOS RESPECTIVOS PLANOS URBANISTICOS APROBADOS.			X
PLANO DEL NUEVO PROYECTO URBANÍSTICO FIRMADO POR EL PROFESIONAL RESPONSABLE.			X
PLANO TOPOGRÁFICO CON EL CUAL SE TRAMITÓ LA LICENCIA O EL ACTO DE LEGALIZACIÓN DEL AREA OBJETO DE REURBANIZACIÓN.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES LICENCIA DE PARCELACION			
PLANO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DEL PREDIO, FIRMADO POR EL PROFESIONAL COMPETENTE.			X
PLANO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN, FIRMADO POR ARQUITECTO.			X
COPIAS DE LAS AUTORIZACIONES QUE SUSTENTAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES, EN CASO DE AUTOABASTESIMIENTO.			X
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIA DE PARCELACION PARA SANEAMIENTO			
COPIA DE LA LICENCIA VENCIDA DE PARCELACIÓN Y CONSTRUCCION EN SUELO RURAL, SU MODOFICACIONES Y REVALIDACIONES JUNTO CON LOS PLANOS APROBADOS CON BASE EN LOS CUALES LA OBRAS FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPEREN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LAS OBRAS FALTANTES POR EJECUTAR NO SUPEREN EL 20% DEL AREA TOTAL DE LAS CESIONES DEFINIDAS EN LA LICENCIA VENCIDA.			X
PLANO DEL PROYECTO DE PARCELACION, FIRMADO POR UN ARQUITECTO RESPONSABLE DEL DISEÑO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES LICENCIA DE SUBDIVISIÓN			
A. MODALIDAD SUBDIVISIÓN URBANA Y RURAL			
PLANO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ANTES Y DESPUÉS DE LA SUBDIVISIÓN.			X
B. MODALIDAD RELOTEO			
PLANO BASE EN EL CUAL SE URBANIZARON LOS PREDIOS OBJETO DE SOLICITUD.			X
PLANO QUE SEÑALE LOS PREDIOS RESULTANTES DE LA DIVISIÓN PROPUESTA.			X
DOCUMENTOS RECONOCIMIENTO DE EDIFICACIONES			
PLANO DE LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN, FIRMADOS POR ARQUITECTO RESPONSABLE.			X
COPIA DEL PERITAJE TÉCNICO QUE DETERMINE LA ESTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y PROPUESTA PARA LAS INTERVENCIONES.			X
DECLARACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, ENTENDIDA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN			
MEMORIA DE CÁLCULOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES.		X	
MEMORIAS DE DISEÑO DE LOS ELEMENTO NO ESTRUCTURALES.		X	
COPIA DE LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DE SUELOS / INVESTIGACION MINIMA TITULO E NSR-10.	X		
PLANO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO	X		
EL PROYECTO ARQUITECTONICO	X		
Revisión independiente de los diseños estructurales			
EDIFICACIONES QUE TENGAN O SUPEREN LOS 2.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.			X
EDIFICACIONES QUE EN CONJUNTO SUPEREN LOS 2.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.			X
EDIFICACIONES QUE DEBAN SOMETERSE A SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE.			X
EDIFICACIONES QUE TENGAN MENOS DE 2.000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA, QUE CUENTEN CON LA POSIBILIDAD DE TRAMITAR AMPLIACIONES QUE ALCANCEN O SUPEREN LOS 2000 M2.			X
EDIFICACIONES DE MENOS DE 2000 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA QUE DEBAN SOMETERSE A SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE.			X
EL PROYECTO CONSTRUCTIVO GENERA 5 O MAS UNIDADES DE VIVIENDA PARA TRANSFERIR A TERCEROS.			X
Para las condiciones anteriores, adjuntar los siguientes documentos:			
MEMORIA DE LOS CÁLCULOS Y PLANOS ESTRUCTURALES, FIRMADOS POR EL REVISOR INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES.			X
MEMORIAL FIRMADO POR EL REVISOR INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, EN EL QUE CERTIFIQUE EL ALCANCE DE LA REVISIÓN.			X
BIEN DE INTERÉS CULTURAL			
ANTEPROYECTO O AUTORIZACIO DE INTERVENCION APROBADA POR EL MINISTERIO DE CULTURA O LA ENTIDAD COMPETENTE, EN INTERVENCIONES SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA ENTIDAD COMPETENTE.			X
PROPIEDAD HORIZONTAL			
COPIA DEL ACTA DEL ÓRGANO COMPETENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL O DEL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, AUTORIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.			X
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES EN RIESGO POR DAÑOS EN LA ESTRUCTURA			
CONCEPTO TÉCNICO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL O DISTRITAL ENCARGADA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO U ÓRDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA QUE ORDENE REFORZAR EL INMUEBLE.			X

1215

EQUIPAMIENTOS EN SUELOS OBJETO DE ENTREGA DE CESIONES ANTICIPADAS			
CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.			X
INFORMACIÓN QUE SOPORTE EL ACCESO DIRECTO AL PREDIO OBJETO DE CESIÓN DESDE UNA VÍA PÚBLICA VEHICULAR EN LAS CONDICIONES DE LA NORMA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE.			X
TRÁMITE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE OTORGÓ LA LICENCIA ORIGINAL			
LICENCIAS ANTERIORES O EL INSTRUMENTO QUE HAGA SUS VECES CON LOS RESPECTIVOS PLANOS.			X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN LICENCIAS DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO			
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.			X
COPIA DE LOS PLANOS DE DISEÑO DEL PROYECTO.			X
DOCUMENTOS PARA OTRAS ACTUACIONES			
AJUSTES DE COTAS Y ÁREAS			
COPIA DEL PLANO CORRESPONDIENTE.			X
APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL			
PLANOS DE ALINDERAMIENTO.			X
PRESENTACIÓN DE SOLICITUD ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE OTORGÓ LA LICENCIA: COPIA DE LA LICENCIA Y DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.			X
PARA LICENCIAS URBANÍSTICAS QUE HAYAN PERDIDO SU VIGENCIA: MANIFESTACIÓN EXPRESA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO EN LA QUE CONSTE QUE LA OBRA APROBADA ESTÁ CONSTRUIDA EN SU TOTALIDAD.			X
CUADRO DE ÁREAS O PROYECTO DE DIVISIÓN.			X
BIENES DE INTERÉS CULTURAL: ANTEPROYECTO O AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN APROBADA.			X
AUTORIZACIÓN PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTÉCNICOS.			X
APROBACIÓN DE PISCINAS			
PLANOS DE DISEÑO Y ARQUITECTÓNICOS (NSR-10).			X
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y DE SUELOS.			X
MODIFICACIÓN DEL PLANO URBANÍSTICO, DE LEGALIZACION Y DEMAS PLANOS			
COPIA DE LA LICENCIA DE URBANIZACIÓN, SUS MODIFICACIONES, PRÓRROGA Y/O REVALIDACIÓN O EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE APROBO EL DESARROLLO O ASENTAMIENTO Y LOS PLANOS QUE HACEN PARTE DE LAS MISMAS.			X
PLANOS QUE CONTENGAN LA NUEVA PROPUESTA URBANÍSTICA OBJETO DE APROBACIÓN.			X
CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA Y USO DE SUELO			
DIRECCIÓN OFICIAL DEL PREDIO O SU UBICACIÓN SI SE ENCUENTRA EN SUELO RURAL.			X
ANTECEDENTES URBANÍSTICOS COMO LICENCIAS Y DEMAS, EN CASO DE EXISTIR.			X
BIENES DESTINADOS AL USO PUBLICO O CON VOCACIÓN AL USO PUBLICO			
PLANO RECORD DE IDENTIFICACION DE ZONAS DE USO PÚBLICO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.			X

CONDICIÓN DE LA RADICACIÓN

RADICACIÓN EN LEGAL Y DEBIDA FORMA

RADICACION INCOMPLETA X

ACTUANDO EN CALIDAD DE SOLICITANTE ( ) APODERADO (**X**) MANDATARIO ( ) DE LA PRESENTE SOLICITUD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (O ACTO DE RECONOCIMIENTO) DEBIDAMENTE FACULTADO PARA ELLO, RECONOZCO QUE ÉSTA NO CUMPLE CON TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS REGLAMENTADOS, SIN PERJUICIO DE LO CUAL INSISTO EN SU RADICACIÓN INCOMPLETA, Y SOY RESPONSABLE DE COMPLETARLA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SO PENA DE ENTENDERSE DESISTIDA. (VER ARTÍCULO 2.2.6.1.2.1.2 IBÍDEM).

OBSERVACIONES

1. Falta firma de solicitante en formato de revisión de proyectos. Este se encuentra en las instalaciones de la curaduría primera.
2. Diligenciar todos los datos y firma a puño y letra del ingeniero civil responsable de los diseños de los elementos no estructurales en la casilla 5 del punto 5.2 de la página 3 del formulario único nacional. Este se encuentra en las instalaciones de la curaduría primera.
3. En el formulario único nacional el solicitante debe indicar en los puntos 5.1 si acepta o no ser notificado de todas las actuaciones relacionadas al trámite de licenciamiento a través de correo electrónico.
4. Aportar documentos de identificación y representación legal del municipio de Montería.
5. Aportar copia del Certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de la solicitud vigente o con fecha no mayor a un mes de la radicación del proyecto.
6. Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica identificación del predio.
7. El poder presentado debe ser debidamente autenticado ante notario.
8. Aportar acta de titulación de inmuebles No. 0005 de 15 de abril de 2005.
9. Aportar copia de tarjeta profesional, copia de certificación de vigencia (con fecha de expedición no mayor a seis meses) y copia de certificaciones que acrediten experiencia mínima de tres (3) años de ejercicio del Arquitecto relacionado como Director de la construcción responsable en el Formulario Único Nacional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional para tal fin, en una o varias actividades, tales como construcción, diseño estructural, diseño de elementos no estructurales, trabajos geotécnicos, interventoría o supervisión técnica, o acreditar estudios de posgrado en el área de construcción, estructuras, geotecnia o ingeniería sísmica.
10. Aportar copia de certificaciones que acrediten experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras o estudios de postgrado del Ingeniero Civil Estructural responsable del diseño estructural relacionado en el Formulario Único Nacional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional para tal fin.
11. Aportar copia de certificaciones que acrediten experiencia mayor de cinco (5) años en diseño geotécnico de fundaciones del Ingeniero Civil Geotecnista responsable relacionado en el Formulario Único Nacional, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la dirección de un profesional facultado para tal fin, o acreditar estudios de postgrado en el área de geotécnica.
12. En el estudio de suelos falta firma a puño y letra del profesional responsable.
13. Presentar planos arquitectónicos y estructurales en formato AutoCAD.
14. Memoria de los cálculos y diseños estructurales debidamente firmados a puño y letra por Ingeniero Civil responsable.
15. NO UTILIZAR PAPEL RECICLADO O PAPEL ECOLOGICO, USAR PAPEL BLANCO NORMAL.
16. NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HUMEDA, USAR BOLIGAFO NORMAL DE TINTA A BASE DE ACEITE (EJEMPLOS BOLIGRAFO BIC, KILOMETRICO ENTRE OTROS).
17. Se le informa que para subsanar los puntos antes descrito de estas observaciones cuenta con un plazo máximo hasta el día 10 de enero del año 2024.
18. ESTAS OBSERVACIONES SON PRELIMINARES AL MOMENTO DE LA RADICACION, PENDIENTE REVISIÓN TECNICA PARA DETERMINAR SI HAY OBSERVACIONES FALTANTES.
19. Si el ingeniero encargado del estudio de suelo es distinto al diseñador estructural, se debe incluir una casilla en el rotulo del plano de cimienta con nombre y número de matrícula profesional del Geotecnista para la firma del mismo, si el profesional responsable del estudio de suelos es el misma calculista debe especificar que firma por ambos estudios y/o diseños. De acuerdo a lo establecido en la NSR 10 título H Estudios Geotécnicos. Artículo H.1.1.2.1.
20. En los planos de elementos no estructurales debe incluir una casilla en el rotulo con nombre y número de matrícula profesional del Director de la construcción responsable relacionado en el Formulario Único Nacional para la firma puño y letra del mismo. De acuerdo a lo establecido en la NSR 10 título A Artículo A.1.3.6.5 literal (b).

NOMBRE: NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA

CEDULA: 1.007.339.391 **FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE**

1216

Montería, 08 Noviembre - 2023

CURADURIA URBANA PRIMERA DE MONTERÍA
K 6 19 31 Chuchurubi local 1
E-mail: cu1monteria@gmail.com
Tel: 3015016263 - 7892842
Montería- Córdoba

ASUNTO: Solicitud de licencia de Const. modalidad de ampliación

Cordial Saludo,

Yo, Nataly Espitia Vergara identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.339.391 de cotorra, realizo la entrega de los siguientes documentos;

1. Formulario Unico Nacional Diligenciado	7. Levantamiento Topografico y Documentos del profesional. (1 Plano
2. Cedula del solicitante	8. Diseño Arquitectonico y (3 Planos Documentos del profesional
3. Rut del Consorcio	9. Diseño Estructural (4) Planos Documentos del profesional
4. Certificado libertad y Tradición	10.
5. Poder Otorgado Por la Alcaldía	11.
6. Estudio de Suelos y Documentos del Profesional.	12.

Asociados al radicado identificado con numero _____
Del año _____

Atentamente, Nataly E.V.

C.C. 1.007.339.391

Correo electrónico: aula52023.12@gmail.com

Teléfono celular: 3103199848

Dirección: Edificio Sexta Avenida oficina 618.

Powered by CamScanner

10. ACTAS DE COMITÉ

11. PROGRAMACION DE OBRA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	67 días	mar 17/10/23	mar 2/01/24
2		INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL	64,5 días	mar 17/10/2	sáb 30/12/2
22		INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL	59,5 días	lun 23/10/2	sáb 30/12/2
33		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL	37,5 días	lun 30/10/2	mié 13/12/2
66		INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO	39 días	mar 14/11/23	mié 27/12/23
91		INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL	52,5 días	lun 30/10/2	vie 29/12/23
133		INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO	44 días	mar 14/11/23	mar 2/01/24
158		INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HORIZONTE	29 días	lun 27/11/23	vie 29/12/23
174		INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO - SEDE RURAL MIXTA LOS PERICOS	30,5 días	jue 23/11/2	jue 28/12/2
236		INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES - SEDE COL DE BTO DE LOS GARZONES	28 días	lun 20/11/2	jue 21/12/2
249		INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - SEDE PRINCIPAL	16 días	jue 7/12/23	mar 26/12/2
258		INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO - SEDE PRINCIPAL	37 días	mar 14/11/2	mar 26/12/2
284		INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL	25 días	mar 14/11/2	mar 12/12/2
292		INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL - SEDE RURAL MIXTA LA FLORIDA	36,5 días	mar 14/11/2	lun 25/12/2
333		INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA GABRIELA MISTRAL	30 días	vie 17/11/23	jue 21/12/23
346		INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO - SEDE RURAL MIXTA EL CONGO	40 días	mié 15/11/2	vie 29/12/23
428		INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL	40 días	mié 15/11/2	vie 29/12/23

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: mar 28/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

124

Costo	Predecesoras
$ 2.698.156.386,74	
$ 121.890.021,00	
$ 145.121.693,64	
$ 66.020.783,40	
$ 109.743.171,12	
$ 132.936.858,12	
$ 109.743.171,12	
$ 72.320.838,14	
$ 158.715.654,24	
$ 93.831.514,92	
$ 89.375.916,96	
$ 370.345.774,92	
$ 112.025.831,28	
$ 152.331.512,52	
$ 171.648.969,36	
$ 396.052.338,00	
$ 396.052.338,00	

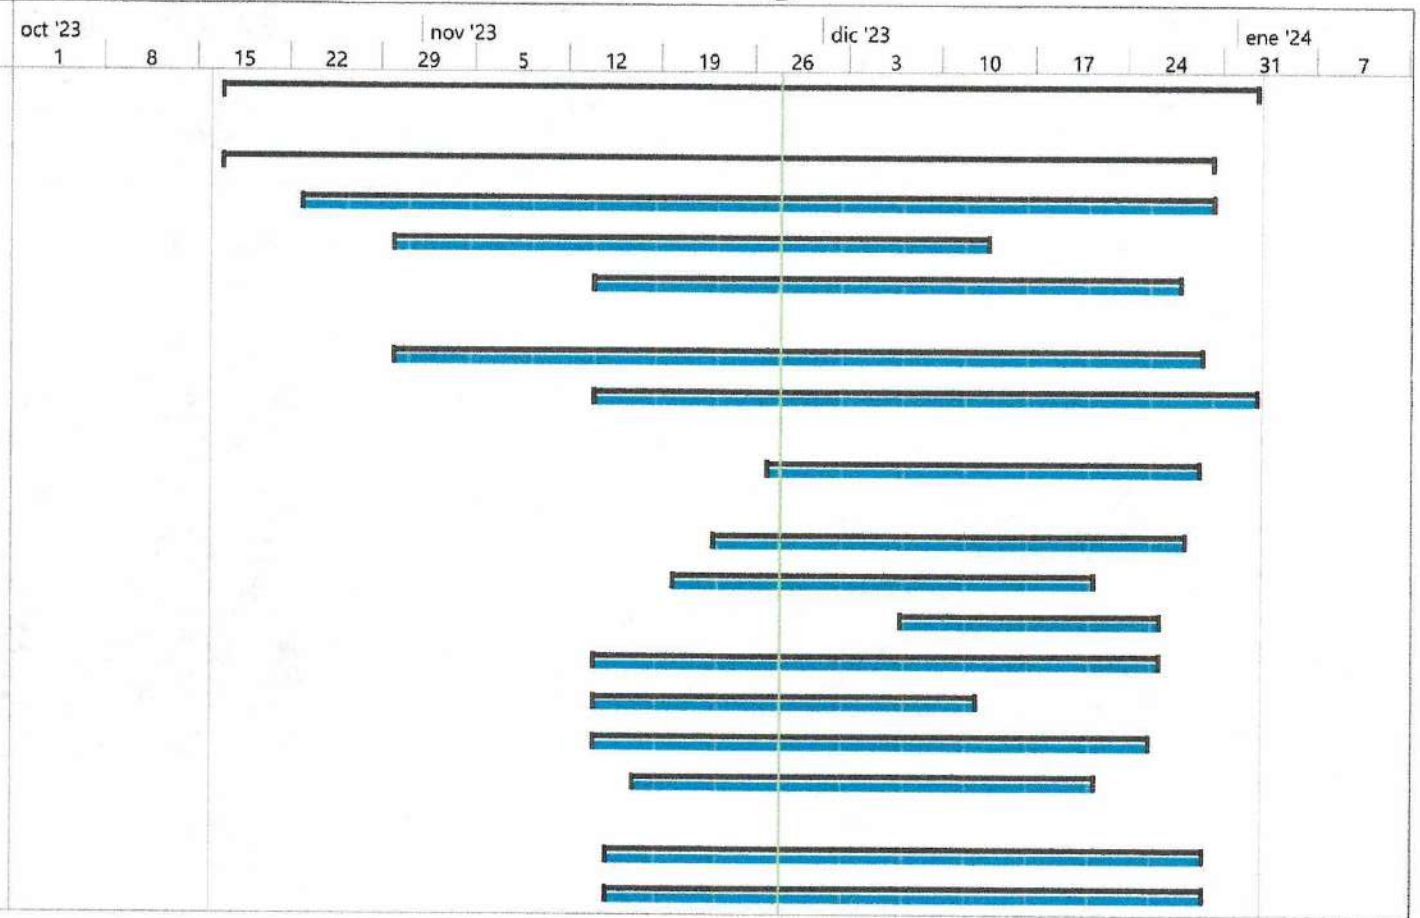

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: mar 28/11/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

12.FLUJO DE CAJA

PROYECTO COLEGIOS AULAS MONTERIA ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA	Año 2021												Total general
	Semana 42	Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52		
INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ 927.979,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 927.979,80
DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 4.128.763,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.128.763,32
RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO	$ 3.340.683,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.340.683,72
IMPERMEABILIZACION PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EN LAS AREAS AFECTADAS POR LA	$ 4.170.514,56	$ 2.853.530,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.024.075,06
DESMONTE PROVISIONAL DE SALIDAS Y PUNTOS ELECTRICOS Y POSTERIOR REINSTALACION	$ 10.978.409,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.978.409,40
DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ 495.402,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.402,60
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ 8.919.646,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.919.646,56
DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ 255.839,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 255.839,76
DESMONTE DE CANALETAS METALICAS Y BAJANTES EXISTENTES Y POSTERIOR REINSTALACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA	$ -	$ 909.919,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 909.919,56
SII CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	$ -	$ 27.421.994,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.421.994,16
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 MTS	$ -	$ 2.236.855,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.236.855,44
MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	$ -	$ 765.769,30	$ 2.297.304,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.063.073,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EDIL PARA IMPERMEABILIZACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	$ -	$ -	$ 2.123.884,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.123.884,52
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ -	$ 2.999.490,84	$ 2.141.779,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.140.270,04
SII CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	$ -	$ -	$ 20.487.084,63	$ 1.007.560,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.494.621,24
1240 -SII CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.80 X 7.00 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.095.422,72	$ 4.724.632,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.820.055,29
SII INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	$ -	$ -	$ -	$ 8.579.130,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.579.130,12
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUS EDIFICIOS INTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.966.183,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.966.183,16
INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO DE BATERIA SANITARIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ 9.423.006,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.423.006,12
LOCALIZACION ,TRAZADO Y REPLANTEO	$ -	$ 2.779.674,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.779.674,48
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ 1.184.744,55	$ 2.606.439,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.791.183,56
EXCAVACIÓN MANUAL	$ -	$ 1.309.774,31	$ 5.671.355,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.980.129,64
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ 19.537.458,35	$ 16.334.596,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.872.054,68
SII DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.047.175,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.047.175,76
VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.75MTS X 0.35MTS. INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.290.754,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.290.754,40
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E=0,10MT, , INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-61 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.039.479,48	$ 6.931.032,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.570.511,88
CONSTRUCCION DE CAÑUELA DE 0,30X0,20MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REFORZADA CON 2 0 1/2" Y ESTRIBOS Ø1/4" C@,20MTS PARA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.367.294,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.367.294,12
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ 550.116,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 550.116,56
RENOCION DE PINTURA	$ -	$ -	$ 7.947.042,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.947.042,84
RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ 24.199,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.199,32
DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMB	$ -	$ -	$ 19.786,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.786,80
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ 230.013,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230.013,36
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ 1.112.914,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.112.914,44
DESMONTE DE LLAVE DE CHORRO, INCLUYE SELLADO PROVISIONAL DE LOS PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS	$ -	$ -	$ 263.234,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 263.234,40
DESMONTE DE REJILLAS DE PISO DE 2", INCLUYE SELLADO PROVISIONAL DE PUNTOS SANITARIO	$ -	$ -	$ 28.176,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.176,72

1219

DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ 151.565,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151.565,04
MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y DE ENCHAPES DE PISO Y MUROS, INCLUYE RETIRO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA EN LAS JUNTAS.	$ -	$ -	$ 11.619.292,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.619.292,32
LEVANTE DE MURO PARA MESON EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ 136.159,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 136.159,32
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MURO	$ -	$ -	$ 316.013,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 316.013,23
ENCHAPE CERAMICA COLOR BLANCO PARA MURO DE MESON	$ -	$ -	$ 98.472,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98.472,00
DESMONTE DE PUERTA Y MARCO METALICO	$ -	$ -	$ 465.492,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 465.492,60
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ 1.072.847,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.072.847,16
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGUN LINEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ 2.740.384,76	$ 3.523.351,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.263.736,60
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO	$ -	$ -	$ 2.039.871,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.039.871,24
MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS DE DIVISIONES DE BAÑOS, INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO	$ -	$ -	$ 400.135,81	$ 2.160.730,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.560.866,00
MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS, INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ 1.383.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.383.624,00
S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ 343.902,08	$ 756.534,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.436,65
S/I CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	$ -	$ -	$ -	$ 100.775,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.775,40
S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	$ -	$ -	$ -	$ 14.207.684,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.207.684,24
S/I LAVAMANO DE COLGAR REFERENCIA MILANO O SIMILAR, INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.036.310,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.036.310,88
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ 2.246.481,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.246.481,60
PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ 1.028.926,04	$ 237.675,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.267.601,28
PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ 4.056.883,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.056.883,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 1,00 x 2.1m INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.425.539,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.425.539,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 0.75 x 1.5m INCLUYE ANTICORROSIVO Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60	$ -	$ -	$ -	$ 2.743.540,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.743.540,80
SUMINISTRO E INTALACION REJILLAS METALICAS DE PISO DE 2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.661,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.661,60
SUMINISTRO E INTALACION LLAVE TERMINAL DE CHORRO 1/2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.822,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.822,96
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TRIPLEX COLOR VERDE, H=2.0 MTS, PARA OBRAS	$ -	$ -	$ 1.058.686,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.058.686,20
DEMOLICION DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ 4.533.068,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.533.068,56
DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ -	$ -	$ 2.345.127,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.345.127,84
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO 4 HILADAS E= 0.20 m, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 539.376,26	$ 245.171,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 784.547,29
DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ -	$ -	$ -	$ 212.315,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 212.315,40
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 6.096.696,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.096.696,16
DESMONTE DE COLUMNAS VARIAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 632.934,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 632.934,72
DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ -	$ 555.624,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 555.624,96
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ 33.724,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.724,68
DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO EXISTENTE, NO INCLUYE ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ 665.280,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 665.280,00
DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE, NO INCLUYE ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ 633.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 633.600,00
ADECUACION DE AULAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ 1.595.598,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.595.598,84
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ 3.537.234,14	$ 4.180.367,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.717.601,76
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.376,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.376,88
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-83 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ 6.792.195,61	$ 27.440.470,26	$ 543.375,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.776.041,52
PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.419.719,75	$ 5.187.908,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.607.627,88
GUARDAESCOBA EN CERÁMICA H=0.10 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 992.527,31	$ 1.172.986,82	$ -	$ -	$ -	$ 2.165.514,13

PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.838.244,20	$ -	$ -	$ 2.838.244,20
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.621.892,56	$ -	$ -	$ 2.621.892,56
MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 234.365,80	$ -	$ -	$ 234.365,80
S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0.90 x 2.1m INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.838.027,60	$ -	$ -	$ 1.838.027,60
S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ 4.399.656,03	$ 19.065.376,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.464.832,16
INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA Y CIELO RASO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS, PARA OBRAS	$ -	$ -	$ 533.747,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 533.747,28
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ 3.335.320,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.335.320,56
DESMONTE DE CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 1.233.868,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.233.868,68
RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ 2.711.250,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.711.250,96
DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ 137.788,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 137.788,88
DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 282.496,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 282.496,16
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ 42.185,85	$ 25.263,51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.449,36
REMOCION DE PINTURA	$ -	$ -	$ 6.380.305,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.380.305,80
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ 293.542,25	$ 2.496.835,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.789.397,60
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ 162.928,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 162.928,92
DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ -	$ -	$ -	$ 495.402,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 495.402,60
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ 188.501,28	$ 188.501,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 377.002,56
DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I, REFUERZO DE 2 No 2 CORRIDAS Y AROS No 2 C/ 0.15 M.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.772,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.772,08
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 M X 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I, REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4",	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.654,89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 467.654,89
VIGA DE CORONA DE 0.20 X 0.20 DE 21 Mpa, INCLUYE REFUERZO DE 4 2 1/2" Y AROS DE 2 3/8" @ 0.20m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.527.534,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.527.534,00
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.685,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 148.685,44
PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.895.829,99	$ 1.474.533,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.370.362,60
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.711.016,68	$ 2.711.016,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.422.033,32
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.633,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.633,92
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.568.228,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.568.228,36
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 314.218,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 314.218,08
S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.861.260,47	$ 7.543.002,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.404.263,44
ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536.709,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 536.709,36
PLACA EN CONCRETO 21 Np4, E= 0.10MT, INCLUYE REF, MALLA ELECTROSOLDADA D-83 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.403.359,71	$ 2.852.479,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.255.859,29
PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.098.063,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.098.063,56
S/ INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EXTRAIDO DE LA CERAMICA H= 0,10 CM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.758.630,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.758.630,72
P-01 -S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.961.737,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.961.737,40
S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ 15.552.023,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.552.023,52
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 MTS	$ -	$ -	$ 1.472.713,28	$ 883.627,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.356.341,25
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	$ -	$ -	$ 10.473.351,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.473.351,24
DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO EXISTENTE.	$ -	$ -	$ 712.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 712.800,00
DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE.	$ -	$ -	$ 443.520,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 443.520,00
S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 676.555,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 676.555,44
S/I LAVAMANO DE COLGAR REFERENCIA MILANO O SIMILAR, INCLUYE ADAPTOS DESAGUES Y GRIFERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 518.155,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 518.155,44
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T.E. 100/277V, 1260X160X80MM, LA	$ -	$ -	$ 2.244.671,20	$ 518.047,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.762.918,40
S/A VENTILADOR DE TECHO 132 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	$ -	$ -	$ -	$ 3.855.814,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.855.814,40

1224

SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE #12 AWG HFLS LIBRE DE HALOGENO EN TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE	$ -	$ -	$ 1.811.547,68	$ 371.695,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.983.442,56
SM PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,90 x 2,1m INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ 4.475.317,28	$ 1.032.765,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.508.082,81
SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR 120 VOL CABLE CALIBRE 12 AWG HF LS (LIBRE DE HALOGENO) TUBERIA SCH40 3/4" LIBRE DE	$ -	$ -	$ 882.392,84	$ 226.706,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.209.098,88
DESMONTE E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO SPLITT	$ -	$ -	$ -	$ 1.834.430,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.834.430,40
INSTITUCION EDUCATIVA GAÑO VIEJO PALOTAL - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SM CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ 1.058.686,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.058.686,20
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ 4.533.088,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.533.088,56
DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ -	$ -	$ 2.345.127,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.345.127,84
DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO 4 HILADAS E= 0.20 m, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 784.547,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 784.547,28
DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ -	$ -	$ 212.315,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 212.315,40
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ 6.098.956,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.098.956,16
DESMONTE DE COLUMNAS VARIAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ 532.934,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.934,72
DEMOLICION DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ 173.632,80	$ 381.992,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 555.624,96
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ 33.724,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.724,68
DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO EXISTENTE, NO INCLUYE ACCESORIOS	$ -	$ -	$ 665.280,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 665.280,00
DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE, NO INCLUYE ACCESORIOS	$ -	$ -	$ 633.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 633.600,00
ADECUACION DE AULAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ 1.595.593,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.595.593,84
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ 5.786.201,32	$ 1.929.400,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.717.601,76
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.376,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.376,88
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D 83 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.617.330,62	$ 9.128.710,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.776.041,52
PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.20X0.30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.803.813,94	$ 6.803.813,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.607.627,88
GUARDAESCOBA EN CERÁMICA H=0.10 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.421.118,64	$ 744.395,48	$ -	$ -	$ -	$ 2.165.514,12
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.838.244,20	$ -	$ -	$ -	$ 2.838.244,20
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.570,37	$ 2.247.422,19	$ -	$ -	$ 2.621.992,56
MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 234.385,80	$ -	$ -	$ 234.385,80
SM PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,90 x 2,1m INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 344.259,18	$ 772.661,62	$ 719.110,81	$ 1.938.827,61
SM CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ 3.617.494,96	$ 8.114.921,12	$ 8.114.921,12	$ 3.617.494,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.464.832,16
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HORIZONTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SM CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ 411.672,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 411.672,36
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ 2.693.824,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.693.824,32
ADECUACION FISICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LEVANTE DE MURO PARA MESON EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4,	$ -	$ -	$ 47.744,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.744,06
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ 2.298.106,07	$ 667.192,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.965.298,16
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.132.699,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.132.699,92
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.268.535,81	$ 1.167.052,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.435.588,76
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 972.074,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 972.074,40
SANSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	$ -	$ -	$ 4.281.844,03	$ 2.091.133,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.372.977,16
ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	$ -	$ -	$ 2.363.864,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.363.864,60
P-01 =SM PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.120.217,18	$ 160.031,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.280.248,21
SM CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.231.722,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.231.722,24

1222

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR PINTADA PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.747.445,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$	41.747.445,95
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 302.977,13	$ 1.312.900,88	$ -	$ -	$ -	$	1.615.878,01
INSTITUCION EDUCATIVA DESITO VOLAO - SEDE RURAL MIXTA LOS PERICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ 1.109.347,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.109.347,80
DESMONTE DE PROTECTOR DE VENTANAS	$ -	$ -	$ -	$ 127.178,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	127.178,04
DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ -	$ 24.272,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	24.272,16
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ 819.525,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	819.525,95
DEMOLICIÓN DE REDOBLON EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ -	$ 110.382,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	110.382,36
DEMOLICION DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ -	$ -	$ -	$ 275.738,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	275.738,76
DEMOLICION DE VIGA DINTEL DE 0,10 MTS X 0.20 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ -	$ 363.575,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	363.575,52
DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ -	$ -	$ -	$ 141.543,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	141.543,60
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 1.407.881,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.407.881,64
DESMONTE DE COLUMNAS VARIAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 443.054,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	443.054,04
DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ -	$ 1.047.731,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.047.731,52
DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO EXISTENTE, NO INCLUYE ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ 83.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	83.160,00
DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE, NO INCLUYE ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ 126.720,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	126.720,00
ADECUACION DE AULAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
EXCAVACIÓN MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ 824.732,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	824.732,04
RELLENO CON MATERIM. SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ 705.694,31	$ 3.055.408,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	3.760.593,13
S/I DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.303.563,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.303.563,64
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 958.051,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	958.051,28
PEDESTAL DE (0,3m X 0,3m X 0,75m) EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 810.548,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	810.548,61
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELEC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.531.821,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	5.531.821,90
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.904.913,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	2.904.913,44
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 P.S.I). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.006.239,82	$ 364.203,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	4.370.443,44
MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, REF. 3/8" @ 0.15 MTS, INCLUYE GRANITO PARA PLACA DE 0.60MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.752.251,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	11.752.251,72
LEVANTE DE MURO PARA MESON EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.637.634,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	7.637.634,84
LEVANTE DE CALADO DE CONCRETO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 691.986,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	691.986,24
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.366.865,85	$ 3.721.272,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$	7.088.138,64
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MURO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.536.533,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$	3.536.533,44
PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0,30X0,30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.083.219,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.083.219,72
ENCHAPE PARED PARA BAÑOS, COCINA Y ZONA DE LABORES MACEDONIA O SIMILAR BLANCO 25 X 35 HASTA 2.10 DE ALTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.313.829,00	$ 3.941.487,00	$ -	$ -	$ -	$	5.255.316,00
GUARDAESCOBA EN CERÁMICA H=0.10 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.021.788,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.021.788,24
PINTURA EN VINILO PARA FACHADAS (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.372.238,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$	2.372.238,00
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 906.158,88	$ -	$ -	$ -	$	906.158,88
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.948.470,48	$ -	$ -	$ -	$	1.948.470,48
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 777.659,52	$ -	$ -	$ -	$	777.659,52
S/INSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.098.381,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$	5.098.381,20
ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y PILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.890.931,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.890.931,68
P-01 -S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.981.737,40	$ -	$ -	$ -	$	8.981.737,40
S/I CUBIERTA EN LÁMINA FIBROCEMENTO, INCLUYE LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.505.443,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	8.505.443,76

1223

ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESVALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.209.647,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.209.667,52
S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.384.847,03	$ 1.621.228,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.986.075,93
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON 6 1/4 Y EST. 0 1/4 CADA 0.20 MTS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.615.878,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.615.878,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EDIL PARA IMPERMEABILIZACION, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 897.771,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 897.771,60
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 513.934,08	$ -	$ -	$ -	$ 513.934,08
SUMINISTRO E INTALACION LLAVE TERMINAL DE CHORRO 1/2".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.274,32	$ -	$ -	$ -	$ 108.274,32
PUNTO SANITARIOS DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.742.951,76	$ -	$ -	$ -	$ 1.742.951,76
PUNTO SANITARIOS DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.175,40	$ -	$ -	$ -	$ 193.175,40
CAJA DE REGISTRO DE 0.6X0.6X0.6 CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 2500 PSI REF: 1/4 @ 0.15MTS E.A.S. INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 855.930,96	$ -	$ -	$ -	$ 855.930,96
CAJAS DE REGISTRO PVC 20X20CM COLOR BLANCO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 381.936,08	$ -	$ -	$ -	$ 381.936,08
S/I TUBERIA SANITARIA 2" PVC, INCLUYE RELLENO SELECIONADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.186.847,96	$ -	$ -	$ -	$ 2.186.847,96
S/I TUBERIA SANITARIA 4" PVC, INCLUYE RELLENO SELECIONADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.683.471,96	$ -	$ -	$ -	$ 1.683.471,96
S/I LAVAMANO DE COLGAR REFERENCIA MILANO O SIMILAR, INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.036.310,88	$ -	$ -	$ -	$ 1.036.310,88
S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 674.555,44	$ -	$ -	$ -	$ 674.555,44
S/I LAVAPLATOS EMPOTRAR 0.53 MTS X 0.43 MTS ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 671.071,60	$ 851.788,00	$ -	$ -	$ 1.522.857,60
CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO D=2.00 Y H=1.50 SEGUN DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.811.827,68	$ -	$ -	$ 4.811.827,68
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.055.802,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.055.802,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO , 75 AMPERIOS, 240/120 VOLTIOS, LAMINA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.607,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.607,76
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.591.931,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.591.931,20
S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.570.409,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.570.409,60
SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE #12 AWG HFLS LIBRE DE HALOGENO EN TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.710.676,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.710.676,08
SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR 120 VOL CABLE CALIBRE 12 AWG HF LS (LIBRE DE HALOGENO) TUBERIA SCH40 3/4" LIBRE DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.065,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.065,92
INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES - SEDE COL DE BTO DE LOS GARZONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	$ -	$ -	$ -	$ 971.622,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 971.622,96
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ 2.590.344,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.590.344,24
DESCAPOTE MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ 2.388.272,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.388.272,04
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ 1.913.089,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.913.089,20
ADECUACION DE TERRENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ 61.355,60	$ 4.847.097,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.908.453,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.503.883,17	$ 37.972.545,07	$ 8.647.213,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.123.641,47
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.934.413,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.934.413,44
CUNETAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
S/I TUBERÍA DE PVC DE 6" PARA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN PATIO PRINCIPAL INCLUYE RELLENO ACOPLES PARA SU	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.697.246,00	$ 13.505.778,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.193.024,00
CAJA DE REGISTRO PARA DRENAR AGUA LLUVIA DEL PATIO PRINCIPAL EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI), DIMENSIONES DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 960.858,36	$ 847.816,20	$ -	$ -	$ 1.808.674,56
INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	$ -	$ -	$ -	$ 1.884.900,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.884.900,80
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ 1.165.787,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.165.787,04
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 2.308.654,32	$ 7.541.604,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.850.258,44
CUBIERTA Y PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RTA EN PERFIL PHR, PINTADA, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.474.721,38	$ 5.136.649,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.611.371,36
S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y AC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.520.273,28	$ 26.409.781,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.930.054,72

1224

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICOS INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.029.311,91	$ 4.104.232,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.133.544,60
INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ 1.058.686,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.058.686,20
DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACION DE 0,30 MTS X 0,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	$ -	$ -	$ 2.345.127,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.345.127,84
DEMOLICIÓN DE SOBRECIMIENTO 4 HILADAS E= 0,20 m, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ 784.547,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 784.547,28
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ 8.253.278,45	$ 6.838.430,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.091.709,16
DESMONTE DE COLUMNAS VARIAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 1.097.088,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.097.088,32
DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ -	$ 2.275.703,00	$ 598.870,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.874.573,53
POLIDEPORTIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.748.816,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.748.816,38
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.376,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.333.376,88
LEVANTE EN BLOQUE DE 0,15Mx0,20mX0,40M PARA CONFINAMIENTO CON MORTERO 1:4 H= 0.2m/s Y CONCRETO GROUTING EN DOVELAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.147.990,57	$ 7.015.497,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.163.488,52
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, ,INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-63 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.916.408,43	$ 113.931.423,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 177.937.832,16
MANTENIMIENTO DE PERFILES METALICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.471.252,80	$ 4.427.699,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.898.952,24
SII CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.712.834,70	$ 53.657.156,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.370.040,84
CERRAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.734.433,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.734.433,80
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.149.633,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.149.633,52
EXCAVACION MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 427.204,31	$ 1.851.218,66	$ -	$ -	$ -	$ 2.278.422,97
REMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACION GEOTECNISTA. INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.502.958,40	$ 900.197,76	$ -	$ -	$ 14.403.156,16
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.054.355,56	$ -	$ -	$ -	$ 6.054.355,56
VIGA DE CIMENTACION DE 0.30 X 0.30 DE 21 Mpa, INCLUYE REFUERZO DE 4 7 1/2" Y AROS DE 2 3/8" @ 0.20m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.473.940,00	$ -	$ -	$ -	$ 6.473.940,00
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:4, 4 HILADAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 813.811,87	$ 1.553.259,02	$ -	$ -	$ 2.368.870,89
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 M X 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.883.611,28	$ -	$ -	$ 4.883.611,28
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0,15MTS X 0,20MTS X 0,40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.168.129,36	$ 6.336.258,72	$ -	$ -	$ 9.504.388,08
ALFAJIAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.2Mpa (2500 PSI)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.813.512,36	$ 1.813.512,36
INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.778.503,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.778.503,96
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.534.242,33	$ 2.430.297,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.964.539,40
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICOS INCLUYE, PULIDA CON LIJA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.757.548,37	$ 1.887.049,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.644.598,04
CUBIERTA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.231.836,08	$ 557.800,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.849.806,28
SII CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.848.983,71	$ 15.939.935,89	$ -	$ -	$ -	$ 55.788.565,60
ISTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL - SEDE RURAL MIXTA LA FLOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SII CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ 883.154,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 883.154,60
RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ 338.664,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 338.664,48
DEMOLICION DE CALADOS. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	$ -	$ -	$ -	$ 902.491,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 902.491,36
DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	$ -	$ -	$ -	$ 198.088,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 198.088,64
REMOCION DE PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ 4.331.716,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.331.716,56
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ 2.198.791,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.198.791,32

1225

DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	$ -	$ -	$ -	$ 283.087,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283.087,20
DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 5KM	$ -	$ -	$ -	$ 1.205.222,02	$ 547.828,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.753.050,04
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 708.997,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 708.997,23
ADECUACION DE AULAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.635,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.057.635,12
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.115.590,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.115.590,04
VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25MTS X 0.35MTS INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.507.396,59	$ 8.517.803,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.025.359,73
DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I, REFUERZO DE 2 No 3 CORRIDAS Y AROS No 2 C/0.15 M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.413.973,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.413.973,76
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 M X 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.844.122,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.844.122,48
VIGA DE CORONA DE 0.29 X 0.20 DE 21 M/pa, INCLUYE REFUERZO DE 4 1 1/2" Y AROS DE 7 3/8" @ 0.20m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.922.539,48	$ 4.460.718,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.383.257,64
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938.081,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938.081,76
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521.099,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521.099,04
PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.742,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.742,76
MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, REF. 3/8" @ 0.15 MTS, INCLUYE GRANITO PARA PLACA DE 0.60MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.745.791,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.745.791,64
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.267.030,93	$ 4.261.831,31	$ -	$ -	$ 5.528.862,24
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 2 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 475.209,24	$ -	$ -	$ 475.209,24
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.807.024,65	$ -	$ -	$ 2.807.024,65
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 2 MANOS), PARA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 95.401,65	$ -	$ -	$ 95.401,65
SINSTALACIÓN DE ESTUCO PLASTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.314.048,59	$ 5.546.633,90	$ -	$ -	$ -	$ 9.860.682,49
ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 696.837,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 696.837,24
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0.10MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-93 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.053.753,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.053.753,80
PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 741.040,90	$ 7.694.524,34	$ 453.525,56	$ -	$ -	$ 8.889.090,80
GUARDAESCOBA EN CERÁMICA H=0.10 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.694.353,32	$ -	$ -	$ 1.694.353,32
P-01 -S1 PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.120.992,80	$ -	$ -	$ 5.120.992,80
S1 VENTANERÍA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.962.867,02	$ 5.962.867,02	$ -	$ 11.925.734,04
S1 CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.174.173,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.174.173,92
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON 0 1/4 Y EST. @ 1/4 CADA 0.20 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.331.767,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.331.767,80
S1 SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 676.555,44	$ -	$ -	$ 676.555,44
S1 LAVAMANO DE COLGAR REFERENCIA MILANO O SIMILAR. INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.030.310,68	$ -	$ -	$ 1.030.310,68
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.835.354,00	$ 259.023,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.144.377,60
S1 VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.819.518,00	$ 321.301,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.140.819,20
SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE #12 AWG HFLS LIBRE DE HALOGENO EN TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.163,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.975.163,64
SALIDA ELECTRICA PARA VENTILADOR 120 VOL CABLE CALIBRE 12 AWG HF LS (LIBRE DE HALOGENO) TUBERIA SCH40 3/4" LIBRE DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.612.131,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.612.131,84
INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA GABRIELA MISTRAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	$ 3.359.479,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.359.479,20
S1 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ 4.130.811,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.130.811,96
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	$ 800.318,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.318,64
ADECUACION DE TERRENO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL	$ 312.491,05	$ 6.351.003,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.663.495,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ 10.036.451,15	$ 14.051.031,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.087.482,76
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ 5.793.246,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.793.246,36
TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

1226

CUNETA EN CONCRETO DE 21Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR 0.30MX0.25M VACIADA IN SITU, INCLUYE TAPA EN REJILLAS	$ -	$ -	$ 3.444.529,76	$ 9.274.003,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.718.532,96
CUNETA EN CONCRETO DE 21Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR 0.60MX0.35M VACIADA IN SITU, INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y TODO	$ -	$ -	$ -	$ 17.606.647,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.606.647,68
CUNETA EN CONCRETO DE 21Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR 0.90MX0.55M VACIADA IN SITU, INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y TODO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.947.553,11	$ 25.138.301,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97.085.854,80
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO - SEDE RURAL MIXTA EL CONGO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOCALIZACION ,TRAZADO Y REPLANTEO	$ -	$ 1.017.260,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.017.260,64
CAMPAMENTO 50 m2 TABLA EN LAMINAS DE TEJA EN ASBESTO CEMENTO	$ -	$ 11.229.320,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.229.320,52
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2.0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ 571.266,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 571.266,96
DESCAPOTE MANUAL	$ -	$ 829.081,87	$ 119.297,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 948.379,28
ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.	$ -	$ -	$ 589.151,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 589.151,84
ENTIBADO DE MADERA O TABLEROS VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS ESTABLES, SEGÚN	$ -	$ -	$ 3.233.223,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.233.223,84
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ 175.339,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.339,56
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES MANUAL PARA ZAPATAS, INCLUYE RETIRO.	$ -	$ -	$ 2.543.156,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.543.156,88
EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS, INCLUYE RETIRO.	$ -	$ -	$ 1.098.232,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.098.232,08
REMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA., INCLUYE	$ -	$ -	$ 4.200.923,10	$ 840.184,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.041.107,72
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ 9.442.073,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.442.073,52
S/I DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	$ -	$ -	$ -	$ 1.529.548,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.529.548,92
CIMENTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 mpa (2200psi)	$ -	$ -	$ -	$ 592.442,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 592.442,40
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ 4.570.477,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.570.477,56
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE , VIBRADO, CURADO Y DEMÁS	$ -	$ -	$ -	$ 6.137.902,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.137.902,32
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS	$ -	$ -	$ -	$ 5.315.148,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.315.148,96
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 P.S.I). INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ 12.225.304,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.225.304,08
DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I, REFUERZO DE 2 No 3 CORRIDAS Y AROS No 2 C/0,15 M	$ -	$ -	$ -	$ 58.644,96	$ 175.934,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 234.579,84
ALFAJAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0.20 MTS EN CONCRETO DE 17.2Mpa (2500 PSI)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.381.930,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.381.930,76
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 M X 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.224.480,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.224.480,16
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA ZAPATAS.	$ -	$ -	$ -	$ 2.308.110,75	$ 153.874,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.461.984,80
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA VIGAS DE CIMENTACION.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.510.609,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.510.609,84
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA COLUMNAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.107.690,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.107.690,44
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA VIGAS DE CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.789.716,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.789.716,44
MAMPOSTERIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:4, 4 HILADAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.919.168,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.919.168,44
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.433.925,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.433.925,84
CUBIERTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.576.869,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.576.869,58
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.312.370,41	$ 31.879.698,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113.192.068,45
REDOBLON DE 0.20MTS X 0.10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0.20 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.811.203,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.811.203,68
REVESTIMIENTO Y ACABADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.429.034,83	$ 1.714.392,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.143.427,48
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.532.822,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.532.822,28

1227

PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 428.342,64	$ 8.133.510,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	8.556.852,80
PISOS Y ENCHAPES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0,10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-61 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.465.263,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	23.465.263,80
RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA, E=0.08 Y VIGAS 0.15 MTS X 0.20 MTS) , REF	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 471.123,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	471.123,84
PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.842.278,28	$ 3.743.772,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$	8.586.051,08
3 / INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EXTRAIDO DE LA CERAMICA H= 0,10 CM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.244.482,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$	1.244.482,80
PINTURAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.221.673,20	$ 1.221.673,20	$ -	$ -	$ -	$	2.443.346,40
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.455.366,00	$ -	$ -	$ -	$	1.455.366,00
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.827.080,96	$ -	$ -	$ -	$	2.827.080,96
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS), PARA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.373.568,57	$ 2.282.280,95	$ -	$ -	$ -	$	3.655.849,52
5/INSTALACION DE ESTUCO PLÁSTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.016.229,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	6.016.229,40
ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.421.212,09	$ 66.050,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$	5.587.263,08
CARPINTERIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
P-01 -SA PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.280.248,20	$ -	$ -	$ -	$	1.280.248,20
SA VENTANERÍA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.374.248,28	$ -	$ -	$ -	$	10.374.248,28
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.055.802,00	$ -	$ -	$ -	$	1.055.802,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 60X60X75 CM (MEDIDAS INTERNAS), INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.171.473,92	$ -	$ -	$ -	$	2.171.473,92
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1", TIPO DB SUBTERRÁNEA, INCLUYE EXCAVACIONES, PEGA PVC MAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.202.762,96	$ -	$ -	$ -	$	6.202.762,96
TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO , 75 AMPERIOS, 240/120 VOLTIOS, LAMINA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.607,76	$ -	$ -	$ -	$	397.607,76
PROTECCIONES ELECTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.770,80	$ -	$ -	$ -	$	245.770,80
SALIDAS ELÉCTRICAS - TOMACORRIENTES 120/220V	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.986.904,92	$ 283.843,56	$ -	$ -	$	2.270.748,48
ILUMINACION Y SALIDAS ELECTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.041.678,95	$ 720.239,85	$ -	$ -	$	5.761.918,80
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X18W, T8, 100/277V, 1260X100X80MM, LA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.144.377,60	$ -	$ -	$	4.144.377,60
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA DE 4.5 W, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787.109,40	$ -	$ -	$	787.109,40
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO BALA DE 7W, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 698.326,20	$ -	$ -	$	698.326,20
SA VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.487,95	$ 3.735.126,45	$ -	$	3.855.614,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
CAJA DE PASO PARA TUBERÍA METÁLICA EMT, PARA CIRCUITOS DERIVADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 809.592,40	$ -	$ -	$	809.592,40
ACCESORIOS E ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.193,20	$ 141.352,37	$ -	$	161.545,57
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 340.137,60	$ -	$	340.137,60
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN B.T.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA (MALLA ELECTRICA EN B.T.) EN CABLE 2/0 AWG, CON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.443.120,00	$ -	$	4.443.120,00
DICTAMEN Y CERTIFICACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
DICTAMEN DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP PARA REDES ELECTRICAS INTERNAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.435.200,00	$ -	$	4.435.200,00
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-

PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	$ -	$ -	$ -	$ 1.017.260,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.017.260,64
CAMPAMENTO 50 m2 TABLA EN LAMINAS DE TEJA EN ASBESTO CEMENTO	$ -	$ -	$ -	$ 5.293.743,90	$ 5.965.576,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.259.320,52
S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE, H=2,0 MTS. PARA OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ 571.266,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 571.266,96
DESCAPOTE MANUAL	$ -	$ -	$ -	$ 946.379,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 946.379,28
ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	$ -	$ -	$ -	$ 589.151,64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 589.151,64
ENTIGADO DE MADERA O TABLEROS VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS ESTABLES, SEGÚN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 606.229,47	$ 2.626.994,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.233.223,84
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.339,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.339,58
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES MANUAL PARA ZAPATAS, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.543.156,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.543.156,88
EXCAVACIONES MANUAL PARA VIGAS, INCLUYE RETIRO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.098.232,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.098.232,08
REMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA., INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.041.107,72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.041.107,72
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.442.073,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.442.073,52
S/I DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 855.300,77	$ 655.240,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.510.540,92
CIMENTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOLADO EN CONCRETO DE 15,2 mpa (2200psi)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 592.442,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 592.442,40
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.927.764,15	$ 642.723,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.570.477,55
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE , VIBRADO, CURADO Y DEMÁS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 671.333,07	$ 5.466.569,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.137.902,32
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.515.148,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.515.148,96
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 P.S.I.) INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS ACTIVIDADES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.225.304,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.225.304,05
DINTEL DE 10*20 CM DE 3.000 P.S.I. REFUERZO DE 2 No 3 CORRIDAS Y ARGS No 2 C/ 0,15 M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87.957,44	$ 146.612,40	$ -	$ -	$ -	$ 234.569,84
ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" @ 0,20 MTS EN CONCRETO DE 17,2Mpa (2500 PSI)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 893.224,04	$ 1.488.706,73	$ -	$ -	$ -	$ 2.381.930,77
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE 0,10 M X 0,20 M EN CONCRETO DE 3.000 P.S.I. REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.224.480,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.224.480,16
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA ZAPATAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.461.984,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.461.984,60
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA VIGAS DE CIMENTACION.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.148.250,62	$ 4.362.359,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.510.609,64
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA COLUMNAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.107.690,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.107.690,44
ACERO DE REFUERZO DE 420MPA (60.000 P.S.I.) PARA VIGAS DE CUBIERTA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.056.001,89	$ 3.723.714,56	$ -	$ -	$ -	$ 29.780.716,45
MAMPOSTERIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10*20*40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3, 4 HILADAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.469.688,17	$ 2.449.480,28	$ -	$ -	$ -	$ 3.919.168,45
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA-CEMENTO DE 0,10MTS X 0,20MTS X 0,40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 INCLUYE DOVELAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.433.925,84	$ -	$ -	$ -	$ 7.433.925,84
CUBIERTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.578.869,56	$ -	$ -	$ 14.578.869,56
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.670.539,50	$ 49.521.529,94	$ -	$ -	$ -	$ 113.192.069,44
REDOBLON DE 0,20MTS X 0,10MTS EN CONCRETO DE 17MPA (2500 PSI) CON Ø 1/4 Y EST. Ø 1/4 CADA 0,20 MTS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.611.203,68	$ -	$ -	$ -	$ 1.611.203,68
REVESTIMIENTO Y ACABADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.571.763,64	$ 3.271.663,64	$ -	$ -	$ -	$ 9.143.427,44
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.532.822,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.532.822,28
PAÑETE LINEAL MORTERO 1:4 PARA COLUMNAS Y MUROS Y DISTINTOS FILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.033.028,02	$ 3.533.826,78	$ -	$ -	$ -	$ 8.566.852,80
PISOS Y ENCHAPES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 0,10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA D-65 JUNTA DILATACION Y SELLO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.577.324,77	$ 15.887.939,03	$ -	$ -	$ -	$ 23.465.263,80
RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI(PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,09 Y VIGAS 0,15 MTS X 0,20 MTS) , REF	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166.855,36	$ 247.830,77	$ 56.438,71	$ 471.124,84

1229

PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 COLOR BLANCA INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.747.093,08	$ 8.638.857,11	$ -	$ 8.386.051,09
S/INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EXTRAIDO DE LA CERAMICA H=0,10 CM	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.244.492,80	$ -	$ 1.244.492,80
PINTURAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES INTERIORES.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 957.157,85	$ 1.476.188,45	$ 2.443.346,40
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 576.032,38	$ 879.283,63	$ 1.455.366,01
PINTURA A 2 MANOS CON VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO SEGÚN LÍNEA DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SUPERFICIES EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.119.052,83	$ 1.708.028,06	$ 2.827.080,89
PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS) PARA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.449.877,91	$ 2.212.071,59	$ 3.662.849,51
S/INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.745.816,74	$ 3.272.411,74	$ 6.018.229,48
ESTUCO LINEAL PARA MUROS,VIGAS ,COLUMNAS Y FILOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.089.555,40	$ 1.917.707,68	$ 5.507.263,08
CARPINTERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
P-01 -S/I PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 1.00 X 2.0M INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179.082,34	$ 384.838,51	$ 384.838,51	$ 331.492,84	$ 1.280.248,20
S/I VENTANEARÍA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.451.150,73	$ 3.118.449,63	$ 3.118.449,63	$ 2.660.189,29	$ 10.374.239,28
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTIVIDADES PRELIMINARES													
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE Cu 2xNo 8 + 1xNo 8 AWG, LSHF EN TUBERÍA PVC DE 1".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 535.232,96	$ 520.569,04	$ 1.055.802,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 60X60X75 CM (MEDIDAS EXTERNAS) INCLUYE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.818,64	$ 1.070.457,28	$ 2.171.413,92
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 1", TIPO DB SUBTERRÁNEA, INCLUYE EXCAVACIONES, PEGA PVC MAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.144.456,34	$ 3.058.316,60	$ 6.202.782,94
TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION													
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO , 75 AMPERIOS, 240/120 VOLTIOS, LAMINA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201.535,05	$ 196.042,72	$ 397.607,77
PROTECCIONES ELECTRICAS													
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 15 - 30 AMP.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.632,14	$ 121.178,68	$ 245.770,80
SALIDAS ELÉCTRICAS - TOMACORRIENTES 120/220V													
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE TOMA, INCLUYE CAJAS 4"X4" CON SUPLEMENTO, DUCTO PVC, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, PEGA PC, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG CU-LSHF 600V 75°C C CT, OBRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.151.143,33	$ 1.119.605,15	$ 2.270.748,48
ILUMINACION Y SALIDAS ELECTRICAS													
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE TOMACORRIENTE, CAJAS 12X12X5 CM CON TAPA TOMA DOBLE, DUCTO Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", ADAPTADORES TERMINAL,	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.109.273,85	$ 3.652.644,95	$ 5.761.918,80
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HERMÉTICA LED 2X40W, T8, 100/277V, 1200X100X80MM, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.144.377,60	$ 4.144.377,60
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA DE 4.5 W, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 787.109,40	$ 787.109,40
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO SALA DE 7W, LA LUMINARIA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETILAP Y EL RETIE, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 608.326,20	$ 608.326,20
S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.855.614,40	$ 3.855.614,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR													
CAJA DE PASO PARA TUBERÍA METÁLICA EMT, PARA CIRCUITOS DERIVADOS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.330,21	$ 359.252,19	$ 809.582,40
ACCESORIOS E ILUMINACION													
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE TENER CERTIFICADO RETIE.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.894,62	$ 79.650,94	$ 161.545,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE TENER CERTIFICADO RETIE.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 172.430,87	$ 167.706,73	$ 340.137,60
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN B.T.												

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA (MALLA ELÉCTRICA EN B.T.) EN CABLE 2/0 AWG, CON CUATRO VARILLAS DE COBRE DE 2.4 METROS Y CUADRICULAS, INCLUYE 6 COLAS, SOLDADURA EXOTÉRMICA, EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.443.120,00	$ 4.443.120,00
DICTAMEN Y CERTIFICACIONES												
DICTAMEN DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP PARA REDES ELECTRICAS INTERNAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.435.200,00	$ 4.435.200,00
Total general	$ 32.900.814,93	$ 89.714.044,56	$ 236.470.263,07	$ 202.531.515,95	$ 495.242.686,84	$ 805.842.342,89	$ 495.688.878,41	$ 271.656.219,27	$ 210.936.958,59	$ 65.958.732,36	$ 65.213.909,18	$ 2.698.156.367,0

17. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

13 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Formato	Secretaria de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
Contrato No.	LP-SIM-012-2023
Valor Contractual:	$ 2.847.134.379,00
Valor Etapa N°2 - Ejecucion:	$ 2.698.156.387,00
Plazo Etapa N°2 Ejecucion :	Dos (02) Meses y (15) Quince Dias
Tiempo de Ejecucion:	76
Fecha de Iniciación:	17/10/2023
Fecha de Vencimiento:	30 de Diciembre de 2023

OBJETO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Semana Número: 1 Del: 17/10/2023 Al: 22/10/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 5,00 días

Nombre del Supervisor IRIS SPATH CAMAÑO


AVANCE DEL CONTRATO SEMANA N° 1

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,22%	1,22%
Valor de la Obra programada:	$ 32.900.814,93	$ 32.900.814,93

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,00%	2,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 53.963.127,74	$ 53.963.128

GRÁFICA DE AVANCE

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,78%
Durante el periodo	1,22%	2,00%	
Acumulado actual	1,22%	2,00%	

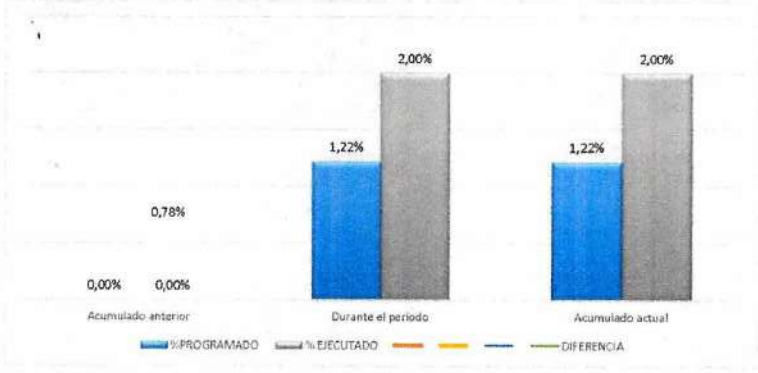


REGISTRO FOTOGRÁFICO

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LA I.E. EL RECUERDO



CERRAMIENTO I.E. GENERAL SANTANDER



DESMONTE DE CUBIERTA I.E. RANCHO GRANDE



DEMOLICION ANDENES I.E. GENERAL SANTANDER



1232

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la presente semana se realiza cerramiento en las instituciones educativas San Jose, General Santander, recuerdo y Rancho grande, asi mismo fueron realizadas todas las actividades preliminares de estas instituciones tal como localizacion y replanteo, desmontes , demoliciones entre otros.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la proxima semana y acorde a la programacion de obras del contratista se continua con los desmontes de aparatos sanitarios, retiros de material sobrante y rellenos.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La inversión de recursos económicos por concepto de ejecución de actividades físicas para el presente periodo semanal (octubre 17 hasta octubre 22 de 2023 corresponde aproximadamente CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTI OCHO PESOS MCTE ($ 53.963.128) lo que equivale a un avance aproximado del 2,00% vs un programado de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y TRES PESOS ($32.900.814,93), por lo cual la obra se encuentra presenta respecto a lo programado con un 1% de avance

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente de Interventoría Nombre: Arq. Carlos Alberto de la Ossa Bula
	Representante Legal Interventoría Nombre: Andres Felipe Buelvas Sepa
	Contratista Sim Nombre: Ing. Edwin Paternina

1233

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Formato	Secretaria de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
Contrato No.	LP-SIM-012-2023
Valor Contractual:	$ 2.847.134.379,00
Valor Etapa N°2 - Ejecucion:	$ 2.698.156.387,00
Plazo Etapa N°2 Ejecucion :	Dos (02) Meses y (15) Quince Dias
Tiempo de Ejecucion:	76
Fecha de Iniciación:	17/10/2023
Fecha de Vencimiento:	30 de Diciembre de 2023

OBJETO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Semana Número: 2 Del: 23/10/2023 Al: 29/10/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 12,00 días

Nombre del Supervisor IRIS SPATH CAMAÑO


AVANCE DEL CONTRATO SEMANA N° 2

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,33%	4,54%
Valor de la Obra programada:	$ 89.714.044,50	$ 122.614.859,43

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	7,00%	9,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 188.870.947,09	$ 242.834.075

GRÁFICA DE AVANCE

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	1,22%	2,00%	4,5%
Durante el periodo	3,33%	7,00%	
Acumulado actual	4,54%	9,00%	

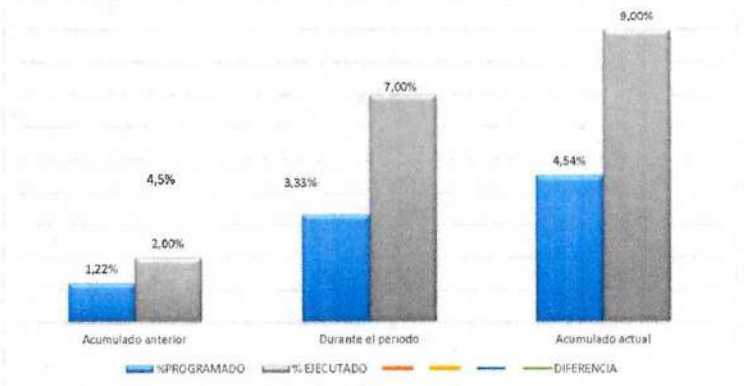

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RELLENO, COMPACTACION Y TOMA DE DESIDADES EN LA I.E. EL RECUERDO





DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LIMEZA DE JUNTAS EN LA I.E. SAN JOSE




DESMONTE DE CIELO RAZO Y ESTRUCTURAS EN LA I.E. GENERAL SANTANDER




1234

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la presente semana se continua cerramiento en las instituciones educativas San Jose, General Santander, recuerdo y Rancho grande, Mercedes Abrego, Divino niño, Pradera, Villa Margarita asi mismo fueron realizadas todas las actividades preliminares de estas instituciones tal como localizacion y replanteo, desmontes de aparatos sanitarios, retiro de material sobrante y rellenos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la proxima semana y acorde a la programacion de obras del contratista realizara actividades tales como instalacion de geotextil, malla electrosoldada, concreto para plantillas, levantes, mantenimiento de estructuras de cubierta y desmontes de cubierta

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La inversión de recursos económicos acumulados por concepto de ejecución de actividades físicas para el presente periodo semanal N°2 (octubre 23 hasta octubre 29 de 2023 corresponde aproximadamente DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 242.834.075) lo que equivale a un avance aproximado del 9,00% vs un programado de CIENTO VEINTI DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 122.614.859,43), por lo cual la obra se encuentra presenta respecto a lo programado con un 4,5% de avance

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente de Interventoría Nombre: Arq. Carlos Alberto de la Ossa Bula Representante Legal Interventoría Nombre: Andres Felipe Buelvas Serpa Contratista Sim Nombre: Ing. Edwin Paternina

1235

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Formato	Secretaria de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
Contrato No.	LP-SIM-012-2023
Valor Contractual:	$ 2.847.134.379,00
Valor Etapa N°2 - Ejecucion:	$ 2.698.156.387,00
Plazo Etapa N°2 Ejecucion :	Dos (02) Meses y (15) Quince Dias
Tiempo de Ejecucion:	76
Fecha de Iniciación:	17/10/2023
Fecha de Vencimiento:	30 de Diciembre de 2023

OBJETO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Semana Número: 3 Del: 30/10/2023 Al: 5/11/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 19,00 días


Nombre del Supervisor IRIS SPATH CAMAÑO

AVANCE DEL CONTRATO SEMANA N° 3

	SEMANAL	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**
Obra programada (%)	7,65%	12,20%	Obra Física Ejecutada (%)	7,00%	16,00%
Valor de la Obra programada:	$ 206.470.263,07	$ 329.085.122,50	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 188.870.947,09	$ 431.705.022

GRÁFICA DE AVANCE

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	4,54%	9,00%	4%
Durante el periodo	7,65%	7,00%	
Acumulado actual	12,20%	16,00%	

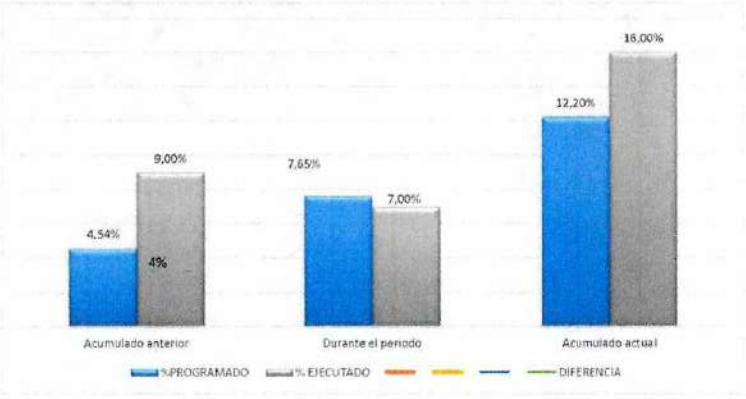

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO DE PLACA DE CONTRAPISO I.E. EL RECUERDO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE CUBIERTA I.E.RANCHO GRANDE



LEVANTE SOBRECIMIENTO ANDEN EN LA I.E. GENERAL SANTANDER



DESMONTE DE CIELO RASO Y CUBIERTA I.E. RANCHO GRANDE



7236

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la presente semana se continua cerramiento en las instituciones educativas San Jose, General Santander, recuerdo y Rancho grande, Mercedes Abrego, Divino niño, Pradera, Villa Margarita asi mismo fueron realizadas actividades tales como instalacion de geotextil, malla electrosoldada, concreto para plantillas, levantes, mantenimiento de estructuras de cubierta y desmontes de cubierta
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Para la proxima semana y acorde a la programacion de obras del contratista se continua con lla fundida de plantillas en concreto, instalacion de estructuras metalicas y de cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y electricas
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
La inversión de recursos económicos acumulados por concepto de ejecución de actividades físicas para el presente periodo semanal N°3 (octubre 30 hasta noviembre 05 de 2023 corresponde aproximadamente a CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 431.705.022) lo que equivale a un avance aproximado del 16,00% vs un programado de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 329.085.122,50), por lo cual la obra se encuentra presenta respecto a lo programado con un 12,20% de avance

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente de Interventoría Nombre: Arq. Carlos Alberto de la Rossa Bula Representante Legal Interventoría Nombre: Andres Felipe Buelvas Serpa Contratista Sim Nombre: Ing. Edwin Paternina

4234

Alcaldía de Montería SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Formato	Secretaria de Infraestructura
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código Formato:
		Pagina 1 de 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
Contrato No.	LP-SIM-012-2023
Valor Contractual:	$ 2.847.134.379,00
Valor Etapa N°2 - Ejecucion:	$ 2.698.156.387,00
Plazo Etapa N°2 Ejecucion :	Dos (02) Meses y (15) Quince Dias
Tiempo de Ejecucion:	76
Fecha de Iniciación:	17/10/2023
Fecha de Vencimiento:	30 de Diciembre de 2023

OBJETO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.

Semana Número: 4 Del: 6/11/2023 Al: 12/11/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 26,00 días

Nombre del Supervisor IRIS SPATH CAMAÑO


AVANCE DEL CONTRATO SEMANA N° 4

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,51%	19,70%
Valor de la Obra programada:	$ 202.531.545,95	$ 531.616.668,45

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	14,00%	30,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 377.741.894,18	$ 809.446.916

GRÁFICA DE AVANCE

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12,20%	16,00%	10%
Durante el periodo	7,51%	14,00%	
Acumulado actual	19,70%	30,00%	

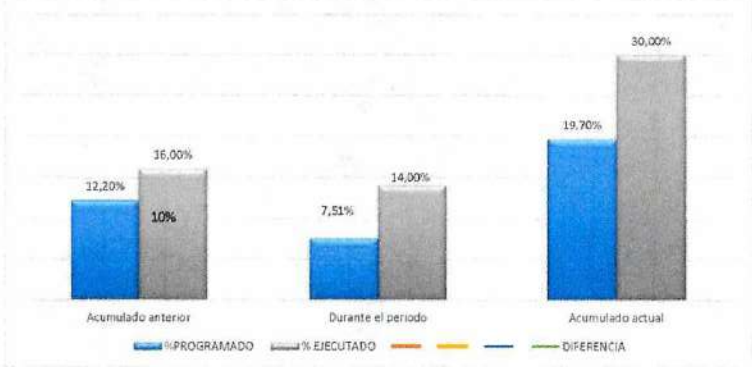

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLACA DE CONTRAPISO I.E. EL RECUERDO





ESTRUCTURA E INSTALACIÓN CUBIERTA I.E. RANCHO GRANDE



DEMOLICION MURO DE CERRAMIENTO I.E. MERCEDES ABREGO





PLACA DE CONTRAPISO ANDEN I.E. GENERAL SANTANDER





1238

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
Durante la presente semana se ontinua cerramiento en las instituciones educativas San Jose, General Santander, recuerdo y Rancho grande, Mercedes Abrego, Divino niño, Pradera, Villa Margarita asi mismo fueron realizadas actividades tales como fundida de plantillas en concreto, instalacion de estructuras metalicas y de cubiertas, instalaciones hidrosanitarias y electricas, demolicion muro de cerramiento
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Para la proxima semana y acorde a la programacion de obras del contratista se continua con la instalacion de estructuras metalicas, instalacion de cubiertas , construccion de redoblon, impermeabilizacion, insatalacion de llaves terminales e instalacion de protectores.
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO
La inversión de recursos económicos acumulados por concepto de ejecución de actividades físicas para el presente periodo semanal N°4 (noviembre 06 hasta noviembre 12 de 2023) corresponde aproximadamente a MIL SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1,077,373,845) lo que equivale a un avance aproximado del 39,93% vs un programado de QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SESISCIENTOS DIECISESIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 531.616.668,45), por lo cual la obra se encuentra presenta respecto a lo programado con un 19,70% de avance

OBSERVACIONES	FIRMAS
	Residente de Interventoría Nombre: Arq. Carlos Alberto de la Ossa Bula Representante Legal Interventoría Nombre: Andres Felipe Buelvas Serpa Contratista Sim Nombre: Ing. Edwin Paternina

1239

17.1. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL OBRA

1240

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901752045	6	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YURIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280966583	9458967245	E	2023/11/14	2023/11/16	BANCOLOMBIA	2	$6,963,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES vsp	cor	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irp	cet	inf	vio	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total
1	CC	72261352	BLANCO OCHOA EDILIAR ANTONIO		X																25-14	15	$1,612,400	$158,000	EPS010	15	$1,612,400	$64,500	CCF16	15	$1,612,400	$64,500	14-11	15	$1,612,400	$8,300	15	$0	$0	$0	
2	CC	73143152	CASTILLA NEGRETE PABLO EUGENIO		X																25-14	15	$2,175,000	$348,000	EPS005	15	$2,175,000	$87,000	CCF16	15	$2,175,000	$87,000	14-11	15	$2,175,000	$11,400	15	$0	$0	$0	
3	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	X	X																25-14	29	$3,364,000	$538,300	EPS037	29	$3,364,000	$134,600	CCF16	29	$3,364,000	$134,600	14-11	29	$3,364,000	$17,600	29	$0	$0	$0	
4	CC	71386445	FERNANDEZ MARTINEZ RUBERT JAMES	X	X																230801	16	$3,439,787	$550,400	EPS005	16	$3,439,787	$137,600	CCF16	16	$3,439,787	$137,600	14-11	16	$3,439,787	$18,000	16	$0	$0	$0	
5	CC	78710197	GARCIA CASTILLO JULIO CESAR	X																	25-14	14	$1,504,907	$240,800	EPS037	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	$0	
6	CC	6882634	GIRALDO VITOLA EDUARDO ALFREDO		X																25-14	15	$1,612,400	$258,000	EPS037	15	$1,612,400	$64,500	CCF16	15	$1,612,400	$64,500	14-11	15	$1,612,400	$8,500	15	$0	$0	$0	
7	CC	1067838657	GONZALEZ AHUZ MARIA INES	X																	230801	14	$1,504,907	$240,800	EPS010	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	$0	
8	CC	11041212	MANCILLA DIAZ ERNESTO MANUEL	X	X																230801	29	$3,117,307	$498,800	EPS009	29	$3,117,307	$124,700	CCF16	29	$3,117,307	$124,700	14-11	29	$3,117,307	$16,300	29	$0	$0	$0	
9	CC	23178952	PADILLA MEZA BEATRIZ ELENA	X																	230801	14	$1,504,907	$240,800	EPS002	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	$0	
10	CC	64702183	PADILLA MEZA BERENA PATRICIA	X																	230801	14	$1,504,907	$240,800	EPS002	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	$0	
11	CC	9084762	PAJARO VILLEGAS JAIME	X	X																	0	$0	$0	EPS002	29	$2,493,846	$99,800	CCF16	29	$2,493,846	$99,800	14-11	29	$2,493,846	$13,100	29	$0	$0	$0	
12	CC	30571396	RIVERA HOYOS MARIA ELENA	X																	230801	14	$3,009,814	$481,600	EPS037	14	$3,009,814	$120,400	CCF16	14	$3,009,814	$120,400	14-11	14	$3,009,814	$15,800	14	$0	$0	$0	
13	CC	78768867	ROJAS MARTINEZ RAUMER IVAN		X																230801	15	$1,612,400	$258,000	EPS048	15	$1,612,400	$64,500	CCF16	15	$1,612,400	$64,500	14-11	15	$1,612,400	$8,500	15	$0	$0	$0	
14	CC	50900611	VERGARA VIDAL DIXIA ESTHER	X																	230801	14	$1,504,907	$240,800	EPS005	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	$0	
Total	Afiliados(14)																						$22,467,643	$4,035,100			$20,961,489	$1,198,600			$20,961,489	$152,200			$0	$0		

2023/12/04 04:24 PM

7297

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901792545	6	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	780966583	9458967345	E	2023/11/14	2023/11/06	BANCOLOMBIA	7	$6,963,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,395,100	$8,900	$0	$4,404,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,643,100	$3,300	$0	$1,646,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,029,600	$4,100	$0	$2,033,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$722,400	$1,500	$0	$723,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$157,200	$400	$0	$157,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$157,200	$400	$0	$157,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,198,600	$2,400	$0	$1,201,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$1,198,600	$2,400	$0	$1,201,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,198,600	$2,700	$0	$1,201,300
EPS MUTUAL SER	EPS348	806,008,394	7	1	$64,500	$200	$0	$64,700
EPS SURA (ANTES SURAMD)	EPS010	800,088,702	2	2	$124,700	$300	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$379,700	$800	$0	$380,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$220,200	$500	$0	$220,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$409,500	$900	$0	$480,400
TOTAL				14	$6,949,500	$14,400	$0	$6,963,900

en línea

1242

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901752045	6	CONSORCIO ALIAS MONTERIA 2023	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 38	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	76832281	9459820923	E	2023/11/14	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	17	$1,447,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	svp	vct	irl	slp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	T	tot
1	CC	1067339191	ESPITIA VERGARA NATALY STEFANIA	X																	230201	30	$1,624,000	$259,900	ESSC62	30	$1,624,000	$65,000	CCF16	30	$1,624,000	$65,000	14-11	30	$1,624,000	$8,500	30	$0	$0	SI		190
2	CC	1233340425	HORAZO VEGA MARIA ANGEL	X																	230301	30	$1,276,000	$204,200	EPS041	30	$1,276,000	$51,100	CCF16	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	$6,700	30	$0	$0	SI		31
3	CC	1066172341	LOBO GONZALEZ MOISES ELIAS	X	X																230201	15	$1,276,000	$204,200	EPS017	15	$1,276,000	$51,100	CCF16	15	$1,276,000	$51,100	14-11	15	$1,276,000	$6,700	15	$0	$0	SI		31
4	CC	11002321	MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS	X																	230201	30	$1,624,000	$259,900	EPS037	30	$1,624,000	$65,000	CCF16	30	$1,624,000	$65,000	14-11	30	$1,624,000	$8,500	30	$0	$0	SI		190
Total	Afiliados(4)																						$5,800,000	$928,200			$5,800,000	$232,200			$5,800,000	$232,200			$5,800,000	$30,400		$0	$0			

1243

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901750085	6	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULITA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012158759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	76832281	9459820923	E	2023/11/14	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	17	$1,447,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$928,100	$15,700	$0	$943,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$204,200	$3,500	$0	$207,700
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	3	$724,000	$12,200	$0	$736,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$30,400	$600	$0	$31,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$30,400	$600	$0	$31,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$232,200	$4,000	$0	$236,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$232,200	$4,000	$0	$236,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$232,200	$4,000	$0	$236,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$65,000	$1,100	$0	$66,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$116,100	$2,000	$0	$118,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$51,100	$900	$0	$52,000
TOTAL				4	$1,423,000	$24,300	$0	$1,447,300


ANEXO N° 2.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

1244

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA**	**64,63 días**	**lun 16/10/23**	**sáb 30/12/23**	**$ 2.698.156.386,74**
2		INICIO	0 días	lun 16/10/23	lun 16/10/23	$ 0,00
3		**INSTITUCION EDUCATIVA RANCHO GRANDE - SEDE PRINCIPAL**	**30 días**	**mar 17/10/23**	**mar 21/11/23**	**$ 121.890.021,00**
23		**INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO - SEDE PRINCIPAL**	**33 días**	**lun 23/10/23**	**jue 30/11/23**	**$ 145.121.693,64**
34		**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL**	**14 días**	**lun 30/10/23**	**jue 16/11/23**	**$ 66.020.783,40**
67		**INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA MI AMIGUITO**	**39 días**	**mar 31/10/23**	**vie 15/12/23**	**$ 109.743.171,12**
92		**INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER - SEDE PRINCIPAL**	**27 días**	**lun 30/10/23**	**jue 30/11/23**	**$ 132.936.858,12**
134		**INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA EL DIVINO NIÑO**	**53 días**	**lun 30/10/23**	**sáb 30/12/23**	**$ 109.743.171,12**
159		**INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CIELO - SEDE ESCUELA RURAL MIXTA HORIZONTE**	**29 días**	**mar 31/10/23**	**lun 4/12/23**	**$ 72.320.838,14**
175		**INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO - SEDE RURAL MIXTA LOS PERICOS**	**30,5 días**	**mar 7/11/23**	**mié 13/12/23**	**$ 158.715.654,24**
237		**INSTITUCION EDUCATIVA LOS GARZONES - SEDE COL DE BTO DE LOS GARZONES**	**28 días**	**mié 8/11/23**	**lun 11/12/23**	**$ 93.831.514,92**
250		**INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA - SEDE PRINCIPAL**	**16 días**	**jue 9/11/23**	**mar 28/11/23**	**$ 89.375.916,96**

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: sáb 4/11/23




1295

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
259		**INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO - SEDE PRINCIPAL**	**52 días**	**mar 31/10/23**	**sáb 30/12/23**	**$ 370.345.774,92**
285		**INSTITUCION EDUCATIVA LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL**	**25 días**	**mar 14/11/23**	**mar 12/12/23**	**$ 112.025.831,28**
293		**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL - SEDE RURAL MIXTA LA FLORIDA**	**36,5 días**	**mar 7/11/23**	**mar 19/12/23**	**$ 152.331.512,52**
334		**INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON - SEDE ESCUELA URBANA MIXTA GABRIELA MISTRAL**	**30 días**	**mar 17/10/23**	**mar 21/11/23**	**$ 171.648.969,36**
347		**INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO - SEDE RURAL MIXTA EL CONGO**	**56 días**	**jue 26/10/23**	**sáb 30/12/23**	**$ 396.052.338,00**
429		**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTY - SEDE PRINCIPAL**	**44 días**	**jue 9/11/23**	**vie 29/12/23**	**$ 396.052.338,00**
511		FIN	0 días	lun 16/10/23	lun 16/10/23	$ 0,00

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: sáb 4/11/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manuall
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


1296

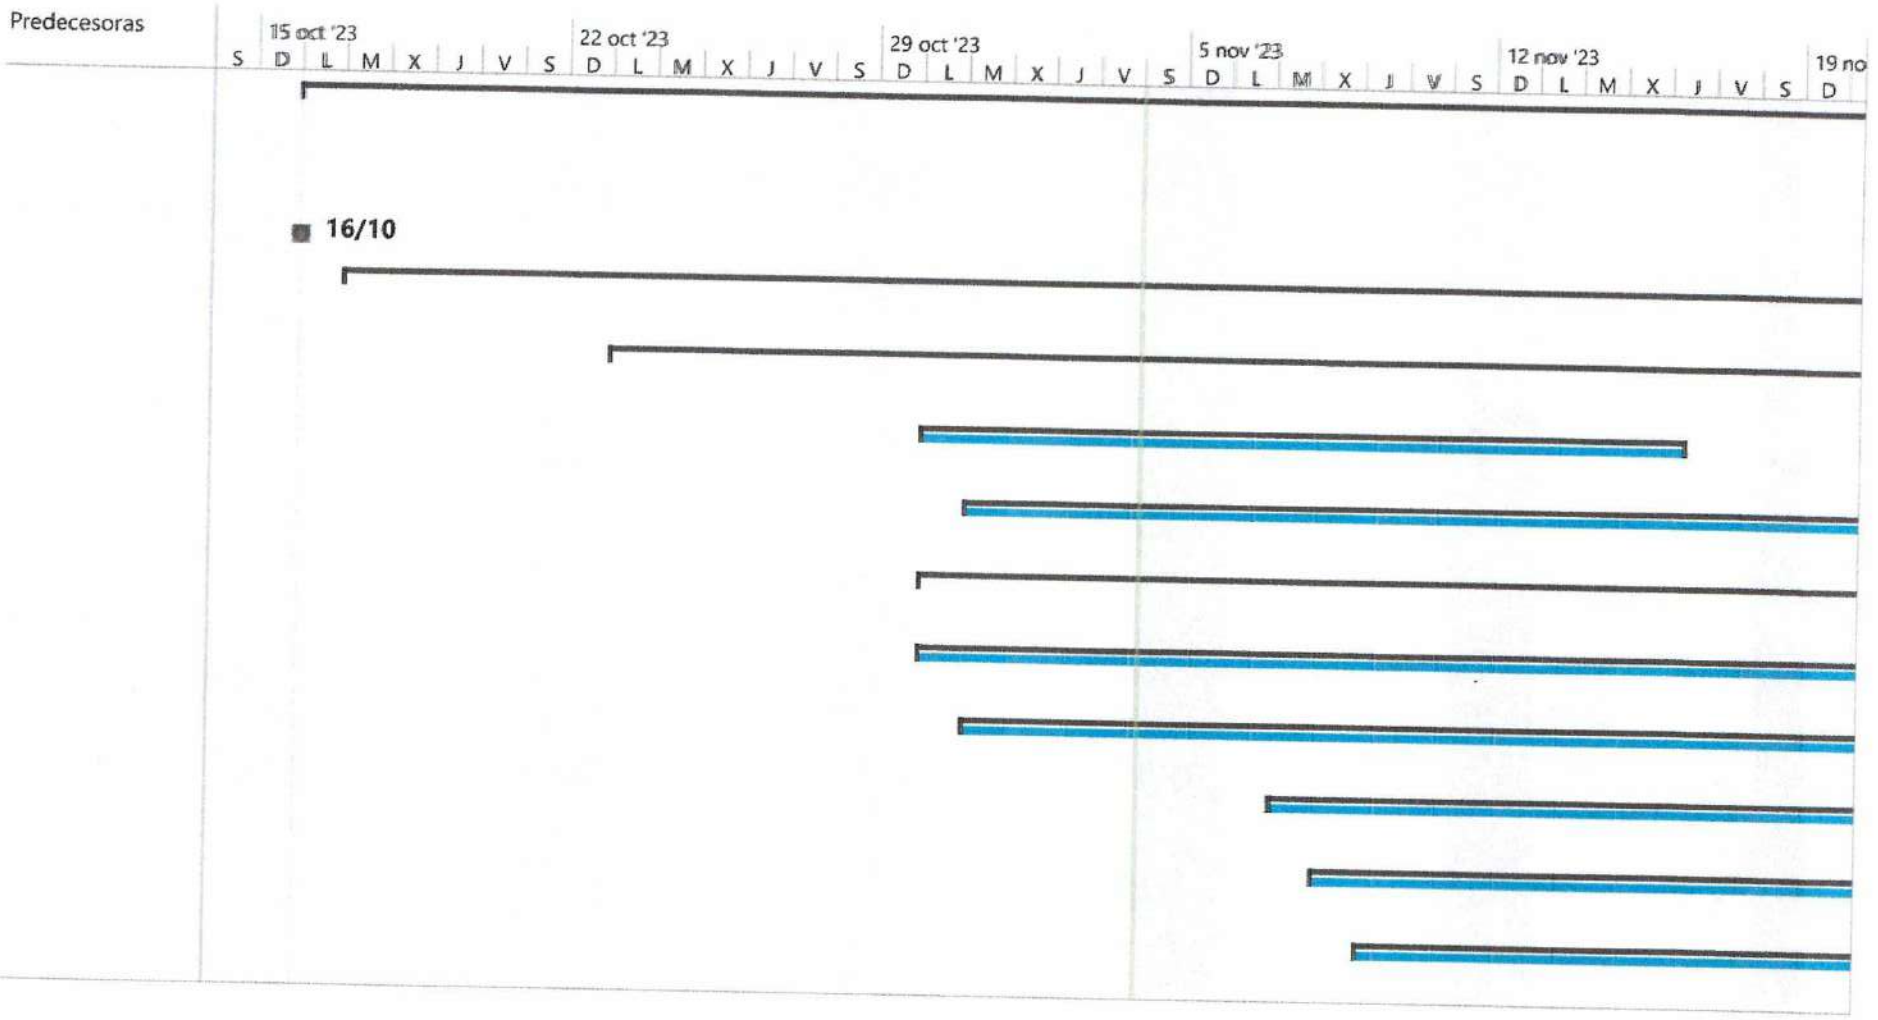

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: sáb 4/11/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

1247

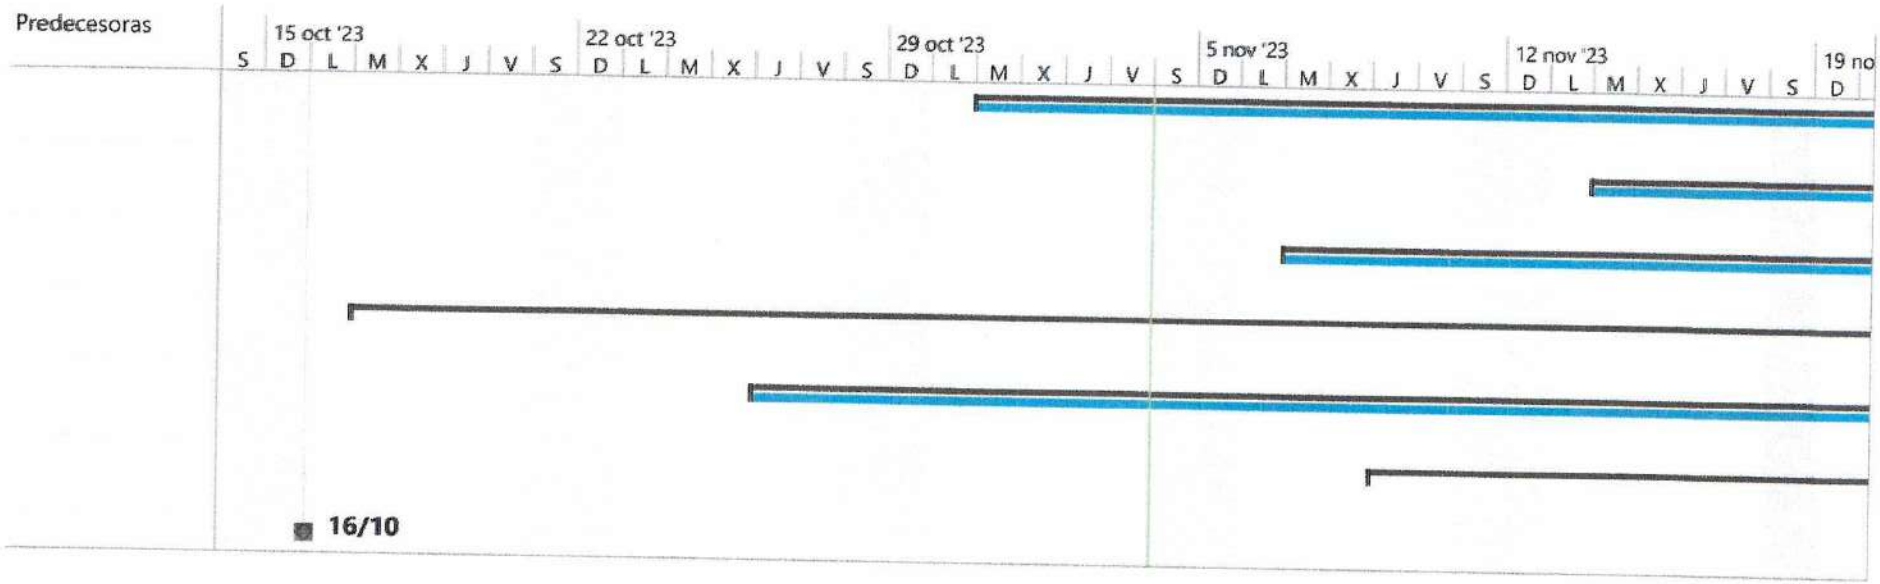

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: sáb 4/11/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

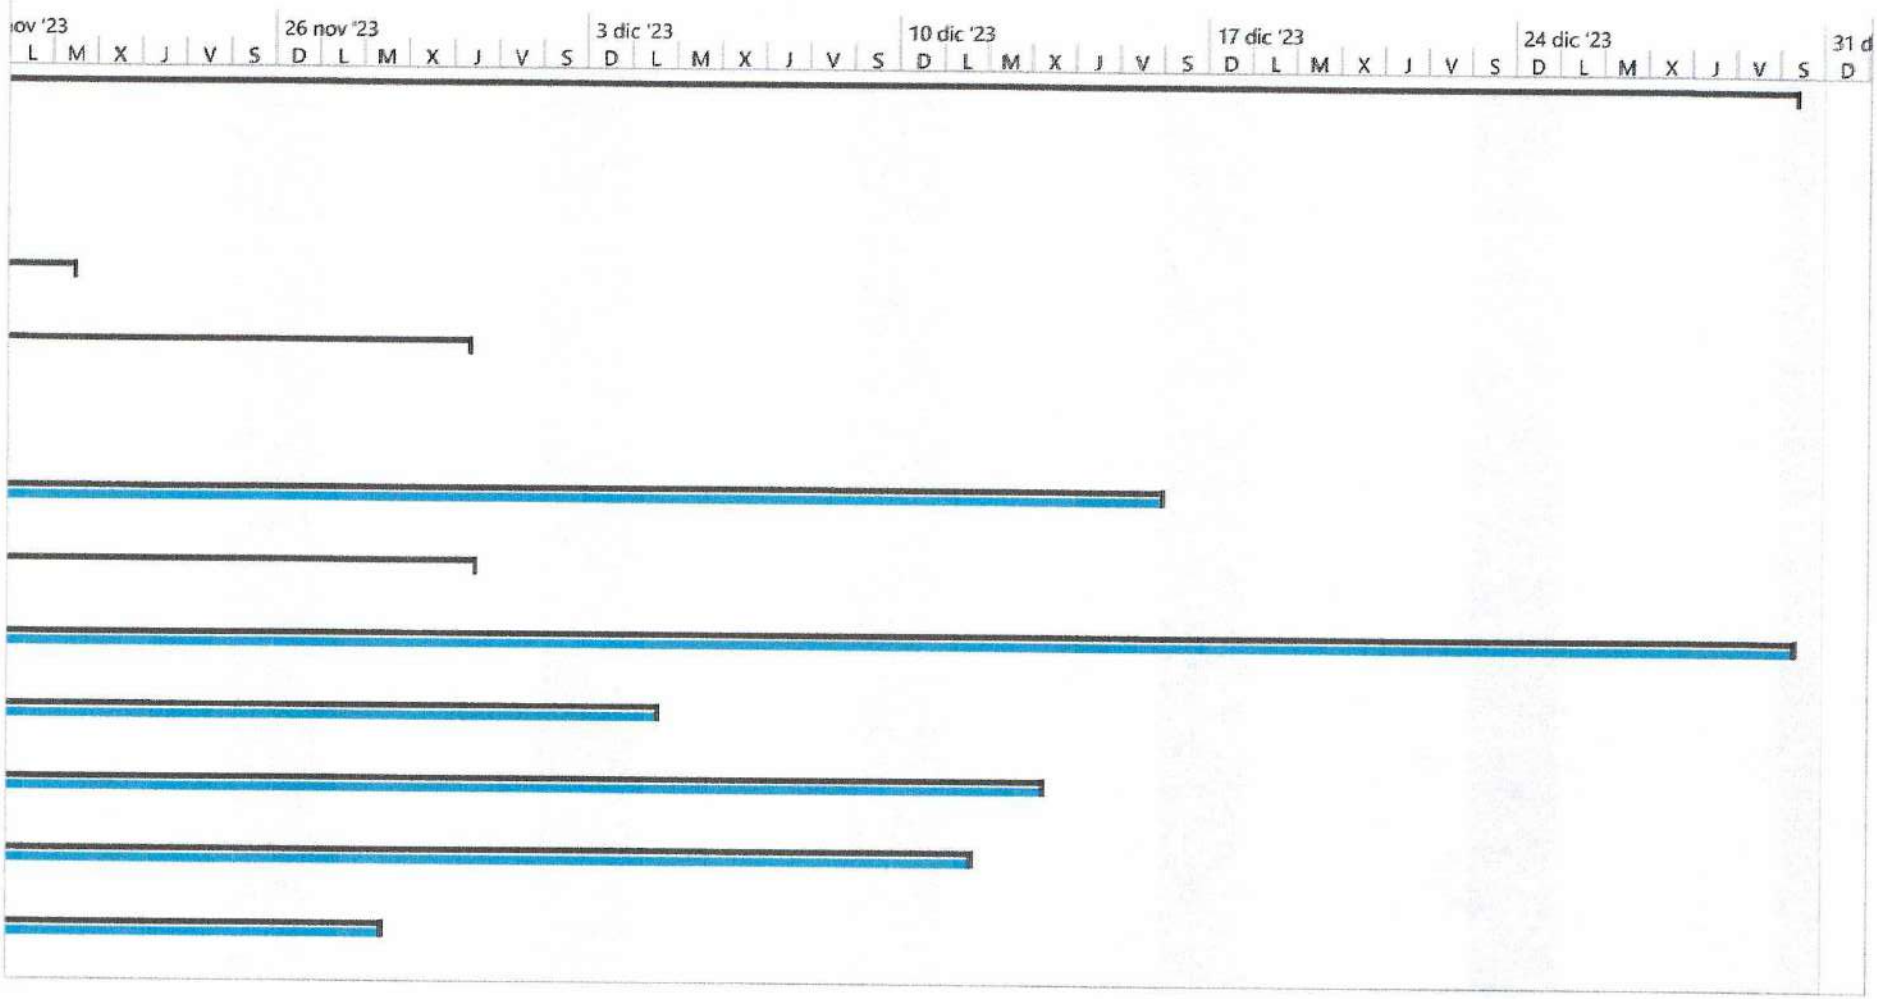

Proyecto: PROYECTO COLEGIO
Fecha: sáb 4/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

1249

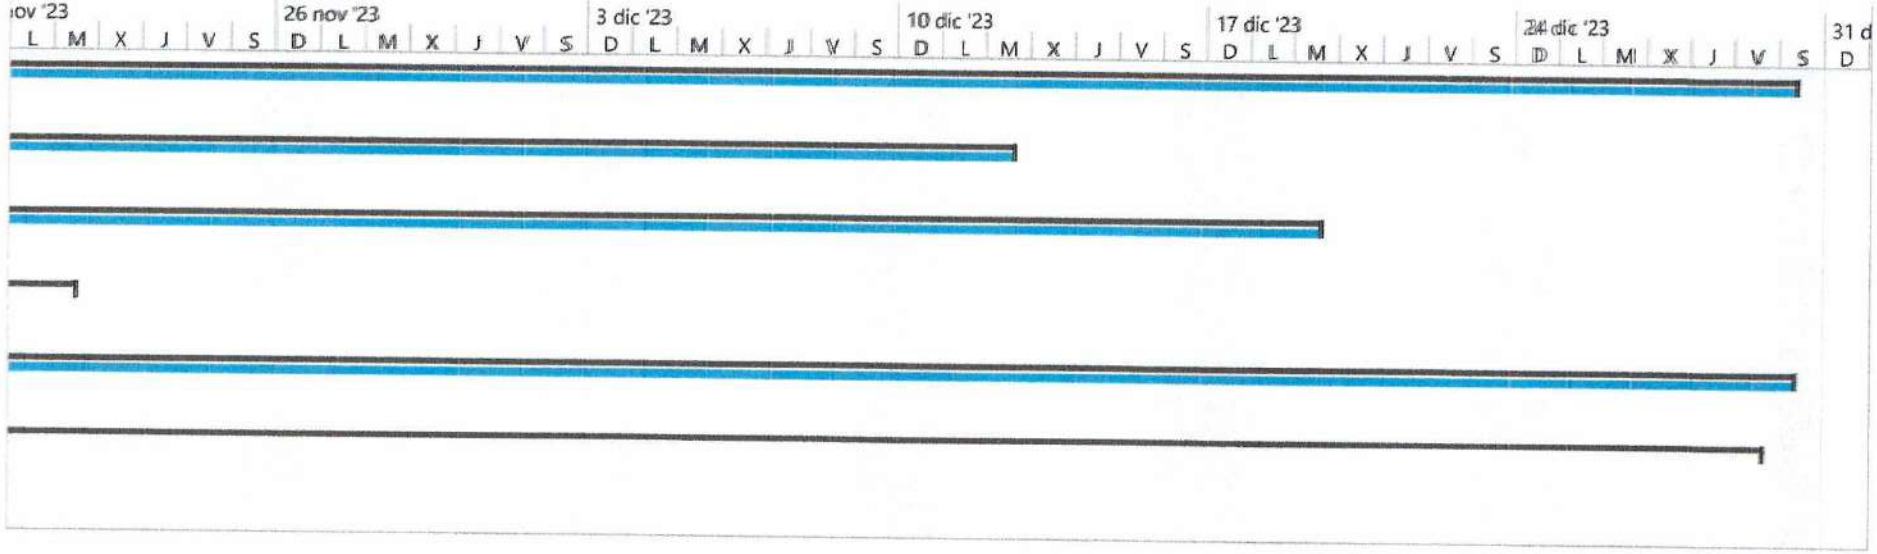

Proyecto: PROYECTO COLEGIO Fecha: sáb 4/11/23	Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
	División	Tarea manual	Hito externo
	Hito	solo duración	Fecha límite
	Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
	Tarea inactiva	solo el comienzo	
	Hito inactivo	solo fin	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901752045	6	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SÍ

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280966583	9458967245	E	2023/11/14	2023/11/16	BANCOLOMBIA		$6,963,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72261552	BLANCO OCHOA EDUAR ANTONIO		X																	25-14	15	$1,612,400	$258,000	EPS010	15	$1,612,400	$64,500	CCF16	15	$1,612,400	$64,500	14-11	15	$1,612,400	$8,500	15	$0	$0	SI	$395,500
2	CC	73143152	CASTILLA NEGRETE PABLO EUGENIO		X																	25-14	15	$2,175,000	$348,000	EPS005	15	$2,175,000	$87,000	CCF16	15	$2,175,000	$87,000	14-11	15	$2,175,000	$11,400	15	$0	$0	SI	$533,400
3	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	X	X																	25-14	29	$3,364,000	$538,300	EPS037	29	$3,364,000	$134,600	CCF16	29	$3,364,000	$134,600	14-11	29	$3,364,000	$17,600	29	$0	$0	SI	$825,100
4	CC	71386445	FERNANDEZ MARTINEZ RUBERT JAMES	X	X																	230301	16	$3,439,787	$550,400	EPS005	16	$3,439,787	$137,600	CCF16	16	$3,439,787	$137,600	14-11	16	$3,439,787	$18,000	16	$0	$0	SI	$843,600
5	CC	78710197	GARCIA CASTILLO JULIO CESAR	X																		25-14	14	$1,504,907	$240,800	EPS037	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	SI	$369,100
6	CC	6882634	GHISAYS VITOLA EDUARDO ALFREDO		X																	25-14	15	$1,612,400	$258,000	EPS037	15	$1,612,400	$64,500	CCF16	15	$1,612,400	$64,500	14-11	15	$1,612,400	$8,500	15	$0	$0	SI	$395,500
7	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	X																		230301	14	$1,504,907	$240,800	EPS010	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	SI	$369,100
8	CC	11041212	MANCILLA DIAZ ERNESTO MANUEL	X	X																	230301	29	$3,117,307	$498,800	EPS005	29	$3,117,307	$124,700	CCF16	29	$3,117,307	$124,700	14-11	29	$3,117,307	$16,300	29	$0	$0	SI	$764,500
9	CC	23178952	PADILLA MEZA BEATRIZ ELENA	X																		230201	14	$1,504,907	$240,800	EPS002	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	SI	$369,100
10	CC	64702183	PADILLA MEZA BERENA PATRICIA	X																		230301	14	$1,504,907	$240,800	EPS002	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	SI	$369,100
11	CC	9084762	PAJARO VILLEGAS JAIME	X	X																		0	$0	$0	EPS002	29	$2,493,846	$99,800	CCF16	29	$2,493,846	$99,800	14-11	29	$2,493,846	$13,100	29	$0	$0	SI	$212,700
12	CC	30571396	RIVERA HOYOS MARIA ELENA	X																		230201	14	$3,009,814	$481,600	EPS037	14	$3,009,814	$120,400	CCF16	14	$3,009,814	$120,400	14-11	14	$3,009,814	$15,800	14	$0	$0	SI	$738,200
13	CC	78768867	ROJAS MARTINEZ RAUMIR IVAN		X																	230301	15	$1,612,400	$258,000	EPS048	15	$1,612,400	$64,500	CCF16	15	$1,612,400	$64,500	14-11	15	$1,612,400	$8,500	15	$0	$0	SI	$395,500
14	CC	50900611	YERGARA VIDAL ONISA ESTHER	X																		230301	14	$1,504,907	$240,800	EPS005	14	$1,504,907	$60,200	CCF16	14	$1,504,907	$60,200	14-11	14	$1,504,907	$7,900	14	$0	$0	SI	$369,100
Total	Afiliados(14)																							$27,467,643	$4,395,100			$29,961,489	$1,198,600			$29,961,489	$1,198,600			$29,961,489	$157,200		$0	$0		$6,949,500

2023/11/20 10:15 AM

1250

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901752045	6	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	280966583	9458967245	E	2023/11/14	2023/11/16	BANCOLOMBIA		$6,963,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,395,100	$0	$4,404,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,643,100	$0	$1,646,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,029,600	$0	$2,033,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$722,400	$0	$723,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$157,200	$0	$157,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$157,200	$0	$157,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,198,600	$0	$1,201,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$1,198,600	$0	$1,201,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,198,600	$0	$1,201,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$64,500	$0	$64,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$124,700	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$379,700	$0	$380,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$220,200	$0	$220,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$409,500	$0	$410,400
TOTAL				**14**	**$6,949,500**	**$0**	**$6,963,900**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/11/20 10:15 AM

725

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901752045	6	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	265953286	9458771543	E	2023/10/11	2023/11/08	BANCOLOMBIA	28	$3,924,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	72261552	BLANCO OCHOA EDUAR ANTONIO	X																	25-14	16	$1,719,894	$275,200	EPS010	16	$1,719,894	$68,800	CCF16	16	$1,719,894	$68,800	14-11	16	$1,719,894	$9,000	16	$0	$0	SI	$421,800
2	CC	73143152	CASTILLA NEGRETE PABLO EUGENIO	X																	25-14	16	$2,320,000	$371,200	EPS005	16	$2,320,000	$92,800	CCF16	16	$2,320,000	$92,800	14-11	16	$2,320,000	$12,200	16	$0	$0	SI	$569,000
3	CC	15679759	DURAN ROMERO JESUS DAVID	X																	25-14	16	$2,320,000	$371,200	EPS037	16	$2,320,000	$92,800	CCF16	16	$2,320,000	$92,800	14-11	16	$2,320,000	$12,200	16	$0	$0	SI	$569,000
4	CC	71386445	FERNANDEZ MARTINEZ RUBERT JAMES	X																	230301	16	$3,439,787	$550,400	EPS005	16	$3,439,787	$137,600	CCF16	16	$3,439,787	$137,600	14-11	16	$3,439,787	$18,000	16	$0	$0	SI	$843,600
5	CC	6882634	GHISAYS VITOLA EDUARDO ALFREDO	X																	25-14	16	$1,719,894	$275,200	EPS037	16	$1,719,894	$68,800	CCF16	16	$1,719,894	$68,800	14-11	16	$1,719,894	$9,000	16	$0	$0	SI	$421,800
6	CC	11041212	MANCILLA DIAZ ERNESTO MANUEL	X																	230301	16	$1,719,894	$275,200	EPS005	16	$1,719,894	$68,800	CCF16	16	$1,719,894	$68,800	14-11	16	$1,719,894	$9,000	16	$0	$0	SI	$421,800
7	CC	9084762	PAJARO VILLEGAS JAIME	X																		0	$0	$0	EPS002	16	$1,719,894	$68,800	CCF16	16	$1,719,894	$68,800	14-11	16	$1,719,894	$9,000	16	$0	$0	SI	$146,600
8	CC	78768867	ROJAS MARTINEZ RAUMIR IVAN	X																	230301	16	$1,719,894	$275,200	EPS048	16	$1,719,894	$68,800	CCF16	16	$1,719,894	$68,800	14-11	16	$1,719,894	$9,000	16	$0	$0	SI	$421,800
Total	Afiliados(8)																						$14,959,363	$2,393,600			$16,679,257	$667,200			$16,679,257	$667,200			$16,679,257	$87,400		$0	$0		$3,815,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/11/08 02:19 PM

1252

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901752045	6	CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YULIZA CASTILLO NEGRETE	CRA 45 N 27 28	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	265953286	9458771543	E	2023/10/11	2023/11/08	BANCOLOMBIA	28	$3,924,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,393,600	$68,500	$0	$2,462,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,292,800	$37,000	$0	$1,329,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,100,800	$31,500	$0	$1,132,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$87,400	$2,500	$0	$89,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$87,400	$2,500	$0	$89,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$667,200	$19,100	$0	$686,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	$667,200	$19,100	$0	$686,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$667,200	$19,300	$0	$686,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$68,800	$2,000	$0	$70,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$68,800	$2,000	$0	$70,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$161,600	$4,700	$0	$166,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$68,800	$2,000	$0	$70,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$299,200	$8,600	$0	$307,800
TOTAL				8	$3,815,400	$109,400	$0	$3,924,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/11/08 02:19 PM

1283

17.2. PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	asesorcontable.monteria@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3107883842

Clave: 9459685918

Periodo Pensión: 2023-10 **Periodo Salud: 2023-11**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/29	8	$30,400	$3,835,000
2023/11/30	9	$34,300	$3,838,900

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	9	$1,981,700
COLFONDOS		2	$405,400
COLPENSIONES		2	$309,700
PORVENIR		5	$1,266,600
ARL	1	9	$862,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		9	$862,200
CCF	1	9	$495,500
COMFACOR		9	$495,500
EPS	2	9	$495,600
NUEVA E.P.S.		3	$143,200
SALUD TOTAL		6	$352,400
SUBTOTAL			$3,835,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$3,835,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2040 C5088002 ****1560 T656
Fix30/11/23 15:29N.N0880 Norte de M
202311 84 Aportes en Linea
PLANILLA No.000009459685918
Identificacion900805380
VALOR PLANILLA:3,842,600.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:3,842,600.00

1254
27

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805389	4	BUSERCO S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11		9459885918	E	2023/11/21			8	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCIONES MONTERIA 1 (9 Afiliados)																						$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
Centro de Trabajo: INSTITUCIONES MONTERIA (9 Afiliados)																						$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (9 Afiliados)																						$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600
1	CC	10932128	ACOSTA MIGUEL	X																	23030 1	15	$950,000	$152,000	EPS037	15	$950,000	$38,000	CCF16	15	$950,000	$38,000	14-23	15	$950,000	6.960%	$66,200	15	$0	$0	SI	$294,200
2	CC	10772153	DE LA OSSA CARLOS	X																	23100 1	14	$1,213,334	$194,200	EPS002	14	$1,213,334	$48,600	CCF16	14	$1,213,334	$48,600	14-23	14	$1,213,334	6.960%	$84,500	14	$0	$0	SI	$375,900
3	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO		X																23030 1	15	$2,064,000	$330,300	EPS002	15	$2,064,000	$82,600	CCF16	15	$2,064,000	$82,600	14-23	15	$2,064,000	6.960%	$143,700	15	$0	$0	SI	$639,200
4	CC	15042277	LOPEZ JOSE		X																23100 1	15	$1,300,000	$208,000	EPS037	15	$1,300,000	$52,000	CCF16	15	$1,300,000	$52,000	14-23	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	11003522	MONTES ANDREY		X																23030 1	15	$1,300,000	$208,000	EPS037	15	$1,300,000	$52,000	CCF16	15	$1,300,000	$52,000	14-23	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	13669147	PEREZ FRANCISCO																		23[illegible]	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	[illegible]14729	REVUELTAS EDUARDO	X																	23[illegible] 15-14	15	$760,000	$121,600	EPS002	15	$760,000	$30,400	CCF16	15	$760,000	$30,400	14-23	15	$760,000	6.960%	$52,900	15	$0	$0	SI	$235,300
8	CC	45519543	REYNA MAYRELY	X																	23030 1	14	$1,926,400	$308,300	EPS002	14	$1,926,400	$77,100	CCF16	14	$1,926,400	$77,100	14-23	14	$1,926,400	6.960%	$134,100	14	$0	$0	SI	$596,600
9	CC	11000082	RUIZ JOVANNY																		23030 1	30	$1,612,000	$258,000	EPS002	30	$1,612,000	$64,500	CCF16	30	$1,612,000	$64,500	14-23	30	$1,612,000	6.960%	$112,200	30	$0	$0	SI	$499,200
Total	Afiliados(9)																					$12,285,734	$1,966,000			$12,285,734	$491,600			$12,285,734	$491,600			$12,285,734		$855,400		$0	$0		$3,804,600

7255
28

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29082364
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LORIE VANESSA ALGAN MORELO
PRIMER APELLIDO:			
DIRECCIÓN:	VEREDA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
1 PREAPORTANTE:	CALLE 67 DE LOS LAURELES	TELEFONO:	7909910
1 PLANILLA:	PRINCIPAL/DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades especializadas para las labores de oficina
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF / RESERVA TRIBUTARIA:	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45178826	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd):		2021-10-19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999190348

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25901	25901-PROTECCION	1	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.200	$ 0	$ 341.200
SUBTOTALES:										**$ 341.200**	**$ 0**	**$ 341.200**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 266.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.600	$ 0	$ 0	$ 266.600
SUBTOTALES:													**$ 266.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 266.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14128	14128 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.600	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 52.600
SUBTOTALES:									**$ 52.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

No	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	ACUERDO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	No. HORAS LABORO	TIPO DE ALTA/NOVEDAD	NOVEDADES: EXTRANJERO	COLOMBIA EN EL EXTERIOR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	LBA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	F.S. SUBSISTENCIA	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	F.S. UPC ADICIONAL	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	VALOR AJUSTES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	29082364	1-DEPENDIENTE	1-DEPENDIENTE	00-NINGUNA SITUACION DE CONTINUA	$ 0.133.333			NO											25901-PROTECCION		$ 0.133.333	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0		$ 341.200	25901-SANITAS S.A.		$ 0.133.333	$ 266.600	$ 0	$ 266.600	14128 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 0.133.333	$ 52.600	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 659.800**

1256
32

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	2023101111080092405 6	9457525230	E	2023/11/21	2023/10/11	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$3,263,765	$522,300	EPS002	30	$3,263,765	$130,600	CCF16	30	$3,263,765	$130,600	14-23	30	$3,263,765	$227,200	30	$0	$0
2	CC	30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,900	$0	$707,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$522,300	$0	$522,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$308,000	$0	$308,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$308,000	$0	$308,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$177,000	$0	$177,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$177,000	$0	$177,000
TOTAL				2	$1,369,900	$0	$1,369,900

2023/10/13 09:34 AM

1254

Powered by CamScanner

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	asesorcontable.monteria@gmail.com	MONTERIA-CORDOBA	3107883842

Clave: 9459685532

Periodo Pensión: 2023-09 **Periodo Salud: 2023-10**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/11/29	41	$105,900	$2,670,000
2023/11/30	42	$108,300	$2,672,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	3	7	$1,379,400
COLFONDOS		1	$231,100
COLPENSIONES		2	$238,300
PORVENIR		4	$910,000
ARL	1	7	$600,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		7	$600,400
CCF	1	7	$345,100
COMFACOR		7	$345,100
EPS	2	7	$345,100
NUEVA E.P.S.		3	$157,900
SALUD TOTAL		4	$187,200
SUBTOTAL			$2,670,000
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$2,670,000

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 C8080002 ****1560 T654
FIx30/11/23 15:27H.ND800 Norte de H
202310 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009459685532
Identificacion900805380
VALOR PLANILLA:2,674,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:2,674,900.00

1258

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9459685532	E	2023/10/19			41	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	sln	ma	vac	ovp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INSTITUCIONES MONTERIA 1 (7 Afiliados)																								$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
Centro de Trabajo: INSTITUCIONES MONTERIA (7 Afiliados)																								$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																								$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100
1	CC	10932128	ACOSTA MIGUEL	X																		23030 1	16	$1,013,334	$162,200	EPS037	16	$1,013,334	$40,600	CCF16	16	$1,013,334	$40,600	14-23	16	$1,013,334	6.960%	$70,600	16	$0	$0	SI	$314,000
2	CC	10766786	LEPESQUEUR ALFREDO	X																		23030 1	16	$2,201,600	$352,300	EPS002	16	$2,201,600	$88,100	CCF16	16	$2,201,600	$88,100	14-23	16	$2,201,600	6.960%	$153,300	16	$0	$0	SI	$681,800
3	CC	15042277	LOPEZ JOSE	X																		23100 1	16	$1,386,667	$221,900	EPS037	16	$1,386,667	$55,500	CCF16	16	$1,386,667	$55,500	14-23	16	$1,386,667	6.960%	$96,600	16	$0	$0	SI	$429,500
4	CC	1003522	MONTES ANDREY	X																		23030 1	16	$1,386,667	$221,900	EPS037	16	$1,386,667	$55,500	CCF16	16	$1,386,667	$55,500	14-23	16	$1,386,667	6.960%	$96,600	16	$0	$0	SI	$429,500
5	CC	15669947	PEREZ FRANCISCO	X																		25-14	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$74,800	CCF16	16	$618,667	$24,800	14-23	16	$618,667	6.960%	$43,100	16	$0	$0	SI	$191,700
6	CC	78714729	REVUELTAS EDUARDO	X																		25-14 1	16	$810,667	$129,800	EPS002	16	$810,667	$32,500	CCF16	16	$810,667	$32,500	14-23	16	$810,667	6.960%	$56,500	16	$0	$0	SI	$251,300
7	CC	1100...02	RIVERA YANETH	X																		23030 1	16	$859,734	$137,600	EPS002	16	$859,734	$34,400	CCF16	16	$859,734	$34,400	14-23	16	$859,734	6.960%	$59,900	16	$0	$0	SI	$266,300
Total	Afiliados(7)																							$8,277,336	$1,324,700			$8,277,336	$331,400			$8,277,336	$331,400			$8,277,336		$576,600		$0	$0		$2,564,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INSTITUCIONES MONTERIA 1	CRA 8 N 35-45	MONTERIA-CORDOBA	7851178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10		9459685532	E	2023/10/19			41	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,324,700	$54,700	$0	$1,379,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$221,900	$9,200	$0	$231,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$228,800	$9,500	$0	$238,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$874,000	$36,000	$0	$910,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$576,600	$23,800	$0	$600,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$576,600	$23,800	$0	$600,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$331,400	$13,700	$0	$345,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$151,500	$6,300	$0	$157,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$179,800	$7,400	$0	$187,200
TOTAL				7	$2,564,100	$105,900	$0	$2,670,000

1259
24

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	79785324
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			LORE VANESSA ALBAN MORELO
CÓDIGO SUCURSAL			CONDOMA
DIRECCIÓN	CRA 47 # 96 LOS LAURELES	TELÉFONO	2900000
TIPO APORTANTE	INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN		UNO	Actividades especializadas y técnicas de la cat
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4512986236	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN SGTSS	MES septiembre AÑO	2021	PERÍODO COTIZACIÓN SAL ID	MES septiembre AÑO	2021
BASE DE MORA		0			
FECHA PAGO (AAAA-MM-DD)		2021-09-18	NÚMERO AUTORIZACIÓN		2993480972

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
57601	25-0601-PROTECCION	1	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.200	$ 0	$ 341.200
SUBTOTALES:										**$ 341.200**	**$ 0**	**$ 341.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 266.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.600	$ 0	$ 0	$ 266.600
SUBTOTALES:													**$ 266.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 266.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:									**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900805380	4	BUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35 45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	56744851	9456744851	E	2023/10/19	2023/10/02	BANCO AV VILLAS		$1,369,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	$3,263,765	$522,300	EPS002	30	$3,263,765	$130,600	CCF16	30	$3,263,765	$130,600	14-23	30	$3,263,765	$227,200	30	$0	$0
2	CC	30659806	BURGOS MARTHA CECILIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$4,423,765	$707,900			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$177,000			$4,423,765	$308,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$707,900	$0	$707,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$522,300	$0	$522,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$308,000	$0	$308,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$308,000	$0	$308,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	$177,000	$0	$177,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$177,000	$0	$177,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$177,000	$0	$177,000
TOTAL				2	$1,369,900	$0	$1,369,900

2023/10/09 10:34 AM

1961

. ENSAYOS Y TEST DE LABORATORIO

1262

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONC5:G9O DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	
		PÁGINA	1 de 1

Objeto: MEGA COLEGIO LOS RECUERDOS

Ordenado por: CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023

Tipo: SUBBASE

Fecha: 17/11/2023

Proctor de Referencia No: 2,128 **% Hum. Opt.:** 6,63

Ensayo	1	2	3	4	5
Abscisa					
Peso frasco + arena inicial (g)	6127	6008	6110	6102	6100
Peso frasco + arena final (g)	2839	2630	2691	2352	2697
Peso total arena usada (g)	3288	3378	3419	3750	3403
Constante del cono (g)	1585	1585	1585	1585	1585
Peso arena en el hueco (g)	1703	1793	1834	2165	1818
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Volumen del hueco (cm^3)	1158,5	1219,7	1247,6	1472,8	1236,7
Peso suelo extraído húmedo (g)	2560	2748	2775	3300	2777
Humedad (%)	8,6	8,0	7,8	6,8	8,0
Peso suelo extraído seco (g)	2357,3	2544,4	2574,2	3089,9	2571,3
Peso material retenido en 3/4"	0	0	0	0	0
% material retenido en 3/4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Densidad del material (gr/cm^3)	2,03	2,09	2,06	2,10	2,08
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128
Humedad óptima laboratorio (%)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,03	2,09	2,06	2,10	2,08
Compactación terreno (%)	95,62	98,03	96,96	98,59	97,70
Compactación especificada (%)	95	95	95	95	95

Observaciones: _____

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277098 Montería - Cordoba

1263

JV INGENIERÍA	ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION (PROCTOR MODIFICADO) INV-E-142-13	CÓDIGO: FO-S-15-19
		VERSIÓN: 06
	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 DE CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO ENSAYO N° -

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023

PROYECTO: MEGA COLEGIO LOS RECUERDOS

2. MATERIAL

DESCRIPCION: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE MATERIAL: CANTERA JOMEVE — MUESTRA N°: -

TIPO DE MATERIAL: Subbase — FECHA TOMA: 13-NOV-23

FECHA ENSAYO: 15-NOV-23


3. ENSAYO

Humedad natural del material			Equipo utilizado para el ensayo
Peso húmedo material + Tara	324,6	8,37%	Balanzas Trumax: 15kg Serie: YS191580
Peso seco material + Tara	304,2		
Peso de la tara	60,5		

DENSIDAD SECA

PRUEBA	1	2	3	4
Método utilizado para el ensayo	C			
No. de Golpes	56	56	56	56
Molde No.	1	1	1	1
No. de Capas	5	5	5	5
Peso muestra húmeda + molde, (g).	10378	10746	10896	10770
Peso molde, (g).	6042	6042	6042	6042
Peso muestra húmeda, (g).	4336	4704	4854	4728
Volumen molde, cm3.	2134,69	2134,69	2134,69	2134,69
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,031	2,204	2,274	2,215
Densidad muestra seca, gr/cm3	1,968	2,097	2,117	2,025
Densidad muestra seca, KN/m3	19,295	20,566	20,764	19,861
TOMA MUESTRA PARA HUMEDAD		*(w1-w2) /(w2-w3) *100*		
Recipiente No.	1	2	3	3
Peso rec. + Muestra Hum. (g). W1 =	368,7	491	433,4	519,1
Peso rec. + Muestra Seca (g). W2 =	358,8	473,4	411,9	485,7
Peso Recipiente (g). W3 =	52,9	126,5	121,1	128,8
Contenido de Humedad (%)	3,24	5,07	7,39	9,36
% De humedad adicionado				

CURVA PROCTOR MODIFICADO

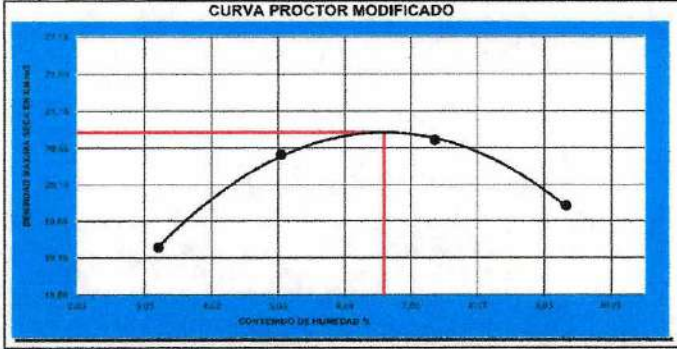

RESULTADOS DEL ENSAYO

Densidad máxima de laboratorio **20,87** KN/m3

Densidad máxima de laboratorio **132,8** lb/pie3

Densidad máxima de laboratorio **2,128** g/cm3

Porcentaje de Humedad optima **6,63** %

% Ret. en tamiz 3/4" gradación original. **16,9** %

OBSERVACIONES: sin observaciones

ELABORÓ		APROBO	
Nombre:	JORGE LUIS VANDA G.	Nombre:	JORGE LUIS GALLEGO SILVA
Cargo:	Laboratorista	Cargo:	ING GEOTECNICO

JV INGENIERÍA

NIT. 10.765.474

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

	DENSIDAD EN TERRENO - MÉTODO DEL CONC5:G9O DE ARENA INV E -161	CÓDIGO	P-FH-CEO-001c
		VERSIÓN	5
		FECHA	
		PÁGINA	1 de 1

Objeto: MEGA COLEGIO LOS RECUERDOS

Ordenado por: CONSORCIO AULAS MONTERÍA 2023

Tipo: SUBBASE

Fecha: 17/11/2023

Proctor de Referencia No: 2,128 **% Hum. Opt.:** 6,63

Ensayo	1	2	3	4	5
Abscisa					
Peso frasco + arena inicial (g)	6127	6008	6110	6102	6100
Peso frasco + arena final (g)	2839	2630	2691	2352	2697
Peso total arena usada (g)	3288	3378	3419	3750	3403
Constante del cono (g)	1585	1585	1585	1585	1585
Peso arena en el hueco (g)	1703	1793	1834	2165	1818
Densidad de la arena (gr/cm^3)	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Volumen del hueco (cm^3)	1158,5	1219,7	1247,6	1472,8	1236,7
Peso suelo extraído húmedo (g)	2560	2748	2775	3300	2777
Humedad (%)	8,6	8,0	7,8	6,8	8,0
Peso suelo extraído seco (g)	2357,3	2544,4	2574,2	3089,9	2571,3
Peso material retenido en 3/4"	0	0	0	0	0
% material retenido en 3/4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Densidad del material (gr/cm^3)	2,03	2,09	2,06	2,10	2,08
Densidad máxima del proctor (gr/cm^3)	2,128	2,128	2,128	2,128	2,128
Humedad óptima laboratorio (%)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Densidad máxima corregida (gr/cm3)	2,03	2,09	2,06	2,10	2,08
Compactación terreno (%)	95,62	98,03	96,96	98,59	97,70
Compactación especificada (%)	95	95	95	95	95

Observaciones: _____

Aprobó:

Jorge Luis Gallego Silva
Ingeniero Civil

Elaboró:

Jorge Luis Vanda Gonzalez
Laboratorista

Dirección: Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
Teléfono: 3106277098 Montería - Cordoba

JV INGENIERIA	ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION (PROCTOR MODIFICADO) INV-E-142-13	CÓDIGO: FO-S-15-19
		VERSION: 06
	JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO CIVIL M.P 25202-40122 CND ESTUDIOS DE SUELO, CALCULOS ESTRUCTURALES Y CUBIERTAS METALICAS	VIGENCIA: 03-FEB-16

1. PROYECTO ENSAYO N° -

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

PROYECTO: MEGA COLEGIO LOS RECUERDOS

2. MATERIAL

DESCRIPCION: Suelo Granular Areno limoso

FUENTE MATERIAL: CANTERA JOMEVE — MUESTRA N°: -

TIPO DE MATERIAL: Subbase — FECHA TOMA: 13-NOV-23

FECHA ENSAYO: 15-NOV-23


3. ENSAYO

Humedad natural del material			Equipo utilizado para el ensayo
Peso humedo material + Tara	324,6	8,37%	Balanzas Trumax: 15kg Serie: YS191580
Peso seco material + Tara	304,2		
Peso de la tara	60,5		

DENSIDAD SECA

PRUEBA	1	2	3	4
Método utilizado para el ensayo	C			
No. de Golpes	56	56	56	56
Molde No.	1	1	1	1
No. de Capas	5	5	5	5
Peso muestra húmeda + molde, (g).	10378	10746	10896	10770
Peso molde, (g).	6042	6042	6042	6042
Peso muestra húmeda, (g).	4336	4704	4854	4728
Volumen molde, cm3.	2134,69	2134,69	2134,69	2134,69
Densidad muestra húmeda, gr/cm3	2,031	2,204	2,274	2,215
Densidad muestra seca, gr/cm3	1,968	2,097	2,117	2,025
Densidad muestra seca, KN/m3	19,295	20,566	20,764	19,861
TOMA MUESTRA PARA HUMEDAD		*(w1-w2) /(w2-w3) *100*		
Recipiente No.	1	2	3	3
Peso rec. + Muestra Hum. (g). W1 =	368,7	491	433,4	519,1
Peso rec. + Muestra Seca (g). W2 =	358,8	473,4	411,9	485,7
Peso Recipiente (g). W3 =	52,9	126,5	121,1	128,8
Contenido de Humedad (%)	3,24	5,07	7,39	9,36
% De humedad adicionado				

CURVA PROCTOR MODIFICADO

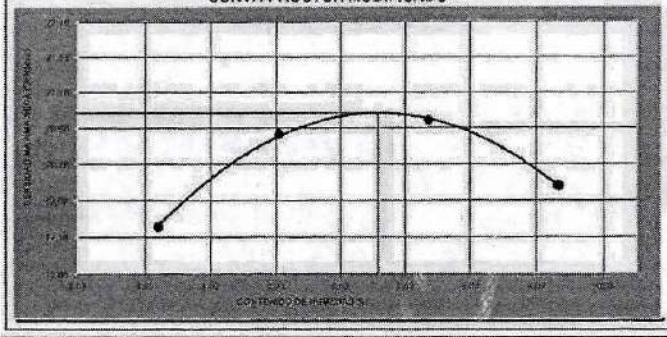

RESULTADOS DEL ENSAYO

Densidad máxima de laboratorio **20,57** KN/m3

Densidad máxima de laboratorio **132,8** lb/pie3

Densidad máxima de laboratorio **2,128** g/cm3

Porcentaje de Humedad optima **6,63 %**

% Ret. en tamiz 3/4" gradación original, **16,9 %**

OBSERVACIONES: sin observaciones

ELABORÓ		APROBO	
Nombre: JORGE LUIS VANDA G.	Nombre:	JORGE LUIS GALLEGO SILVA	
Cargo: Laboratorista	Cargo:	ING GEOTECNICO	

	JV INGENIERÍA NIT. 10.765.474 LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106277098

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023


NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA DEL ELEMENTO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
															DISEÑO	PSI	%
1	PLACA DE CONTRAPISO 1	3/11/2023	10/11/2023	7	3000	150,0	300,0	27703				X			60826	2315	77%
2			17/12/2023	14	3000	150,0	300,0	27462		X					71003	2703	90%

Observaciones:


Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

	JV INGENIERÍA **NIT. 10.765.474** **LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS** **ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410**	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106277098

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA DEL ELEMENTO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
															DISEÑO	PSI	%
1	PLACA DE CONTRAPISO 2	4/11/2023	11/11/2023	7	3000	150,0	300,0	27703		X					61248	2331	78%
2			18/12/2023	14	3000	150,0	300,0	27462				X			70152	2670	89%

Observaciones:


Fractura diagonal sin nelas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas



las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

124

1267



JV INGENIERÍA
NIT. 10.765.474
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410

Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA DEL ELEMENTO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
															DISEÑO	PSI	%
1	PLACA DE CONTRAPISO 3	6/11/2023	13/12/2023	7	3000	150,0	300,0	27703		X					60489	2303	77%
2			20/12/2023	14	3000	150,0	300,0	27462				X			71528	2725	91%

Observaciones:

Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

Fractura en una de las esquinas

las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

	JV INGENIERÍA NIT. 10.765.474 LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410	Calle 3A 1C-20 Nuevo Horizonte MONTERIA- CÓRDOBA CEL: 3106277098

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA DEL ELEMENTO	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Lb)							Resistencia Obtenida		
															DISEÑO	PSI	%
1	PLACA DE CONTRAPISO 4/4	7/11/2023	14/12/2023	7	3000	150,0	300,0	27703					X		61825	2353	78%
2			21/12/2023	14	3000	150,0	300,0	27462			X				70427	2681	89%

Observaciones:

- Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos
- Conos razonablemente bien formados de ambos extremos
- Cono bien formado en un extremo pero no en el otro
- Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos
- Fractura en una de las esquinas
- las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

21

1269

BITACORA DE OBRA

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE - S.P

FECHA:	DÍA 19	MES 10	AÑO 23	PÁGINA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	4
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700XG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se realiza inspección y recorrido de la institución, dando claridad a establecido plan de trabajo, se establece cronograma y Plan de trabajo.
Se dejaron 3 alternativas por cada
- Pomaca, demolición, desmonte
- Levante, anclaje y pintura
- Mantenimiento, cubierta e instalación.
Se procede a iniciar con la primera actividad
- Pomaca, demolición y desmonte

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1271/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - S P

FECHA:	DÍA 20		MES 10		AÑO 23		PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"			

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	4
CONDUCTORES	
OPERADORES	5
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Una vez identificados los focos a intervenir se procede a
- Remover pintura
- Retiro pañete
- Remate de cubierta

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

17

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE – J. P.

FECHA:	DÍA 21	MES 10	AÑO 23	PÁGINA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	4
CONDUCTORES	
OPERADORES	4
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	1G

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se avanza en la remoción de pintura, retiro de pañete y demarte de cubierta, esta actividad esta programada para los 3 primeros días.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1272 /R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUDE – S.P.

FECHA:	DÍA 23		MES 10		AÑO 23		PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"			

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1/2
OFICIALES	5
AYUDANTES	
CONDUCTORES	
OPERADORES	5
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se aumento el numero de personal para avanzar mas rapidamente.
Se termino con la actividad de retiro de cubierta de la zona programada, con el resanado de paredes hubo un avance de 40% y se retiro todo el suelo

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - S. P.

FECHA:	DÍA 24	MES 10	AÑO 23	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	5
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia la intervencion de un nuevo area de trabajo, en este se inicio la fundicion de muros y desmonte de aparatos sanitarios, Muros

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1273/F

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GAZONES

GARZONES.

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA: 17-OCT-2023	DÍA 17	MES 10	AÑO 23	PÁGINA 1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO: X	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN LABORES SIENDO LAS 9 AM CON EL TRAZADO Y REPLANTEO DEL AREA A TRABAJAR.

CON LA INSTALACION DE LA TELA VERDE PARA EL CERRAMIENTO Y PODER LABORAR DE MANERA SEGURA.

HACE INGRESO DE HERRAMIENTAS MENORES. PALAS, CARRETAS, ETC.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1274/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 18		MES 10		AÑO 23		PÁGINA	2	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN LABORES SIENDO LAS 8:17 AM.
SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE LA TELA VERDE PARA CERRAMIENTO.
POR PARTE DE TOPOGRAFIA CON LA MEDICION DE NIVELES EN TERRENO PARA INICIAR CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION MANUAL.
SE LE HIZO ENTREGA DE DOTACION AL PERSONAL EN CAMPO COMO FUE CASCOS, GUANTES, GAFAS DE PROTECCION

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

143

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 19	MES 10	AÑO 23	PÁGINA	3		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIARON ACTIVIDADES EN CAMPO A LAS 8:20 AM. SE REALIZA CHARLA POR PARTE DE PERSONAL SISO.
SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIONES MANUAL.
ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN TODO EL DIA POR LAS ALTAS TEMPERATURAS

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1275/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 20		MES 10		AÑO	23	PÁGINA	4	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN TRABAJOS A LAS 8:00 AM SE CONTINUO CON LA EXCAVACION MANUAL POR PARTE DEL PERSONAL EN CAMPO.
SE INICIO EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, DE ESCOMBROS PARA INICIAR CON EL ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

145

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 21		MES 10		AÑO 23		PÁGINA	5	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	
OFICIALES	
AYUDANTES	
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIARON LABORES DE TRABAJO EN CAMPO A LAS 8:15 AM.
SE REALIZO TRABAJO DE CAPACITACION POR PARTE DE PERSONAL SISO EN EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS.
SE CONTINUA CON EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.
SE INICIA EL INGRESO DE LOS PRIMEROS VIAJES DE MATERIAL SELECCIONADO. INGRESARON 3 VIAJES

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1276/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 23		MES 10		AÑO 23	PÁGINA	6
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:		"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"		

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN LABORES SIENDO LAS 8:00 AM
SE CONTINUA CON EL ACOPIO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SU EXTENDIDO.
SE ESTA A LA ESPERA DEL EQUIPO DEL MINICARGADOR PARA EL INICIO DE EXTENDIDO DE MATERIAL.
SE HIZO EL INGRESO DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECCIONADO.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

147

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 24		MES 10		AÑO	23	PÁGINA	17	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIO LABORES EN CAMPO SIENDO LAS 8:00 AM, SE REALIZA INGRESO DE MATERIAL DE RELLENO PARA SU EXTENDIDO.

HIZO INGRESO DE 6 VIAJES DE MATERIAL SELECCIONADO.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1277/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA 25		MES 10		AÑO	23	PÁGINA	8	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE ARRANCO TRABAJO EN CAMPO A LAS 8:00 AM.
SE CONTINUO CON EL ACOPIO DE MATERIAL SELECCIONADO. HIZO INGRESO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECCIONADO LLEGA EQUIPO PARA EL EXTENDIDO DE MATERIAL SIENDO LAS 4 PM.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

149

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	26	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	9
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE EMPEZO TRABAJO EN CAMPO SIENDO LAS 8:00 A.M.

POR PARTE DEL PERSONAL SISO SE HIZO CHARLA CON PERSONAL EN CAMPO.

SE INICIA TRABAJO DE EXTENDIDO DE MATERIAL YA ACOPIADO EL EL AREA.

SE HIZO INGRESO DE 6 VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1220/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	27	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	10
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE EMPIEZA TRABAJO EN CAMPO A LAS 7:45 AM.
INGRESARON 3 VIAJES DE MATERIAL SELECCIONADO. PARA TOTAL DE 222.10 M3
SE CONTINUA CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL ACOPIADO. LABOR QUE SE HIZO EN TODO EL DIA.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

151

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	29	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	11
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIO LABORES SIENDO LAS 8:00
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE
EXTENDIDO DE MATERIAL.
LLEGA PERSONAL DE TOPOGRAFIA
PARA EL CHEQUEO DE NIVELES.
PARA INICIAR CON SU COMPACTACION

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1279/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	30	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	12	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIO LABORES EN CAMPO SIENDO LAS 8:00 AM.
POR PARTE DE PERSONAL SISO SE INICIAN CHARLAS DE SEGURIDAD EN CAMPO CON EL PERSONAL EXISTENTE.
SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE COMPACTACION DE TERRENO, REGADO DE AGUA PARA SU COMPACTACION.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

153

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	31	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	13
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN LABORES EN CAMPO SIENDO LAS 7:45 AM CON ACTIVIDAD DE COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO SE SUSPENDE ACTIVIDAD DE COMPACTACIÓN POR DAÑO DE MANGUERA DEL MINICARGADOR.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1280/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	1	MES	11	AÑO	23	PÁGINA	14
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN TRABAJOS SIENDO LAS 7:40 AM CON PERSONAL EN CAMPO CON LA LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES Y SE ESTUVO A LA ESPERA DEL ARREGLO DEL MINICARGADOR EL CUAL SE SOLUCIONO EL DAÑO A LAS 5 PM.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

15F

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	2	MES	11	AÑO	23	PÁGINA	15
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIA TRABAJO SIENDO LAS 8:00 AM
SE REALIZA CHARLA DE SEGURIDAD POR PARTE DE PERSONAS SISO.
SE CONTINUA ACTIVIDAD DE COMPACTA CON ACTIVIDAD QUE LLEVO TODO EL DIA

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1281/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	3	MES	11	AÑO	23	PÁGINA	16
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIO TRABAJO A LAS 7:45 AM SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE COMPACTACION.
LLEGA PERSOUAL DE TOPOGRAFIA PARA EL CHEQUEO DE NIVELES.
EMPIEZA EL INGRESO DE MATERIAL TRITURADO INGRESARON 7 VIAJES DE 6m3.
SE INICIA CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL TRITURADO

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

157

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	4	MES	11	AÑO	23	PÁGINA	17
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN LABORES A LAS 8:00 A.M. SE CONTINUA CON EL EXTENDIDO DE MATERIAL DE TRITURADO.
HACE INGRESO DE 3 VIAJES DE TRITURADO DE 6 M3.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1282/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	7	MES	11	AÑO	23	PÁGINA	18	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:	X	LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
	1

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIAN ACTIVIDAD EN CAMPO SIENDO LAS 8:00 AM.
PERSONA DE SISO REALIZA CHARLA CON TRABAJADORES.
INGRESAN 3 VIAJES DE TRITURADOS DE 6M3.
SE CONTINUA CON EL EXTENDIDO DE MATERIAL. ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN TODO EL DIA. CULMINANDO A SE ESTA ACTIVIDAD

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

159

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	8	MES	11	AÑO	23	PÁGINA	19
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

SE INICIO LABORES A LAS 8:00 AM CON EL PERSONAL DE PLANTA.
LLEGA PERSONAL TOPOGRAFICO PARA EL CHEQUEO DE NIVELES.
SE REALIZA LIMPIEZA DE LA OBRA Y EL RETRO DE MATERIAL SOBRANTE.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1283/R

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE Camito Torrez Sede Mi Ranchito

FECHA:	DÍA	17	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	5
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	2
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Construccion de Cerramiento en tela verde.
- Nivelacion de terreno.
- Botada de Material.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1289/2

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

It canto torrez sede mi Amigo.to.

FECHA:	DÍA 18		MES 10		AÑO 2023.	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
ESTRO	
OFICIALES	4
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	1
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

charlas de seguridad

Demolicion de viga.

de concreccion. de 0.30 x 0.40.

Botada de material de Demolicion.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

162

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE Camilo Torres Sede principal

FECHA:	DÍA 19	MES 10	AÑO 2023	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	5
CONDUCTORES	1
OPERADORES	1
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Charla de seguridad.
- Demolición de losa concreto
- Retiro de material sobrante.
- Limpieza de área.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1285/L

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E. Carlos Orrego Sede Principal

FECHA:	DÍA 20	MES 10	AÑO 2023	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	1
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	7

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Demolicion de viga cimentacion
- Inicio Demolicion de sobrecimiento. e: 0.20.
- Retiro de escombros.
- Limpieza Area.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E comfatorre 2 Sede Principal

FECHA:	DÍA 21	MES 10	AÑO 2023	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	8
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	1
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TRONZADORA	1
HERRAMIENTA MENOR	8

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Demolicion de cimentacion.

Demolicion de sobrecimiento.

Acopio de material de sobrecimiento

Retiro de material de cimiento.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

165

1286/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FE cambio Torre 4 Sede mi Ranchito.

FECHA:	DÍA 23		MES 10		AÑO 2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	1
TALADRO	1
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	1
TIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	8

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Demolicion de sobrecimiento.

Retiro de material de cimentacion.

Acopio de material sobrecimiento.

Limpieza de area.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

166

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE Combo Toret Sede ni Anjoto.

FECHA:	DÍA	24	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Retiro de material de excavacion.

continua demolicion de sobre concreto.

Retiro de material de base

Inicio Descapote columnas

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1287/12

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE carlos Torres Sede principal

FECHA:	DÍA 25		MES 10		AÑO 2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"			

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	10
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Demolicion de columnas.

Retiro de material de sobrecimientos.

Inicio Domatico nuevo.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

118

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I E canto real segundo

FECHA:	DÍA	26	MES	10		AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:			NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	1
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

continua Demolicion de columnas.

continua Demolicion de muros.

Excavacion manual.

Retiro de material de demolicion.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1288/12

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE comb bruet Sede principal

FECHA:	DÍA 27	MES 10	AÑO 2023	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	10
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	8
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Demolicion de muros.

Excavacion manual.

Retiro de material de demolicion.

Retiro de material de excavacion.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

170

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO VIEJO PALOTAL

1289/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE CAÑO VIEJO PANDI SEDE PRIMARIA.

FECHA:	DÍA	17	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA			ESTADO DEL TIEMPO	lluvia.		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	-/	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

cerramiento de Obra.
charla de seguridad.
Limpieza de frente.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

171

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

EJECUCION SEG DIA NIÑO

FECHA:	DÍA 19		MES 10		AÑO 2023		PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	✓	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	5
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Cimbra de Sesmon.
Desmonte de cabezote.
Desmonte de cobierta.
Retiro de material sobrante.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1290/2

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E. Caño Viento Sede Pbro Nicolás

FECHA:	DÍA 19		MES 10		AÑO 2023		PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				lluvia.	
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	1
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Charla Seguridad.
Demolicion de cielorraso
Desmonte de cubierta
Retiro de material sobrante.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

173

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E. CAÑO VIEJO Sede Divino Niño

FECHA:	DÍA	20	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA			ESTADO DEL TIEMPO		SECO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:	✓	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	
OFICIALES	1
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Desmonte de cobertura
Resane de muros.
Limpieza de estructura de cobertura.
Retiro de material sobrante.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

174

1291/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIO DE OBRA

I.E. CATORCE JOSE GABRIEL DUQUE

FECHA:	DÍA 26		MES 10		AÑO 2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	✓
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Resane de paredes
- Limpieza de cubierta.
- Impermeabilización de muro interior
- Retiro material sobrante

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

175

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I E Caño Viejo Sede Divino Niño

FECHA:	DÍA 23	MES 10	AÑO 2023	PÁGINA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO	Seco.	
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO: ✓	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
UIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Impermibilizacion de muros.
Inicio de pintura
Impermibilizacion muros.
retido de muros
Sobante.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1292/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE todo bueno sale Diurno

FECHA:	DÍA	24	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					seco
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Impermabilizado muro.
Instalacion de muro para
Impermeabilizar
Pintura de parejo.
Interventor

CONTRATISTA DE OBRA	n/n n.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

177

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E Carlos Orozco Sede Divina Niño

FECHA:	DÍA	27	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO	Seco.				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	✓	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura de muros interiores y exterior.

Instalación de redes electricas.

Retiro de material sobrante.

CONTRATISTA DE OBRA	Mant.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	Flor
OTROS	

1290/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E Carlos Ordeño Jose Divino Niño.

FECHA:	DÍA	26	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA			ESTADO DEL TIEMPO		Seco.		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	1
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	10
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Instalacion de ciclos
nso en PVC

Instalacion de Red
electrica.

Retiro de interr
Sobrante.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

179

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E. camilo arejo pabon sede principal

FECHA:	DÍA	27	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA				ESTADO DEL TIEMPO	seco		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:		"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"			

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	.
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	5
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Instalación de cerramiento en PVC
- Instalación de salidas eléctricas
- Retiro de interna sonte.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1294/12

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIO DE OBRA

IE CURO VIEJO SEDE PRIMARIA

FECHA:	DÍA	28	MES	10		AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA				ESTADO DEL TIEMPO				LLUVIOSO.
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:			NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:		"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Finalizo instalacion de ciclo mgo en PVC.

Instalacion de red electrica.

Limpieza y retiro de material.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE Carlos Ureño Sede Divino Niño

FECHA:	DÍA	30	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Puntos de anclaje
Interventoría
puntos de prueba
electrica.
Finalizo parte electrica.

CONTRATISTA DE OBRA	yuma.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1295/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE CAÑO VIEJO DESDE DIVINO NIÑO.

FECHA:	DÍA	31	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	10
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura de pared
Exterior
pintura pared exterior
Instalación de luminaria

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

187

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E. Cuño Creek Sede Otra Vida

FECHA:	DÍA: 01	MES: 11	AÑO: 2023	PÁGINA:
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA	ESTADO DEL TIEMPO		
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023	SOLEADO: X	NUBLADO:	LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023	OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"	

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	1
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	1

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura de muros interiores

Pintura de muros exteriores.

Limpieza de Aulas.

Instalación de Puntos electricos.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1296/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE CAROLINA SOTO DIOMEDES PEÑO

FECHA:	DÍA	2	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	2
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura interior -
Pintura exterior
Retiro de material sobrante
Limpieza de Area

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

185

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I E Carlos Orejo Sede Diomedes

FECHA:	DÍA	3	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	X
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura Interiores.

Pintura exterior

Estuco Liso Por Columnas y muros

Limpieza de Area.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1297/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IG anexo Sol Diario Nro

FECHA:	DÍA	4	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	.
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura Interior
Pintura exterior
Retiro de material
Sobrante de empaques
de Pintura.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

182

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE Cato Orejo Sede Principal

FECHA:	DÍA	7	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura de muro interno
Pintura de muro exterior
Retiro de material sobrante.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

12978/L

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE Cantaclaro Sede Diomi Niño

FECHA:	DÍA	8	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
ESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura Interior
Pintor Exterior.
Toma de detalles.
Limpieza de Area.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

IE CATORCE DE DICIEMBRE

FECHA:	DÍA	9	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
MAESTRO	1
OFICIALES	10
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Pintura de Aver Interior
y toma de detalles
pintura exterior.
Limpieza de Aulas.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1209/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I E Caño Viejo Sede Diamantino

FECHA:	DÍA	10	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	✓	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	1
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Toma de detalles pintura interior
pintura exterior
Retiro de pintura y limpieza de Aleros

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

191

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

I.E. CATO VIEJO Sede Preescolar

FECHA:	DÍA	11	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	V	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	5
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Limpieza de Aceri
detalles de pintura
exterior e interior.
lavado de pisos.
retiro de material.

CONTRATISTA DE OBRA	Yuranis
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1300

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA MARGARITA

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	17	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inician con reunion del personal presente en la obra a las 7:00 Am para capacitacion de los trabajos a realizar y la Seguridad en la obra, Seguido a la capacitación se hace entrega de la dotación necesaria para iniciar las actividades.

8:30 am se da inicio a la construccion del cerramiento de la zona a intervenir utilizando Tela Verde y Listones de madera.

Se da llegada de todos los equipos para trabajo en altura.

Se finaliza el dia sin novedad

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1301/2

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	18	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	2
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia reunion del personal presente en la obra a las 7:00 Am para verificar implementos de Seguridad.

Se inicia tipo 7:30 am con el armado de los Andamios para posteriormente comenzar el desmonte de la cobierta, iniciando por la parte frontal, ubicando el material retirado en un sitio autorizado para su retiro. Finalizamos el dia sin Novedad

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1761

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	19	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	3
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
	7

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia el día en la obra a las 7:10 am con reunion del personal para la verificación de los implementos de seguridad para continuar con el desmonte de la cubierta.

Se da continuidad al desmonte de la cubierta con la parte media de la estructura ubicando el material retirado en un lugar autorizado para su posterior retiro finalizamos el dia sin novedad

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1302/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	20	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	4
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se da Inicio al dia a las 7:00 Am Con la reunion del personal para verificar los elementos de seguridad.

Se Continua Con el desmonte de la cobierta en la zona final faltante, se ubica el material en la zona autorizada

Se finaliza el dia sin novedad

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

196

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	21	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	5
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	1
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6.

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

damos inicio al dia de labores a las 7:00 AM con la reunion de personal para hacer la verificacion de los elementos de seguridad. Continuamos con el desmonte de la cubierta del polideportivo y el retiro del material a una distancia no mayor a 5 Km, con esto damos por finalizado el desmonte y el dia en el que no se presenta ninguna novedad

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1303/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	23	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	6
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia con reunion del personal presente en la obra a las 7:00 AM para capacitacion de los trabajos a realizar, seguido de la capacitacion se inicia con la actividad de la pulida de la estructura con lija automotivo y pintura tipo esmalte

finalizamos el dia Sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

198

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	24	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	7
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
JIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Iniciamos con reunion del personal en la obra a las 7:00am y se indica que se seguira con la actividad de pulida de la estructura con lija, anticorosivo y pintura tipo esmalte.

finalizamos el dia sin novedad

6

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1309/2

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA CIELO

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	17	MES 10		AÑO	2023	PÁGINA 1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"			

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	
	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se inicia con reunión del personal presente en la obra a las 7:03am para una capacitación sobre los trabajos a realizar y la seguridad en la obra.

Seguido a la capacitación se hace entrega de la dotación necesaria para la realización de las actividades.

A las 8:00am se da inicio a la construcción del cerramiento de la zona a intervenir utilizando tela verde y listones de madera.

Se da la llegada de los equipos para trabajo en altura como andamios, linia de vida y arnés.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1305/L

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	19	MES	10		AÑO	2023	PÁGINA	2
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:			NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se inicia con la llegada a la obra a las 6:50am, se reune el personal presente en la obra para verificar implementos de seguridad.

Se comienza armando los andamios para posteriormente comenzar el desmonte de la cubierta iniciando por la parte frontal, ubicando el material retirado en un sitio autorizado para su posterior retiro.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

201

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	19	MES	10		AÑO	2023	PÁGINA: 3
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X			NUBLADO:		LLUVIOSO:
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	7

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia el día en la obra a las 7:05am con reunión del personal para la verificación de los implentos de seguridad para continuar con el desmonte de la cubierta.

Se da continuidad al desmonte de la cubierta con la parte media de la estructura, ubicando el material retirado en un sitio autorizado para su posterior retiro

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1306/1

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	20	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	4	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	6

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

-Se inicia el día a las 6:55am con la reunión del personal para la verificación de los elementos de seguridad.

Se continua con el desmonte de la cubierta en la zona final faltante, se ubica el material en una zona autorizada.

Se hace el retiro del material desmontado a una distancia no mayor a 5km.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

207

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	23	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	6
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	7

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia el día a las 6:55am con reunión de todo el personal en obra, se realiza una capacitación para las actividades del día y se hace entrega de la dotación necesaria para la realización de estas.

Continua realizando la instalación de la estructura de soporte en perfiles comenzando por la parte trasera.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1307/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	25	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	8
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	8

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se comienza el día con la reunión del personal en obra verificando equipos de seguridad como andamios, linea de vida y arnés.

Se continua con la instación de la estructura en perfiles para la cubierta, usando andamios, seguimos con la parte frontal para finalizar el monte de la estructura.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

705

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	24	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	7
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	9

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se inicia el día a la 7:04am reuniendo al personal en obra para la verificación de los elementos de seguridad.

Se continua con la instalación de la estructura en perfiles para la cubierta, utilizando los andamios, seguimos con la parte media de la estructura.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1309/12

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	26	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	9	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
TIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	8

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se comienza el día con la reunión del personal en obra verificando elementos de seguridad y las actividades a realizar en el día.

Se inicia con la instalación de la cubierta en la parte trasera de la estructura usando los andamios y los equipos de seguridad, cubierta en lamina termoacustica incluyendo caballetes y accesorios para su correcta instalación.

Finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

207

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	27	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	10	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	
OFICIALES	2
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	1
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	8

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Inicia el día reuniendo el personal en obra verificando los elementos de seguridad.

Continuamos con la instalación de la cubierta con lamina termoacustica incluyendo caballetes y accesorios en la zona media de la estructura.

Finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1309/K

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MERCEDES ABREGO

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO.

FECHA:	DÍA	17	MES	10		AÑO	2023	PÁGINA	1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X			NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	4
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

Se Inicia con la Entrega de Dotacion de los Trabajados que se encuentran en la Obra Tales Como Jeans, Camisa, Botas (certificadas).

Iniciamos con el Cerramiento en figue Verde, con listones y alambre Negro.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1310/K

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	18	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	2
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	
OFICIALES	
AYUDANTES	
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CINGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Iniciamos Con la demolicion de Viga de Cimentacion de 0,30 m X 0,40 en Concreto
- Se. Inicia Con la demolicion de sobrecimiento de 4 hiladas, con Espesor de 0,20 m
- Iniciamos la Demolicion de Muro con espesor de 0,15 m

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	19	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	3
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	4
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CINGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos con la Demolicion de Viga de Cimentacion de 9,30 m X 0,40 en concreto.
- Continuamos con la demolicion del sobrecimiento de 4 hiladas, con Espesor de 0,20 m
- Iniciamos con la Demolicion de Columnas en Pared de Cerramiento

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1311

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6


BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	20	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	4	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	4
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	1
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
PINGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	20

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos con la Demolicion de Columnas en Pared de cerramiento.
- Iniciamos con el Retiro de material Sobrante, Utilizando un mini cargador y una Volqueta.



CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

212

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	21	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	6
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	1
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	8

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se inicia el día en la obra con una reunión a las 7:02am con el personal presente para verificar elementos de seguridad y las actividades a realizar en el día.

Se continua con levante de muro para meson en bloque de arena-cemento con pega de mortero.

Llegada del material para la estructura de soporte de la cubierta, es ubicado en un sitio autorizado, para posteriormente ser pintado.

Se finaliza el día sin novedad.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1312/12

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	21	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	5	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
ANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	10

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Iniciamos con la localizacion y replanteo del Polideportivo.
- Iniciamos con la Excavacion Manual Para la cimentacion de Cerramiento de Pared en Bloque.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

214

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	23	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	6
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	
OFICIALES	
AYUDANTES	
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
ANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	15

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos con el Replanteo del Polideportivo.
- Iniciamos el Mejoramiento del Terreno debajo de Zapatas en Piedra Rajon
- Iniciamos el Relleno con Material seleccionado compactado
- INICIAMOS Sobrecimiento de En Bloque Macizo 10 x 20 x 40 con Pega Mortero 1:4 4 hiladas

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1313/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	24	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	7	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
IDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	6
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
ANDAMIO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	20

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Iniciamos la Construccion de Viga de Cimentacion de 0,30 X 0,40m En concreto, Vibrado, Curado.
- Iniciamos levante en Bloque de 0,15mx 0,20m X 0,40m Para confinamiento Con Mortero 1:4 h 0,2 mts. y Concreto Grating en Dovelas de muros, Incluyendo anclaje Para refuerzo de 1/2"
- Iniciamos Construccion de Pedestales de 0,30 X 0,30 X 0,75 En concreto.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

216

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	25	MES	10	AÑO	PÁGINA	8
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO				
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"			

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
SIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	1
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
ANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	20

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos con levante de muro en Bloque de Drena, Cemento de 0,10 m X 0,20m X 0,40m, con Pega de Mortero. 1:4
- Continuamos con el levante en Bloque de 0.15 m X 0,20m X 0.40m, Para confinamiento con Mortero 1.4h, 0,2 ml. y Concreto Grouting en Dovelas de Muros, Incluyendo anclaje Para Refuerzo de 1/2"

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1314/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	26	MES	10		AÑO	2023	PÁGINA	9
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		**ESTADO DEL TIEMPO**						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO: X			NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023**		**OBJETO:**	**"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"**					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
IDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	5
AYUDANTES	
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
NIGURO	
...IPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos con levante de Muro en Bloque de Arena, Cemento de 0,10 m X 0,20m X 0,40m, con Pega de Mortero 1:4
- continuamos con el levante en Bloque de 0,15 m X 0,20m X 0.40m, Para confinamiento en Montero 1.4 H, a2m y Concreto Grounting en Develas de muros, Incluye Anclaje Para refuerzo de 1/2"

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	27	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	10
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
IDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
NIGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	20

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Iniciamos con la construccion de columnas de confinamiento de 0,10 X 0,20m en Concreto de 3.000 PSI, Refuerzo 4 Varillas de 3/8" y Estribos de 1/4"
- Continuamos Con levante en Bloque de 0,15 m X 0,20 m X 0,40m, Para confinamiento en Mortero 1:4 H. 0,2m y Concreto Grounting en Dovelas de Muros, Incluye Anclaje Para refuerzo de 1/2"

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1315/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	28	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	11	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
IDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
IGURO	
QUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	20

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Iniciamos con la Construccion de Viga Corona de 0,20 X 0,20 de 21 MPA, Incluye refuerzo de 4 Ø 1/2" y Aros de Ø 3/8" a C-0,20m
- Continuamos con levante en Bloque de 0,15m X 0,20 m x 0,40m, Para confinamiento en Mortero 1.4 H. 0,20m y Concreto Grounting en Dovelas de muros, Incluye Anclaje para Refuerzos de 1/2"

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

220

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	30	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	12
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
IDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	10
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	
TALADRO	1
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	1
VIBRADOR DE CONCRETO	
IGURO	
UIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	30

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos con la construccion de viga corona de 0,20 x 0,20 de 21 MPa, Incluye Refuerzo de 4 Ø 1/2" y aros de Ø 3/8" a cada 0,20 m
- Iniciamos Relleno con Material Seleccionado, con BUGGY

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1316/r

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	31	MES	10	AÑO	2023	PÁGINA	13
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	5
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	1

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	1
RANA	1
TALADRO	1
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	20

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Iniciamos Pañete allanado en Bloque de Brena - Cemento de 0,10 m x 0,20 x 0,40 mts con Pega de Mortero.
- Continuamos Relleno con Material seleccionado, con Buggy, con Rana y Vibrocompactador

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

222

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	1	MES	11	AÑO	2023	PÁGINA	24	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
CONDUCTORES	
OPERADORES	
ALMACENISTA	
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	
TALADRO	
MEZCLADORA	
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Continuamos Relleno con Material Seleccionado, con Buggy y Rana y Vibrocompactador.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1317/K

CONSORCIO AULAS
MONTERIA 2023

BITÁCORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER

GRA SANTANDER

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	17	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	1
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	1
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	2
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	11

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se procede con labores de localizacion y replanteo con topografia
- Inicia obras de excavacion manual en area de corredor pasillo horizontal de bateria de aulas con una longitud de 39.25 ml
- Se utilizan herramientas menores para esta labor

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1318/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	18	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	2	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	X	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	1
CADENERO	1
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	2
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	1
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se continua con la actividad de excavacion de pasillo de aulas hasta un 80%.
* Se procede a inicio de desolacion de viga de conformacion de pasillo corredor con una distancia de 39.75 mL
- Se procede a la actividad de acopio y organizacion de material de escombros y excavacion.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	19	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	3
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:		LLUVIOSO:	X
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	2
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- por condiciones de lluvia no se puedo laboral de manera normal en la jornada de la mañana, tan solo aprovechando un 65% del tiempo de la jornada laboral.
- En horas de la tarde se entrega la dotación faltante a todos los trabajadores de la obra para dar cumplimiento a las normas SST
- se termina la totalidad de desencofrado de plantilla y viga amarre del pasillo.

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

1379/12

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	20	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	4
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:		NUBLADO:	X	LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	1
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	
AYUDANTES	2
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	3
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- En horas de la mañana se procede al retiro de material de escombros y material procedente de excavaciones del pasillo por medio de volqueta de 7.00 m³
- Se procede a dar inicio a la construcción de excavación para urgamiento de pasillo
- En el area interna de administración se procede a retirar la pintura existente y desmonte de cielo raso

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

227

1320/R

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	21	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	5
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"				

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	7
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**CANTIDAD**
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	2
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se termina construccion de sobrecimiento en area de pasillo de aulas
- Se continua con el desmonte de cielo raso y remocion de pintura en interior de area administrativa.
- Se procede con el desmonte de cielo raso, estructura de cielo raso y cubierta del area de administrativa. Coor

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	

CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023
NIT: 901.752.045-6

BITACORA DIARIA DE OBRA

FECHA:	DÍA	27	MES	10	AÑO	23	PÁGINA	6	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA		ESTADO DEL TIEMPO						
CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-012-2023		SOLEADO:	X	NUBLADO:		LLUVIOSO:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AULAS MONTERIA 2023		OBJETO:	"ESTUDIOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERIA"					

PERSONAL Y MANO DE OBRA	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
SISO	
SUPERVISOR DE OBRA	
RESIDENTE SISO	1
TOPOGRAFO	
CADENERO	
RESIDENTE AMBIENTAL	
RESIDENTE SOCIAL	
MAESTRO	1
OFICIALES	3
AYUDANTES	3
CONDUCTORES	1
OPERADORES	
ALMACENISTA	1
PALETEROS	

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	
VOLQUETAS	1
BICILINDRO 700KG	
VIBROCOMPACTADOR	
RANA	1
TALADRO	
MEZCLADORA	1
COMPRESOR	
SIERRA CIRCULAR	
PULIDORA	2
MOTOBOMBA	
VIBRADOR DE CONCRETO	
CANGURO	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
EQUIPO DE SOLDADURA	
TRONZADORA	
HERRAMIENTA MENOR	5

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN

- Se continua con los descuentos de cielo raso y cubierta al igual que su estructura en madera
- Se procede con el inicio de retiro de pared en mal estado en el primer metro de muros de la zona interior y exterior

CONTRATISTA DE OBRA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
OTROS	
