FACTURA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT 901.489.956-3

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f83fde365f8ab73d9d6ed3b1924f0ada80f6c4cab1fe302bbbece48ecdd9dad56a3c9ec5592d3f17cafd11872bf81d2

Número de Factura: JVM-192
Fecha de Emisión: 19/12/2024
Fecha de Vencimiento: 18/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
Nombre Comercial: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
Nit del Emisor: 901489956
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 52 A 14 17 BARRIO MONTEVERDE
Teléfono / Móvil: 3106541925
Correo: jvmsas2021@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999007
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 26 13 49INT 201
Teléfono / Móvil: 6010328212
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81101500	Servicio de consultoría e interventoría para la construcción de obras de ingeniería civil	94	1,00	$ 8.427.228,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.601.173,37	19.00			$ 8.427.228,25

Notas Finales

#$12-04-00-000;contrato2365 de 2024;cesar.martinez@supernotariado.gov.co#$
ACTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AVANCE DEL 20% DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2365-2024 DEL CUYO OBJETO ES "REALIZ AR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA L AS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS P ÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)".
SEDE CENTRO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, MUNICIPIO DE CUCUTA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/12/2024 22:11:23
Documento validado por la DIAN:
19/12/2024 22:11:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8427228.25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8427228.25
IVA	1601173.37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1601173.37
Total neto factura (=)	10028401.62
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10028401.62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.427.228,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.427.228,25
IVA	1.601.173,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.601.173,37
Total neto factura (=)	10.028.401,62
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 10.028.401,62

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764076514855 Rango desde: 124 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-05

ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 DEL 30% CÚCUTA.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
LUGAR DE EJECUCION ORIP CUCUTA

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de octubre de 2024			lunes 16 de diciembre de 2024

CONTRATO Nº	2343 DE 2024	VALOR:				$ 323.014.524,00
		ADICIÓN				$ 0,00
		VALOR TOTAL				$ 323.014.524,00
CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER), MEDELLÍN NORTE (ANTIOQUIA), ABEJORRAL (ANTIOQUIA), DABEIBA (ANTIOQUIA), YOLOMBO (ANTIOQUIA), PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), PENSILVANIA (CALDAS) Y CALARCÁ (QUINDÍO) PARA LA AGRUPACIÓN NO. 2 "				
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC					

A LOS DIECISEIS (16) DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LADY AGUIRRE DIRECTORA DE OBRA DE BALER INGENIERIA SAS CONTRATISTA, Y JOSE SEBASTIAN PADILLA DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC, INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	ACTUALIZADOS	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ANTERIOR	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)										
1	PRELIMINARES								$ -	
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	250,00	249,91	213,19	0,00	213,19	$ 8.844,00	$ 1.885.432,02	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	238,00	354,84	270,90	0,00	270,90	$ 17.073,00	$ 4.625.075,70	
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	238,00	354,84	270,90	0,00	270,90	$ 19.682,00	$ 5.331.853,80	
1,18	DESMONTE VENTANA METÁLICA	m²	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 18.932,00	$ -	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	7,00	9,00	4,00	0,00	4,00	$ 19.129,00	$ 76.516,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	un	7,00	9,00	4,00	0,00	4,00	$ 17.933,00	$ 71.732,00	
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	m²	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 4.738,00	$ -	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	60,00	56,00	0,00	0,00	0,00	$ 22.548,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	100,00	541,52	158,00	0,00	158,00	$ 4.040,00	$ 638.320,00	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	3.570,00	3.238,85	0,00	0,00	0,00	$ 738,00	$ -	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	$ 12.861,00	$ 321.525,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	un	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	$ 600.171,00	$ -	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	$ 226.979,00	$ -	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
3,02	BARANDA TUBO REDONDO	m	44,00	12,00	12,00	0,00	12,00	$ 138.723,00	$ 1.664.676,00	
3,13	MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 283.534,00	$ -	
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	8,00	6,00	6,00	0,00	6,00	$ 192.048,00	$ 1.152.288,00	
3,19	REJILLA DE PISO 30CM	m²	3,20	7,75	7,75	0,00	7,75	$ 107.408,00	$ 832.412,00	
3,21	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA TERMOACUSTICA, DOBLE VIDRIO	m²	36,00		0,00	0,00	0,00	$ 1.816.716,00	$ -	
3,22	PUERTA TIPO PERSIANA, LAMINA CALIBRE 18 PINTURA ELECTROESTATICA 0,60 a 75 - h=2,00 a 2,200 incluye marco metálico y chapa de seguridad	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 698.304,00	$ -	
4	CIELORRASOS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	280,00	227,17	0,00	0,00	0,00	$ 130.552,00	$ -	
5	CONCRETOS Y MORTEROS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	20,00	46,70	46,70	0,00	46,70	$ 37.878,00	$ 1.768.902,60	
6	CUBIERTAS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
6,06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	30,00	36,72	0,00	0,00	0,00	$ 43.053,00	$ -	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	80,00	700,50	550,50	0,00	550,50	$ 59.302,00	$ 32.645.751,00	
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	$ 39.256,00	$ -	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	5,00	9,50	0,00	0,00	0,00	$ 82.891,00	$ -	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	23,00	102,51	96,42	0,00	96,42	$ 40.434,00	$ 3.898.646,28	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	98,00	398,93	349,93	0,00	349,93	$ 89.174,00	$ 31.204.247,62	
7	ENCHAPE MUROS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
7,03	RESANE	m²	10,00	128,94	128,94	0,00	128,94	$ 9.186,00	$ 1.184.458,82	
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
8,07	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	un	8,00	1,00	1,00	0,00	1,00	$ 91.964,00	$ 91.964,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] FACHADA Y TODAS LAS CULATAS	m²	306,00	482,44	431,78	0,00	431,78	$ 31.243,00	$ 13.489.974,44	
12	MUROS - MAMPOSTERÍA				0,00	0,00			$ -	
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	72,80	25,07	25,07	0,00		$ 62.107,00	$ 1.557.022,49	
12,11	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	3,00	8,20	6,20	0,00		$ 35.538,00	$ 220.335,60	
13	**PINTURAS**	0				0,00			$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	13,20	124,00		0,00		$ 12.718,00	$ -	
13,09	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m²	80,00	0,00	0,00	0,00		$ 23.939,00	$ -	
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	1.750,00	767,64	601,30	0,00		$ 25.433,00	$ 15.292.913,77	
13,15	PINTURA EPOXICA PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS	ml	20,00	18,70	18,70	0,00		$ 14.088,00	$ 263.445,60	
13,16	RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	ml	44,00	796,56	598,56	0,00		$ 20.433,00	$ 12.230.376,48	
14	PISOS	0			0,00	0,00			$ -	
14,01	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	m²	370,00	0,00	0,00	0,00		$ 31.659,00	$ -	
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	150,00	82,15	82,15	0,00		$ 64.282,00	$ 5.280.965,57	
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	m	24,00	16,26	16,26	0,00		$ 46.022,00	$ 748.317,72	
14,21	SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.	m	14,00	19,30	19,30	0,00		$ 60.648,00	$ 1.170.506,40	
15	RED ELÉCTRICA	0			0,00	0,00			$ -	
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10,00	23,00	0,00	0,00		$ 196.671,00	$ -	
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	50,00	19,00	0,00	0,00		$ 171.391,00	$ -	

15,14	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	un	3,00	2,00	0,00	0,00		$ 23.434,00	$ -	
15,25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	un	3,00	3,00	1,00	0,00		$ 192.355,00	$ 192.355,00	
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	3,00	3,00	0,00	0,00		$ 101.745,00	$ -	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	5,00	10,00	1,00	0,00		$ 110.078,00	$ 110.078,00	
15,44	CANALETA PLASTICA 100X45MM	ml	20,00	24,10	4,10	0,00		$ 34.011,00	$ 139.445,10	
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	3,00	10,00	0,00	0,00		$ 11.182,00	$ -	
15,54	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	un	1,00	2,00	0,00	0,00		$ 66.946,00	$ -	
16	RED HIDRÁULICA								$ -	
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	20,00	27,00	12,00	0,00		$ 12.434,00	$ 149.208,00	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	1,00	0,00	0,00		$ 25.704,00	$ -	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml	un	1,00	1,00	1,00	0,00		$ 56.637,00	$ 56.637,00	
17	RED SANITARIA	0			0,00	0,00			$ -	
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	3,00	4,00	0,00	0,00		$ 55.216,00	$ -	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	60,00	60,00	0,00	0,00		$ 28.170,00	$ -	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	40,00	16,50	16,50	0,00		$ 41.052,00	$ 677.358,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN	0			0,00	0,00			$ -	
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	630,00	398,93	299,00	0,00		$ 2.877,00	$ 860.223,00	
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	m²	3,00	3,00	0,00	0,00		$ 399.647,00	$ -	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	7,00	7,00	0,00	0,00		$ 46.137,00	$ -	
20	ADICIONALES	0			0,00	0,00			$ -	
20	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	68,00	60,76	0,00	0,00		$ 24.554,00	$ -	
0	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**								$ -	
1.10.	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UND	50,00	56,00	22,00			$ 19.073,00	$ 419.606,00	
8.05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	M2	73,00	9,94	9,94			$ 104.527,00	$ 1.038.998,38	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	100,56	100,56	100,56			$ 26.217,00	$ 2.636.363,17	
7,05	CERÁMICA FORMATO 30X60CM	m2	4,00	4,00	0,00			$ 85.427,00	$ -	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	30,00	30,00	12,00			$ 9.450,00	$ 113.400,00	
1,90	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	73,00	9,94	9,94			$ 19.850,00	$ 197.309,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UND			0,00			$ 403.448,00	$ -	
16,20	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	UND			0,00			$ 399.173,00	$ -	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	M2	10,00	10,00				$ 70.434,00	$ -	
1,21	DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	UND	1,00	1,00	1,00			$ 14.958,00	$ 14.958,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	und	1,00	1,00	1,00			$ 14.024,00	$ 14.024,00	
2,13	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	und	1,00	1,00				$ 541.328,00	$ -	
12,07	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	M2	15,30	15,30	15,30			$ 117.731,00	$ 1.801.284,30	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	8,45	8,45	0,00			$ 367.678,00	$ -	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	10,20	35,20	35,20			$ 18.245,00	$ 642.224,00	
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UND	1,00	1,00				$ 96.079,00	$ -	
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UND	1,00	1,00				$ 106.978,00	$ -	
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	ML	8,00	8,00				$ 40.017,00	$ -	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	11,00	11,00				$ 60.997,00	$ -	
20,18	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tubería en cobre hasta 3 ml)	und	2,00	2,00				$ 670.136,00	$ -	
20,8	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	und		4,00	4,00			$ 53.800,00	$ 215.200,00	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	ML		25,00	25,00			$ 4.476,00	$ 111.900,00	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM.	ML		25,00	25,00			$ 15.395,00	$ 384.875,00	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UND		1,00				$ 84.576,00	$ -	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UND		1,00	1,00			$ 126.629,00	$ 126.629,00	
NP-1	HERRAJES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN PARA PUERTAS O VENTANA EN ALUMINIO O METALICA	UND		4,00	4,00			$ 191.560,00	$ 766.240,00	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2		216,00	0,00			$ 27.789,00	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO									**$ 148.315.973,86**
	ADMINISTRACIÓN	23,85%								$ 35.373.368,93
	IMPREVISTOS	1,00%								$ 1.483.159,74
	UTILIDADES	5,00%								$ 7.415.798,69
	IVA SOBRE UTILIDADES	19,00%								$ 1.409.001,75

VALOR TOTAL OBRA	**$ 193.997.302,98**

VALOR TOTAL ORIP CUCUTA	**$ 193.997.302,98**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 323.014.524,00**
VALOR ADICIÓN N°1	**$ 0,00**
VALOR ACTUAL CONTRATO	**$ 323.014.524,00**

VALOR ANTICIPO	**$ 0,00**
PORCENTAJE DE ANTICIPO	**0,00%**

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$193.997.302,98	60,06%	30,00%	**$96.904.357,23**		**$0,00**	**$0,00**	**$ 96.904.357,23**	**$ 226.110.166,77**
2		0,0%				**$0,00**	**$0,00**	**$ -**	**$ 226.110.166,77**
3		0,0%				**$0,00**	**$0,00**	**$ -**	
4									
5									
TOTALES	**$193.997.302,98**	**60,06%**	**30,00%**	**$96.904.357,23**				**$ 96.904.357,23**	**$ 226.110.166,77**

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL. EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

LADY AGUIRRE
Representante Legal - Directora de obra
CONTRATISTA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC - Representante Legal
INTERVENTORIA

CÉSAR MARTINEZ
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

Formato Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.

Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES	Código: GA-DMIF-PR-01-FR-08
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES	Versión: 04
		Fecha: 10/10/2018
		Hoja 1 de 1


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO Nº	2343 de 2024		CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS		NIT / C.C.	900264015-8
PLAZO	4 MESES		FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA	25/10/2024		FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA	31/12/2024
CRP	566224	DEL 16/10/2024					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	712.517.120,00	TOTAL ADICIONES	$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	712.517.120,00
VALOR ORIP	$	323.014.524,00	TOTAL ADICIONES	$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	323.014.524,00
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."							

EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
FACTURA / CUENTA DE COBRO						% TOTAL DE EJECUCION
FECHA DD-MM-AA	FACTURA	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR	
16-dic-24	FE28	ACTA PARCIAL No. 1 CUCUTA 30%	$ 96.904.357,23	NA	$ 96.904.357,23	30,00%
					$ -	0,00%
					$ -	$ -
					$ -	0,00%
TOTALES			$ 96.904.357,23		$96.904.357,23	30,00%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 2343 DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA -FORMA DE PAGO
DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN	**1. Factura, Acta de recibo parcial 2 del 60% ORIP Cucuta, Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría, RUT, Contrato de obra, acta de inicio, Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, planillas de seguridad social, Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario.**

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS DIECISEIS (16) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024



CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante Legal
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC

SRPG

RUT CONTRATISTA INTERVENTORIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920917081

(415)7707212489984(8020) 000001492091708 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 9 9 5 6	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla
	JVM S.A.S. BIC

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 52 A 14 17 BARRIO MONTEVERDE

42. Correo electrónico jvmsas2021@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 5 4 1 9 2 5	6 0 4 7 8 4 6 5 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 1 1 2	2 0 2 1 0 5 2 8	4 2 2 0	2 0 2 1 0 5 2 8		4 2 9 0	4 3 3 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 17 / 15 : 17: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA NEGRETE CARLOS ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920917081

(415)7707212489984(8020) **000001492091708 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 9 9 5 6	3	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 5 2 8	
77. No. Matrícula mercantil	1 8 8 4 6 2	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	2 2	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 5 2 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 6 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920917081

(415)7707212489984(8020) **000001492091708 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 9 9 5 6	3	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 5 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 0 8 5 5 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
VERGARA	NEGRETE	CARLOS	ARTURO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

COPIA CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

Entre los suscritos, **WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** de la SNR, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Resolución No. **10989** del 14 de septiembre de 2022, con la cual se le delegó la Ordenación del Gasto, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y de la otra parte, **JVM INGENIERÍA S.A.S BIC,** identificada con **901.489.956-3,** representada legalmente por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE,** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.508.558,** de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de comercio de Montería**,** quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE INTERVENTORÍA núm. 2365-2024**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales vigentes atinentes a la materia, contrato que se tramita por la Plataforma Transaccional del **SECOP II** y, en consecuencia, se pactan condiciones adicionales, en consideración a lo siguiente:

1) Que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

2) Que la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

3) Que previamente se realizó el Concurso Público de Méritos 009 de 2024 para **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).**

4) Que en el mencionado proceso se recibieron tres propuestas por parte de los siguientes interesados:

NÚM.	PROPONENTE
1	JVM INGENIERÍA S.A.S BIC
2	CONSORCIO INTERJUJ 2024
3	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

5) Que de acuerdo con lo anterior y de conformidad con los parámetros previstos en el pliego de condiciones, se llevó a cabo la verificación de los requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, soportados en los puntajes, dando el siguiente orden de elegibilidad:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD – AGRUPACIÓN No. 2

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. 009 DE 2024

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)

RESUMEN EVALUACION FINAL - AGRUPACION No. 2

No.	NOMBRE PROPONENTE	AGRUPACION A LA QUE PRESENTA PROPUESTA				EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA DEL PERSONAL	5.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN									PUNTAJE FINAL
		1	2	3	4			ESTADO FINAL DOCUMENTOS HABILITANTES	5.4. FACTOR TECNICO DE CALIDAD 1: Inspector de interventoría y/o Coordinador de Interventoría Puntaje Máximo 40,5 puntos	5.5. FACTOR TECNICO DE CALIDAD 2: EXPERIENCIA ADICIONAL Puntaje Máximo 40 puntos	5.6. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Puntaje Máximo 10 puntos	5.7. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Puntaje Máximo 1 punto	5.8. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES Puntaje Máximo 0,25 puntos	5.10. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA Puntaje Máximo 0,25 puntos	REDUCCIÓN PUNTAJE POR ANOTACIONES VIGENTES DE OBRAS INCONCLUSAS Puntaje maximo a reducir 1 punto	5.11. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Puntaje maximo a reducir 2 puntos	
1	JVM INGENIERIA S.A.S BIC	X	X	X	X	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	40,5000000	40,0000000	10,0000000	1,0000000	0,2500000	0,2500000	0,0000000	0,0000000	100,0000000
2	(*) CONSORCIO INTERJUJ 2024	X	X	X	X	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
3	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	X	X			EL PROPONENTE ES ADJUDICATARIO DE LA AGRUPACION No. 1. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 5.17 MODO DE ADJUDICACIÓN. (...) B. El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato para alguna de las AGRUPACIONES, no podrá participar ni ser adjudicatario de las otras AGRUPACIONES. Es decir que la entidad adjudicará los CUATRO (4) contratos a CUATRO (4) proponentes diferentes (...)									

6) Que conforme a lo anterior resultó ganador de la **AGRUPACIÓN No. 2** el proponente **JVM INGENIERÍA S.A.S BIC** con **100 puntos** y quien oferto un precio de **CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($110.605.055,00) M/CTE,** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido IVA.

7) Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, las demás normas que lo reglamenten o modifiquen y las siguientes clausulas.

CLÁUSULA PRIMERA: - OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA) – AGRUPACIÓN 2.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor, según corresponda.

La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo contable, jurídico y financiero que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,

podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.

El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales, sociales, presupuéstales, contables y financieros en el desarrollo del contrato.

La Interventoría debe asumir una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos específicos de la Interventoría serán entre otros:

- Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes.

- Colaborar: Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al Contratista.

- Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra hasta obtener su liquidación.

- Exigir: La Interventora tiene la obligación de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

- Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

- Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del contrato. Esta acción

también se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas.

- Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

CLÁUSULA TERCERA: - VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: A) VALOR: El valor del presente contrato de interventoría es hasta por la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($110.605.055,00) M/CTE.** incluidos todos los costos directos e indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto contractual, incluido lVA**. B) PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución será de **tres (3) meses y quince (15) días.**

El tiempo será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II y sin exceder el 31 de diciembre de 2024.

El plazo de ejecución del contrato de INTERVENTORÍA y los tiempos serán contados a partir del lleno de los requisitos legales para la ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribirá con la interventoría y la entidad, previo el lleno de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo por la plataforma SECOP II.

PARÁGRAFO 1: La ejecución del presente contrato queda supeditada a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual debe ser firmada en compañía de la supervisión del contrato.

PARÁGRAFO 2: El costo de las visitas para inicio, durante el proceso de ejecución y recibo de obras, deben estar contemplados en los costos de la oferta económica del oferente.

PARÁGRAFO 3: La INTERVENTORÍA a las obras se realizará en una (1) etapa de acuerdo con las especificaciones del MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO y el presupuesto publicado por la entidad

CLÁUSULA CUARTA: - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Esta contratación será financiada con recursos provenientes del presupuesto rubro C-1209-0800-17-53105B-1209004-02-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA – RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL, para la vigencia 2024, los cuales se encuentran soportados bajo el CDP 102024 del 15 de agosto de 2024, expedido por el responsable de presupuesto.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

CLÁUSULA QUINTA: - FORMA DE PAGO: El valor de la INTERVENTORÍA DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS IVA, se pagará mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones:

PAGOS DIRECTOS

Se pagará hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la INTERVENTORÍA, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante el plazo de ejecución del contrato. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Informe del avance y las labores ejecutadas por la interventoría
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por el supervisor.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Registro fotográfico del avance de las ejecuciones y actividades desarrolladas por el contratista a la fecha y revisadas por la interventoría.
11. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

PAGOS AVANCE DE OBRA

Hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la INTERVENTORÍA, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de ejecución financiero del contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor.

PAGOS – ACTA PARCIAL 1.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

Se efectuará el primer pago del 20% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 30% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales avance correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo parcial 1 firmada por la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría (En caso de requerirse).
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
13. Registro fotográfico del avance de las obras de cada uno de los frentes.
14. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2

Se efectuará un segundo pago del 20% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 60% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales avance correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

2. Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
13. Registro fotográfico del avance de obras de cada uno de los frentes.
14. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

TERCER PAGO –ACTA PARCIAL 3.

Se efectuará un tercer pago del 30% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 90% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales avance correspondientes y debidamente firmadas por el contratista de obra, interventoría y visto bueno de la supervisión.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos**:**

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales
2. Copia del Acta de recibo parcial 3 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
13. Registro fotográfico del avance de obras de cada uno de los frentes.
14. Copia de Bitácora de Obra actualizada con todos los acontecimientos del periodo a cobrar.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes

PAGO FINAL

Se efectuará el pago final del 10% del valor final correspondiente al 100% de la ejecución del contrato, con la presentación del informe final del contratista, aprobado por el supervisor, la póliza de la garantía única actualizada y la proyección del acta de liquidación del contrato.

Para la cancelación de estos recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y con la presentación de los siguientes documentos:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Copia del Acta de recibo final firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.
3. Copia del Certificado de cumplimiento firmado por la interventoría.
4. Copia del RUT contratista de interventoría.
5. Copia del Contrato de interventoría.
6. Copia del acta de inicio.
7. Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Copias planillas de seguridad social.
9. Certificación bancaria no mayor a 30 días calendario, en la cual se relacione la cuenta, tipo de cuenta y entidad bancaria donde se debe consignar los dineros correspondientes.
10. Acta de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
11. Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra y obra no prevista final suscrita por el contratista de obra, el contratista de interventoría y el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.
12. Entregar Informe de obra en medio magnético con registro fotográfico organizado de forma cronológica desde el inicio hasta la terminación de la obra.
13. Entregar Video de la obra (registrando cada uno de los espacios de la edificación).
14. Entregar Bitácora de obra escaneada en medio magnético.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

15. Entregar Informe de todos los ensayos de laboratorio que se realizaron durante la ejecución de la obra con la información de los resultados obtenidos.
16. Entregar Informe del listado del personal que laboró en la obra y copia de la seguridad social.
17. Entregar Informe de las licencias y/o permisos adicionales tramitados durante la ejecución de la obra.
18. Entregar planos record en medio magnético y físicos debidamente firmados por el contratista de obra e interventor.
19. Entregar memorias de cálculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría del contrato.
20. Entregar el Manual de operación y funcionamiento con los respectivos catálogos.
21. Entregar el Manual de mantenimiento
22. Entregar el soporte de pago de las facturas de los servicios públicos.
23. Entregar el Paz y salvo de pago a proveedores y personal que hicieron parte de la ejecución de las obras.
24. Entregar el Compilado de las certificaciones de calidad de materiales solicitados y utilizados en la obra y que fueron requeridos para el desarrollo de la misma y certificación de calibración de los equipos utilizados.
25. Registro fotográfico del avance de obras de cada uno de los frentes.

Nota: Las cuentas de cobro deberán presentarse a más tardar los días quince (15) de cada mes.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará dentro de los CUATRO (4) meses siguientes al recibo a satisfacción de las obras contempladas dentro del objeto contractual y su alcance.

PARÁGRAFO 1: El valor del contrato se pagará conforme a las actividades ejecutadas, para lo cual será necesario la certificación y aprobación por parte del supervisor (o quien haga sus veces) donde certifique la realización de las actividades objeto de contratación por la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**.

PARÁGRAFO 2: La **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** no reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO,** de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes en lo concerniente al manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable, y allegarla a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.

PARÁGRAFO 4: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo

empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del **CONTRATISTA** y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO 5: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de caja (PAC) autorizado, situación que **EL CONTRATISTA** declara conocer y aceptar.

PARÁGRAFO 6: Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga **EL CONTRATISTA** acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por **EL CONTRATISTA.**

PARÁGRAFO 7: LA SUPERINTENDENCIA no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.**

NOTA 1: La entidad no realizara adición en dinero, teniendo en cuenta que la interventoría contratada tiene un fin específico el cual es controlar obras desde el inicio hasta su culminación. En caso de ser necesario solo se adicionará en valor el contrato de interventoría proporcionalmente al valor adicionado en el contrato de obra y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos y esté debidamente justificado.

NOTA 2: Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

CLÁUSULA SEXTA: - LUGAR DE EJECUCIÓN: Las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la interventoría a las obras son las siguientes:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

AGRUPACIÓN No. 2

N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCION
1	CENTRO	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	Avenida Cero No. 9-30
2	ANDINA	ANTIOQUIA	MEDELLIN NORTE	Carrera 47 No. 52-122 Int. 201
3			ABEJORRAL	Calle Santuario No. 50-25 SI-321
4			DABEIBA	Calle 11 No. 11-58
5			YOLOMBO	Calle 21 No. 18-35
6			PUERTO BERRIO	Carrera 2 No. 6-16
7		CALDAS	MANIZALES	Centro Comercial Cancafe Local 10 - Calle 19 No. 21-44
8		QUINDIO	PENSILVANIA	Calle 4 No. 7-35
9			CALARCA	Carrera 26 No. 39-21 Local 201

CLÁUSULA SÉPTIMA: - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: **1)** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2)** Está debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **3)** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. **4)** Los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

CLÁUSULA OCTAVA: - RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato.

CLÁUSULA NOVENA: - OBLIGACIONES DEL GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:

A. OBLIGACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA adquiere para con **LA SUPERINTENDENCIA**, las siguientes obligaciones generales:

a. Aportar y cargar en la Plataforma Transaccional del **SECOP II,** para conocimiento de la **SUPERINTENDENCIA** y en los plazos en los que se le determine, los documentos requeridos para el inicio del contrato.
b. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la SNR.
c. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

d. Respetar la política medioambiental de la SNR, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.
e. Constituir la garantía a favor de **LA SUPERINTENDENCIA** por los valores y con los amparos previstos en el contrato y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días calendario siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte de la **SUPERINTENDENCIA,** cuando a ello hubiere lugar.
f. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del contrato.
g. Suscribir, conjuntamente con la supervisión del contrato (o quien haga sus veces), el acta de inicio correspondiente una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
h. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor del contrato.
i. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la SNR.
j. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de quien sea designado como supervisor del contrato.
k. Suscribir con el contratista de obra el respectivo cronograma de actividades a desarrollarse dentro de los tiempos contractuales.
l. Presentar los informes que le indique el supervisor.
m. Obrar con la diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que se le asignen a través del Supervisor del contrato.
n. Atender los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.
o. Informar oportunamente al supervisor del contrato o quien haga sus veces, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.
p. Acatar las instrucciones que, dentro del marco del objeto y obligaciones del presente contrato, se le impartan por parte de LA SUPERINTENDENCIA, a través del Supervisor, durante el desarrollo del contrato de consultoría.
q. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.
r. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por **EL CONSULTOR** durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
s. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato
t. Garantizar que el manejo de la imagen institucional por parte del contratista de obra, esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen a la **SUPERINTENDENCIA**.
u. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

v. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Supervisor del contrato y/o de la entidad.
w. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
x. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega a **LA SUPERINTENDENCIA** de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.
y. Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.
z. Estar a paz y salvo por el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
aa. Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro.
bb. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la SNR - Superintendencia de Notariado y Registro y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
cc. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de avance de obra, que den cuenta de la ejecución del contrato una vez aprobados y firmados por el Supervisor, adjunta la factura correspondiente y demás documentos a que hubiere lugar (en caso que se requiera) dentro de los tres (3) días siguientes a su aprobación y firma por parte del Supervisor.
dd. Verificar que el contratista de obra desarrolle las obras de manera que no se afecten a los vecinos o terceros de las obras, y en caso de algún inconveniente, se debe verificar la responsabilidad del contratista y proceder a solucionarlo.
ee. Todos los empleados a cargo del Consultor al momento del desarrollo del objeto contractual deben contar con todo el equipo de seguridad durante todo el tiempo que se encuentren en el inmueble de la SNR ejecutando el objeto contractual.
ff. Verificar cada vez que, entre un nuevo trabajador por parte del contratista de obra, que el mismo cuente con todas las afiliaciones de Ley.
gg. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

hh. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término establecido en el presente documento.
ii. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por **LA SUPERINTENDENCIA** relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
jj. La Interventoría debe verificar que el contratista implemente un plan de contingencia que minimice el riesgo de retraso de la ejecución de las obras por motivo de lluvias (Si es del caso), así como llevar el registro diario en bitácora del estado del clima.
kk. Verificar que el contratista lleve un registro diario en Bitácora del ingreso o retiro de los trabajadores que ejecutaran las actividades, previo cumplimiento de los documentos necesarios para el ingreso e inicio de actividades por cada empleado.
ll. Solicitar al contratista las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra y así verificar que cuenten con las certificaciones necesarias que acrediten su calidad y estén conformes a las especificaciones técnicas y necesidades del presente proceso.
mm. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, de la invitación pública y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS. El CONTRATISTA, adquiere para con **LA SUPERINTENDENCIA** las siguientes obligaciones específicas:

- **DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**

EL EQUIPO DISPONIBLE DEL CONSULTOR, tiene la obligación de suministrar oportunamente todos los medios necesarios para cumplir con el objeto del contrato con los programas, plazos y especificaciones técnicas de la obra, so pena de la aplicación de las sanciones que se establezcan en el contrato por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para el mantenimiento, adecuación y mejoramiento, deben ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.

a. Solicitar al contratista de obra y entregar para aprobación de la supervisión o quien haga sus veces con plazo máximo de TRES (3) días calendario luego de la firma del respectivo contrato, un cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los que entregará las adecuaciones. El incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma dará lugar al inicio de las actuaciones sancionatorias a que haya lugar.
b. Cumplir con el objeto, el alcance del mismo y obligaciones contractuales en los términos y con las especificaciones descritas en el contrato y los documentos que lo integran.
c. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPOS: Estará a cargo del CONSULTOR la respectiva revisión al CONTRATISTA al momento de la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas,

repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual; así como el recurso humano que requiera para cumplir con el objeto y obligaciones contractuales. Las obras de adecuación serán responsabilidad del contratista hasta tanto no sean recibidos a satisfacción por la interventoría y La Entidad.

d. PAGO DE SALARIOS: El CONSULTOR DE INTERVENTORÍA debe asumir el pago oportuno de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato.
e. CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecución del objeto del contrato, el CONSULTOR DE INTERVENTORÍA tendrá la obligación de exigirle al CONTRATISTA DE OBRA poner en práctica procedimientos adecuados de montaje, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Así mismo, vigilara que el CONTRATISTA DE OBRA tenga las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cualquier daño que pudiere ocasionar al inmueble, y sus respectivas estructuras, instalaciones o redes.
f. Verificar y aprobar las zonas que serán intervenidas para iniciar y ejecutar el objeto del contrato por parte del CONTRATISTA DE OBRA.
g. Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra establecidas en el contrato y las que se establezcan conjuntamente con la visita adelantada previo al inicio de la ejecución de las obras y presentar un informe a la SUPERINTENDENCIA sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al mismo.
h. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA ejecute los ítem y cantidades a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la Entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier obra que resultaré mal ejecutada a juicio del Interventor y/o entidad, así mismo el Contratista se deberá ajustar a los horarios señalados para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que se deberá efectuar el trabajo 24 horas del día de domingo a domingo, incluyendo festivos.
i. Cumplir con el personal mínimo solicitado en la presente convocatoria.
j. Poner en práctica como Interventoría los procedimientos adecuados de construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados en el inmueble a intervenir.
k. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA conserve en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA DE OBRA cualquier daño que pudiere ocasionar a

tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, responderá por la disponibilidad de volquetas para el retiro oportuno de los escombros, de acuerdo a las normas y entregar las obras en perfecto estado de limpieza.

l. La INTERVENTORÍA verificara que el CONTRATISTA DE OBRA repare las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al presente Contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas (En caso de requerirse).
m. Realizar la actualización de la vigencia de las garantías constituidas a la fecha de suscripción del acta de inicio y cuando se requiera.
n. Elaborar con el contratista de la obra las actas de iniciación y las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, las cuales no deberán sobrepasar el valor de la obra, debidamente justificadas, cambio de especificaciones, entregas parciales, liquidación y todas aquellas a que hubiere lugar, en coordinación con el contratista. Las actas de suspensión, reiniciación y liquidación deberán ser aprobadas por la Secretaria General.
o. Legalizar las actas de mayores, menores cantidades de obra y obra no prevista, mensualmente ante la Supervisión, cuando se requiera, de acuerdo con el avance del contrato.
p. Mantener actualizada la documentación de los contratos.
q. Estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizará y acordará con el constructor los precios de los ítems no pactados en el contrato para luego remitirlos a la entidad contratante para la aprobación respectiva antes de la ejecución de esas obras.
r. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la SUPERINTENDENCIA.
s. Programar y coordinar con el contratista y con la SUPERINTENDENCIA las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.
t. Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. El interventor deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones, así mismo verificará la calidad de los materiales utilizados por el contratista.
u. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.
v. Revisar y dar el visto bueno en caso de haber cambios en la ejecución del contrato, previo visto bueno del Supervisor del contrato.
w. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar

oportunamente a la SUPERINTENDENCIA y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

x. El Consultor acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su Oferta económica autónoma.

y. Verificar que toda actividad cuente con la previa autorización del director y/o residente de interventoría y dicho inicio y lugar de la actividad deberán quedar consignados en la respectiva bitácora de obra, un error en la ejecución de un ítem sin el previo consentimiento de la Interventoría y/o la supervisión, correrá por cuenta de Contratista y no será imputable a las cantidades contractuales.

z. Presentar al Supervisor del contrato un informe mensual de ejecución, manifestando el avance en la programación, de acuerdo con lo establecido en el contrato y las dificultades en la ejecución del mismo.

aa. Realizar seguimiento detallado de la información contenida en los documentos aportados por el CONTRATISTA DE OBRA, presentando un informe semanal a la Superintendencia de Notariado y Registro sobre el cumplimiento del cuadro de rendimientos, programaciones y todo lo relacionado en la correcta ejecución y avance del contrato, en caso de incumplimiento por parte del contratista deberá informarlo por escrito a la entidad y en caso de que afecte la normal ejecución del contrato sugerir los procedimientos sancionatorios que correspondan.

bb. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del Interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato el concepto de aprobación de ítems y precios no previstos y los respectivos análisis de precios unitarios. En caso de que la SUPERINTENDENCIA presente observaciones a los APU de ítems no previstos, el Interventor deberá efectuar las correcciones del caso.

cc. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las licencias y/o permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.

dd. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.

ee. Suscribir el acta de inicio según lo señalado.

ff. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.

gg. Asistir a los comités de obra y seguimiento técnico, los cuales deberán ser semanal o quincenal y se realizarán presencial en el sitio de las obras, apoyados con videoconferencias para la asistencia de los delegados por parte de la entidad.

hh. Las videoconferencias se realizarán a través del aplicativo que para este fin posee la Entidad. Los costos de los medios para la comunicación por vía internet y los equipos necesarios para la videoconferencia, serán asumidos por el Contratista de obra.

ii. El CONSULTOR se compromete a llevar una bitácora, en donde consten las órdenes y el desarrollo de la obra, la misma debe ser diligenciada diariamente durante la ejecución, la

cual será administrada por la interventoría y entregada en el informe final, la omisión de alguna información en la bitácora, no exime al contratista o interventor de su responsabilidad.

jj. El Contratista se compromete a presentar los informes, reportes, bitácoras y demás documentos ante la Entidad, de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y los formatos definidos por La Entidad.

kk. Presentar a La Entidad, el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la Normatividad vigente, para realizar las actividades de la presente contratación, revisado y aprobado por la Interventoría para su implementación en obra.

ll. El transporte, custodia y almacenamiento de los bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del CONSULTOR. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del CONSULTOR, correrán por su cuenta.

mm. Adoptar e implementar los protocolos de bioseguridad (PAPSO) y SST de acuerdo a la normatividad vigente en cada obra y los costos serán asumidos por el Contratista.

nn. El CONSULTOR se verá obligado a contratar personal idóneo, capacitado y especializado en lo requerido dentro del presente proceso.

oo. El CONSULTOR debe exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega de los planos record en medio magnético y físico al finalizar la ejecución del objeto contractual.

pp. Cumplir con los componentes internos de la administración que fueron calculados por la Entidad.

qq. Suscribir las actas de vecindad con el respectivo registro fotográfico antes del inicio de las obras y al finalizar para verificar que se encuentren en el mismo estado cuando se iniciaron los mantenimientos objeto del presente proceso contractual.

rr. El CONSULTOR y el equipo del CONSTRAISTA DE OBRA deberán cumplir lo estipulado en la resolución 4272 de 2021 donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

ss. Llevar un archivo fotográfico de cada una de LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO de la Agrupación No. 1, No. 2, No. 3 y No.4, desde el inicio hasta su terminación, el cual debe ser entregado al Supervisor al momento del recibo final o liquidación del mismo.

tt. El Interventor y contratista de obra se compromete con la entidad en cumplir con lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, Articulo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), donde señala: PARÁGRAFO 2. Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas y/o subcontratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Decreto 171 de 2016, Resolución 0312 de 2019.

uu. Presentar catálogos, manuales y/o fichas técnicas de los elementos ofertadas en idioma español y que serán enviadas a la interventoría por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

vv. Mantener la vigencia del precio unitario propuesto durante toda la vigencia del contrato.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

ww. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA Cumpla con la entrega de las adecuaciones dentro del plazo contractual establecido en el presente documento, es decir a los tres (3) meses y quince (15) días siguientes de la suscripción del acta de inicio.

xx. Realizar el cobro de la facturación generada en el marco del contrato, para lo cual deberá cumplir con los procedimientos y requisitos internos establecidos al interior de la Superintendencia de Notariado y Registro.

yy. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista.

zz. El Interventor Debe verificar que el contratista realice la entrega y socialización del **Manual de Mantenimiento** de las obras ejecutadas.

aaa. Autorizar la contratación de la mano de obra de los diferentes capítulos del presupuesto y supervisará la administración de los subcontratos.

bbb. La Interventoría estará pendiente que todos los trabajadores contratos cuenten con la capacitación y experiencia en acabados de obra, esto con el fin de desempeñar las labores que conlleva este tipo de intervenciones.

ccc. Aprobar el pago de las cuentas de los subcontratistas, trabajadores o proveedores, según las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la ley.

ddd. Verificar que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los presupuestos, especificaciones y contrato de obra.

eee. Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del contrato.

fff. Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.

ggg. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto a la SUPERINTEDENCIA para la resolución final de las mismas.

hhh. Suspender si es necesario el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto técnico previo sobre la suspensión.

iii. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto. Además, elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes a la SUPERINTEDENCIA para su aprobación con una antelación mínima de DIEZ (10) días calendario a la fecha requerida para su implementación, las cuales deben estar suficientemente justificadas técnica, jurídica y económicamente.

jjj. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato

kkk. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.

lll. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor

deberá informar al supervisor de este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.

mmm. El Interventor deberá en compañía del CONTRATISTA DE OBRA, verificar las zonas donde se van a iniciar los trabajos y en qué estado se encuentran los equipos o elementos existentes en la misma, en caso de daño o que los mimos no funcione de manera adecuada una vez se finalice la ejecución, es responsabilidad del Contratista de obra dejar los elementos en el estado que fueron entregados.

nnn. Enviar en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato al supervisor, copia de los requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento (el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación), si el Contratista lo incumple, el interventor deberá informar de inmediato al supervisor con el fin de informar a la Dirección de Contratación, para que se dé aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el interventor deberá enviar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados y este remitirlos a la Secretaría General. Si el incumplimiento conlleva, además, a un indebido manejo de recursos, el interventor deberá informar al supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.

ooo. Elaborar el acta de terminación del contrato y el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en un tiempo máximo de QUINCE (15) días contados a partir de la fecha del recibo final de las obras y remitir a la SUPERINTENDENCIA para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.

ppp. Realizar la respectiva acta y hacer respetar los acuerdos o actividades acordados en la vista inicial de reconocimiento en compañía de la interventoría y la supervisión.

qqq. Verificar que el contratista de inicio a las actividades a ejecutar producto del proceso, a más tardar tres (3) días calendario, posterior a la aprobación del cronograma de actividades presentado por el contratista de obra.

rrr. Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.

sss. Realizar la interventoría de acuerdo con la Resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021 ANEXO – MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y las que la modifiquen, adicionen o deroguen, de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual se adopta el manual interno de Supervisión e interventoría de los Contratos que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro.

ttt. Realizar los cobros respectivos una vez se cumpla con los porcentajes establecidos en el aparte forma de pago y realizar el continuo acompañamiento para que el contratista de obra también realice sus cobros una vez se cumpla con el avance estipulado.

uuu. Cuando se requiera del desmonte, traslado o manipulación de cualquier aparato o equipo de la SNR, el INTERVENTOR en compañía del contratista de Obra deben dejar constancia median acta, bitácora, fotografías y videos, del estado de funcionamiento del elemento a manipular, y el mismo una vez se culmine la actividad debe quedar conforme

se reportó al inicio de la actividad, en caso que no se diligencie la evidencia o el contratista inicie actividades sin autorización de la interventoría, el contratista es responsable del arreglo o cambio de elemento en caso que presente fallas.

vvv. El interventor debe verificar antes del inicio de cualquier actividad, que el contratista cuente con todos los materiales y el personal técnico de cada actividad para evitar problemas al momento de su ejecución, actividades como cambio de cubierta, cambio de estructura de cubierta, cielorrasos, pisos, entre otros deben contar con todos los elementos necesarios para evitar problemas en el funcionamiento de la oficina.

www. El Interventor en compañía del contratista deben realizar las respectivas memorias de cantidades de obra, donde se debe plantear de forma clara las cantidades ejecutadas y el sitio de su ejecución.

xxx. Cumplimiento de toda la regulación que aplica en materia ambiental para el presente proceso

yyy. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

- **INTERVENTORÍA FINANCIERA**

Realizar el seguimiento a la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir, con el fin de tener herramientas para realizar las recomendaciones y ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de las obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de ejecución del contrato.

La interventoría deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios para realizar los pagos y realizar la revisión de los mismos, realizando y suscribiendo las certificaciones que correspondan, además debe vigilar que el contratista de obra realice los respectivos cobros una vez se cumpla con los avances de obra estipulados para tal fin, se debe evitar que el contratista acumule pagos.

- **INTERVENTORÍA LEGAL**

Revisión de los documentos del contratista de obra, tales como, Contrato de obra, Pliegos de condiciones y en general de los documentos que hacen parte del contrato. Lo anterior, con el objeto de que sean conocidas las condiciones y obligaciones del contratista de obra y el personal vinculado y responsable de la ejecución del contrato.

Se debe mantener un estricto control y seguimiento a las garantías suscritas por el contratista, haciendo énfasis en la vigencia de las mismas, en concordancia con lo establecido en el contrato de obra. Se revisará e informará a la Entidad oportunamente de las condiciones y vencimiento de las mismas.

Así mismo realizar la verificación del pago de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que utilice el contratista en la ejecución de las obras.

De igual manera, realizar el seguimiento legal a la ejecución del contrato y asegurarse de que el contrato se cumpla en todos sus términos y condiciones. Esto incluye la revisión de los plazos de ejecución, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requisitos legales.

Debe además realizar los informes, reportes y conceptos jurídicos y/o Legales que La Entidad solicite al Interventor, en relación con la ejecución del contrato. También debe informar a las partes sobre cualquier problema o incumplimiento detectado y proponer soluciones para corregirlos.

- **INTERVENTORÍA AMBIENTAL**

La interventoría deberá efectuar el seguimiento del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por ellos mismos, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio ambiente.

Para ello se deberá atender la normatividad de orden constitucional, y legal como la Ley 99 de 1993 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción, entre otras.

Atender la normatividad legal vigente sobre sanidad ambiental y fumigación (Ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991 y demás normas que amplíen o modifiquen la materia).

- **CONTROL DE COSTOS**

Con base en el presupuesto de la obra y mediante la continua confrontación de este con las cantidades de obra, los precios básicos, las compras, contratos, rendimientos de mano de obra, análisis de los demás factores que inciden en los costos se procura mantener una información más real y actualizada que permita a la entidad contratante tener una visualización oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones que se produzcan a los estimados, una idea de las razones y de las medidas correctivas que se puedan tomar.

En caso de que antes del inicio de las labores de mantenimiento y a juicio de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la SNR la cual será conformada por un funcionario o funcionarios del Grupo de Infraestructura, sea necesario ejecutar otros ítems no contemplados en el contrato inicial, el Contratista y la Interventoría pactarán nuevos precios para estos ítems dentro de los términos estipulados en la Ley 80 de 1993. Así el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los ítems no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoría, previo visto bueno de la Supervisión designada por la SNR, teniendo en cuenta los precios

vigentes en el mercado en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta original del contratista.

Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos - del respectivo manual de Interventoría, todo lo anterior previo visto bueno de la INTERVENTORÍA y la ENTIDAD.

En caso que, entre el Contratista y la Interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la información al Supervisor designado por la SNR, quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista y la interventora del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas por retrasos en el cronograma.

- **CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

Consiste en controlar la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para la ejecución de los de las actividades contratadas. Establece un marco de referencia con base en la metodología de secuencias, tiempos e interrelaciones, para desarrollar el conjunto o cada una de las actividades que componen la etapa de la ejecución de las obras.

Indica las responsabilidades de los distintos grupos de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos para poder cumplir las metas preestablecidas.

Las visitas serán programadas conjuntamente, con el contratista de obra, interventoría y la entidad. Hacer seguimiento constante a la programación de la obra.

Llevar a cabo lo establecido en la resolución 682 de 24 de abril de 2020 con relación al (PAPSO).

- **RECOMENDACIONES**

Liquidación del contrato de interventoría

El Supervisor procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la interventoría, la cual se suscribirá máximo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al

vencimiento del plazo de ejecución del contrato La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.

Inspección final de la obra

El Interventor, el supervisor y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra, DIEZ (10) días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.

En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista se dará por parte de la Interventoría y supervisión, máximo tres (3) días calendario para su atención, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y Entrega de la obra.

Manual de Mantenimiento de obras ejecutadas.

El Interventor deberá solicitar al contratista la entrega y socialización de un manual de mantenimiento de las obras ejecutadas, así cada oficina será responsable del cuidado de las obras ejecutadas.

- **CONTROL DEL PERSONAL Y DEL EQUIPO**

La Interventoría designará Ingenieros y/o Arquitectos, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.

Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su ubicación en el sitio, a más tardar en TRES (3) días calendario, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar se hagan efectivas las medidas administrativas que para el efecto tiene fijadas, según el ANEXO – MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SNR.

La interventoría levantará los registros de calidad, de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del contratista.

El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y demás normas vigentes, respecto al ejercicio de la profesión en el territorio nacional. El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo de trabajo y el respectivo personal, en las condiciones ofrecidas durante el proceso y así lograr una adecuada interventoría.

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrá las siguientes funciones:

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

Controlar, exigir, colaborar, resolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993) y los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones, los estudios y diseños del proyecto, la normatividad vigente y demás obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoría que garanticen la correcta ejecución del proyecto, así como:

- Inspeccionar las actividades de los procesos constructivos, de acuerdo con lo establecido en los pliegos.
- Tomar medidas y verificar cantidades ejecutadas en cada uno de los frentes de trabajo en compañía del contratista de obra.
- Verificar el cumplimento de las especificaciones técnicas del material requerido para el desarrollo de la obra.
- Verificar que todo el personal del contratista cumpla con las prácticas y elementos de seguridad en el trabajo.
- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
- Suscribir el acta de replanteo (Mayores y Menores) o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas en cada uno de los frentes. Será responsable de la veracidad y exactitud del certificado final de obra que haya firmado.
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la Bitácora de obra ejecutada), aportando los resultados del control realizado.

Insumos.

La SNR entregará al **Interventor,** copia del Contrato de obra suscrito con el Contratista, así como los estudios y los documentos previos que lo soportan, sin embrago cualquier documento contractual puede ser verificado en el SECOP II.

Productos.

El interventor deberá solicitar al contratista:

- Hojas de vida del personal profesional.
- Relación del equipo mínimo obligatorio.
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
- Programa de Obra y flujo de inversiones
- Plan de manejo de tránsito- PMT (Si se requiere).

- Permisos Ambientales de las canteras, plantas de concreto, plantas de asfalto y escombreras que utilizará durante la Etapa de Construcción, así como también los permisos que sean necesarios utilizar.
- Plan de manejo ambiental
- Plan de calidad y cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del Contratista.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.

Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

- **CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS**

Objetivo: Comprobar que los recursos de materiales que va a utilizar en las obras el **Contratista,** corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el **Contrato de Obra.**

Materiales: El Interventor realizará las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, además de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idóneos para corroborar con certeza que la obra ejecutada por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos en el **Contrato de Obra.**

Así mismo, deberá verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos, acero de refuerzo, etc.), sirviendo de comprobación a los controles de calidad que realice **el Contratista**. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los ensayos y/o pruebas que adelante el **Contratista e Interventoría**, primaran para efectos de la comprobación de las **Metas Físicas** y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta última**.**

Adicionalmente, deberá controlar los procesos de fabricación y transporte de los productos elaborados fuera del área del proyecto, para su utilización en la ejecución de las Obras de Construcción. Haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para cámaras, tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados (de existir) y demás implementos. En caso de no ser posible la verificación directa de los procesos de fabricación de los productos elaborados fuera del área del **Proyecto** por parte del **Interventor**, éste deberá solicitar al **Contratista** los protocolos de ensayos de tales materiales, en los cuales deberán constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el **Contrato de Obra**, o que tales calidades resultan ser superiores a las que allí se especifican.

Insumos: Para adelantar dicha labor el **Interventor** deberá contar, entre otros y como mínimo, con los siguientes insumos:

- Muestras, catálogos y certificaciones de la calidad de los materiales.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

- Realización y/o Revisión de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en el Contrato de Obra.
- Visita de inspección a sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los productos fabricados fuera del área del proyecto.

Productos:

Los productos resultantes de este proceso corresponderán a:

- Entregar informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capítulo del informe mensual exigido en el Contrato de Interventoría.
- Presentar y analizar los resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
- Efectuar los requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad, cuando sea necesario.
- Presentar informes de inspección a las instalaciones de fabricación
- Notificar al Contratista y a la entidad respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos realizados.
- Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra.
- Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la imposición de multas al Contratista, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra.

CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA.

Objetivo: Verificar los procesos constructivos empleados por el **Contratista,** la secuencia y cronograma de los mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a éste cumplir con los resultados esperados y la **Programación de Obra y flujo de inversiones** y **Cronograma de Metas Físicas** entregados por el Contratista.

Insumos:

- Reuniones semanales entre contratista e interventoría, las cuales serán realizadas de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría interno de la SNR según resolución No. 8044 del 30 de agosto de 2021.
- Informes de Interventoría, los cuales deberán ser elaborados diariamente por el personal contratado y debe estar consignado en la respectiva Bitácora de Obra.
- Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.
- Registro fotográfico y fílmico de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de construcción del proyecto (antes - durante y final), estos registros deben hacer parte de os informes semanales y mensuales de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

CLÁUSULA DÉCIMA: - OBLIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA: La Superintendencia de Notariado y Registro, se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

a. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con él para el desarrollo del mismo.
b. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda de tal manera que facilite su labor.
c. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.
d. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervisión dará aviso oportuno a LA SUPERINTENDENCIA sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
e. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión de la presente contratación.
f. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia del contrato.
g. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
h. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello hubiere lugar.
i. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, cuando hubiere lugar.
j. Las demás inherentes al contrato, y las consignadas en la Resolución interna que regula la actividad de Supervisión.

Además de las obligaciones contenidas en el presente documento, el contratante se obliga para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. Aprobar la Garantía única del Contrato.
b. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.
c. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.
d. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto por la Secretaría General, exigiendo al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
e. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a

cargo del contratista, el cual se verá reflejado en el informe final de supervisión final, el cual deberá ser cargado en la plataforma SECOP II.

f. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

g. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

h. Efectuar cumplidamente los pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo contrato, dentro del plazo y las condiciones establecidas para tal fin. Para el efecto, la SUPERINTENDENCIA a través de la supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en la plataforma SECOP II.

i. Verificar, como requisito de pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

j. Impartir aprobación de la facturación cargada a través de la plataforma SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás relacionados.

k. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar.

l. Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

m. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: - ÍTEMS NO PREVISTOS: Si como resultado de la ejecución del contrato surgen ítems no previstos en algunos de los frentes y la entidad no cuenta en su base de datos con los precios actualizados de obra, se debe seguir el siguiente procedimiento:

a. El interventor debe verificar si el ítem NO PREVISTO se encuentra establecido en el ANEXO-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, publicado por la entidad y con vigencia 2024, en caso de no encontrarse deberá proceder según lo establecido en los siguientes literales.

b. El contratista deberá presentar solicitud formal al interventor donde se justifique la necesidad de incluir ítems no previstos en la oferta económica.

c. El interventor deberá analizar la procedencia de la solicitud y si la autoriza, deberá solicitar al contratista la elaboración de los APU'S y las cotizaciones (mínimo 3) para determinar el valor del ítem y así mismo, notificar a la entidad mediante una comunicación sobre la necesidad de estos nuevos ítems.

d. El contratista presentará los APU'S de los ítems no previstos para la revisión y aprobación del interventor del contrato, siempre y cuando se cuente con presupuesto para la ejecución de las actividades. Para la autorización de estos APU'S, se deberá elaborar un acta de fijación de precios no previstos que deberá ser suscrita por el contratista de obra, y con el visto bueno y aprobación de la interventoría.

e. En caso de requerirse el acta suscrita de mayores y menores cantidades, la misma debe estar debidamente justificada por el contratista y aprobada por la interventoría.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - INFORMES: El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato los siguientes informes en original y copia o vía correo electrónico y cargarlos en la plataforma SECOP II:

A. INFORME SEMANAL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS

El informe debe ser presentado conforme al formato que para tal fin suministre la SUPERINTENDENCIA, el Supervisor del Contrato o la Interventoría, previa consulta entre las partes.

B. INFORME MENSUAL Y FINAL

El contratista de interventoría deberá validar el informe entregado por el contratista de obra y enviarlo al supervisor en original y copia o vía correo electrónico y verificar que el contratista de obra los cargue en la plataforma SECOP II, conforme lo requerido a continuación:

CONTENIDO MÍNIMO INFORMES MENSUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **INFORMACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

- No de Informe
- Periodo al que corresponde el informe
- Nombre del Contratante
- Nombre de Contratista
- Valor del contrato
- Plazo del contrato
- Fecha de inicio del contrato
- Fecha de vencimiento del contrato
- Fechas de prorrogas
- Valor de adiciones
- Fechas de suspensiones

- **ASPECTOS TÉCNICOS:**

- Descripción del Avance general del contrato programado vs ejecutado, incluye plan de contingencia
- Gráfico resumen de la Programación de Obra
- Relación de Informes semanales
- Control y manejo de equipos y/o maquinaria
- Relación de la Información climática

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

- Relación de Certificados de calidad de materiales
- Revisión de especificaciones técnicas contractuales
- Control de personal
- Control de ensayos
- Relación de comités de obra y/o visitas de obra

- **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

- Relación de solicitudes de prorroga
- Relación de solicitudes de adiciones
- Relación de solicitudes de suspensiones
- Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato
- Relación de correspondencia enviada y recibida

- **ASPECTOS FINANCIEROS CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN**

- Programación financiera, Programado vs ejecutado
- Relación de pagos realizados
- Equilibrio económico o financiero del contrato de obra
- Relación de Actas de mayores y menores cantidades
- Relación de actas de recibo parcial y/o final

- **ASPECTOS LEGALES**

- Actualización del estado de las pólizas
- Informe detallado de incumplimiento del contratista de obra en caso de que se aplique
- Acciones por incumplimiento parcial o total del contrato de obra

- **ASPECTOS AMBIENTALES**

- Impactos generados
- Tratamiento y manejo de RCD
- Fichas ambientales
- Almacenamiento y manejo de materiales de construcción
- Manejo de campamentos
- Manejo de maquinaria y equipos 32
- Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas
- Manejo de gestión integral de residuos sólidos

- Control conservación materiales Orden y aseo
- Otras actividades realizadas
- Seguridad y salud en el trabajo
- Relación de actividades de alto riesgo
- Programa de capacitaciones, inducción y reinducción
- Reunión copasst
- Reunión comité de convivencia
- Personal del contrato y verificación de aportes SST
- Resumen detallado de los accidentes e incidentes presentados desde la ejecución del contrato
- Registro de entrega epp y dotación

- **ANEXO**

- Informes semanales
- Registro fotográfico
- Bitácora de obra
- Registro climático
- Registro climático
- Certificado de calidad de materiales
- Actas de comités de obra y/o visitas
- APUS y actas de justificación de ítems no previstos
- Actas de justificación contractual
- Memoria de cantidades de obra
- Prorrogas
- Adiciones
- Suspensiones
- Correspondencia enviada
- Correspondencia recibida
- Programación de obra
- Flujo de caja
- Actas de mayores y menores cantidades
- Actas de recibo parcial o final
- Constancia de cumplimiento y acreditación de pagos de seguridad social integral y pagos parafiscales del contratista de obra.
- Paz y salvos por concepto de pago a proveedores
- Control de equipos
- Control de personal

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

- Memorias de cantidades de Obra

- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

NOTA: Si la entidad la requiere solicitara el informe adicional que se necesite.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: - PRODUCTOS A ENTREGAR: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, control de costos y control de programación y recibir a satisfacción LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).de igual forma entregar a la supervisión designada para tal fin por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Los inmuebles para intervenir cuentan con sus respectivas cantidades de obra que fueron producto de las visitas realizada por el Grupo de Infraestructura de la SNR y los cuales se adjuntan como anexo al presente Estudio Previo.

El Interventor debe exigir al contratista la entrega de un Manual de Mantenimiento el cual debe ser socializado con el personal una vez se termine la adecuación y debe ser entregado en físico a la supervisión del presente proceso. De la socialización con el personal de cada oficina se deberá suscribir la respectiva acta.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN: La **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** ejercerá la vigilancia y control de la correcta ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la cual será ejercida por el Director de la Regional Andina o por quien designe por escrito el ordenador del gasto, así mismo brindaran apoyo a la supervisión los siguientes funcionarios y/o contratistas: Ingeniera Rosa Santamaría, Ingeniero Ceiler Salazar y Arquitecto Felipe Ríos del Grupo de Infraestructura o quien designe por escrito el ordenador del gasto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RENUNCIA A LA RECONVENCIÓN EN MORA: El Contratista renuncia a ser requerido para la constitución en mora.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Al presente contrato le son aplicables las cláusulas excepcionales al derecho común, de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: - CESIÓN: Los derechos y obligaciones que emanen del presente contrato son intuito persona, y no podrán ser cedidos ni transferidos por el Contratista sin el consentimiento previo y escrito por parte de la Superintendencia**,** al tenor del artículo 41 inciso 3 de la Ley 80 de 1993.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: La solución de las controversias contractuales que surjan de la ejecución del presente contrato serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En caso de que persistan las diferencias, las partes quedarán en libertad para recurrir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. - Las obligaciones de las partes establecidas en este contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten diferencias o controversias, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del presente contrato se considera como domicilio contractual el lugar de ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El contrato resultante de este proceso de selección no genera vínculo laboral alguno entre la Superintendencia y el personal que designe **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento del objeto contractual. Por lo tanto, serán por cuenta del **CONTRATISTA** todos los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás pagos a que haya lugar, así como el.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: - INDEMNIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA: El Contratista mantendrá indemne a la Superintendencia contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones de este contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la Superintendencia por asuntos, que según este contrato sean de responsabilidad del Contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Superintendencia y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: **A)** Estudios y documentos previos. **B)** Documento soportes del contrato. **C)** Certificado de disponibilidad presupuestal. **D)** Registro Presupuestal. **E)** Recibos de pago de al Sistema de Seguridad Social. **F)** Actas, informes y demás documentos que se suscriban para el correcto y oportuno cumplimiento del mismo. **G)** Pliegos de condiciones, sus anexos y Adendas. **H).** Modificaciones transaccionales que se tramiten y aprueben por la PLATAFORMA SECOP II. **I).** Propuesta del oferente**.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación.

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común acuerdo procederán, dentro de los CUATRO (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la liquidación por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA y la contraprestación de éste.

En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la firma de las partes y en vigencia de la garantía única de cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, la Superintendencia de Notariado y Registro, dentro de los dos (2) meses siguientes, liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, La Superintendencia de Notariado y Registro podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.

PARÁGRAFO: En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las prestaciones impliquen la existencia de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado, se deberá realizar una liquidación parcial de aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual.

Para las obligaciones que subsistan, se deberá realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en cuenta que para ésta también se aplicarán los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula. El acta de la liquidación final deberá ser suscrita por las partes previo visto bueno del supervisor y en vigencia de la garantía única de cumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:- GARANTÍAS: Debido a la naturaleza del contrato, en cuanto a su objeto, valor y plazo, la Superintendencia de Notariado y Registro requiere que el futuro contratista constituya:

AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del Valor del Contrato	La cual estará vigente por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015). **En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva.**

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚM. 2365 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007-0 Y JVM INGENIERÍA S.A.S BIC, NIT. 901.489.956-3

De amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5% del Valor del Contrato	Por el término de éste y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza y realizar la actualización de la garantía a la fecha de suscripción del acta de inicio. (Numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.13, Decreto 1082 de 2015).**En todo caso la vigencia de los amparos debe iniciar en la misma fecha de expedición de la póliza y no con fecha retroactiva**
De calidad del servicio	veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición del acta de recibo de la obra (numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 y Artículo 2.2.1.2.3.1.12, del decreto 1082 de 2015)
De Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV	Por el término de ejecución del contrato y si la cuantía de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su patrimonio deberá responder ante el tercer afectado, por el término de ejecución de la obra contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 y Artículo 2.2.1.2.3.1.18, del decreto 1082 de 2015).

PARÁGRAFO 1: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato y/o se adicione el valor, el Contratista se compromete, dentro de los 5 días siguientes, a presentar el certificado de modificación de la garantía de conformidad con el nuevo plazo y/o valores pactados.

PARÁGRAFO 2: El contratista deberá mantener la garantía en plena vigencia y validez en los términos expresados en este documento y deberá pagar las primas y cualquier otra expensa necesaria para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

Conforme a lo anterior, en caso de ser necesario se deberá solicitar la adición en tiempo a los amparos establecidos en la Garantía Única de Cumplimiento para que los plazos exigidos sean consecuentes a los solicitados, contados a partir del Inicio de la ejecución contractual. Así mismo, de acuerdo con lo anterior será obligación del Contratista efectuar los ajustes a que haya lugar.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: - PENAL PECUNIARIA: a) En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato por parte del contratista, éste deberá pagar a **LA SUPERINTENDENCIA** a título de pena, una suma equivalente al 20% del valor total de este contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. **b)** Igualmente, frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, éste deberá pagar a título de tasación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual será cancelada o descontada, según sea el caso, al momento de efectuarse el pago del contrato. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de cobrar judicialmente perjuicios adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: - MULTAS: a) Con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, se causaran multas hasta por un valor

equivalente al 0.5x1000 del valor del contrato, por cada día de incumplimiento o retraso hasta cuando estas efectivamente se cumplan. **b)** La imposición de las multas se hará mediante resolución motivada, previo agotamiento del debido proceso y de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. **c)** La imposición de multas no impedirá la imposición de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. **d)** El contratista autoriza a **la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, descuente del saldo a su favor el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

CLAUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA SÉPTIMA: - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Se tendrán como causales de terminación, además de las previstas en la Ley, cuando el contratista no constituya **l**a póliza de garantía dentro del término establecido en la Plataforma Transaccional del **SECOP II** por la **SUPERINTENDENCIA.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: - PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN. El presente contrato se considera perfeccionado con su suscripción en la Plataforma Transaccional del **SECOP II.** Para su ejecución requerirá: **1).** Expedición del Registro presupuestal; **2).** Constitución de la garantía por parte de el contratista y su aprobación por parte de la Superintendencia en la PLATAFORMA SECOP II**. 3).** Acreditación de estar al día en los aportes a Salud, Pensión y a Riesgos Laborales en los términos de ley. Para su legalización requerirá: 4**).** Suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos antes señalados.

Proyectó: *Laura Milena Arroyo Lozano - Dirección de Contratación.*
Revisó: *Héctor Iván Suárez Betancur – Dirección de Contratación.*
Revisó y validó: *Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Director de Contratación.*
Aprobó Transaccionalmente: *William Pérez Castañeda – Secretario General y Ordenador del Gasto SNR.*

COPIA ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2365 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT: 901.489.956-3

FECHA DE INICIO: 25 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) meses y siete (7) días.
LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato se establece para la agrupación No.2 en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, Medellín Zona Norte, Abejorral, Dabeiba, Yolombó, Puerto Berrío, Manizales, Pensilvania y Calarcá.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 110.605.055 COP
FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 25 de octubre de 2024.
FECHA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 25 de octubre de 2024.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 582624 del 24 de octubre de 2024.

El día veinticinco (25) de octubre de 2024 en la ciudad de Medellín, se reunieron **CESAR AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ** en su calidad de supervisor del contrato y **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** en su calidad de contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del **Contrato No. 2365 de 2024.**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

Se firma en Medellín para los fines pertinentes el día 25 de octubre de 2024.

CESAR A. MARTINEZ HERNANDEZ
SNR - DIRECTOR REGIONAL
ANDINA Supervisor

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT: 901.489.956-3
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CC: 79.508.558
Representante Legal

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT 901.489.956-3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA

Bogotá D.C. 06 de diciembre de 2024

Señores,
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
Bogotá D.C.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO

CERTIFICAN QUE:

La Empresa **JVM INGENIERIA S.A.S. BIC** identificada con NIT 901.489.956-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad de Montería, ha cumplido y se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP), Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Caja de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
JAIRO ARGEL MARTINEZ
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 246221-T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD No**. 79.508.558**

Dirección: Calle 52ª No. 14 - 17, Montería – Córdoba
Teléfono: (4) 7846589, Celular: 310 654 1925
E – mail: jvmsas2021@gmail.com

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1100395023
DESDE NOVIEMBRE 2024 HASTA NOVIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA		
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1100395023		
APELLLIDOS:	RAMIREZ ARRIETA	NOMBRES:	LUCIA CAROLINA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7948673521	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	28/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	003 - SEDE MONTERIA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.800.000																		230201-PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000	79508558	$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF16-COMFACOR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 441.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901791022
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSTRUIR
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 52A N 14-17	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	006 - PROFESIONALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7952937620**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		33					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1118997101	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000	$ 0	$ 960.000	$ 22.000	$ 982.000
SUBTOTALES:										**$ 960.000**	**$ 22.000**	**$ 982.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 52.000	$ 1.200	$ 0	$ 53.200
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 52.000	$ 1.200	$ 0	$ 53.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136.000	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 136.000	$ 3.200	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:													**$ 240.000**	**$ 5.600**	**$ 0**	**$ 245.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 334.100	$ 334.100	$ 7.700	$ 0	$ 341.800
SUBTOTALES:									**$ 334.100**	**$ 7.700**	**$ 0**	**$ 341.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	3	$ 188.000	$ 4.400	$ 192.400
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 52.000	$ 1.200	$ 53.200
SUBTOTALES:			**$ 240.000**	**$ 5.600**	**$ 245.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																							PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 16075813
DESDE NOVIEMBRE 2024 HASTA DICIEMBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901489956
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JVM INGENIERIA S.A.S. BIC
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 52A NO.14-17	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16075813
APELLLIDOS:	MUNOZ	NOMBRES:	CRISTIAN CAMILO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7948596861	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	octubre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	noviembre - 2024	FECHA DE PAGO:	28/11/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - PROYECTOS DE OBRA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES					
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
$ 1.300.000	24																	230301-PORVENIR	7	$ 303.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 12.200	14-11 - ARL SURA	7	$ 303.334		$ 21.200	7	$ 303.334	CCF21-CAFAM	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 94.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901791022
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CONSTRUIR
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 52A N 14-17	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	006 - PROFESIONALES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7952937620**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		33					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1118997101	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000	$ 0	$ 960.000	$ 22.000	$ 982.000
SUBTOTALES:										**$ 960.000**	**$ 22.000**	**$ 982.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 52.000	$ 1.200	$ 0	$ 53.200
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 52.000	$ 1.200	$ 0	$ 53.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136.000	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 136.000	$ 3.200	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:													**$ 240.000**	**$ 5.600**	**$ 0**	**$ 245.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 334.100	$ 334.100	$ 7.700	$ 0	$ 341.800
SUBTOTALES:									**$ 334.100**	**$ 7.700**	**$ 0**	**$ 341.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	3	$ 188.000	$ 4.400	$ 192.400
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 52.000	$ 1.200	$ 53.200
SUBTOTALES:			**$ 240.000**	**$ 5.600**	**$ 245.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																							PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	005 - OBRAS FFIE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7946734629**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		23			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1118922056

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 0	$ 512.000	$ 8.200	$ 520.200
SUBTOTALES:										**$ 512.000**	**$ 8.200**	**$ 520.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 128.000	$ 2.100	$ 0	$ 130.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 52.000	$ 900	$ 0	$ 52.900
SUBTOTALES:													**$ 180.000**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 183.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 229.600	$ 229.600	$ 3.700	$ 0	$ 233.300
SUBTOTALES:									**$ 229.600**	**$ 3.700**	**$ 0**	**$ 233.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 76.000	$ 1.300	$ 77.300
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	2	$ 104.000	$ 1.700	$ 105.700
SUBTOTALES:			**$ 180.000**	**$ 3.000**	**$ 183.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

CERTIFICADO BANCARIO

Certificado Bancario

Miércoles, 4 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JVM INGENIERIA SAS BIC identificado(a) con NIT 901489956, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	56900003358	2022/06/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1
LUGAR DE EJECUCION ORIP CUCUTA

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de octubre de 2024		HASTA	martes 31 de diciembre de 2024

CONTRATO Nº	2343 DE 2024	VALOR:	$ 323.014.524,00
		ADICIÓN	$ 0,00
		VALOR TOTAL	$ 323.014.524,00
CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER), MEDELLÍN NORTE (ANTIOQUIA), ABEJORRAL (ANTIOQUIA), DABEIBA (ANTIOQUIA), YOLOMBO (ANTIOQUIA), PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), PENSILVANIA (CALDAS) Y CALARCÁ (QUINDÍO) PARA LA AGRUPACIÓN NO. 2 "	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC		

A LOS DIECISEIS (16) DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONASLADY AGUIRRE DIRECTORA DE OBRA DE BALER INGENIERIA SAS CONTRATISTA, Y JOSE SEBASTIAN PADILLA DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC, INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	ACTUALIZADOS	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ANTERIOR	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
	ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)									
1	PRELIMINARES								$ -	
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	250,00	249,91		0,00	0,00	$ 8.844,00	$ 2.210.207,58	
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	238,00	354,84	0,00	0,00	0,00	$ 17.073,00	$ 6.058.126,98	
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	238,00	354,84	0,00	0,00	0,00	$ 19.682,00	$ 6.983.895,93	
1,18	DESMONTE VENTANA METÀLICA	m²	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 18.932,00	$ -	
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00	$ 19.129,00	$ 172.161,00	
1,22	DESMONTE DE MARCO METÀLICO PARA PUERTA	un	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00	$ 17.933,00	$ 161.397,00	
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	m²	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 4.738,00	$ -	
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	60,00	56,00	0,00	0,00	0,00	$ 22.548,00	$ 1.262.688,00	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	100,00	541,52	0,00	0,00	0,00	$ 4.040,00	$ 2.187.740,80	
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	3.570,00	3.238,85	0,00	0,00	0,00	$ 738,00	$ 2.390.272,48	
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	$ 12.861,00	$ 321.525,00	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	un	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	$ 600.171,00	$ 6.001.710,00	
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	7,00	10,00	0,00	0,00	0,00	$ 226.979,00	$ 2.269.790,00	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
3,02	BARANDA TUBO REDONDO	m	44,00	12,00	0,00	0,00	0,00	$ 138.723,00	$ 1.664.676,00	
3,13	MARCO METÀLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 283.534,00	$ -	
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	$ 192.048,00	$ 1.152.288,00	
3,19	REJILLA DE PISO 30CM	m²	3,20	7,75	0,00	0,00	0,00	$ 107.408,00	$ 832.412,00	
3,21	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA TERMOACUSTICA, DOBLE VIDRIO	m²	36,00		0,00	0,00	0,00	$ 1.816.716,00	$ -	
3,22	PUERTA TIPO PERSIANA, LAMINA CALIBRE 18 PINTURA ELECTROESTATICA 0,60 a 75 - h=2,00 a 2,200 incluye marco metálico y chapa de seguridad	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 698.304,00	$ -	
4	CIELORRASOS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	280,00	227,17	0,00	0,00	0,00	$ 130.552,00	$ 29.657.902,55	
5	CONCRETOS Y MORTEROS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	20,00	46,70	0,00	0,00	0,00	$ 37.878,00	$ 1.768.902,60	
6	CUBIERTAS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
6,06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	30,00	36,72	0,00	0,00	0,00	$ 43.053,00	$ 1.581.022,40	
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	80,00	700,50	0,00	0,00	0,00	$ 59.302,00	$ 41.541.051,00	
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	$ 39.256,00	$ 235.536,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	5,00	9,50	0,00	0,00	0,00	$ 82.891,00	$ 787.464,50	
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	23,00	102,51	0,00	0,00	0,00	$ 40.434,00	$ 4.144.889,34	
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	98,00	398,93	0,00	0,00	0,00	$ 89.174,00	$ 35.573.773,62	
7	ENCHAPE MUROS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
7,03	RESANE	m²	10,00	128,94	0,00	0,00	0,00	$ 9.186,00	$ 1.184.458,82	
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
8,07	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	un	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	$ 91.964,00	$ 91.964,00	
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	0			0,00	0,00	0,00		$ -	
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] FACHADA Y TODAS LAS CULATAS	m²	306,00	482,44	0,00	0,00	0,00	$ 31.243,00	$ 15.072.744,82	
12	MUROS - MAMPOSTERÍA				0,00	0,00			$ -	
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	72,80	25,07	0,00	0,00		$ 62.107,00	$ 1.557.022,49	
12,11	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	3,00	8,20	0,00	0,00		$ 35.538,00	$ 291.411,60	
13	**PINTURAS**	0			0,00	0,00			$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	13,20	124,00	0,00	0,00		$ 12.718,00	$ 1.577.032,00	
13,09	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m²	80,00	0,00	0,00	0,00		$ 23.939,00	$ -	
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	1.750,00	543,24	0,00	0,00		$ 25.433,00	$ 13.816.147,57	
13,15	PINTURA EPOXICA PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS	ml	20,00	18,70	0,00	0,00		$ 14.088,00	$ 263.445,60	
13,16	RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	ml	44,00	796,56	0,00	0,00		$ 20.433,00	$ 16.276.110,48	
14	PISOS	0			0,00	0,00			$ -	

14,01	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	m²	370,00	0,00	0,00	0,00		$ 31.659,00	$ -	
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	150,00	82,15	0,00	0,00		$ 64.282,00	$ 5.280.965,57	
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	m	24,00	16,26	0,00	0,00		$ 46.022,00	$ 748.317,72	
14,21	SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.	m	14,00	19,30	0,00	0,00		$ 60.648,00	$ 1.170.506,40	
15	RED ELÉCTRICA	0			0,00	0,00			$ -	
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10,00	23,00	0,00	0,00		$ 196.671,00	$ 4.523.433,00	
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	50,00	19,00	0,00	0,00		$ 171.391,00	$ 3.256.429,00	
15,14	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	un	3,00	2,00	0,00	0,00		$ 23.434,00	$ 46.868,00	
15,25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	un	3,00	3,00	0,00	0,00		$ 192.355,00	$ 577.065,00	
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	3,00	3,00	0,00	0,00		$ 101.745,00	$ 305.235,00	
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	5,00	10,00	0,00	0,00		$ 110.078,00	$ 1.100.780,00	
15,44	CANALETA PLASTICA 100X45MM	ml	20,00	24,10	0,00	0,00		$ 34.011,00	$ 819.665,10	
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	3,00	10,00	0,00	0,00		$ 11.182,00	$ 111.820,00	
15,54	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	un	1,00	2,00	0,00	0,00		$ 66.946,00	$ 133.892,00	
16	RED HIDRÁULICA	GL	1,00		0,00	0,00			$ -	
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	20,00	27,00	0,00	0,00		$ 12.434,00	$ 335.718,00	
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	1,00	0,00	0,00		$ 25.704,00	$ 25.704,00	
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml	un	1,00	1,00	0,00	0,00		$ 56.637,00	$ 56.637,00	
17	RED SANITARIA	0			0,00	0,00			$ -	
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	3,00	4,00	0,00	0,00		$ 55.216,00	$ 220.864,00	
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	60,00	60,00	0,00	0,00		$ 28.170,00	$ 1.690.200,00	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	40,00	16,50	0,00	0,00		$ 41.052,00	$ 677.358,00	
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN	0			0,00	0,00			$ -	
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	630,00	398,93	0,00	0,00		$ 2.877,00	$ 1.147.708,38	
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	m²	3,00	3,00	0,00	0,00		$ 399.647,00	$ 1.198.941,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	7,00	7,00	0,00	0,00		$ 46.137,00	$ 322.959,00	
20	ADICIONALES	0			0,00	0,00			$ -	
20	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	68,00	60,76	0,00	0,00		$ 24.554,00	$ 1.491.901,04	
0	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**								$ -	
1.10.	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UND	50,00	56,00				$ 19.073,00	$ 1.068.088,00	
8.05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	M2	73,00	9,94				$ 104.527,00	$ 1.038.998,38	
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	98,60	100,56				$ 26.217,00	$ 2.636.363,17	
7,05	CERÁMICA FORMATO 30X60CM	m2	4,00	4,00				$ 85.427,00	$ 341.708,00	
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	30,00	30,00				$ 9.450,00	$ 283.500,00	
1,90	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	73,00	9,94				$ 19.850,00	$ 197.309,00	
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UND	1,00					$ 403.448,00	$ -	
16,20	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	UND	1,00					$ 399.173,00	$ -	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	M2	10,00	10,00				$ 70.434,00	$ 704.340,00	
1,20	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	UND	1,00	1,00				$ 17.933,00	$ 17.933,00	
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	und	1,00	1,00				$ 14.020,00	$ 14.020,00	
2,13	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	und	1,00	1,00				$ 541.328,00	$ 541.328,00	
12,07	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	M2	15,30	15,30				$ 117.731,00	$ 1.801.284,30	
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	8,45	8,45				$ 367.678,00	$ 3.106.879,10	
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	10,20	35,20				$ 18.245,00	$ 642.224,00	
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UND	1,00	1,00				$ 96.079,00	$ 96.079,00	
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UND	1,00	1,00				$ 106.978,00	$ 106.978,00	
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	ML	8,00	8,00				$ 40.017,00	$ 320.136,00	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	11,00	11,00				$ 60.997,00	$ 670.967,00	
20,18	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tubería en cobre hasta 3 ml)	und	2,00	2,00				$ 670.136,00	$ 1.340.272,00	
20,8	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	und		4,00				$ 53.800,00	$ 215.200,00	
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	ML		25,00				$ 4.476,00	$ 111.900,00	
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM.	ML		25,00				$ 15.395,00	$ 384.875,00	
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UND		1,00				$ 84.576,00	$ 84.576,00	
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UND		1,00				$ 126.629,00	$ 126.629,00	
NP-1	HERRAJES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN PARA PUERTAS O VENTANA EN ALUMINIO O METALICA	UND		4,00				$ 191.560,00	$ 766.240,00	
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2		216,00				$ 27.789,00	$ 6.002.424,00	

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 246.952.988,33**
ADMINISTRACIÓN	23,85%	**$ 58.898.302,98**
IMPREVISTOS	1,00%	**$ 2.469.529,88**
UTILIDADES	5,00%	**$ 12.347.649,42**
IVA SOBRE UTILIDADES	19,00%	**$ 2.346.053,39**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 323.014.524,00**
VALOR TOTAL ORIP CUCUTA		**$ 323.014.524,00**
SALDO POR AJUSTAR		**$ -**

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

LADY AGUIRRE
Representante Legal - Directora de obra
CONTRATISTA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JVM INGENIERIA S.A.S. BIC - Representante Legal
INTERVENTORIA

CÉSAR MARTINEZ
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

JUSTIFICACIÓN ACTA No. 1
LUGAR DE EJECUCION ORIP CUCUTA

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de octubre de 2024		HASTA	martes 31 de diciembre de 2024

CONTRATO Nº	2343 DE 2024	VALOR CONTRACTUAL + ADICIONES	$ 323.014.524,00 $ 0,00 $ 323.014.524,00
CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER), MEDELLÍN NORTE (ANTIOQUIA), ABEJORRAL (ANTIOQUIA), DABEIBA (ANTIOQUIA), YOLOMBO (ANTIOQUIA), PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA), MANIZALES (CALDAS), PENSILVANIA (CALDAS) Y CALARCÁ (QUINDÍO) PARA LA AGRUPACIÓN NO. 2 "	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC		

A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONASLADY AGUIRRE DIRECTORA DE OBRA DE BALER INGENIERIA SAS CONTRATISTA, Y JOSE SEBASTIAN PADILLA DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC, INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE JUSTIFICACION, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. INICIAL	CANTIDAD MODIFICADA	% VARIACIÓN	OBSERVACIONES (Incluye registro fotografico)
	ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)					
1	PRELIMINARES					
1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	m²	250,00	249,91	0%	se ajusta cantidad en obra
1,11	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	238,00	354,84	49%	se ajusta cantidad en obra
1,16	DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	m²	238,00	354,84	49%	se ajusta cantidad en obra
1,18	DESMONTE VENTANA METÀLICA	m²	36,00	0,00	-100%	no se hace necesario
1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	un	7,00	9,00	29%	se ajusta cantidad en obra
1,22	DESMONTE DE MARCO METÀLICO PARA PUERTA	un	7,00	9,00	29%	se ajusta cantidad en obra
1,29	DESMONTE DE VIDRIO	m²	36,00	0,00	-100%	no se hace necesario
1,55	INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	un	60,00	56,00	-7%	se ajusta cantidad en obra
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	m²	100,00	541,52	442%	se ajusta cantidad en obra
1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	kg	3.570,00	3.238,85	-9%	se ajusta cantidad en obra
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	m²	25,00	25,00	0%	se mantiene cantidad
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**	0				
2,14	HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA	un	7,00	10,00	43%	se ajusta cantidad en obra
2,16	MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	un	7,00	10,00	43%	se ajusta cantidad en obra
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**	0				
3,02	BARANDA TUBO REDONDO	m	44,00	12,00	-73%	se ajusta cantidad en obra
3,13	MARCO METÀLICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M	un	3,00	0,00	-100%	no se hace necesario
3,14	MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	un	8,00	6,00	-25%	se ajusta cantidad en obra
3,19	REJILLA DE PISO 30CM	m²	3,20	7,75	142%	se ajusta cantidad en obra
3,21	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA TERMOACUSTICA, DOBLE VIDRIO	m²	36,00		-100%	se ajusta cantidad en obra
3,22	PUERTA TIPO PERSIANA, LAMINA CALIBRE 18 PINTURA ELECTROESTATICA 0,60 a 75 - h=2,00 a 2,200 incluye marco metálico y chapa de seguridad	un	3,00	0,00	-100%	no se hace necesario
4	CIELORRASOS	0				
4,02	CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	m²	280,00	227,17	-19%	se ajusta cantidad en obra
5	CONCRETOS Y MORTEROS	0				
5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	m²	20,00	46,70	134%	se ajusta cantidad en obra
6	CUBIERTAS	0				
6,06	TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6	m²	30,00	36,72	22%	se ajusta cantidad en obra
6,16	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	m	80,00	700,50	776%	se ajusta cantidad en obra
6,17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	m	6,00	6,00	0%	no se hace necesario
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	5,00	9,50	90%	se ajusta cantidad en obra
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	m	23,00	102,51	346%	se ajusta cantidad en obra
6,22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	m²	98,00	398,93	307%	se ajusta cantidad en obra
7	ENCHAPE MUROS	0				
7,03	RESANE	m²	10,00	128,94	1189%	se ajusta cantidad en obra
8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0				
8,07	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	un	8,00	1,00	-88%	se ajusta cantidad en obra
10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	0				
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] FACHADA Y TODAS LAS CULATAS	m²	306,00	482,44	58%	se ajusta cantidad en obra
12	MUROS - MAMPOSTERÍA					
12,05	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5	m²	72,80	25,07	-66%	se ajusta cantidad en obra
12,11	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	3,00	8,20	173%	se ajusta cantidad en obra
13	**PINTURAS**	0				
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	13,20	124,00	839%	se ajusta cantidad en obra
13,09	TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	m²	80,00	0,00	-100%	se ajusta cantidad en obra
13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	m²	1.750,00	543,24	-69%	se ajusta cantidad en obra
13,15	PINTURA EPOXICA PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS	ml	20,00	18,70	-7%	se ajusta cantidad en obra
13,16	RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	ml	44,00	796,56	1710%	se ajusta cantidad en obra
14	PISOS	0				

14,01	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	m²	370,00	0,00	-100%	no se hace necesario
14,11	PISO GRES 30,5X30,5CM	m²	150,00	82,15	-45%	se ajusta cantidad en obra
14,19	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	m	24,00	16,26	-32%	se ajusta cantidad en obra
14,21	SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.	m	14,00	19,30	38%	se ajusta cantidad en obra
15	RED ELÉCTRICA	0				
15,07	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	10,00	23,00	130%	se ajusta cantidad en obra
15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	un	50,00	19,00	-62%	se ajusta cantidad en obra
15,14	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A	un	3,00	2,00	-33%	se ajusta cantidad en obra
15,25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	un	3,00	3,00	0%	se mantiene cantidad
15,31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	3,00	3,00	0%	se mantiene cantidad
15,35	CAMBIO SALIDA TOMA	un	5,00	10,00	100%	se ajusta cantidad en obra
15,44	CANALETA PLASTICA 100X45MM	ml	20,00	24,10	21%	se ajusta cantidad en obra
15,45	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE	un	3,00	10,00	233%	se ajusta cantidad en obra
15,54	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA RED NORMAL. Promedio 5 ml	un	1,00	2,00	100%	se ajusta cantidad en obra
16	RED HIDRÁULICA					
16,02	TUBERÍA PVCP 1/2"	m	20,00	27,00	35%	se ajusta cantidad en obra
16,05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	un	1,00	1,00	0%	se mantiene cantidad
16,10	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml	un	1,00	1,00	0%	se mantiene cantidad
17	RED SANITARIA	0				
17,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	un	3,00	4,00	33%	se ajusta cantidad en obra
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	60,00	60,00	0%	se mantiene cantidad
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	40,00	16,50	-59%	se ajusta cantidad en obra
19	ASEO-SEÑALIZACIÓN	0				
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	m²	630,00	398,93	-37%	se ajusta cantidad en obra
19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	m²	3,00	3,00	0%	se mantiene cantidad
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	7,00	7,00	0%	se mantiene cantidad
20	ADICIONALES	0				
20	MANTENIMIENTO REJA METALICA	M2	68,00	60,76	-11%	se ajusta cantidad en obra
0	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					
1.10.	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UND	50,00	56,00	12%	se incluye actividad
8.05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo	M2	73,00	9,94	-86%	se incluye actividad
14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	98,60	100,56	2%	se incluye actividad
7,05	CERÁMICA FORMATO 30X60CM	m2	4,00	4,00	0%	se incluye actividad
1,47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	30,00	30,00	0%	se incluye actividad
1,90	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM)	M2	73,00	9,94	-86%	se incluye actividad
17,28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UND	1,00	0,00	-100%	se incluye actividad
16,20	LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	UND	1,00	0,00	-100%	se incluye actividad
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	M2	10,00	10,00	0%	se incluye actividad
1,20	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	UND	1,00	1,00	0%	se incluye actividad
1,23	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	und	1,00	1,00	0%	se incluye actividad
2,13	HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-75CM. INCLUYE CERRADURA	und	1,00	1,00	0%	se incluye actividad
12,07	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	M2	15,30	15,30	0%	se incluye actividad
3,18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	8,45	8,45	0%	se incluye actividad
1,45	DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)	M2	10,20	35,20	245%	se incluye actividad
17,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UND	1,00	1,00	0%	se incluye actividad
17,12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UND	1,00	1,00	0%	se incluye actividad
17,23	TUBERÍA PVCS 4"	ML	8,00	8,00	0%	se incluye actividad
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	11,00	11,00	0%	se incluye actividad
20,18	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto eléctrico, Tubería en cobre hasta 3 ml)	und	2,00	2,00	0%	se incluye actividad
20,8	DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	und	0,00	4,00	0%	se incluye actividad
1,50	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA	ML	0,00	25,00	0%	se incluye actividad
14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM.	ML	0,00	25,00	0%	se incluye actividad
15,30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UND	0,00	1,00	0%	se incluye actividad
16,26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UND	0,00	1,00	0%	se incluye actividad
NP-1	HERRAJES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN PARA PUERTAS O VENTANA EN ALUMINIO O METALICA	UND	0,00	4,00	0%	se incluye actividad
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2	0,00	216,00	0%	se incluye actividad

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

CADY AGUIRRE
BALER INGENIERIA S.A.S. - BIC. - Representante Legal
CONTRATISTA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JVM INGENIERIA S.A.S. BIC - Representante legal
INTERVENTORIA

CÉSAR MARTINEZ
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
Superintendencia de Notariado y Registro

MEMORIAS DE CANTIDAD

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DESMONTE DE CIELORRASO

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1.04	UNIDAD	m2

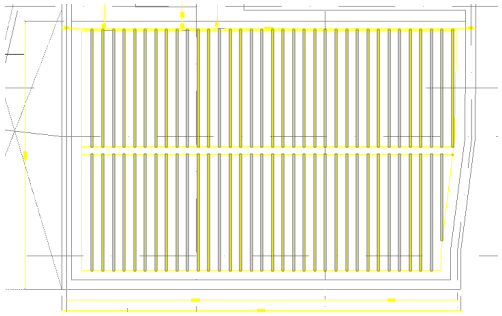DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT		LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
DESMONTE DE CIELORRASO	area de piso 4 bajo cubierta de canaleta 90	1,00		11,89	17,93					213,19	
	cafeteria	1,00		6,03	6,09						
										TOTAL	213,19

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DESMONTE DE CUBIERTA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1.11	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
CUBIERTA	PISO 4 CANALETA 90	1,00	21,00	12,90					270,90	
	DOMO PISO 2	1,00	9,15	5,16						
	CAFETERIA	1,00	6,09	6,03						
									TOTAL	270,90

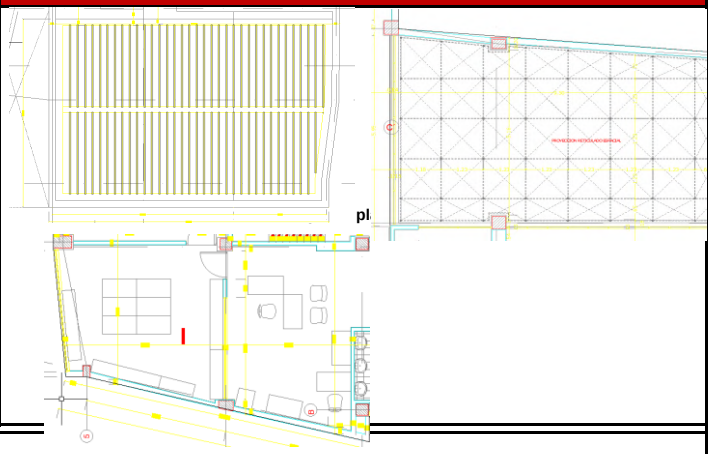

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1.16	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	PISO 4 CANALETA 90	1,00	21,00	12,90					270,90
	DOMO PISO 2	1,00	9,15	5,16					
	CAFETERIA	1,00	6,09	6,03					
								TOTAL	270,90

CROQUIS

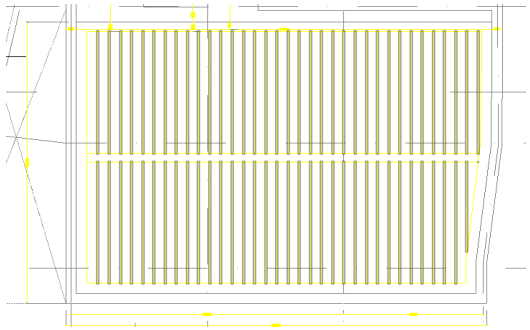

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DESMONTE DE PUERTA METÁLICA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1.20	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	PISO 4	2,00							1,00	
	PISO 3	-							0,00	
	PISO 2	2,00							0,00	
	PISO 1	3,00							1,00	
	SOTANO	1,00							1,00	
	sotano - desmonte para adecución	1,00							1,00	
								TOTAL	4,00	

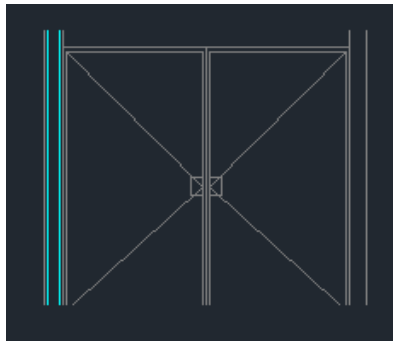

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 1.22		UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	PISO 4	2,00							1,00
	PISO 3	-							0,00
	PISO 2	2,00							0,00
	PISO 1	3,00							1,00
	SOTANO	1,00							1,00
	sotano - desmonte para adecución	1,00							1,00
								TOTAL	4,00

CROQUIS

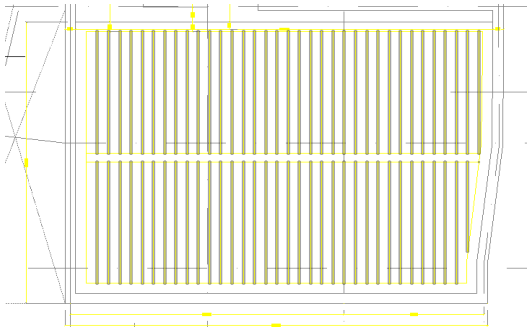

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 1.57 UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	PISO 4	1,00	30,00	5,00					150,00
	PISO 3	1,00	15,98	8,00					
	PISO 2	1,00	15,98	8,00					
	PISO 1	1,00	15,98	8,00					
	SOTANO	1,00	2,00	4,00					8,00
								TOTAL	158,00

CROQUIS

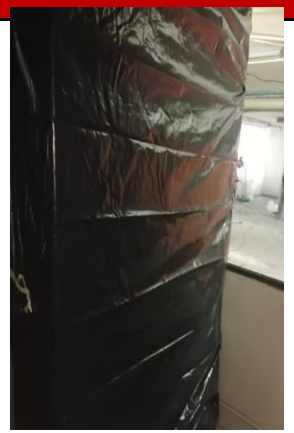

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1.73	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M		1,00	10,00	2,50					25,00
		1,00							
								TOTAL	25,00

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

BARANDA TUBO REDONDO

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 3.02		UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
BARANDA TUBO REDONDO		4,00	3,00						12,00
BARANDA TUBO REDONDO									
COLUMNAS EN TUBO METÁLICO DE 15*15 CALIBRE 2.5mm ZONA DE FUMADORES									
								TOTAL	12,00

CROQUIS

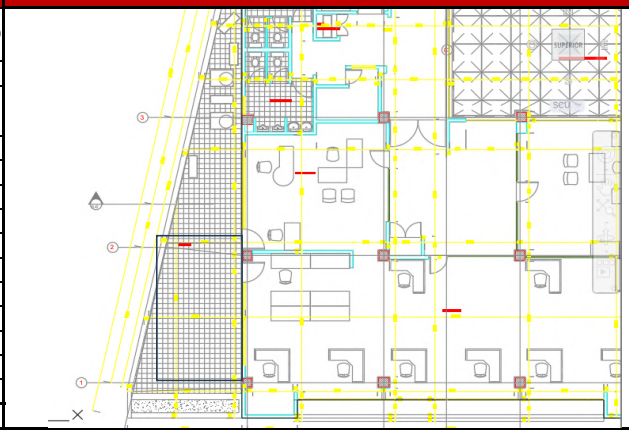

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	7	MES	11	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 3.14 UNIDAD: und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
MARCOS TAPAS CAJAS DE INSPECCIÓN	PARQUADERO SOTANO	6,00							6,00
								TOTAL	6,00

CROQUIS

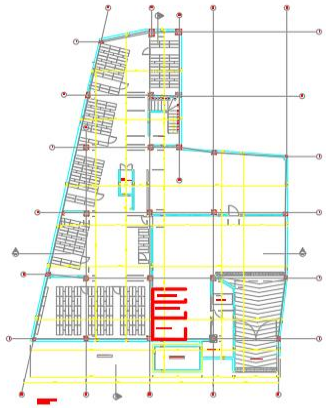

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


REJILLA DE PISO 30CM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA


ITEM: 3.19 UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
REJILLA DE PISO 30CM	SOTANO carcamo cuerto de residuos	1,00	3,00	1,00					3,00
	rejilla calle - adecuación	0,50	3,50	1,00					1,75
	rejilla sotano rampa - adecuación	0,50	6,00	1,00					3,00
								TOTAL	7,75

CROQUIS

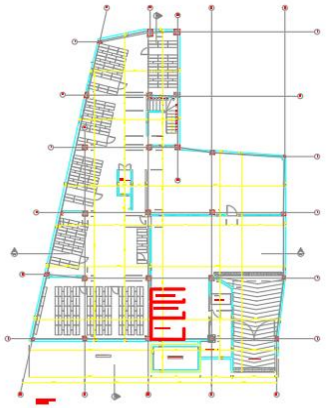

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 5.03 — UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	sotano cuarto de residuos	1,00	16,80	2,40					40,32
	MURO VENTANA	1,00	4,40	1,45					6,38
									0,00
									0,00
								TOTAL	46,70

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 6.16 UNIDAD: m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
=+A9	PISO 4 CANALETA 90	26,00	18,00						468,00	
	DOMO PISO 2	20,00	6,00						120,00	
	CAFETERIA	5,00	6,00						30,00	
	ZONA DE FUMADORES	4,00	3,00						12,00	
		6,00	6,00						36,00	
	tensores piso 2	3,00	11,50						34,50	
		suministro							-150,00	
									TOTAL	550,50

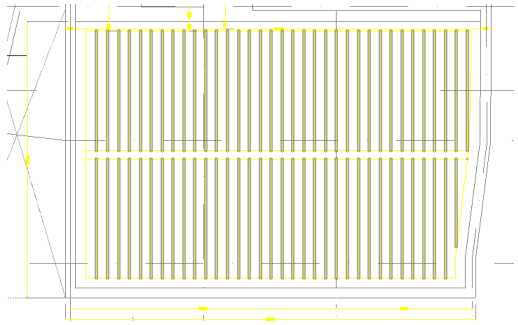

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

INTERVENTORIA
JOSE SEBASTIAN PADILLA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	6.21	UNIDAD	m


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	PISO 4 CANALETA 90	2,00	21,00	12,90					67,80
	DOMO PISO 2	2,00	9,15	5,16					28,62
	CAFETERIA	1,00	6,09						
								TOTAL	96,42

CROQUIS

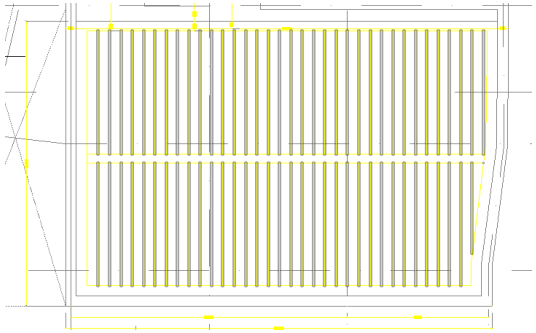

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA


ITEM:	6.22	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM	piso 4	1,10	21,00	12,90					297,99
	DOMO PISO 2	1,10	9,15	5,16					51,94
	ZONA E FUMADORES	1,00	7,00	7,00					
	caballete								
								TOTAL	349,93

CROQUIS

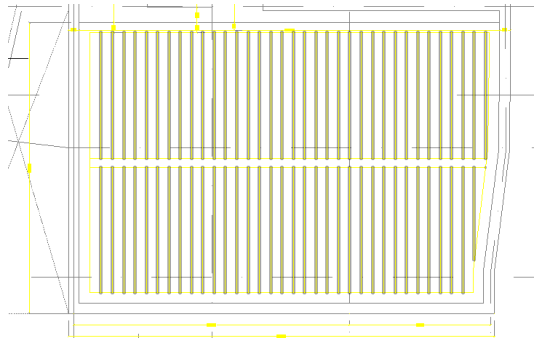

REGISTRO FOTOGRAFICO

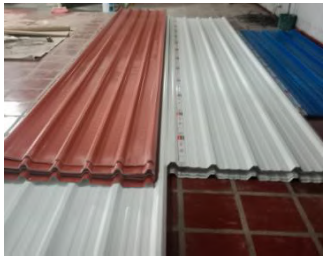





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
RESANE			
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 7.03		UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
RESANE	sotano, fachada, puertas	1,00	5,61	23,00					128,94
								TOTAL	128,94

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	8.07	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70	sotano parqueadero	1,00							1,00	
								TOTAL	1,00	

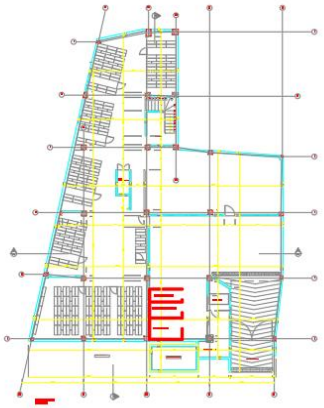

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 10.03 — UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ALTO		L	a	h	
PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	FACHADA PISO 2-PISO 4	1,00	18,50	7,66					141,71
	VENTANAS	-3,00	13,38	1,37					-54,99
	PISO 1	1,00	4,51	23,37					105,40
	VENTANAS	-1,00	2,20	18,49					-40,68
	ESCALERAS	-1,00	5,30	0,86					-4,56
	CULATA IZQUIERDA	1,00	8,70	19,20					167,04
	PARTE INTERNA VENTANAS	1,00	13,65	3,00					40,95
	PARTE INTERNA VENTANAS	1,00	1,60	6,00					9,60
	suministro de material								
	sotano piso	2,00	1,30	2,10					5,46
	piso	1,00	1,45	2,10					3,05
	muros	8,00	2,50	2,40					48,00
		2,00	1,50	2,40					7,20
		1,00	1,50	2,40					3,60
									0,00
								TOTAL	431,78

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	12.05	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO NO.5		1,00	8,40	2,40					20,16
CUARTOS BIODEGRADABLE		1,00	2,20	1,45					3,19
		1,00	4,30	0,40					1,72
								TOTAL	25,07


CROQUIS

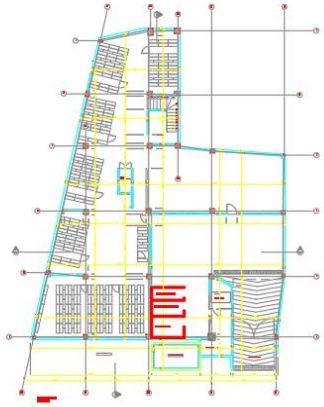

REGISTRO FOTOGRAFICO





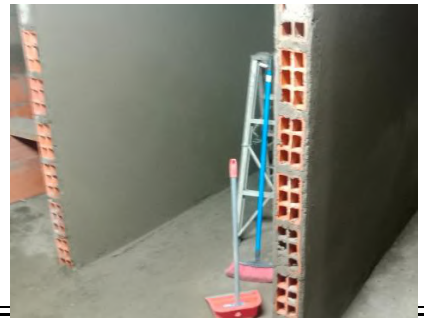

OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


DINTEL EN CONCRETO 5CM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	12.11	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
DINTEL EN CONCRETO 5CM	CUARTOS DE RESIDUOS	1,00	4,20						4,20
	OFICINA PISo 4	1,00	2,00						2,00
								TOTAL	6,20

CROQUIS

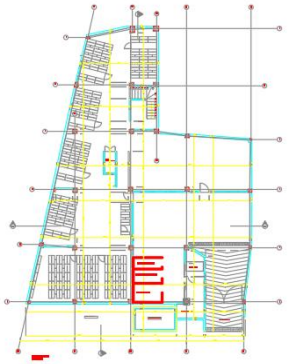

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 13.10 — UNIDAD: m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ALTURA		L	a	h	
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	PISO 4	1,00	97,50	2,60					253,50
	CAJONES PISO 4	7,00	3,20	0,80					17,92
	FACHADA PISO 1	1,00	6,00	2,40					14,40
	FACHADA PLACA PISO 1	1,00	31,20	1,50					46,80
	ENTRADA SOTANO	1,00	6,00	1,23					7,40
	PISO 1	1,00	124,42	2,10					261,28
								TOTAL	601,30

CROQUIS

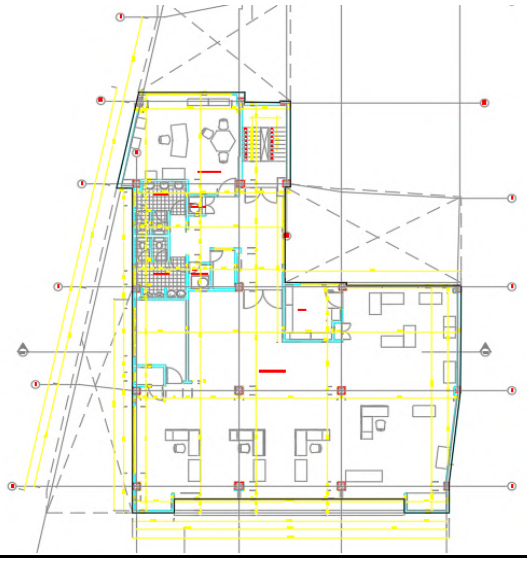

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 13.15 — UNIDAD: ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ALTO		L	a	h	
PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO		1,00							
CUARTOS BIODEGRADABLES	sotano	6,00	0,25	2,40					14,40
	DINTEL	1,00		4,30					4,30
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
						TOTAL			18,70

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 13.16		UNIDAD	ml


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
RECUBRIMIENTO ESMALTE 3 EN 1 EN PASAMANOS Y BARANDALES, se debe aplicar en todos los componentes y por las caras existentes, dos manos	BARANDA ESCALERA, HORIZONTALES	10,00	2,70						27,00	
	VERTICALES CORTOS	20,00	1,06						21,20	
	SOPORTES A TECHO	14,00	2,50						35,00	
		2,00	5,00						10,00	
	BARANDAS PISO 2 ANTEPECHO	4,00	5,40						21,60	
		8,00	1,15						9,20	
	REJILLA SOTANO	1,00	6,56						6,56	
	PISO 4 CANALETA 90	26,00	18,00						468,00	
	DOMO PISO 2	20,00	6,00							
	CAFETERIA	5,00	6,00							
	ZONA DE FUMADORES	4,00	3,00							
		6,00	6,00							
								TOTAL	598,56	



REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

PISO GRES 30,5X30,5CM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	14.11	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
PISO GRES 30,5X30,5CM	SOTANO PARQUEDRO	1,00	12,09	5,27					63,71
		1,00	5,28	5,96					31,47
		-1,00	4,30	2,10					-9,03
		-1,00	2,00	2,00					-4,00
									0,00
									0,00
									0,00
								TOTAL	82,15

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	14.19	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM		1,00	16,26						16,26	
cuartos biodegradabes									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
								TOTAL	16,26	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación.

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	14.21	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
SUMINISTRO RECUBRIMIENTO PARA PISO EPOXICO DE BAJO ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes para su perfecta aplicación	SOTANO	4,00	1,20						4,80	
REPARCHEO EN SÓTANO		4,00	0,60						2,40	
		2,00	3,00						6,00	
		1,00	2,00						2,00	
		1,00	1,50						1,50	
		2,00	0,50						1,00	
		1,00	0,60						0,60	
		1,00	1,00						1,00	
									0,00	
								TOTAL	19,30	

REGISTRO FOTOGRAFICO

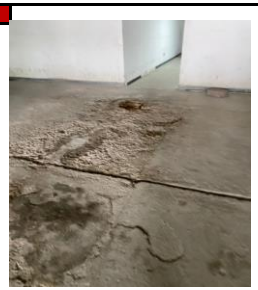





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 15.25		UNIDAD	und

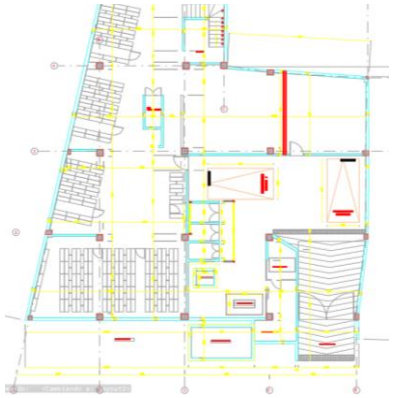DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	SOTANO	1,00							1,00	
									TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


CAMBIO SALIDA TOMA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	15.35	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
CAMBIO SALIDA TOMA	SOTANO CUARTO RESIDUOS	1,00							1,00	
								TOTAL	1,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

CANALETA PLASTICA 100X45MM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	15.44	UNIDAD	ml

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
CANALETA PLASTICA 100X45MM		1,00	20,00						
	sotano cuarto de residuos	1,00	4,10						4,10
								TOTAL	4,10

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

TUBERÍA PVCP 1/2"

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	16.02	UNIDAD	m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
TUBERÍA PVCP 1/2"									
	SOTANO POCETA	1,00	6,00						6,00
		1,00	6,00						6,00
								TOTAL	12,00

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	16.10	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml	SOTANO	1,00							1,00
								TOTAL	1,00

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA		
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 17.20		UNIDAD	m


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	SOTANO - SIFON PARA CONETAR CARCAMO DE CTO RESIDUOS	1,00	4,00						4,00
	LIEMPEZA Y SONDEO DE CARCAMOS - SOTANO PARQUEADERO	1,00	6,50						6,50
	LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCIÓN	6,00	1,00						6,00
								TOTAL	16,50

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

ASEO GENERAL DE OBRA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	19.01	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	% afectación de area	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
ASEO GENERAL DE OBRA	SOTANO	1,00		12,00	13,00					156,00	
	PISO 4	1,00		11,00	13,00					143,00	
									TOTAL	299,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS


INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1.10	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	LAMPARAS DE 60X60 piso 4	19,00							19,00	
	LAMPARAS DE 30X120	23,00								
	LAMPARAS CIRCULAR	8,00								
	CUARTO BIODEGRADABLES	3,00								
	SOTANO	3,00							3,00	
								TOTAL	22,00	



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo			
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 8.05		UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
=+A9	SOTANO PARQUEDRO	1,00	1,20	1,20					1,44	
		1,00	1,00	1,00					1,00	
		1,00	3,00	2,00					6,00	
		1,00	1,00	1,50					1,50	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
								TOTAL	9,94	

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

ALISTADO DE PISO 2CM

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	14.11	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
ALISTADO DE PISO 2CM	SOTANO PARQUEDRO	1,00	12,09	5,17					62,51	
	SOTANO PARQUEDRO	1,00	5,28	5,80					30,62	
	CUARTOS BIOGRADABLES	1,00	4,30	2,10					9,03	
	PLANTA ELECTRICA	-1,00	2,00	0,80					-1,60	
								TOTAL	100,56	



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
REGATA SOBRE MURO+RESANE			
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 1,47		UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
REGATA SOBRE MURO+RESANE	SOTANO PARQUEDRO	1,00	10,00						10,00
	PISO 4	1,00	2,00						2,00
									0,00
									0,00
								TOTAL	12,00

CROQUIS



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA			
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 1,21		UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	SOTANO PARQUEDRO	1,00	10,00						
	PISO 4	1,00	1,00						1,00
									0,00
									0,00
								TOTAL	1,00

CROQUIS

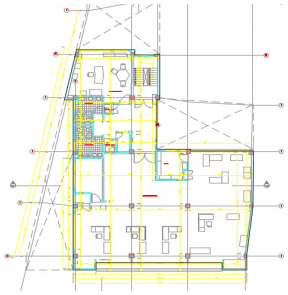

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
	DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA		
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 1,23		UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	SOTANO PARQUEDRO	1,00	10,00						
	PISO 4	1,00	1,00						1,00
									0,00
									0,00
								TOTAL	1,00

CROQUIS

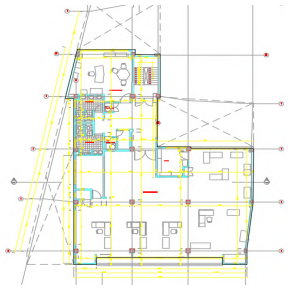

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	12,07	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	alto		L	a	h	
MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad									0,00
	division ofc	1,00	6,50	1,20					7,80
	Archivo piso 4	1,00	3,00	2,50					7,50
								TOTAL	15,30


CROQUIS

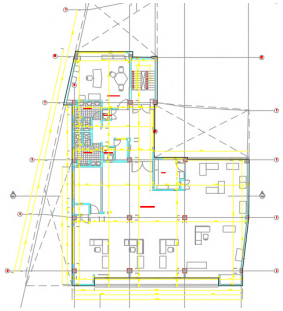

REGISTRO FOTOGRAFICO





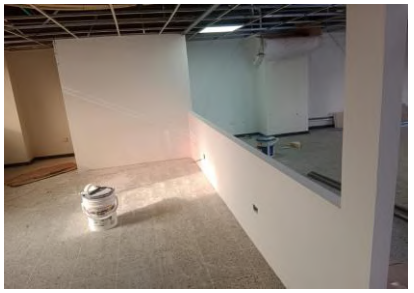

OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS


DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1,45	UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	alto		L	a	h	
DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)									0,00
	piso 4 nueva ofi	1,00	3,08	2,50					7,70
	vano puerta de acceso	1,00	1,00	2,50					2,50
	MURO GIMNASIO	1,00	8,33	3,00					25,00
								TOTAL	35,20

CROQUIS

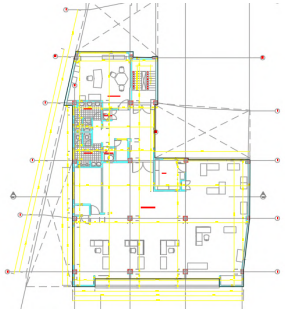

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 20,8		UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT		LONGITUD	ANCHO		L	a	h	
DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES (tarjeteros, Mesas (pequeñas y medianas) archivos de escritorio, tándem hasta 3 puestos, sillas)	sotano	4,00								4,00
										0,00
									TOTAL	4,00

CROQUIS

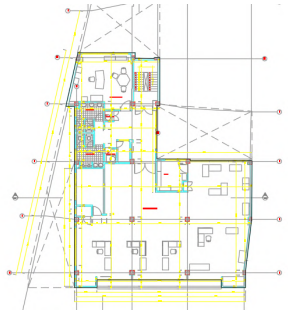

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	1,50	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA		1,00								
CUARTOS BIODEGRADABLES	sotano piso area parqueadero	1,00	25,00	-					25,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
								TOTAL	25,00	

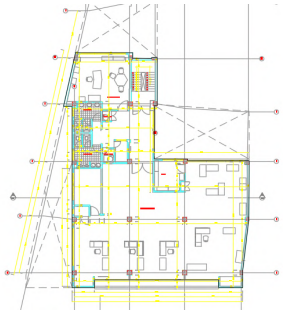

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM.

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM: 14,16 — UNIDAD: ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM.		1,00								
CUARTOS BIODEGRADABLES	sotano piso area parqueadero	1,00	25,00	-					25,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
								TOTAL	25,00	

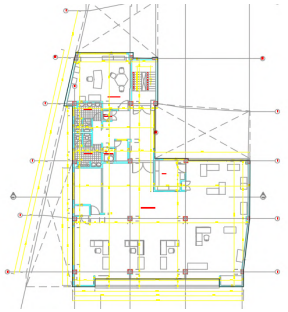

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE

CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA
ITEM: 16,26		UNIDAD	UND

POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO										
CUARTOS BIODEGRADABLES	CUARTO DE RESIDUOS	1,00		-					1,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
								TOTAL	1,00	

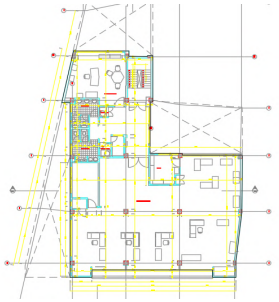

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	16	MES	12	AÑO	2024	HOJA No		DE


CONTRATO No.	2343 DE 2024	CONTRATISTA	BALER INGENIERIA SAS

HERRAJES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN PARA PUERTAS EN ALUMINIO

INTERVENTORIA	JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC	SUPERVISOR SNR	DR. CESAR MARTÍNEZ y apoyo ING. ROSA SANTAMARIA

ITEM:	NP-1	UNIDAD	und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT		LONGITUD	ANCHO		L	a	h		
HERRAJES, TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ADECUACIÓN PARA PUERTAS EN ALUMINIO	sotano - PUERTA ALUMINIO	1,00								1,00	
	PUERTAS TIPO REJILLA	3,00								3,00	
									TOTAL	4,00	

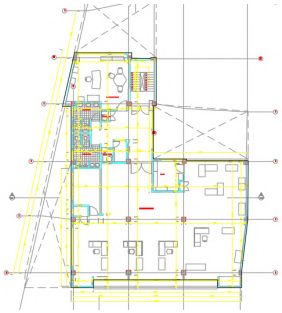

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES



LADY AGUIRRE
CONTRATISTA

JOSE SEBASTIAN PADILLA
INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA 30%
CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC	

REGISTRO FOTOGRAFICO CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER CONTRATO DE INTERVENTORIA

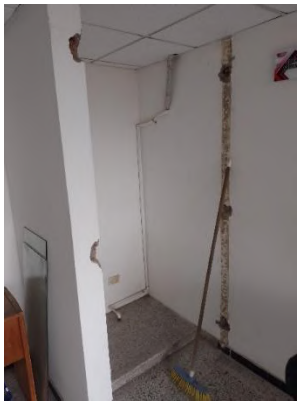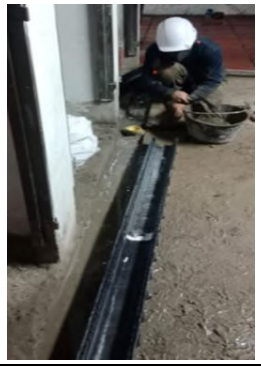Lugar: Cúcuta, Norte de Santander	
ORIP – CÚCUTA	
	 
Descripción: Se realizó el desmontaje controlado del sistema de cielo raso, realizando solamente la remoción de paneles. La actividad garantizó la protección de las instalaciones eléctricas y ductos de los aires acondicionados.	Descripción: Se ejecutó la construcción de cuartos destinados al almacenamiento de residuos biodegradables y la instalación de un lavatrapero en el sótano. La actividad incluyó el levantamiento de muros y aplicación de acabados, así como la adecuación del lavatrapero con conexión hidráulica y desagüe funcional.
 	 
Descripción: Se realizó el desmonte técnico de las puertas metálicas y de madera, incluyendo la remoción del marco, cerrajes y elementos de fijación.	Descripción: Se llevó a cabo la instalación de rejilla de piso de 30 cm, diseñada para facilitar el drenaje eficiente en el área destinada al manejo de materiales biodegradables; y se instaló una tapa en concreto para la caja de inspección de dimensiones 70 x 70 cm

	INTERVENTORIA JVM INGENIERIA SAS BIC	

	
Descripción: Se llevó a cabo la instalación de piso en gres en el sótano, asegurando nivelación precisa de la superficie y sellado de juntas para garantizar durabilidad y resistencia a la humedad. La actividad incluyó la limpieza final y verificación de acabados; y la instalación de los cajas de inspección	Descripción: Se realizó la instalación de media caña en gravilla lavada en las intersecciones piso-pared de los cuartos biodegradables, con el fin de facilitar la limpieza, evitar acumulación de residuos y mejorar la evacuación de líquidos.
	
Descripción: Se suministró y aplicó recubrimiento epóxico de bajo espesor, compuesto por dos componentes, para la protección y acabado del piso. La actividad incluyó la preparación de la superficie, mezcla y aplicación del recubrimiento, asegurando la correcta adhesión y terminación del acabado.	Descripción: Se llevó a cabo el desmonte de lámparas y luminarias, desconectando de manera segura los sistemas eléctricos y retirando los elementos de fijación. La actividad incluyó la manipulación cuidadosa de las luminarias para evitar daños y garantizar su posterior reutilización.

BITACORA DE OBRA

Contrato de obra. No 2343 de 2024.
Nombre del contratista.
BALER. INGENIERIA S.A.S - BIC
NIT: 900.264.015-8
Fecha DE INICIO: 25 de octuBre 2024.
Fecha DeTerminación: 31 de DICIEMBRE 2024
PIAZO de EJECUCIÓN: DOS (2) ~~meses~~ SIETE (7) DIAS
LUGAR. DE EJECUCIÓN:
El LUGAR. de EJECUCIÓN del contrato se establece para la agrupación No. 2. En las Oficinas de REGISTRO de instrumentos publicos de CÚCUTA.

El día (25) Veinticinco de octubre de 2024. En la Ciudad de BOGOTÁ, se REUNIERON CARLOS ARturo VERGARA NEGRETE En su calidad de interventor- del contrato y. LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ En su calidad de contratista, con el fin de dar Comienzo a las actividades pactadas En el objeto del contrato No 2343 de 2024.

Objeto: Contratar POR. el sistema de precios Unitarios Fijos Sin Formula. de Ajuste. las Obras de mantenimiento, Adecuación y mantenimiento de Inmuebles. DONDE Funcionan OFICINAS de REGISTRO DE instrumentos publicos a Nivel Nacional y BODEGA FUNZA. CALICIA, por AGRUpaciones "(32. ORIP y BODEGA Funza CALICIA)".

El día SIETE (7) de NOVIEMBRE del 2024 En la Ciudad de Cúcuta SE reunieron La.

lider=

Ingeniera Rosa Santamaría Supervición técnica por parte de la superintendencia, y la ingeniera Lady MERCEDES AGUIRRE ORtiz por como contratista, por parte de la interventoría el señor CRistian tambien estuvo presente Ronald Santamaria como encargado residente de Obra. para Acordar Compromisos. y tareas. se pacto

1. Entrega de Balance 9/NOV/2024.
2. Socialitación de Alcance 9/Nov/2024.
3. EntreGA de DiaNostico 12./Nov/2024.
4. Programación de Obra. 12./Nov/2024.
5. actas de Vecindad. 12/Nov/2024.
6. afiliaciones de personal 12/Nov/2024
7. Inicio de Actividades 14/Nov/2024.

08/11/24. Se hizo el recorrido por las Viviendas aledañas de los instalaciones de la Superintendencia para hacer unos registros Fotograficos para levantar las actas de Vecindad, no se lograron hacer Firmar por los propietarios de las Viviendas No se por que no se encontraron en los horas de la tarde, debido a este imprevisto se programo una visita con la compañia de la doctora martha. jefe superintendencia oficinas Cucuta. para el dia martes (12) doce de Noviembre 2024.
Ronald Santamaria.
Residente de OBra.

12-11-24. Se Realizo cotizaciones de los diferentes materiales, Herramientas y Equipos que se Ocan

a Utilizar en el proyecto. de mantenimiento.

14-11-24. El personal operativo llego de Bogotá y se ingreso a la Superintendencia para hacer un recorrido por toda las instalaciones para socializar todas las actividades que se van a realizar durante el proyecto.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

15-11-24. Viernes El personal ingresa a la 7 Am. inicia actividades con demolición de placa contrapiso con cuadrilla de dos trabajadores., tambien se Realizó el transbdo de todos mobiliario que estaban el sotano hacia otro sitio se realizo con dos trabajadores. y con sus debidos elementos de Epp. En las horas de la tarde. se realiza desmonte de una parte del cielo raso En el cuarto piso con una cuadrilla de dos trabajadores. y dos mas continuan con demolición de placa contrapiso.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

16-11-24. El personal ingresa a la superintendencia a las 7AM. inicio actividades demolición de placa contrapison con dos trabajadores, tambien se realiza marcación del trazado de los muros del cuarto Biograbable, y se realiza el desmonte de la ventana del sótano. los trabajadores realiton actividades hasta 5pm., a esa hora quedan los muros de los cuartos Biograbables quedan a una altura de 80cm
Ronald Santamaria
Residente Obra

líder

17-11-24 los trabajadores ingresan a las 7:30 Am. inician actividades con pegado de Bloque. y continuan con demolición de la placa Contrapiso realizan todas las actividades con sus respectivos Epp. y laboran hasta la 1 pm.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

18-11-24. Lunes dieciocho de noviembre los trabajadores ingresan a las 7 Am. inician actividades de demolición de placa. con una cuadrilla de dos trabajadores y sus respectivos Epp. la otra cuadrilla crea dos trabajadores realiza la actividad de pegada de bloque en los muros de los cuartos Biograbables. En las horas de la tarde. terminan los dos trabajadores con la demolición de la placa contrapiso y prosiguen a preparar el area de placa con malla electrosoldada y producto de SIKadur - 32. Primer Puente Adherencia Concreto fresco A. Endurecido 1K y preparar el concreto para su respectiva Vaciado en el area a fundir, Realizaron actividades hasta las 5pm.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

19-11-24 los trabajadores ingresan a las 7 Am inician actividades con demolición de muros en el cuarto piso y desmonte de cielo raso la otra cuadrilla continua con el pegado de bloque en los muros del los cuartos nobiograbables En el Sotano. En las horas de la tarde se. paran muebles en toda el area del Sotano para realizar los alistados de piso de 2 cm.

y proseguir con el alistado en toda el area del sotano. la cuadrilla mampostera termina muros hasta el nivel 2.9 m. realizando tambien los dinteles de las tres puertas de los cuartos no biogradables. Los trobajadores haboran hasta los 5 pm.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

20.-11-24. Los trobajadores ingresan a los 7 Am, inician actividades de pegado de tableta 30x30 de Arcilla. con brecha de 1cm cuadrilla de dos trabajadores la otra cuadrilla continua en los cuartos no biogradables con el revestimiento de muros y Filos. En las horas de la tarde los trabajades continuan con las mismas actividades. terminado con un rendimiento de 14 m2. El en la cuadrilla de enchopadores. y cuadrilla de paños-tadores con un rendimiento de 20 m2. todos los trabajadores cumple con sus respectivos Epp.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

21-11-24. Los trabajadores ingresan a los 7:Am, inician actividades en repello de muros de cuartos no biogradables con cuadrilla de dos trabajadores q tambien realizan pegada de tableta 30x30 con dos trabajadores y con sus respectivos Epp. En la tarde realizan regata para meter tuberia electrica. para puntos electricos dentro de Cuarto no biogradables se realizo sonde de Silfo para conectar bajante de cerramo.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

líder

22.-11-24 Los trabajadores ingresan a las 7:Am. inician con actividades de instalación de los marcos metalicos de las puertas persianas de los cuartos no biogradables., tambien se hacen las regatas para el desague del lavatrapero, en las jornada de la tarde se pegan los marcos metalicos de las puertas y se prosigue a sacar filos, tambien se realizo una urrecorrido con el coordinador de alturas para la instalación de los andamios colgantes. y se llego a la toma de la decisión de alquilar los equipos de sillas colgantes para Realizar la pintada de Fachada y Culata del Edificio, tambien se realizo Alistado de una area del piso del Sotano para continuar el dia sabado con la pegada de tableta 30x30 de arcilla.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

23-11-24. los trabajadores ingresan a las 7:30 Am. inician actividades con enchapa de tableta 30x30 en el area parqueadero del sotano con una cuadrilla de dos trabajadores y con sus respectivos EPP; tambien continuan otra cuadrilla de dos trabajadores revestimiento de los muros de cuartos no biogiadables el dia de hoy sabado dan por terminado esta actividad.
Hoy Sabado 23 de noviembre del 2024. se realiza con el maestro encargado corte de cantidades ejecutadas.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

25-11-24. Los trabajadores ingresan a las 7: Am. inician actividad con el brechado de la tableta y limpieza de la misma, tambien se realiza primera mano pintura tipo uno en color blanco para tapar poros del pañete de los muros del cuarto de residuos, se hace instalación de tapas en concreto a las cajas de los puntos d tierra. en los horas de la tarde instalación de la. plomeria sifón para bajante de lavatropero, tambien se hace mamposteria y se paneta. el lavatropero, El dia de hoy se trabaja con una cuadrilla de cinco trabajadores y con sus respectivos Epp. y laboran hasta las 6 pm.
Ronald Santamaría
Residente de Obra.

26-11-24. Los trabajadores ingresan a los 7: Am. inician actividades con enchape de tableta 30x30. y con enchape del lavatroperos en ceramica blanca 60x30. tambien se procede a realizar las regata para meter el carcamo de cuartos biodegradables, en las horas de la tarde se culmina el enchape de lavatroperos se instala la llave del mismo, se realiza plomería del carcamo para instalación del mismo. y se continua con alistado de piso para finalizar la tarde. las actividades con se realizan con una cuadrilla de cinco trabajadores y sus respectivos Epp. en las horas de la tarde se programa una visita con el carpintero que la a fabricar las puertas que se van a reemplazar por las puertas persianas de lamina metalica se procede hacer recorrido del piso cuatro

	al sotano tamando medidas de cada puerta y enumerandolas para un total de diez puertas, quedando el compromiso de realizarnos una cotización para el dia siguiente. Ronald Santamaria Residente de Obra.
27-11-24.	Los trabajadores ingresan a los 7 Am. inician Actividades de cambiando el sentido de abertura a la puerta del paso de sotano al archivo. tambien realizan el brechado del enchape y alistado de pisos de los cuartos biogradables. En las horas de la tarde se continuo con el enchape y brechado del piso hasta terminar el chape. los Actividades la realiza una cuadrilla de cinco trabajadores con sus respectivos Epp. Ronald Santamaria Residente de Obra.
28-11-24.	Los trabajadores ingresan a los 7 Am inician actividades. con el brechado de tableta. con. dos trabajadores, tambien se realizan las media cañas de los cuartos biogradables. se realiza con el maestro encargado de sacar. las cantidades de la pergola que se va realizar en una zona del segundo piso que esta a la interperie en los horas de la tarde se realiza la instalación de todo el guardaescoba. y se hace Aseo y lavado general con acido muriatico de todo el enchape de tablela 30x30, tambien se realizo compra de toda la perfileria de la estructura de las cubiertas de 4 piso y segundo piso y pergola. Ronald Santamaria Residente de Obra.

29-11-24	los trabajadores ingresan a las 7Am. inician con Actividades de marcación y Replanteo de los muros en superboard. de la oficina del cuarto piso y demolición de placa. para puntos Sanitario y. lavamanos del Baño de la oficina, con una cuadrilla de tres trabajadores, tambien terminan. de hacer. media cañas del los cuartos no biogradables en las horas de la tarde los trabajadores. realizan estructura de muros en superboard. y demolición de muros y Vano de puerta. para oficina del cuarto piso se realiza con. una cuadrilla de dos trabajadores y con sus respectivos Epp. Ronald Santamaria Residente de Obra.
30-11-24	los trabajadores ingresan. a las 7Am. inician actividades. en armado de estructura para muro. en superboard. con dos trabajadores, tambien. realizan el recogido de los escombros de demolición del dia anterior y los recogen en. costales. y bajan una parte. hacia el Sotano punto de acopio. En las hora de la mañana. nos llaman de Homecenter para entregar pedido de materiales. sobre las 11 Am llega Pedido. del material de construcción se inicia con el descargue de perfiles, tejas UPVC, soldadura, Anticorrosivo, pintura Epoxica, pintura Koraza. Ronald Santamaria Residente de Obra.
02-12-24	los trabajadores ingresan a las 7Am. inician actividades con el desprendimiento del encanto.

líder

Asfaltico que impermeabilizaba la media caña. que hace la junta entre la teja y el muro y parte del caballete, se hace demolición de la media caña. y proceden a desmontar las tejas. con ayuda de un lazo las amarran fuertemente para luego llevarlas (arrastradas) jaladas hasta la parte que tiene placa para proceder a picarlas con un maso. esa. actividad se realiza hasta desmontar un area de 6m x 6m. en las horas de la tarde. Los trabajadores realizan Actividades en la Subida de perfiles en C. del Segundo piso ala. Cubierta del cuarto piso. para realizar la Unión con Soldadura. 6013 de los dos perfiles en C. (para for) cuyos medidas Son. 150 x 50 x.2mm para formar una Viga. 0.15 m. x 0.10m. Esta actividad. la realiza una cuadrilla. de cinco trabajadores con Sus respectivos Epp.
El dia de hoy se presenta la. S.S.T. Erika Johana. Parra Gonzalez. para apoyar y supervisar los trabajos en altura.
Ronald Santamaría
Residente de Obra.

03-12-24. Los trabajadores ingresan. 7 Am. inician actividades con la limpieza de fachada. con su respectiva. señalización en lona verde y cinta peligro bajo la supervición de la SST. y Sus respectivos Epp. En la parte de la Cubierta. del piso cuatro. realizan la unión de los perfiles en C con soldadura. 60.13 para hierro. de otra parte donde ya se desmonto la teja de eternit se distribuyen a la misma distancia las Vigas ya. cuidas para proceder hacer los anclajes. en. Varilla de 1/2" en cada extremo de la Viga.

para luego hacer la unión de la viga con el concreto. En las horas de la tarde se hizo estucado. en las areas de la fachada donde se hizo la. limpieza. tambien se realizo la subida de la teja necesaria para cubrir el area. que se. requiere en la cubierta, se realiza la actividad enrrollando la teja. y amarrandola en cada extremo con un laso y así proceder con dos desde. trabajadores a jalar desde la cubierta. para subirla desde el segundo piso, esta actuvida la. realiza cuatro trabajadores con sus respectivos Epp. tambien se realizo pedido de material necesario para continuar techado de la cubierta.
Ronald Santamaria
Residente de Obra.

04-12-24. Los trabajadores ingresan a la 7Am. se inician actividades con la señalización y el cerramiento. en la parte externa del frente del edificio para. dar inicio con la primera mano pintuco Koraza. para exteriores. En el coarto piso se realizan resanes de los regatas donde se demolieron. los muros en blogue existentes. tambien se hacen filos para el bano de puerta de entrada principal de la oficina en construccion. En las horas de la mañana se realiza compra de la totalidad de perfiles en C. 150 x 50 x 2mm, flanches para cubiertas y otros materiales. En las horas de la tarde se continua con la pintada de fachada y se hacen ajustes a la estructura del cielo raso soldandola con templetes en barilla a la estructura nueva en perfiles en C. para luego (dar) hacer el.

líder

desmonte de la estructura metalica en cercha metalica existente. las actividades se realizan con una cuadrilla de cinco trabajadores con sus respectivos EPP. y bajo la supervicion SST..

Ronald Santamaria
Residente de Obra.

05-12-24 Los trabajadores ingresan 7Am. inician actividades con el desmonte de la estructura metalica existente de la cobierta canaleta 90 el demonte se realiza de la siguiente manera, amarran con laso los dos extremos de la cercha al perfil en C, luego cortan con pulidora los extremos que estan envellidos en las vigas de concreto, para luego sacarla por encima del la cobierta. y decender con ella hasta el primer piso. se inicia con la primera mano de pintura en Koraza. para exteriores en la parte lateral del edificion. y paralelamente se continua prim$ con segunda mano en la parte de la fachada. este actividad se realiza con dos trabajadores con todos sus respectivos EPP. y sus equipos para trabajo en suspensión en alturas. en las horas de la tarde con la continuida del la techado con teja Blanca UPVC. y realizando media caña. donde se nace el pegue de la teja UPVC con el mismo perimetral de la cobierta. A las 4 PM se realiza comite de obra en la oficina. de la doctora martha. Asisten la doctora martal perez, doctora alexandra espinosa, ingeniera Rosa santamaria, ingeniera Lady Aguirre; interventoria sergio barrera. y Ronald santamaria, Residente

líder

06-12-24.	Los trabajadores ingresan a las 7 Am. inician actividades con. estucado y lijado en fachada. tambien instalando las laminas de superboard. en la estructura para muro divisoria en la oficina en construccion piso cuatro. la actividad la realizo dos trabajadores con sus respectivos Epp. se. continua con. la segunda mano. en la parte lateral del edificio. En las horas de la tarde. se instalan las cajas y tuberia electrica. para puntos electricos en edif. muros divisorios para oficina. del cuarto piso, se hace el de ventana., vidrios y muro divisoria en oficina de segundo piso. tambien. se realizo el desplazamiento de costales con escombros del cuarto piso hacia el. sotano. Ronald Santamaria Residente de Obra
07-12-24.	Los trabajadores ingresan a las 7Am inician actividades con la demolición de muros del. gimnacio lo realizan. dos trabajadores con sus respectivos Epp. tambien continuan con. el resane juntas, filos y tornillos del muro en superboard. para la oficina en cuarto piso, se continua de pintando fachada y parte lateral del edificio. tambien se realiza. impermeabilización con Emulsión Asfaltica y cinta asfaltica en la parte del flanche de cubierta. cuarto piso. En las horas de la tarde. se cotización de material. en Homecenter de pintura para interiores, Pinture en Aceite. y demas material. Ronald Santamaria Residente de Obc.

líder

09-12-24. Los trabajadores ingresan a las 7 AM. inician actividades con la subida de perfiles en C. a placa de la cobierta para iniciar con la unión en soldadora 6013. a cada 60 cm. ingresan dos trabajadores nuevos para realizar esta actividad. con sus respectivos Epp. los demas trabajadores continuan realizando las actividades que se estaban ejecutando como son: pintada de fachada. con pintura Koraza. tipo 1. para exteriores. ésta actividad la realiza dos trabajadores con todos sus respectivos Epp y sus equipos para trabajo en alturas. El maestro. realiza filos y resanes en muro divisorio de la oficina cuarto piso. otro. trabajador. realiza el empacado de los escombros de la demolición del muros del gimnacio en costales para. luego proceder. a bajarlos al sotano. para su dispocación final. En las horas de la mañana se realiza la compra. de la pintura. para interiores. del primer y cuarto piso. En las horas de la tarde se realiza él lavado con varsol y mantenimiento de los equipos para trabajo en alturas. para posterior entrega al dueño.
Ronald Santamaria.
Apoyo Residente de Obra.
