GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02 PARCIAL	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	martes, 04 de febrero de 2025

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: SAMC-SI-018-2024 (ID:CO1.PCCNTR.6875308)	Número Radicado Interno del Contrato:	29102024-1475
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.654.594-8	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	

CONTRATISTA	PROXA INGENIEROS SAS
CONTRATO CEDIDO A:	N/A

CODIGO VIA	50CL01	NOMBRE DE LA VIA	LAS MARGARITAS-CAUYA-SECTOR MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA

Actividad Económica	4290	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA

Objeto del Contrato:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 262.893.678,00	$ 0	$ 52.578.736

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 262.893.678	PÚBLICA
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: DOS MESES. HASTA 30/12/2024	Fecha de Iniciación	OCTUBRE 31 DE 2024
	Fecha de Terminación de ejecución	DICIEMBRE 30 DE 2024
	Prórrogas	HASTA 14/02/2025 (1,5 MESES)

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500026528	$ 121.222.124,00	$ 24.244.425,00	$ 96.977.699,00	6 - 0141
VALOR ACTA	$ 121.222.124,00	$ 24.244.425,00	$ 96.977.699,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 262.893.678,00	Valor del Anticipo:		$ 52.578.736,00
Adición del Contrato		$ 0,00			
Valor Acta Nro. 1	$ 76.344.806,00		Amortización Acta 1	$ 15.266.961,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 121.222.124,00		Amortización Acta 2	$ 24.244.425,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 65.326.748,00		Saldo por Amortizar:	$ 13.067.350,00	
Sumas iguales	$ 262.893.678,00	$ 262.893.678,00	Sumas iguales	$ 52.578.736,00	$ 52.578.736,00

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: **JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA**

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: **CAROLINA DUQUE TOBON**

Supervisora contrato

Firma N/A

Nombre **Interventor Externo**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
378aaa3962efd2e4eca6816f883b267ebab12cead093910f6411973fc23455b88752b00772a85b5740b9f81273b369dd

Número de Factura: FE-12
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento: 24/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROXA INGENIEROS S.A.S
Nombre Comercial: PROXA INGENIEROS S.A.S
Nit del Emisor: 901654594
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

Pais: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 25 23 51 OF 202
Teléfono / Móvil: 6068823119
Correo: PROXAINGSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8908010521
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 21 CALLE 23
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: seincaldas@caldas.gov.vo

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	ACTA PARCIAL DE OBRA 2 CONTRTO No 29102024 1475	94	1,00	$ 121.222.124,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.222.124,00

Notas Finales

Linea de negocio: ADMINSTRACION 25% UTILIDAD 5%

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2025 10:18:57
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 10:18:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	121222124
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	121222124
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	121222124
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 121222124

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	121.222.124,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	121.222.124,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	121.222.124,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$121.222.124,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077156754 Rango desde: 5 Rango hasta: 900 Vigencia: 2025-08-14

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

MANIZALES, 21 de Agosto del 2024
CALDAS
COLOMBIA
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **La Empresa PROXA INGENIEROS SAS** con **NIT. 9016545948,**

Posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DA MÀS

Numero	**0550086000795251**
Fecha de apertura	**21/08/2024**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO
Banco Davivienda S.A.

PROXA
INGENIEROS S.A.S

LOS SUSCRITOS CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE PROXA INGENIEROS SAS NIT 901.654.594-8 IDENTIFICADOS COMO APARECE EN EL PIE DE LAS FIRMAS


CERTIFICAN QUE:

PROXA INGENIEROS SAS NIT 901.654.594-8, se encuentra a Paz y Salvo en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Se firma en Manizales a los 04 días del mes de febrero del 2025 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

José Fernando Estrada González
CONTADOR PUBLICO
PROXA INGENIEROS SAS
NIT 901.654.594-8
C.C. 10.214.954
T.P. 7541-T

Vanessa Giraldo Florez
Representante Legal
PROXA INGENIEROS SAS
NIT 901.654.594-8
C.C. 1.053.860.055

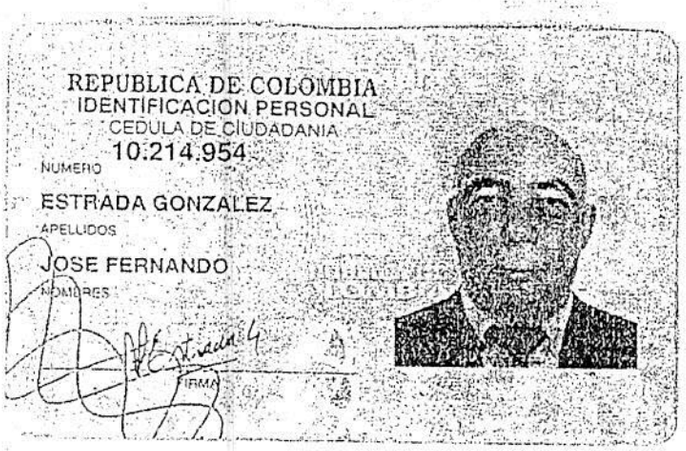

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.214.954
NUMERO
ESTRADA GONZALEZ
APELLIDOS
JOSE FERNANDO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1949
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-MAY-1970 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

A-0900100-35146822-M-0010214954-20060515 0323S06135A 02 105525120

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



7541-T

JOSE FERNANDO ESTRADA GONZALEZ
C.C. 10214964
RES. INSCRIPCION 1079 DEL 30/08/1982
COOPERATIVA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR COOFES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277923 14861

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 0 F B 0 F E D 9 4 A 3 4 A 6 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE FERNANDO ESTRADA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10214954 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 7541-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920685222

(415)7707212489984(8020) 000001492068522 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 4 5 9 4	8	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROXA INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 23 51 OF 202

42. Correo electrónico PROXAINGSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 8 8 2 3 1 1 9	3 1 1 7 4 3 8 3 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 1 1 6	4 2 1 0	2 0 2 2 1 1 1 6	4 1 1 2	4 3 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 16 / 09 : 49: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920685222

(415)7707212489984(8020) 000001492068522 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 4 5 9 4	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 1 1 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 2 6 4 3 1	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 1 1 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 1 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920685222

(415)7707212489984(8020) 000001492068522 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 4 5 9 4	8	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 8 6 0 0 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	FLOREZ	VANESSA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 0 7 8 6 2 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	SALAZAR	JOHN	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654594	8	PROXA INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANSERMA OBRA	CALLE 19 #40-72	ANSERMA-CALDAS	3117438388	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1167872574	9479833770	E	2025/01/24	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,782,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	27	$ 1.170.000	16%	SIN RIESGO	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	27	$ 1.170.000	4%	$ 46.800	$
							$ 3.500.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	16%	SIN RIESGO	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 3.500.000	4%	$ 140.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	27	$ 1.170.000	16%	SIN RIESGO	$ 187.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	27	$ 1.170.000	4%	$ 46.800	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	27	$ 1.800.000	16%	SIN RIESGO	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000		NUEVA E.P.S.	27	$ 1.800.000	4%	$ 77.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	14	$ 606.667	16%	SIN RIESGO	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100		NUEVA E.P.S.	14	$ 606.667	4%	$ 24.300	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	$
							$ 2.000.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	$
																					$ 2.471.500						$ 617.900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 46.800		CONFAMILIARES	27	$ 1.170.000	4%	$ 46.800	COLPATRIA ARP	27	$ 1.170.000	6,96%	5	$ 81.500	27	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 140.000		CONFAMILIARES	30	$ 3.500.000	4%	$ 140.000	COLPATRIA ARP	30	$ 3.500.000	6,96%	5	$ 243.600	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 46.800		CONFAMILIARES	27	$ 1.170.000	4%	$ 46.800	COLPATRIA ARP	27	$ 1.170.000	6,96%	5	$ 81.500	27	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 72.000		CONFAMILIARES	27	$ 1.800.000	4%	$ 72.000	COLPATRIA ARP	27	$ 1.800.000	6,96%	5	$ 125.300	27	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 24.300		CONFAMILIARES	14	$ 606.667	4%	$ 24.300	COLPATRIA ARP	14	$ 606.667	6,96%	5	$ 42.300	14	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 52.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 80.000		CONFAMILIARES	30	$ 2.000.000	4%	$ 80.000	COLPATRIA ARP	30	$ 2.000.000	6,96%	5	$ 139.200	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 617.900						$ 617.900						$ 1.075.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654594	8	PROXA INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANSERMA OBRA	CALLE 19 #40-72	ANSERMA-CALDAS	3117438388	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1167872574	9479833770	E	2025/01/24	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$4.782.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,471,500	$0	$0	$2,471,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,376,000	$0	$0	$1,376,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$908,300	$0	$0	$908,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$187,200	$0	$0	$187,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,075,400	$0	$0	$1,075,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,075,400	$0	$0	$1,075,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$617,900	$0	$0	$617,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	$617,900	$0	$0	$617,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$617,900	$0	$0	$617,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$365,600	$0	$0	$365,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$148,300	$0	$0	$148,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				10	$4,782,700	$0	$0	$4,782,700

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654594	8	PROXA INGENIEROS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 25 23 51	MANIZALES-CALDAS	3117438388	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2025-01	1167863654	9479831612	E	2025/01/24	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	51,042,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																										
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	16078625	GIRALDO SALAZAR JOHN JAIRO	Dependiente	0	No	No				X	2024/12/30																							
2	CC	12845379	ROSERO GOMEZ JOSE EDGAR	Dependiente	0	No	No				X	2024/12/30																							

Total Afiliados(2)

							SALARIO			PENSION												SALUD						
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vtp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.500.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	16%	SIN RIESGO	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	4%	$ 60.000	$
							$ 1.300.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
																					$ 448.000						$ 222.500	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 60.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.500.000	4%	$ 60.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.500.000	6,96%	5	$ 104.400	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 162.500		CONFAMILIARES	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 1.300.000	2%	$ 26.000	3%	$39.000	0%	$0	0%	$0	No
	$ 222.500						$ 112.000						$ 194.900				$ 26.000		$ 39.000		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901654594	8	PROXA INGENIEROS S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 25 23 51	MANIZALES-CALDAS	3117438388	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1167863654	9479831612	E	2025/01/24	2025/01/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,042,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$194,900	$0	$0	$194,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$194,900	$0	$0	$194,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$112,000	$0	$0	$112,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$112,000	$0	$0	$112,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$222,500	$0	$0	$222,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$222,500	$0	$0	$222,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				2	$1,042,400	$0	$0	$1,042,400

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO DOS (02)PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29102024-1475
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29102024-1475

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta FEBRERO 04 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29102024-1475	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500026528			
NIT o RUT:	901.654.594-8			
Contratista:	PROXA INGENIEROS SAS			
Representante Legal:	VANESSA GIRALDO FLOREZ			
Valor del Contrato ($):	$ 262.893.678,00	Aporte Departamento	$ 262.893.678,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN			
Disponibilidad presupuestal	3500044417	FONDO	0 - 0141	
Duración del contrato (Plazo):	DOS MESES. HASTA 30/12/2024			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 31 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 30 DE 2024	
Modificatorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CINCO MESES (HASTA 14/02/2025)	Nueva fecha terminacion	FEBRERO 14 DE 2025	
Interventor Externo	N/A			
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	600,1,1	600		Excavaciones varias sin clasificar	M3	58,00	50.350,00	2.920.300,00
2	311,1	311		Llenos con material	M3	0,00	78.820,00	0,00
3	630,4	630		Concreto clase D para muros	M3	50,75	1.007.565,00	51.133.924,00
4	630,7	630		Enrocados en concreto para proteccion de fondo y pared	M3	0,00	901.258,00	0,00
5	640,1	640		Acero de refuerzo	KG	3.265,00	9.646,00	31.494.190,00
6				Manejo de aguas	ML	12,00	223.945,00	2.687.340,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**88.235.754,00**

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	600,1,1	600		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2,00	50.350,00	100.700,00
6				Manejo de aguas	ML	6,00	223.945,00	1.343.670,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**1.444.370,00**

OBR ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
7			NP1	Roceria y limpieza	M2	0,00	480,00	0,00
8			NP2	Solado de limpieza	M3	7,35	975.163,00	7.167.448,00
9			NP3	Enrocados para conformacion de pisos	M3	31,50	762.633,00	24.022.940,00
10			NP4	Jornal ayudante	UND	3,00	117.204,00	351.612,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**31.542.000,00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$121.222.124,00
Amortización Anticipo			$24.244.425,00
Valor Ordenación del Gasto:			$96.977.699,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		262.893.678,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	76.344.806,00	
Valor Acta No. 2:	121.222.124,00	
Saldo del contrato	65.326.748,00	
Sumas Iguales	262.893.678,00	262.893.678,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		52.578.736,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	15.268.961,00	
Amortización del Anticipo Acta 1:	24.244.425,00	
Saldo por amortizar:	13.065.350,00	
Sumas Iguales:	52.578.736,00	52.578.736,00

SE HACE CONSTAR

Que **PROXA INGENIEROS SAS**, representado legalmente por **VANESSA GIRALDO FLOREZ** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
PROXA INGENIEROS SAS
Contratista

Firma
CAROLINA DUQUE TOBON
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL ACTA NRO DOS (02) PARCIAL CONTRATO DE OBRA NRO. 29102024-1474**

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta FEBRERO 04 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29102024-1475	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500026528			
NIT o RUT:	901.654.594-8			
Contratista:	PROXA INGENIEROS SAS			
Representante Legal:	VANESSA GIRALDO FLOREZ			
Valor del Contrato ($):	$ 262.893.678,00	Aporte Departamento	$ 262.893.678,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN			
Disponibilidad presupuestal	3500044417	FONDO	0 - 0141	
Duración del contrato (Plazo):	DOS MESES. HASTA 30/12/2024			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 31 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 30 DE 2024	
Modificatorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CINCO MESES (HASTA 14/02/2025)	Nueva fecha terminacion	FEBRERO 14 DE 2025	
Interventor Externo	N/A			
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1	600,1,1	600		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2,00	50.350,00	100.700,00
6				Manejo de aguas	ML	6,00	223.945,00	1.343.670,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**1.444.370,00**

OBR ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
7			NP1	Roceria y limpieza	M2	0,00	480,00	0,00
8			NP2	Solado de limpieza	M3	7,35	975.163,00	7.167.448,00
9			NP3	Enrocados para conformacion de pisos	M3	31,50	762.633,00	24.022.940,00
10			NP4	Jornal ayudante	UND	3,00	117.204,00	351.612,00
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**31.542.000,00**

JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES: Fue necesario realizar las mayores cantidades de obra y la obra adicional no prevista aquí relacionada para evacuar las aguas de escorrentia y debido a que al realizar las excavaciones, se encontró gran cantidad de roca, con la que se realizaron los enrocados por lo que se modificó el análisis de precio unitario del ítem original, y se debió contemplar un solado de limpieza para conformar una superficie adecuada para el posicionamiento del acero, además de algunos jornales para realizar actividades varias y rocería y limpieza de la zona.

Por lo tanto,. Se autoriza la inclusion del acta de mayores cantidades de obra y obra adicional no prevista aquí relacionadas y del item no previsto aquí relacionado.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
PROXA INGENIEROS SAS
Contratista

Firma
CAROLINA DUQUE TOBON
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 02 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS
SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO									
								OBRAS DEL ADICIONAL	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									
NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
1	600,1,1	600		Excavaciones varias sin clasificar	M3	94,00	50.350,00	4.732.900,00		
2	311,1	311		Llenos con material del sitio	M3	70,00	78.820,00	5.517.400,00		
3	630,4	630		Concreto clase D para muros	M3	150,00	1.007.565,00	151.134.750,00		
4	630,7	630		Enrocados en concreto para proteccion de fondo y pared	M3	9,00	901.258,00	8.111.322,00		
5	640,1	640		Acero de refuerzo	KG	8.986,00	9.646,00	86.678.956,00		
6				Manejo de aguas	ML	30,00	223.945,00	6.718.350,00		
7			NP1	Roceria y limpieza	M2		480,00			
8			NP2	Solado de limpieza	M3		975.163,00			
9			NP3	Enrocados para conformacion de pisos	M3		762.633,00			
10			NP4	Jornal ayudante	UND		117.204,00			
				VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				262.893.678,00		0,00

OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA											
ACTA Nº 01		NO PREVISTA		ACTA Nº 01		MAYOR CANT.		NO PREVISTA		TOTAL ACTA	EJECUTADO
OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
36,00	1.812.600,00			58,00	2.920.300,00	2,00	100.700,00			96,00	4.833.600,00
10,80	851.256,00									10,80	851.256,00
30,45	30.680.354,00			50,75	51.133.924,00					81,20	81.814.278,00
										0,00	0,00
2.000,00	19.292.000,00			3.265,00	31.494.190,00					5.265,00	50.786.190,00
18,00	4.031.010,00			12,00	2.687.340,00	6,00	1.343.670,00			36,00	8.062.020,00
		541,93	260.124,00							541,93	260.124,00
		4,41	4.300.469,00					7,35	7.167.448,00	11,76	11.467.917,00
		18,90	14.413.769,00					31,50	24.022.940,00	50,40	38.436.709,00
		6,00	703.224,00					3,00	351.612,00	9,00	1.054.836,00
	56.667.220,00		19.677.586,00		88.235.754,00		1.444.370,00		31.542.000,00		197.566.930,00

PROXA INGENIEROS SAS
CONTRATISTA

CAROLINA DUQUE TOBON
SUPERVISOR CONTRATO

VALOR ACTA DOS PARCIAL	$	121.222.124,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	24.244.425,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	96.977.699,00

GOBIERNO DE CALDAS	**PREACTA NRO DOS (02) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29102024-1475** **RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29102024-1475**

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta FEBRERO 04 DE 2025

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29102024-1475	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500026528			
NIT o RUT:	901.654.594-8			
Contratista:	PROXA INGENIEROS SAS			
Representante Legal:	VANESSA GIRALDO FLOREZ			
Valor del Contrato ($):	$ 262.893.678,00	Aporte Departamento	$ 262.893.678,00	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN			
Disponibilidad presupuestal	3500044417	FONDO	0 - 0141	
Duración del contrato (Plazo):	DOS MESES. HASTA 30/12/2024			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 31 DE 2024	Fecha de terminación	DICIEMBRE 30 DE 2024	
Modificatorio 01 (prorroga de plazo)	UNO PUNTO CINCO MESES (HASTA 14/02/2025)	Nueva fecha terminacion	FEBRERO 14 DE 2025	
Interventor Externo	N/A			
Supervisor Departamento	CAROLINA DUQUE TOBON			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

NRO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
		GENERAL	PARTICULAR				
1	600,1,1	600		Excavaciones varias sin clasificar	M3	60,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2	311,1	311		Llenos con	M3	0,00	0,00
3	630,4	630		Concreto clase D para muros	M3	50,75	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4	630,7	630		Enrocados en concreto para proteccion de fondo y pared	M3	0,00	0,00
5	640,1	640		Acero de refuerzo	KG	3.265,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
6				Manejo de aguas	ML	18,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
7			NP1	Roceria y limpieza	M2	0,00	0,00
8			NP2	Solado de limpieza	M3	7,35	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
9			NP3	Enrocados para conformacion de pisos	M3	31,50	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
10			NP4	Jornal ayudante	UND	3,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

CAROLINA DUQUE TOBON
Supervisor

PROXA INGENIEROA SAS
Contratista

GOBIERNO DE CALDAS

NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
	GENERAL	PARTIC.					
1			Excavaciones varias sin clasificar	m3	60,00	$ 50.350,00	3.021.000,00
2			Llenos con material del sitio	m3	0,00	$ 78.820,00	0,00
3			Concreto clase D para muros,vigas, caissons	m3	50,75	$ 1.007.565,00	51.133.924,00
4			Enrocados para proteccion de fondo	m3		$ 901.258,00	0,00
5			Acero de refuerzo	kg	3.265,00	$ 9.646,00	31.494.190,00
6			Manejo de aguas	ml	18,00	$ 223.945,00	4.031.010,00
OBRA ADICIONAL NO PREVISTA							
NP 1			ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	0,00	480,00	0,00
NP 2			SOLADO DE LIMPÍEZA	M3	7,35	975.163,00	7.167.448,00
NP 3			ENROCADOS PARA CONFORMACION DE PISO	M3	31,50	762.633,30	24.022.940,00
NP 4			JORNAL AYUDANTE	UN	3,00	117.204,00	351.612,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				**121.222.124,00**



GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: 1	**Excavaciones varias sin clasificar**	**UNIDAD:**	**M3**

LOCALIZACION	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**Unidad**	**M3**	**M3**	
MARAPRA	50,00	2,00	0,60		60,00	60,00	
TOTAL ACTA NRO 02					***60,00***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 01. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: 2	**Llenos con material del sitio**	**UNIDAD:**	**M3**

LOCALIZACION	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**Unidad**	**M3**	**M3**	
TOTAL ACTA NRO 02					***0,00***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: 3	Concreto clase D para muros,vigas, caissons	UNIDAD:	M3

LOCALIZACION	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Espesor	Unidad	M3	M3	
MARAPRA	50,00	1,70	0,20		17,00	17,00	PISO BOX
MARAPRA	50,00	1,40	0,15		10,50	27,50	LADO DERECHO BOX
MARAPRA	50,00	1,40	0,15		10,50	38,00	LADO IZQUIERDO BOX
MARAPRA	50,00	1,70	0,15		12,75	50,75	TAPA BOX
TOTAL ACTA NRO 02					*50,75*		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: 5	**Acero de refuerzo**	**UNIDAD:**	**KG**

LOCALIZACION	**Medidas**					**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Cantidad**	**Unidad**	**Peso**	**kg**	**kg**	
MARAPRA	6,25		251,00		1,00	1.569,00	1.569,00	FLEJES BOX
MARAPRA	50,00		32,00		1,00	1.600,00	3.169,00	LONG BOX
MARAPRA	0,60		160,00		1,00	96,00	3.265,00	TRASLADP LONG BOX
TOTAL ACTA NRO 02						***3265,00***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: 6	**Manejo de aguas**				**UNIDAD:**	**ML**

LOCALIZACION	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**Unidad**	**ML**	**ML**	
MARAPRA					18,00	18,00	DEVIO TRAMO 2
						18,00	
						18,00	
						18,00	
						18,00	
						18,00	
TOTAL ACTA NRO 02					***18,00***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 01. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: NP1	ROCERIA Y LIMPIEZA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACION	Medidas				Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	Longitud	Ancho	Altura	Unidad	M2	M2	
TOTAL ACTA NRO 02					*0,00*		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: NP2	**SOLADO DE LIMPÍEZA**	**UNIDAD:**	**M3**

LOCALIZACION	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**Unidad**	**M3**	**M3**	
MARAPRA	50,00	2,10	0,07		7,35	7,35	TRAMO 1
					0,00	7,35	
					0,00	7,35	
					0,00	7,35	
					0,00	7,35	
TOTAL ACTA NRO 02					***7,35***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: NP3	**Enrocados para proteccion de fondo**				**UNIDAD:**	**M3**
LOCALIZACION	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Espesor**	**Unidad**	**M3**	**M3**	
MARAPRA	50,00	2,1	0,30		31,50	31,50	TRAMO 1
TOTAL ACTA NRO 02					***31,50***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

PREACTA NRO 02. (MEMORIAS DE CALCULO)

CONTRATO No. 29102024-1475

OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA. MUNICIPIO DE ANSERMA. VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS

SUPERVISOR: CAROLINA DUQUE TOBON

ITEM: NP4	**JORNAL AYUDANTE**	**UNIDAD:**	**M3**

LOCALIZACION	**Medidas**				**Total medidas**	**Acumulado medidas**	**Observaciones**
	Longitud	**Ancho**	**Altura**	**Unidad**	**un**	**un**	
MARAPRA					3,00	3,00	CONSTRUCCION DE ROMBON
TOTAL ACTA NRO 02					***3,00***		

SUPERVISOR

CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 02 PARCIAL

CONTRATO	29102024-1475	RADICADO JURID. NRO:	29102024-1475
OBJETO:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROXA INGENIEROS SS		
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAROLINA DUQUE TOBON		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES. HAST EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	PRORROGA PLAZO	HAST EL 14/02/2025 (1,5 MESES)
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONL) INCLU	$ 262.893.678	PORCENTAJE AU %	30% (A: 25%, U: 5%
VALOR TOTAL	$ 262.893.678		

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
Excavaciones varias sin clasificar	94,00	4.732.900,00	1,80%	0,04%	96,00	4.833.600,00	1,84%
Llenos con material del sitio	70,00	5.517.400,00	2,10%	-1,77%	10,80	851.256,00	0,32%
Concreto clase D para muros	150,00	151.134.750,00	57,49%	-26,37%	81,20	81.814.278,00	31,12%
Enrocados en concreto para proteccion de fondo y pared	9,00	8.111.322,00	3,09%	-3,09%	0,00	0,00	0,00%
Acero de refuerzo	8.986,00	86.678.956,00	32,97%	-13,65%	5.265,00	50.786.190,00	19,32%
Manejo de aguas	30,00	6.718.350,00	2,56%	0,51%	36,00	8.062.020,00	3,07%
Roceria y limpieza	0,00	0,00	0,00%	0,10%	541,93	260.124,00	0,10%
Solado de limpieza	0,00	0,00	0,00%	4,36%	11,76	11.467.917,00	4,36%
Enrocados para conformacion de pisos	0,00	0,00	0,00%	14,62%	50,40	38.436.709,00	14,62%
Jornal ayudante	0,00	0,00	0,00%	0,40%	9,00	1.054.836,00	0,40%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (A: 25,00% - U: 5%)		**262.893.678,00**	100,00%			**197.566.930**	**75,15%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	PROXA INGENIEROS SAS
VALOR DEL CONTRATO	$ 262.893.678
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 262.893.678
PLAZO INICIAL	DOS MESES. HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIACION	OCTUBRE 31 DE 2024
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 30 DE 2024
PRORROGA	1,5 MESES (HASTA FEBRERO 14 DE 2025)

INTERVENTORIA/SUPERVISION
EL CONTRATO NO CUENTA CON INTERVENTORIA EXTERNA. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DE LA INGENIERA CAROLINA DUQUE TOBON, PROFESIONAL UNIVERSITARIA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejeucion del contrato se han realizado actividades tales como:Excavaciones varias sin clasificar, Llenos con material del sitio, Concreto clase D para muros, Acero de refuerzo, Manejo de aguas,Roceria y limpieza, Solado de limpieza, Enrocados para conformacion de pisos y jornles para ayudantes con una inversion de $ 197.566.930,00 incluido AU del 30% (administracion: 25%, utilidad: 5%) equivalente al 75,15 de ejecucion del contrato.

CAROLINA DUQUE TOBON
SUPERVISORA DEL CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 02 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 29102024-1475** COPIA CONTROLADA SIG	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
FEBRERO 04 DE 2025

ACTA NRO. **02 PARCIAL** **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	**29102024-1475**	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	**29102024-1475**
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1,40 MTS x 1,40 MTS EN CONCRETO REFORZADO URBANIZACION MARPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VIA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN
CONTRATISTA:	PROXA INGENIEROS SAS
SUPERVISOR	CAROLINA DUQUE TOBON

PREGUNTAS	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

CAROLINA DUQUE TOBON
Supervisora contrato

PROXA
INGENIEROS S.A.S

Gobierno de CALDAS

SECRETERIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME TECNICO DE OBRA
ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO N°29102024-1475

OBJETO:

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN.

CONTRATISTA: PROXA INGENIEROS SAS
NIT: 901.654.594-8

SUPERVISOR: ING CAROLINA DUQUE TOBON

PERIODO DEL INFORME:
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 2 DE FEBRERO DEL 2025

PROXA
INGENIEROS S.A.S

INTRODUCCION

La totalidad de la red vial a cargo del departamento de Caldas corresponde a 1,761 km, de los cuales apenas el 35% se encuentra pavimentado y el 65% está en afirmado. Por otra parte, el 15% corresponde a vías de primer orden, el 33% a vías de segundo orden y el 52% a vías terciarias, lo que implica la mayor proporción para vías de este tipo en el departamento, con un déficit de pavimentación del 97%.

La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y mantenimiento de la infraestructura física municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles.

La red vial del Departamento se encuentra primordialmente construida en afirmado y predominan los tramos en condición regular o mala. La totalidad de la red vial recibe mantenimiento periódico y/o rutinario, aunque no toda la infraestructura vial ha sido sometida a intervenciones de rehabilitación, mejoramiento o reconstrucción. La red vial departamental es susceptible a los procesos de inestabilidad de taludes en todo el Departamento.

La Gobernación de Caldas, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, busca mejorar la vía con código 50CL01-4 Las Margaritas el crucero sector Urbanización Marapra, vía de segundo orden a cargo del departamento según resolución del Ministerio de Transporte número 0005134 de 2016," Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento de Caldas, dado que se está presentado pérdida parcial de la banca y afectación de viviendas aledañas debido al deficiente manejo de las aguas provenientes de la vía, en este caso, por la falta de estructuras de alcantarillado tipo cajón en concreto reforzado, que ha desencadenado procesos de socavación, afectación de vivienda y la correspondiente pérdida parcial de banca, lo cual genera verdadero riesgo para quienes transitan por esta vía.

El proyecto pretende beneficiar al municipio de Anserma en especial la comunidad de Marapra y sus alrededores, con el mejoramiento mediante la construcción de alcantarillado tipo cajón en concreto reforzado y recuperación el ancho de calzada de la vía y la construcción de canales de entrega de las aguas provenientes de la vía hasta que lleguen a cauce estable. Estas obras se realizarán bajo las especificaciones INVIAS y siguiendo los modelos tipo con que cuenta la Secretaría De Infraestructura Del Departamento de Caldas

PROXA
INGENIEROS S.A.S

GENERALIDADES


NUMERO DEL CONTRATO	N° 29102024-1475
TIPO CONTRATO	OBRA PÚBLICA.
OBJETO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN.
FECHA DE INICIO	31/10/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30/12/2024
CONTRATISTA	PROXA INGENIEROS SAS
PLAZO EJECUCIÓN	2 MESES
VALOR CONTRACTUAL	$262.893.678
SUPERVISOR	CAROLINA DUQUE TOBON
PRORROGA	1.5 MESES
FECHA DE TERMINACION FINAL	14/02/2025

PROXA
INGENIEROS S.A.S

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Estas obras están ubicadas en la dirección descrita a continuación:

FRENTE	LOCALIZACION
NA	URBANIZACION MARAPRA EN LA VIA ENTRE RISARADLA Y ANSERMA CALDAS

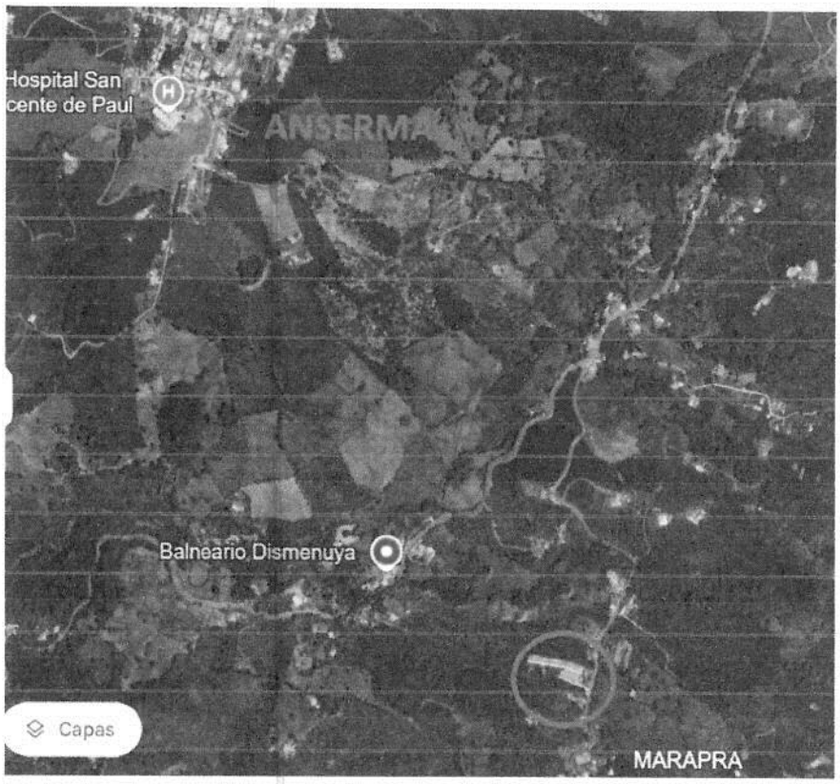

PROXA
INGENIEROS S.A.S

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Las actividades a ejecutar y el alcance del contrato consiste en la rocería, excavación y conformación del lecho rocoso del riachuelo mediante la construcción de un enrocado en el piso, para la construcción de 110 m de alcantarilla o box culvert en concreto clase D de 1.4 m x 1.4 m libres con paredes de 0,15 m de espesor y piso de 0.20 de espesor, reforzado con acero de ½" cada 0.20 m en ambos sentidos.

Dicho box culvert unirá un canal en U existente con un box culvert existente aguas abajo.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo del 15 de diciembre del 2024 al 2 de febrero del 2025; se realizó las actividades correspondientes a la

- Se arrendo la bodega para el almacenamiento de los materiales.
- Se realizaron las actas de vecindad
- Se realizo la socialización del proyecto a la comunidad
- Se realizo la rocería
- Se ejecutaron los senderos por los cuales se va a bajar el material
- Se realizaron demoliciones de concretos existentes
- Se realizo demolición en roca
- Se realizo a conformación de las rocas
- Se realizo la construcción de enrocado
- Se instalo solado de limpieza
- Se realizo el manejo de aguas
- Se instalo el acero de refuerzo
- Se instalo en concreto clase D

En el periodo se realizaron las siguientes consultas y solicitudes a la Supervisión y así mismo las solicitudes de la supervisión al contratista:

- Se han realizado mesas de trabajo con el fin de resolver algunas dudas por parte del contratista las cuales han sido resueltas de manera inmediata por parte del supervisor.

- Se realizo balance de obra con el fin de tener claras las actividades a ejecutar y el alcance de las obras.

ASPECTOS LOGISTICOS

MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA:

- Tubería Novafort para desvió de aguas
- Material granular TRITURADO
- Material granular ARENA
- Cemento Portland
- Acero de alta resistencia de diámetro No. 4.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:

La maquinaria y equipo utilizado por el contratista para la ejecución de las obras, fueron los siguientes:

- Herramienta menor (palas, picas, barras, buggies)
- 2 mezcladoras de 1 saco.
- Pulidora.
- Volquetas para ingreso y retiro de material.

PROXA
INGENIEROS S.A.S

RECURSOS DE PERSONAL:

- **RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO**

NOMBRE	CARGO
Ing. Johnny Andres Gaitan Naranjo	Director de Obra
Ing. John Jairo Giraldo Salazar	Residente de Obra
Ing. Andrea Garcia	Profesional Ambiental
Jaime Cardona Marulanda	Profesional SST
Beatriz Yulieth Rios Osorio	Profesional Social
Heinz Hernandez Jiemenz	Técnico Constructor

- **RELACION PERSONAL OPERATIVO**

PERSONAL	NOVIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025
Maestro de Obra	1	1	1
Oficiales	1	2	3
Ayudante Practico	0	0	0
Ayudante	5	5	7
TOTAL	**7**	**8**	**11**

PROXA
INGENIEROS S.A.S

ESTADO DE TIEMPO

En el periodo entre el 15 de diciembre del 2024 y el 2 de febrero de 2025; se realizó el registro del estado del tiempo relacionado a continuación:

ESTADO DEL TIEMPO				
PROXA INGENIEROS SAS				
CONTRATO No. 29102024-1475				
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CAJON (SECCION 1.4 MTSX1.4MTS) EN CONCRETO REFORZADO, URBANIZACION MARAPRA, MUNICIPIO DE ANSERMA, VÍA DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO ORDEN.				
FECHA			ESTADO	OBSERVACIONES
DIA		MES		
J	31	Octubre	TIEMPO SECO	
V	1	Noviembre	TIEMPO SECO	
S	2	Noviembre	TIEMPO SECO	
D	3	Noviembre	TIEMPO SECO	
L	4	Noviembre	TIEMPO SECO	
M	5	Noviembre	TIEMPO SECO	
MC	6	Noviembre	TIEMPO SECO	
J	7	Noviembre	TIEMPO SECO	
V	8	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
S	9	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
D	10	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
L	11	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	12	Noviembre	TIEMPO SECO	
MC	13	Noviembre	TIEMPO SECO	
J	14	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
V	15	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
S	16	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
D	17	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
L	18	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	19	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	20	Noviembre	TIEMPO SECO	
J	21	Noviembre	TIEMPO SECO	
V	22	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
S	23	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
D	24	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
L	25	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	26	Noviembre	TIEMPO SECO	
MC	27	Noviembre	TIEMPO SECO	
J	28	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
V	29	Noviembre	TIEMPO LLUVIOSO	
S	30	Noviembre	TIEMPO SECO	
D	1	Diciembre	TIEMPO SECO	
L	2	Diciembre	TIEMPO SECO	
M	3	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	4	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
J	5	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
V	6	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	

S	7	Diciembre	TIEMPO SECO	
D	8	Diciembre	TIEMPO SECO	
L	9	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	10	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	11	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
J	12	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
V	13	Diciembre	TIEMPO SECO	
S	14	Diciembre	TIEMPO SECO	
D	15	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
L	16	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	17	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	18	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
J	19	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
V	20	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
S	21	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
D	22	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
L	23	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	24	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	25	Diciembre	TIEMPO SECO	
J	26	Diciembre	TIEMPO SECO	
V	27	Diciembre	TIEMPO SECO	
S	28	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
D	29	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
L	30	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
M	31	Diciembre	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	1	Enero	TIEMPO SECO	
J	2	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
V	3	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
S	4	Enero	TIEMPO SECO	
D	5	Enero	TIEMPO SECO	
L	6	Enero	TIEMPO SECO	
M	7	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	8	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
J	9	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
V	10	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
S	11	Enero	TIEMPO SECO	
D	12	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
L	13	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
M	14	Enero	TIEMPO SECO	
MC	15	Enero	TIEMPO SECO	
J	16	Enero	TIEMPO SECO	
V	17	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
S	18	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
D	19	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
L	20	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
M	21	Enero	TIEMPO SECO	
MC	22	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
J	23	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
V	24	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
S	25	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
D	26	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
L	27	Enero	TIEMPO SECO	
M	28	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
MC	29	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
J	30	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
V	31	Enero	TIEMPO LLUVIOSO	
S	1	Febrero	TIEMPO SECO	
D	2	Febrero	TIEMPO LLUVIOSO	

PROXA
INGENIEROS S.A.S

AVANCE FISICO Y EN TIEMPO DE LA OBRA

EL AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

COBRADO A LA FECHA:

VALOR TOTAL CONTRATADO	$262.893.678	
VALOR ACTA 1		$ 76.344.806
VALOR ACTA 2		$ 121.222.124
SALDO DEL CONTRATO		$65.326.748
SUMAS IGUALES	$262.893.678	$262.893.678
PORCENTAJE COBRADO		75,15%

El valor cobrado en la obra a la fecha del presente informe es del 75,15% dejando un saldo por cobrar del contrato del 24,85%.

PROXA
INGENIEROS S.A.S

MEMORIAS DE CALCULO

CONDICIONES INCIALES DE OBRA

NRO	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	94,00	$ 50.350,00	4.732.900,00
2	Llenos con material del sitio	m3	70,00	$ 78.820,00	5.517.400,00
3	Concreto clase D para muros, vigas, caissons	m3	150,00	$ 1.007.565,00	151.134.750,00
4	Enrocados para protección de fondo	m3	9,00	$ 901.258,00	8.111.322,00
5	Acero de refuerzo	kg	8.986,00	$ 9.646,00	86.678.956,00
6	Manejo de aguas	ml	30,00	$ 223.945,00	6.718.350,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)					262.893.678,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICAROTIA NO. 1 (BALANCE)

NRO	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	126,00	$ 50.350,00	6.344.100,00
2	Llenos con material del sitio	m3	37,80	$ 78.820,00	2.979.396,00
3	Concreto clase D para muros,vigas, caissons	m3	106,58	$ 1.007.565,00	107.386.278,00
4	Enrocados para proteccion de fondo	m3		$ 901.258,00	0,00
5	Acero de refuerzo	kg	6.974,00	$ 9.646,00	67.271.204,00
6	Manejo de aguas	ml	54,00	$ 223.945,00	12.093.030,00
OBRA ADICIONAL NO PREVISTA					
NP 1	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	541,93	480,00	260.124,00
NP 2	SOLADO DE LIMPÍEZA	M3	15,44	975.163,00	15.056.517,00
NP 3	ENROCADOS PARA CONFORMACION DE PISO	M3	66,15	762.633,30	50.448.193,00
NP 4	JORNAL AYUDANTE	UN	9,00	117.204,00	1.054.836,00
	VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)				262.893.678,00

PROXA
INGENIEROS S.A.S

ACTA NO. 1

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				OBRA	VALOR
NRO	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO	CANT.	VR.TOTAL
1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 50.350,00	36,00	1.812.600
2	Llenos con material del sitio	m3	$ 78.820,00	10,80	851.256
3	Concreto clase D para muros,vigas, caissons	m3	$ 1.007.565,00	30,45	30.680.354
4	Enrocados para proteccion de fondo	m3	$ 901.258,00	0,00	0
5	Acero de refuerzo	kg	$ 9.646,00	2.000,00	19.292.000
6	Manejo de aguas	ml	$ 223.945,00	18,00	4.031.010
	ITEMS NO PREVISTOS				
7	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	480,00	541,93	260.124
8	SOLADO DE LIMPÍEZA	M3	975.163,00	4,41	4.300.469
9	ENROCADOS PARA CONFORMACION DE PISO	M3	762.633,30	18,90	14.413.769
10	JORNAL AYUDANTE	UN	117.204,00	6,00	703.224
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)					**76.344.806**

ACTA NO. 2

					TOTAL ACTA	EJECUTADO
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL					OBRA	VALOR
NRO	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	CANT.	VR.TOTAL
1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	94,00	50.350,00	60,00	3.021.000,00
2	Llenos con material del sitio	M3	70,00	78.820,00	0,00	0,00
3	Concreto clase D para muros	M3	150,00	1.007.565,00	50,75	51.133.924,00
4	Enrocados en concreto para proteccion de fondo y pared	M3	9,00	901.258,00	0,00	0,00
5	Acero de refuerzo	KG	8.986,00	9.646,00	3.265,00	31.494.190,00
6	Manejo de aguas	ML	30,00	223.945,00	18,00	4.031.010,00
7	Roceria y limpieza	M2		480,00	0,00	0,00
8	Solado de limpieza	M3		975.163,00	7,35	7.167.448,00
9	Enrocados para conformacion de pisos	M3		762.633,00	31,50	24.022.940,00
10	Jornal ayudante	UND		117.204,00	3,00	351.612,00
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30,00% (ADMINISTRACION: 25,00% - U: 5%)						**121.222.124,00**

ACTAS SUSCRITAS

A la fecha de corte de la presente acta; se suscribieron las actas relacionadas a continuación:

- **ACTA DE INICIO**
- **ACTA DE OBRA NO 1**
- **ACTA DE OBRA NO 2**

PROXA
INGENIEROS S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



INICIO DE ROCERIA



INICIO DE ROCERIA



INICIO DE ROCERIA



INICIO DE ROCERIA



BOX CULVERT EXISTENTE



CANAL EN U EXISTENTE

PROXA
INGENIEROS S.A.S

DURANTE



EXCAVACIONES



MANEJO DE AGUAS




ACOMODACION DE ROCA




ENROCADOS



SOLADO DE LIMPIEZA

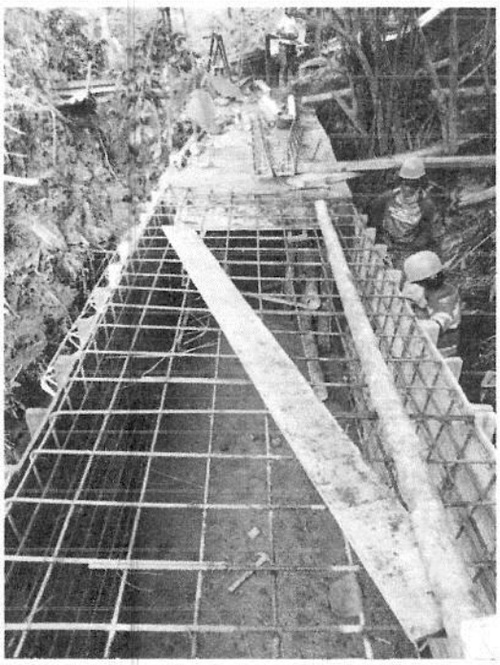

INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO

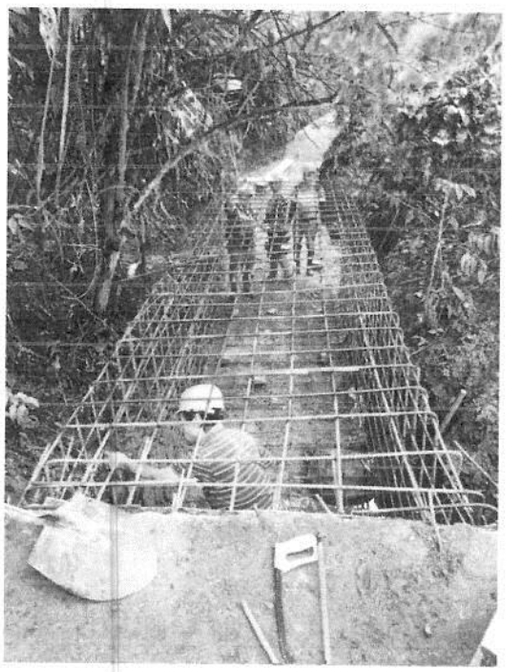


INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO



INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO




PISO BOX CULVERT

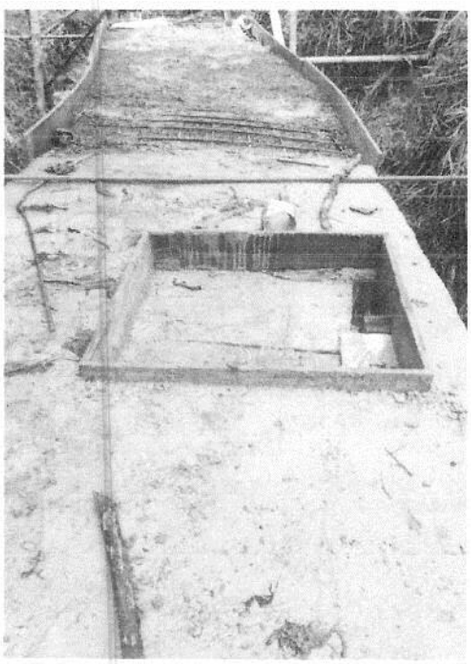

TECHO BOX CULVERT

PROXA
INGENIEROS S.A.S

DESPUES

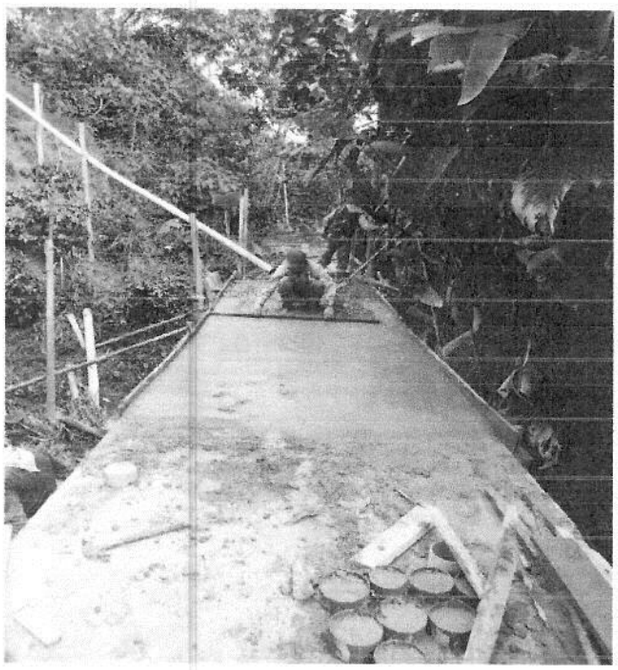

TRAMO DE BOX CULVERT TERMINADO



TRAMO DE BOX CULVERT TERMINADO

CALLE 25 No 23-51 OFICINA 202 MANIZALES – CALDAS
CELULAR 311 743 8388 EMAIL: proxaingsas@gmail.com



TRAMO DE BOX CULVERT TERMINADO



TRAMO DE BOX CULVERT TERMINADO

PROXA
INGENIEROS S.A.S



TRAMO DE BOX CULVERT TERMINADO

VANESSA GIRALDO FLOREZ
Representante Legal
PROXA INGENIEROS S.A.S.
CONTRATISTA
