1. FECHA ELABORACIÓN:	11	1	2025	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	5				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 67D 58 14, BARRIOS UNIDOS,						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360-2024			7. FECHA CONTRATO:	27	11	24	8. VALOR CONTRATO: frente	$ 42.971.188		
9. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	20	Días	
12. PRORROGAS:				13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENARTK XXI,										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354-2024			18. FECHA CONTRATO:	28	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 365.580.190		
20. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	20	Días	
23. PRORROGAS:				24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091										
27. SUPERVISOR SDIS:	Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES			**Visita a establecimiento**	
Localizacion y replanteo	100%	100%		
Suministro e instalacion de angeo de proteccion	64%	35%	**En visita de taller se cuantifica el avance**	
Suministro e instalacion de ventanas aluminio	100%	35%	**En visita de taller se cuantifica el avance**	
Suministro e instalacion de puertas en aluminio	83%	0%		
Suministro e instalacion de media caña en pvc	100%	0%		
Pintura epoxica reflectiva en rampa	100%	100%		
Orden y aseo Final	0%	0%		
TOTAL	**81,00%**	**30,00%**		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	1,00%	47,00%	-46%
Durante el periodo	29,00%	34,00%	-5%
Acumulado Actual	30,00%	81,00%	-51%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	34,00%	81,00%
Valor de la Obra Programada	$ 14.610.204	$ 34.806.662

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	29,00%	30,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 12.461.645	$ 12.891.356

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

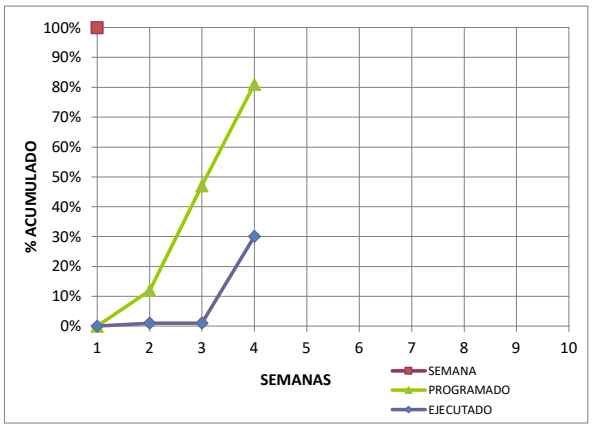

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA		ESTADO
ALMACENISTA				lunes	6	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO				martes	7	F
TÉCNICOS CARPINTERIA DE ALUMINIO/ METALICA				miércoles	8	F
MAESTRO				jueves	9	F
OFICIAL				viernes	10	F
AYUDANTE				sábado	11	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fabricación de carpinteia metalica, puerta y ventanas
2. La Interventoría con visita de taller y verificación de avance

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. se realiza comite de obra virtual el día 26 de diciembre de 2024, en el cual se revisa el presupuesto y se aprueba iniciar obra de ventaneria.
2. Se realiza acta de visita de taller para verificar la fabricación de carpinteria metalica, puertas y ventanas, se cuantifica un avance del 30%
3. En esta semana se realizan actividades de taller

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	11	1	2025	No. INFORME	4	SEMANA No.	5


OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATO OBRA No:	*9360-2024*	CONTRATISTA	CONSORCIO INGENARTK XXI,
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	*9354-2024*	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

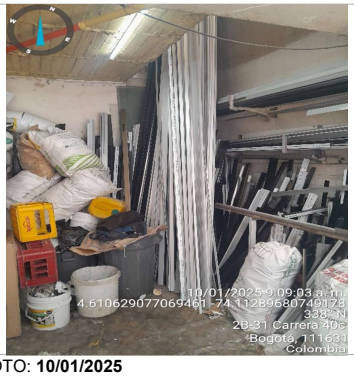

FECHA FOTO: **10/01/2025**
DESCRIPCIÓN: MATERIAL DE VENTANERIA EN TALLER

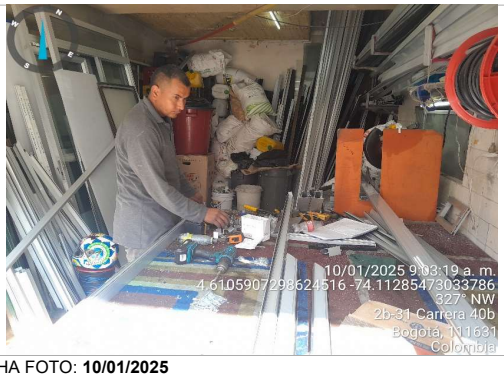

FECHA FOTO: **10/01/2025**
DESCRIPCIÓN: CORTE Y MEDICIÓN DE PERFILES DE VENTANAS



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: ARMADO DE PERFILERIA DE VENTANAS



FECHA FOTO: **10/01/2025**
DESCRIPCIÓN: VENTANA EN PROCESO DE ARMADO

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:
