| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 25 | 1 | 2025 | 2. No. INFORME | 6 | 3. SEMANA No. | 7 | | | |
| 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI | | | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: | CL 67D 58 14, BARRIOS UNIDOS, | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 9360-2024 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 27 | 11 | 24 | 8. VALOR CONTRATO: frente | $ | 46.993.789 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 12 | 12 | 24 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 | 12 | 24 | 11. PLAZO: | 20 | Días |
| 12. PRORROGAS: | | | | 13. SUSPENSIONES: | | Meses/días | | 14. ADICIONES: | $ | - |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO INGENARTK XXI, | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 9354-2024 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 28 | 11 | 24 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 365.580.190 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 12 | 12 | 24 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 | 12 | 24 | 22. PLAZO: | 20 | Días |
| 23. PRORROGAS: | | | | 24. SUSPENSIONES: | | Meses/días | | 25. ADICIONES: | $ | - |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091 | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión | | | | | | | | | |

**B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN**


| 28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | 31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO | 32. EVALUACIÓN AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | | | | |
| Localizacion y replanteo | 100% | 100% | | |
| Suministro e instalacion de angeo de proteccion | 100% | 100% | **INSTALADA** | |
| Suministro e instalacion de ventanas aluminio | 100% | 100% | **INSTALADA** | |
| Suministro e instalacion de puertas en aluminio | 100% | 0% | | |
| Suministro e instalacion de media caña en pvc | 100% | 0% | | |
| Pintura epoxica reflectiva en rampa | 100% | 100% | | |
| Orden y aseo Final | 100% | 0% | | |
| TOTAL | **100,00%** | **63,88%** | | |

| 33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
| Acumulado anterior | 61,76% | 94,00% | -32% |
| Durante el periodo | 2,12% | 6,00% | -4% |
| Acumulado Actual | 63,88% | 100,00% | -36% |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programada | 6,00% | 100,00% |
| Valor de la Obra Programada | $ 2.819.627 | $ 46.993.789 |

| | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutada | 2,12% | 63,88% |
| Valor de la Obra Ejecutada | $ 996.578 | $ 30.021.443 |

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

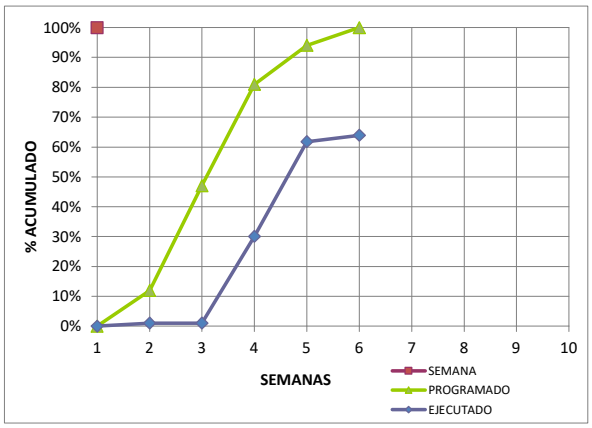


## C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

| 35. PERSONAL OPERATIVO OBRA | | 36. EQUIPOS EN OBRA | | 37. ESTADO DEL TIEMPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | CANTIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | DIA | | ESTADO |
| ALMACENISTA | | | | lunes | 20 | F |
| TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO | | | | martes | 21 | F |
| TÉCNICOS CARPINTERIA DE ALUMINIO/ METALICA | | | | miércoles | 22 | F |
| MAESTRO | | | | jueves | 23 | F |
| OFICIAL | 2 | | | viernes | 24 | F |
| AYUDANTE | | | | sábado | 25 | F |
| RESIDENTE | 1 | | | LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S) | | |

## D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fabricación e Instalación de carpinteia metalica, puerta
2. La Interventoría con visita de taller y verificación de avance a puertas
3. instalación de malla de protección en rampa

## E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. se realiza medición de carpinteria metálica puertas
2. instalación de carpinteria metalica, ventanas, y angeos de cocina
3. Medición de mallas protección rampa
4. En esta semana se realizan actividades de taller fabricación dse puerta

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
**CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091**

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ELABORACIÓN: | 25 | 1 | 2025 | No. INFORME | 6 | SEMANA No. | 7 |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO OBRA No: | *9360-2024* | CONTRATISTA | CONSORCIO INGENARTK XXI, |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No: | *9354-2024* | INTEVENTORÍA | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091 |

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: VENTANERIA DE PASACOMIDA



FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: VENTANERIA DE DESCOMIDE




FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: VENTANA POSTERIOR COCINA



FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: VENTANA INTERIOR COCINA



FECHA FOTO: **23/01/2025**
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN MALLA PROTECCIÓN RAMPA

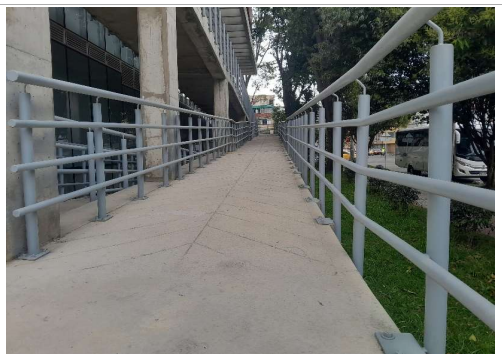

FECHA FOTO: **23/01/2025**
DESCRIPCIÓN: MEDICIÓN MALLA PROTECCIÓN RAMPA
