1. FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	2. No. INFORME	6	3. SEMANA No.	7			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	, Centro día María Goretti, CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CASA DE LA SABIDURIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AC 68 58 23 MJ, BARRIOS UNIDOS,					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360-2024	7. FECHA CONTRATO:	27	11	24	8. VALOR CONTRATO: frente	$ 12.333.384			
9. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	20	Días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENARTK XXI,									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354-2024	18. FECHA CONTRATO:	28	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 365.580.190			
20. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	20	Días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091									
27. SUPERVISOR SDIS:	Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES				
Localizacion y replanteo	100%	100%		
Suministro e instalacion de angeo de proteccion	100%	100%		
Suministro e instalacion de ventanas aluminio	100%	100%		
Suministro e instalacion de puertas en aluminio	100%	10%	**ACTA DE VANOS, TRABAJO DE TALLER**	
Suministro e instalacion de media caña en pvc	100%	0%		
Orden y aseo Final	100%	0%		
TOTAL	**100,00%**	**70,45%**		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	67,03%	100,00%	-33%
Durante el periodo	3,42%	0,00%	3%
Acumulado Actual	70,45%	100,00%	-30%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 12.333.384

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,42%	70,45%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 421.662	$ 8.688.766

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

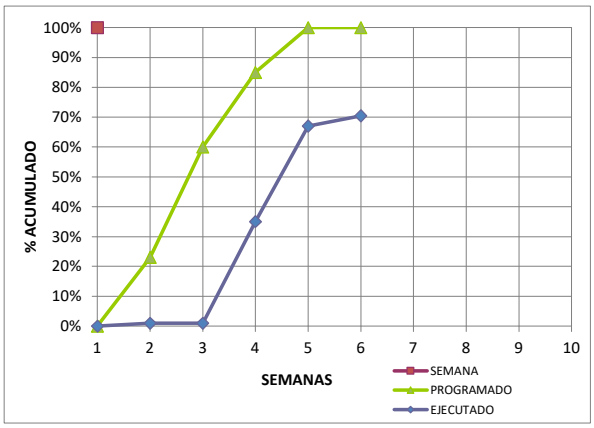

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA		ESTADO
ALMACENISTA				lunes	20	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO				martes	21	F
TÉCNICOS CARPINTERIA DE ALUMINIO/ METALICA	2			miércoles	22	F
MAESTRO				jueves	23	F
OFICIAL				viernes	24	F
AYUDANTE				sábado	25	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fabricación e Instalación de carpinteia metalica, puerta
2. La Interventoría con visita de taller fabricación de puertas y verificación de avance

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Instalación de carpinteia metalica ventanas
2. Se realiza acta de vanos de carpinteria metalica, puertas
3. En esta semana se realizan actividades de taller fabricación de puerta

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	No. INFORME	6	SEMANA No.	7

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATO OBRA No:	*9360-2024*	CONTRATISTA	CONSORCIO INGENARTK XXI,
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	*9354-2024*	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: TAPALUZ EN VENTANA COCINA




FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: VENTANA DESCOMIDE



FECHA FOTO: **20/01/2025**
DESCRIPCIÓN: VENTANA POSTERIOR

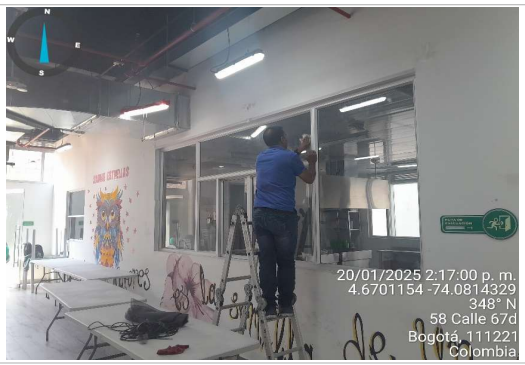

FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: VENTANA PASACOMIDA

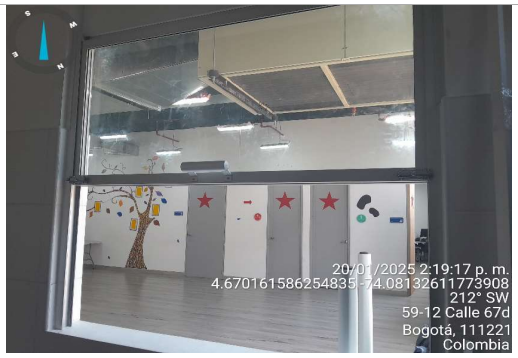

FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: VENTANA DESCOMIDE



FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: VENTANA POSTERIOR
