1. FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	7			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL AURES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 130B 96 57 SUBA					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9360-2024	7. FECHA CONTRATO:	27	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 17.428.067			
9. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	20	Días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENARTK XXI,									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9354-2024	18. FECHA CONTRATO:	28	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 365.580.190			
20. FECHA ACTA INICIO:	12	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	22. PLAZO:	20	Días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -			
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091									
27. SUPERVISOR SDIS:	Arq, Karol Vargas.- Apoyo a la Supervisión									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA,	0%	0%		
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE FACHADA FLOTANTE CON	0%	0%		
CERRADURA DE SOBREPONER	0%	0%		
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO	0%	0%		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO,	0%	4,64%	**MEDICIÓN DE PUERTAS, ACTA DE VANOS**	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	0%	0%		
TOTAL	**0,00%**	**1,15%**		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior			
Durante el periodo			
Acumulado Actual	1,15%	0,00%	1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ -

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	1,15%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 200.413

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

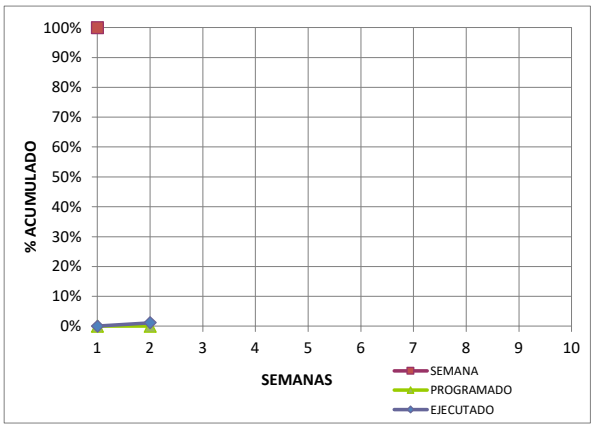

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA		ESTADO
ALMACENISTA				lunes	20	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO				martes	21	F
TÉCNICOS CARPINTERIA DE ALUMINIO/ METALICA	2			miércoles	22	F
MAESTRO				jueves	23	F
OFICIAL				viernes	24	F
AYUDANTE				sábado	25	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)		

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con fabricación de puertas.
2. Instalación de puertas

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. se inicia actividades de obra con acta de vanos el día 24 de enero de 2025,
2. se inicia fabricación de puertas

OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	25	1	2025	No. INFORME	2	SEMANA No.	7

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATO OBRA No:	*9360-2024*	CONTRATISTA	CONSORCIO INGENARTK XXI,
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	*9354-2024*	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS SOCIAL 091

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: **24/01/2025**
DESCRIPCIÓN: JARDIN INFANTIL AURES



FECHA FOTO: **24/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Medición acta de vanos de puerta batiente principa



FECHA FOTO: **24/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Medición acta de vanos de puerta batiente principa



FECHA FOTO: **24/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Medición acta de vanos de puerta batiente principa



FECHA FOTO: **24/01/2025**
DESCRIPCIÓN: Medición acta de vanos de puerta batiente posterior

FECHA FOTO:
DESCRIPCIÓN:
