Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira

- CORTE DE OBRA No 1

NUMERO DE CONTRATO:	**SA-MC-01-2024**
OBJETO DEL PROCESO:	**Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.**
NOMBRE DEL PROPONENTE:	**HACER DE COLOMBIA S.A.S**

I. CORTE DE OBRA No 1

ANEXO 11 OFERTA ECONOMICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO RICO					
ITEMS GENERALES					
1-01- PRELIMINARES					
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	M2	1,00	129.133,00	129.133,00
1-01-03	Campamento, incluye teja de zinc, piso en tierra , tabla.	M2	50,00	128.175,00	6.408.750,00
1-01-04	Localización y replanteo	M2	138,11	1.682,00	232.304,38
1-01-05	Limpieza y nivelación	M2	138,11	6.040,00	834.196,48
1-01-08	Nivelación terreno con material del sitio	M2	138,11	4.832,00	667.357,18
1-01-10	Cargue de material manual	M3	107,46	27.773,00	2.984.586,56
1-01-11	Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)	M3	107,46	50.060,00	5.379.627,82
1-01-14	Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras	Día	90,00	10.496,00	944.640,00
				Subtotal	**17.580.595,43**
1-02 DESMONTES Y DEMOLICIONES					
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1-02-02	Corte con disco muro ambos lados	M	82,90	9.227,00	764.918,30
1-02-03	Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape	M2	315,02	11.109,00	3.499.557,18
1-02-06	Demolición manual de concreto (Placas y Estructuras Enterradas)	M3	48,34	173.573,00	8.390.379,96
1-02-08	Demolición losa sobre terreno	M2	138,11	11.572,00	1.598.232,06
1-02-11	Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos	Un	2,00	15.969,00	31.938,00
1-02-13	Desmonte cielo falso	M2	138,11	6.903,00	953.387,14
1-02-17	Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco	M2	47,50	13.308,00	632.130,00
1-02-34	Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica	M2	138,11	17.451,00	2.410.192,51
1-02-35	Corte de piso en Concreto con cortadora autopropulsada	M	138,11	5.047,00	697.051,26
				Subtotal	**18.977.786,42**

1-03 EXCAVACIONES Y LLENOS					
CODIGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1-03-01	Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual	M3	82,87	33.827,00	2.803.148,77
1-03-07	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	93,56	60.404,00	5.651.494,89
1-03-24	Lleno compactado con material granular	M3	53,86	129.088,00	6.953.154,72
1-03-28	Lleno con piedra, incluye transporte	M3	21,55	156.626,00	3.374.581,10
				Subtotal	**18.782.379,48**
					55.340.761,33
	ADMINISTRACION	15%			8.301.114,20
	UTILIDAD	5%			2.767.038,07
					11.068.152,27
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	19%			525.737,23
					66.934.650,82

NOTA 1: El CONTRATISTA incluirá en todos y cada uno de los ítems, todos los costos de suministro de materiales, acabados, instalación, mano de obra, equipos, herramientas, limpieza, trasiegos, transportes, cargue, retiro de material, disposición final, elementos de seguridad y en general todos los costos directos e indirectos relacionados con la completa ejecución de los ítems correspondientes, ejecutados y entregados en pleno funcionamiento a satisfacción de LA INTERVENTORÍA. No se pagará valor independiente ni adicional por estos conceptos, por lo cual será responsabilidad a cuenta y costo del CONTRATISTA y deberán estar contemplados en los ítems correspondientes

OSCAR TAMAYO PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
HACER DE COLOMBIA SAS

31/12/2024
FECHA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	SA-MC-01-2024		CONTRATISTA						HACER DE COLOMBIA SAS			

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-01-01*	*Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción*	UNIDAD:	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
VALLA		1,00								1,00
									TOTAL	*1,00*

CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**		**CONTRATISTA**			**HACER DE COLOMBIA SAS**						


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**

ITEM:	***1-01-03***	***Campamento, incluye teja de zinc, piso en tierra , tabla.***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
CAMPAMENTO	OBRA	1,00	8,197	6,10						50,00
									TOTAL	***50,00***

CROQUIS

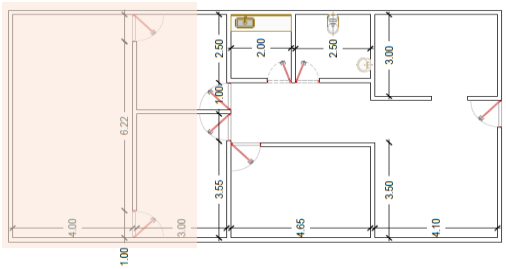

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**			**CONTRATISTA**					**HACER DE COLOMBIA SAS**			

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA		**EJE GROUP SAS**		**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM:	***1-01-04***	***Localización y replanteo***		**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
LOCALIZACION Y REPLANTEO	OBRA		16,843	8,20						138,11
									TOTAL	***138,11***

CROQUIS

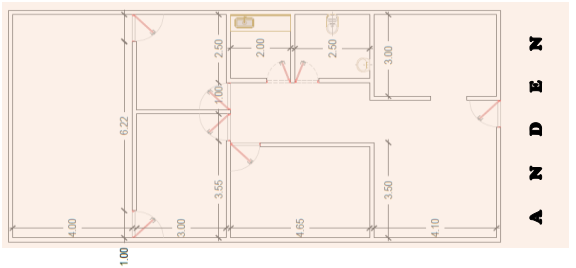

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	SA-MC-01-2024	CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA SAS


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-01-05*	*Limpieza y nivelación*	UNIDAD:	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LIMPIEZA Y NIVELACION	OBRA		16,843	8,20						138,11
									TOTAL	*138,11*

CROQUIS

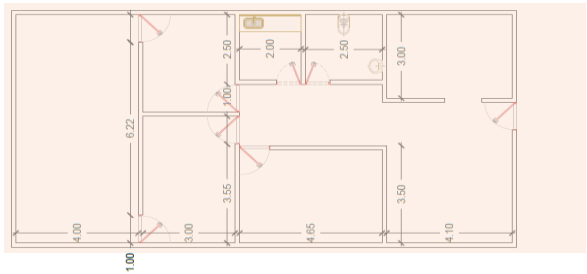

Observaciones	

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	SA-MC-01-2024	CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA SAS


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-01-08*	*Nivelación terreno con material del sitio*	UNIDAD:	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
NIVELACION TERRENO	OBRA		16,843	8,20						138,11
						TOTAL				*138,11*

CROQUIS

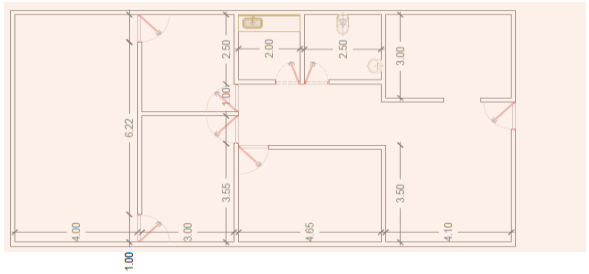

Observaciones	

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**FECHA**	**DIA**	**3**	**MES**	**1**	**AÑO**	**2025**	**HOJA No**	1	**DE**			

CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**	**CONTRATISTA**	**HACER DE COLOMBIA SAS**

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM: ***1-01-10***	***Cargue de material manual***	**UNIDAD:**	*M3*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
cargue volqueta de 7 m3		15,35			7,00					107,46
									TOTAL	***107,46***

CROQUIS





Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS **CONTRATISTA**	**EJE GROUP SAS** **INTERVENTORIA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**		**CONTRATISTA**						**HACER DE COLOMBIA SAS**			

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM: ***1-01-11***	***Retiro de material sobrante cargue manual (distancia 1 a 15 Km)***	**UNIDAD:**	*M3*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
Retiro de material sobrante	Obra	15,35			7,00					107,46	
										TOTAL	***107,46***







Observaciones	

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**			**CONTRATISTA**					**HACER DE COLOMBIA SAS**			

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA		**EJE GROUP SAS**		**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM:	***1-01-14***	***Alquiler andamio tubular certificado, incluye manipulación y teleras***		**UNIDAD:**	*Día*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**	**CROQUIS**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**		
Alquiler andamio		90,00								90,00	
									TOTAL	***90,00***	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE


CONTRATO No.	SA-MC-01-2024	CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA SAS

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA
ITEM: 1-02-02	*Corte con disco muro ambos lados*	UNIDAD:	*M*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
corte pulidora manual			82,900							82,90
									TOTAL	82,90

CROQUIS

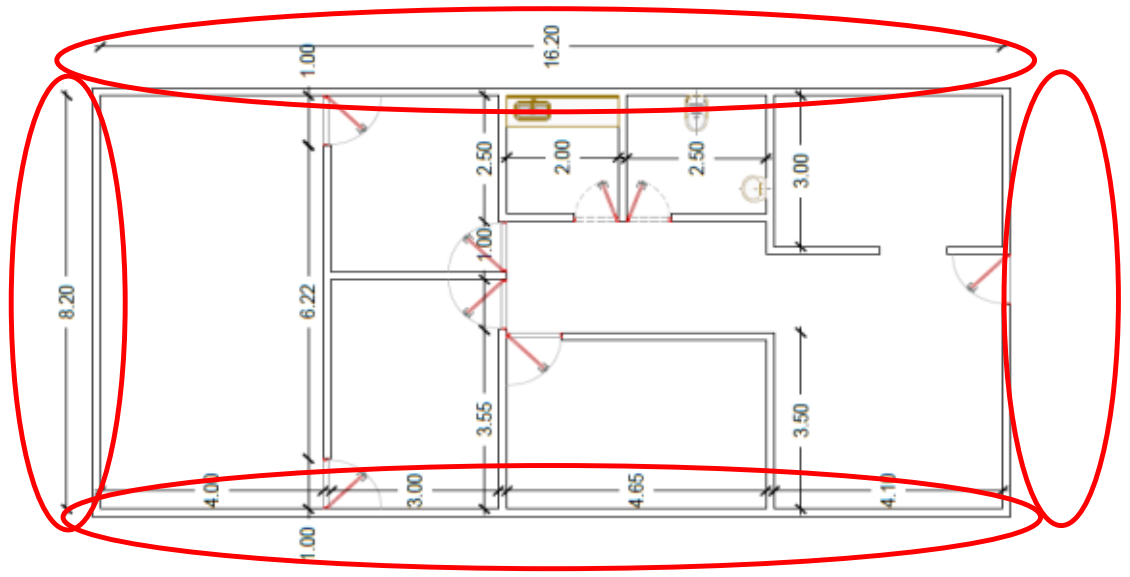

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	HACER DE COLOMBIA arquitectura para el futuro


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**FECHA**	**DIA**	**3**	**MES**	**1**	**AÑO**	**2025**	**HOJA No**	1	**DE**	

CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**	**CONTRATISTA**	**HACER DE COLOMBIA SAS**
OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.			
INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**

ITEM:	***1-02-03***	***Demolición muro en soga, incluye revoque y/o enchape***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
Muros perimetral			52,00		3,10					161,42
Muros internos			48,00		3,20					153,60
									TOTAL	***315,02***

CROQUIS

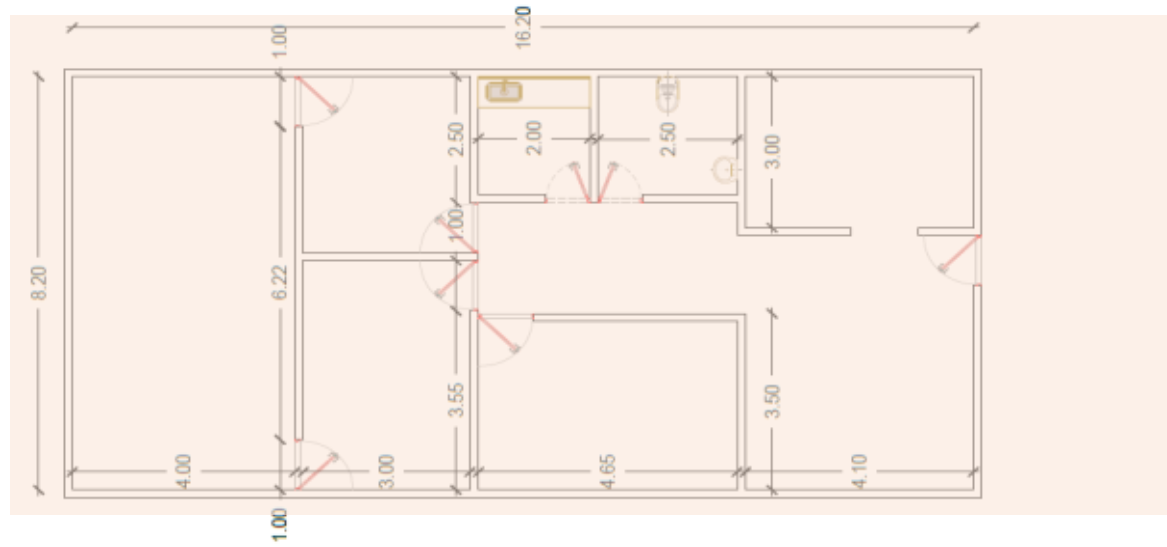

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS **CONTRATISTA**	**EJE GROUP SAS** **INTERVENTORIA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**		**CONTRATISTA**			**HACER DE COLOMBIA SAS**						

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM: ***1-02-06***	***Demolición manual de concreto (Placas y Estructuras Enterradas)***	**UNIDAD:**	*M3*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
Demolicion manual de concreto	Obra		42,000	0,40	0,60					10,10
			44,00	0,40	0,80					14,08
			18,00	0,50	0,80					7,20
			13,00	0,50	0,80					5,20
			21,00	0,50	0,80					8,40
			10,50	0,40	0,80					3,36
										-
						TOTAL				***48,34***

CROQUIS

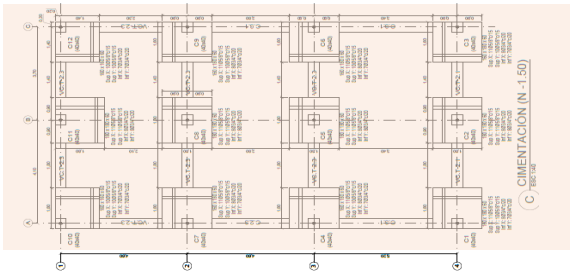

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**			**CONTRATISTA**					**HACER DE COLOMBIA SAS**			

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM: ***1-02-08***	***Demolición losa sobre terreno***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
losa contrapiso	eje A		16,50	2,00						33,00
losa contrapiso	eje C		16,50	2,00						33,00
losa contrapiso	eje 1		16,50	2,00						33,00
losa contrapiso	eje 2		19,56	2,00						39,11
										-
									TOTAL	***138,11***

CROQUIS

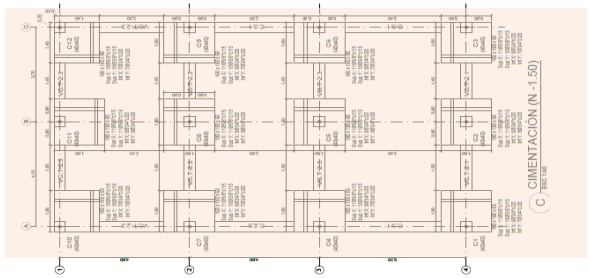

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	


CONTRATO No.	SA-MC-01-2024	CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA SAS

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA
ITEM: 1-02-11	*Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos*	UNIDAD:	*Un*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
sanitario		1,00								1,00
lavamanos		1,00								1,00
									TOTAL	*2,00*

CROQUIS

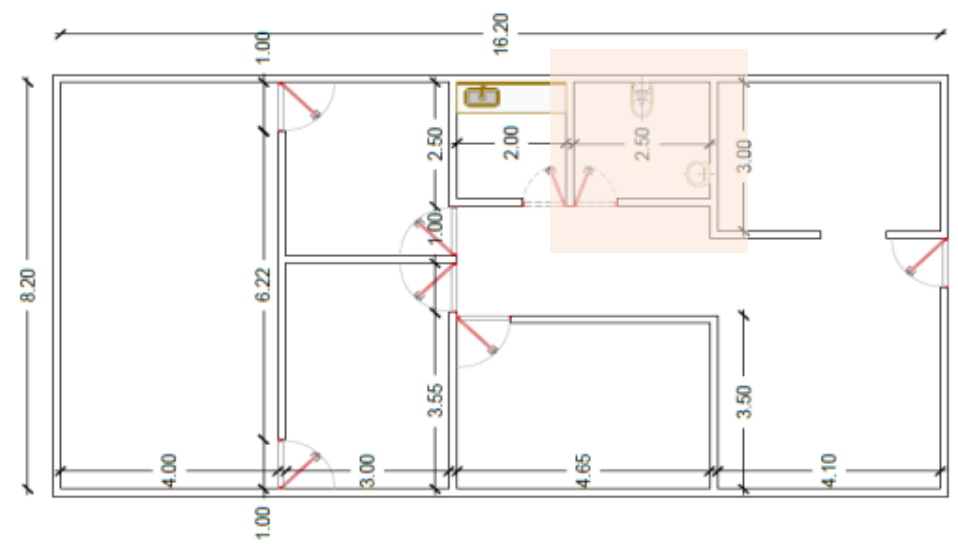

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS **CONTRATISTA**	**EJE GROUP SAS** **INTERVENTORIA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	SA-MC-01-2024		CONTRATISTA						HACER DE COLOMBIA SAS			


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-02-13*	*Desmonte cielo falso*	UNIDAD:	*M2*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
cielo falso en PVC			16,843	8,20						138,11
									TOTAL	*138,11*

CROQUIS

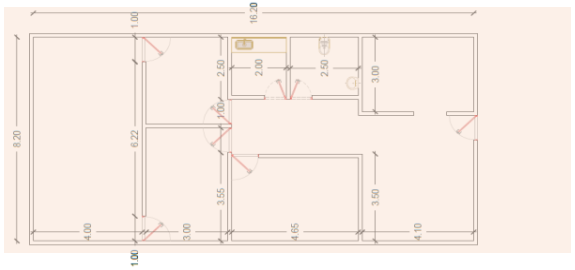

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**		**CONTRATISTA**						**HACER DE COLOMBIA SAS**			

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**
ITEM: ***1-02-17***	***Desmonte de puerta metálicas o de madera, incluye desmonte marco***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
puerta de madera		8,00		1,10	2,40					21,10
puerta metalica		1,00		1,00	2,40					2,40
ventanas		4,00		2,00	1,50					12,00
ventanas interiores		4,00		2,00	1,50					12,00
									TOTAL	***47,50***

CROQUIS

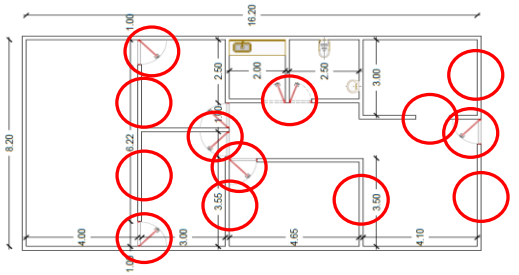

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	**FECHA**	**DIA**	**3**	**MES**	**1**	**AÑO**	**2025**	**HOJA No**	1	**DE**	

CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**	**CONTRATISTA**	**HACER DE COLOMBIA SAS**


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**

ITEM:	***1-02-34***	***Desmonte techo de fibrocemento, incluye desmonte de estructura metálica***	**UNIDAD:**	*M2*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
teja fibro cemento	cubierta		16,843	8,20						138,11
									TOTAL	***138,11***

CROQUIS

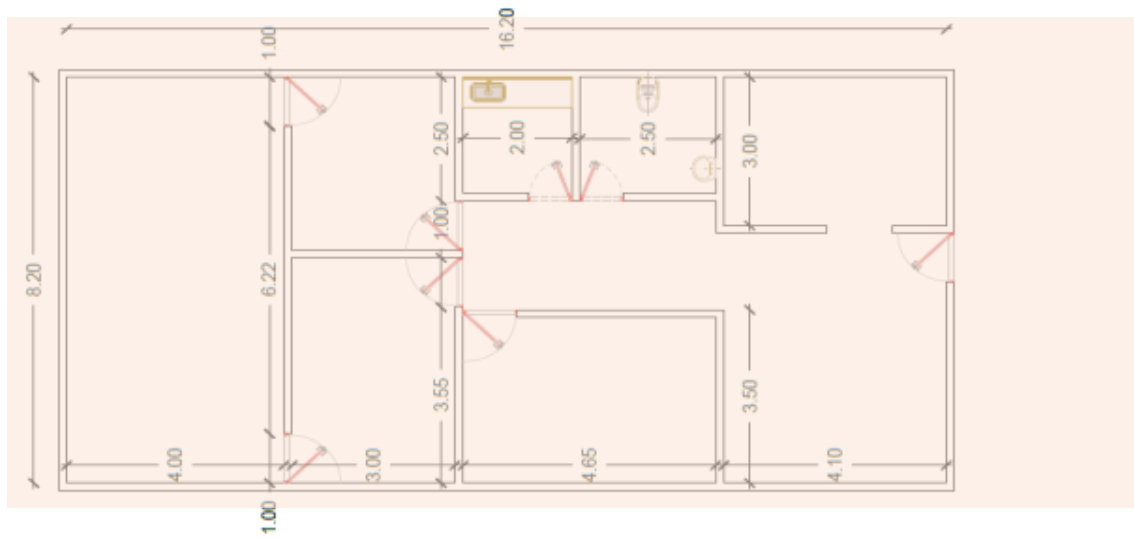

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS **CONTRATISTA**	**EJE GROUP SAS** **INTERVENTORIA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	**SA-MC-01-2024**		**CONTRATISTA**			**HACER DE COLOMBIA SAS**						


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	**EJE GROUP SAS**	**SUPERVISOR**	**IVAN MATURANA CORDOBA**

ITEM:	***1-03-01***	***Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual***	**UNIDAD:**	*M3*

DESCRIPCION	**UBICACIÓN**	**ELEMENTOS LLENOS**				**PESO (KG)**	**VANOS**			**TOTAL**
		CANT	LONGITUD	ANCHO	**ALTO**		**L**	**a**	**h**	
excavacion zapata c-10	A-1	1,00	1,60	1,60	3,12					7,99
excavacion zapata c-11	**B-1**	1,00	1,80	1,80	2,81					9,10
excavacion zapata c-12	C-1	1,00	1,60	1,60	2,25					5,76
excavacion zapata c-7	A-2	1,00	1,60	1,80	3,12					8,99
excavacion zapata c-9	C-2	1,00	1,60	1,80	2,25					6,48
excavacion zapata c-4	A-3	1,00	1,60	1,80	3,12					8,99
excavacion zapata c-6	C-3	1,00	1,60	1,80	2,25					6,48
excavacion zapata c-1	A-4	1,00	1,60	1,80	3,12					8,99
excavacion zapata c-3	C-4	1,00	1,60	1,80	2,25					6,48
excavacion zapata c-5	B-3	1,00	1,60	1,80	2,81					8,09
excavacion zapata c-8	B-2	1,00	1,60	1,80	2,81					8,09
excavacion zapata c-2	B-4	1,00	1,60	1,80	2,81					8,09
										0,00
										0,00
										0,00
									TOTAL	***93,56***

CROQUIS

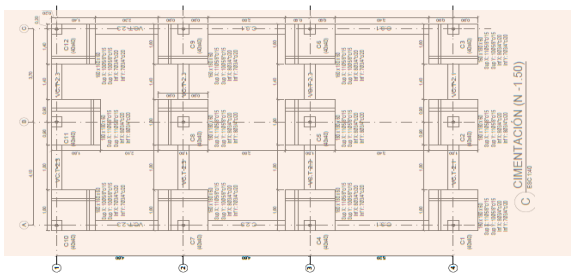

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	
CONTRATO No.	SA-MC-01-2024		CONTRATISTA						HACER DE COLOMBIA SAS			


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-03-07*	*Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual*	UNIDAD:	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
Excavacion en material comun		1,00	16,500	8,20	0,61					82,87
									TOTAL	*82,87*

CROQUIS

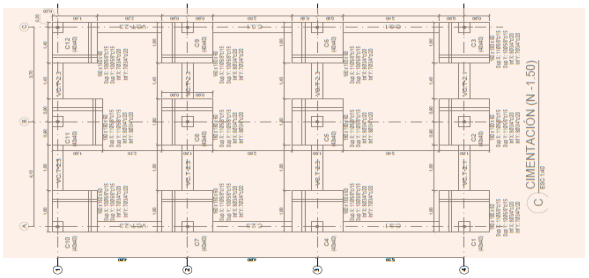

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

CONTRATO No.	SA-MC-01-2024	CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA SAS


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-03-24*	*Lleno compactado con material granular*	UNIDAD:	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
Zapatas C-1, C-3, C-4, C-6, C-7, C-9		6,00	1,800	1,60	0,32					5,53
Zapatas C-2, C-5, C-8, C-11		4,00	1,80	1,80	0,32					4,15
Zapatas C-10, C-12		2,00	1,60	1,60	0,32					1,64
Vigas eje A		3,00	3,60	0,40	0,32					1,38
Vigas eje C		3,00	3,60	0,40	0,32					1,38
Vigas eje 1		1,00	3,20	0,40	0,32					0,41
Vigas eje 2		1,00	3,20	0,40	0,32					0,41
Vigas eje 3		1,00	3,20	0,40	0,32					0,41
Vigas eje 4		1,00	3,20	0,40	0,32					0,41
Vigas eje 5		3,00	3,60	0,40	0,32					1,38
Losa		1,00	16,50	8,20	0,27					36,76
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	*53,86*

CROQUIS

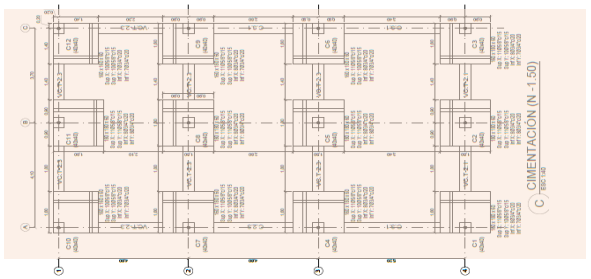

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

HACER DE COLOMBIA
arquitectura para el futuro

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DIA	3	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	1	DE	

CONTRATO No.	SA-MC-01-2024	CONTRATISTA	HACER DE COLOMBIA SAS


OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura las Obras de Ampliación y mejora del Palacio de Justicia de Pueblo Rico - Risaralda.

INTERVENTORIA	EJE GROUP SAS	SUPERVISOR	IVAN MATURANA CORDOBA

ITEM:	*1-03-28*	*Lleno con piedra, incluye transporte*	UNIDAD:	*M3*

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
Zapatas C-1, C-3, C-4, C-6, C-7, C-9		6,00	1,80	1,60	0,40					6,93
Zapatas C-2, C-5, C-8, C-11		4,00	1,80	1,80	0,40					5,18
Zapatas C-10, C-12		2,00	1,60	1,60	0,40					2,05
Vigas eje A		3,00	3,60	0,40	0,40					1,73
Vigas eje B		3,00	3,60	0,40	0,40					1,73
Vigas eje C		3,00	3,60	0,40	0,40					1,73
Vigas eje 1 - 2 - 3 - 4		4,00	3,45	0,40	0,40					2,21
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
									TOTAL	***21,55***

CROQUIS

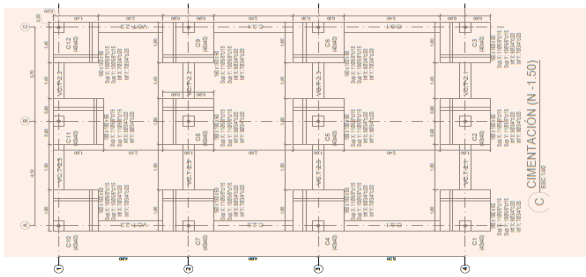

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

HACER DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

EJE GROUP SAS
INTERVENTORIA
