21 / NOV / 2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se dio Cumplimiento a protocolos de Bioseguridad
- Aplicación de pintura de plástico en frio con microesferas (método Llana), se realizaron pruebas de espesor. (> 50 MILS)
- Aplicación de pintura acrílica con microesferas líneas continuas y discontinuas 12 cm según (Norma Invias)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

97

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	22/ NOV /2021	HORARIO	9:00 PM : 4:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X NUBLADO NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y aplicacion manual de pintura de plástico en frio alta duración (metodo Linea)	Carrera 11 (costado oriental) (Parque Santander)	M²	83.91

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Forgon UPR 619	- Pintura Plástica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

98

22/NOV/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Localización y replanteo, durante este proceso se observó que en algunos tramos de vía, se presentaban fisuras grietas, baches y se solicita a la interventoría tener encuenta estas observaciones, para lo cual la interventoría solicito se pasara la observación por escrito y hacer un requerimiento a la entidad contratante para subsanar estos hechos.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

99

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	23 / NOV / 2021	HORARIO	10:00 PM 4:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS X	

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Debido a los fuertes lluvias no se ejecutaron actividades			

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	4		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

105

23 / NOV / 2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Lluvias torrenciales toda la tarde y noche (hasta 3:AM)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	24/ NOV. /2021	HORARIO	8:00 AM — — —

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
					X

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Se presentaron fuertes lluvias No se ejecutaron actividades			

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA			
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Respirador	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☐ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

102

24/NOV./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Debido a las fuertes lluvias presentadas en horas de la tarde y noche no se ejecutaron actividades

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	25/NOV/2021	HORARIO	5:00 PM : 3:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro y aplicacion manual de pintura de plastico en frio alta duracion (Metodo Linea)	Calle 72 cra 15 (Salida Villa de Leiva)	M2	58

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Furgon placa UPR 619	- Pintura Plastico
RESIDENTE DE OBRA	1	- Camioneta Compesio	- Microesferas
PROFESIONAL SISO		- Compresor Aire	
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	3		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS: Tapabocas	X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

104

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	27 / NOV. / 2021	HORARIO	9:00PM: 4:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y aplicación manual de pintura plastica en frio (Incluido Limp.)	Carrera 9 calle 12 (Asmevet)	M2	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Furgon placa UPP 619	- Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Camioneta Compro	- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	N-A X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	N-A X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro		Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

105

27/NOV/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se ejecutaran trabajos en horario nocturno. donde cumplimiento del PMT al igual que los protocolos de Bioseguridad

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

25/NOV./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se realizaron cierres parciales e intermitentes debido al alto tráfico en esta intersección
- Se verificaron espesores de pintura plástica en frío
- Se dió cumplimiento al PMT

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	26/ NOV. /2021	HORARIO	2:00PM : 12:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación manual (Incluido Llana) de pintura de plástico en frio	Calle 72 - Cra 15 (Salida Villa de Leiva)	M2	56.76
- Visita a Fabrica de Señalizacion Vertical			

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Fiergon VPL 619	- Pintura Plástica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Camioneta Campero	- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	NA X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	NA X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

108

26/NOV./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página 2/2

-Terminadas las actividades en algunos tramos de la intersección se procede a abrir vía en el otro sentido y así no cerrar totalmente el flujo vehicular en esta zona

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

109

212 0613

MUNICIPIO DE TUNJA	BITÁCORA DE OBRA		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	29/NOV./2021	HORARIO	9:00 PM - 4:30 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de pintura plástica en frio (metodo Lloyd).	Carrera 9 calle 14	M²	32

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			- Pintura plástica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro		Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

110

29/NOV./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página. 2/2

- Se dio cumplimiento al PMT y protocolos de bioseguridad
- Una vez realizado el recorrido a diferentes puntos por intervenir en la zona histórica, evidenciamos nuevamente el mal estado en que se encuentran las vías a intervenir en la Carrera 9 calle 25 y Carrera 9 calle 24 y solicitamos se tomen medidas para subsanar o corregir estas falencias, Lo anterior se hace necesario para así garantizar la calidad y estabilidad de las obras

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

111

0615

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	30 / NOV. / 2021	HORARIO	9:00PM - 5:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frío (Incluido Llana)		ML	

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			- Pintura plástica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Respiradores X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa			Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera			Cerrar la via	X
Cinta de peligro	X	60 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

112

215

30/NOV/2020

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se da cumplimiento a protocolos de bioseguridad
- La interventoría verifica los elementos de protección personal de todos los trabajadores
- Se hace inspección de equipos y herramientas.
- Se realiza visita a bodega donde se están construyendo las señales verticales, se verifica el avance y la calidad de los elementos utilizados

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

115

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	1 / DIC / 2021	HORARIO	10:00 PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicacion de pintura plastica en frio (Metodo Manual)	Cra 9 - Calle 29	M²	20
- Replanteo y cambeo de señalizacion horizontal	Av Colon - Cra 11	M²	30

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	UBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Furgon OPP 619	- Pintura Plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro	30ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

119

1/DIC./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página 2/2

- Se hace complimiento de protocolos de bioseguridad
- En la avenida calle con Carrera 11 Intersección, se adelantan trabajos de localización y replanteo (Embrado) ya que estar via presenta un alto flujo vehicular y no se puede cerrar parcialmente un tramo de la Avenida calle.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

115

0619

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	2 / DIC. / 2021	HORARIO	10:00PM - 4:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio (cruces 12cm)	Carrera 9a. Calle 29	M²	22
	Av. Coka - Carrera 11	M²	32

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Camion furgón placa VFR614	- Pintura plastico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	30 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

116

2/12/0620

2/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0621

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	3 / DIC / 2021	HORARIO	10:00PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro Aplicación de pintura plástica (Pieto de Hara) con microesferas en frío	Av. Oriental - calle 24	M2	40

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Furgón VIK 619	- Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Reflectivos X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50 Ml	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

118

3/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	4 DIC 2021	**HORARIO**	8:00PM - 5:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Aplicación grafiti plástica en fino con microesfera (marcado línea)	Calle 9 Calle 11	M2	20
	Carrera Calle 23 (marque pinzón)	M2	30

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA			
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de vía cerrada
Barrera de madera		Cerrar la vía
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

120

4/DIC/2020

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

121

0625

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	29/ MARZO /2022	HORARIO	8:00 PM: - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura para Imprimante	- Sector los Quintos	M²	150
- Suministro e instalación de Señales Verticales	- Sector los Quintos	UN	10
- Cerk de plaro en adoquin	- Frente Barrio Los Quintos	ML	132
- Suministro y aplicación de pintura plástica	-	M²	80

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura Plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		-
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	4		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	—	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	—	
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada X
Barrera de madera	—	Cerrar la via X
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

29/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	30 / Marzo / 2022	**HORARIO**	8:00AM - 12:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura para imprimante	- Los Quintas	M^2	60
- Suministro e instalación de Señales Verticales	- Los Quintas	UN	10
- Excavación manual en material común	- Los Quintas	M^3	3,30
- Suministro y aplicación de pintura plástica	- Los Quintas	M^2	100

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo tipo Furgon	- Pintura para imprimante
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Mortero
PROFESIONAL SISO	—	—	—
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	4		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

30/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	31 / MARZO / 2022	HORARIO	8:00 AM - 12:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura para imprimante	- Sector los Quintas	ML	728
	- Resaltos Av. Universitaria Loma	M2	100
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio	- Sector los Quintas	ML	728
	- Resaltos	M2	100
- Vaciado de concreto para sardinel, in-sito	- Puente los Quintas	M2	164
	- Sector los Quintas	ML	66

OK

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgón	- Pintura para Imprimante
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de aire	- Pintura plástica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		- Morteio
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	—	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	—	
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

31 / MARZO / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	1/Abril/2022			HORARIO	8:00 AM - 4:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e Instalación de Señales Verticales	- Resaltos Colegio Inem Calle 24 entre Kr 15 y 18	UN	3
- Suministro y aplicación de Pintura plastica en frio	- Resaltos Av. Universit. Colegio Inem - calle 24 Kr 15	M²	80

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Mangueras
PROFESIONAL SISO	—		- Mortero
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada X
Barrera de madera	—	Cerrar la via X
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

1 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	21 Abril 2022	HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS X

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Debido a fuertes lluvias presentado en horas del dia - tarde y noche no fue posible efectuar Actividades			

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	—		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	—	GAFAS	—	—
BOTAS	—	TAPA OIDOS	—	—
GUANTES		OTROS	TAPABOCAS —	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

2/ Abril/ 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA ~~RESIDENTE~~ INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	4 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00 AM - 4:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS X	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de Imprimante (Pintura)	- Colegio Los Angeles	M2	124.82
- Aplicación de pintura plástica con llana	- Colegio Los Angeles	M2	124.82

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgón	- Pintura plástico
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Pintura para Imprimante
PROFESIONAL SISO	—		- Micro esferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada X
Barrera de madera	—	Cerrar la via X
Cinta de peligro	20 ML	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

4 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	5 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00 PM – 4:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Suministro y aplicación de pintura para Imprimante	-Kr 11 - Av colón calle 10	M2	94.24
-Suministro y aplicación de pintura plástico en frío	-Kr 11 - Av Colón calle 10	M2	94.24

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	-Vehículo Tipo Furgon	-Pintura para Imprimante
RESIDENTE DE OBRA	1	-Compresor Aire	-Pintura plástico
PROFESIONAL SISO	—		-Microesfera
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	30ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

5/Abril/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	6/Abril/2022	**HORARIO**	8:00 PM - 4:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de pintura para imprimante	- K 11 calle 16	M²	46,50
- Suministro y aplicación de pintura plastica en frio con microesferas	- K 11 calle 16	M²	46,50

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura para imprimante
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Pintura Plastica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	4		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

6 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	7 / Abril / 202			**HORARIO**	8:00 PM - 5:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Pintura acrilica para Imprimante	K1 9 calle 18	M2	46.14
- Suministro y aplicación de pintura plastica en frio con microesferas	K1 9 calle 21	M2	14.18
	K1 9 calle 18	M2	46.14
	K1 9 calle 21	M2	14.18

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura para Imp. acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	- Pintura plastica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	30 M	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

7 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	8 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00 PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura acrilica para demarcación	- Calle 22 Kr 12	M^2	39.75
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio con microesferas	Calle 22 Kr 12	M^2	39.75

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Pintura Plástica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	3		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	30ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

8/ Abril /2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	BITÁCORA DE OBRA		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	9 / Abril / 2022			HORARIO	8:00 PM - 4:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Pintura acrílica para Demarcación	- Resalto Av. Universitaria	M2	125,27
- Pintura plástica en frio con microesferas	- K. 15 N° 9a-59 y 109		
	- Resalto Av. Universitaria		
	- K. 15 N° 9a-59 y 109	M2	125.27

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura Acrilico
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	- Pintura Plastico
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	2	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	1	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

04 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

- Se autoriza por parte de la supervisión la aplicación de pintura para empalmento y pintura plástica para resaltos en la Av Universitaria Y. 15 con calle 19A y frente a Univ. Antonio Nariño

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	11 / Abril / 2022	HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Suministro e Instalación de Señales Verticales	-Hospital San Antonio SR-02 SR-30 SR-16 SR-46A SR-29 SR-42 SR-01	UN	26

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1	-	-Mortero
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

11/Abril/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Una vez verificados los diseños de Señalización Vertical entregados por la supervisión, se efectuan las visitas y se verifica la necesidad de cada una de ellas, constatando que algunas señales no son requeridas, ya que no se han construido los resaltos, por lo tanto no se procede a su instalación.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	12 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00AM - 5:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Retiro de Señales Verticales	- Centro Histórico	UN	20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**SUMINISTRO DE MATERIALES**
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	-	-	- Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	-		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	-	informacion de via cerrada	-
Barrera de madera	-	Cerrar la via	-
Cinta de peligro	-	Canalizacion de obras	-

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

12 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Por Solicitud de la supervisión del contrato, se realiza el retiro de las señales Verticales, ubicadas en el centro histórico, y zonas dispersas.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	13 / Abril / 2022		**HORARIO**	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de Señales Verticales	Barrio Santa Ines SR-08 SR-10 SR-01 SR-06	UN	9
- Suministro e Instalación de estoperoles	- Barrio San Rafael - Normal Femenino (Via Tunja-Arcabuco)	UN UN	200 200

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgón	- Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1	- Taladro Percutor	- Anclaje
PROFESIONAL SISO	—		- Epóxico
INGENIERO AUXILIAR	—		- Estoperoles
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	20 ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	13 / Abril / 2022		**HORARIO**	9:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de Señales Verticales	Barrio Santa Ines SR-08 SR-10 SR-01 SR-06	UN	9
- Suministro e instalación de estoperoles	- Barrio San Rafael - Normal Fernando (Via Tunja-Arcabuco)	UN UN	200 200

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1	- Taladro Percutor	- Anclajes
PROFESIONAL SISO	—		- Epoxico
INGENIERO AUXILIAR	—		- Estoperoles
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	20 ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

13 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	14 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Suministro e Instalación de Señalización Vertical	-Costo Histórico SR-29A SR-28 SR-01 SR-01/SR-03 SR-38 SR-40 SR-06 SR-06/SR-01	UN	11

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**SUMINISTRO DE MATERIALES**
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		-Montero
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

14 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	15 / Abril / 2022		**HORARIO**	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e Instalación de señales Verticales	- Glorieta Gobernador SP-46B SP-95 SP-96A	UND	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**SUMINISTRO DE MATERIALES**
CARGO	CANTIDAD		- Mortero
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

15 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	16 / Abril / 2021	**HORARIO**	8:00 AM - 5:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO / NUBLADO / NUBLADO LLUVIA LEVES / LLUVIAS MODERADAS X / LLUVIAS INTENSAS		

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Suministro e Instalación de Señales Verticales	-Glorieta Cabecera Sur SR-02 SP124-SR-30 SP-46A	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		-Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

16 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Debido a la presencia de fuertes lluvias presentadas en horas de la noche anteriores y durante el Dia, no se efectuaron actividades de Aplicación de pinturas plásticas y acrílica.
- Solo se realizaron actividades en hojas de lo tarde (Señalización Vertical)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	BITÁCORA DE OBRA		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	18 / Abril / 2022	HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de estoperoles	Av. Colon Calle 13	Un	164

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgón	- Epóxico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Anclajes
PROFESIONAL SISO	—		- Estoperoles
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	4		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

18 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	18 / Abril / 2022	HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de estoperoles	Av. Colon Calle 15	Un	164

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgón	- Epóxico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Anclajes
PROFESIONAL SISO	—		- Estoperoles
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	4		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA

BITÁCORA DE OBRA

2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	19/Abril/2	HORARIO	

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
				X	X

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Suministro e instalación de estoperoles	Calle 4 Kr 14 a 16	UN	198

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA

CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	—
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SISO	—
INGENIERO AUXILIAR	—
MAESTRO GENERAL	—
OFICIALES	1
AYUDANTES	2
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
OTRO	

MAQUINARIA Y EQUIPO

- Vehículo Tipo Furgon

SUMINISTRO DE MATERIALES

- Anclajes
- Estoperoles
- Epoxico

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	—	
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

19 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	20 / Abril / 2022	HORARIO	12:00M - 4:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS X

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e Instalación de estoperoles	- Puente Santa Inés	UN	50

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgon	- Estoperoles
RESIDENTE DE OBRA	1		- Anclajes
PROFESIONAL SISO	—		- Epóxicos
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO ____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	2	Informacion de via cerrada
Barrera de madera	2	Cerrar la via
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

20 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA

BITÁCORA DE OBRA

2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	23 / Abril / 2022	HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS X

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Pétiro de Señalización Vertical	- Cloneto Contenedor	UN	6

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

23 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde y noche

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	25 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00AM - 5:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO / NUBLADO / NUBLADO LLUVIA LEVES / LLUVIAS MODERADAS / LLUVIAS INTENSAS X		

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Debido a fuertes lluvias, no se ejecutaron actividades el día hoy	-	-	-

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	-		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	-		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO		GAFAS		
BOTAS		TAPA OIDOS		
GUANTES		OTROS	TAPABOCAS	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		informacion de via cerrada
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☐ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

25 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 2/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	26 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00 AM – 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro & Señalización Vertical	Centro Histórico SR-28 SR-01 SR-28A CC.UNIVA -SITIO DISPERSO (Rotos)	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**SUMINISTRO DE MATERIALES**
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		- Mortero
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	—	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	—	
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

26/Abril/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- La interventoría solicita se incluyan cuadrillas para las actividades de Señalización horizontal para el Barrio el Consuelo

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	27 / Abril / 2020		**HORARIO**	8:00 AM - 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicacion de pintura acrilica para Imprimacion	- Barrio el Consuelo	M²	100

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgón	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	4		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	—	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	—	
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50Ml	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

27 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Una vez entregado el diseño definitivo para la instalación de la Señalización horizontal del Sector Barrio el Consuelo, se procedio a efectuar su aplicación en horas de la noche.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	28 / Abril / 2021			HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Suministro y aplicación de pintura Acrílica para Impalmante	-Barrio el Consuelo	M2	100
-Suministro y aplicación de pintura plástica en fino Microesfera	-Barrio el Consuelo	M2	60

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	-Vehiculo Tipo Furgon	-Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	-Compresor Aire	-Pintura plastico
PROFESIONAL SISO	—		-Microesfera
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50M	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

28 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	29 / Abril / 2022	**HORARIO**	8:00 PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de Pintura Acrilica para imprimante	- Barrio el Consuelo	M²	100
- Suministro y aplicación de pintura plastica en frio con microesferas	- Barrio el Consuelo	M²	80

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	-
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada X
Barrera de madera	—	Cerrar la via
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

29/Abril/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	30 / Abril / 2022	HORARIO	8:00 PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
			X		

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura Acrílica para Demarcación	- Barrio el Consuelo	M2	18,67
- Suministro y aplicación de Pintura plastica en frio con microesferas	- Barrio el Consuelo	M2	80

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgón	- Pintura Acrílica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	- Pintura Plástica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

30 / Abril / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."					Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	2/MAYO/2022			**HORARIO**	8:00 PM - 5:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio con microesferas	- Barrio el Consuelo	M²	60
- Suministro de pintura Acrilica para Imprimante	- Green Hills Glorieta	M²	65.41

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura Plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		- Pintura Acrilico
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada X
Barrera de madera	—	Cerrar la via X
Cinta de peligro	50 M2	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

2 / MAYO / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1063-2021
FECHA	31 Mayo 2022	HORARIO	8:00 AM - 4:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA:

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e Instalación de pintura plastica en frio	- Puente el Cercado	M²	88.67
- Suministro y aplicación de pintura Acrilica para Impresiones	- Glorieta Green Hills	M²	50
- Suministro Pintura Plastico en frio	- Glorieta Green Hills	M²	80

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCION DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	30M	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

3/MAYO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se presentaron fuertes lluvias en horas de tarde

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	4 / MAYO / 2022		HORARIO	8:00 AM — 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación	Glorieta Green Hills	M2	100
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frío	Glorieta Green Hills	M2	50
-			

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo tipo Furgón	- Pintura Acrílica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Pintura Plástica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

4/MAYO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	5 / MAYO / 2022	HORARIO	8:00 AM — 3:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales Longitudinale	- Via Tunja - Toca	ML	4317
- Suministro y aplicación de pintura acrílica	- Via Tunja - Toca	ML	4317
- Suministro e instalación de Dispositivo	- El Cercado Altos II Tactonel	UF UN	20 20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgo	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	- Pintura plastica
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa	—	Informacion de via cerrada X
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

5/MAYO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Una vez verificado el estado actual de algunos tramos de vía. (Tunja - Arcabuco), se solicita por parte de la interventoría se aplique imprimante en pintura acrílica y se proceda a pintar.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	6/ MAYO /2022	HORARIO	8:00AM - 3:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
					X

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio con microesfera	- Glorieta Casa Hilo	M2	135,91
- Suministro e instalación de Dispositivos	- Ramal el convento		
	- Hitos	UN	17
	- Estoperoles	UN	115
	- Tachones	UN	120

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgón	- Pintura Plástico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		-
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	—		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

6/MAYO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA ~~RESIDENTE~~ INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	17 / MAYO / 2022	HORARIO	8:00 PM - 4:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e instalación de pintura acrilica para Tomprmarket	- Glorieta Gobernador	M²	60

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	UBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD	- Vehiculo Hpo Furgon	- Pintura Acrilica
DIRECTOR DE OBRA	—	- Compresor de Aire	-
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla Informativa	—	Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50 Ml	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

9/MAY0/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	9 / MAYO / 2022	HORARIO	9:00 PM - 3:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
			X		

FRENTE DE OBRA:

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura Acrilica para Tachuelas	- Glorieta Gobernador	M²	96,48
- Suministro y aplicación de Pintura plastica en Franjas con microesferas	- Glorieta Gobernador	M²	50

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgon	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor de Aire	
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACION UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50M	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

9/MAYO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se solicita por parte de la supervisión el tapado de algunas pastillas y demarcaciones con imprimante en la zona de la glorieta del gobernador

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2022
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	10/MAYO/2022		HORARIO	10:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio, con microesferas	Glorieta Gobernador	M2	40
- Aplicación de bandas Reductoras de Velocidad	Glorieta Gobernador	M2	18

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		- Grava 3/8"
INGENIERO AUXILIAR	—		- Epoxico para bandas
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	TAPABOCAS X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	SOM	Canalizacion de obras	X

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

10 /MAYO /2017

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	4 DIC 2021	HORARIO	8:00PM - 5:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Aplicación pintura plástica en frio	Cra 9 Calle 11	M2	20
Con microesferas (metodo llana)	Cra 9 calle 23 (Parque plazón)	M2	30

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPUMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA			
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES			
AYUDANTES			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

120
179

4/DIC/2020

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página. 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

121
180

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	5 / DIC / 2021	HORARIO	8:00PM ← 5:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de pintura plástica en frio (método Hand)	Cra 9 calle 23	M²	28,27
	Cra 9 calle 22	M²	19,86

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Furgon URT 619	- pintura plástica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0700

5/DK/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página 4/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	6 / DIC. / 2021			HORARIO	8:00PM A 4:00AM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación manual de pintura plástica (Método Hand) en frío	Cra 9 con Calle 29	M2	30.00

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NO SE PRESENTARON				

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	-	- Furgon ORP 619	- Pintura Plástica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas para marcas viales
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Información de vía cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la vía	Parcialmente
Cinta de peligro	60 ML	Canalizacion de obras	-

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

6/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- La Interventoria solicita, se alleguen los pagos de soportes de pago de las planillas del personal que labora en obra, lo anterior correspondiente al mes de Diciembre.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1035-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	7 / DIC. / 2021	HORARIO	8:00 PM - 2:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio (método Línea) y microesferas para marcas viales	Cra 9 calle 29	M2	15.89
- Pintura acrilica con microesferas Línea costado Derecho	Glorieta Mercado	ML	200

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	-	- Vehiculo Tipo Furgon ORP 619	- Pintura plastica inclinterrodilato
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas para marcas viales
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	-		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro	50 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

7/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

- Culminados los trabajos en esta intersección, el contratista hace la solicitud de la entrega de los Diseños definitivos de Señalización Vertical y horizontal para dar alcance a las cantidades contractuales.
- Para lo anterior la interventoría informa que ese tema se tocará en próximo comité técnico.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

186

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1035-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	8 / DIC / 2021	HORARIO	9:00PM – 3:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES X	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica con pto método Hand	Carrera 9 con Calle 11	M2	48.20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehiculo Tipo Furgon URP 619	- Pintura plastica bajo duración
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		- Microesferas para marcas viales
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	80 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

187

8/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- La interventoría solicita el sitio de acopio de los materiales o tarros utilizados que sobran o desocupados, del proyecto
- El contratista informa que estos tarros provenientes de la pintura utilizada son llevados al acopio o bodega dispuesta por el contratista, para posteriormente ser llevados y dispuestos a sitios o acopio que cumplen con los mismos condiciones.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	9/DIC./2021	HORARIO	

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Aplicación de pintura plástica en frio, método manual	Av Cobo Mesa Calle 19	M²	45.90
	Carrera 8 con Calle 18	M²	24.60
- Algunas Señales Pintura Plastica Acrilica	Carrera 8 con Calle 20	M²	8.00

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	Vehiculo Furgón ORP 018	- Pintura Plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas para marcas viales
PROFESIONAL SISO	—		- Pintura acrilica con microesferas
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	X	10ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0708

9/DIC/2004

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- En la intersección de la Carrera 9 con calle 20, se aplicó pintura plástica en frio en algunas señales, para las señales faltantes se solicito la aprobación por parte de la interventoría y supervisor de la alcaldía de aplicar pintura acrílica, lo anterior debido al mal estado en que se encuentran algunas franjas de la vía.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0709

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	10 / DIC / 2021	HORARIO	9:00 PM - 3:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e Instalación de señales reglamentarias 60x60cm	Vial Tunja - Hatobo	UN	30

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	-	- Vehículo Tipo Furgón OBF 618	- Soportes Verticales
RESIDENTE DE OBRA	1		- Hormigón o Concreto
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla Informativa	-	Informacion de via cerrada	-
Barrera de madera	-	Cerrar la via	X
Cinta de peligro	-	Canalizacion de obras	-

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

10/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

- Una Vez Verificados los sitios de instalación por parte de la interventoría, se procede a su instalación
- Igualmente se verifica y aprueba el tipo de Señal Vertical a instalar por parte de la interventoría, lo anterior, de acuerdo a los planos finales de Diseño entregados por el Municipio

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

192

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	12/DIC/2021	HORARIO	8:00PM - 12:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro y aplicación de pintura plástica en frio	- Carrera 8 calle 19	M²	14,00
	- Carrera 8 calle 23	M²	13,40
	- Carrera 12 calle 15	M²	62,60

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehículo Furgón URP 610	- Pintura plástico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas para Marcas viales
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	-		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro	100 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

193

11/DIC./2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0713

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	13 / DIC / 2021	HORARIO	9:00 AM — 4:30 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
		X NOCHE			

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicacion de pintura Acrilica	Kr 8 Calle 25	M2	76
	Kr 9 Calle 19	M2	29.30
- Aplicación de pintura plastica (Hueso)	Kr 11 Calle 17	M2	32.20
	Kr 7 Calle 20	M2	19.45

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0714

13/DIC/2024

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- En algunos puntos o tramos se realizaron o aplicaron pintura acrílica, lo anterior debido al mal estado en que se encuentran los tramos en estos lugares, la firma interventora autoriza estos trabajos, en común acuerdo con el contratista.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	14 / DIC / 2021	HORARIO	9:00PM - 4:30AM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO / NUBLADO X NOCHE / NUBLADO LLUVIA LEVES / LLUVIAS MODERADAS / LLUVIAS INTENSAS		

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de pintura plástica en frío	Kr 10 calle 21A	M2	16.63
	Colegio Gabriel Betancourt	M2	22.00
- Instalación de Señales Verticales	Calle 3 entre 11 y 14	UN	15
	Loma - Floresta	UN	03

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA — SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		- Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas para vías
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES — SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0716

14/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

En Visita conjunta Interventoria y contratista, en la glorieta maldonado Sector Hypotino se dejaron las siguientes actividades:

- Retiro de 5 Tachones
- Suministro e instalación de 6 Hitos
- Suministro e instalación de 10 Tachones

x Avenida Maldonado calle 25 Intersección (MR KING)

- Suministro e instalacion 22 Tachones
- Suministro e Instalación 8 hitos

x Carrera 9 calle 25 (Salesiano)

- Suministro e Instalación de 16 Tachones
- Suministro e Instalación de 18 hitos
- Retiro de 12 hitos

x Carrera 8 calle 25 (Salesiano 2)

- Retiro de 12 Hitos
- Suministro e instalación 12 Hitos
- Suministro e Instalacion 2 Tachones

x Carrera 9 calle 23 (Pinzón)

- Suministro e Instalación de 3 Tachones

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

198

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 2/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	15 / DIC / 2021	HORARIO	9:00 PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO Noche	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Kr 7 calle 17 Aplicación de pintura acrilica	Kr 7 calle 17	M²	14.00
- Retiro de tachones e hitos	Kr 8 calle 25	UN	12
	Kr 9 calle 25	UN	15

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1		- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	ROLL	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se autoriza la aplicación de pintura acrilica en la cebra peatonal ubicada en la carrera 7 con calle 17, igualmente las flechas

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

199

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página:

-Se autoriza el retiro de los tachones e hitos que se encuentran deteriorados y se autoriza la instalación de Nuevos Unidades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

200

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página:

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1035-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	16 / DIC / 2021	HORARIO	9:00PM - 4:30PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Demarcación horizontal (Delimitación y pintes)	Calle 3 entre 11 y 14	Mt	300
- Instalación de Señales Verticales	Vía Toria Arriba	UN	10
	Calle 3 entre 11 y 14	UN	05
	20 Floridas	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	-	- Vehículo tipo furgon	- Pintura plastica y
RESIDENTE DE OBRA	1		- Pintura Acrilica
PROFESIONAL SISO	-		
INGENIERO AUXILIAR	-		
MAESTRO GENERAL	-		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	-		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

16/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

- Se Inician actividades de demarcación de líneas continuas y discontinuas, para luego aplicar la pintura acrílica.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	17/DIC/2021	HORARIO	9:00 PM - 4:30 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO NOCHE X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-Señalizacion Vertical Instalacion	Calle 3 entre 11 y 14	UN	4
	La Florida	UN	25
	Teresa Arambuco Inicio mas Vias - delineado	UN	9

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehiculo Turbon UPG 619	- Señales Metalicas
RESIDENTE DE OBRA			- Mezcla o concreto
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	-		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro	20 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

19/DIC

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

Una vez efectuada la visita de reconocimiento se procede a la instalación de las señales verticales

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0723

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 2/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021	
FECHA	18 / DIC / 2021	HORARIO	9:00 PM - 4:00 AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS / LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Aplicación de pintura plástica en frio Señales horizontales peatonal	Calle 3 entre 11 y 12 3 Pontes Varias	M²	60
- Señalización Vertical	Diferentes puntos	UN	20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		- Vehiculo Furgon OPB 619	- Pintura plástico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas para marcas viales
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	
Cinta de peligro	30 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

205

Página: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realiza recorrido por todos los puntos o intersecciones intervenidas y se termina de ejecutar las señales faltantes en estas fichas.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

206

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	20 / DIC / 2021	HORARIO	9:00PM - 5:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación de pintura plástica en frio	Barrio La planada	M²	80
- Aplicación de pintura Acrilica	Sector la Esperanza y Saleciano	M²	120

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa		informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro	20ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

207

20/DIC/2017

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- Nuevamente se continuan con visitas a intersecciones intervenidas y se realizan las aplicaciones de pintura faltantes
- La interventoria Verifica la calidad y especificación de los trabajos y materiales suministrados a la fecha.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0727

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	21 / DIC. / 2021	HORARIO	8:30 PM - 3:30 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Aplicación pintura plástica en frio	Varios Puntos	M2	300
- Instalación de Tachones	Carrera 9 Calle 25	UN	25
	Carrera 9 Calle 25	UN	16
- Instalación de hitos	Carrera 9 Calle 29	UN	18
	Carrera 9 calle 23	UN	18

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	- Vehiculo Forgon VPE 619	- hitos
RESIDENTE DE OBRA	1		- Tachones
PROFESIONAL SISO			- Pintura
INGENIERO AUXILIAR			- Microesferas
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	
Cinta de peligro	800 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0728

21/DIC/2009

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0729

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	22/DIC/2021	HORARIO	8:30 AM – 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
		NOCHE			

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Instalacion de Tachones	Glorieta Matarredo	UN	10
	Kr 8 calle 25	UN	12
	Kr 9 calle 23	UN	3
Instalacion de hitos	Glorieta Matarredo	UN	6
	Kr 8 calle 25	UN	2
Aplicacion de pintura antideslizante	Varios puntos	M2	70

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	50 ML	Canalizacion de obras	X

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0730

22/DIC/2024

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	23 / DIC / 2021	HORARIO	8:30 PM - 4:30AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Señalización Vertical	Cl 14 - calle 21 a 6	UN	16
- Pintura Acrilica aplicación	Vanos peatonal o intersecciones	M²	89
- Pintura Acrilica aplicación	calle 3 entre 11 y 14	ML	240

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Vehiculo Furgon UPR 619	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1		- Pintura Plastica
PROFESIONAL SISO			- Microesferas
INGENIERO AUXILIAR			- Mortero para Señales Verticales
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa		Informacion de via cerrada	X
Barrera de madera		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	160 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

213

23/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	24 / DIC. / 2021	HORARIO	8:00 AM. - 3:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS
	X				

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Demarcación Lineal - lineas continuas y discontinuas (Rombo)	Vía Tunja - Aeropuerto	ML	3200
		ML	3200
- Fabricación Señalización Vertical		UN	30

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Vehiculo Furgon OPI 269	- Pintura para postes
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	8		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

215

24/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

* Se realizan actividades de localizacion - replanteo y punteo de la demarcación de lineas (continuas) y discontinuas en la via Tunja - Arcabuco.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0735

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."	Página:	1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	27 / DIC / 2021	HORARIO	2:00PM — 10:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación de pintura acrilica con microesferas Lineas continuas	Via Toca - Arcabuco	ML	2300

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	Vehiculo Furgon UPR 619	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	8		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

27/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se retoman actividades de aplicación de pintura acrílica con microesferas, Líneas Continuas y discontinuas en 2 tramos de la vía Tunja - Arcabuco

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0737

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	28 / DIC / 2021	HORARIO	8:00PM - 4:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Actividades de Aplicación de pintura plástica Barrio los Florida	Barrio los Florida	M²	20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA		Vehiculo Furgon UPR 614	- Pintura plástico
RESIDENTE DE OBRA	1		- Microesferas
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa		Informacion de via cerrada X
Barrera de madera		Cerrar la via X
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0738

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS	Página:

28/DIC/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Se realizan actividades en el Barrio la Florida, se deja constancia que la comunidad interrumpio las actividades programadas a las 2:00PM, por el motivo de estar inconformes con los cambios del flujo vehicular diseñado y solicito servicio con funcionarios de la Alcaldia de Tunja.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	29/ DIC /2021	HORARIO	3:00 PM:- 1200 M

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Instalación de Señalización Vertical	calle 3 entre 11 y 9	UN	14

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA			- Montaje postes anclaje de Señales
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	13		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa		Informacion de via cerrada
Barrera de madera		Cerrar la via
Cinta de peligro		Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0741

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página:

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

223

29/DIC

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

- El contratista informa que por ser epoca decembrina los proveedores de insumos estan incumpliendo con los suministros y se puede presentar atrasos o inconvenientes de rendimiento con los temas de Microesferas y Papel 3M.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

224

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	5 / Enero / 2022	**HORARIO**	8:00 AM – 5:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
*Suministro e Instalación de Señales Verticales	Señales Dispersas SP-25A	UN	25

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	*Vehiculo tipo furgon	* Mortero (Grava - Arena Cemento)
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

100
260744

5/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* El contratista de obra deja constancia que en algunos sitios donde se estan instalando las señales verticales (SP-25A), los propietarios de las viviendas no estan permitiendo su instalación, argumentando que el anden es de ellos y no dejan, por lo cual amenazan a los trabajadores

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

~~FIRMA RESIDENTE~~ INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	6 / Enero / 2022	**HORARIO**	7:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señales verticales	* Calles Barrio Concreto	UN	20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehiculo tipo Furgon	Mortero (Grava - Arena - Cemento)
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	2		
AYUDANTES	3		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

6/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 2/2

*

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."	Página:	1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	7 / Enero / 2022	**HORARIO**	6:00PM — 3:00A

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y aplicación e instalación de tachones e hitos	*Cra 8 calle 25	UN	15 HITOS
	*Barrio las Quintas	UN	15 HITOS
		UN	30 TACHONES
		UN	70 TACHONES

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	* Vehiculo tipo Furgon	* Tachones
RESIDENTE DE OBRA	1		* hitos
PROFESIONAL SISO	—		* Elementos de Sello
INGENIERO AUXILIAR	—		* Anclajes
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	30ML	Canalizacion de obras	SI

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

7/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 1/2

* En el sector del Barrio los quintos, se verifica el estado actual de la vía (vía en adoquín) y se agrueba sobre esta vía la instalación de Hitos - Tachas y Tachones segun Diseño

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página:
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	8 / Enero / 2022	**HORARIO**	9:00 AM – 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señales Verticales	(Tunja - Arcabuco)	UN	5

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehículo Camioneta	* Grava - Arena - Cemento
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	1		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

8/ Enero /2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	10 / Enero / 2022	**HORARIO**	7:00 AM - 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Instalación de señales verticales	DISPERSOS	UN	20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		Grava - Arena - Cemento
DIRECTOR DE OBRA	X 1		
RESIDENTE DE OBRA	X 1		
PROFESIONAL SISO			
INGENIERO AUXILIAR			
MAESTRO GENERAL			
OFICIALES	1		
AYUDANTES	0		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	X1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

10/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Una vez Verificados los puntos o sitios de instalación de las señales en ~~Butgoires~~ Bogotá se realiza el proceso y se instalan Según lo acordado.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	11 / enero / 2020		**HORARIO**	7:00 AM – 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señales verticales	* Calle 32 entre Carrera 11 a 19 Barrio la Esperanza	UN	15

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		Grava - Arena - Cemento
DIRECTOR DE OBRA	X		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	X		
INGENIERO AUXILIAR	X		
MAESTRO GENERAL	X		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	X		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—		informacion de via cerrada	X
Barrera de madera	—		Cerrar la via	X
Cinta de peligro	X	40 ML	Canalizacion de obras	X

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

110

11/enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

Página: 1/2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

~~FIRMA RESIDENTE~~ INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	12 / Enero / 2022		**HORARIO**	8:00 AM: 5:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro instalación de señales Verticales	* Vias Sector la Esperanza	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		Grava - Arena - Cemento
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

12. /Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	13 Enero / 2022	**HORARIO**	8:00 AM - 4:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de Señales Verticales	- Tunja - Arcabuco - Sector la Esperanza	UN	5

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

13/Enero/2027

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Se programaron instalaciones de Señales verticales en algunos puntos dispersos (SP-25A) para regitos, sin embargo los propietarios de las viviendas donde se instalaron no autorizaron su instalación. (No permitieron)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página:	1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	14 / Enero / 2022		**HORARIO**	9:00PM - 4:00AM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de pintura plástica en frío, incluye microesferas	*Zona Centro	M²	35
* INICIO ACTIVIDADES señalización pintura Acrílica Puente las quintas	x Barrio Las Quintas	M² y ML	Replanteo

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	X		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	X		
INGENIERO AUXILIAR	X		
MAESTRO GENERAL	X		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	SI
Cinta de peligro	40 ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

14 | Enero | 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* La interventoria solicita la aplicación de pintura blanca sobre los resaltos, de acuerdo a normas actuales vigentes, e informa que en caso que el resalto no cumpla con medidas técnicas se debe ajustar (triangulos) a las medidas existentes, lo anterior una vez inicien estas actividades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	15 / Enero / 2022	**HORARIO**	8:00AM - 4:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de pintura acrílica.	Puente las Quintas	M2	80
* Señales Verticales SP25A	Zona Centro	UN	5

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehiculo Tipo Furgon	- Pintura Acrilico
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	- Arena, Cemento, Cemento
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla Informativa	—	informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

15/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

* Se instalan señales tipo SP-25A en la zona centro de la ciudad

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	17 / ENERO / 2022	**HORARIO**	8:00 AM – 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e Instalación Señalización Vertical	Barrio Las Quintas	UN	8

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	2		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

17/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0765

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	18 / Enero / 2022	**HORARIO**	7:00 AM – 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalacion de señal(es) Verticale(s)	* Calle 32 entre Kr 11 y 19	UN	15

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1	*	* Grava - Arena - Cemento
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	X		
INGENIERO AUXILIAR	X		
MAESTRO GENERAL	X		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	X		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

18/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* El contratista de obra, solicita den más puntos o lugares para la instalación de señales verticales SP-25A
* Al igual solicita se autoricen más intersecciones o tramos de vía para aplicación de pintura plástica en frío

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

123

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	19 / Enero / 2022	**HORARIO**	8:00 PM - 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS		LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación de pintura Acrílica con microesferas	Frente las Cuentas	M²	20
* Suministro e instalación de señal Vertical	(Dispersos)	UN	20

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0768

19/Enero/2021

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	20 / ENERO / 2022	**HORARIO**	8:00 PM - 4:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de pintura acrílica con microesferas	Puente Los Cuentas Centro Histórico	M²	150

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA — SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES — SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

20/Enero/2022 Pág: 2/2

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

- Se inician actividades de aplicación de pintura acrílica en las intersecciones del centro histórico (Acción Popular), Estos tramos y sus cantidad fueron aprobados por la firma interventora.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

20771

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	21 / ENERO / 2022	**HORARIO**	8:00 AM - 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de Sobles verticales (Resaltos)	* DISPERSO	UN	12

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		* Grava - Arena - Cemento
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA

21 (Enero) 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Se autoriza por parte de la interventoria la instalación de señales Verticales en los Sitios visitados el dia de hoy.
(Resaltes Dispersos SP-25A)

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	22 / Enero / 2022	**HORARIO**	8:00PM-

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e Instalación de Señales Verticales	(Reyallos - Dispersos)	UN	10
* Aplicación de pintura plástica en frío	Av Colon - Soltiano	M2	40

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla Informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	3
Cinta de peligro	50ML	Canalizacion de obras	3

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

22/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

- La interventoría solicita la intervención inmediata en tramos faltantes de la avenida Colón, así igual que en el Barrio las Quintas

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

2990775

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	24 / Enero / 2022			**HORARIO**	8:00 AM — 12:00 PM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de Señales Verticales	Puntos Dispersos	UN	20
* Aplicación de pintura plástica en frío	Av. Colón	M²	40

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCIÓN	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	SI
Cinta de peligro	80 M	Canalizacion de obras	SI

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA

24 / Enero / 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* El contratista verifica en terreno el cumplimiento de las norma técnicas y especificaciones (Espesor) de pintura plástica y acrílica

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0777

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."				Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.			**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ			**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	25/ ENERO /2022			**HORARIO**	8:00 PM - 4:00 AM
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación de Pintura plástica en frío, incluye Microesferas	Av. Colón La florida	M2	55

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehículo Tipo Furgón	* Pintura plástica
RESIDENTE DE OBRA	1	* Compresor de Aire	* Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	5		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada
Barrera de madera	—	Cerrar la via SI
Cinta de peligro	80 ML	Canalizacion de obras SI

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

25/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

- Se realizan los cambios solicitados por la alcaldía en la zona del Barrio la Florida, (Señalización horizontal)
* Igualmente, se realizan actividades en la avenida Colón y se efectuan pruebas de espesores, en conjunto con Interventoría.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	26 / Enero / 2022	**HORARIO**	7:00 AM - 12:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro y aplicación de pintura plástica en Fdo	* Av. Colon	M2	60
* Suministro y aplicación de pintura Acrílica	* Zona Centro	M2	20
* Instalación de Señales Verticales	* Sitios Dispersos	M2	40

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☐

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA

CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	—
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SISO	—
INGENIERO AUXILIAR	—
MAESTRO GENERAL	—
OFICIALES	2
AYUDANTES	8
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1
OTRO _____	

MAQUINARIA Y EQUIPO

* Vehículo Tipo Furgón
* Compresor de Aire

SUMINISTRO DE MATERIALES

* Pintura Acrílica
* Pintura Plástica
* Señales (Mortero)

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS		
BOTAS	X	TAPA OIDOS		
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	SI
Cinta de peligro	50 ML	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

26/Enero/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1035-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	27/ ENERO /2022	HORARIO	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación pintura plastica en frio	Av. Colon	M2	90
* Suministro e instalación Señal Vertical	Dispersa	UN	18

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehiculo Tipo Furgon	* Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1	* Compresor Aire	* Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		* Phenol - Grava - Cemento
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	0		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via SI
Cinta de peligro	50M	Canalizacion de obras SI

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

27 Enero 2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 27

* Se realiza la intervención del Barrio Las Quintas y se instalan Tachas, Hitos y Tachones según último diseño aprobado por la entidad.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0783

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	28/ ENERO / 2022	**HORARIO**	7:00 AM - 4:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señales verticales	(DISPERSOS RESALTOS)	UN	20
* Aplicación de pintura plástica en frio, con microesferas	AV. COLÓN	M2	46

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehiculo Tipo Furgon	* Pintura plastica
RESIDENTE DE OBRA	1	* Compresor Aire	* Microesferas
PROFESIONAL SISO	—		* Arena - Cemento - Grav
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	80 ML	Canalizacion de obras	51

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

28/ Enero /2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Se informa al personal en obra que se suspenden actividades de obra, hasta cuando se reinicien el contrato.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."	Página:	1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	15 / Marzo / 2022	**HORARIO**	8:00AM - 5:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO X	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
- Suministro e Instalación de Señales Verticales	Calle 32	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**SUMINISTRO DE MATERIALES**
CARGO	CANTIDAD		- Señales Verticales
DIRECTOR DE OBRA	—		- Grava - Arena - Cemento
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

15/MARZO/2017

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Una vez solucionados los inconvenientes que ocasionaron las suspensiones del contrato de obra, se dio reinicio a las actividades contratadas.
* Se visitó la calle 32 entre transv. 11 y Calle 19, y se autorizaron las instalaciones de señales Verticales, esto se realizó conjuntamente contratista e Interventoría.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."	Página:	1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	16 / Marzo / 2022	**HORARIO**	8:00 AM - 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
*Suministro e instalación de señales verticales	Barrio Las Quintas	UN	10

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		Señales Verticales,
RESIDENTE DE OBRA	1		Grava - Arena - Cemento
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0788

16/Marzo/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Se realizan los trámites legales para la modificatoria N°2 Adición en tiempo y en dinero.
* La interventoria solicita verbalmente la programación de obra de acuerdo al acta modificatoria N°2

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	17 / MARZO / 2022	**HORARIO**	8:00AM – 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señales verticales	* Dispersos -TIPO SUAREX -SE A7-B	UN	3

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORO EN OBRA		**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**SUMINISTRO DE MATERIALES**
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	1		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

17/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* El contratista informa que debido a la entrega tardía de Algunos diseños para la instalación de Señales Verticales y de Pintura plástica en frío, se retrazaron las actividades y se solicitó una prorroga y adición.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		**Página:** 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	16 / MARZO / 2022	**HORARIO**	8:00 AM - 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
*Suministro e instalación de señales verticales	DISPERSOS	UN	8

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		Arena - Gravilla - Cemento
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada —
Barrera de madera	—	Cerrar la via —
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras —

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

18/Marzo/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Se autoriza la aplicación de Imprimante en pintura acrílica, para las líneas continuas y discontinuas en la zona de las intersecciones (Acción Populares) del centro histórico

* La interventoría informa, que una vez se apruebe el modificatorio N°2 y adición N°1, se autorizaran esas actividades.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	CONTRATO No.	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	CONTRATO No.	1068-2021
FECHA	19 / MARZO / 2022	HORARIO	8:00 AM - 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señale Verticales	DISPERSOS	UN	5

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA — SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		Grava - Arena - Cemento
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1/2		
AYUDANTES	—		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO ____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES — SI ☐ NO ☒ CUÁL ____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

14/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

Se realiza visita interventoría - Contratista de obra y Supervisión y se hace un reconocimiento de los puntos o intersecciones donde se requiere la aplicación de imprimante ML y M²

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0795

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	21 / MARZO / 2022	**HORARIO**	8:00 AM – 5:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de señales verticales	DISPERSO	UN	15

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1/2		
AYUDANTES	—		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

22/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

En visita realizado conjuntamente Interventoria – contratista se verifico el lugar de la aplicación de la pintura para imprimación el igual que la señales Verticales en el sector Centro de la ciudad y resaltos Reductores.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	22 / MARZO / 2022	**HORARIO**	8:00AM - 6:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro e instalación de señales verticales	* DISPERSOS	UN	8

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		- Grava - Arena - Concreto
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	1		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	—
Cinta de peligro	—	Canalizacion de obras	—

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORÍA

22/Marzo/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS Página: 2/2

* Se Aprueba por parte del contratante la prorroga N°2 y Adición N°1, y se autoriza el inicio para mañana de aplicación de imprimante en sitios aprobados y autorizados.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	23/ MARZO /2022	**HORARIO**	8:00 AM - 4:00 PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación de pintura Acrilica para Imprimante	Dispersos	ML	1800
	Dispersos	M2	600

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	3		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	SI
Cinta de peligro	100ML	Canalizacion de obras	SI

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

23/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

* Se autoriza por parte de la interventoría la aplicación de pintura acrílica para imprimante en los puntos más afectados por el estado de las vías.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	24 / Marzo / 2022	**HORARIO**	8:00 AM : 4:00AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación pintura Acrilica para imprimante	DISPERSO	ML	1000
	DISPERSO	M2	350
* Aplicación de pintura Acrilica con microesferas	DISPERSO	ML	2000
	DISPERSO	M2	100

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehiculo Tipo Furgon	* Pintura Acrilica con microesferas
RESIDENTE DE OBRA	1	* Compresor Aire	
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	51
Cinta de peligro	100	Canalizacion de obras	51

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

24/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	25/ MARZO /2022	**HORARIO**	8:00 AM: 5:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Aplicación de pintura acrilica	DISPERSOS	ML	1250
* Aplicación de pintura acrilica	PUENTE LAS QUINTAS / BARRIO LAS QUINTAS	ML	600
* Suministro e instalación de Tacha)	DISPERSOS	UN	1200
* Suministro e instalación de Tachones)	BARRIO LAS QUINTAS (GATO)	UN	124

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	* Vehiculo Tipo Furgon	* Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	* Compresor Aire	
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	SI
Barrera de madera	—	Cerrar la via	SI
Cinta de peligro	100 ML	Canalizacion de obras	

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

25/MARZO/2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."			Página:	1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.		**CONTRATO No.**	1036-2021	
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		**CONTRATO No.**	1068-2021	
FECHA	26 / MARZO / 2022		**HORARIO**	8:00 AM - 4:00 PM	
ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
*Suministro e instalación de Pitos	sector los Quintos	UN	24
*Aplicación de pintura Acrílica	Dispersos - Sectores	ML M2	1000 185
* Suministro y Aplicación de Imprimante	Dispersos	ML M2	500 300

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	*Vehículo Tipo Furgon	-Pintura Acrílica
RESIDENTE DE OBRA	1	*Compresor de aire	- Hitos
PROFESIONAL SISO	—	*Taladro Percutor	-
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO _____			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla informativa	—	informacion de via cerrada	—
Barrera de madera	—	Cerrar la via	51
Cinta de peligro	50 ML	Canalizacion de obras	51

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

26/ MARZO /2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021
PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2

CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	27 / MARZO / 2022	**HORARIO**	7:00AM – 4:00 AM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO X	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
* Suministro y aplicación de pintura para Imprimante	* Resalto y otros dispersos	M2	30
		M2	1050
* Suministro y aplicación pintura plastica en frio	* Resalto y Sectores dispersos	M2	800
* Suministro y aplicación pintura Acrilica	* DISPERSO	ML	1500

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	LIBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—		
RESIDENTE DE OBRA	1		
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		
MAESTRO GENERAL	—		
OFICIALES	1		
AYUDANTES	6		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Valla informativa	—	Informacion de via cerrada
Barrera de madera	—	Cerrar la via
Cinta de peligro	100 ML	Canalizacion de obras

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0808

27 MARZO / 2012

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

0809

MUNICIPIO DE TUNJA	**BITÁCORA DE OBRA**		2021

PROYECTO	"CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA."		Página: 1/2
CONTRATISTA	CUMBRE INGENIERIA S.A.S.	**CONTRATO No.**	1036-2021
INTERVENTORÍA	CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ	**CONTRATO No.**	1068-2021
FECHA	28 / MARZO / 2022	**HORARIO**	8:00AM – 4:00PM

ESTADO DEL TIEMPO	SOLEADO	NUBLADO	NUBLADO LLUVIA LEVES	LLUVIAS MODERADAS	LLUVIAS INTENSAS

FRENTE DE OBRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
X INSTALACION TACHAS	Puente Los Quintos	UN	220
X INSTALACION SEÑALES VERTICALES	ZONA CENTRO	UN	9
X APLICACION PINTURA ACRILICA	DISPERSOS	ML	872
X APLICACION IMPRIMANTE	AUTOIDS - DISPERSO	M2	256

SE PRESENTARON NO CONFORMIDADES EN OBRA SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES O INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CORRECCION	UBERACIÓN	RESPONSABLE	FECHA

PERSONAL QUE LABORÓ EN OBRA		MAQUINARIA Y EQUIPO	SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGO	CANTIDAD		
DIRECTOR DE OBRA	—	- Vehículo Tipo Furgón	- Pintura Acrilica
RESIDENTE DE OBRA	1	- Compresor Aire	- Pintura Plastica
PROFESIONAL SISO	—		
INGENIERO AUXILIAR	—		- Tachas
MAESTRO GENERAL	—		- Microesfera
OFICIALES	1		
AYUDANTES	7		- Arena - Cemento - Gra
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	—		
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		
OTRO			

SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN				OBSERVACIONES
CASCO	X	GAFAS	X	
BOTAS	X	TAPA OIDOS	X	
GUANTES	X	OTROS	Tapabocas X	

SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Valla Informativa	—	Informacion de via cerrada	
Barrera de madera	—	Cerrar la via	SI
Cinta de peligro	100ML	Canalizacion de obras	SI

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES SI ☐ NO ☒ CUÁL _____

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

28/ MARZO /2022

OBSERVACIONES Y OTROS ASPECTOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA

ANEXO 11.10
INFORMES SEMANALES

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	11 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	1	DEL	05 DE NOV DE 2021	AL	11 DE NOV DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	92			PLAZO ACTUALIZADO:	92		
PLAZO TRANSCURRIDO:	7	EQUIVALE AL	8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	7	EQUIVALE AL	8%
VALOR INICIAL :	$		37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$		642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	$		37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$		642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor			VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>		
VALOR POR PAGAR:				VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DEL CONTRATO, REVISIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	19/11/2021	19/11/2021	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigent	$ 525.698.00	0.08%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 525.698.00	0.08%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Falta de programacion de obra actualizada con la fecha de inicio del contrato de obra, es decir el 05 de Noviembre de 2021.
Falta de documentacion inicial con la que se puede ordenar el inicio de actividades en campo.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Actualizacion de programacion de obra con fecha de inicio.	Contratista	09 de Noviembre de2021
Entrega de documentacion inicial para inicio de actividades en campo	Contratista	Toda la presente semana

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoria:

1. una vez realizado el primer reconiod de obra, por diferentes sectores a intervenir en el contrato d eobra, se identifica por las apartes contratista, Interventoria y la entidad contratanta que se hace necesario la utilizacion de varias actividades no previstas, como es el caso de la aplicacion de imprimante para las zonas donde el estado del pavimento se encuentra en condicones regulares o malas.Este se debe aplicar tanton en los sectores donde se palicara demarcacion tipo metro cuadrado y el los sectores donde se aplicara metro lineal.2. seidentifica que se debe crear una actividad para el retiro de las bases delos dispositivos de regulacion del transitor que se van a reemplazar es el caso de hitos y tachones.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista: el dia 11 de Noveimbre del 2021, el contratista presenta los analisis de precios unitarios para los siguientes items: 1. NP01: Suministro y aplicación de imprimante en pintura de trafico acrilica, 2. NP02: Suministro y aplicación de imprimante en pintura acrilica, lineas continuas y discontinuas de 15 cms según norma Invias y 3. NP03: Retiro de dispositivos de seguridad, base de hitos y/o base de tachones

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la interventoria de obra realizará la respectiva revison y analisisi de los apus no previstos presentados por le contratista y los remitira a la entidad contratatante con el objetivoq ue sean revisados y aprobados.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

1. Firma acta de Inicio de interventoria y de obra el dia 05 de Noviembre de 2021.
2. Asistencia a comité de obra de obra el dia 08 de Noviembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se fijan los primeros compromisos preliminares por parte del contratista de obra y la interventoría para el inicio de la ejecución de actividades de obra. Así mismo la secretaria de tránsito y transporte entrega algunos estudios y diseños de los puntos priorizados por las acciones populares, los cuales serán los primeros en ser intervenidos.
3. Asistencia a visita de obra, conjuntamente el mismo dia 08 de Noviembre de 2021, se lleva a cabo la primer visita de obra a los puntos priorizados por la secretaria de tránsito y transporte, en la cual se definen aspectos técnicos para la ejecución de las actividades necesarias en cada punto, además se ve la necesidad de realizar algunos ajustes a los diseños iniciales, los cuales serán realizados por la entidad contratante y remitidos nuevamente a la interventoria y contratista de obra para su respectiva ejecucion. También el contratista de obra se compromete a realizar el plan de trabajo, de acuerdo a los puntos ya estipulados en esta visita y a realizar los respectivos planes de manejo del tránsito (PMTS) de estos puntos establecidos.
Se deja en claro que el inicio de las actividades depende la celeridad con que el contratista de obra entregue esta información y la interventoria pueda revisar para que la secretaria de tránsito y transporte pueda realizar la respectiva aprobación.
4. Revisión de documentación remitida por el contratista, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoria:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO EL 08-11-2021 1. Hoja de vida del director de obra.
2. Hoja de vida del residente de obra.
3. Hoja de vida del asesor especialista en tránsito.
4. Plan de calidad a aplicar en obra.
5. Relación de la maquinaria a utilizar en la ejecución del contrato de obra. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y solicitud de ajustes.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA NUMERO ENV.OO1 del 09-11-2021. 1. Se solicita al contratista de obra información adicional. Copia de pólizas actualizadas a la fecha.
2. Plan de gerencia de proyectos.
3. Presentar a la interventoría para su aprobación y/o verificación, la programación de Obra,
4. Análisis de Precios Unitarios de todos los ítems del presupuesto presentados en la oferta económica.
5. Elaborar y presentar a la Interventoría el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental del contrato, debidamente firmado por el representante legal y/o los especialistas que apliquen. Este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las obras.
6. Subcontratos con las empresas terceras que participaran en la ejecución del contrato.
7. Afiliaciones al sistema de seguridad social.
8. Diseñar y presentar al Interventor el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- SST), para el seguimiento el Contrato de Obra (según decreto 1443 de 2014 Min trabajo).
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 09-11-2021 1. Plan de Manejo del Tránsito (PMT) a implementar. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión y solitud de ajustes.
OFICO RECIBIDO CONTRATISTA 10-11-2021 1. Copia de pólizas contractuales.
2. Precios unitarios contractuales.
3. Programación de obra v0
4. Flujo de caja mensual. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión y solicitud de ajustes.
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 10-11-2021 Plan de Manejo del Tránsito (PMT) ajustado. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión y solicitud de ajustes.
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 10-11-2021 Programa de gerencia de obra. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión.
OFICIO ENVIADO AL CONTRTATISTA ENV.OO2-10-11-2021 Solicitud de ajustes al PMT general.
OFICIIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 11-11-2021 Relación de empleados a laborar empresa VRC.ACTUACION INTERVENTORIA; Revisión
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATATISTA 11-11-2021 Precios unitarios no previstos. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

VISITAS DE CAMPO 1, VERIFICANDO DISEÑOS, ESTADO DE LAS VIAS A INTERVENIR, ACTIVIDADES A EJECUTAR EN CADA SECTOR.



















RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	2	DEL	12 DE NOV DE 2021	AL	18 DE NOV DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	14 EQUIVALE AL 15%	PLAZO TRANSCURRIDO:	14 EQUIVALE AL 15%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA INICIO DEL CONTRATO, REVISIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS DISEÑOS, ENTREGA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA Y ENTIDAD CONTRATANTE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	19/11/2021	19/11/2021	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 946.256.00	0.15%	0.00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 946.256.00	0.15%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

El contratista de obra presenta un informe en el cual informa el estado actual de las vías priorizadas a intervención inicial, en el cual se puede observar que la mayoría de intersecciones se encuentran en un mal estado, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento de estas, asi mismo informa que la estabilidad de la obra seria reducida a solo 12 meses.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
La entidad contratante consultara a la secretaria de infraestructura municipal la posibilidad de intervenir estos sectores criticos para asi poder realizar las demarcacion diseñadas.	Secretaria de transito y transporte de Tunja	26 de Noviembre de 2021
La interventoria remite el informe del estado actual de las vias a la secretaria de transito y transporte de Tunja para que se pronuncie respecto al tema.	Interventoria de obra	19 de Noviembre de 2021

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: **a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría:** 1. una vez realizado el primer recorriod de obra, por diferentes sectores a intervenir en el contrato d eobra, se identifica por las apartes contratista, interventoria y la entidad contratanta que se hace necesario la utilizacion de varias actividades no previstas, como es el caso de la aplicacion de imprimante para las zonas donde el estado del pavimento se encuentra en condicones regulares o matas.Este se debe aplicar tanton en los sectores donde se palicara demarcacion tipo metro cuadrado y el los sectores donde se aplicara metro lineal.2. seidentifica que se debe crear una actividad para el retiro de las bases delos dispositivos de regulacion del transitor que se van a reemplazar es el caso de hitos y tachones. **b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista:** el dia 11 de Noveimbre del 2021, el contratista presenta los analisis de precios unitarios para los siguientes items: 1. NP01: Suministro y aplicación de imprimante en pintura de trafico acrílica, 2. NP02: Suministro y aplicación de imprimante en pintura acrílica, lineas continuas y discontinuas de 15 cms según norma Invías y 3. NP03: Retiro de dispositivos de seguridad, base de hitos y/o base de tachones **c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:** la interventoria de obra realizó la respectiva revision y analisisi de los apus no previstos presentados por le contratista, solicito algunos ajustes y posteriormente remitira a la entidad contratatante con el objetivo que sean revisados y aprobados.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
1. Asistencia a comité de obra virtual, el día 12 de Noviembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se fijan compromisos por parte del contratista de obra y la interventoría para el inicio de la ejecución de actividades de obra. 2.Se realiza visita de obra el día 16 de Noviembre de 2021 y el contratista se compromete a entrega el plan de trabajo para el día 17 de Noviembre de 2021, con el fin que se revise y se apruebe el inicio de actividades el día 18 de Noviembre de 2021. 2.. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría: FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA: OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 12-11-2021. Plan de Manejo del Tránsito (PMT) particular de 6 puntos específicos. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y solicitud de ajustes. OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA NUMERO ENV.OO4 del 12-11-2021. 1. Se solicita al contratista ajustes a los PMT de los 6 puntos específicos. OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 12-11-2021 1. Programa de implementacion de seguridad en el trabajo. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión. OFICIO RECIBIDO CONTRATISTA 16-11-2021 1. Plan de Manejo del Tránsito (PMT) particular de 6 puntos específicos. ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión. OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 17-11-2021 Plan de Manejo Ambiental (PMa). ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión. OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 17-11-2021 Plan de Trabajo. Programacion y alcance finaciero de obra ACTUACION INTERVENTORIA: Revisión. OFICIO ENVIADO A SUPERVISION ENV.OO6-17-11-2021 Remision del PMT general para revision y aprobacion. OFICIO RECIBIDO SUPERVISION 17-11-2021 Solicitud ajustes del PMT general. ACTUACION INTERVENTORIA: Reenvio a contratista.. OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 18-11-2021 Solicitud aprobacion de apus no previstos y reporte de visita de obra numero 1; ACTUACION INTERVENTORIA Revisión OFICIO ENVIADO A SUPERVISOR 18-11-2021. Remision de Precios unitarios no previstos revisados. OFICIO RECIBIDO SUPERVISION del 18-11-2021. 1. Aprobacion por secretaria de transito del PMT.ACTUACION INTERVENTORIA Remision al contratista de obra. OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA NUMERO ENV.OO9 del 18-11-2021. 1. Remision de Aprobacion por secretaria de transito del PMT OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA NUMERO ENV.O10 del 18-11-2021. 1. Observaciones al Plan de trabajo. OFICIO ENVIADO A LA SUPERVISION 18-11-2021 Remision de la Solicitud aprobacion de apus no previstos y reporte de visita de obra numero 1;

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

VISITAS DE CAMPO, VERIFICANDO DISEÑOS, ESTADO DE LAS VIAS A INTERVENIR, ACTIVIDADES A EJECUTAR EN CADA SECTOR.


























RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CODIGO:GIN-F- 033
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	3	DEL	19 DE NOV DE 2021	AL	25 DE NOV DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	21 EQUIVALE AL 23%	PLAZO TRANSCURRIDO:	21 EQUIVALE AL 23%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoria y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de Items

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 19.109.716.00	2.97%	0.44%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 21.941.796.00	3.41%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

El contratista de obra como la interventoria solcitan a la entidad la entrega total de los diseños definitivos tanto señalización horizontal como vertical de todos los sectores a intervenir en el contrato de obra

Con respecto al informe tecnico que contratista de obra presentó en el cual informa el estado actual de las vías priorizadas a intervención inicial, en el cual se puede observar que la mayoría de intersecciones se encuentran en un mal estado, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento de estas, asi mismo informa que la estabilidad de la obra seria reducida a solo 12 meses. La entidad contratnte y la interventoria estan en desacuerdo con el contratista ya que las polizas o garantias contractulaes del contrato de obra no se pueden cambiar y que seria mas viable realizar los mantenimientos solicitados.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega diseños definitivos tanto señalización horizontal como vertical de todos los sectores a intervenir en el contrato de obra	Secretaria de transito y transporte deTunja	26 de Noviembre de 2021
La entidad contratante consultara a la secretaria de infraestructura municipal la posibilidad de intervenir estos sectores criticos para asi poder realizar las demarcaciones diseñadas.	Secretaria de transito y transporte deTunja	26 de Noviembre de 2021
La entidad contratante consultara a la secretaria juridica municipal pronunciamineto respecto a la reduccion del tiempo de las garantias.	Secretaria de transito y transporte deTunja	26 de Noviembre de 2021
La entidad contratante solicita al contrataista un informe tecnico-juridico argumentabdo la reduccion de garanrias	Contrtatista	26 de Noviembre de 2021

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría:
1. una vez realizado el primer recorrido de obra, por diferentes sectores a intervenir en el contrato d eobra, se identifica por las apartes contratista, Interventoria y la entidad contratanta que se hace necesario la utilizacion de varias actividades no previstas, como es el caso de la aplicacion de imprimante para las zonas donde el estado del pavimento se encuentra en condiciones regulares o malas.Este se debe aplicar tanton en los sectores donde se paticara demarcacion tipo metro cuadrado y el los sectores donde se aplicara metro lineal.2. seidentifica que se debe crear una actividad para el retiro de las bases delos dispositivos de regulacion del transitor que se van a reemplazar es el caso de hitos y tachones.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la Interventoría y del contratista: el dia 11 de Novsimbre del 2021, el contratista presenta los analisis de precios unitarios para los siguientes items: 1. NP01: Suministro y aplicación de imprimante en pintura de trafico acrilica, 2. NP02: Suministro y aplicación de imprimante en pintura acrilica, lineas continuas y discontinuas de 15 cms según norma Invias y 3. NP03: Retiro de dispositivos de seguridad, base de hitos y/o base de tachones

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la interventoria de obra realizó la respectiva revision y analisis de los apus no previstos presentados por le contratista, solicito algunos ajustes y posteriormente remitió a la entidad contratatante con el objetivo que sean revisados y aprobados.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comité de obra numero 3 virtual, el dia 19 de Noviembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa por parte del contratista de obra y la interventoria que el inicio de la ejecución de actividades de obra sera el dia 19 de Noviembre de 2021.
2.. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoria:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 24-11-2021. Informe estado actual de las vias. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y remision a la entidad contratante.
OFICIO ENVIADO A SUPERVISON del 25-11-2021.Remite a entidad contratante el informe estado actual de las vias 3. Se reporta que se presentaron lluvias 2 dias de la semana 23 y 24 de Noviembre de 2021, por lo cual no se pueden ejecutar labores en campo.

ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.
1. AVENIDA MALDONADO, SECTOR GLORIETA DEL HUGOLINO: se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y se realiza aplicacion de pintura lineal con pintura acrilica con microesferas, segun diseños.
2. AVENIDA COLON, INTERSECCION NIEVES, MR KING:se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
3. AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 11:se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana.Avance parcial.
4. AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 15 (SALIDA A VILLA DE LEYVA):se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. avance Parcial.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS AVENIDA MALDONADO, SECTOR GLORIETA DEL HUGOLINO

















ACTIVIDADES EJECUTADAS AVENIDA COLON, INTERSECCION NIEVES, MR KING.

















ACTIVIDADES EJECUTADAS AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 11









ACTIVIDADES EJECUTADAS AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CARRERA 25 (SALIDA A VILLA DE LEYVA)










ENSAYOS PARA PRUEBA DE ESPESOR PUNTURA PLASTICA

Para la aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones.











RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	02 DE DICIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	4	DEL	26 DE NOV DE 2021	AL	02 DE DIC DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	28 EQUIVALE AL 30%	PLAZO TRANSCURRIDO:	28 EQUIVALE AL 30%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

)

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en dias	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 41.682.616.00	6.49%	0.39%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 44.206.940.00	6.88%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Contratista solicita intervencion y/o mantenimiento de las vias en mal estado.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
interventoria de obra remite solicitud a entidad contratante	Intervemtoria	02 de diciembre de 2021

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría:

1. una vez realizado recorrido de obra el dia 16 de Noviembre de 2021, se identifica que en algunos sectores se deben instalar estoperoles metalicos como dispositivo para reducion de velocidad, es elcaso del sector de la avenida colon con carrera12, avenida colon con calle 2 4 y calle 25 y la via Tunja Arcabuco sector Barrio San Rafael.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista: el dia 25 de Noveimbre del 2021, el contratista presenta los analisis de precios unitarios para el siguiente item: 1. NP04: SUMINISTROEINSTALACIÓNDEESTOPEROLESMETALICOSD=10CMH=2CMS(Incluye,PlantaElectrica,Taladro,Broca,AditivoEpóxico,ydemaselementos para su correcta instalación).

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la interventoria de obra realizará la revision asi mismo la entidad contratante realizara la respectiva revision y aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

1. Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría: FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 26-11-2021. Apus Item no previsto Estoperol metalico. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y remison entidad contratante

OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 01-12-2021. Soliciudmantenimiento viasa intervenir . ACTUACION INTERVENTORIA:Revision y remision a entidad contrantate.


OFICIO ENVIADO A SUPERVISON del 02-12-2021.Remite a entidad contratante solictud del contratista mantenimeinto de viasa intervenir. OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA del 02-12-2021.Solicitud informe mensual numero 1.

ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. AVENIDA COLON, INTERSECCION CON CALLE 24: se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
2. CARRERA 9 CON CALLE 23 (PARQUE PINZON): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
3. CARRERA 9 CON CALLE 24 (PARQUE PINZON):se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana.
4. CARRERA 9 CON CALLE 12 (ASMEVET):.se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
5. CARRERA 9 CON CALLE 29 (MALDONADO):.se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
6. VIA SALIDA BARRIO SAN RAFAEL:.se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. avance Parcial.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 INTERSECCION CALLE 24

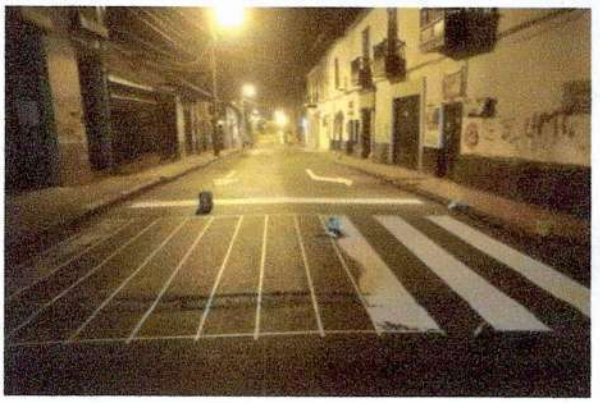







ACTIVIDADES EJECUTADAS AVENIDA COLON INTERSECCION CALLE 23







ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 INTERSECCION CON CALLE 29









ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 INTERSECCION CON CALLE 12









ACTIVIDADES EJECUTADAS VIA TUNJA ARCABUCO SALIDA BARRIO SAN RAFAEL





ACTIVIDADES EJECUTADAS AVENIDA COLON CON CALLE 24









RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	18 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	5	DEL	03 DE DIC DE 2021	AL	09 DE DIC DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	35 EQUIVALE AL 38%	PLAZO TRANSCURRIDO:	35 EQUIVALE AL 38%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al interventc	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 64.782.719.00	10.08%	0.02%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 64.942.280.00	10.11%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Con respecto al informe tecnico que contratista de obra presentó en el cual informa el estado actual de las vias priorizadas a intervención inicial, en el cual se puede observar que la mayoria de intersecciones se encuentran en un mal estado, por lo cual se hace necesario realizar un mantenimiento de estas, asi mismo informa que la estabilidad de la obra seria reducida a solo 12 meses.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
La entidad informa que respecto al estado crítico de algunos puntos de intervención, que el contrato de reparcheo que se está ejecutando actualmente no contempla el arreglo de fisuras ni deterioros similares, entonces hay que acomodarnos a las condiciones el pavimento como estén, utilizando la pintura acrilica.	Secretaria de transito y transporte	

236

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
En este campo, se deben informar los siguientes aspectos: **a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría:** 1. una vez realizado recorrido de obra el dia 16 de Noviembre de 2021, se identifica que en algunos sectores se deben instalar estoperoles metalicos como dispositivo para reducion de velocidad, es elcaso del sector de la avenida colon con carrera12, avenida colon con calle 2 4 y calle 25 y la via Tunja Arcabuco sector Barrio San Rafael. **b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista:** el dia 25 de Noviembre del 2021, el contratista presenta los analisis de precios unitarios para el siguiente item: 1. NP04: SUMINISTROEINSTALACIÓNDEESTOPEROLESMETALICOSD=10CMH=2CMS(Incluye,PlantaElectrica,Taladro,Broca,AditivoEpóxico,ydemaselementos para su correcta instalación). **c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:** la interventoría de obra realizará la revision asi mismo la entidad contratante realizara la respectiva revision y aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 1. Asieencia a comite virtual numero 4, el dia 03 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compormisos por las partes paraavanzar en la ejecucion del contrato. 2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría: FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA: OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 26-11-2021. Apus item no previsto Estoperol metalico. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión. OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 01-12-2021. Solicinudmantenimiento viasa intervenir . ACTUACION INTERVENTORIA:Revision y remision a entidad contrantate. OFICIO ENVIADO A SUPERVISON del 02-12-2021.Remite a entidad contratante solicitud del contratista mantenimeinto de viasa intervenir. **ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS:** En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad. 1. CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. 2.CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO):se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura acrilica segun diseños. 3.CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL):se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños. 4. CARRERA 7 CON CALLE 18.se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. 5. CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO).se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. 6. CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL); se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. 7. CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO); se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 CON CALLE 22 (BRIGADA):







ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 9 CON CALLE 25 (SALESIANO)











CARRERA 7 CON CALLE 17 (ANTIGUO TERMINAL)









CARRERA 7 CON CALLE 18









ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 20 (PILA DEL MONO)









ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 10 CON CALLE 21 (CAMOL)





ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 15 CON CALLE 19 (TOPO)














ENSAYOS PARA PRUEBA DE ESPESOR PUNTURA PLASTICA

Para la aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC-1360-1, para avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones.

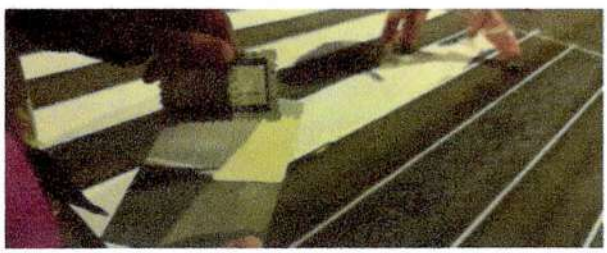



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CODIGO:GIN-F- 033
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	16 DE DICIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	6	DEL	10 DE DIC DE 2021	AL	16 DE DIC DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021			CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES			PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021			FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	92			PLAZO ACTUALIZADO:	92		
PLAZO TRANSCURRIDO:	42	EQUIVALE AL	46%	PLAZO TRANSCURRIDO:	42	EQUIVALE AL	46%
VALOR INICIAL :	$		37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$		642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):				VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	$		37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$		642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al interventor>			VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>		
VALOR POR PAGAR:				VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA			INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoria y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	3/02/2022	3/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	3/01/2022	3/01/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 95.758.590.00	14.90%	4.10%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 122.130.946.00	19.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría:
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista:
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comite virtual numero 4, el dia 03 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compromisos por las partes paraavanzar en la ejecucion del contrato.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 10-12-2021. PMT via Tunja Arcabuco. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y solicitud de ajustes..
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 14-12-2021. PMT señalizacion vertical . ACTUACION INTERVENTORIA:Revision y remision a entidad contrantate.
OFICIO RECIBIDO DEL CONTRATISTA 15-12-2021. PMT ajustado via Tunja Arcabuco. ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y remision a entidad contrantate..
OFICIO ENVIADO A SUPERVISON 13-2-2021. Solictud totalidad de estudios y diseños.
ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.
1. CARRERA 8 CON CALLE 18 : se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
2.CARRERA 8 CON CALLE 23:se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
3.CARRERA 8 CON CALLE 25:se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños.
4. CARRERA 7 CON CALLE 19.se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños.
5.CARRERA 7 CON CALLE 20 (ESQUINA CTI).se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
6. CARRERA 10 CON CALLE 21A (HOTEL HUNZA)): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños. .
7. CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños. 8.CARRERA 16 CON CALLE 32 (LA ESPERANZA) se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura acrilica, segun diseños
9.COLEGIO GALILEO GALILEI se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños
10. CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (PARCIAL DEMARCACION HORIZONTAL): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños
11.VIA TUNJA ARCABUCO (PARCIAL SEÑALIZACION VERTICAL): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura acrilica, segun diseños

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 18






ACTIVIDADES EJECUTADACARRERA 8 CON CALLE 23




ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 8 CON CALLE 25






ACTIVIDADES EJEJCUTADAS CARRERA 7 CON CALLE 19






ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 7 CON CALLE 20 (ESQUINA CTI)




ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 10 CON CALLE 21A (HOTEL HUNZA)




ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 11 CON CALLE 17 (LUMOL)





ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 16 CON CALLE 32









ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO GALILEO GALILEI





ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (PARCIAL DEMARCACION HORIZONTAL)






ACTIVIDADES EJECUTADAS VIA TUNJA ARCABUCO (PARCIAL SEÑALIZACION VERTICAL)







RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

* Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato

FECHA	23 DE DICIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	7	DEL	19 DE DIC DE 2021	AL	23 DE DIC DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	49 EQUIVALE AL 53%	PLAZO TRANSCURRIDO:	49 EQUIVALE AL 53%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al interventor	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	3/02/2022	3/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehiculos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	3/01/2022	3/01/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	18/01/2022	18/01/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	6/01/2022	6/01/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestalL	19/01/2022	19/01/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	26/01/2022	26/01/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	2/02/2022	2/02/2022	0
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	2/02/2022	2/02/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de items

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 150.170.956.00	23.37%	6.64%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 192.812.963.00	30.00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría;
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista:
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comite virtual numero 17, el dia 17 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecucion del contrato.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DE SUPERVISION 17-12-2021. Reductores de velocidad a intervenir . ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión y remision a contratista..
OFICIO ENVIADO AL CONTRATISTA 17-12-2021. Remision Reductores de velocidad a intervenir .
OFICIO ENVIADO A SUPERVISON 22-12-2021. Registro fotografico sectores intervenidos a la fecha.

ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.
1. CARRERA 12 CON CALLE 18 : se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
2. CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCACION HORIZONTAL Y DEMARACACION VERTICAL PARCIAL): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana y pintura acrilica, segun diseños y se realiza el suministro e instalacion de señales verticales parcialmente.
3..VIA TUNJA ARCABUCO (DEMARCACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL): se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura acrilica, segun diseños y se realiza el suministro e instalacion de señales verticales.
4. VIAS INTERNAS BARRIO LA FLORIDA :se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños.
5. Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo: Se realiza la instalacion de hitos en la isleta de la avenida maldonaso sector glorieta maldonado, en la interseccion de las nievas (sector mr king), en la interseccion de la carrera 9 con calle 25 (esquina salesiano).
6. Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm: Se realiza la instalacion de tachones en la isleta de la avenida maldonaso sector glorieta maldonado, en la interseccion de las nievas (sector mr king), en la interseccion de la carrera 9 con calle 25 (esquina salesiano).
7.Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex); se realiza retiro de señales verticales en la via Tunja Arcabuco, en la calle 3 entre carreras 11 y 14.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS CARRERA 12 CON CALLE 18





ACTIVIDADES VIAS INTERNAS BARRIO LA FOLRIDA









ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 DEMARCACION HORIZONTAL)






ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (INSTALACION SEÑALES VERTICALES)









ACTIVIDADES EJECUTADAS VIA TUNJA ARCABUCO (SEÑALIZACION VERTICAL)











ACTIVIDADES EJECUTADAS SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS Y TACHONES







ACTIVIDADES EJECUTADAS RETIRO DE SEÑALES VERICALES







RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	PERIODO No.	8	DEL	24 DE DIC DE 2021	AL	30 DE DIC DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021		CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:			**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:			**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	92		PLAZO ACTUALIZADO:	92		
PLAZO TRANSCURRIDO:	56	EQUIVALE AL 61%	PLAZO TRANSCURRIDO:	56	EQUIVALE AL	61%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00		VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00		
VALOR ADICION(ES):			VALOR ADICION(ES):			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00		VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00		
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor		VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>		
VALOR POR PAGAR:			VALOR POR PAGAR:			
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA		INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	3/02/2022	3/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehiculos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	3/01/2022	3/01/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	18/01/2022	18/01/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	6/01/2022	6/01/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	19/01/2022	19/01/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	26/01/2022	26/01/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	2/02/2022	2/02/2022	0
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	2/02/2022	2/02/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 220.207.652.00	34.27%	2.93%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 239.054.163.00	37.20%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría:
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista:
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comite virtual numero 7, el día 24 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecucion del contrato.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 30-12-2021. Remision informe mensual numero 1 . ACTUACION INTERVENTORIA:Revisión..


ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.
1. CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 (DEMARCACION HORIZONTAL Y DEMARACACION VERTICAL): se ejecuta demarcacion de la linea de 12 cms de ancho con la aplicacion de pintura acrilica, segun planos diseños, en una longitud aproximada de 500 metros lineales y se continua con el suministro e instalacion de señales verticales.
2..VIA TUNJA ARCABUCO (DEMARCACION LINEAL): se ejecuta demarcacion de la linea doble continua con la aplicacion de pintura acrilica, segun planos diseños, en ena longitud aproximada de 3500 metros lineales.
4. VIAS INTERNAS BARRIO LA FLORIDA :se ejecuta demarcacion horizontal con la aplicacion de pintura plastica metodo manual a llana, segun diseños y se realiza sumninistro e instalacion de señales verticales, segun planos de diseño.
5. Se relaiza ensayos de retrofelctividad en la demarcacion horizontal en la via Tunja Arcabuco, Calle 3 entre carreras 11 y 14, Resultados acordes a los exigido en la norma NTC 4744-C.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA


ACTIVIDADES EJECUTADAS CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 14 DEMARCACION LINEA DE 12 CMS






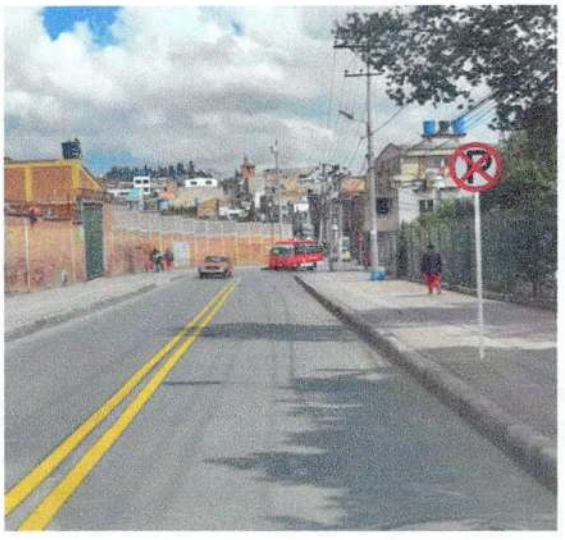




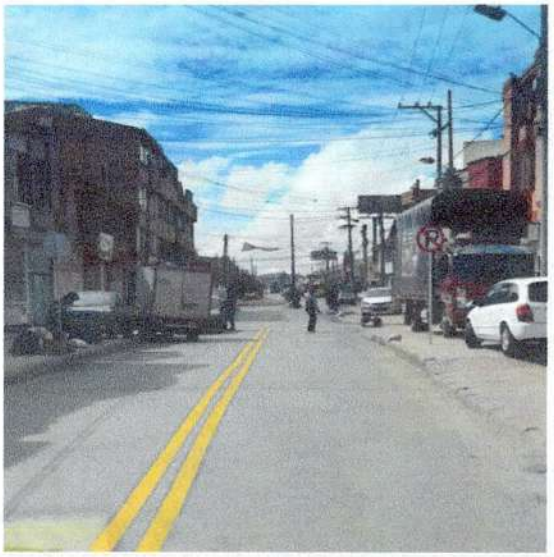

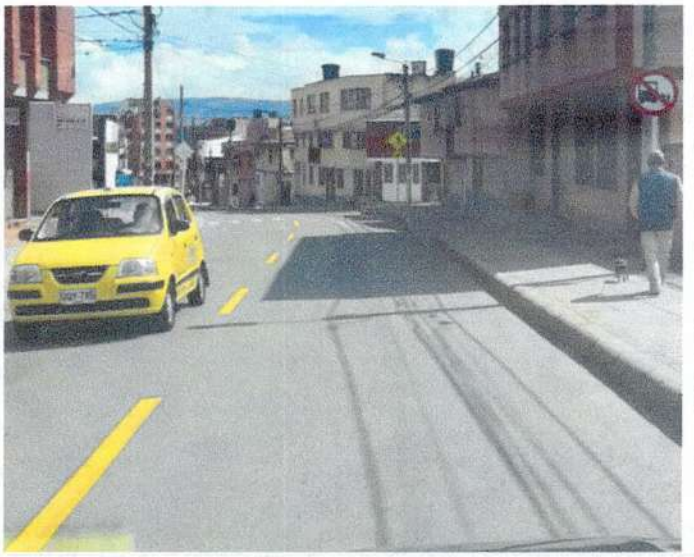


ACTIVIDADES EJECUTADAS VIA TUNJA ARCABUCO DEMARCACION LINEA CONTINUA DOBLE DE 12 CMS



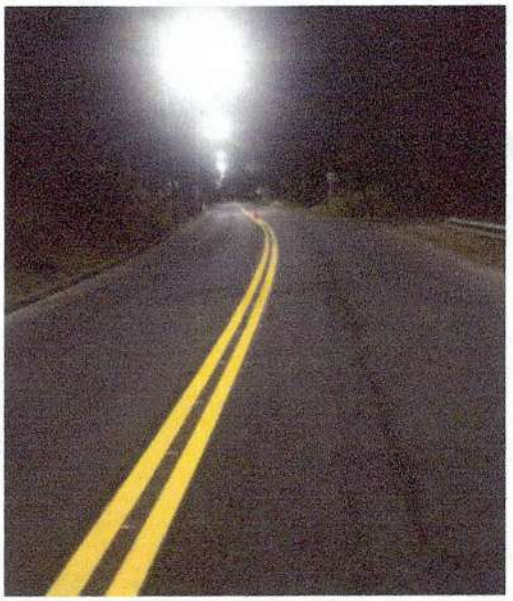



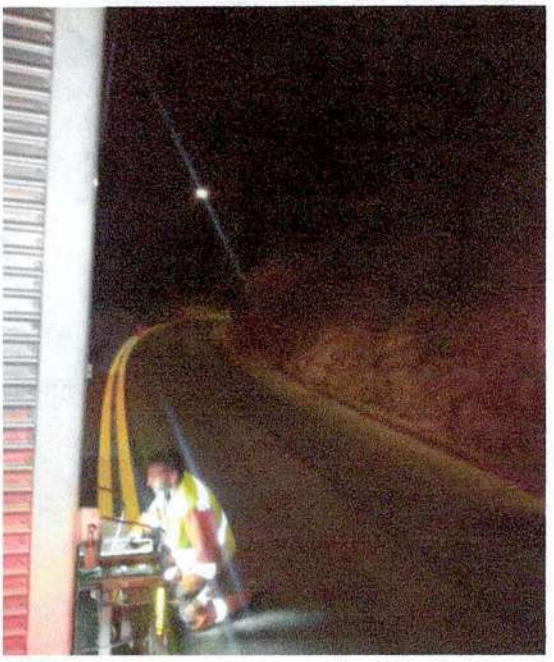









ENSAYOS Y TOMA DE PRUEBAS DE RETROFELCTIVIDAD














VIAS INTERNAS BARRIO LA FLORIDA DEMARCACION HORIZONTAL E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES






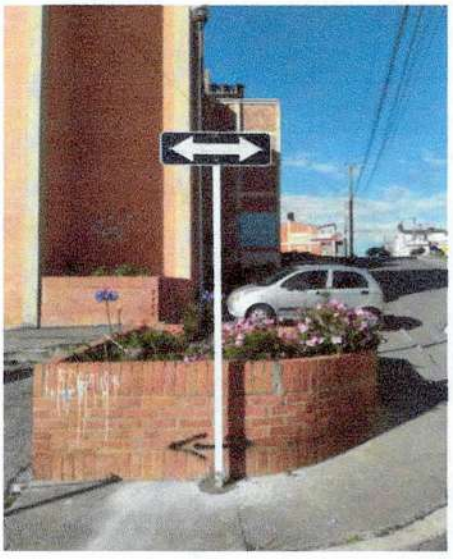












RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ MUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CODIGO:GIN-F- 033
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	13 DE ENERO DE 2022	PERIODO No.	10	DEL	07 DE ENE DE 2021	AL	13 DE ENERO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	70 EQUIVALE AL 76%	PLAZO TRANSCURRIDO:	70 EQUIVALE AL 76%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	«Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor	VALOR PAGADO:	«Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)»
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	2/02/2022	2/02/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	1/02/2022	1/02/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	31/01/2022	31/01/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestalL	2/02/2022	2/02/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	2/02/2022	2/02/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	23/12/2021	18/12/2021	5
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	23/12/2022	23/12/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de Items

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 242.939.091,00	37,80%	1,76%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 254.264.556,00	39,57%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

Se presenta poco avance semanal, debido a falta de insumos por festividades de fin de año, como el suministro de microesferas, por esta razon no se eejcutan actividades de señalizacion horizontal.

Se comienza a ejecutar la reprogramacion de obra apartir del 12 de enero de 2022, la cual fue aprobada por la entidad contratante.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Implementacion de 2 cuadrillas apartir de la sihuelnte semana, incluyendo trabajos nocturnos.	Contratista	17 de enero de 2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría:
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista:
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO:

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Se realiza acta de modificación de cantidades número 1, debido a la necesidad de ejecutar mayor y menores cantidades según lo evidenciado en los recorridos de obra realizados y a la modificaciones tecnicas necesarias a ejecutar.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comita virtual numero 8, el dia 24 de Diciembre de 2021, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecucion del contrato.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoria:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACIÓN INTERVENTORIA:
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA ENV.23- 11-01-2022. Solicitud reprogrmacion de obra.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA ENV.11-01-01-2022. Solicitudprogramacion semanal .
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 12-01-2022. Remite reprogramacion de obra.
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 12-01-2022. Responde solicitud de reprogramacion de obra semanal.

ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES: se realiza sumministro e instalacion de señales verticales segun diseños, en la calle 32 entre carrera 16 y la via Tunja-Arcabuco y vias aledañas a la urbanizacion la Esperanza. Se continua instalando señales verticales en la carrera 14 entre calles 21 y 26.


INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES VIAS CALLE 32









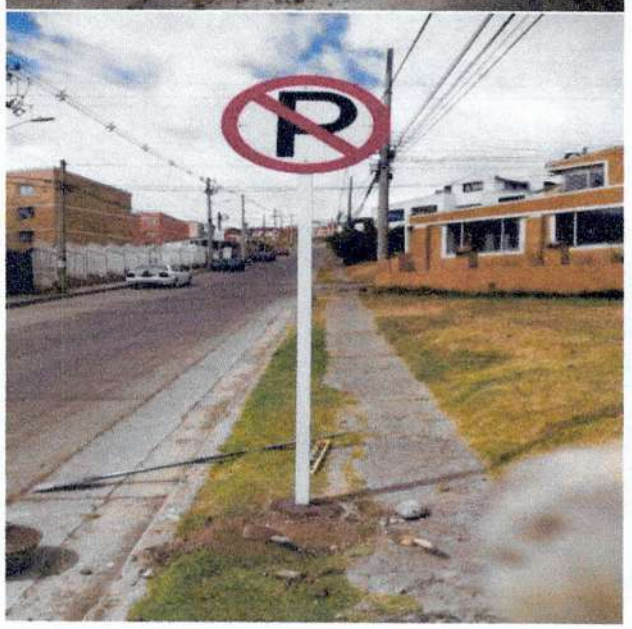











RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	20 DE ENERO DE 2022	PERIODO No.	11	DEL	14 DE ENE DE 2021	AL	20 DE ENERO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	77 EQUIVALE AL 84%	PLAZO TRANSCURRIDO:	77 EQUIVALE AL 84%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor	VALOR PAGADO:	Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista teniendo que el anticipo no es un pagoo
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoria y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	2/02/2022	2/02/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	1/02/2022	1/02/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	31/01/2022	31/01/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestalL	2/02/2022	2/02/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	2/02/2022	2/02/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	23/12/2021	18/12/2021	5
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	23/12/2022	23/12/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de items

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 274.004.223.00	42.64%	2.79%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 291.926.256.00	45.43%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría: El contratista presenta analisis de precios unitarios no previstos, para la demarcacion horizontal y vertical del puente de las quintas.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista: la interventoria porcede a realizar la respectiva revisi on de los analisis de precios unitarios no previstos.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la entidad proceda a realizar la revision de los analisis de precios unitarios no previstos entregados por el contratista.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comita virtual numero 10, el día 14 de Enero de 2022, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecucion del contrato. 2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO SUPERVISION.14- 01-2022. Remision de diseños demarcacion puente de las quintas.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA ENV.16- 11-01-2022. Solicitud complemento informe mensuta #2.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA ENV.17-01-01-2022. Solicitud pago seguridad social ingeneiro residente.
OFICID RECIBIDO DE CONTRATISTA 21-01-2022. APUS no previstos demarcacion puente las quintas.
OFICIO ENVIADO A SUPERVISON 21-01-2022. Remision APUS no previstos demarcacion puente las quintas..


ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente semen se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.


1. SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES: se realiza sumninistro e instalacion de señales verticales segun diseños en el Barrio el consuelo, Barrio Maldonado, en la calle 32 , cc viva, y señales en resaltos de los barrios Nazareth, Jordan, San Antonio, Patriotas, Altamira, Paraiso, dorado, nieves,libertador, villa bachue entre otros.
2. DEMARCACION HORIZONTAL PUENTE LAS QUINTAS: se realiza la demarcacion del muro tipo new jersey en pintura tipo acrica con microesferas reflectivas.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES RESALTOS
INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES RESALTOS





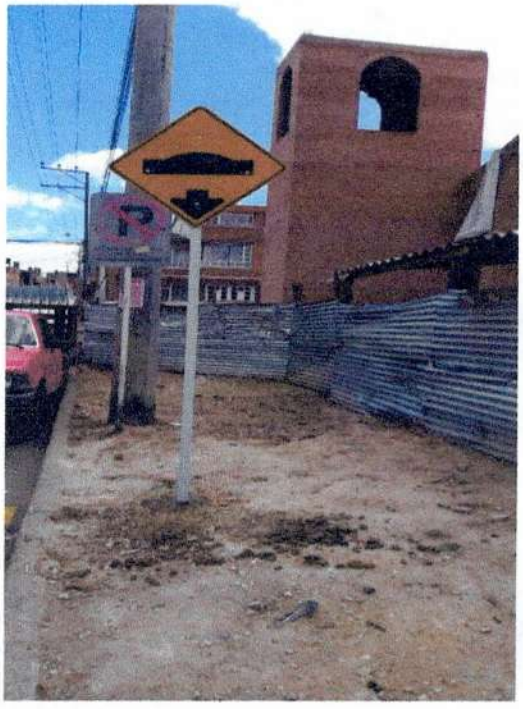

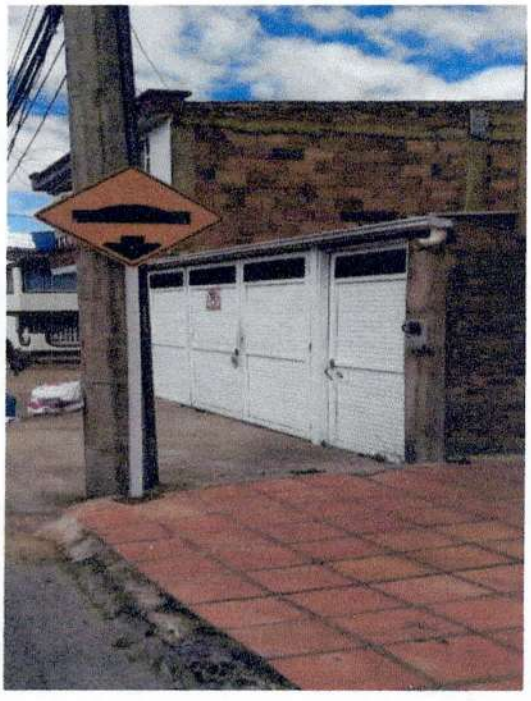


















PINTURA MURO PUENTE LAS QUINTAS










RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CODIGO:GIN-F- 033
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	28 DE ENERO DE 2022	PERIODO No.	12	DEL	21 DE ENE DE 2022	AL	28 DE ENERO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	84 EQUIVALE AL 91%	PLAZO TRANSCURRIDO:	84 EQUIVALE AL 91%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Interventor	VALOR PAGADO:	<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista recuerde que el anticipo no es un pago>
VALOR POR PAGAR:		VALOR POR PAGAR:	
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

}

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	4/02/2022	4/02/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	4/02/2022	4/02/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	4/02/2022	4/02/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	2/02/2022	2/02/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	1/02/2022	1/02/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	31/01/2022	31/01/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestall.	2/02/2022	2/02/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	2/02/2022	2/02/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	23/12/2021	18/12/2021	5
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	23/12/2022	23/12/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	4/02/2022	4/02/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	4/02/2022	4/02/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	4/02/2022	4/02/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	4/02/2022	4/02/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	4/02/2022	4/02/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de Items

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 369.080.004.22	57.43%	-3.02%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 349.700.256.00	54.42%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

Se reporta un retraso en ejecucion de obra del 3.02% , el contratista de obra solicita suspensión del contrato contrato de obra, ya que hay escases de suministro de materiales para fabricar señales verticales y este items es uno de las mas relevante del contrato y se estaria generando incumplimientos acumulados aca en adelante.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se remite la solicitud de suspensión de obra a la entidad contrante.	Interventoria	28_01_2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría: El contratista presenta analisis de precios unitarios no previstos, para la demarcacion horizontal y venical del puente de las quintas.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: la interventoria porcede a realizar la respectiva revision de los analisis de precios unitarios no previstos, solicita al contratista ajustes a los mismos.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la entidad procede a realizar la revision de los analisis de precios unitarios no previstos entregados por el contratista.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1. Asistencia a comite virtual numero 10, el dia 14 de Enero de 2022, con asistencia del contratista de obra y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecucion del contrato. 2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO SUPERVISION.14- 01-2022. Remision de diseños demarcacion puente de las quintas.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA ENV.16- 11-01-2022. Solicitud complemento informe mensula #2.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA ENV.17-01-01-2022. Solicitud pago seguridad social ingeneiro residente.
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 21-01-2022. APUS no previstos demarcacion puente las quintas.
OFICIO ENVIADO A SUPERVISON 21-01-2022. Remision APUS no previstos demarcacion puente las quintas..


ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.


1. SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES DE RESALTOS: se realiza suministro e instalacion de señales verticales en resaltos solicitudes de la entidad contratante, barrios Santa Ines, Fuente Higueras, Paraiso, Patriotas, Curubal, La Maria, Altamira, entre otors,
2. INSTALACION DE PINTURA PLASTICA EN FRIO : se realiza instalacion de pintura plastica en frio por el metodo manuela tipo llana, segun diseños en los siguientes sectores: Avenida Maldonado con calle 29, Avenida Colon con carrera 12 y Avenida colon con carrera 13A.


7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES RESALTOS



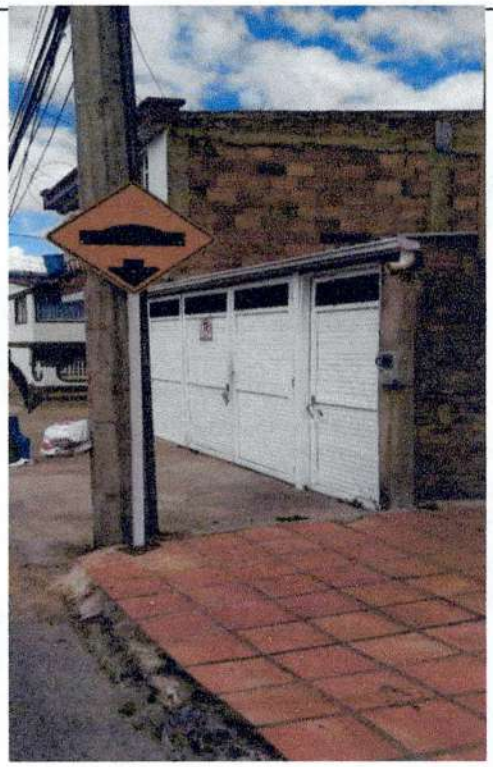

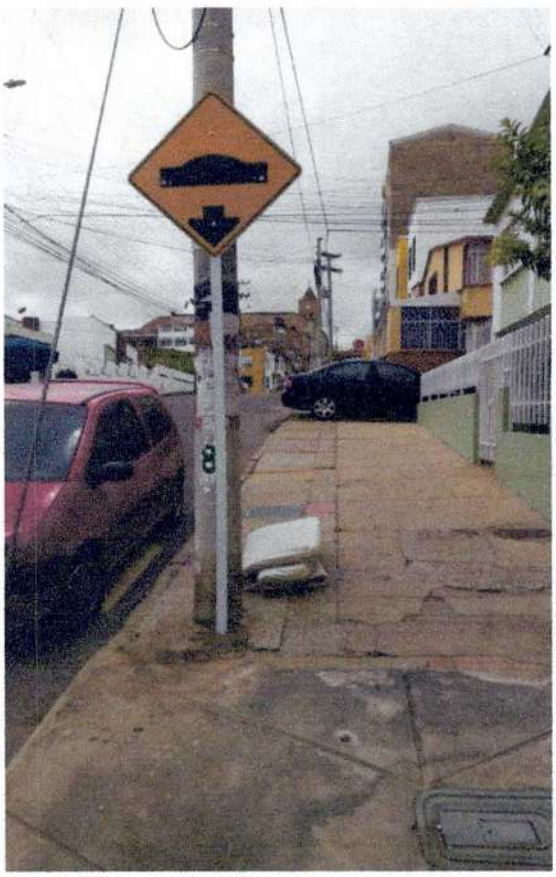

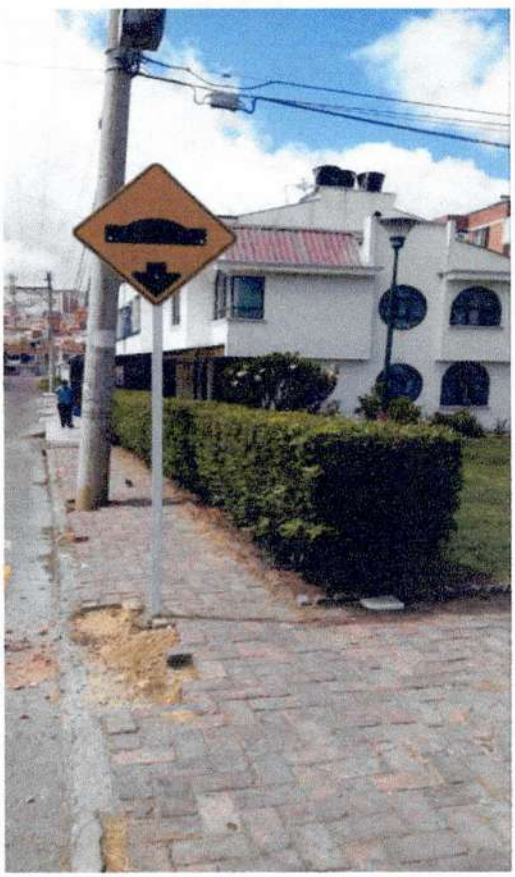












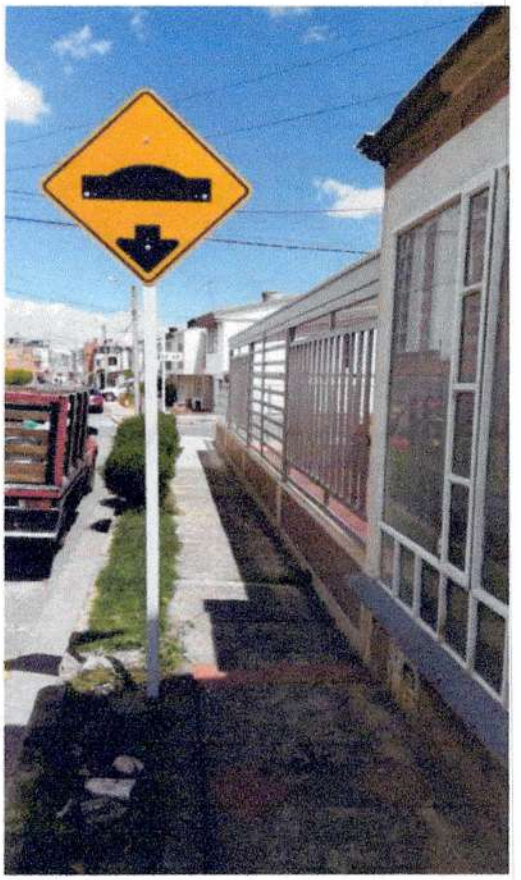

INSTALACION DE PINTURA PLASTICA EN FRIO

















WNO 508












RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F- 033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	21 DE MARZO DE 2022	PERIODO No.	13	DEL	15 DE MARZO DE 2022	AL	22 DE MARZO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO. EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	92	PLAZO ACTUALIZADO:	92
PLAZO TRANSCURRIDO:	92 EQUIVALE AL 100%	PLAZO TRANSCURRIDO:	92 EQUIVALE AL 100%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 37.074.450.00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 642.638.556.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ 225.273.356.00
VALOR POR PAGAR:	$ 37.074.450.00	VALOR POR PAGAR:	$ 417.365.200.00
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestaL	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	21/03/2022		NO SE HA TERMINADO, EN EJECUCION
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	21/03/2022	21/03/2022	0
Plazo del proyecto en días	92	92	92	0

Inserte las filas que requiera según el número de ítems

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 642.638.556,00	100,00%	-33,15%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 391.070.692,00	60,85%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

Una vez terminado el plazo contractual inicial, el contratista de obra no ejecuto el 100% del contrato inicial, se evidencia un retraso del 33,15)%, se acuerda ejecutar ese saldo en el tiempo de prorroga número 1.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se informa a la entidad contratante acerca del incumplimiento contractual	Interventroria	21_03_2022
Se ejecutaran las actividades retrasadas en el plazo de prorroga número 1.	Contratista	22_05_2022

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos.

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría: En comun acuerdo entre las partes se acuerda la necesidad de realizar un adicional en recursos y una prorroga en tiempo del contrato de obra, esto se deja soportado en el cómite de obra numero 13 del del 15 de Marzo de 2022. El contratista presenta analisis de precios unitarios no previstos, para la ejecucion del adicional número 1 del contrato.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: la interventoria procede a realizar la respectiva revision de los analisis de precios unitarios no previstos, se da su visto bueno a estos y son remitidos a la entidad contratante para su aprobacion.

c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la entidad procede a realizar la revision de los analisis de precios unitarios no previstos entregados por el contratisa y da su respectiva aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1.Reinicio de obra el dia 15 de Marzo de 2022.
2. Comite d eobra #13 el dia 15 de Marzo de 2022, con asistencia del contratista de obra, interventoria y supervisores de secretaria de tránsito y transporte, en el cual se informa avance fisico, financiero y temporal del contrato, asi como se acuerda la necesidad de realizar un adicional en recursos y una prorroga en tiempo del contrato de obra, fijan compromisos por las partes para avanzar en la ejecucion del contrato.
3.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoria:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 15-03-2022. Entrega de APUS no previstos para adicional en recursos y prorroga número 1.
OFICIO ENVIADO A SUPERVISION 15-03-2022. Remision APUS no previstos para adicional en recursos y prorroga número 1.

ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente seman se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES : se realiza suministro e instalacion de señales verticales segun diseños, Barrio , Maldonado, sector centro de la ciudad. 2.SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES DUPLEX: se realiza suministro e instalacion de señales verticales segun diseños. Barrio Las quintas y en la calle 32 entre carrera 11 y 14.
3.SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES SP 47B: se realiza suministro e instalacion de señales verticales segun diseños. Barrio Las quintas, en la calle 32 entre carreras 11 y 14 y en la via Tunja-Arcabuco.
4.SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VERTICALES SR 38: se realiza suministro e instalacion de señales verticales segun diseños, Barrio Las quintas, Barrio Maldonado, Barrio el Consuelo, y en la calle 32 entre carrera 16 y via Tunja-Arcabuco
5. SUMINISTRO E INSTALACION TACHAS : se realiza suministro e instalacion de Tachas en la Via Tunja-Arcabuco, en la calle 32 entre carrera 16 y via Tunja-Arcabuco, carrera 3 entre carra 11 y carrera 14, Avenida colon entre carrera 16 y calle 25.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES












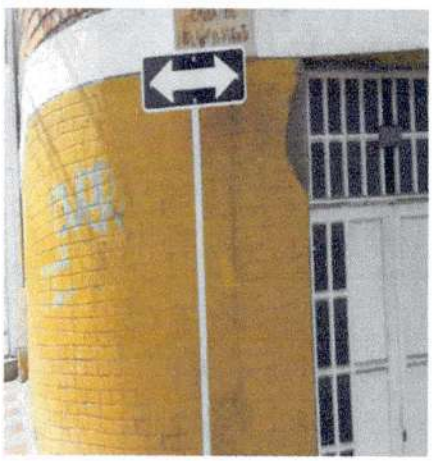

INSTALACION DE TACHAS











RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CODIGO:GIN-F- 033
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	31 DE MARZO DE 2022	PERIODO No.	14	DEL	23 DE MARZO DE 2022	AL	31 DE MARZO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022		
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	150	PLAZO ACTUALIZADO:	150		
PLAZO TRANSCURRIDO:	98 EQUIVALE AL 65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	98	EQUIVALE AL	65%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450.00	VALOR INICIAL :	$		642.638.556.00
VALOR ADICION(ES):	$ 17.768.822.00	VALOR ADICION(ES):	$		308.000.000.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 54.843.272.00	VALOR ACTUALIZADO:	$		950.638.556.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$		225.273.356.00
VALOR POR PAGAR:	$ 54.843.272.00	VALOR POR PAGAR:	$		725.365.200.00
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoria y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	13/04/2022	13/04/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	12/04/2022	12/04/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	11/04/2022	11/04/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38. lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestalL	13/04/2022	13/04/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	13/04/2022	13/04/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	19/05/2022	19/05/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	19/05/2022	19/05/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	19/05/2022	19/05/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
	ITEMS NO PREVISTOS			

17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIAS (espesor seco minimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Electrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días	150	150	150	0
Inserte las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 358.319.609,46	37,69%	23,89%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 585.397.654,00	61,58%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad Industrial

Se aprueba la programacion de obra en la cual se presentan las actividades del adicional en recursos 1 y una prorroga en tiempo de 2 meses.

Se evidencia un porcentaje ejecutado superior al programado, lo cual es bueno para el desarrollo del contrato

Se evidencia la implementacion de 3 cuadrillas de trabajo, una en la parte de demarcacion lineal, la segunda en demarcacion horizontal y una tercera especifica en trabajos de demarcion y señalizacion del puente de las quintas.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría: En comun acuerdo entre las partes se acuerda la necesidad de realizar un adicional en recursos y una prorroga en tiempo del contrato de obra, esto se deja aportado en el cómite de obra numero 13 del del 15 de Marzo de 2022. El contratista presenta analisis de precios unitarios no previstos, para la ejecucion del adicional número 1 del contrato.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista: la interventoria porcede a realizar la respectiva revision de los analisis de precios unitarios no previstos, se da su visto bueno a estos y son remitidos a la entidad contratante para su aprobacion.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la entidad procede a realizar la revision de los analisis de precios unitarios no previstos entregados por el contratista y da su respectiva aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1.Suscripcion de adicional en recursos #1 y prorroga en tiempo #1, apartir del dia 23 de Marzo de 2022.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoría:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 24-03-2022. Entrega de Programavcion de obra para adicional en recursos y prorroga número 1.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA 24-03-2022.Observaciones a Programavcion de obra para adicional en recursos y prorroga número 1.
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 25-03-2022. Entrega de complemento programacion de obra para adicional en recursos y prorroga número 1.
v
ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. PUENTE Y VIAS DEL BARRIO LAS QUINTAS: Se realiza la intervencion del puente vehicular y las vias aledañas del Barrio las quintas, se realiza segun el diseño entregado por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimacion y la aplicacion de pintura de plástico en frio y pintura acrilica para la demarcacion horizontal. Ademas tambien se realiza la demarcacion lineal del puente y de las vias del barrio las Quintas realizando la respectiva imprimacion y demarcacion con pintura tipo acrilica. Asi mismo se ejecuta la señalizacion vertical tanto del puente como de las vias aledañas. Ademas segun diseños se realiza la instalacion de dispositivos para la canalizacion del transito tachones e hitos.
2. DEMARCACION HORIZONTAL Y VERTICAL RESALTOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD: Se realiza la intervencion de un listado de reductores de velocidad proporcionado por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimacion y la aplicacion de pintura de plástico en frio para la demarcacion horizontal. Asi mismo se termina la señalizacion vertical de estos, labor que ya se venia adelantando.
3. DEMARCACION LINEAL SECTORES PRIORIZADOS DE LAS CIUDAD: Se realiza la intervencion de sectores priorizados por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimacion y la aplicacion de pintura de tipo acrilica. Entre estos sectores se encuentra la avenida Colon entre carrera 16 y calle 25, la avenida maldonado entre la calle 25 y la glorieta del hugolino, las vias del barrio la florida, la calle 32 entre carrera 16 y via Tunja-Arcabuco y alrededor de 15 puntos o intersecciones del centro historico de la ciudad.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL PRESENTE PERIODO

INTERVENCION PUENTE Y VIAS BARIIO LAS QUINTAS





























ESPACIO

INTERVENCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD














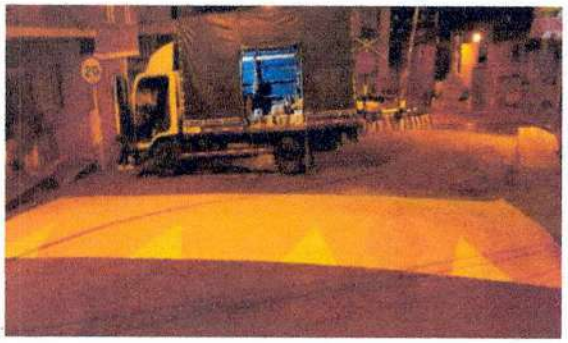



















DEMARCACION LINEAL SECTORES PRIORIZADOS DE LA CIUDAD





























RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE



CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/20
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	CODIGO:GIN-F-
	FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	07 DE ABRIL DE 2022	PERIODO No.	15	DEL	01 DE ABRIL DE 2022	AL	07 DE ABRIL DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE INICIO PRORROGA #1	23 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 3	22 DE MAYO DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	150	PLAZO ACTUALIZADO:	150
PLAZO TRANSCURRIDO:	106 EQUIVALE AL 71%	PLAZO TRANSCURRIDO:	106 EQUIVALE AL 71%
VALOR INICIAL :	$ 37.074.450,00	VALOR INICIAL :	$ 642.638.556,00
VALOR ADICION(ES):	$ 17.768.822,00	VALOR ADICION(ES):	$ 308.000.000,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 54.843.272,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 950.638.556,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ 225.273.356,00
VALOR POR PAGAR:	$ 54.843.272,00	VALOR POR PAGAR:	$ 725.365.200,00
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrílica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015. numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	13/04/2022	13/04/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias.	12/04/2022	12/04/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	11/04/2022	11/04/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38. lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestall.	13/04/2022	13/04/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	13/04/2022	13/04/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
12	Suministro e instalacion de taches reflectivas unidireccionales y bidireccionales	19/05/2022	19/05/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	19/05/2022	19/05/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	19/05/2022	19/05/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
	ITEMS NO PREVISTOS			

17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIAS (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Electrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días	150	150	150	0
Inserte las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 493 975 938 73	42.50%	27.16%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 862 261 782 00	69.65%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Se evidencia un porcentaje ejecutado superior al programado, lo cual es bueno para el desarrollo del contrato

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría:
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la Interventoría y del contratista:
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1.Suscripcion de adicional en recursos #1 y prorroga en tiempo #1, apartir del dia 23 de Marzo de 2022.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoria: No hubo
v
ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS. En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. Suministro y aplicación manual (método lliha) de pintura de plástico en frio en los siguientes sectores:
1.1 Interseccion de la Avenida universitaria con carrera 2 este o esquina del colegio de los Angeles.
1.2. Interseccion de la carrera 11 con avenida colon o esquina de la universidad Juan de castellanos.
1.3. Interseccion de la carrera 9 con calle 18 (Esquina Colegio del Rosario).
1.4. Interseccion de la carrera 11 con calle 16.
1.5 Interseccion de la carrera 12 con calle 21A. 1.6 Interseccion de la carrera 9 con calle 21.
1.7. Resaltos avenida Universitaria. .

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL PRESENTE PERIODO

COLEGIO DE LOS ANGELES






INTERSECCION AV COLON CON CARRERA 11 (ESQUINA JUAN DE CASTELLANOS)






INTERSECCION CARRERA 9 CON CALLE 18 (ESQUINA COLEGIO EL ROSARIO)






INTERSECCION CARRERA 11 CON CALLE 16






INTERSECCION CARRERA 9 CON CALLE 21




INTERVENCION REDUCTORES DE VELOCIDAD AVENIDA UNIVERSITARIA

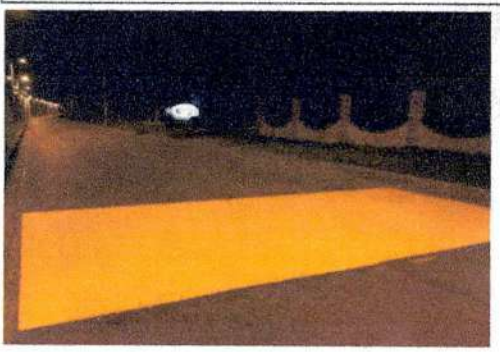











RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE

CONTRATISTA

NOMBRE: ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**

	ALCALDIA DE TUNJA	FECHA: 09/09/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FORMATO:INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO:GIN-F-033

*** Esta versión aplica para los contratos que inicien posteriormente a la fecha de la vigencia de este formato**

FECHA	31 DE MARZO DE 2022	PERIODO No.	14	DEL	23 DE MARZO DE 2022	AL	31 DE MARZO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE TUNJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	1068 DE 2021	CONTRATO No.:	1036 DE 021		
PLAZO INICIAL:	3 MESES	PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	28 DE ENERO DE 2022		
TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE SUSPENSION INICIAL	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #1	12 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #1	15 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #2	25 DE FEBRERO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	6 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #2	6 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022	FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION #3	04 DE MARZO DE 2022		
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO	TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSION #3	10 DIAS CALENDARIO		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN:	15 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 2:	22 DE MARZO DE 2022		
**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022	**FECHA DE INICIO PRORROGA #1:	23 DE MARZO DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN 3:	22 DE MAYO DE 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	150	PLAZO ACTUALIZADO:	150		
PLAZO TRANSCURRIDO:	98 EQUIVALE AL 65%	PLAZO TRANSCURRIDO:	98	EQUIVALE AL	65%
VALOR INICIAL :	$ 37,074,450.00	VALOR INICIAL :	$		642,638,556.00
VALOR ADICION(ES):	$ 17,768,822.00	VALOR ADICION(ES):	$		308,000,000.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 54,843,272.00	VALOR ACTUALIZADO:	$		950,638,556.00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$		225,273,356.00
VALOR POR PAGAR:	$ 54,843,272.00	VALOR POR PAGAR:	$		725,365,200.00
SUPERVISOR:	ING. LUIS FELIPE CARDENAS AVILA	INTERVENTOR:	ING. CESAR HERNANDO FIGUEROA BAEZ		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (OBLIGATORIO)	5/11/2021	5/11/2021	0
0	Recopilación de información, entrega de documentación para inicio del contrato, revisión y armonización de los diseños, entrega del plan de manejo de tráfico y autorización por parte de interventoría y entidad contratante para el inicio de las actividades	19/11/2021	19/11/2021	0
1	Suministro e instalacion de señales reglamentarias 60 x 60 cm	13/05/2022	13/05/2022	0
2	Marcas viales con pintura de trafico segun norma invias y diseño (incluye microesferas)	18/05/2022	18/05/2022	0
3	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio alta duración metil-metacrilato 100% puro con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma ntc-1360-1, para pasos peatonales, avisos en la carretera y zonas donde se presente abrasión severa por parte de los vehículos y peatones (incluye todos los elementos necesarios para su aplicación y mano de obra)	20/05/2022	20/05/2022	0
4	Suministro y aplicacion de pintura acrilica con microesferas, lineas continuas y discontinuas de 12 cms segun norma invias	20/05/2022	20/05/2022	0
5	Suministro e instalación de señalización vial vertical doble (duplex) en papel reflectivo 60 x 60 zona urbana, según especificaciones relacionadas en el manual de señalización vial adoptado por la resolución 1885 de 2015, numerales 2.2.2. Y 2.1.6.2 (incluye todos los elementos necesarios para si instalación entre ellos herramienta menor, excavación, concreto y ,mano de obra)	13/04/2022	13/04/2022	0
6	Suministro e instalación de señal vertical de transito preventivas sp-47b, tamaño 60 x 60 cm. Elaboradas en lamina galvanizada cal.16 papel reflectivo grado xi (diamante al cubo marca 3m) pedestal elaborado en angulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostatica. Segun norma invias..	12/04/2022	12/04/2022	0
7	Retiro de señales verticales (incluye pedestal y tablero) con entrega en la respectiva entidad territorial (incluye señales sencillas y dúplex)	11/04/2022	11/04/2022	0
8	Suministro e instalación señales verticales sr-38, lámina galvanizada reflectividad tipo xi, grado diamante al cubo, con pedestal.	13/04/2022	13/04/2022	0
9	Señales preventivas (sp) y reglamentarias (sr) 60 x 60 cm reflectivo verde limon	13/04/2022	13/04/2022	0
10	Señales de transito dimensiones 60*75 cms (delineadores de curva) según norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
11	Señales de transito 0.90*1.13 mts (informativas) segun norma invias	13/04/2022	13/04/2022	0
12	Suministro e instalacion de tachas reflectivas unidireccionales y bidireccionales	19/05/2022	19/05/2022	0
13	Suministro e instalacion de hitos (alto =75 cm d=8 cm) de color amarillo	19/05/2022	19/05/2022	0
14	Suministro e instalacion de tachones 40*15*8 cm	19/05/2022	19/05/2022	0
15	Estoperoles d=10 cm h=25 cms	5/11/2021	5/11/2021	0
16	PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO	22/05/2022	22/05/2022	0
	ITEMS NO PREVISTOS			

17	NP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE EN PINTURA ACRILICA , LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 15 CMS SEGÚN NORMA INVIAS (espesor seco mínimo 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
18	NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE EN PINTURA DE TRAFICO ACRILICA, (Espesor seco mínimo de 9 mils)	18/05/2022	18/05/2022	0
19	NP-03 RETIRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD BASE DE HITOS, BASE DE TACHONES	12/05/2022	12/05/2022	0
20	NP-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METALICOS D=10 CM H=2CMS (Incluye, Planta Electrica, Taladro, Broca, Aditivo Epóxico, y demas elementos para su correcta instalación).	18/05/2022	18/05/2022	0
21	NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS	17/05/2022	17/05/2022	0
22	NP-06 BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo)	18/05/2022	18/05/2022	0
23	NP-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL CHEVRON DE 40CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
24	NP-08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DOL DE 20CM X90CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
25	NP-09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA – EN ANDÉN, (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en tubi de 2", pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
26	NP-10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PARA CICLORUTA -ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática).	19/05/2022	19/05/2022	0
27	NP-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL TIPO DELINEADOR DE CURVA 60CM X 75CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
28	NP-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA O REGLAMENTARIA DE 60CM X 60CM - ANCLADA EN PUENTE VEHICULAR. (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática):	19/05/2022	19/05/2022	0
29	NP-13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 1,77CM X 0,44CM (Elaboradas en lámina galvanizada Cal.16 papel reflectivo grado XI (diamante al cubo) pedestal elaborado en ángulo de 2" x 2" x 1/4 pintura electrostática	19/05/2022	19/05/2022	0
30	NP-14 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H0.40 MTS - A=0.2 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	6/04/2022	6/04/2022	0
31	NP-15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	6/04/2022	6/04/2022	0
32	NP-16 CORTE DE PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN DE ARCILLA	6/04/2022	6/04/2022	0
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	20/05/2022	20/05/2022	0
Plazo del proyecto en días	150	150	150	0
Inserte las filas que requiera según el número de ítems				

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 358.319.609,46	37,69%	31,85%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría.	$ 661.059.045,00	69,54%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación (cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental y Seguridad industrial

Se aprueba la programacion de obra en la cual se presentan las actividades del adicional en recursos 1 y una prorroga en tiempo de 2 meses.

Se evidencia un porcentaje ejecutado superior al programado, lo cual es bueno para el desarrollo del contrato

Se evidencia la implementacion de 4 cuadrillas de trabajo, una en la parte de demarcacion lineal, la segunda en demarcación horizontal de resaltos, la tercera en instalacion de señalizacion vertical de resaltos y una cuarta especifica en trabajos de demarcion y señalizacion del puente de las quintas.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la interventoría: En comun acuerdo entre las partes se acuerda la necesidad de realizar un adicional en recursos y una prorroga en tiempo del contrato de obra, esto se deja aportado en el cómite de obra numero 13 del del 15 de Marzo de 2022. El contratista presenta analisis de precios unitarios no previstos, para la ejecucion del adicional número 1 del contrato.
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: la interventoria procede a realizar la respectiva revision de los analisis de precios unitarios no previstos, se da su visto bueno a estos y son remitidos a la entidad contratante para su aprobacion.
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte del MUNICIPIO: la entidad procede a realizar la revision de los analisis de precios unitarios no previstos entregados por el contratista y da su respectiva aprobación.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
1.Suscripcion de adicional en recursos #1 y prorroga en tiempo #1, apartir del dia 23 de Marzo de 2022.
2.Revisión de documentación remitida por el contratista y supervisor, a continuación de relaciona la documentación recibida y enviada, junto con la actuación de la interventoria:
FECHA DOCUMENTACION APORTADA Y ACTUACION INTERVENTORIA:
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 24-03-2022. Entrega de Programavcion de obra para adicional en recursos y prorroga número 1.
OFICIO ENVIADO A CONTRATISTA 24-03-2022.Observaciones a Programavcion de obra para adicional en recursos y prorroga número 1.
OFICIO RECIBIDO DE CONTRATISTA 25-03-2022. Entrega de complemento programacion de obra para adicional en recursos y prorroga número 1.
y
ACTIVIDADES FISICAS REALIZADAS: En la presente semana se intervinieron los siguientes sectores de la ciudad.

1. PUENTE Y VIAS DEL BARRIO LAS QUINTAS: Se realiza la intervencion del puente vehicular y las vias aledañas del Barrio las quintas, se realiza segun el diseño entregado por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimacion y la aplicacion de pintura de plástico en frio y pintura acrilica para la demarcacion horizontal. Ademas tambien se realiza la demarcacion lineal del puente y de las vias del barrio las Quintas realizando la respectiva imprimacion y demarcacion con pintura tipo acrilica. Asi mismo se ejecuta la señalizacion vertical tanto del puente como de las vias aledañas. Ademas segun diseños se realiza la instalacion de dispositivos para la canalizacion del transito tachones e hitos. Se construye separador en la salida del puente.
2. DEMARCACION HORIZONTAL Y VERTICAL RESALTOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD: Se realiza la intervencion de un listado de reductores de velocidad proporcionado por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimacion y la aplicacion de pintura de plástico en frio para la demarcacion horizontal. Asi mismo se termina la señalizacion vertical de estos, labor que ya se venia adelantando.
3. DEMARCACION LINEAL SECTORES PRIORIZADOS DE LAS CIUDAD: Se realiza la intervencion de sectores priorizados por la secretaria de tránsito de Tunja, para la cual se realiza imprimacion y la aplicacion de pintura de tipo acrilica. Entre estos sectores se encuentra la avenida Colon entre carrera 16 y calle 25, la avenida maldonado entre la calle 25 y la glorieta del hugolino, las vias del barrio la florida, la calle 32 entre carrera 16 y via Tunja-Arcabuco y alrededor de 15 puntos o intersecciones del centro historico de la ciudad.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL PRESENTE PERIODO

INTERVENCION PUENTE Y VIAS BARIIO LAS QUINTAS









