BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal #1 Interventor: CONSORCIO SANTA TERESA 28

noviembre 20, 2024 al noviembre 24, 2024

1. Datos Generales

PARQUE	Código: 03-035	Localidad:	SANTAFE
NACIONAL		Barrio:	LA MERCED

2. Contrato de Obra

COP No.	4060-2024

Objeto: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2 - "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Contratista: CONSORCIO BELZCON IDRD 1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
20-nov-24	- 8 MESES	19-jul-25	0	19-jul-25				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Costo Directo	9.383.224.371,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
A.I.U. (36,49%)	3.423.938.573,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sub Total	12.807.162.944,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS REEMBOLSABLES/ COMPLEMENTARIOS	93.186.863,00						
Total Inicial	12.900.349.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Adición No. 1	-						
Total Final	12.900.349.807,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Anticipo: (40% Sobre costo directo)	3.753.289.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total	3.753.289.748,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10		
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				

3. **Contrato de Interventoría**

	CI No.	**4080-2024**	
Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2		
Contratista:	**CONSORCIO SANTA TERESA 28**		

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
20-nov-24	9 MESES	19-ago-25	0	19-ago-25				

	Valores Iniciales	Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	2.107.109.833,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Iva (19%)	-	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Sub Total	2.107.109.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Adición:	-						
Total Final	2.107.109.833,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Retegarantía:	210.710.983,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	1.896.398.850,00	$ 0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acumulado		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

		Acta 7	Acta 8	Acta 9	Acta 10		
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				
		$ 0,00	$ 0,00				

#1	Fecha de corte:	noviembre 24, 2024	

4.

Datos Generales Parques Contractuales	PARQUE	VALOR	% Ejecución Acumulado		Código:	Localidad:	OBSERVACIONES
			Prog.	Real			
	PPARQUE NACIONAL	$ 604.478.878,00	0,00%	0,00%	03-035	SANTAFE	el contratista entrega una primera version del presupuesto del parque nacional por un valor $604,478,878 de acuerdo a la visita realizada en compañía de la supervision, interventori y contratista
	TOTAL		0,00%	0,00%			

5			
	Fecha Inicial:	20-nov-24	6. OBSERVACIONES: La interventoría mediante el comunicado IDRD-4080-G2-2024-001 le solicita al contratista teniendo en cuenta que de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD frente a la intervención prioritaria en el Parque Nacional y considerando que el CONSORCIO BELZCON IDRD 1 manifestó ingreso de personal operativo para el próximo lunes 18 de noviembre de 2024, por medio de la presente se solicita la remisión de los documentos de ingreso, a saber: -Afiliación a EPS -Afiliación a ARL -Afiliación a Pensiones -Exámenes médicos vigentes -Copia de la cédula de ciudadanía Es pertinente resaltar que los documentos en mención deben entregarse a esta interventoría oportunamente, previo al ingreso del personal operativo durante la ejecución del contrato descrito en la referencia.
	Fecha de Terminación Inicial:	19-jul-25	
	Adición de tiempo en (meses):	0-ene-00	
	Fecha de Terminación Final:	19-jul-25	

7. Licencias:

Construcción:		Ambiental:	N/A	Intervensión del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS		CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2024		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	
		JUN	JUL	AGOS			

10. Observaciones por parques:

1.- se realiza visita en compañía de la supervision, interventoria y contratista para analizar las necesidades a realizar en el parque nacional, se anexa acta realizada en sitio

11. INFORME TÉCNICO

• PARQUE NACIONAL: segun lo requerido por la supervision del IDRD se inicia con las siguientes actividades:

- Se avanza con la demolicion de las placas que se encuentran en mal estado en la rotonda mapa de las americas
- Se inicia con la instalacion de canecas en acero inoxidable en los lugares aprobados por la administracion del parque
- Se realiza muestra de estampado en la zona donde se enecuentra las tabletas de colores amarillo, azul y rojo

12. COMPONENTE SST

Actividades de interventoría: se envia comunicado IDRD-4080-G2-2024-001 donde la interventoria SOLICITUD REMISIÓN DOCUMENTACIÓN COMPONENTE SST(se anexa comunicado)

12. COMPONENTE LEGAL

Se suscribe acta de inicio del contrato el 20 de noviembre de 2024, en proceso de legalización en la entidad.

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Recorrido Priorización Ctos 4041/24, 4060/24, 4080/24.	DD	MM	AA
ACTA No.		15	11	2024

LUGAR: Parque Nacional HORA DE INICIO: 8:00 am HORA FIN:

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Recorrido Pijaos - Cancha	4.
2. Visita Palermo Sur	5.
3. Parque Nacional	6.

TEMAS TRATADOS

1. Pijaos - Cancha:
- Mantenimiento, pintura arcos de fútbol
- Cotización (presupuesto) luminarias LED 300 luxes
- Mantenimiento de grama → Retiro de grama, chequeo de niveles, revisión y limpieza de desagües.
Nivelación con el material requerido, imprimación y colocación de césped.
- Revisión de medidas de arco: Para F11 debe ser reglamentario
- Arcos móviles con guaya obligatoriamente. (todo lo movible debe tener guaya).
- Retirar llantas de los arcos.
- Arcos F8 de 5 x 2,30 de altura, se deben revisar las medidas.
- Cerramiento perimetral, mantenimiento. (cambio de la d, por ahora solo ppio)
- Instalación de grama:
Se cepilla la fibra, se aplica la primera capa de arena, se instala caucho acorde con la especificación.
Como no cabe todo el caucho inicialmente, se debe almacenar el

TEMAS TRATADOS

- Desmonte, suministro e instalación de baranda (puede ser M83 debe evaluarse) en la media luna cercana a la pista (cancha tenis)
- Sanblastear con arena la baranda de la cancha de hockey, pintar bordillo amarillo, cambio de tableros y destroncar la pista de patinaje.
- Reposición de piezas en madera de Kioskos de cancha de tenis.
- Cambio de madera plástica en contenedores y mantenimiento de baños "goteras luz".
- Revisar si los nichos se pueden intervenir por patrimonio son 5.
- Mantenimiento muro puente
- Hacer filtro por apozamiento de agua por infiltración
- Arreglar antepecho en rotonda de la jardinera de francisco Orellana.
- Arreglar placas entrada a glorieta Santo Domingo.
- Arreglar puerta acceso a cancha F11
- Desmonte de poste metalico y afectado por abejas.
- Revisar cubierta de Kiosko en cancha hockey
- Suministro e instalación teja fibrocemento Kiosko hockey
- En senderos realizar tratamientos que sean necesarios para las raices, reconstrucción de placas afectadas con la estructura requerida.

Se solicita al IDRD allegar copia del permiso de Patrimonio, para las intervenciones, la entidad manifiesta que allegará la respuesta el día de hoy.

El IDRD reitera la necesidad de finalizar las obras antes del 6 de diciembre de 24.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Recorrido Priorización COP 4041/24 - 4060/24 FECHA: 15 11 2024

HORA INICIAL 8:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Nacional.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angelica Ramos H	Contratista	STP		IDRD		
2	Cristhian Correa	Contratista	STP		IDRD		
3	Jose Alberto Varela	Contratista	STP		IDRD		
4	JORGE MONTERO	CONTRATISTA	STP		IDRD		
5	Diego Cortés Cortés	Contratista	STP				
6	Liliana P. Barbosa B	Contratista	STP.		IDRD		
7	David Orlando Ortiz Stagnol	Equipo técnico			Bolzen SAS		
8	NESTOR BARON SIA	CONTRATISTA			BOLZEN		
9	Jorge B. Tovar	Contratista			Bolzen		
10	Paul D. Delgado C.	Interventor	CST 28		CST 28		
11	Daniel Moreno	Entrevistador	CST 28		CST 28		
12	Andrés Díaz F.	Adm Parques.	IDRD.				
13	Olgadúcia Suaq.	Prof Espe.	IDRD		IDRD		
14	Camilo Galindo	contratista	STP		IDRD		
15	Sabina A. Ramírez T	Silvicultor	STP/IDRD		IDRD		
16	Keidy Mayerli Cortés	contratista			Innovaparques		
17	Yaneth Fonseca R	Contratista	STP		IDRD.		
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

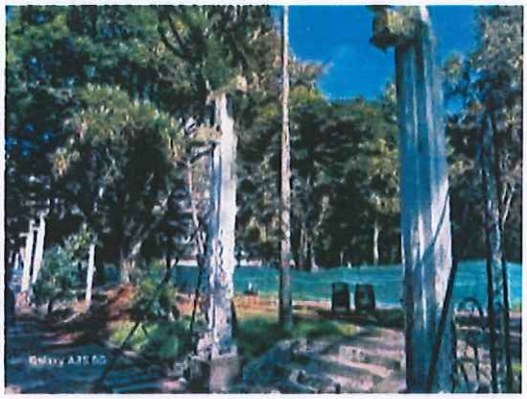
FOTOGRAFÍA (1)

	
PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL BORDILLO EN LADRILLO	PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL DE LOSETAS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (2)

	
PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL NICHOS EN ROTONDA MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL DE COLUMNAS ARTESANALES

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (3)

	
PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL SENDERO PEATONAL	PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL DE BARANDA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

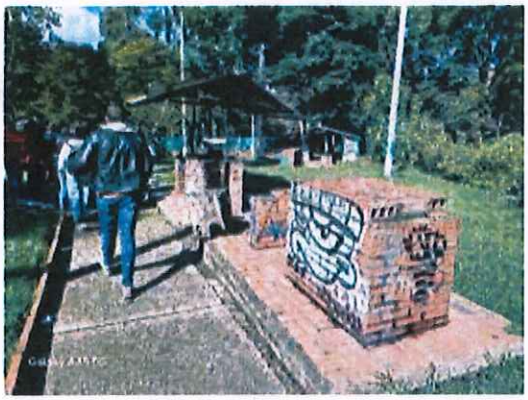
FOTOGRAFÍA (4)

	
PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL BARANDA PISTA DE PATINAJE	PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL PISO PISTA DE PATINAJE

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

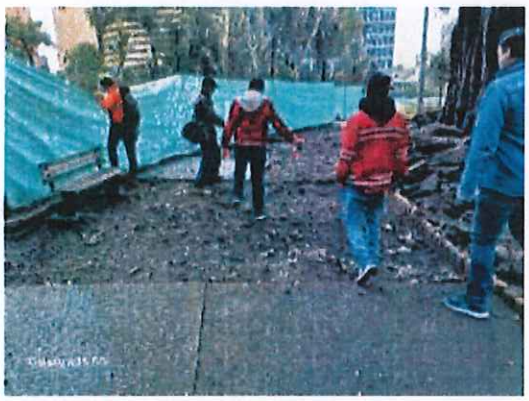
FOTOGRAFÍA (5)

	
PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL NICHOS ASADORES	PARQUE NACIONAL: ESTADO ACTUAL ANTEPECHO

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (6)

	
PARQUE NACIONAL: SE INICIA CON LA DEMOLICION DE PLACA	PARQUE NACIONAL: SE INICIA CON LA DEMOLICION DE PLACA

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (7)

	
PARQUE NACIONAL: SE REALIZA MUESTRA DE ESTAMPADO EN MAPA DE LAS AMERICAS	PARQUE NACIONAL: SE REALIZA MUESTRA DE ESTAMPADO EN MAPA DE LAS AMERICAS

SOLIUN INGENIERÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO
	CONSORCIO SANTA TERESA 28

NOMBRE DEL PROYECTO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO BELZCON IDRD 1
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	4080-2024
MES DEL REPORTE:	20-24 NOVIEMBRE

FOTOGRAFÍA (8)

	
PARQUE NACIONAL: SE AVANZA EN LA INSTALACION DE CANECAS	PARQUE NACIONAL: SE AVANZA EN LA INSTALACION DE CANECAS

CONSORCIO
SANTA TERESA 28

NIT. 901.888.461-1

IDRD-4080-G2-2024-046

Bogotá D. C., 12 de diciembre de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100425382 Código Web eq?a2H
FECHA:12-12-2024 15:38:54 FOLIOS 15
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍ
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: Contrato de interventoría No. IDRD-SG-4080-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1**
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 4060 DE 2024

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2024 y el 24 de noviembre de 2024, para el contrato de interventoría que se describe en la referencia.

El informe corresponde a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de interventoría 4080 de 2024, referente al seguimiento y control del contrato de obra 4060 de 2024 (parques).

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (14) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A
