Tunja, 26 de julio de 2024

CSC PVR 033 2024

SEÑORES
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS

RICARD
RESPUESTAS INTEGRADAS SAS
Interventoría

Referencia: **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORÁMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE PROPIA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS”.**

Asunto: Radicación Acta parcial No. 1

Respetados,

En atención a la ejecución del contrato de obra en referencia, me permito radicar Acta Parcial No. 1 con los respectivos soportes, según anexo contractual:

1. Memorias de Cálculo con cantidades
2. Balance de la ejecución de actividades
3. Copia de bitácora del periodo a cancelar
4. Factura para cobro (borrador)
5. Informe técnico de obra
6. Informe HSEQ de obra
7. Certificado aporte parafiscales
8. Planillas de parafiscales

Agradecemos de antemano la atención prestada a nuestra solicitud. Deseamos recibir prontamente una respuesta.

Atentamente,



MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
R.L. CONSORCIO PORVENIR
NIT NO. 901.818.757-7

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca - Amazonas

CONTRATO DE OBRA No. 18 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"

ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 01 | **PERIODO MES DE: 07 de junio de 2024 al 25 de julio de 2024** | **FECHA: Julio 15 de 2024**

CONTRATISTA	:	CONSORCIO PORVENIR
NIT	:	901.818.757-7
DIRECCIÓN	:	CL 20 # 12 - 84, TUNJA-BOYACÁ
TELÉFONO	:	3105602708
INTERVENTOR	:	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S
NIT	:	900.704.712-2
DIRECCIÓN	:	CL 13 # 108-100, BOGOTÁ D.C
TELÉFONO	:	3107695884

VR.INICIAL OBRA	:	**$ 627.118.212,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. ADICIONAL No.	:	**$ 0,00**
VR. TOTAL	:	**$ 627.118.212,00**
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	:	**$ 0,00**
AMORTIZADO ACTA No.1	:	**$ 0,00**
AMORTIZADO ACTA No.2	:	**$ 0,00**
SALDO POR AMORTIZAR	:	**$ 0,00**

LOCALIZACIÓN	:	GACHETA CUNDINAMARCA
FECHA INICIACIÓN	:	07 DE JUNIO DE 2024
PLAZO INICIAL	:	8 MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 1	:	
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	:	
PLAZO TOTAL	:	8 MESES
FECHA SUSPENSIÓN No.	:	
FECHA REINICIACIÓN No.	:	
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	:	02 DE FEBRERO DE 2025

BALANCE GENERAL N° 3 ACTUALIZADO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**			**CONDICIONES ACUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**					
											PRESENTE ACTA		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**	**(+/-)**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO ($)**
1	**OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES**				**$ 287.137.459,00**					**$ 295.836.757,20**				**$ 0,00**		**$ 8.824.625,92**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	49,00	$ 6.104,00	$ 299.096,00	-	-18,70	-$ 114.145,00	30,30	$ 184.951,20	30,30	$ 184.951,20		$ 0,00	30,30	$ 184.951,20
1.2	CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN FIBRA CON PARALES Y SEÑALIZACIÓN	ML	32,00	$ 29.982,00	$ 959.424,00	-	61,10	$ 1.831.900,00	93,10	$ 2.791.324,00	35,74	$ 1.071.556,68		$ 0,00	35,74	$ 1.071.556,68
1.3	DESMONTE DE PIEDRA DE ORNATO INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	M2	7,00	$ 32.124,00	$ 224.868,00	-	1,58	$ 50.756,00	8,58	$ 275.624,00	8,58	$ 275.623,92		$ 0,00	8,58	$ 275.623,92
1.4	DESMONTE DE REDES SANITARIAS CON REUBICACIÓN HACIA CAJAS ALEDAÑAS	ML	65,00	$ 29.982,00	$ 1.948.830,00		0,00	$ -	65,00	$ 1.948.830,00	65,00	$ 1.948.830,00		$ 0,00	65,00	$ 1.948.830,00
1.5	DESMONTE DE REDES HIDRAULICAS CON DESVIACIÓN HACIA PATIO INTERIOR	ML	56,00	$ 23.558,00	$ 1.319.248,00		31,92	$ 751.971,00	87,92	$ 2.071.219,00	87,92	$ 2.071.219,36		$ 0,00	87,92	$ 2.071.219,36
1.6	DEMOLICION DE PLACA REFORZADA E=10 CM. INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	M2	12,00	$ 64.248,00	$ 770.976,00		8,89	$ 570.843,00	20,89	$ 1.341.819,00	20,89	$ 1.342.140,72		$ 0,00	20,89	$ 1.342.140,72
1.7	DEMOLICION DE JARDINERAS INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	GL	1,00	$ 191.673,00	$ 191.673,00	-	0,00	$ -	1,00	$ 191.673,00	1,00	$ 191.673,00		$ 0,00	1,00	$ 191.673,00
1.8	DEMOLICION MURO EN LADRILLO PISO 1 A 4, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M2	4,20	$ 42.832,00	$ 179.894,00	-	0,00	$ -	4,20	$ 179.894,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE DISPOSICION TEMPORAL Y FINAL DEL MATERIAL.	M3	24,00	$ 63.177,00	$ 1.516.248,00	-	3,52	$ 222.194,00	27,52	$ 1.738.442,00	27,52	$ 1.738.631,04		$ 0,00	27,52	$ 1.738.631,04
1.10	BASE COMPACTADA SEGÚN DISEÑO EN MATERIAL APTO PARA RESISTIR PESO Y HUMEDAD DEL SECTOR.	M3	2,80	$ 170.257,00	$ 476.720,00		3,67	$ 624.332,00	6,47	$ 1.101.052,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	SUBBASE SEGUN DISEÑO EN MATERIAL APTO PARA SOPORTAR TRANSICIÓN ENTRE MATERIALES.	M3	2,80	$ 128.496,00	$ 359.789,00		3,67	$ 471.195,00	6,47	$ 830.984,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.12	FOSO SEGÚN DISEÑO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,20	$ 1.124.342,00	$ 2.473.552,00		1,48	$ 1.666.180,00	3,68	$ 4.139.733,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.13	ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PUENTES, PLATINAS DE EXTENSIÓN, GUIAS INTERIORES, VIGA DE ISAJE, PLATINAS, ENTRE OTROS.	KG	2500,00	$ 25.164,00	$ 62.910.000,00	-	0,00	$ -	2500,00	$ 62.910.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS EN ACERO INOXIDABLE 304, 1,2 mm SEGÚN CONTORNO DE ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSOR DE 2,2 M DE ALTURA	UND	4,00	$ 888.766,00	$ 3.555.064,00	-	0,00	$ -	4,00	$ 3.555.064,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.15	SISTEMA PANORAMICO DE VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 10 mm INCLUYE APLIQUES Y SOPORTES EN ACERO REFORZADO.	M2	65,44	$ 353.365,00	$ 23.124.206,00	-	0,00	$ -	65,44	$ 23.124.206,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.16	SISTEMA DE ANCLAJE A ESTRUCTURA REFORZADA EN PUNTOS DE CONEXIÓN SEGÚN DISEÑO	UND	12,00	$ 85.664,00	$ 1.027.968,00		0,00	$ -	12,00	$ 1.027.968,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.17	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC RETUIRIO Y DISPOSICIÓN A SITIO SUGERIDO POR LA RAMA JUDICIAL	M2	16,00	$ 64.248,00	$ 1.027.968,00		0,00	$ -	16,00	$ 1.027.968,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.18	CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO	M2	19,00	$ 535.401,00	$ 10.172.619,00		0,00	$ -	19,00	$ 10.172.619,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.19	PATOLOGIA A SITIOS REFERENCIADOS CON EL USO DE FERROSCAN Y OTROS EQUIPOS DE PRESICIÓN	GL	1,00	$ 7.923.934,00	$ 7.923.934,00	-	0,00	$ -	1,00	$ 7.923.934,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.20	ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE MAQUINAS Y SOPORTE SECUNDARIO DE CUBIERTA	M2	16,00	$ 256.992,00	$ 4.111.872,00	-	0,00	$ -	16,00	$ 4.111.872,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.21	SIMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS	UND	1,00	$ 144.986.582,00	$ 144.986.582,00	-	0,00	$ -	1,00	$ 144.986.582,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.22	Interruptor trifásico (Breaker) Industrial 3X40A Capacidad de Ruptura 25 KA incluye instalación en TGD y accesorios.	UN	1,00	$ 224.868,00	$ 224.868,00		0,00	$ -	1,00	$ 224.868,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.23	Acometida de tablero general de distribución TDG al tablero ascensor en (3No8+No8+1N10T)	ml	23,00	$ 40.690,00	$ 935.870,00		0,00	$ -	23,00	$ 935.870,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.24	Interruptor trifásico (Breaker) de caja moldeada de 3x40A instalado en cuarto de máquinas Incluye tablero para para alojamiento de breaker	UN	1,00	$ 310.533,00	$ 310.533,00		0,00	$ -	1,00	$ 310.533,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.25	suministro de instalaciones tubería EMT sobrepuesta de 1 1/4" con accesorios y sistema de anclaje.	ML	21,00	$ 40.690,00	$ 854.490,00	-	0,00	$ -	21,00	$ 854.490,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.26	Interruptor trifásico (Breaker) Industrial 3X30A Capacidad de Ruptura 25 KA incluye instalación en TGD y accesorios.	UN	1,00	$ 214.160,00	$ 214.160,00	-	0,00	$ -	1,00	$ 214.160,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.27	Acometida de tablero general de distribución TGD al tablero ascensor en(3No10+No10+1N12T)	ml	23,00	$ 21.416,00	$ 492.568,00	-	0,00	$ -	23,00	$ 492.568,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.28	Tablero Trifásico Con Puerta Cerrada y Espacio para Totalizador de 12 Circuitos, con totalizador de 30 A tipo riel de 10 KA y 3 interruptores de 1X20A enchufables instalado en el cuarto de	UN	1,00	$ 588.941,00	$ 588.941,00		0,00	$ -	1,00	$ 588.941,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.29	Suministro e instalaciones tubería EMT de 1 " sobrepuesta con accesorios y sistema de anclaje.	ML	21,00	$ 35.336,00	$ 742.056,00		0,00	$ -	21,00	$ 742.056,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.30	Salida de iluminación para foso del ascensor en cable No 12 y tubo EMT sobrepuesto incluye soportes, accesorios y toma.	UN	4,00	$ 214.160,00	$ 856.640,00		0,00	$ -	4,00	$ 856.640,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.31	Salida de toma monofásica de mantenimiento para foso del ascensor en cable No 12 y tubo EMT sobrepuesto incluye soportes, accesorios y toma.	UN	4,00	$ 214.160,00	$ 856.640,00	-	0,00	$ -	4,00	$ 856.640,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.32	Luminaria led cuadrada tipo exterior para foso ascensor incluye clavija y extensión 1 metro de cable encauchetado 3X12	UN	4,00	$ 160.620,00	$ 642.480,00	-	0,00	$ -	4,00	$ 642.480,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.33	PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 mm 15X15	M2	5,00	$ 85.664,00	$ 428.320,00	-	13,36	$ 1.144.086,00	18,36	$ 1.572.406,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.34	PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45	M2	5,00	$ 96.372,00	$ 481.860,00		13,25	$ 1.276.683,00	18,25	$ 1.758.543,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.35	PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45	M2	5,00	$ 96.551,00	$ 482.755,00		0,00	$ -	5,00	$ 482.755,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.36	REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA BATIENTE CERRAMIENTO AEREO DE EXTENSIÓN DE ASCENSOR. TUBO 1 1/2" X 1 1/2"	M2	7,10	$ 267.700,00	$ 1.900.670,00		0,00	$ -	7,10	$ 1.900.670,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.37	REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA LATERALES ASCENSOR TUBO 2" X 2"	M2	18,50	$ 267.700,00	$ 4.952.450,00		0,00	$ -	18,50	$ 4.952.450,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.38	ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN DISEÑO.	KG	271,00	$ 9.637,00	$ 2.611.627,00	-	21,10	$ 203.302,00	292,10	$ 2.814.929,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	**OBRA CIVIL MANTENIMIENTO PALACIO DE JUSTICIA -BAÑOS 2 Y 3**				**$ 12.624.355,00**					**$ 13.120.060,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 8.815.083,35**
2.1	DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL	M2	65,50	$ 32.679,00	$ 2.140.475,00	-	28,33	$ 925.796,00	93,83	$ 3.066.271,00	92,37	$ 3.018.559,23		$ 0,00	92,37	$ 3.018.559,23
2.2	DEMOLICION PISO AREA BAÑOS (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)	M2	18,00	$ 22.765,00	$ 409.770,00	-	12,39	$ 282.058,00	30,39	$ 691.828,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.3	DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO (INCLUYE PUERTAS METALICAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	UN	2,00	$ 26.209,00	$ 52.418,00	-	3,00	$ 78.627,00	5,00	$ 131.045,00	5,00	$ 131.045,00		$ 0,00	5,00	$ 131.045,00
2.4	DESMONTE LUMINARIAS	UN	6,00	$ 6.859,00	$ 41.154,00	-	84,00	$ 576.156,00	90,00	$ 617.310,00	51,00	$ 349.809,00		$ 0,00	51,00	$ 349.809,00
2.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINAL TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN	11,00	$ 11.758,00	$ 129.338,00	-	9,00	$ 105.822,00	20,00	$ 235.160,00	20,00	$ 235.160,00		$ 0,00	20,00	$ 235.160,00
2.6	DESMONTE CIELO RASO 4 PISO	M2	400,00	$ 24.628,00	$ 9.851.200,00	-	-59,80	$ 1.472.754,00	340,20	$ 8.378.446,00	206,29	$ 5.080.510,12		$ 0,00	206,29	$ 5.080.510,12
3	**CUBIERTA**				**$ 44.253.903,00**					**$ 44.394.627,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 25.865.465,36**
3.1	MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA EXCREMENTO PALOMAS Y MURCIELAGOS Y ARREGLO, LIJADA Y PINTURA ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	340,00	$ 125.384,00	$ 42.630.560,00	+	0,20	$ 25.077,00	340,20	$ 42.655.637,00	206,29	$ 25.865.465,36		$ 0,00	206,29	$ 25.865.465,36

3.2	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	ML	35,00	$ 38.549,00	$ 1.349.215,00	+	3,00	$ 115.647,00	38,00	$ 1.464.862,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.3	LIMPIEZA Y DESINFECCION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	UN	8,00	$ 34.266,00	$ 274.128,00	+	0,00	$ -	8,00	$ 274.128,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	**UNIDADES SANITARIAS**				**$ 69.117.325,00**					**$ 74.566.601,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 10.065.763,62**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO FORMATO 60*30 (INCLUYE SI APLICA EL PICADO DE MURO O PREPARACION DE SUPERFICIE DE MURO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ENCHAPE)	M2	70,00	$ 155.266,00	$ 10.868.620,00	-	41,24	$ 6.403.170,00	111,24	$ 17.271.790,00	46,19	$ 7.171.736,54		$ 0,00	46,19	$ 7.171.736,54
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO 60*60 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU INSTALACION)	M2	25,00	$ 139.204,00	$ 3.480.100,00	-	5,39	$ 750.310,00	30,39	$ 4.230.410,00	13,06	$ 1.818.004,24		$ 0,00	13,06	$ 1.818.004,24
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO CON BASE EN CONCRETO CON APOYOS 1.20 X 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS)	M2	2,16	$ 412.259,00	$ 890.479,00	+	0,22	$ 90.697,00	2,38	$ 981.176,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE PUERTA	M2	25,00	$ 1.265.688,00	$ 31.642.200,00	+	-5,29	-$ 6.695.490,00	19,71	$ 24.946.710,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO	UN	6,00	$ 1.927.443,00	$ 11.564.658,00		3,00	$ 5.782.329,00	9,00	$ 17.346.987,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA INSTITUCIONAL	UN	6,00	$ 416.164,00	$ 2.496.984,00	-	3,00	$ 1.248.492,00	9,00	$ 3.745.476,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.7	SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	$ 895.388,00	$ 895.388,00		1,00	$ 895.388,00	2,00	$ 1.790.776,00	1,00	$ 895.388,00		$ 0,00	1,00	$ 895.388,00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS BLANCO DE SENSOR INCLUYE PUNTO ELECTRICO	UN	3,00	$ 196.993,00	$ 590.979,00	+	1,00	$ 196.993,00	4,00	$ 787.972,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL BLANCO PARA PAPEL HIGUIENICO	UN	3,00	$ 128.496,00	$ 385.488,00	-	5,00	$ 642.480,00	8,00	$ 1.027.968,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	UN	3,00	$ 170.733,00	$ 512.199,00	-	1,00	$ 170.733,00	4,00	$ 682.932,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y DILATADOS DE 1.10 X 1,0 MT	UN	3,00	$ 225.907,00	$ 677.721,00	-	1,00	$ 225.907,00	4,00	$ 903.628,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BAÑO DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE (BARRA FIJA, BARRA ABATIBLE A PARED)	JG	1,00	$ 489.935,00	$ 489.935,00	-	0,00	$ -	1,00	$ 489.935,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO	UN	3,00	$ 28.912,00	$ 86.736,00		4,00	$ 115.648,00	7,00	$ 202.384,00	3,00	$ 86.736,00		$ 0,00	3,00	$ 86.736,00
4.14	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE ASEO	UN	3,00	$ 34.266,00	$ 102.798,00	-	0,00	$ -	3,00	$ 102.798,00	2,00	$ 68.532,00		$ 0,00	2,00	$ 68.532,00
4.15	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE WIN METALICO	ML	180,00	$ 24.628,00	$ 4.433.040,00	-	-177,74	-$ 4.377.381,00	2,26	$ 55.659,00	1,03	$ 25.366,84		$ 0,00	1,03	$ 25.366,84
5	**CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA**				**$ 1.867.538,00**					**$ 1.722.980,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 144.558,00**
5.1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MARCO DE VENTANAS INCLUYE LIJADO PARA QUITAR RASTROS DE CORROSION, APLICACIÓN DE CORROSIVO Y ESMALTE	UN	50,00	$ 29.641,00	$ 1.482.050,00	-	0,00	$ -	50,00	$ 1.482.050,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.2	MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA	UN	8,00	$ 48.186,00	$ 385.488,00	+	-3,00	-$ 144.558,00	5,00	$ 240.930,00	3,00	$ 144.558,00		$ 0,00	3,00	$ 144.558,00
6	**PROTECCION SOLAR**				**$ 21.753.120,00**					**$ 12.870.789,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL SOLAR,Super Guard (IR+ SPUTTER) rechaza los rayos infrarrojos en un 97% (calor), Sputter película reflectiva rechaza el brillo o reflejo del sol, brinda protección del 99 9% de los rayos UV (ultravioleta) causantes de la decolaración de muebles y enseres y de enfermedades en la piel. Evita accidentes por desfragmentación del vidrio.	M2	120,00	$ 181.276,00	$ 21.753.120,00	-	-49,00	-$ 8.882.331,00	71,00	$ 12.870.789,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	**ILUMINACION**				**$ 18.007.650,00**					**$ 18.007.650,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LEED	UN	90,00	$ 200.085,00	$ 18.007.650,00	+	0,00	$ -	90,00	$ 18.007.650,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	**CIELO RASO**				**$ 41.975.200,00**					**$ 35.699.908,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC	M2	400	$ 104.938	$ 41.975.200,00	-	-59,80	-$ 6.275.292,00	340,20	$ 35.699.908,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 80.700,00**					**$ 295.900,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 0,00**
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	UN	3,00	$ 26.900,00	$ 80.700,00	+	8,00	$ 215.200,00	11,00	$ 295.900,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	**ASEO Y VARIOS**				**$ 1.093.200,00**					**$ 1.395.178,00**		$ 0,00		**$ 0,00**	0,00	**$ 274.182,20**
10.1	ASEO PERMANENTE DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL	M2	300,00	$ 3.644,00	$ 1.093.200,00		82,87	$ 301.978,00	382,87	$ 1.395.178,00	75,2421	$ 274.182,20		$ 0,00	75,24	$ 274.182,20
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 497.910.450,00**			**$ 34.506.963,00**		**$ 497.910.450,20**		**$ 53.989.678,45**		**$ 0,00**		**$ 53.989.678,45**
A. I. U.	**(25%)**															
ADMINISTRACIÓN	**(15%)**				$ 74.686.568,00			$ 5.176.044,00		$ 74.686.568,00		$ 8.098.451,77		$ 0,00		$ 8.098.451,77
IMPREVISTOS	**(5%)**				$ 24.895.523,00			$ 1.725.348,00		$ 24.895.523,00		$ 2.699.483,92		$ 0,00		$ 2.699.483,92
UTILIDAD	**(5%)**				$ 24.895.523,00			$ 1.725.348,00		$ 24.895.523,00		$ 2.699.483,92		$ 0,00		$ 2.699.483,92
IVA	**(19%)**				$ 4.730.149,00			$ 327.813,00		$ 4.730.149,00		$ 512.901,94		$ 0,00		$ 512.901,94
A. TOTAL OBRA CIVIL					**$ 627.118.212,00**			**$ 43.461.516,00**		**$ 627.118.212,20**		**$ 68.000.000,00**		**$ 0,00**		**$ 68.000.000,00**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA					**$ 68.000.000,00**							**$ 68.000.000,00**		**$ 0,00**			**$ 68.000.000,00**

A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA **$ 68.000.000,00** **SON:** SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
Representante Legal
CONSORCIO PORVENIR
CONTRATISTA

ADRIANA VARGAS QUIROGA
Representante Legal
RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	**MEMORIAS DE CALCULO**	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO	
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024	
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN	

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2



Localización	**Dimensiones**			**No. Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Longitud**	**Altura**		
Foso del ascensor	2,95	2,75			8,11
Cerramiento foso	5,84	3,80			22,19
TOTAL					**30,30**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	**MEMORIAS DE CALCULO**	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.2	CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN FIBRA CON PARALES Y SEÑALIZACIÓN	ML



Localización	**Dimensiones**			**No. Elem.**	**Medida Total**
	Ancho	**Longitud**	**Altura**		
FOSO ASCENSOR					
Cerramiento obras		3,50			3,50
Cerramiento foso		3,80			3,80
		5,84			5,84
		1,42			1,42
Altura de repisas			2,58	3,00	7,74
BAÑOS TERCER PISO					
Cerramiento		5,70			5,70
Altura de repisas			2,58	3,00	7,74
TOTAL					**35,74**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.3	DESMONTE DE PIEDRA DE ORNATO INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	M2





Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
Monumento vigen	3,30	2,60			8,58
TOTAL					8,58

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA


FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.4	DESMONTE DE REDES SANITARIAS CON REUBICACIÓN HACIA CAJAS ALEDAÑAS	ML



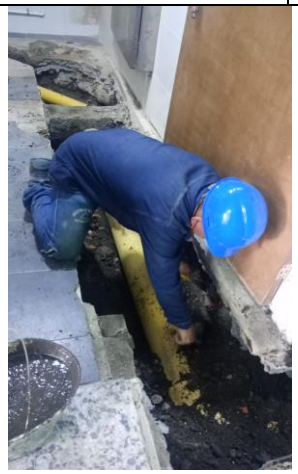

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
PISO 1					
Desmonte red existente		5,00			5,00
Replanteo cambio de red hacia caja 1		25,00			25,00
Replanteo cambio de red hacia caja 2		10,00			10,00
Replanteo cambio de red hacia caja 3		25,00			25,00
TOTAL					**65,00**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.5	DESMONTE DE REDES HIDRAULICAS CON DESVIACIÓN HACIA PATIO INTERIOR	ML



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
PISO 1					
Desmonte red existente		5,50			5,50
Desviación hacia patio interior		50,50			50,50
BAÑOS PISO 3					
Desmonte de red en baño de mujeres		15,96			15,96
Desmonte de red en baño de hombres		15,96			15,96
TOTAL					**87,92**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.6	DEMOLICION DE PLACA REFORZADA E=10 CM. INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	M2



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
PRIMER PISO					
Foso del ascensor	3,50	3,35			11,73
Exterior foso	4,50	1,20			5,40
Baño piso 1 mujeres	4,70	0,80			3,76
TOTAL					**20,89**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.7	DEMOLICION DE JARDINERAS INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	GL



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
PRIMER PISO					
Jardinería del monumento de la virgen				1,00	1,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	OBRA CIVIL PARA INSTALACION ASCENSORES	1.9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE DISPOSICION TEMPORAL Y FINAL DEL MATERIAL.	M3



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
PISO 1					
Foso del ascensor	3,50	3,35	1,80		21,11
Exterior foso	4,50	1,20	0,70		3,78
Baño piso 1 mujeres	4,70	0,80	0,70		2,63
TOTAL					**27,52**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	PRELIMINARES	2.1	DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL	M2





Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 2					
BAÑO MUJERES					
cara frontal	1,58		2,00		3,16
caras laterales		3,68	2,00	2,00	14,72
muro de división	1,82		1,93		3,51
cara trasera	1,58		2,00		3,16
puerta	-0,73		2,00		-1,46
BAÑO HOMBRES					
cara frontal	1,58		2,00		3,16
caras laterales		3,68	2,00	2,00	14,72
muro de división	1,82		1,93		3,51
cara trasera	1,58		2,00		3,16
puerta	-0,73		2,00		-1,46
BAÑO PISO 3					
BAÑO MUJERES					
cara frontal	1,58		2,00		3,16
caras laterales		3,68	2,00	2,00	14,72
muro de división	1,82		1,93		3,51
cara trasera	1,58		2,00		3,16
puerta	-0,73		2,00		-1,46
BAÑO HOMBRES					
cara frontal	1,58		2,00		3,16
caras laterales		3,68	2,00	2,00	14,72
muro de división	1,82		1,93		3,51
cara trasera	1,58		2,00		3,16
puerta	-0,73		2,00		-1,46
TOTAL					**92,37**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPITULO	PRELIMINARES	2.3	DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO (INCLUYE PUERTAS METALICAS Y	UN



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 2 Y 3					
Piso baños hombres				2,00	2,00
Piso baños mujeres				2,00	2,00
Piso baño mujeres 1				1,00	1,00
TOTAL					5,00

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	PRELIMINARES	2.4	DESMONTE LUMINARIAS	UN



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑOS 3					
Piso baños hombres				4,00	4,00
Piso baños mujeres				4,00	4,00
ZONAS 4TO PISO					
Sala de audiencias				13,00	13,00
Hall				19,00	19,00
Sala de archivo				11,00	11,00
TOTAL					**51,00**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas


CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	PRELIMINARES	2.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINAL TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)	UN

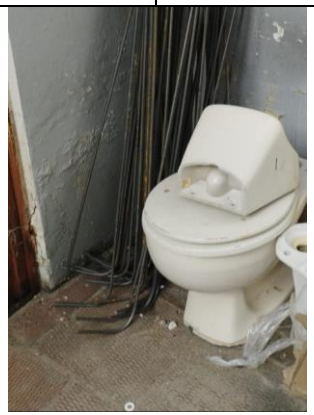

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 3					
Piso baños hombres sanitarios				2,00	2,00
Piso baños hombres lavamanos				2,00	2,00
Piso baños hombres orinal				1,00	1,00
Piso baños mujeres sanitario				2,00	2,00
Piso baños mujeres lavamanos				2,00	2,00
BAÑO PISO 1					
Piso baños mujeres sanitario y lavamanos				2,00	2,00
BAÑO PISO 2					
Piso baños hombres sanitarios				2,00	2,00
Piso baños hombres lavamanos				2,00	2,00
Piso baños hombres orinal				1,00	1,00
Piso baños mujeres sanitario				2,00	2,00
Piso baños mujeres lavamanos				2,00	2,00
TOTAL					**20,00**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas


CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	PRELIMINARES	2.6	DESMONTE CIELO RASO 4 PISO	M2

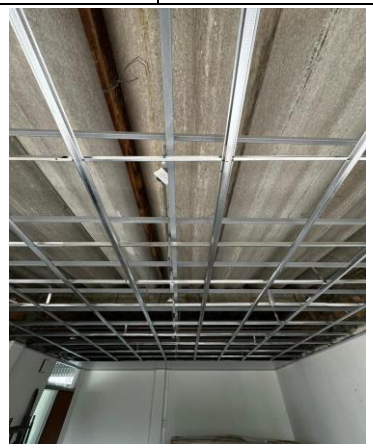

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
PISO 4					
Hall	6,50	15,74			102,30
Sala de audiencias	6,19	8,45			52,31
Archivo zona 1	4,75	7,84			37,24
Archivo zona 2	5,27	4,37			23,03
Vacío claraboya	3,09	-2,78			-8,59
TOTAL					**206,29**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	CUBIERTA	3.1	MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA EXCREMENTO PALOMAS Y MURCIELAGOS Y ARREGLO, LIJADA Y PINTURA ESTRUCTURA EXISTENTE	M2



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
CUBIERTA					
Hall	6,50	15,74			102,30
Sala de audiencias	6,19	8,45			52,31
Archivo zona 1	4,75	7,84			37,24
Archivo zona 2	5,27	4,37			23,03
Vacío claraboya	3,09	-2,78			-8,59
TOTAL					**206,29**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	UNIDADES SANITARIAS	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO FORMATO				M2





Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 2					
BAÑO MUJERES					
cara frontal	1,58		2,00		3,16
caras laterales		3,68	2,00	2,00	14,72
muro de división	1,82		1,93		3,51
cara trasera	1,58		2,00		3,16
puerta	-0,73		2,00		-1,46
BAÑO HOMBRES					
cara frontal	1,58		2,00		3,16
caras laterales		3,68	2,00	2,00	14,72
muro de división	1,82		1,93		3,51
cara trasera	1,58		2,00		3,16
puerta	-0,73		2,00		-1,46
TOTAL					**46,19**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	UNIDADES SANITARIAS	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO 60*60	M2



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 2					
Piso baños hombres		3,88	1,60		6,21
Piso baños mujeres		3,88	1,60		6,21
Poceta de aseo		0,80	0,80		0,64
TOTAL					13,06

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo
RES. DE OBRA

Arq. Luis Armando Borda
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón
RESIDENTE INTERVENTORIA

Ing. Ricardo Gonzalo
DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	UNIDADES SANITARIAS	4.7	SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS				UN	
			Localización	**Dimensiones**			**No. Elem.**	**Medida Total**
				Ancho	**Longitud**	**Altura**		
			BAÑO PISO 2					
			Baños hombres				1,00	1,00
			TOTAL					1,00



OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	UNIDADES SANITARIAS	4.13	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO				UN
			Localización	**Dimensiones**			**No. Elem.**	**Medida Total**
				Ancho	**Longitud**	**Altura**		
			BAÑO PISO 2					
			Baños hombres				1,00	1,00
			Baños mujeres				2,00	2,00
			TOTAL					3,00





OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	UNIDADES SANITARIAS	4.14	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE ASEO	UN



Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 2					
Baños mujeres				1,00	1,00
Baño mujeres piso 1				1,00	1,00
			TOTAL		**2,00**

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas


CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	UNIDADES SANITARIAS	4.15	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE WIN METALICO	ML

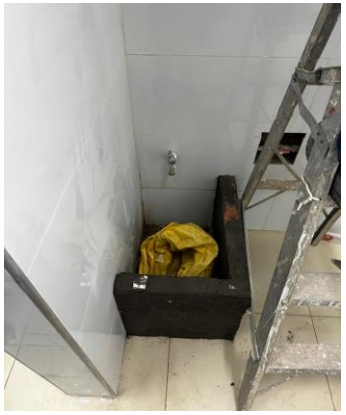

Localización	Dimensiones			No. Elem.	Medida Total
	Ancho	Longitud	Altura		
BAÑO PISO 2					
Baños mujeres		0,63			0,63
		0,40			0,40

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA	5.2	MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA				UN	
			Localización	**Dimensiones**			**No. Elem.**	**Medida Total**
				Ancho	**Longitud**	**Altura**		
			BAÑO PISO 3					
			Baños hombres				1,00	1,00
			Baños mujeres				1,00	1,00
			BAÑO PISO 1					
			Baños hombres				1,00	1,00
			TOTAL					3,00





OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas

CONSORCIO PORVENIR	MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO
		VERSION 1
		FECHA

FECHA	15/07/2024

BALANCE DE OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO PORVENIR	**RESIDENTE DE OBRA**	INGENIERO JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	18 DE 2024
INTERVENTOR	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	INGENIERA JANETH LIZETH RODRÍGUEZ ALARCÓN

CAPÍTULO	ASEO Y VARIOS	10.1	ASEO PERMANENTE DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL				M2
			Localización	**Dimensiones**			**No. Elem.**	**Medida Total**
				Ancho	**Longitud**	**Altura**		
			ZONA DEL FOSO PARA ASCENSOR					
			Foso	3,80	5,84			22,19
			PATIO					
			Zona del patio	7,86	10,36			81,43
			BAÑO PISO 3					
			Piso baños hombres		3,88	1,60	1,00	6,21
			Piso baños mujeres		3,88	1,60	1,00	6,21
			Poceta de aseo		0,80	0,80	1,00	0,64
			BAÑO PISO 1					
			Piso baños mujeres		3,88	1,60	1,00	6,21
			Ajuste Acta 1					-47,64
			TOTAL					**75,2421**





OBSERVACIONES:

Ing. Juan Camilo Castro Castillo	**Arq. Luis Armando Borda**	**Ing. Janeth Lizeth Rodríguez Alarcón**	**Ing. Ricardo Gonzalo**
RES. DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 18 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORÁMICO, INCLUYE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS"

RESIDENTE DE OBRA: ING. JUAN CAMILO CASTRO C.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ING. JANETH LIZETH RODRÍGUEZ A.

RESIDENTE SST: ANGELA VIVIANA BEJARANO R.

DIRECTOR DE OBRA: ARQ. LUIS ARMANDO BORDA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. GONZALO RICARDO

FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2024

Scanned with CamScanner

Junio 7-2024. Actividades Ejecutadas:

1. Retiro de plantas y tierra que esta alrededor de la pila.
2. Demolición de la pila y traslado de escombros.
3. Aseo y orden en el area intervenida.

Personal en obra: 1 maestro encargado, 1 residente SST, 1 oficial 3 ayudantes

Junio 8-2024. Se realiza la continuación de la demolición de la pila y traslado de escombros.
Aseo y orden en el area.

Personal en obra: 1 maestro encargado, 1 residente SST, 1 oficial, 3 ayudantes.

Junio 11-2024. Actividades ejecutaelas

1. Demolición de placa de la fuente y traslado de material. Aseo y orden.

Personal en obra: 1 maestro encargado, 1 residente SST, 1 oficial, 3 ayudantes.

Junio 12-24. Actividad ejecutada.
Excavación para el foso del ascensón primer piso, traslado de tierra (lonas)
Aseo y orden.

Personal en obra: 1 maestro encargado, 1 residente SST, 1 oficial, 3 ayudantes

Junio 13-24. Actividades ejecutadas:

1. Retiro de enchape baños del 3 piso, traslado de escombros a 1 piso
2. Preparar la superficie (Picar).

Personal en obra: 1 residente SST, maestro encargado, 1 oficial y 2 ayudantes.

Junio 14-24. Actividades ejecutadas: Desmonte de cielo-raso en el salón de audiencia y pasillo del 4 piso.

Junio 15-24. Actividades ejecutadas: Instalación de estructura para el cielo-raso en el salon de audiencia 4 piso.

Junio 17-24 Finalización de instalación de cielo-raso (estructura).
Se inicia la instalación del cielo raso en PVC.
Orden y aseo en el area intervenida.

NKA

Scanned with CamScanner

Fecha = 18 de Junio de 2024.

Actividades Ejecutadas =

- Reunión con la Supervisión en donde se tocaron los siguientes temas = * Cambio de caja de inspección en el foso del ascensor en donde se traslada la tubería existente en la parte lateral por los baños del primer piso (mujeres) con el fin de desviar la tubería de gres que afectan la elaboración del foso del ascensor, teniendo como arreglo en los laterales dejar un tapete en enchape para mejor visualización como entrada al ascensor.
* Adelantar los No previstos que surgan en la Obra
* Realizar Traslado a un punto del edificio para la Virge
* Se define realizar la actividad de instalación de enchape de muros de piso a techo en los baños.
* Se solicita realización Total de tubería hidráulica en los baños de los diferentes pisos y mantenimient de las puertas de los mismos.
* Se recomienda cambio de la cubierta total del cuarto piso por cristalización y goteras teniendo en cuenta sus afectaciones para lo cual se envierá la oferta económica de esta actividad y como solicitud (de la entidad) una propuesta con instalación de manto foil explicando que de realizar la actividad sería sin garantía de las mismas.
* La entidad aclara que según la consultoría no se requiere realizar licencia de Construcción para las actividades a ejecutar.
* Se solicitará por parte de la entidad a la Fiscalía Seccional y local el retiro del archivo ubicado en el cuarto piso para revisar retiro y cambio del Cielo Raso.

Nota: Se aclara que en el tema de la cubierta el Contratista Presentará 2 opciones para su -

arreglo.
1. Cambio de toda la cubierta
2. Instalación de manto.
estas 2 opciones las propone el contratista y deben ser aprobadas y avaladas por la interventoria para V.o B.o de la supervisión de obra, así como los demas "no previstos" que surgan en la obra.

Nuestra supervisora Norma Ascencio.

Maria Diaz P
Coordinadora Cons. Porvenir.

Interventoria.

Coordinador Cons. Porvenir.

18-06-2024 Se reorganiza el encerramiento en el 1 piso para inspección de tuberia.
Aseo y orden en el area intervenida.

19-06-2024 Actividades ejecutadas:
1. Corte y demolición de placa en parte lateral del acceson del 1 piso (baño y pasillo). y traslado de escombros, aseo y orde en el area.

20-06-24. Actividades ejecutadas:
Excavación en pasillo para tuberia.
Instalación de tuberia para desviación de caja de aguas negras.

21-06-24 Actividades ejecutadas
- Elaboración de cajas (3) con tapas para aguas negras
- Culminación de demolición de la piedra de la fuente parte superior.

22-06-24.
- Finalización de demolición de piedra de la fuente nivel inferior.
- Inicio de limpieza y pintura de la estructura en el salon de audiencias 4 piso.

24-06-24 - Retiro de escombro de piedra al acopio del patio del edificio.
- Finalización de limpieza y pintura de la estructura métalica del salon de audiencias 4 piso.
- Inicio de limpieza y pintura de la estructura en el pasillo.

25-06-24 - Limpieza y pintura de la estructura en el pasillo del 4 piso
- Instalación de registro interno para desviar tuberia (llave) en el baño de damas 1 piso
- Retiro de tierra y escombros del foso para el ascensor.

26-06-24 - Finalización de limpieza y pintura de la estructura métalica del pasillo 4 piso
- Excavación para el foso del ascensor de acuerdo al perimetro y profundidad.
- Retiro de baldosa en baño de damas 1 piso.

27-06-24. Culminación de excavación del foso para el ascensor
Retiro de escombro, orden y aseo.
Desistalación de cielo falso salon de archivo piso 4.
Limpieza y pintura de estructura metalica.

Scanned with CamScanner

28-06-24 Descargue de juego de baños, baldosa y pegacor.
- Se inicia instalación de baldosa en el baño de damas 1 piso.
- Continuación de limpieza y pintura en estructura.

29-06-24 - Retiro de escombro del edificio
- Retiro de 2 juegos de baños.

02-07-2024 Actividades realizadas.
- Instalación de baldosa en baño 1 piso
- Limpieza y pintura de estructura en salon de archivo 4 piso.

Personal en obra: 1 Oficial, 3 ayudantes, 1 maestro encargado, 1 residente de obra y SST

- Se realiza recorrido y visita de Obra con la Supervisión, Interventoria y personal de Obra con el fin de verificar ejecución de actividades y toma de decisiones para darle continuación a la obra, teniendo pendiente por parte de Interventoria y revisión de la Entidad la programación, balance de Obra, Items no previstos y oferta económica de la cubierta con la finalidad de saber que continuación se le dará a la actividad de instalación de cielo raso del cuarto piso. Tambien tenemos la espera de la visita de Eurolift. con la finalidad de poder tener los diseños y continuación de las actividades del foso del ascensor.
- la Entidad autorizo envio balance con actividades contractuales y espera de la fecha para poder ejecutar acta parcial Cobro.
- Se solicita retiro de division metálica del baño del primer piso de mujeres, puesto que el mismo se encuentra en deterioro e incompleto por

tanto, no se recomienda dejarlo y se solicita autorización para el retiro del mismo.
- La obra tiene un avance del 9.44% sin embargo se solicita prontitud en la respuesta de la documentación suministrada por el contratista, puesto que se tiene Atraso significativo por obras que en estas momentos no se puede avanzar (cielo raso
- Se reitera que la entidad envie oficio para retiro de Archivo por parte de la Fiscalia y poder ejecutar Actividades en dichos espacios.

Ing Residente de obra

Arq Victor Camilo
Dir. Interventoría

Supervisor

03-07-24 Se realiza las siguientes actividades:
Inicio de enchape baños 3 piso
Personal en obra: residente obra y SST, 1 maestro encargado, 1 oficial y 3 ayudantes

Residente obra

Residente SST

04-07-24 Continuación enchape de baños 3 piso
Orden y aseo en area intervenida.
Personal en obra: 1 residente SST, 1 maestro 1 oficial, 3 ayudantes

Residente SST

05-07-24 Actividades realizadas:
- Enchape de baños 3 piso.
- Instalación de juego de baño en el ban 1 piso.
- Mantenimiento a puertas del baño.

Personal en obra: 1 residente SST, 1 maestro de obra 1 oficial, 3 ayudantes

Residentes SST

Scanned with CamScanner

6-07-24. Actividades ejecutadas:

- Corte de piezas para enchapar.
- Orden y aseo de los baños

Personal en obra: 1 maestro encargado, un oficial y 3 ayudantes.

Herramientas: Pulidora, cortadora de enchape, destornillador nivel, palustre, llana., Metro,

Angela Bejarano
Residente SST

8-07-24. Actividades ejecutadas:

- Corte de piezas para enchapar pared.
- Orden y aseo

Personal en obra: Mastro encargado, tres ayudante.

Herramientas: Pulidora, cortadora, llana, nivel, palustre.

Angela Bejarano Residente SST

9-07-24. Actividades a ejecutar:

- Descargue de material
- Desmonte de piso de baños del tercer piso, inst. de enchape de piso baño 1.
- Orden y aseo.

→ Herramientas: Pulidora, cortadora, llana, nivel, palustre.

Residente de Obra
Residente SST

- Personal en Obra: Tres ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado.

10-07-2024. Actividades a realizar:

- Continuación de instalación de enchape de piso en baño de hombres y mujeres del tercer piso.
- Continuación de aplicación de boquilla en enchape de pared en baño de hombres y mujeres.
- Orden y aseo.

Personal de Obra: Tres ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado. Por parte del consorcio: Residente de obra, residente SST; Por parte interventoría: Residente de interventoría.

Scanned with CamScanner

Se realizo visita verificando las actividades realizadas.
-Enchape baños tercer piso. (hombres - mujeres).
- Aplicación de boquilla baños tercer piso (hombres - mujere

Ing. Lizeth Rodriguez Interventoria

11-07-2024. Actividades a realizar:
- Continuación de instalación de enchape de pared en la zona baja en baño de hombres y mujeres de tercer piso.
- Continuación de aplicación de boquilla en baño de hombres y mujeres de tercer piso.
- Instalación de orinales y sanitarios en baño de hombres y mujeres en baño tercer piso.
- Remates pendientes; orden y aseo.

Personal de Obra: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado. Por parte del consorcio: 1 Residente de obra, 1 residente SST. Por parte de interventoría: 1 residente de interventoria.

Herramienta: Pulidora, Cortadora, Llana, nivel, palustre.

Residente de Obra Residente SST.

Se realiza visita verificando las actividades realizadas y en ejecución
- Enchape baños tercer piso.
- Aplicación de boquilla baño tercer piso.
- figuración de hierro.
- Mantenimiento a puertas. (pintura).

Residente de obra. Interventoria
Ing Lizeth Rodriguez.

12-07-2024: Actividades a realizar:
- Continuación de terminación de enchape de pared en la zona baja en baño de mujeres de tercer piso.
- Continuación de aplicación de boquilla en baño de mujeres de tercer p
- Instalación de orinales y sanitarios en baño de hombres y mujeres.

Scanned with CamScanner

- remates pendientes; orden y aseo.

Personal en obra: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado. Por parte del consorcio: 1 residente de obra y 1 residente SST. Por parte de la interventoría: 1 residente interventoría, 1 director de interventoría.

Herramienta: Pulidora, cortadora, llana, nivel, palustre.

Residente de Obra

Residente SST

Residente de obra. Interventoria
Ing. Lizeth Rodríguez

Se realiza recorrido y visita de obra junto con el supervisor y la ingeniera residente por parte de la interventoría, con el fin de verificar la ejecución de las actividades, revisión de la propuesta económica de la cubierta y verificación de cantidades de ésta misma. Se deja a la espera por parte de la empresa Eurolift el día exacto de la otra semana en que harán la visita técnica. Queda pendiente la información de la persona encargada que recibe los diferentes frentes terminados. Adicional, averiguar información de la disposición final de las lámparas desmontadas del cuarto piso. Se hace la petición de tener impresos los planos del foso para la otra semana.

- La oferta económica de la cubierta queda autorizada por parte de la interventoría, incluida la revisión de APU's y cotizaciones.
- Se realiza corte de obra, su respectivo anexo de registro fotográfico.

Residente de Obra

Residente de obra, interventoría
Ing. Lizeth Rodríguez.

Arq. Director Interventoría

13-07-2024 Actividades a realizar:

- Aplicación de pintura en techo de los dos baños en tercer piso y zona de afuera.
- Enchape de piseta en baño de mujeres.
- Aplicación de segunda mano en borde de puertas.

Scanned with CamScanner

- Remates finales y orden y aseo.

- También se procede a instalar las divisiones del baño de hombres y mujeres del tercer piso. Adicional, los mesones del lavamanos.

Personal en Obra: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado, 2 instaladores de divisiones de baño. Por parte del consorcio: 1 residente de obra/ 1 residente SST. Por parte de la interventoría: 1 residente de interventoría.

Herramientas: Pulidora, cortadora, Llana, nivel, palustre.

Residente de Obra

Residente SST

Residente de Obra. Interventoría

Ing. Cizeth Rodríguez

15-07-2024

Actividades a realizar:

- Terminación de instalación de accesorios en baños de segundo piso.
- Remates pendientes.
- Orden y Aseo.

Personal en Obra: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado. Por parte del consorcio: 1 Ing. residente, 1 residente SST. Por parte de interventoría: 1 Ing Residente

Herramientas: Pulidora, cortadora, Llana, nivel, palustre.

Residente de Obra

Residente SST

Residente de obra Interventoría

16-07-2024.

Actividades a realizar:

- Figuración de hierro para estructura del ascensor.
- Remates pendientes, orden y aseo.

Se realizó recorrido con la ing. de interventoría para entrega de baños del tercer piso. Queda constancia que se puede empezar a realizar actividades en baño del segundo piso, mientras llega el director de interventoría a rectificar detalles.

Personal en Obra: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado. Por parte del consorcio: 1 Ingeniero residente, 1 residente SST. Por parte de la interventoría: 1 ing. residen

Herramienta: Pulidora, cortadora, llana, nivel, palustre.

Residente de Obra

Residente SST

Ing. Lizeth Rodríguez
Residente de obra Interventoría

17-07-2024 Actividades a realizar:

- Desmonte de accesorios, aparatos hidrosanitarios, enchape de pared y piso en baños de hombre y mujeres de segundo piso.
- Orden y aseo.

Personal en Obra: 3 ayudantes, 1 oficial. Por parte del consorcio: Ing. Residente de obra, 1 residente SST, Por parte de la interventoría: 1 Ing. residente.

Herramientas: Pulidora, cortadora, Llana, nivel, pulustre.

Residente de Obra.

Residente SST

Residente de obra Interventoría
Ing. Lizeth Rodríguez.

18-07-2024 Se realiza visita técnica por parte de Eurolift, a cargo del Sr. Andrés Bojarano, dónde tomó medidas del foso y entre pisos para las posteriores intrucciones a ejecutar para la construcción de la estructura. Se estima que el próximo viernes llegarán las actualizaciones para los procesos constructivos. También se realizo consulta para no manejar cuarto de máquinas y dejar el control en cuarto piso.

Andres Bojarano
TEC. Eurolift SAS.

Dir Interventoría

Se evidencia en visita de Eurolift que la altura de la estructura requerida para el ascensor supera la que existe físicamente con la claraboya del foso actual, la marquesina debe modificarse sí o sí a mayor altura. Se cotizará por parte del consorcio la modificación de la futura marquesina del foso ascensor.

- Se verificara en sitio las cantidades del cuadro Balance Cantidades entre Interventoría y Consorcio.

18/07/2024. Se da Inicio al recorrido con el Personal dela supervisión, Residente de Interventoria, residente de obra residente sisoma y maestro. donde se evidencia e Informa a todo el Personal relacionado que: el Cerramiento esta Instalado con liston de madera. que difiere al contratado en el Presupuesto, en los baños se solicita mejorar, enchape, Win, la Instalación de los Sanitarios ya que se evidencia con una Pega bastante gruesa y mal acabado sanitario de Primer piso tiene filtración el meson Instalado en los lavamanos del 3er Piso no corresponde con el contratado, y en el Primer Piso no hay Instalación del meson se evidencia lavamanos de Pedestal, en cuanto a las actividades de cubierta no han Iniciado labores, Informan que entregaron la Oferta economica el dia 12/07/2024. Pero no han recibido respuesta para Iniciar labores, Se requiere dar respuesta de manera Inmediata ya que hay atrasos en actividades en la programación Vrs. Ejecución, en cuanto al Personal de Interventoria NO se evidencia que no hay Personal contractual Solo se evidencia la Presencia de la Residente de Interventoria, Igualmente se requiere y solicita. respuesta y Propuesta de Eurolift Ascensores ya que Informan que la Cubierta y faja (estructura) (cobertor) en la zona del ascensor debe subir.
falta la instalación de las secamanos en los baños y se solicita el manejo de olores en los baños, las divisiones en seco, se evidencian con mal acabado. y no se han Instalado en su totalidad las accesorios para discapacitados. todo lo relacionado en las actividades revisadas el dia de hoy, queda Socializado con el Personal de Interventoria, Obra, maestro y supervisión.

Supervi.

NKA

19-07-2024 Actividades a realizar:

+ Eliminación de pega existente en pared y nivelación de la misma en baño de hombres de segundo piso.

+ Instalación de red hidráulica nueva en baños.

- Orden y aseo.

Por petición de la entidad el día de ayer, se dispuso a desocupar el agua empozada en foso del ascensor.

Personal en Obra: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro encargado. Por parte del consorcio: 1 Residente de obra, 1 residente SST.

Herramientas: Pulidora, cortadora, llana, nivel, palustre.

Residente Obra. Residente Int. Residente SST

22-07-2024. Actividades a realizar:

- Continuación de plomada en muros de baños del segundo piso.
- Continuación de instalación de red hidráulica nueva en baños.
- Retoque en mesones en concreto, fundida de apoyos para mesones, Orden y aseo.

Personal en Obra = 3 ayudantes, 1 oficial. Por parte del consorcio: 1 Ing. residente de obra, 1 residente SST. Por parte de la interventoria: 1 Ing. residente.

Herramientas: Pulidora, cortadora, llana, nivel, palustre.

Residente Obra. Residente Interventoria.

Se hizo prueba hidráulica para baños de segundo, dónde salió todo en orden. Se realiza cubrimiento en muro.

La prueba que se realizo fue verificación de flujo hidraulico, no prueba de presión para instalación de los sanitarios con fluxometros. Se hace cubrimiento de excavación de ascensor.

Lizeth Rodríguez. Angela Bejarano

Residente Interventoria. Residente SST.

23/07/2024. Actividades a realizar.

Aplome de paredes del segundo piso baños hombres y mujeres.

Cambio e instalación sifones plásticos por sifones acero inoxidable de baños de tercer piso hombres y mujeres.

A la fecha no hay material (PORCELANATO PAREDES) para continuar con las actividades de los baños de hombres y mujeres.

Scanned with CamScanner

Personal en obra: 1 Oficial, 1 residente de obra, 1 residente SST, 1 residente interventoria.
Herramienta: cortadora, pulidora, llana, nivel, palustre.
Se solicita certificación de disposición final de los residuos generados en obra. al residente de obra ing. Juan Camilo Castro Castillo.
Se realiza oficio de petición de respuesta para la elección del enchape de pared para ser escogido lo más pronto posible para continuar labores, todo enviado a interventoría.

Residente de Obra | Residente SST | Residente Interventoría

24-07-2024 Actividades a realizar:
- Continuación de plomada en muros de baños del segundo piso.
- Terminación de retoques de mesones en concreto. - Orden y aseo.

Personal en Obra: 1 oficial. Por parte del consorcio: 1 ing. residente, 1 residente SST. Por parte de la interventoría: 1 residente.
Herramientas: Cortadora, pulidora, llana, nivel, palustre.

Residente de Obra | Residente de Interventoría. | Residente SST.

25-07-2024. Actividades a realizar:
- Continuan realizan alistado de muros para así mismo iniciar instalando enchape.
- Se informa al Ing. residente de obra, la importancia de que exista mano de obra, ya que el dia de hoy solo asiste 1 oficial y las actividades presentar retraso (Por falta de personal y el material para instalar).

Residente Obra | Residente Interventoría | Residente SST

26-07-2024. Actividades a realizar
- Se continua aplomando muros baño segundo piso.

Personal en obra: 1 oficial, Por parte del consorcio: 1 ing. residente, 1 residente SST, parte de interventoría: 1 residente interventoría.
Herramientas: Cortadora, pulidora, llana, nivel, palustre.

Residente Interventoría | Residente Obra

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO PORVENIR
NIT 901.818.757-7
CL 20 12 84
Tel: (608) 3105602708
Tunja - Colombia
cscporvenir@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PR 3

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS		
NIT	901.673.538-6	**Teléfono**	(601) 5658500 - Ext. 000
Dirección	Carrera 7 No. 17-28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2024, 11:41
Expedición	29/10/2024, 11:43
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Valor Acta Parcial No. 1 Contrato de obra No. 18 de 2024, que tiene por objeto el SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORÁMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS. Consorciados: Miguel Alejandro Pinzón Aguilar 30% Doble M Ingenieros SAS 40% Soul Ingeniería CO SAS 30%	1.00	53,989,678.45	0 %	0.00	53,989,678.45
2	ADMINISTRACION 15,00%	1.00	8,098,451.77	0 %	0.00	8,098,451.77
3	IMPREVISTOS 5.00%	1.00	2,699,483.92	0 %	0.00	2,699,483.92
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	2,699,483.92	19 %	512,901.94	2,699,483.92

Total items: 4

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 68,000,000.00

Total Bruto	67,487,098.06
IVA 19%	512,901.94
Total a Pagar	68,000,000.00

Observaciones:
#$27-01-02-033;18-2024;mlizarab@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068742780 aprobado en 20240409 prefijo PR desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 30616efaa46307cb9e8d90f149b95cd3e5ce27d603c9ae9d030b02cff9173f028289641b606050981faa4b1e26ec39f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 01

07 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2024

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORÁMICO, INCLUYE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS

CONTRATO DE OBRA No. 18 de 2024



1 INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta el avance del proyecto de obra, incluyendo información general del proyecto, actividades ejecutadas, seguridad y salud en el trabajo, y procesos técnicos constructivos. El proyecto está siendo ejecutado por el CONSORCIO PORVENIR y se desarrolla en la fiscalía general en Gachetá, Cundinamarca. El período abarcado en este informe corresponde del 07 de junio al 25 de julio de 2024, conforme al contrato No. 18 de 2024, suscrito con la dirección seccional de administración judicial de Cundinamarca y Amazonas.

2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Calle 04 # 03 - 21, Gachetá - Cundinamarca

3 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

3.1 Generalidades

- CONTRATO DE OBRA: No. 18 de 2024
- MODALIDAD DE SELECCIÓN:
- CONTRATISTA: Consorcio Porvenir
- OBJETO: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) ascensor panorámico incluye obra civil y eléctrica, así como las obras de mantenimiento a la infraestructura física para la sede propia en el municipio de Gachetá a cargo de la dirección seccional de administración judicial de Cundinamarca y Amazonas.
- VALOR CONTRATO: Inicial: $627.118.212,00 (Seiscientos veintisiete millones ciento dieciocho mil doscientos doce pesos) incluidos honorarios, AIU e impuestos.
- VALOR ADICION No. 1: No aplica
- PLAZO INICIAL: 8 MESES a partir de la suscripción del acta de inicio
- FECHA DE INICIO: 07 de junio de 2024
- FECHA FINAL: 02 de febrero de 2025

3.2 ASPECTOS LEGALES Y GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA No.	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101208559	Cumplimiento de contrato	16/04/2024	16/06/2025	$ 62.711.821,20
		Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/04/2024	16/12/2027	$ 97.067.731,80
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	2 AÑOS		$ 62.711.821,00
		Estabilidad y calidad de obra	5 AÑOS		$ 125.423.642,40
SEGUROS DEL ESTADO	14-40-101064257	Predios labores y Operaciones	16/04/2024	16/12/2024	$ 26.000.000,00

3.3 Resumen presupuesto de obra

RESUMEN PRESUPUESTO - OBRA CIVIL			
ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	INCIDENCIA COSTO DIRECTO
1	CAPÍTULO 1. OBRA CIVIL PARA INSTALACIÓN ASCENSORES	$ 287.137.459,00	57.64%
2	CAPITULO 2. OBRA CIVIL MANTENIMIENTO PALACIA DE JUSTICIA – BAÑOS 2 Y 3	$ 12.624.355,00	2.53%
3	CAPITULO 3. CUBIERTA	$ 44.253.903,00	8.88%
4	CAPÍTULO 4. UNIDADES SANITARIAS	$ 69.117.325,00	13.88%
5	CAPITULO 5. CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA	$ 1.867.538,00	0.37%
6	CAPÍTULO 6. PROTECCIÓN SOLAR	$ 21.753.120,00	4.37%
7	CAPÍTULO 7. ILUMINACIÓN	$ 18.007.650,00	3.62%

8	CAPÍTULO 8. CIELO RASO	$	41.975.200,00	8.42%
9	CAPÍTULO 9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$	80.700,00	0.059%
10	CAPITULO 10. ASEO Y VARIOS	$	1.093.200,00	0.22%
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	$	497.910.450,00	100,00%

3.4 RELACIÓN DE PAGO

PAGOS REALIZADOS					
NO. O.P.	FECHA DE PAGO	VALOR FACTU RA	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	CONCEPTO
1		$ 68.000.000,00		$ 68.000.000,00	Acta 1

3.5 PROGRAMADO VS EJECUTADO

3.5.1 Ejecución de actividades de obra según presupuesto

AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEMANA 6						
ITEM	**DESCRIPCION**	**% prog**	**Costo prog**	**% ejec Sem**	**% ejec acum**	**Valor ejec acum**
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	100%	$ 184.951,00		100%	$ 184.951,20
1,2	CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN FIBRA CON PARALES Y SEÑALIZACIÓN	100%	$ 2.791.324,00		38,39%	$ 1.071.556,68
1,3	DESMONTE DE PIEDRA DE ORNATO INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	100%	$ 275.624,00		100%	$ 275.623,92
1,4	DESMONTE DE REDES SANITARIAS CON REUBICACIÓN HACIA CAJAS ALEDAÑAS	100%	$ 1.948.830,00		100%	$ 1.948.830,00
1,5	DESMONTE DE REDES HIDRAULICAS CON DESVIACIÓN HACIA PATIO INTERIOR	100%	$ 2.071.219,00		100%	$ 2.071.219,36
1,6	DEMOLICION DE PLACA REFORZADA E=10 CM. INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	100%	$ 1.341.819,00		100%	$ 1.342.140,72
1,7	DEMOLICION DE JARDINERAS INC. RETIRO DE PALACIO A SITIO SEGURO	100%	$ 191.673,00		100%	$ 191.673,00
1,8	DEMOLICION MURO EN LADRILLO PISO 1 A 4, INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	100%	$ 179.894,00		0%	$ -
1,9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN INCLUYE DISPOSICION TEMPORAL Y FINAL DEL MATERIAL.	100%	$ 1.738.442,00		100%	$ 1.738.631,04
1,10	BASE COMPACTADA SEGÚN DISEÑO EN MATERIAL APTO PARA RESISTIR PESO Y HUMEDAD DEL SECTOR.	100%	$ 1.101.052,00		0%	$ -
1,11	SUBBASE SEGÚN DISEÑO EN MATERIAL APTO PARA SOPORTAR TRANSICIÓN ENTRE MATERIALES.	100%	$ 830.984,00		0%	$ -
1,12	FOSO SEGÚN DISEÑO EN CONCRETO DE 3000 PSI	100%	$ 4.139.733,00		0%	$ -
1,13	ESTRUCTURA METALICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PUENTES, PLATINAS DE EXTENSIÓN, GUIAS INTERIORES, VIGA DE ISAJE, PLATINAS, ENTRE OTROS.	100%	$ 62.910.000,00		0%	$ -

AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEMANA 6						
ITEM	**DESCRIPCION**	**% prog**	**Costo prog**	**% ejec Sem**	**% ejec acum**	**Valor ejec acum**
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS EN ACERO INOXIDABLE 304, 1,2 mm SEGÚN CONTORNO DE ESTRUCTURA METALICA Y PUERTA DE ASCENSOR DE 2,2 M DE ALTURA X 1,10 M DE ANCHO. INC. ORIFICIO BOTONERAS	100%	$ 3.555.064,00		0%	$ -
1,15	SISTEMA PANORAMICO DE VIDRIO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE DE 10 mm INCLUYE APLIQUES Y SOPORTES EN ACERO REFORZADO.	100%	$ 23.124.206,00		0%	$ -
1,16	SISTEMA DE ANCLAJE A ESTRUCTURA REFORZADA EN PUNTOS DE CONEXIÓN SEGÚN DISEÑO	100%	$ 1.027.968,00		0%	$ -
1,17	DESMONTE DE CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC RETUIRIO Y DISPOSICIÓN A SITIO SUGERIDO POR LA RAMA JUDICIAL	100%	1.027.968,00		0%	$ -
1,18	CUBIERTA EN POLICARBONATO. INC ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO	100%	10.172.619,00		0%	$ -
1,19	PATOLOGIA A SITIOS REFERENCIADOS CON EL USO DE FERROSCAN Y OTROS EQUIPOS DE PRESICIÓN	100%	7.923.934,00		0%	$ -
1,2	ESTRUCTURA METALICA DE REALCE CUARTO DE MAQUINAS Y SOPORTE SECUNDARIO DE CUBIERTA	100%	$ 4.111.872,00		0%	$ -
1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PANORAMICO SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA 8 PERSONAS	100%	144.986.582,00		0%	$ -
1,22	INTERRUPTOR TRIFÁSICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X40A CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACIÓN EN TGD Y ACCESORIOS.	100%	224.868,00		0%	$ -
1,23	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TDG AL TABLERO ASCENSOR EN (3NO8+NO8+1N10T)	100%	$ 935.870,00		0%	$ -
1,24	INTERRUPTOR TRIFÁSICO (BREAKER) DE CAJA MOLDEADA DE 3X40A INSTALADO EN CUARTO DE MÁQUINAS INCLUYE TABLERO PARA PARA ALOJAMIENTO DE BREAKER	100%	310.533,00		0%	$ -

AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEMANA 6						
ITEM	**DESCRIPCION**	**% prog**	**Costo prog**	**% ejec Sem**	**% ejec acum**	**Valor ejec acum**
1,25	SUMINISTRO DE INSTALACIONES TUBERÍA EMT SOBREPUESTA DE 1 1/4" CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE.	100%	854.490,00		0%	$ -
1,26	INTERRUPTOR TRIFÁSICO (BREAKER) INDUSTRIAL 3X30A CAPACIDAD DE RUPTURA 25 KA INCLUYE INSTALACIÓN EN TGD Y ACCESORIOS.	100%	214.160,00		0%	$ -
1,27	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD AL TABLERO ASCENSOR EN (3NO10+NO10+1N12T)	100%	492.568,00		0%	$ -
1,28	TABLERO TRIFÁSICO CON PUERTA CERRADA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR DE 30 A TIPO RIEL DE 10 KA Y 3 INTERRUPTORES DE 1X20A ENCHUFABLES INSTALADO EN EL CUARTO DE ASCENSOR.	100%	588.941,00		0%	$ -
1,29	SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERÍA EMT DE 1 " SOBREPUESTA CON ACCESORIOS Y SISTEMA DE ANCLAJE.	100%	742.056,00		0%	$ -
1,3	SALIDA DE ILUMINACIÓN PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.	100%	856.640,00		0%	$ -
1,31	SALIDA DE TOMA MONOFÁSICA DE MANTENIMIENTO PARA FOSO DEL ASCENSOR EN CABLE NO 12 Y TUBO EMT SOBREPUESTO INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y TOMA.	100%	856.640,00		0%	$ -
1,32	LUMINARIA LED CUADRADA TIPO EXTERIOR PARA FOSO ASCENSOR INCLUYE CLAVIJA Y EXTENSIÓN 1 METRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12	100%	642.480,00		0%	$ -
1,33	PLACA CONCRETO 3000 PSI EXTERIOR ASCENSOR. INC. MALLA ELECTROSOLDADA 5.0 mm 15X15	100%	$ 1.572.406,00		0%	$ -
1,34	PISO PORCELANATO EXTERIOR ASCENSOR 45*45	100%	$ 1.758.543,00		0%	$ -
1,35	PISO PORCELANATO INTERIOR ASCENSOR 45*45	100%	482.755,00		0%	$ -
1,36	REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA BATIENTE CERRAMIENTO AEREO DE EXTENSIÓN DE ASCENSOR. TUBO 1 1/2" X 1 1/2"	100%	1.900.670,00		0%	$ -

AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEMANA 6						
ITEM	**DESCRIPCION**	**% prog**	**Costo prog**	**% ejec Sem**	**% ejec acum**	**Valor ejec acum**
1,37	REJILLA ALUMINIO TIPO PERSIANA FIJA LATERALES ASCENSOR TUBO 2" X 2"	100%	4.952.450,00		0%	$ -
1,38	ACERO DE REFUERZO PARA TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEGÚN DISEÑO.	100%	$ 2.814.929,00		0%	$ -
2,1	DEMOLICION ENCHAPE (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)	100%	$ 3.066.271,00		98,44%	$ 3.018.559,23
2,2	DEMOLICION PISO AREA BAÑOS (INCLUYE TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)	100%	$ 691.828,00		0%	
2,3	DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO (INCLUYE PUERTAS METALICAS Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	100%	$ 131.045,00		100,00%	$ 131.045,00
2,4	DESMONTE LUMINARIAS	100%	$ 617.310,00		56,67%	$ 349.809,00
2,5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS Y ORINAL TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL)	100%	$ 235.160,00		100,00%	$ 235.160,00
2,6	DESMONTE CIELO RASO 4 PISO	100%	$ 8.378.446,00		60,64%	$ 5.080.510,12
3,1	MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA EXCREMENTO PALOMAS Y MURCIELAGOS Y ARREGLO, LIJADA Y PINTURA ESTRUCTURA EXISTENTE	100%	$ 42.655.637,00		60,64%	$ 25.865.465,36
3,2	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL	100%	$ 1.464.862,00		0%	$ -
3,3	LIMPIEZA Y DESINFECCION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	100%	274.128,00		0%	$ -
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED PORCELANATO FORMATO 60*30 (INCLUYE SI APLICA EL PICADO DE MURO O PREPARACION DE SUPERFICIE DE MURO PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ENCHAPE)	100%	$ 17.271.790,00		41,52%	$ 7.171.736,54

AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEMANA 6						
ITEM	**DESCRIPCION**	**% prog**	**Costo prog**	**% ejec Sem**	**% ejec acum**	**Valor ejec acum**
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PORCELANATO SELLADO 60*60 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU INSTALACION)	100%	$ 4.230.410,00		42,96%	$ 1.818.004,24
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN GRANITO PULIDO CON BASE EN CONCRETO CON APOYOS 1.20 X 0.60. H=0,90 (INCLUYE PERFORACIONES Y SALPICADERO NECESARIOS)	100%	$ 981.176,00		0%	$ -
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE PUERTA	100%	$ 24.946.710,00		0%	$ -
4,5	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO	100%	$ 17.346.987,00		0%	$ -
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA INSTITUCIONAL	100%	$ 3.745.476,00		0%	$ -
4,7	SUMINSITRO E INSTALACION ORINAL INCLUYE GRIFERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	100%	$ 1.790.776,00		50,00%	$ 895.388,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION SECADOR DE MANOS BLANCO DE SENSOR INCLUYE PUNTO ELECTRICO	100%	$ 787.972,00		0%	$ -
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL BLANCO PARA PAPEL HIGIENICO	100%	$ 1.027.968,00		0%	$ -
4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	100%	$ 682.932,00		0%	$ -
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS PULIDOS Y DILATADOS DE 1.10 X 1,0 MT	100%	$ 903.628,00		0%	$ -
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESO PARA BAÑO DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE (BARRA FIJA, BARRA ABATIBLE A PARED)	100%	$ 489.935,00		0%	$ -
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO ACERO	100%	$ 202.384,00		42,86%	$ 86.736,00
4,14	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE JARDIN PARA POCETA DE ASEO	100%	$ 102.798,00		66,67%	$ 68.532,00
4,15	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA DE ASEO INCLUYE WIN METALICO	100%	$ 55.659,00		45,58%	$ 25.366,84

AVANCE FISICO DEL PROYECTO SEMANA 6						
ITEM	**DESCRIPCION**	**% prog**	**Costo prog**	**% ejec Sem**	**% ejec acum**	**Valor ejec acum**
5,1	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MARCO DE VENTANAS INCLUYE LIJADO PARA QUITAR RASTROS DE CORROSION, APLICACIÓN DE CORROSIVO Y ESMALTE	100%	1.482.050,00		0%	
5,2	MANTENIMIENTO PUERTAS EN MADERA	100%	$ 240.930,00		60,00%	$ 144.558,00
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE CONTROL SOLAR, SUPER GUARD (IR+ SPUTTER) RECHAZA LOS RAYOS INFRARROJOS EN UN 97% (CALOR), SPUTTER PELÍCULA REFLECTIVA RECHAZA EL BRILLO O REFLEJO DEL SOL, BRINDA PROTECCIÓN DEL 99.9% DE LOS RAYOS UV (ULTRAVIOLETA) CAUSANTES DE LA DECOLARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y DE ENFERMEDADES EN LA PIEL. EVITA ACCIDENTES POR DESFRAGMENTACIÓN DEL VIDRIO.	100%	$ 12.870.789,00		0%	
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS 60 X 60 LED	100%	18.007.650,00		0%	$ -
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC	100%	$ 35.699.908,00		0%	$ -
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES	100%	295.900,00		0%	$ -
10,1	ASEO PERMANENTE DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL	100%	$ 1.395.178,00		19,65%	$ 274.182,20
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL			**$ 497.910.450,00**			**$ 53.989.678,45**
ADMINISTRACIÓN		**15%**	**$ 74.686.568,00**			**$ 8.098.451,77**
IMPREVISTOS		**5%**	**$ 24.895.523,00**			**$ 2.699.483,92**
UTILIDAD		**5%**	**$ 24.895.523,00**			**$ 2.699.483,92**
IVA		**19%**	**$ 4.730.149,00**			**$ 512.901,94**
A. TOTAL OBRA CIVIL			**$ 627.118.212,00**			**$ 68.000.000,00**

ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERÍODO

3.5.1.1 Actividades de obra

Durante los meses de junio y julio, hasta la fecha, se llevaron a cabo diversas actividades en el proyecto de mantenimiento. A continuación, se presenta un resumen detallado.

- Excavación manual para ascensor:

  Durante la excavación manual de las dimensiones especificadas, siendo de 1.95 m de largo, 1.75 m de ancho, y una profundidad de 1.50 m, se empleó un enfoque coordinado por parte del equipo técnico. Utilizando herramientas especializadas como palas, picos, rotomartillo y carretillas, se procedió a delimitar y remover el suelo de manera ordenada y precisa. La excavación se realizó en capas sucesivas para garantizar la estabilidad del área circundante, manteniendo una pendiente adecuada para la seguridad del personal involucrado. Se aplicaron medidas de control de calidad para asegurar la uniformidad de la profundidad alcanzada, evaluando constantemente la compactación del suelo extraído. Adicional, se instaló un cerramiento con polisombra para delimitar la seguridad de la intervención de excavación.

- Intervención en replanteo de red hidráulica, y traslado de cajas de aguas residuales:

  En el procedimiento de desmonte de la placa maciza en la zona de excavación, se encontró una caja de inspección de aguas residuales, la cual se tuvo que remover, y realizar desde 0 la instalación de tres cajas nuevas, y dos registros.

- Figuración de acero para estructura de ascensor:

  Actualmente, se está llevando a cabo la fase de figuración del acero para la estructura del ascensor. Este proceso implica la elaboración detallada y precisa de los planos y especificaciones técnicas que determinarán la configuración exacta de las secciones de acero que compondrán la estructura portante del ascensor.

- Cambio de enchape de piso y aparatos hidrosanitarios en baño de mujeres, al lado de la excavación:

  La instalación de la nueva red hidráulica en el baño conllevó a la necesidad de modificar el enchape de piso adyacente por consecuencia del traslado de la caja de inspección de aguas negras. La modificación del enchape implicó la remoción cuidadosa del material existente, seguido de la preparación adecuada de la superficie para la instalación del nuevo revestimiento. Adicional a esto, se aprovechó para cambiar los aparatos hidrosanitarios del baño (sanitario y lavamanos).

- Intervención en baños de segundo piso:

  Se llevó a cabo la instalación de enchape en paredes y pisos en los baños de hombres y mujeres ubicados en el segundo piso. Además, se instalaron nuevos sanitarios en cada baño, tomas de corriente, pintura en los techos y marcos de cada baño. También se realizaron otras mejoras como la instalación de sifones, tapas de registros, llave de jardín y fundida de poceta, completando así una renovación integral de estos espacios.

- Desmonte de cielo raso en cuarto piso:

  Se procedió al desmontaje del cielo raso en yeso con el objetivo de reemplazarlo por uno fabricado en PVC. Esta decisión se tomó con miras a mejorar tanto la estética como la funcionalidad del espacio. También se aprovechó y se desmontaron las luminarias herméticas, por unos paneles led de incrustar.

- Mantenimiento de estructura metálica en cuarto piso:


  El procedimiento de mantenimiento de la cubierta existente en el cuarto piso comenzó con la limpieza de excrementos de palomas y murciélagos, garantizando así condiciones higiénicas y de seguridad óptimas. Posteriormente, se llevó a cabo el arreglo de la estructura existente, abordando cualquier daño o desgaste significativo antes de proceder con el lijado para preparar la superficie para la pintura. Finalmente, se aplicó una capa de pintura especializada, seleccionada para proteger y mejorar la durabilidad de la estructura, asegurando que la cubierta no solo cumpla con estándares estéticos sino también funcionales para mantener la integridad del edificio en su totalidad. Esto se realizó en las zonas del hall, sala de audiencias y archivo del juzgado penal del circuito, en zona 1 y 2.

Se adjuntan actividades diarias en anexo 01 – bitácora de obra mes de junio y julio

3.6 REGISTRO FOTOGRAFICO: FOSO DE ASCENSOR Y BAÑO MUJERES PRIMER PISO





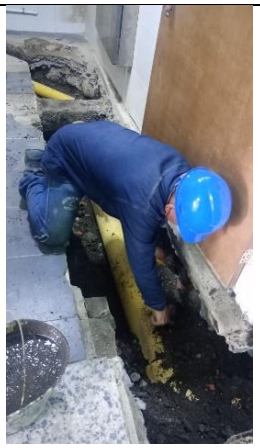






viernes, junio 28, 2024 13:54
Gachetá
PALACIO DE JUSTICIA

viernes, junio 28, 2024 15:50
Gachetá
PALACIO DE JUSTICIA


miércoles, julio 03, 2024 14:43
PALACIO DE JUSTICIA



BAÑOS DE SEGUNDO PISO:

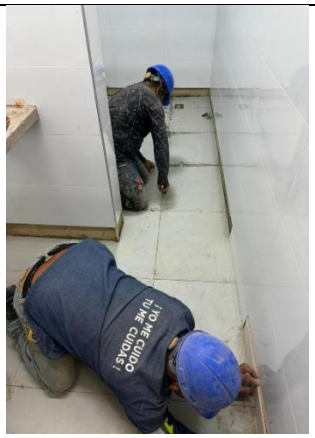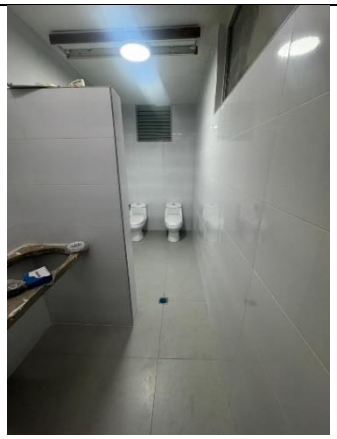



DESMONTE DE CIELO RASO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA:






FIGURACIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURA DE ASCENSOR:

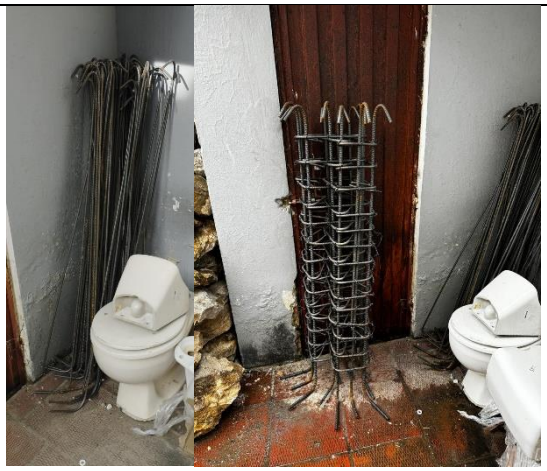




3.7 PERSONAL EN OBRA

3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATISTA

- Director de obra: Arq. Luis Armando Borda
- Residente de obra: Ing. Juan Camilo Castro Castillo
- Profesional SST: Angela Viviana Bejarano

PERSONAL OPERATIVO CONSTRUCTOR

SUBCONTRATISTAS – SVC CONSTRUCCIONES

- Maestro de obra: Efraín Gonzáles Moncada
- Maestro de obra: Yuri Doncel Santos
- Oficial: Edward Fabián Aguilar Hernández

- Ayudante: Álvaro Enrique Martín Martín
- Ayudante: Raúl Eitamartamayo Hernández
- Ayudante: Johan Stiven Ramírez Acosta

3.8 BITÁCORA

La información correspondiente a la bitácora de obra del mes de junio y julio de 2024, se encuentra en el anexo "No. 01 BITACORA DE OBRA" – se envía adjunto junto a este informe.

3.9 Soporte pago parafiscales

La información correspondiente a parafiscales del mes de junio y julio de 2024, se encuentra en el anexo "No 01 Informe SST". Enviado por Angela Viviana Bejarano.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Debido al mantenimiento de la estructura metálica de la cubierta del cuarto piso, se evidenció que la teja existente está en un estado desgastado, y en algunas secciones corroídas. En consecuencia, a esto, se pasó una propuesta económica para cambiar la cubierta completa por una teja de AJOVER. Se mantiene a la espera la respuesta por parte de la entidad.

Se tiene previsto la intervención de los baños del tercer piso cuando se entreguen en su totalidad los que se están interviniendo aún.

Se realiza instalación de estructura para cielo raso en PVC para techo de cuarto piso, avalado por interventoría.

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA No. 18 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA "DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS." Y EL "CONSORCIO PORVENIR" CON Nit. 901818757 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS."

UBICACIÓN ACTUAL DE SST.

GACHETA CUNDINAMARCA

ELABORADO POR:

ANGELA VIVIANA BEJARANO RODRIGUEZ
RESIDENTE SST

OBJETO DEL INFORME

Brindar de forma detallada reporte de actividades realizadas por parte del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la actividad objeto de contrato, "Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) ascensor panorámico incluye obra civil y eléctrica, así como las obras de mantenimiento a la infraestructura fisica para la sede propia en el municipio de Gacheta a cargo de la dirección seccional de administración judicial de Cundinamarca y Amazonas"

Se deja registro fotográfico de las actividades y gestiones realizadas las cuales se anexan dando veracidad a este informe.

OBJETIVOS DEL SST.

1. Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos saludables, promoviendo la salud y previniendo enfermedades laborales y conductas de riesgo en el personal a cargo.

2. Promover hábitos al personal, para mantener el área de trabajo siempre ordenada limpia y despejada de objetos que obstaculicen y detengan la libre movilización y de esta manera evitar un incidente o accidente.

3. Diariamente realizar sensibilización y seguimiento al equipo de trabajo para lograr el indicador en cero accidentes, incidentes.

4. Realizar inspección durante la Jornada de trabajo a los EPP evitando exposiciones de riesgo.

5. Identificar diariamente posibles riesgos en el área o ambiente de trabajo.

6. Generar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para el bienestar y la seguridad de todos los que están en la obra.

7. Garantizar que el personal se encuentre en óptimas condiciones de Salud para desempeñar la labor asignada.

8. Informar e integrar a los trabajadores de forma activa en el compromiso de la prevención de los riesgos con relación a la seguridad y salud en el trabajo.

9. Implementar acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

10. Dejar registro físico y fotográfico de las capacitaciones que se realizan durante el día para mantener el indicador en cero accidentes.

11. Manejo de conflictos y Solución de problemas que se presenten en la jornada evitando debilite el buen ambiente laboral.

12. Identificar y evaluar los riesgos de la obra e implementar medidas correctivas que eliminen o minimicen los Riesgos y exposición al personal.

13. Ejercer Acción de mejora para lograr optimizar el desempeño de la empresa en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

14. Colaborar con el análisis de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, con el fin de proponer medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia

15. Visitar e inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo, teniendo en cuenta maquinaria y equipos con los cuales se realizan las labores diarias e informar sobre su estado y los posibles riesgos que estos generan con el fin de adoptar medidas correctivas.

16. Demás funciones que le señalen las normas sobre la implementación del SST.

SOPORTES DE LA GESTIÓN

1. CAPACITACIONES

A partir del 7 junio al 25 de julio se han realizado las siguientes capacitaciones al personal, siendo estas:

1. Inducción de seguridad y salud en el trabajo:

- Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo) y política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
- Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).
- Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.
- Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).
- Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).
- Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: Puntos de encuentro



2. Uso adecuado de EPP: se socializa la importancia de cada uno de los EPP durante la ejecución de las actividades





3. Qué es y cómo reporto un accidente de trabajo



4. Lavado adecuado de manos




5. Peligro vs Riesgo



6. Acto y condición insegura



7. Separación adecuada de residuos generados en la obra



Respuesta del Personal: Actualmente estamos con un indicador **en cero accidentalidad** e incidentes. Dando por recibido y adoptado las medidas y controles realizados

INSPECCION DE (EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL)

Se realiza control diario y continuo al uso adecuado de EPP durante la ejecucion de las actividades, realiando cambio a los que presentan deteriorio o daño por la labor realiza.






El personal presente en obra cuenta con dotaciòn (camisa manga larga, jean, botas de seguridad y carnet para identificaciòn o en caso de emergencia.



Se realiza inspecciòn a equipos utilizados durante la ejecucion de las tareas, verificando estado fisico y manipulacion (si plica)

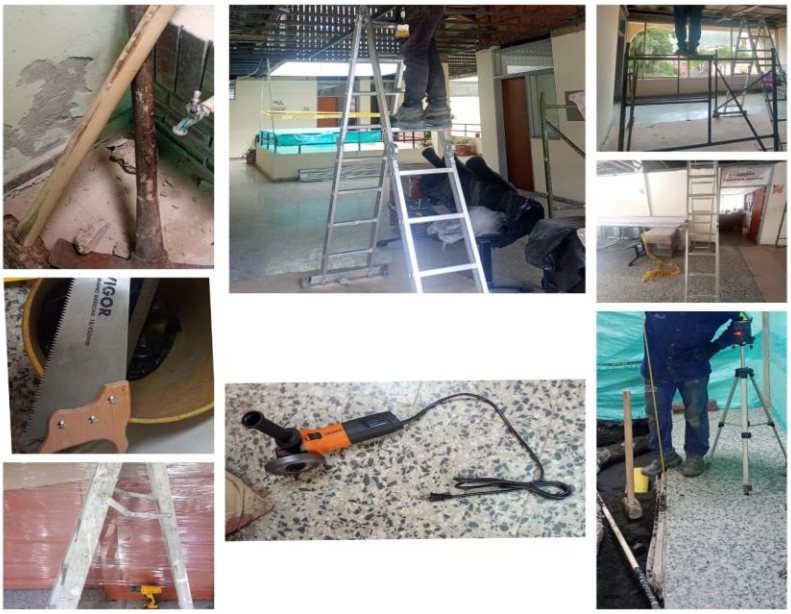

SEÑALIZACION DE LAS AREAS INTERVENIDAS

Como el objetivo es advertir al usuario de la existencia y naturaleza de un riesgo a continuacion se relaciona la señalizacion implementada en el proyecto.



PAUSAS ACTIVAS

Se realizan pausas guiadas por el residente SST para mantener ojos y mente en la tarea sin excesos de desgaste físicos y así mismo controlar estado de Salud del personal.



ORDEN Y ASEO DURANTE LA OBRA

Durante la ejecución del proyecto se realiza aseo y orden en todas las áreas intervenidas.





RESULTADOS OBTENIDOS EN LA OBRA

Se logra identificar compromiso por cada uno de los colaboradores para mantenerse seguro y ayudar para que la actividad diaria no tenga reportes que afecten el indicador.
A la fecha no se presenta reportes que afecten los indicadores o requieran reportes a ARL.
Se evidencia buen ambiente Laboral y zonas seguras sin disminuir atención en que pueda ocurrir accidentes.

Dentro de los seguimientos y controles se logra comprometer al personal y participar y controlar activamente su seguridad y la de la compañía.

GLOSARIO

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.

Medidas de prevención: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Entre ellas están: sistemas de ingeniería; programa de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención.

Medidas de protección: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte, de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandado

Capacitación: es toda actividad realizada en una empresa o institución autorizada, para responder a sus necesidades, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

Quedo atenta a ampliar de ser necesario los reportes entregados en este informe.

Cordialmente,



Residente SST

Se realiza anexo de los soportes ATS, pre operacionales, capacitaciones y entrega de EPP

	INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSORCIO PORVENIR	

INFORME DE AMBIENTAL

CONSORCIO PORVENIR

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA No. 18 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA "DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS." Y EL "CONSORCIO PORVENIR" CON Nit. 901818757 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS."

GACHETA CUND., 23 DE JULIO 2024

ELABORADO POR:

ANGELA VIVIANA BEJARANO RODRIGUEZ

(RESIDENTE SST)

	INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSORCIO PORVENIR	

INTRODUCCIÓN

En este informe se encuentra consolidada la gestión realizada de Gestión Ambiental basados en la guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura, CONTRATO DE OBRA No. 18 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA “DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.” Y EL “CONSORCIO PORVENIR” CON Nit. 901818757 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.”

	INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSORCIO PORVENIR	

OBJETIVO

Identificar y evaluar los aspectos negativos y positivos derivados del desarrollo de las obras del Proyecto y generar las medidas preventivas y de control necesarias que conlleven a un óptimo desempeño del mismo sin causar mayor afectación al medio ambiente y a los habitantes de las zonas aledañas.

OBJETIVOS SUB-ESPECIFICOS

Identificar y evaluar los posibles impactos generados que puedan afectar al medio ambiente.

Establecer las acciones de manejo ambientales necesarias para la protección, conservación y optimización de los recursos naturales.


DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No. 18 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA “DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.” Y EL “CONSORCIO PORVENIR” CON Nit. 901818757 QUE TIENE POR OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASI COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.”

	INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSORCIO PORVENIR	

LOCALIZACION DEL PROYECTO

EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE GACHETA CLL 4 # 3-21

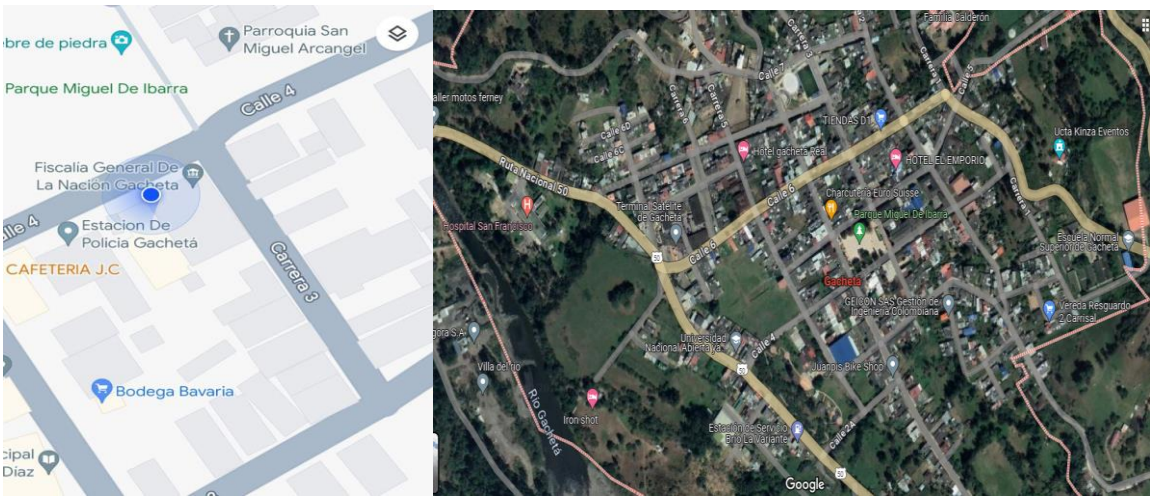

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

UBICACIÓN EN EL PMA	LEGISLACION	APLICACIÓN
7	Resolución 541 de 1994 Regula el cargue, descargue, transporte. Almacenamiento y disposición de escombros	En el Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Mejoras Locativas, Remodelación y Adecuación de las Instalaciones del edificio palacio de justicia Gacheta Cund. en la ejecución de sus actividades se destinaron dos viajes de 30 metros cúbicos cada uno para un total de 60 metros cubicos de escombros destinados a la Fundación día azul futuro verde.
5	Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.	

	INFORME MENSUAL AMBIENTAL CONSORCIO PORVENIR	

INDICE

1. Certificados de la Dispocisión final de residuos.(Anexo certificados)
2. Registro fotografico del cargue de escombros



Realizado por:

Angela Bejarano Rodriguez
Administradora en Salud Ocupacional
LIC S.O. 25-0604 de 2021

ANGELA VIVIANA BEJARANO RODRIGUEZ

(RESIDENTE SST)

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

FDAFV-1844-2024

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Registro 001 Resolución 472 de 2017	
Nombre o razón social	FUNDACIÓN DÍA AZUL FUTURO VERDE	
Documento de identificación o NIT	900.763.971-5	
Representante Legal	OSCAR ARMANDO HORTUA GARCIA	
Dirección	Predio El Triunfo, Vereda Chacua, Municipio Sibate	
Teléfono	3219949007	
Correo electrónico	fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	----------
Nombre o razón social	CONSORCIO PORVENIR
Documento de identificación o NIT	901.818.757-7
Representante Legal	Miguel Alejandro Pinzón
Dirección domicilio	Cl 20 No. 12-84
Teléfono	3105602708
Correo electrónico	cscporvenir@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Calle 4 No. 3-09 Palacio de Justicia Gacheta

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos delgenerador**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	30 m3
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (dry wall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total RCD recibidos	30 m3
Fecha de recepción de los RCD	Del 29 de junio 2024

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT : 900.763.971-5
NOMBRE: Fundación Día Azul Futuro Verde

Verificar Certificado en nuestra página Web www.diaazulfuturoverde@hotmail.com

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

FDAFV-1845-2024

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Registro 001 Resolución 472 de 2017	
Nombre o razón social	FUNDACIÓN DÍA AZUL FUTURO VERDE	
Documento de identificación o NIT	900.763.971-5	
Representante Legal	OSCAR ARMANDO HORTUA GARCIA	
Dirección	Predio El Triunfo, Vereda Chacua, Municipio Sibate	
Teléfono	3219949007	
Correo electrónico	fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	----------
Nombre o razón social	CONSORCIO PORVENIR
Documento de identificación o NIT	901.818.757-7
Representante Legal	Miguel Alejandro Pinzón
Dirección domicilio	Cl 20 No. 12-84
Teléfono	3105602708
Correo electrónico	cscporvenir@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Calle 4 No. 3-09 Palacio de Justicia Gacheta

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos delgenerador**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	30 m3
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (dry wall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total RCD recibidos	30 m3
Fecha de recepción de los RCD	Del 04 de julio 2024

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT : 900.763.971-5
NOMBRE: Fundación Día Azul Futuro Verde

Verificar Certificado en nuestra página Web www.diaazulfuturoverde@hotmail.com

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

FDAFV-1863-2024

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Registro 001 Resolución 472 de 2017	
Nombre o razón social	FUNDACIÓN DÍA AZUL FUTURO VERDE	
Documento de identificación o NIT	900.763.971-5	
Representante Legal	OSCAR ARMANDO HORTUA GARCIA	
Dirección	Predio El Triunfo, Vereda Chacua, Municipio Sibate	
Teléfono	3219949007	
Correo electrónico	fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	----------
Nombre o razón social	CONSORCIO PORVENIR
Documento de identificación o NIT	901.818.757-7
Representante Legal	Miguel Alejandro Pinzón
Dirección domicilio	Cl 20 No. 12-84
Teléfono	3105602708
Correo electrónico	cscporvenir@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Calle 4 No. 3-09 Palacio de Justicia Gacheta

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos delgenerador**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	9 m3
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticostales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (dry wall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total RCD recibidos	9 m3
Fecha de recepción de los RCD	Del 27 de julio 2024

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT : 900.763.971-5
NOMBRE: Fundación Día Azul Futuro Verde

Verificar Certificado en nuestra página Web www.diaazulfuturoverde@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141013616069

(415)7707212489984(8020) 000014101361606 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 8 7 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 2 6 3 3 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DOBLE M INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 3 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 9 7 4 4 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOUL INGENIERIA CO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 4 0 3 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 4 6 5 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PINZON	AGUILAR	MIGUEL	ALEJANDRO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 4 0 3 0 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141013616069

(415)7707212489984(8020) 000014101361606 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 8 7 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PORVENIR

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 # 12 - 84

42. Correo electrónico cscporvenir@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 6 0 2 7 0 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 1	2 0 2 4 0 3 0 2	4 3 3 0	2 0 2 4 0 3 0 2			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 12 / 15 : 21: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141013616069

(415)7707212489984(8020) 000014101361606 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 8 7 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 3 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 3 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141013616069

(415)7707212489984(8020) 000014101361606 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 8 7 5 7	7	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 4 6 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINZON	AGUILAR	MIGUEL	ALEJANDRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 7 2 1 5 6 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUSSI	SUAREZ	CESAR	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y FIC

Yo, **MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR** identificado con C.C. No. 7.174.650 de Tunja, Boyacá, en calidad de Contratista, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que hemos efectuado el pago por concepto de aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados correspondientes a la vigencia julio de 2024 para el Contrato de obra No. 18 de 2024 que tiene como objeto el **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ASCENSOR PANORAMICO INCLUYE OBRA CIVIL Y ELECTRICA, ASÍ COMO LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEDE PROPIA EN EL MUNICIPIO DE GACHETA A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS".**

Dado en Tunja a los (26) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

Firma:
Nombre de quien declara: **MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR**
Nit No. 7.174.650 de Tunja
R.L. CONSORCIO PORVENIR

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30548466
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-08-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO PORVENIR	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901818757	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 12 84	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4330	CORREO ELECTRÓNICO	CSCPORVENIR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7174650	PRIMER APELLIDO	PINZON	SEGUNDO APELLIDO	AGUILAR
PRIMER NOMBRE	MIGUEL	SEGUNDO NOMBRE	ALEJANDRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 07	Año: 2024	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$0		30548466

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74339342	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	AREVALO RODRIGUEZ YAMITH EUCLIDES	$1.300.000
CC-1074414436	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	BEJARANO RODRIGUEZ ANGELA VIVIANA	$1.300.000
CC-6763786	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	BORDA VANEGAS LUIS ARMANDO	$1.300.000
CC-1057596208	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	CASTRO CASTILLO JUAN CAMILO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74339342																													0		
CC - 1074414436																													0		
CC - 6763786																													0		
CC - 1057596208	R	2024-07-09																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74339342	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1074414436	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 6763786	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1057596208	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74339342	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1074414436	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 6763786	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1057596208	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	22	$953.334	1	0.0696000	$66.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74339342	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1074414436	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6763786	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1057596208	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	4	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	4	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$337.900	0	$0	$0	$337.900	0	$0	$337.900	0	$0	$0	$337.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	4	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$337.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$337.900

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30463742
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO PORVENIR	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901818757	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 12 84	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	TUNJA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4330	CORREO ELECTRÓNICO	CSCPORVENIR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7174650	PRIMER APELLIDO	PINZON	SEGUNDO APELLIDO	AGUILAR
PRIMER NOMBRE	MIGUEL	SEGUNDO NOMBRE	ALEJANDRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$0		30463742

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74339342	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	AREVALO RODRIGUEZ YAMITH EUCLIDES	$1.300.000
CC-1074414436	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	BEJARANO RODRIGUEZ ANGELA VIVIANA	$1.300.000
CC-6763786	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	BORDA VANEGAS LUIS ARMANDO	$1.300.000
CC-1049639977	59	No	No	No	25	297	5411201	Salario	PINZON AGUILAR MIGUEL ANGEL	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74339342																													0		
CC - 1074414436																													0		
CC - 6763786																													0		
CC - 1049639977			R	2024-06-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74339342	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1074414436	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 6763786	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1049639977	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74339342	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1074414436	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 6763786	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1049639977	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74339342	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1074414436	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6763786	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049639977	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	4	$0	$0	$0	$0	$0	14	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	4	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	14	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$362.000	0	$0	$0	$362.000	14	$3.900	$365.900	0	$0	$3.659	$365.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	4	$0	14	$0	$0
SENA	0	$0	14	$0	$0
ICBF	0	$0	14	$0	$0
ESAP	0	$0	14	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	14	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$365.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$365.900

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN CAMILO CASTRO CASTILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1057596208
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-05
FECHA DE PAGO:	2024-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8631732750
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631708794
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 953.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.200	$ 119.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 953.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.600	$ 152.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 953.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 5.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.600	$ 277.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901588496-1	SVCCONSTRUCCIONES SAS	CARRERA 92 B NRO 38 C 77 SUR	3218256689	svcconstrucciones967@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	BOGOTA 2	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E		78844917	$6.307.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	234.200	0		0		0	0	0	0	234.200	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.900	0		0		0	0	0	0	72.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.500	0		0		0	0	0	0	3.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	5.200	0		0		0	0	0	0	5.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	294.800	0		0		0	0	0	0	294.800	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.100	0		0		0	0	0	0	104.100	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	83.300	0		0		0	0	0	0	83.300	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	5.200	0		0		0	0	0	0	5.200	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	13.900	0		0		0	0	0	0	13.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	908.400	0	0	0	0	0	0		908.400	9
230301	Porvenir	800224808-8	1.782.200	0	0	0	0	0	0		1.782.200	17
231001	Colfondos	800227940-6	332.900	0	0	0	0	0	0		332.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	242.800	0	0	0	0	0	0		242.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.422.300				1.422.300	0	0	1.422.300			14.223	1.422.300	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	801.500	0	0	801.500	34

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901588496-1	SVCCONSTRUCCIONES SAS		CARRERA 92 B NRO 38 C 77 SUR	3218256689	svcconstrucciones967@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	BOGOTA 2	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E		78844917	$6.307.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	817.100	817.100
Pensión	4	3.266.300	3.266.300
Riesgos Laborales	1	1.422.300	1.422.300
CCF	1	801.500	801.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	6.307.200	6.307.200

PAGADO 795512765

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901588496-1	SVCCONSTRUCCIONES SAS		CARRERA 92 B NRO 38 C 77 SUR	3218256689	svcconstrucciones967@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	BOGOTA 2	02	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					34	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-07	2024-06	E		78844917	$6.307.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000574774	DIAZ GOMEZ SANTIAGO ESTIBEN	1	0			S	X	X															230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
2	CC	1022335205	ANGARITA ACEVEDO JOHN FREDY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1051736688	TELLEZ MENDEZ HAILTON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	110685040	CASTRO CARDOZO CARLOS IVAN	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS037	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
5	CC	1137195515	HERRERA PALACIOS JULIAN	1	0			S	X	X															230301	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
6	CC	1233911508	PUERTO RIVERA CRISTIAN DAVID	1	0			S	X	X															230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS010	130.000	5.200	14-11	130.000	5	9.100	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
7	CC	53009528	ARREDONDO FRANCO MAYA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	79767278	GONZALEZ MONCADA EFRAIN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	80228048	TAMAYO HERNANDEZ RAUL EITAMAR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	910.000	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	86005526	DONCEL SANTOS YURY	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	PT	4905375	BARCO SANCHEZ DENNY ROBINSSON	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPSC34	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
12	CC	1014186967	CASTILLO BAYONA SERGIO ANDRES	1	0			S	X																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPSC34	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF22	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
13	CC	1019070023	COY RINCON EDUARD ALBERTO	1	0			S	X	X															231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
14	CC	1020775495	DONCEL TOVAR DANIEL	1	0			S	X	X															230201	520.000	83.200	0	0	0	0	EPS002	520.000	20.800	14-11	520.000	5	36.200	CCF22	520.000	20.800	0	0	0	0	0
15	CC	13443375	SANCHEZ DURAN JOSE EUSTOQUIO	1	0			S	X																230301	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS037	1.083.334	43.400	14-11	1.083.334	5	75.500	CCF22	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
16	CC	19645347	RINCON SEPULVEDA JAIRO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	1082994356	MARTINEZ LOPEZ KATHERINE	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
18	CC	1128051735	GOMEZ VALLEJO JAIR	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	ESSC24	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
19	CC	1143338375	RIOS CARABALLO ARNALDO	1	0			S	X																231001	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS002	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF22	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
20	CC	11436307	ORIGUA CLAVIJO MARCO AURELIO	1	0			S	X	X															230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
21	CC	93418632	MARTIN MARTIN ALVARO ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	9526058	JEREZ GONZALEZ CIRO ANTONIO	1	0			S	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS005	476.667	19.100	14-11	476.667	5	33.200	CCF22	476.667	19.100	0	0	0	0	0
23	CC	72249697	GOMEZ CASTAÑEDA HENRRY JOHAN	1	0			S	X	X															231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
24	CC	80026460	HERAZO LUNA MEDARDO ENRIQUE	1	0			S	X																230201	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
25	CC	80416653	PINEDA PINEDA JOSE EDGAR	1	0			S	X																230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS002	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
26	CC	88130966	RUIZ JAIMES HECTOR GUILLERMO	1	0			S	X																230201	260.000	41.600	0	0	0	0	ESSC24	260.000	10.400	14-11	260.000	5	18.100	CCF22	260.000	10.400	0	0	0	0	0
27	CC	1030608252	RAMIREZ ACOSTA JOHANN STEVEN	1	0			S	X																231001	780.000	124.800	0	0	0	0	EPSC34	780.000	31.200	14-11	780.000	5	54.300	CCF22	780.000	31.200	0	0	0	0	0
28	CC	1073533792	AGUILAR HERNANDEZ EDWARD FABIAN	1	0			S	X																230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS017	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF22	823.334	33.000	0	0	0	0	0
29	CC	9876849	DIAZ VARGAS REINALDO SEGUNDO	1	0			S	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
30	PT	4981482	GONZALEZ FERNANDEZ ABERLI YARLIN	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
31	PT	5324886	MENDEZ APONTE EDUARDO JOSE	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPSC34	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
32	PT	5436456	LOZANO MONTIEL BILIVARDO JESUS	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
33	CC	13927818	CARDENAS LIZCANO CARLOS JULIO	1	0			S		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	5	3.100	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
34	CC	6501654	RUSSI MARIN HOVER ANTONIO	1	0			S	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074414436		BEJARANO RODRIGUEZ ANGELA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5E # 1-28 SUR GRAN COLOMBIA	CAJICA-CUNDINAMARCA	3158768130	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000561	9470757118	I	2024/08/12	2024/07/30	BANCO DE BOGOTA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: CAJICA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	1074414436	BEJARANO ANGELA	X	X															25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074414436		BEJARANO RODRIGUEZ ANGELA VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5E # 1-28 SUR GRAN COLOMBIA	CAJICA-CUNDINAMARCA	3158768130	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000561	9470757118	I	2024/08/12	2024/07/30	BANCO DE BOGOTA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6763786
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ARMANDO BORDA VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 2 N 6 32	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7935509860**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: julio AÑO: 2024		
DÍAS DE MORA:	32				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	931947560		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 213.000
SUBTOTAL:			1	**$ 213.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 166.400
SUBTOTAL:			1	**$ 166.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 8.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 379.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6763786
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ARMANDO BORDA VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 2 N 6 32	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7942811165**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		931959636

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.700
SUBTOTAL:			1	**$ 208.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 163.000
SUBTOTAL:			1	**$ 163.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 1.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 371.700**

Planilla Pagada
