

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Junio 04 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado Contrataciones Grupos 7 y 9

NO.	GRUPO	CONVOCATORIA	ACTA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	PROPUESTAS	HABILITADOS	RECHAZADO	OBSERVACIONES	SIGUIENTE ACTIVIDAD
1	Grupo 7	CONTRATACIÓN DIRECTA	N.A.	0	N.A.	N.A.	• Se firma acta de incio a 31may202	Ejecución fase I
2	Grupo 7	PAF-MENAM-I-059-2023	N.A.	8	6	1	Se firma acta de inicio a 31may2024	Interventoria a fase I
3	Grupo 9	CONTRATACIÓN DIRECTA	N.A.	0	N.A.	N.A.	En espera de firma acta de inicio.	Firma de Acta de Inicio
4	Grupo 9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	N.A.	0	N.A.	N.A.	• Se realizó la declaratoria desierta de la convocatoria privada de interventoría. • Se está en revisión de información y ajuste de estudios previos para iniciar el proceso de contratación directa.	N.A.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado Contrataciones Grupo 9 Interventoría

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

El día nueve (09) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024) se presentó ante el Comité de Contratación No. 083, el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue remitido con los siguientes resultados:

	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
	CONSORCIO INTER INGECAG 2024 Representante Legal **JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ**	**RECHAZO** **Causal:** 5.33.11. *"**Cuando el proponente** sea persona natural, jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal e **inclusive socios** o los representantes legales o administradores de la sociedad que presenten propuestas para una interventoría o consultoría **siendo adjudicatario** o ejecutando **contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios autónomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente**."* (Negrilla y Subrayado por fuera del texto original).			**RECHAZO**

La declaratoria desierta se realizó mediante Comité Fiduciario No. 32 en Sesión Virtual del 27 a 28 de mayo de 2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

139 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Estado Actual
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [67,98%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [19,83%] 27/11/2023 - 01/08/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	En Obra [100%] 14/11/2023 - 12/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	En Obra [100%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [14,80%] 14/11/2023 - 29/08/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	En Obra [100%] 15/11/2023 - 26/04/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En proceso de legalización precontractual
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [89,70%] 08/11/2023 - 20/07/2024
G9 [15 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En legalización Obra. En proceso de contratación Interventoría
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [15,76%] 19/02/2023 - 15/08/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Estudios [16,45%] 12/02/2023 - 07/06/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [35,23%] 20/02/2023 - 04/06/2024

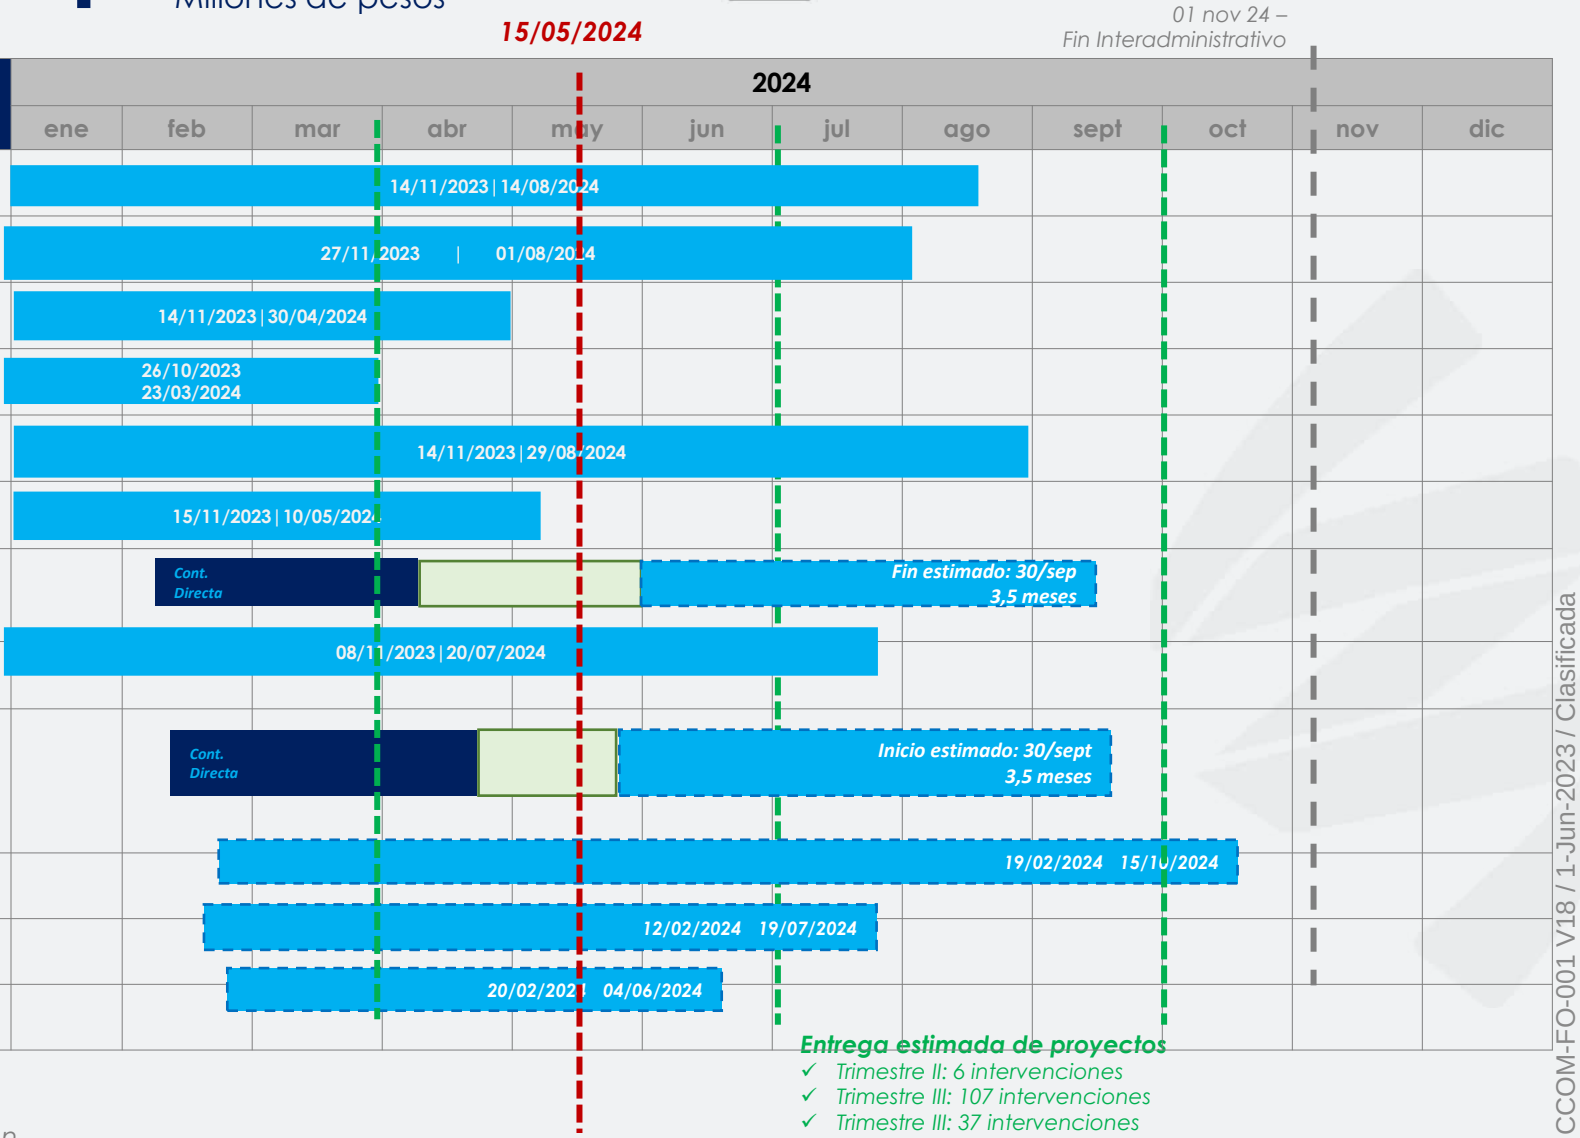

Etapa precontractual y de alistamiento:
192 visitas para viabilidades técnicas y jurídicas.

Entrega estimada de proyectos
- ✓ *Trimestre II: 6 intervenciones*
- ✓ *Trimestre III: 107 intervenciones*
- ✓ *Trimestre III: 37 intervenciones*
- * *8 sedes en validación jurídica*

Convocatoria *Llegalización* *Ejecución*

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

139
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2024				
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN ⇨
Grupo 1	Antioquia I Chocó	En Obra [51,34%] 14/11/2023 - 30/04/2024					14/08/2024
Grupo 2	Atlántico	En Obra [19,83%] 27/11/2023 - 01/06/2024					01/08/2024
Grupo 3	Magdalena	En Obra [100%] 14/11/2023 - 12/04/2024			30/04/2024		
Grupo 4	Bolívar	En Obra [100%] 26/10/2023 - 23/03/2024		23/03/2024			
Grupo 5	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [22,44%] 14/11/2023 - 29/05/2024					29/08/2024
Grupo 6	Cesar	En Obra [67,27%] 15/11/2023 - 26/04/2024			10/05/2024		
Grupo 7	Guajira	En Fase I (Diagnósticos) 31/05/2024 -15/07/2024					30/09/2024
Grupo 8	Córdoba | Bolívar	En Obra [44,42%] 08/11/2023 - 08/05/2024					20/07/2024
Grupo 9	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En legalización Obra. En proceso de contratación Interventoría					30/09/2024
Grupo 10	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [15,76%] 19/02/2023 - 28/06/2024					15/10/2024
Grupo 11	Cauca	En Estudios [16,45%] 12/02/2023 - 07/06/2024					19/07/2024
Grupo 12	Huila | Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [35,23%] 20/02/2023 - 04/06/2024					04/06/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Balance del Contrato

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

	Obra		Interventoría		TOTAL
	Valor inicial	Valor adición	Valor inicial	Valor adición	
					$ 59.485.981.308,00
GRUPO 1	$ 3.447.332.358,95		$ 271.455.247,34	$ 25.183.769,00	$ 3.743.971.375,29
GRUPO 2	$ 4.044.124.630,00		$ 295.715.000,00		$ 4.339.839.630,00
GRUPO 3	$ 4.744.960.153,00	$ -	$ 351.774.412,00	$ 10.000.000,00	$ 5.106.734.565,00
GRUPO 4	$ 3.361.652.674,57		$ 279.439.929,28	$ 10.000.000,00	$ 3.651.092.603,85
GRUPO 5	$ 4.102.044.984,00		$ 300.856.990,00		$ 4.402.901.974,00
GRUPO 6	$ 2.102.352.000,00	$ 394.497.571,44	$ 155.543.411,00	$ 36.738.473,21	$ 2.689.131.455,65
GRUPO 7	$ 4.158.777.883,00		$ 295.239.000,00		$ 4.454.016.883,00
GRUPO 8	$ 4.706.470.280,00	$ 858.000.000,00	$ 297.097.668,00	$ 49.106.877,00	$ 5.910.674.825,00
GRUPO 9	$ 4.810.476.306,00		$ 313.828.750,00		$ 5.124.305.056,00
GRUPO 10	$ 6.014.978.800,00		$ 327.496.568,00		$ 6.342.475.367,99
GRUPO 11	$ 4.728.021.810,00		$ 312.927.160,00		$ 5.040.948.970,00
GRUPO 12	$ 4.918.276.400,00		$ 318.105.088,00		$ 5.236.381.488,00
				SUBTOTAL (1)	**$ 56.042.474.193,79**
				SUBTOTAL (2)	**$ 3.443.507.114,21**
				DOTACIÓN	$ 1.500.000.000,00
				VISITAS	$ 84.371.774,00
				TOTAL (Remanente 1)	**$ 1.859.135.340,21**
				Alcances adicionales:	
				Sede Banco Magdalena	$ 284.875.000,00
				Adición La Chinela y Tronconal	$ 150.000.000,00
				Sedes El Nispero (María La Baja)	$ 657.000.000,00
				IE Demetrio Salazar (Tadó)	$ 201.152.963,00
				Mayores Cantidades Suarez (Inmaculada)	$ 500.000.000,00
				TOTAL (Remanente 2)	**$ 66.107.377,21**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado de Proceso de Contratación de Dotación

Se está a la espera en Contratación Derivada de los Estudios Previos por parte de la Vicepresidencia Técnica., para posterior a esto solicitar el CDR.

Posterior a se espera publicar los documentos para el viernes 17 de mayo de 2024 para el inicio del proceso de contratación con los oferentes interesados.

Para la interventoría se está en revisión la parte social después de la aprobación del área jurídica y técnica. Se proyecta publicación para el próximo viernes 24 de mayo de 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Junio 4 de 2024



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4282 estudiantes.
- $ 3.743.971.376,32 Inversión

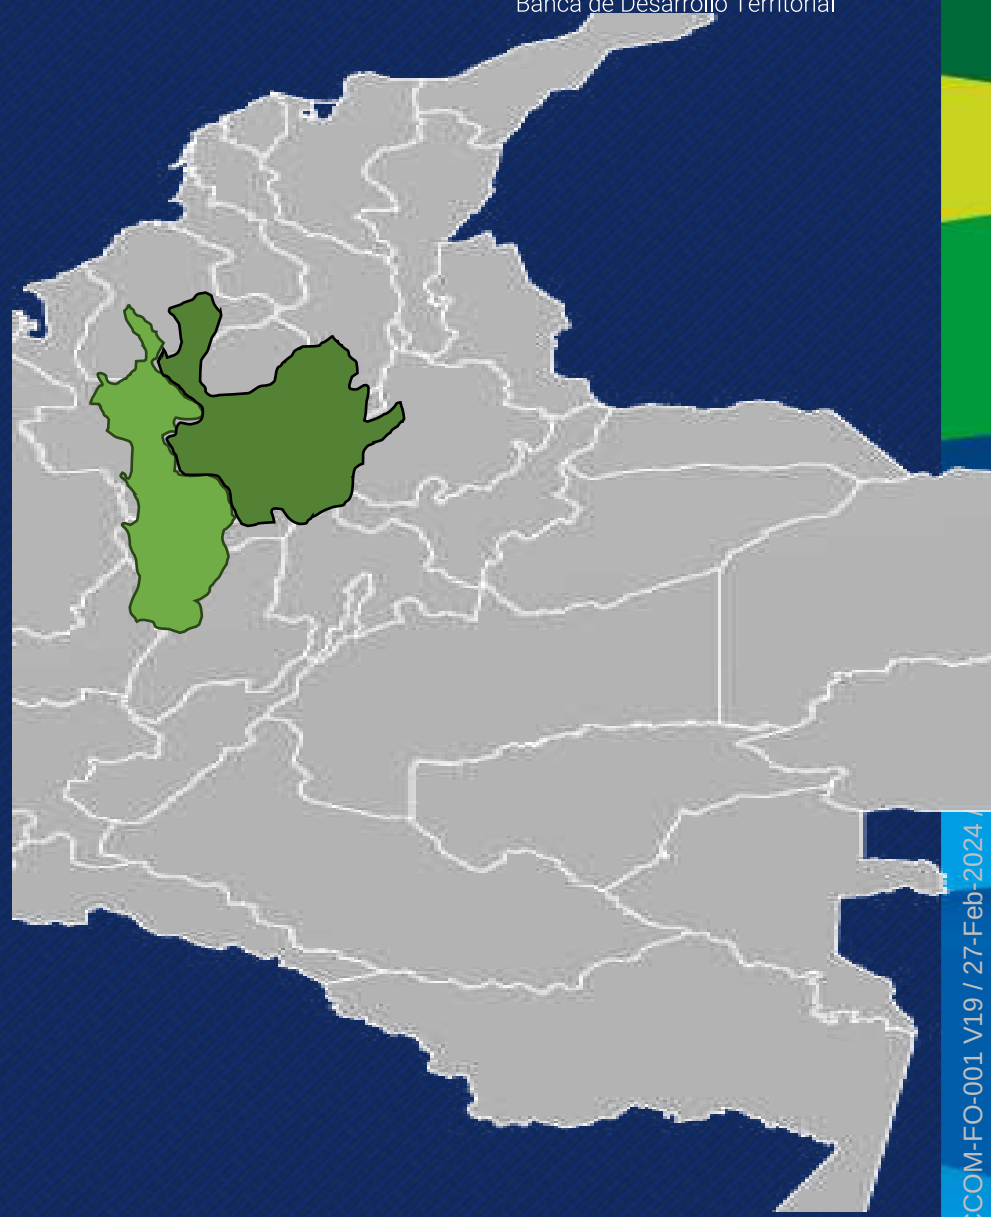

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ	27/2/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ	21/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4		14/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ	20/5/2024
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ	30/5/2024
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		7	2 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

68,36%
Porcentaje Programado

69,01%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 26 al día 12 de mayo de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 94.79% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 67.98%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 26.81% de atraso frente a lo programado.

NOTA: Se tramito adición por la suma de ($201,152,963,00) al valor de ejecución del Componente 2 del contrato obra, para la ejecución de las actividades diagnosticadas en alcance a la sede CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO, ubicada en el municipio de Tadó Chocó, y prórroga por un plazo de 3 MESES atribuible al contratista de obra para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para el CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL ubicado en el municipio del Carmen del Darién, Chocó y CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO, ubicada en el municipio de Tadó Chocó. Proceso que es aprobado en el comité técnico No. 48 y comité fiduciario No. 30 del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 el 14 de mayo de 2024.

Pendiente realizar la actualización de los porcentajes en cumplimiento a la programación soporte de la prórroga aprobada, proceso que se aplicara partir del informe semanal No. 27 con corte al domingo 19 de mayo de 2024.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra en proceso de revision de los productos por parte de la interventoría para emitir su aprobación.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE CHURIDO PUEBLO: Se realiza entrega parcial de las baterías sanitarias principales de hombres y mujeres en el bloque 2, así mismo, continúa el mejoramiento de unidades sanitarias del bloque 1 (profesores) y de las baterías sanitarias del área de preescolar. Culmina enrase de muros hasta la cubierta y procesos de revoques de columnetas del antepecho del balcón. Continúa proceso de reemplazo de estructura de cubierta del área de preescolar e instalación de tejas en UPVC.
2. I.E PUEBLO NUEVO: Transporte y acopio de material de playa, corte y acopio madera y trazado y excavación de pilotes para construcción de cimentación profunda.
3. IE. DEMETRIO SALAZAR: Se continúan actividades de corte y demolición estructuras existentes, excavación para construcción cimentación, cargue y retiro de escombros.
4. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Culmina proceso de acabados internos y externos de aula, se instala enchape perimetral de protección, instalación de luminarias, se encuentra en proceso de instalación de carpintería de puertas y ventanas. Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024.
5. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento, sin embargo, continúa subsanación de observaciones a los acabados de la carpintería metálica. Se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 02 de mayo del 2024.
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. El contratista realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024.
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. Se programa entrega de la placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024.
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. El contratista realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC.
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. Se programa entrega de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – ANTES (FECHA INICIO 29/04/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – DURANTE (FECHA INICIO 29/04/2024)









Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – DURANTE (FECHA INICIO 29/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – DURANTE (FECHA INICIO 29/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05 /2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05 /2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05 /2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO. - ANTES






IE EL OSITO, APARTADÓ - DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA INICIO 11/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA INICIO 11/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA TERMINACIÓN 07/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA ENTREGA 14/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA ENTREGA 14/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL REPOSO, APARTADO. - ANTES









IE EL REPOSO, APARTADÓ - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL REPOSO, APARTADO – DESPUÉS (ENTREGA 14/03/2024)

















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CADENAS LAS PLAYAS, APARTADO. - ANTES









IE CADENAS LAS PLAYAS, APARTADÓ - DURANTE









Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CADENAS LAS PLAYAS, APARTADO - DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO. - ANTES









IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADÓ - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – EN EJECUCIÓN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – EN EJECUCIÓN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – DESPUÉS





Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. - ANTES










IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. - DURANTE



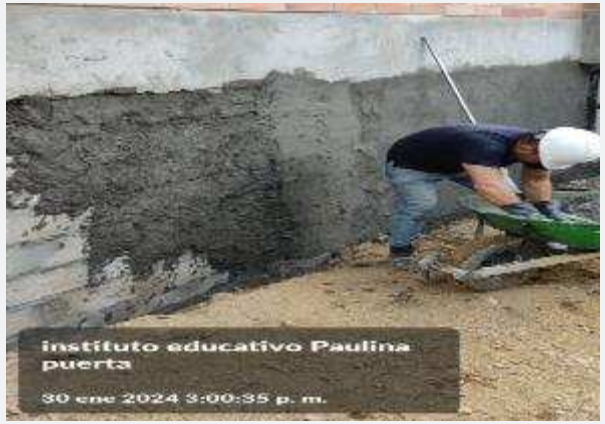





Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. DESPUES

















Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE JESUS MORA, TURBO. - ANTES







IE JESUS MORA, TURBO - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE JESUS MORA, TURBO - DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE JESUS MORA, TURBO - DESPUÉS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ. - ANTES









IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ - DESPUÉS








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ - DESPUÉS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. - ANTES









IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – EN EJECUCIÓN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – EN EJECUCIÓN













Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – DESPUÉS (ENTREGA 14/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones
  Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT
  2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630
  Inversión

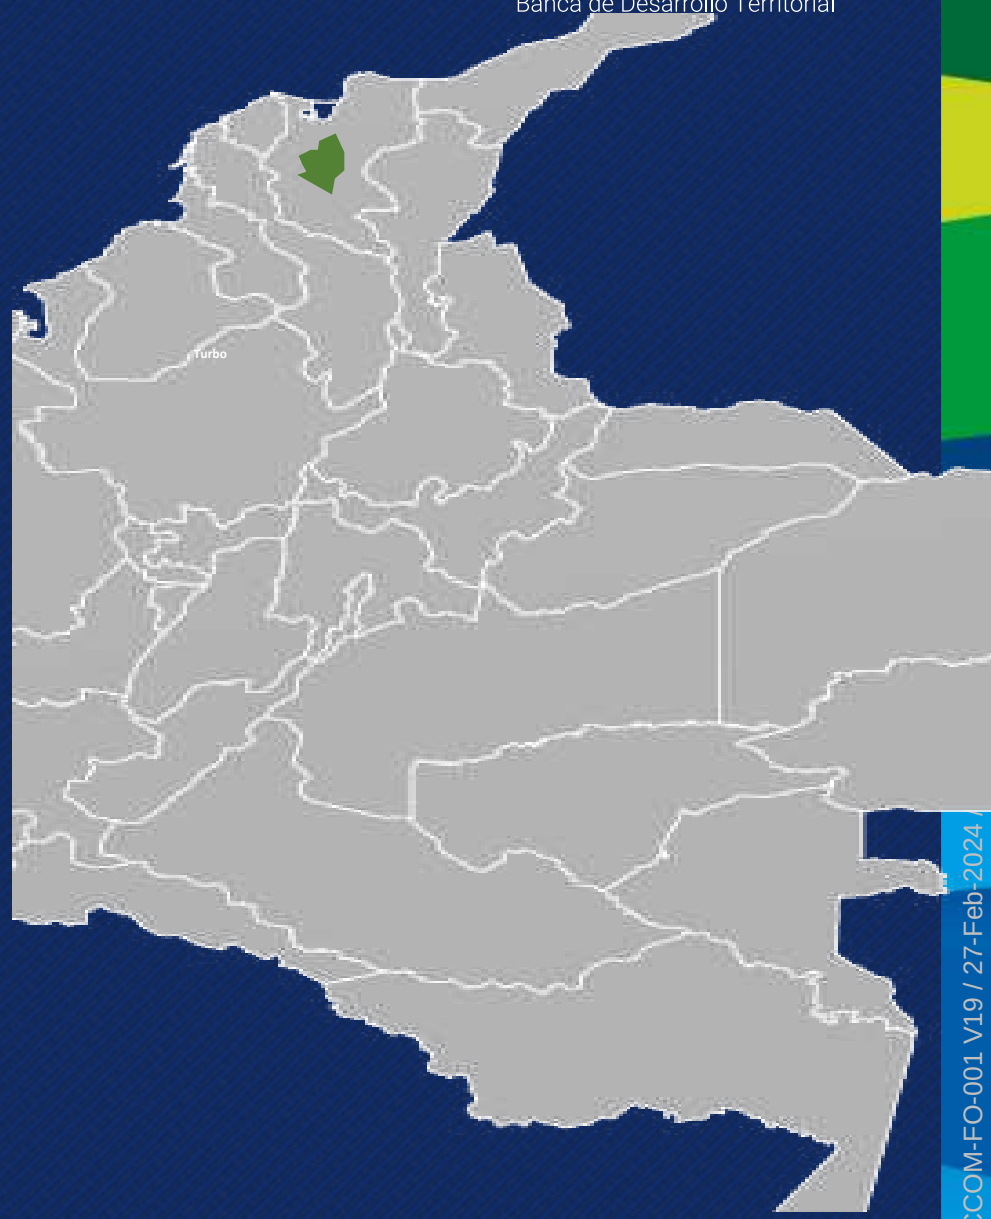

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
	C1	C1	C2	C2			
O: $4.044.124.630 I: $295.715.000	27-nov-23	11-ene-24	19-feb-2024	13-mar-24	Programado	35.35%	-16.39%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	93.46%	Programado	31.25%	Ejecutado	19%	
	Ejecutado	75.52%	Ejecutado	75.52%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ID MEN
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	2	NA	2	92
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3	NA	1	192
	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA	NA	12	EN CASO DE QUE APLIQUE	64
	Palmar de Varela	IE TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	NA	9	EN CASO DE QUE APLIQUE	91
	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL	NA	8	EN CASO DE QUE APLIQUE	83
		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	NA	5	8	84
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	IE JOSEFA DONADO	NA	16	EN CASO DE QUE APLIQUE	18
		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	NA	22	EN CASO DE QUE APLIQUE	144
	Luruaco	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NA	6	EN CASO DE QUE APLIQUE	191

Avance por Sede:

ID 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón: Se realiza socialización del proyecto a la comunidad el día 4 de abril, de acuerdo a la priorización efectuada sobre presupuesto y diagnostico preliminar.se realiza la revisión estudio de suelos ID 92 - IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS/SEDE PITA.- REPELÓN. Se da inicio activiades preliminares de desmontes 1 aula nueva. P:0 E: 5%

ID 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón: Abril 04 - 2.024 Jueves, Se retoma la actividad de elaboración de cerchas haciendo las correcciones de acuerdo a la solicitud de interventoria mediante oficio INT_AM_149. 8 aulas (1 aula de informatica) P:27.98 E: 19.0

ID 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón: Se realiza el englose entre las laminas de cubierta y los muros existentes-Continua hasta terminar la instalación de las correas para soporte de cubierta en el modulo o bloque 1-Inicia la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1-Continua hasta terminar la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1. 5 AULAS DE MEJORAMIENTO P:65.66 E: 73.8%

ID 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL – Soledad-Abril 01 - 2.024 Lunes, Inicia la Instalación de Cerchas para soporte de correas en el modulo de bachillerato-Abril 02 - 2.024 Martes, Continua el montaje de Cerchas para soporte de correas en el modulo de bachillerato-Abril 03 - 2.024 Miércoles, Inicia la Instalación de Correas en perfilería PAG Tipo C para soporte de laminas de cubierta en el modulo de bachillerato. 12 AULAS MEJORAMIENTO P: 44.13% E 37%

ID 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA – Soledad: Se realiza socialización del proyecto a la comunidad el día 4 de abril, de acuerdo a la priorización efectuada sobre presupuesto y diagnostico preliminar. 3 AULAS NUEVAS (Se pueden realizar 2)

ID 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – Soledad: Se realiza reunión de seguimiento del día 2 de abril de 2024, donde se realiza revisión de aspectos preliminares de diagnostico, priorización y presupuesto preliminar del proyecto. Se dejan comentarios finales y requerimiento de cierres del componente I. 22 aulas mejoramiento (No se ha dado incio por solicitud del rector por las prueba saber pro.

ID 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Galapa: 15 aulas mejoramiento P: 11.59 E:2%

ID 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA – Malambo: No se presentan avances por parte del contratista de obra al presente frente de trabajo.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.546.652.379,08	95,50%	-60,22%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.310.170.247,75	35,28%	

ID 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 42.055.385,00	$ 550.948.400,90	100,00%	93,05%	-10,85%	-38,24%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 37.492.375,73	$ 324.532.134,70	89,15%	54,81%		

ID 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 39.426.924,00	$ 532.412.207,56	100,00%	95,91%	-13,30%	-50,52%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 34.183.143,11	$ 251.955.519,75	86,70%	45,39%		

ID 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 21.027.693,00	$ 296.064.924,01	100,00%	100,00%	-11,55%	-68,98%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 18.598.994,46	$ 91.826.762,86	88,45%	31,02%		

ID 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.496.931,00	$ 336.902.394,50	100,00%	81,86%	-10,85%	-31,68%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 12.924.013,99	$ 206.495.918,84	89,15%	50,17%		

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	27/05/2024	COMPONENTE	I - DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS II - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS	PERIODO No.	26	DEL	20/05/2024	AL	26/05/2024

ID 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 13.946.458,00	$ 218.114.610,94	100,00%	98,53%	-100,00%	-80,71%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	$ 39.434.024,96	0,00%	17,81%		

ID 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE - Soledad

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 57.826.155,00	$ 780.871.238,04	100,00%	95,91%	-23,25%	-80,52%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 44.381.573,96	$ 125.262.925,76	76,75%	15,39%		

ID 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 23.528.804,00	$ 366.302.363,04	100,00%	98,08%	-11,45%	-76,39%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 20.834.755,94	$ 81.006.438,03	88,55%	21,69%		

ID 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 18.399.231,00	$ 234.328.659,09	100,00%	90,45%	-59,80%	-85,11%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 7.396.862,00	$ 13.844.803,66	40,20%	5,34%		

COMPONENTES- COMPILADOS

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 230.707.581,00	$ 3.315.944.798,08	94,21%	95,59%	-22,42%	-62,89%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 175.811.719,19	$ 1.134.358.528,57	71,79%	32,70%		

IDMEN 092 IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA La IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA
Institución está ubicada en la zona rural del corregimiento de Cien pesos y Las Tablas, jurisdicción del municipio de Repelón, Atlántico.
El corregimiento de Cien pesos y Las Tablas está ubicado a 39 Kilómetros (50 minutos de viaje) de distancia desde la cabecera municipal de Repelón. La vereda de Pita se encuentra ubicada a aproximadamente a 5 kilómetros (15 min de Cien pesos), en el cual la única vía de acceso es un carreteable transitable solo en los periodos de tiempo seco. En época de lluvias el acceso vehicular hasta la vereda es imposible y el transporte de productos se efectúa a lomo de mula o en moto.





VIDEO →

IDMEN 197 IE MESOLANDIA En la I. E.
Mesolandia se efectuó la socialización el día 24 abril de 2024, durante el desarrollo de la misma la rectora de la institución solicito suspender el inicio de las intervenciones, previstas para el siguiente 25 de abril de 2024, hasta el día lunes 6 de Mayo de 2024 argumentando que requiere de este tiempo prudente pata organizar las reubicación de los alumnos que actualmente está recibiendo clase en esta aulas.
Esta solicitud se dejó referida en las actas de socialización y el las actas de reunión posteriores, las cuales se adjuntan a la presente comunicación. Esta situación representa un retraso en la programación de inicio de actividades para este frente de 15 días calendario, el cual debe reflejarse en el ajuste de la programación, para que la misma se evalúe de acuerdo a las condiciones reales para esta institución.

VIDEO →

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

PERITAJE TÉCNICO PARA RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA IE BLAS TORRES DE LA TORRE
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SOLEDAD – DEPARTAMENTO ATLÁNTICO.

IDMEN	INSTITUCION	FASE I	
		CONT CD FASE I	CONTRACTUAL FASEI INCLUIDO IVA
92	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA	$ 11.719.712,70	$ 13.946.458,00
83	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS/ SEDE PRINCIPAL	$ 17.670.330,30	$ 21.027.693,00
84	IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	$ 12.182.295,00	$ 14.496.931,00
191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	$ 4.903.515,97	$ 5.835.184,00
91	IE TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	$ 7.007.390,76	$ 8.338.795,00
18	IE JOSEFA DONADO/SEDE PRINCIPAL	$ 35.340.659,70	$ 42.055.385,00
192	IE JOSEFA DONADO/SEDE CABICA	$ 19.772.104,20	$ 23.528.804,00
144	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	$ 48.593.407,60	$ 57.826.155,00
64	IE MARIA AUXILIADORA	$ 33.131.868,90	$ 39.426.924,00
197	IE MESOLANDIA - Malambo	$ 15.461.538,70	$ 18.399.231,00
	SUBTOTAL		$ 244.881.560,00
	CONTRACTUAL		$ 263.563.350,00
	SALDO PROVISIONAL COMPONENTE		$ 18.681.790,00
	DISEÑO MURO DE CERRAMIENTO INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS		$ 10.000.000,00
	SALDO COMPONENTE I		$ 8.681.790,00

IDMEN	INSTITUCION	FASE II			
		CONT CD FASE II	CONTRACTUAL FASE II INCLUIDO AIU	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS	SUMINISTROS INCLUIDO IVA
92	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA	$ 129.862.769,86	$ 164.925.718,00	$ 14.812.393,15	$ 17.626.747,85
83	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS/ SEDE PRINCIPAL	$ 198.688.154,56	$ 252.333.956,00		$ -
84	IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	$ 313.511.005,58	$ 398.158.977,00		$ -
191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA				
91	IE TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA				
18	IE JOSEFA DONADO/SEDE PRINCIPAL	$ 461.482.496,57	$ 586.082.771,00		$ -
192	IE JOSEFA DONADO/SEDE CABICA	$ 409.795.924,84	$ 520.440.825,00	$ 29.481.210,38	$ 35.082.640,36
144	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	$ 574.048.413,12	$ 729.041.485,00		$ -
64	IE MARIA AUXILIADORA	$ 431.619.879,88	$ 548.157.247,00		$ -
197	IE MESOLANDIA - Malambo	$ 246.593.012,36	$ 313.173.126,00		$ -
	SUBTOTAL		$ 3.512.314.105,00		$ 52.709.388,20
	CONTRACTUAL		$ 3.710.909.460,00		$ 69.651.820,00
	SALDO PROVISIONAL COMPONENTE		$ 198.595.355,00		16.942.431,80
	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO		$ 90.748.035,48		
	SALDO COMPONENTE I		$ 107.847.319,52		16.942.431,80

VIDEO →

ID 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

Se da inicio actividades preliminares

15 AULA MEJORAMIENTO





ID 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón







Se realiza el englose entre las laminas de cubierta y los muros existentes-Continua hasta terminar la instalación de las correas para soporte de cubierta en el modulo o bloque 1-Inicia la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1-Continua hasta terminar la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1

5 AULAS EN MEJORAMIENTO

VIDEO →

ID 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón

Se realiza socialización del proyecto a la comunidad el día 4 de abril, de acuerdo a la priorización efectuada sobre presupuesto y diagnostico preliminar. se realiza la revisión estudio de suelos ID 92 - IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS/SEDE PITA.- REPELÓN.

Se da inicio con actividades preliminares el 08 abril 2024.

1 AULA NUEVA





VIDEO →

ID 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL - Repelón







El proyecto se encuentra con **cubierta** desmontada, elementos estructurales de cubierta con mantenimiento y complemento efectuado, instalado y en proceder con instalación de cubiertas.

Componente I, se encuentra en trámite de entregas, compromisos para los martes y miércoles 26 y 27 de marzo.

8 AULAS MEJORAMIENTO

ID 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad







Continua el montaje de Cerchas para soporte de correas en el modulo de bachillerato-Abril 03 - 2.024 Miércoles, Inicia la Instalación de Correas en perfilería PAG Tipo C para soporte de laminas de cubierta en el modulo de bachillerato

12 AULAS EN MEJORAMIENTO

ID 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad

- Desmonte de cubierta salón, demolición de pisos, cerramiento provisional en lona verde, trazado y replanteo
- continúan las actividades de Desmonte de cubierta salón, demolición de pisos, cerramiento provisional en lona verde, trazado y replanteo
- continúan las actividades de: trazado, replanteo y excavación de zapatas

3 AULAS NUEVAS



ID 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE - Soledad

- Desmonte de cubierta salón, demolición de pisos, cerramiento provisional en lona verde, trazado y replanteo
- continúan las actividades de Desmonte de cubierta salón, demolición de pisos, cerramiento provisional en lona verde, trazado y replanteo


22 AULAS MEJORAMIENTO



3. REGISTRO DE ACTIVIDADES _ ID 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo

Una vez avalada la inclusión del frente al contrato, se gestiona la solicitud de entrega de registros de visitas y diagnósticos de la edificación.
7 AULAS EN MEJORAMIENTO



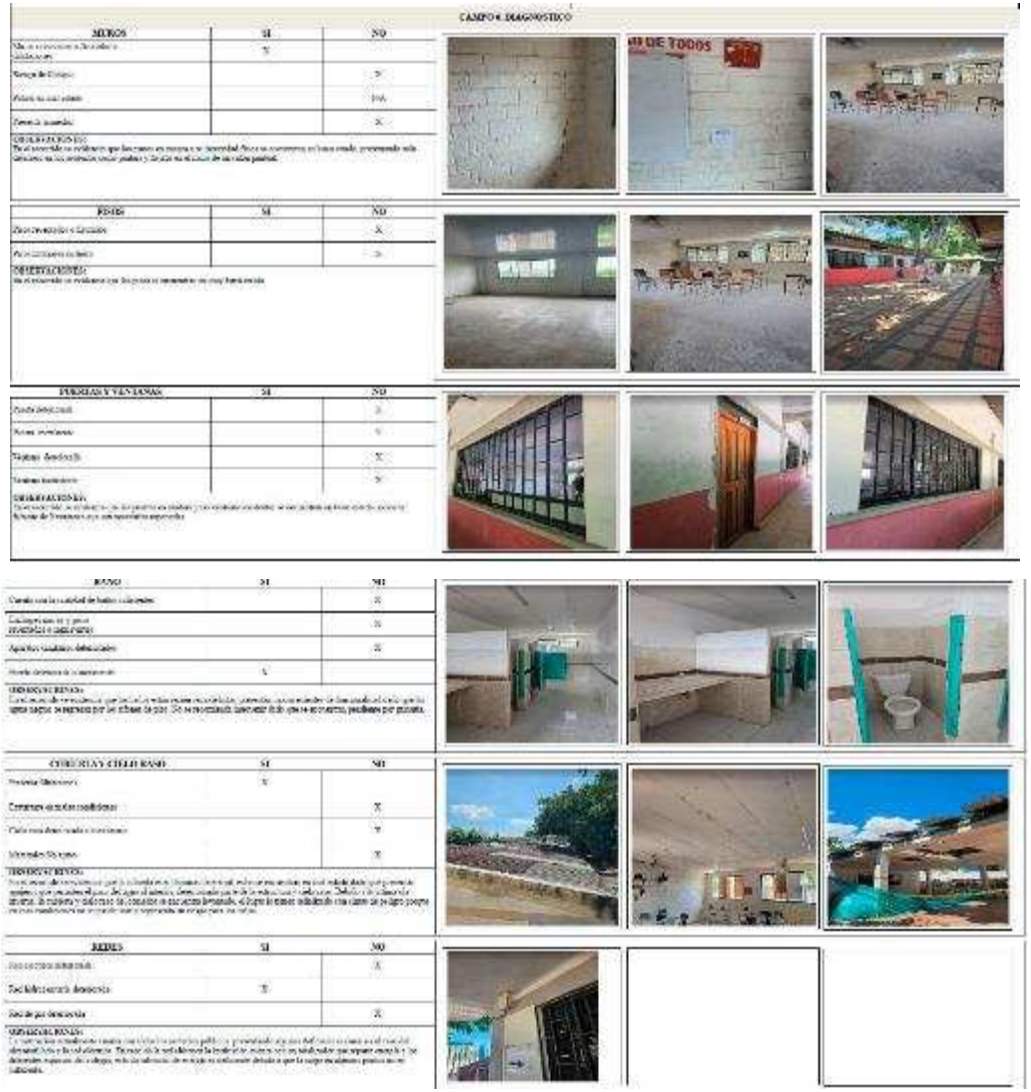


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

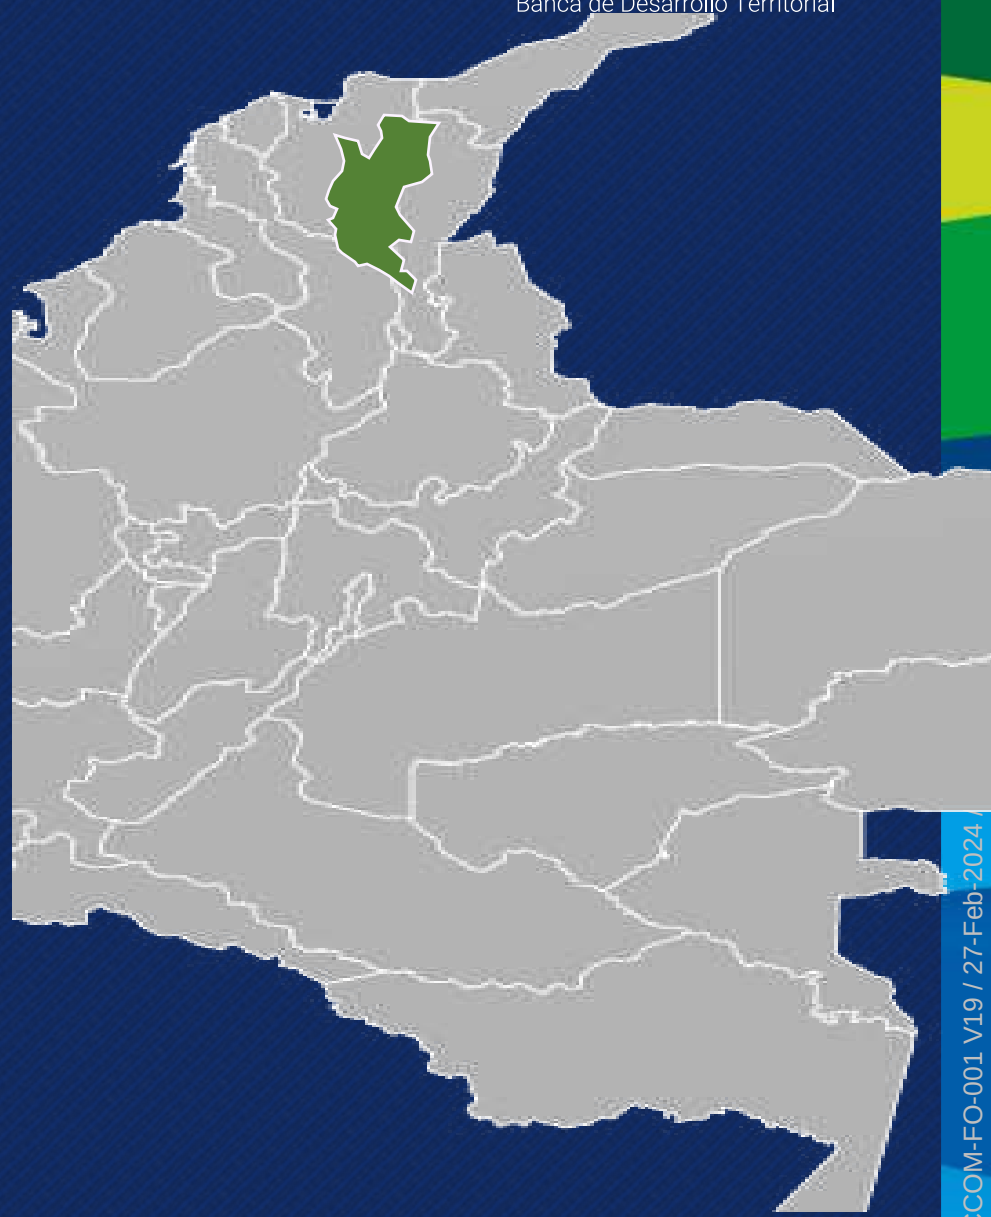

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
5.096.734.565	14-nov-23	28-dic-24	18-dic-23	12-abr-24	**Programado**	100,00%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**Entregadas entre 29 y 30 de abril de 2024**		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 7 al 14 de abril de 2024 (Terminación 12/04/2024).

Avance general Componente I: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede Componente II: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

- **ID112 IE. RIOS VALLE, El Retén (Bachillerato):** Entregado 29/04/2024, terminadas 11 aulas mejoramientos (pintura, pisos baldosa, eléctrica y carpintería metálica) y 9 aulas nuevas en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto, instalada y cableado en ejecución) + baterías sanitarias + circulaciones cubiertas en concreto.
- **ID156 IE. GREGORIO GARZÓN, El Retén (Primaria):** Entregado 29/04/2024, terminadas 7 mejoramientos de aulas (pintura, pisos, eléctrica y carpintería metálica) + baterías sanitarias + circulaciones cubiertas en concreto.
- **ID154 IE. ENOC MENDOZA, Ciénaga** Entregado 29/04/2024, terminadas 24 aulas mejoramientos, en ejecución de primera fase: 12 aulas mejoramientos entregada y en funcionamiento, segunda fase: 12 aulas mejoramientos en limpieza con adecuaciones de cubierta y pañetes de protección) con reforzamiento estructural y pisos, lo anterior a Plan logístico con institución + circulaciones cubiertas en concreto.
- **ID126 IE. EL TRIUNFO, Puebloviejo:** Entregado 30/04/2024, terminadas 4 aulas mejoramientos, ejecutado (sistema de reforzamiento estructural y cubierta UPVC.
- **ID111 IE. CATAQUITA, Puebloviejo:** Entregado 30/04/2024, terminadas 2 aulas mejoramientos, ejecutado (sistema de reforzamiento estructural, en ejecución de (estructura de cubierta 100% instalada, montaje de cubierta UPVC.


ID112. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE BACHILLERATO - SEDE PRINCIPAL


$ 2.346.192.202 INVERSIÓN TOTAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MEJORAMIENTO 11

RETÉN, MAGDALENA

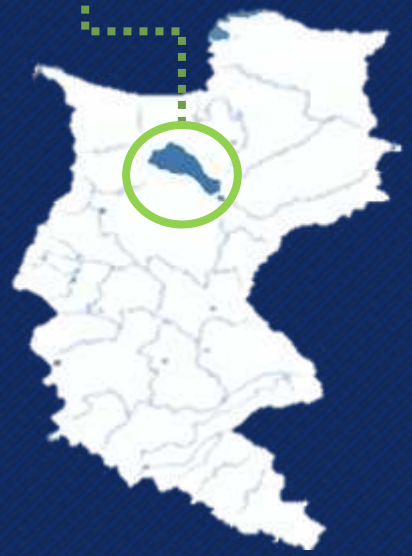

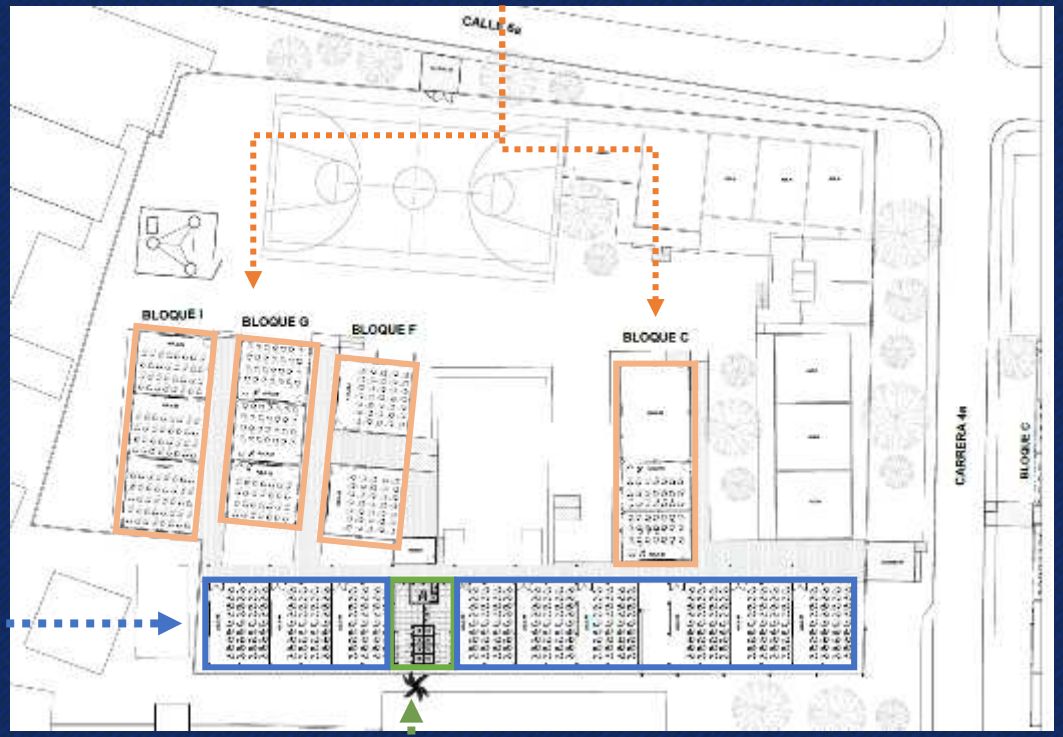

9 AULAS NUEVAS

11 BATERÍAS SANITARIAS

INFORMACIÓN GENERAL	
ID MEN No.	112
DIRECCIÓN	CALLE 7 CARRERA 4 ESQUINA
DEPARTAMENTO	MAGDALENA
MUNICIPIO	RETÉN
ESTADO	ANTIGUO-ACTIVO
CALENDARIO	A
SECTOR	OFICIAL
ZONA EE	URBANA
ALCANCE	
BATERÍAS SANITARIAS	**11 NUEVAS**
AULAS NUEVAS	**9 AULAS**
MEJORAS DE AULAS	**11 AULAS**
POBLACIÓN BENFICIADA	**731 NIÑOS**

MEJORAMIENTO DE AULAS

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

MEJORAMIENTO DE AULAS

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

AULAS MEJORADAS ENTREGADAS 29/04/2024













TOTAL

11

AULAS



PRIMARIA

POBLACIÓN BENEFICIADA

AULAS Y BATERÍAS NUEVAS ENTREGADAS 29/04/2024













TOTAL

9 AULAS

11 Baterías

SECUNDARIA
POBLACIÓN BENEFICIADA

51 m2
ÁREA POR AULA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

ID156. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE PRIMARIA - GREGORIO GARZÓN

$ 527.020.099 INVERSIÓN TOTAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





AULAS
MEJORAMIENTO 7

15 BATERÍAS
SANITARIAS

INFORMACIÓN GENERAL	
ID MEN No.	156
DIRECCIÓN	CALLE 7 CARRERA 4 ESQUINA
DEPARTAMENTO	MAGDALENA
MUNICIPIO	RETÉN
ESTADO	ANTIGUO-ACTIVO
CALENDARIO	A
SECTOR	OFICIAL
ZONA EE	URBANA
ALCANCE	
BATERÍAS SANITARIAS	**15 NUEVAS**
MEJORAS DE AULAS	**7 AULAS**
POBLACIÓN BENFICIADA	**515 NIÑOS**

MEJORAMIENTO DE AULAS

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

MEJORAMIENTO DE AULAS

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

AULAS Y BATERÍAS ENTREGADAS 29/04/2024













TOTAL

7

AULAS

15

Baterías

PRIMARIA

POBLACIÓN BENEFICIADA

ID154. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO - SEDE ENOC MENDOZA RIAZCO

$ 1.649.361.282 INVERSIÓN TOTAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CIÉNAGA, MAGDALENA





AULAS MEJORAMIENTO 24

FASE 1

FASE 2

INFORMACIÓN GENERAL	
ID MEN No.	154
DIRECCIÓN	CALLE 18 C # 34 A 85
DEPARTAMENTO	MAGDALENA
MUNICIPIO	CIÉNAGA
ESTADO	ANTIGUO-ACTIVO
CALENDARIO	A
SECTOR	OFICIAL
ZONA EE	URBANA
ALCANCE	
MEJORAS DE AULAS	**24 AULAS**
POBLACIÓN BENFICIADA	**870 NIÑOS**

MEJORAMIENTO DE AULAS FASE 1

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

MEJORAMIENTO DE AULAS FASE 2

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

AULAS MEJORADAS ENTREGADAS 29/04/2024















TOTAL

24

AULAS



PRIMARIA Y BACHILLERATO

POBLACIÓN BENEFICIADA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

ID126. INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM EL TRIUNFO

AULAS MEJORADAS ENTREGADAS 30/04/2024













TOTAL

4

AULAS

PRIMARIA

POBLACIÓN BENEFICIADA

ID111. INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM ISLA DE CATAQUITA

AULAS MEJORADAS ENTREGADAS 30/04/2024













TOTAL

2

AULAS

PRIMARIA

POBLACIÓN BENEFICIADA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

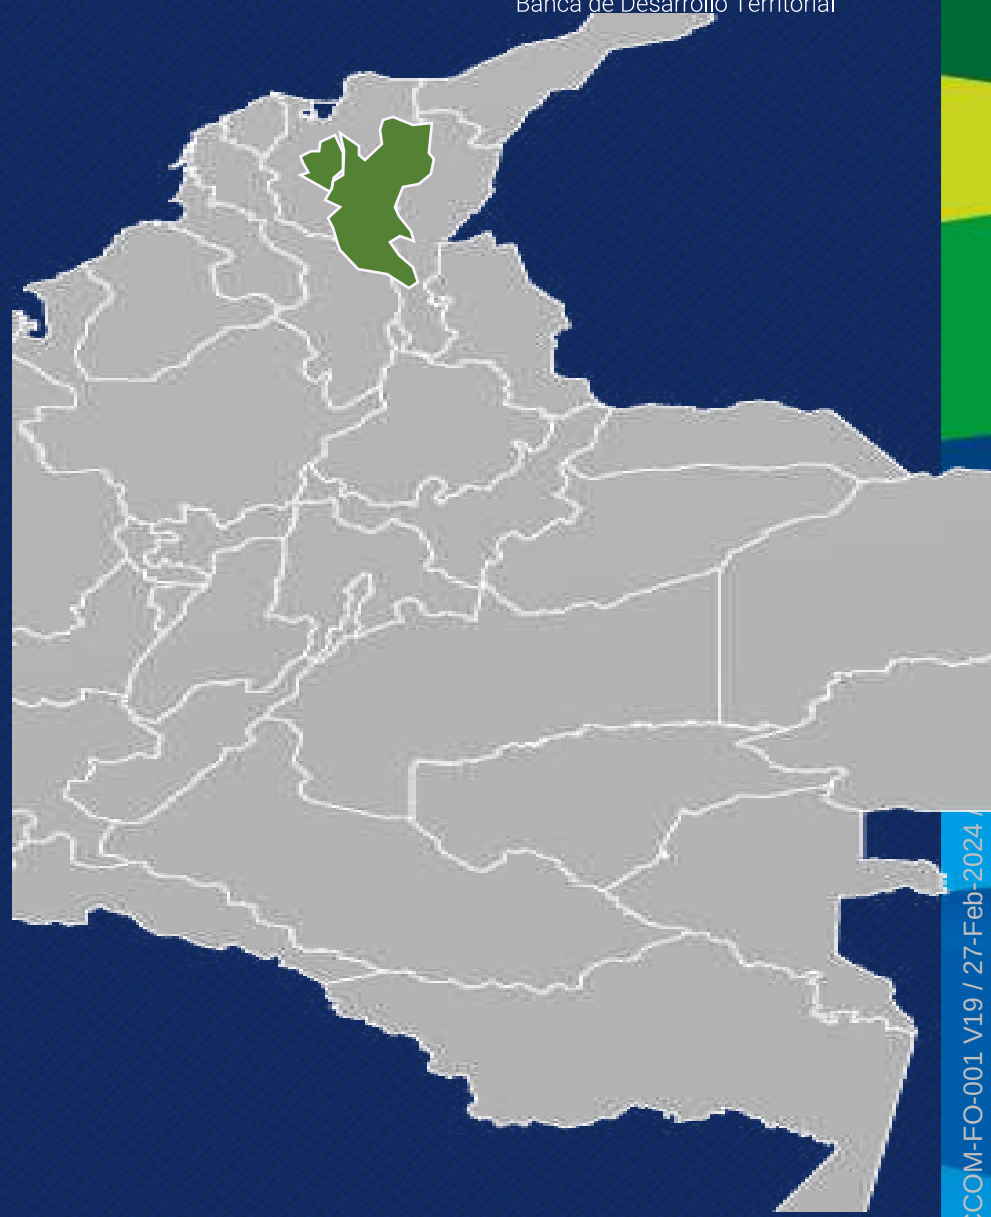

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO Proyectada C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4.744.960.153	24/10/2023	08-12-2023	08-12-2023	07-02-2024	**Programado**	100%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

Se tramito Prorroga por el termino de 45 dias, con nueva fecha de terminacion: 23 de marzo 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO

- ENTREGADO 22 DE DICIEMBRE 2023- 6 AULAS MEJORAMIENTO – 4 BATERIAS = 100%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME SEDE PRINCIPA

- PROGRAMADO 61,70% VS EJECUTADO 61.70% EN EJECUCION 6 AULAS NUEVAS – MEJORAMIENTO DE 16 BATERIAS SANITARIAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA SEDE ERM MARIA AUXILIADORA

- PROGRAMADO 52,19% VS 52,19% EN EJECUCION: 4 AULAS NUEVAS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA SEDE ERM LA PACHA

- **PROGRAMADO 60% VS EJECUTADO 60% EN EJECUCION 3 AULAS NUEVAS – 4 AULAS MEJORAMIENTO= 100% Y 8 BATERIAS SANITARIAS MEJORAMIENTO = 95%**

SAN LUIS

- **PROGRAMADO 1,52% VS EJECUTADO 100% : 1 MEJORAMIENTO**

TACAMOCHO: REUBICACION

- SIN INTERVENCION

JAIMES: Lámina de agua por encima 1,90 m-2 aulas mejoramiento

- Sin respuesta del municipio

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA SEDE ERM LA PACHA

4 MEJORAMIENTOS 3 AULAS NUEVAS 8 MEJORAMIENTOS

INSTITUCIÓN	FECHA COMIENZO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	TIEMPO PRÓRROGA	FECHA TERMINACIÓN FINAL
TIERRAFIRME	22/12/2023	8/02/2024	45 días	23/03/2024
TACAMOCHITO	5/12/2023	8/02/2024	0 días	21/12/2023
LA PACHA	28/11/2023	8/02/2024	45 días	23/03/2024
SAN LUIS	26/01/2024	8/02/2024	0	7/02/2024
MARIA AUXILIADORA	3/01/2024	8/02/2024	45 días	23/03/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

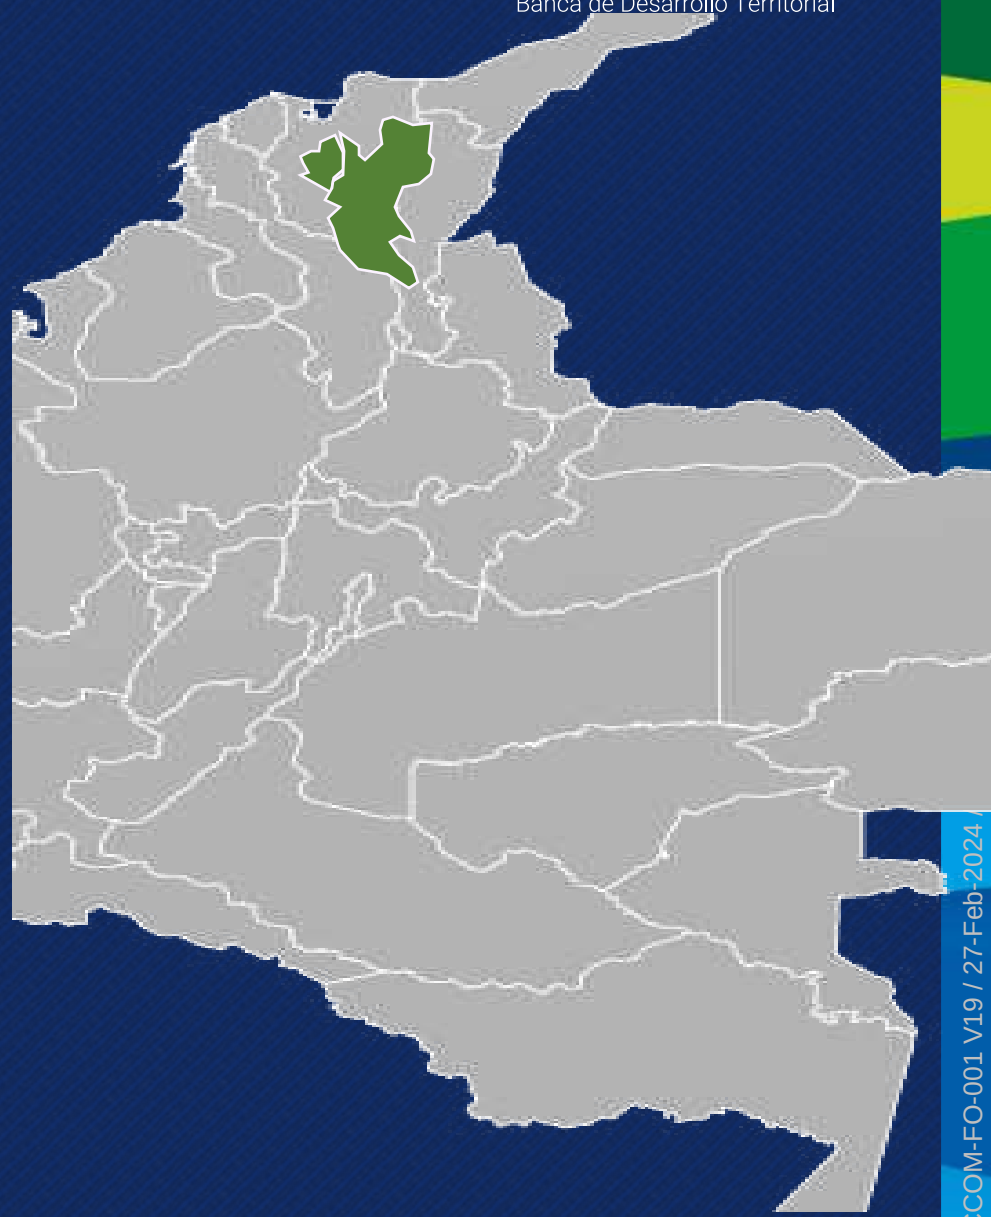

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4,102,044,984	14-Nov-23	29-Dic-23	16-Nov-23	29-Febrero-24	Programado	22.96%	-8.16%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	4,00%	Ejecutado	14.80%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	4,00%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

ESPACIOS A INTERVENIR

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INTERVENCIÓN	DEPTO	MUNICIPIO	ID MEN	DANE	INSTITUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO (-) / AVANCE (+)
Mejoramiento	Cesar	Curumaní	30	220228001627	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Principal	100.00%	98.00%	-2.00%
Mejoramiento	Cesar	Curumaní	97	220228000604	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Chinela	37.11%	40.00%	2.89%
Mejoramiento	Cesar	Curumaní	98	220228000159	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Guaimaral	68.07%	47.00%	-21.07%
Mejoramiento	Cesar	Curumaní	101	220228017396	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Los Serenos	100.00%	95.00%	-5.00%
Mejoramiento	Cesar	Chimichagua	147	220175001751	Centro Educativo El Pueblito - Sede Puerto La Estancia	6.64%	60.00%	53.36%
Mejoramiento	Cesar	Chimichagua	148	220175001298	Centro Educativo El Pueblito - Sede Torrecilla	100.00%	60.00%	-40.00%
Mejoramiento	Cesar	Chimichagua	146	220175001280	Centro Educativo El Pueblito - Sede Tronconal	60.15%	35.00%	-25.15%
Mejoramiento	Magdalena	Concordia	13	247541000106	I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Primaria	31.70%	29.00%	-2.70%
Mejoramiento	Magdalena	Concordia	14	247205000033	I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Jardin Infantil	0.00%	0.00%	0.00%
Mejoramiento	Bolívar	Barranco de Loba	6	213074001029	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal	76.79%	60.00%	-16.79%
Mejoramiento	Bolívar	Barranco de Loba	10	213074000065	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede El Cerrito	67.00%	35.00%	-32.00%
Aulas	Bolívar	Barranco de Loba	9	213074000235	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede La Atascosa	43.81%	50.00%	6.19%
Aulas	Bolívar	San Martín de Loba	43	213667001262	I. E. Tec. Pesquera Leonidas Ortiz Alvear de Chimi - Sede Plan Bonito	26.49%	52.00%	25.51%
Mejoramiento	Magdalena	El Banco	32	247245001130	I. E. Departamental Rural Silvia Cotes De Biswell - Sede La Islita	100.00%	100.00%	0.00%
Mejoramiento	Magdalena	El Banco	133	247245001415	I. E. Departamental Oscar Pisciotti Numa - Sede Inmaculada Concepción	100.00%	100.00%	0.00%
Mejoramiento	Magdalena	El Banco	24	247245001997	I. E. Departamental Antonio Nariño - Sede José Vanegas Ortiz	32.46%	38.00%	5.54%

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 2.546.248.994,44	62.07%	-3.81%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 2.390.067.220,85	58.27%	

AVANCE GENERAL CONTRATO		DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
PROGRAMADO	73,89%	-45,57%
EJECUTADO	28,32%	

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AVANCE ESPECIFICO SEDES CORTE 7/04/2024			
ID MEN	INSTITUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO
30	I. E. Cristian Moreno Pallares Sede Principal	85,00%	70,00%
97	I. E. Cristian Moreno Pallares Sede Chinela	47,00%	30,00%
98	I. E. Cristian Moreno Pallares Sede Guaimaral	88,00%	40,00%
101	I. E. Cristian Moreno Pallares Sede Los Serenos	99,00%	60,00%
147	Centro Educativo El Pueblito Sede Puerto La Estancia	61,00%	20,00%
148	Centro Educativo El Pueblito Sede Torrecilla	48,00%	30,00%
146	Centro Educativo El Pueblito Sede Tronconal	46,00%	0,00%
13	I. E. Santa Cruz del Balsamo Sede Primaria	49,00%	0,00%
14	I. E. Santa Cruz del Balsamo Sede Jardin Infantil	30,00%	5,00%
6	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar Sede Principal	77,00%	17,00%
10	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar Sede Los cerritos	78,00%	15,00%
9	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar Sede La Atascosa	89,00%	15,00%
43	I. E. Tec. Pesquera Leonidas Ortiz Alvear de Chimi Sede Plan Bonito	99,00%	17,00%
32	I. E. Departamental Rural Silvia Cotes De Biswell Sede La Islita	91,00%	37,00%
133	I. E. Departamental Oscar Pisciotti Numa Sede Inmaculada Concepción	92,00%	33,00%
24	I. E. Departamental Antonio Nariño Sede José Vanegas Ortiz	82,00%	26,00%

1. I. E. Departamental Rural Silvia Cotes De Biswell Sede la Islita
2. I. E. Departamental Oscar Pisciotti Numa Sede Inmaculada Concepción
3. I. E. Cristian Moreno Pallares Sede Principal
4. I. E. Cristian Moreno Pallares Sede Los Serenos

• **IE Cristian Moreno Pallares - Sede Principal:** Se presenta un porcentaje programado de 85%, y un porcentaje ejecutado de 70%, para un desfase de -15%. Las actividades ejecutadas durante la semana son:- Raspado de pintura existente en muros interiores en Bloque E, aula 8

- Restauración de pañete existente sobre muro- Instalación y anclaje de malla vena, con mortero liso común 1:3 en el bloque E, aula 8

• **IE Cristian Moreno Pallares - Sede Chinela:** Para esta semana no se ejecutaron actividades en esta sede. Desde el 30 de enero de 2024 no se ha presentado ejecución de actividades; según lo que informa el contratista de obra, la inactivad en esta sede se ha visto por la logística de entrega de la estructura de cubierta y las teja para la misma. Al igual que, la definición y aprobación del tipo de intervención de mejoramiento a Aula Nueva. Presenta un porcentaje programado de 47%, y un porcentaje ejecutado de 30%

• **IE Cristian Moreno Pallares - Sede Guaimaral:** Para esta semana no se ejecutaron actividades en esta sede. Desde el 14 de marzo de 2024 no se ha presentado ejecución de actividades. A la fecha no se cuenta con diseño de cubierta para esta sede. Presenta un porcentaje programado de 88%, y un porcentaje ejecutado de 50%, para un atraso de -38%.

• **IE Cristian Moreno Pallares - Sede Los Serrenos:** Se presenta un porcentaje programado de 99%, y un porcentaje ejecutado de 60%, para un desfase de -39%. Las actividades ejecutadas durante la semana son:

- Instalación de la Cubierta en teja termo acústica en fibra de carbono UPVC

• **IE El Pueblito - Sede Puerto La Estancia:** Para la presente semana no se ejecutaron actividades. Se presenta un porcentaje programado de 61%, y un porcentaje ejecutado de 25%, para un desfase de -37%

• **IE El Pueblito - Sede Torrecilla:** Se presenta un porcentaje programado de 48%, y un porcentaje ejecutado de 30%, para un desfase de -18%. Las actividades ejecutadas durante la semana son:
- Inician las actividades de raspado de pintura existente en muros, realizado con grata pulidora y grata copa, en las paredes externas de la bodega salón 1 y salón 2.

• **IE Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal:** Para la presente semana se llevó acabo fundida de viga de cimentación en concreto 3000 psi; se realizó figurado, fijación de acero para viga de cimentación en el bloque A y C, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 y aula 6; relleno manual con material seleccionado de sitio. Presenta un porcentaje programado de 77%, y un porcentaje ejecutado de 17%, para un atraso de -60%

• **IE Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Los Cerritos:** Para la presente semana no se ejecutaron actividades de obra. El contratista manifiesta que se encuentra realizando suministro de material a la zona pero ha sido difícil el acceso porque el rio se encuentra seco.

• **IE Luis Guillermo Vides Escobar- Sede Atazcosa:** Para la presente semana no se ejecutaron actividades de obra. El contratista manifiesta que se encuentra realizando suministro de material a la zona.

• **IE Leónidas Ortiz Alvear de Chimi - Sede Plan Bonito:** Para la presente semana se ejecutaron actividades como fundida de concreto ciclópeo y de zapatas. El contratista de obra manifiesta que se encuentra en acarreo de materiales a la obra, y las vías se encuentran en mal estado, lo que dificulta el acceso. Presenta un porcentaje programado de 99%, y un porcentaje ejecutado de 17%, para un atraso de -82%

• **IED Antonio Nariño - Sede José De La Paz Vanegas Ortiz:** El 20 de marzo de 2024, se suspendieron actividades por solicitud de la comunidad, ya que requieren una nueva socialización del proyecto que se les está ejecutando, esto debido a que están inconforme con el alcance del proyecto.

• **IED Oscar Pisciotti Numa - Sede Inmaculada Concepción:** No se ejecutaron actividades, el contratista de obra manifiesta que se encuentra en acarreo de materiales a la obra, y resalta que las vías se encuentran en mal estado y esto dificulta el acceso.

• **IED Rural Silvia Cotes De Biswell - Sede La islita:** Se ejecutaron actividades como fundida de viga corona para cubiertas. el contratista de obra manifiesta que se encuentra en acarreo de materiales a la obra, y resalta que las vías se encuentran en mal estado y esto dificulta el acceso. Presenta un porcentaje programado de 91%, y un porcentaje ejecutado de 37%, para un atraso de -54%

Avance de obra corte 17 de marzo de 2024

El atraso e inicio de actividades en algunas sedes se ha visto afecto por el difícil acceso a ellas. En unos casos se ha visto afectaciones por problemas de orden publico lo que ha llevado que las obras no se ejecuten con continuidad. Adicional a esto, para acceder a algunas sedes el medio de transporte es fluvial pero debido a la fuerte sequía que aqueja el sector, dificultan el acceso del personal del contratista y el acceso de equipos o materiales, tal cual como se puede evidenciar en las siguientes imágenes en las que el constructor a optado por varios medios de llevar materiales para cumplir con lo establecido en el contrato.







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.496.849.571,44 I: $200.301.842,00	15-nov-23	30-dic-23	30-nov-23	29-abr-2024	**Programado**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**En entregas de sedes educativas.**		

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	9	1	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

El contratista finalizó las entregas programadas de cada sede educativa.

Las entregas se realizaron en las siguientes fechas:

- ID No. 79 – 02/05/2024
- ID No. 45 – 04/05/2024
- ID No. 75 – 15/04/2024
- ID No. 74 – 10/05/2024
- ID No. 77 – 15/05/2024
- ID No. 4 – 16/05/2024
- ID No. 48 – 17/05/2024

Se realiza reunión el 24/05/2024 para verificación de documentación de:

- Información documental pendiente por entrega por parte del contratista y radicación en findeter
- Actas contractuales
- Pólizas
- Otrosíes
- Informe final

Esto con el fin de consolidar la información faltante e iniciar proceso de liquidación.

En la misma se verificaron los pendientes y se generaron compromisos de entregas de documentación para el cierre contractual.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		105 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	3	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Instalación de canales tipo amazonas. • Instalación de bajantes. • Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3. • Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1. • Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3. • Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3. • Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		15/04/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		65 estudiantes
ALCANCE		
Aulas nuevas	1	Aula prefabricada - Material WPC
Aulas mejoradas	1	* Cambio de cubierta * Cambio de red eléctrica
Baterías sanitarias	Mejoramiento	* Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes * Mantenimiento de carpintería metálica * Cambio de cubierta y red eléctrica * Suministro de tanque de agua potable 2000 L * Construcción de poza séptica con campos de infiltración.
FECHA DE ENTREGA		02/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

MUNICIPIO		La Paz (Robles)
POBLACIÓN BENEFICIADA		65 estudiantes
ALCANCE		
Aulas nuevas	1	• Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada. • Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		04/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		225 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	9	✓ 7 AULAS: • Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Instalación de canales tipo amazonas. • Instalación de bajantes. • Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6 • Reparación de muros con desprendimiento de pañetes. • Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6 • Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6. • Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6 ✓ 2 AULAS • Cambio de cubierta • Subida de nivel • Cambio de red eléctrica • Mejoramiento en muros y en carpintería metálica ✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE
Baterías sanitarias	SI	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas
FECHA DE ENTREGA		10/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		8 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	1	• Mantenimiento y limpieza de cubierta • Cambio de puerta de acceso principal • Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura.
Baterías sanitarias	SI	• Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada. • Instalación de sistema séptico. • Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable.
FECHA DE ENTREGA		15/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

MUNICIPIO		Valledupar
POBLACIÓN BENEFICIADA		385 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	11	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1. • Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5. • Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2. • Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 . En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2. • Desmonte de cielo raso. • Instalación de cielo raso en lamina PVC.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		16/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ

MUNICIPIO		Valledupar
POBLACIÓN BENEFICIADA		805 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	23	* Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas. * Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. * Instalación de canales tipo amazonas. * Instalación de bajantes. * Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		17/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

13
Proyectos

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT
  2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.158.777.879 I: $295.239.000	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/09/2024	Progr	0%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	0,00%	Programado	0,00%	Ejecut	0%	
	Ejecutado	0,00%	Ejecutado	0,00%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	KASICHE	1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN KASPOLIMANA	1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA	ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	1	3	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA CAMPANA	0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	WAYUUMAANA	0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA ESTRELLA	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN PRINCIPAL	1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	COOPERATIVO	0	6	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	JOSÉ ANTONIO GALÁN	0	2	12
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	APUNIMAANA1	0	6	1
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	WAKUAPAMANA	0	3	6

Avance General: En la semana del 31 mayo al 02 de junio de 2024.
Avance general Componente I: 0%
Avance general por Sede Componente II:

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche:
ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana:
ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana:
ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana:
ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial:
ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana:
ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana:
ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella:
ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal:
ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo:
ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán:
ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1:
ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana:

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

9
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$6.161.470.280 **I:** $441.204.280	08/11/2023	23/12/2023	24/12/2023	08/07/2024	**Progr**	89,85%	-1,70%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	97,39%	**Ejecut**	88,15%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	89,17%			

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	Buenos Aires	0	6	6
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0

Avance General: Se realiza entrega técnica de 5 sedes ubicadas en los municipios de Cotorra, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano, María la Baja (Sede Buenos Aires).

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Ejecutada al 100%. Se proyecta su entrega el 06 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 14 de junio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 14 de junio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: En ejecución del componente 1 y componente 2. Se proyecta su entrega 08 de Agosto de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Buenos Aires - María La Baja






Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







Sede Los Aguacates - Cotorra







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Los Cerros - Planeta Rica





Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Níspero-María La Baja













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3297estudiantes.
- $ 6.342.475.368 Inversión

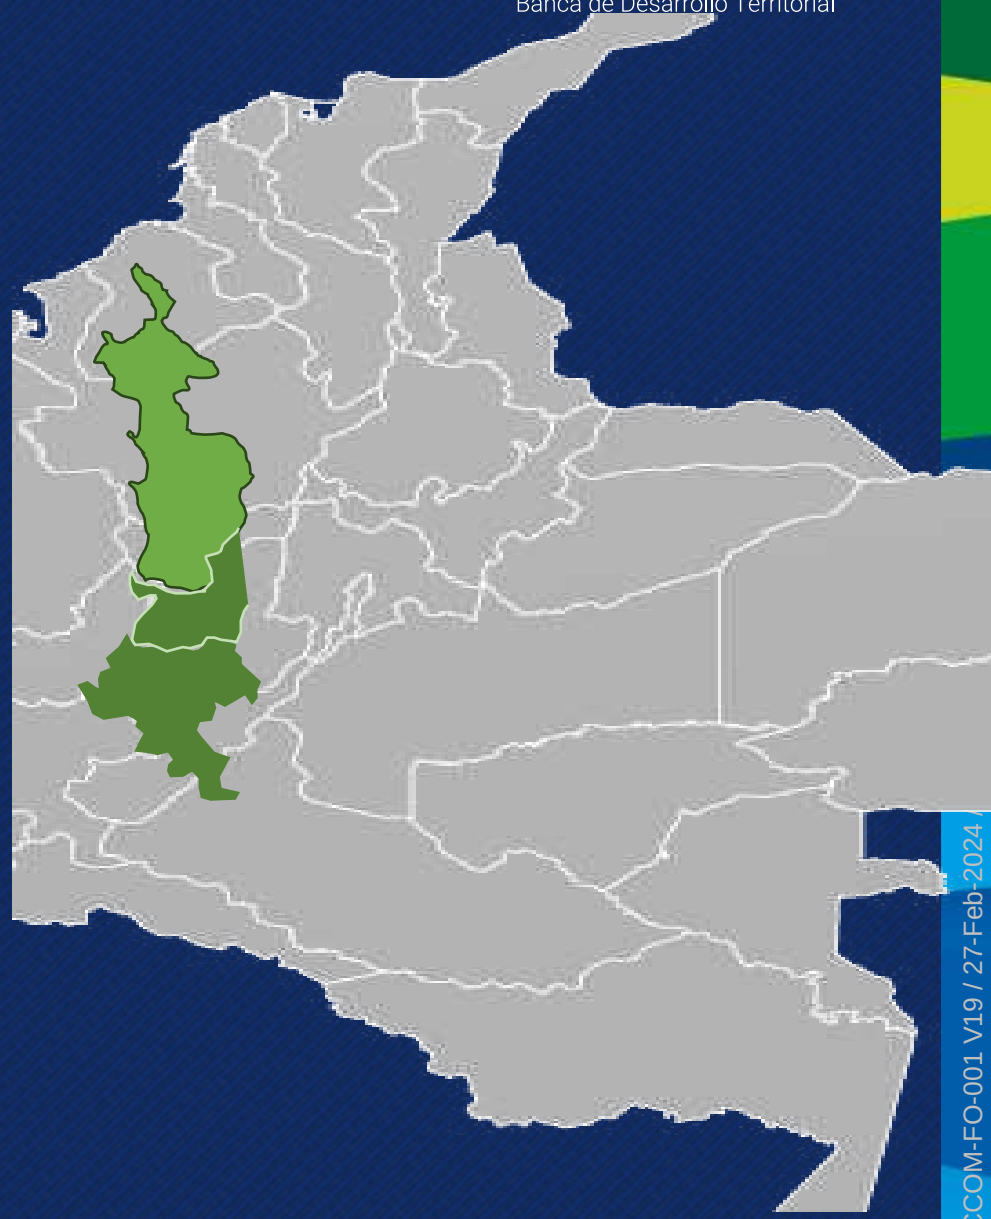

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	30/9/2024
CAUCA	TORIBIO	IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/6/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	3/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	30/6/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/6/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	3/6/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/6/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	30/6/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

73,56%
Porcentaje Programado

25,32%
Porcentaje de avance

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 12 al día 12 de mayo de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 40.19% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 15.76%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 24.43% de atraso frente a lo programado.
Se solicita a la interventoria y contratista de obra iniciar con la implementación del plan de contingencia con el ánimo de mitigar el atraso presente a la fecha e iniciar la etapa de obra en las sedes pendientes.

NOTAS:

1. Actualmente se tramito inicio del proceso de incumplimiento y aplicación cláusula de apremio con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales para cada proyecto.
2. Actualmente se evalúa el balance financiero y tiempos necesarios adicionar a los proyectos con el fin de dar cumplimiento a los diagnósticos aprobados teniendo en cuenta que a la fecha se tienen sedes en proceso de inicio debido a las diferentes variables presentadas a la fecha, por lo cual **se tramitara solicitud de aprobación de recursos por valor cercano a los $500.000.000 millones de pesos teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas y obras complementarias de contención requeridas para garantizar la estabilidad de las aulas en las sedes de Suarez Cauca**, así mismo, se evalúan los tiempos necesarios a tramitar en la **prórroga al contrato de obra e interventoria por un periodo que oscila entre los 4 a 5 meses teniendo en cuenta que se tienen sedes que no han sido iniciadas y el mismo acondicionamiento dado por los rectores para la ejecución de actividades, mayores tiempos que serán con atribución compartida a los proyectos y contratista de obra** debido a las demoras evidenciadas en las sedes que actualmente ya se encuentran en ejecución del componente 2. Cabe resaltar que dentro la evaluación adelantada para la prórroga a tramitar **los costos de los mayores tiempos de interventoria están cercanos a los $130.000.000 millones de pesos valor que está en proceso de revision**. Por lo anterior en la próxima semana se presentará la solicitud de modificatorios contratos de obra e interventoría en alcance a lo socializado en el presente comité de seguimiento.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra en proceso de terminación de los productos técnicos y entregas parciales a la interventoría que se encuentra en revisión y aprobación.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. **IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE PRINCIPAL – En proceso de inicio actividades de mantenimiento parcialmente por bloques en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora, se programa inicio actividades semana del 14 al 17 de mayo.**
2. **IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA. Se continua con actividades de mejoramientos sobre muros, cubiertas, pisos y excavaciones y figurado de aceros para cimentación aulas nuevas.**
3. **IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – se programarán actividades una vez se terminen las obras de mejoramiento sobre la sede principal y de esta forma reubicar los niños para intervenir obra, en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora.**
4. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA HONDA – Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta desmonte de cubierta asbesto y fibrocemento, reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete.**
5. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA PLANTA - Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta desmonte de cubierta asbesto y fibrocemento, reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete, demolición pañetes.**
6. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE SAN CRISTOBAL COLON – Se proyecta retomar la ejecución de actividades en la semana del 14 al 17 de mayo de 2024.**
7. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JHON F. KENNEDY - Desmonte de teja, desmonte de aparatos sanitarios, reparación de pañetes y pintura muros, mantenimiento estructura de cubierta, instalacion cubierta y caballete, mantenimiento de puertas metálicas.**
8. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO – Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.**
9. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE PRINCIPAL - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, cielos rasos, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, suministro de cubierta y mejoras eléctricas.**
10. **IE LA PLAYA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL – Se realiza socialización de inicio actividades el 7 de mayo y se proyecta iniciar actividades en la semana del 14 al 17 de mayo, con las gestiones adelantadas para autorización ingreso a la zona.**
11. **IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE DE SAN JOSE (HUACA) – Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 14 al 17 de mayo.**
12. **IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SIRENA DEL MAR - Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 14 al 17 de mayo.**
13. **IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SECUNDINO RIVAS - Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 14 al 17 de mayo.**
14. **IE DOMINGUILLO – SEDE PRINCIPAL - Se continúan actividades de explanación predio por parte de la alcaldía, pendiente de entrega predio para iniciar actividades, proceso que se proyecta iniciar en la semana del 14 al 17 de mayo.**
15. **IE DOMINGUILLO – SEDE DOMINGO LASSO - Se continua con el desmonte de cubiertas, mejoramiento de estructura metálica y suministró de estructura a reparar, cambio de cubierta, instalación sanitarios, entre otros.**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA. - ANTES






IE MARIA INMACULADA, SUÁREZ- DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (EJECUCIÓN – FECHA INICIO 12/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (EJECUCIÓN – FECHA INICIO 12/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (EJECUCIÓN – FECHA INICIO 12/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGO LASSO. - ANTES






IE DOMINGO LASSO, SANTADER DE QUILICHAO- DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGO LASSO- DURANTE (FECHA DE INICIO 09/04/2024)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. - ANTES









IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – DURANTE (FECHA DE INICIO 16/05/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – DURANTE
(FECHA DE INICIO 16/05/2024)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA-TORIBIO. - ANTES









IE LA PLAYA TORIBIO. – DURANTE (FECHA DE INICIO 27/05/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY - ANTES









IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL- ANTES





IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL- DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024)












CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA- ANTES





IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA- DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- ANTES







IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA- ANTES






IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.040.948.970 Inversión



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.728.021.810 **I:** $ 312.927.160	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/07/2024	**Progr**	26,52%	0,17%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	22,04%	**Ejecut**	26,69%	
	Ejecutado	98,55%	**Ejecutado**	22,31%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 N
El Tambo	I.E. Huisito	Huisito (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	12	8 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	15	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	19	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	2	2 M
		El Altillo	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	1	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

Interventoría solicitó subsanación de algunos ítems del componente 1 de las sedes pendientes por iniciar. Se avanza en revisión y subsanación para autorizar el inicio de ejecución de estas sedes. En revisión de interventoría.

COMPONENTE 2

Actualmente se adelanta ejecución de mejoramientos en 12 Instituciones:

- ✓ Sedes Santa Teresita, La Despensa, El Altillo, Las Yerbas, El Retiro y Bellavista. (Municipio de Rosas)
- ✓ IE Santa Rita Sede Principal (Municipio de la Vega)
- ✓ IE Nuestra Señora de los Remedios (Municipio de Bolívar)
- ✓ IE Nuestra Señora del Carmen (Municipio de Bolívar)
- ✓ Sedes Capitanes y Olaya (Municipio de Balboa)
- ✓ IE Comuneros Sede Principal (Municipio de Popayán)

A la fecha la interventoría ha reportado el inicio de mejoramientos en 12 sedes educativas (ID 44, ID 65, ID 183, ID 186, ID 182, ID 184, ID 187, ID 175, ID 46, ID 3, ID 165, ID 59). En comités de seguimiento se solicitó iniciar intervención cuanto antes con las sedes pendientes, y de esta forma dar cumplimiento al alcance contractual en el plazo establecido.

Contratista remitió solicitud de prórroga por 2 meses con el fin de terminar el alcance del contrato, interventoría revisó a avaló la solicitud; esta solicitud fue aprobada e instruida en comité fiduciario 31. No obstante lo anterior continúan presentándose condiciones particulares de orden público en el departamento del Cauca, al igual que afectaciones en vías a causa del invierno.

Interventoría remitió informe de apremio. Supervisión elaboró concepto revisado por la jefatura de contratación derivada, y remitió el 2 de mayo de 2024 solicitud de inicio del procedimiento de apremio a la contratante. Por su parte la contratante notificó a contratista y aseguradora el inicio del procedimiento el 14 de mayo de 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





Mejoramiento IE Santa Teresita - Rosas





Mejoramientos CE Buenos Aires (Sede Capitanes) - Balboa





Mejoramientos IE Olaya (Sede Principal) - Balboa





CE Guillermo Leon Valencia (Sede La Despensa) – Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





CE Guillermo Leon Valencia (Sede El Altillo) – Rosas





IE Alfonso Cordoba (Sede Las Yerbas) – Rosas





IE Alfonso Cordoba (Sede Bellavista) – Rosas





IE Santa Rita (Sede Principal) – La Vega

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO





IE Comuneros (Sede principal) – Popayán





IE Alfonso Cordoba (Sede el Retiro) – Rosas





IE Nuestra Señora de los Remedios – Bolívar


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

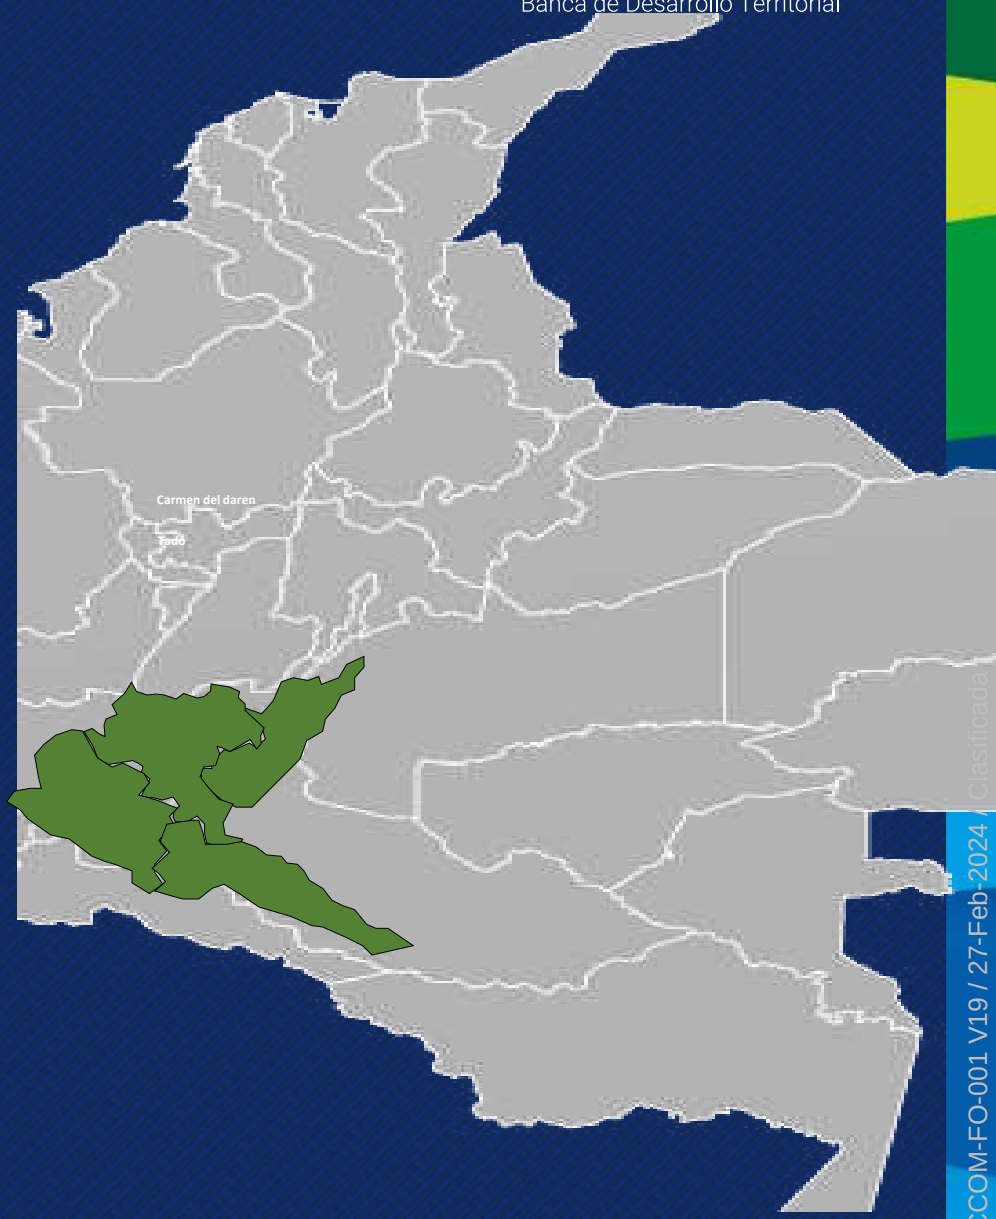

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.918.276.400 **I:** $318.105.088	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	**Progr**	33,37%	
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	29,65%	**Ejecut**	34,40%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	30,63%	En trámite de prórroga, modificación, aprobación NP obra e interventoria prórroga + adición		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	0
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	0
Cauca	Piamonte	Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	2	28	6
Cauca	Piamonte	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	1	1	2
Cauca	Piamonte	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	0
Huila	Acevedo	Institución Educativa Bateas	Bateas	0	3	8
Nariño	Pasto	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	7	0
Nariño	El Rosario	Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	7	0	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombon	0	2	2
Nariño	Ipiales	Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	0
Nariño	Mallama (Piedrancha)	Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	1	2
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	1	2
Putumayo	Pto Leguízamo	IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS		2	
Putumayo	Orito	Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	2
Putumayo	Puerto Asís	E. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	0

Avance General: En la semana del 26 al 2 de JUNIO de 2024.

Avance general Componente I: Terminado 04/04/2024, en proceso de entrega de productos (En trámite)

Avance general por Sede Componente II: Se inician 8 de 18, faltando 10 de inicio.

Se solicitará

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 1,59% Inicio 20/05/2024

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 93,76% Inicio 22/04/2024

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 36,42% Inicio 15/05/2024

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID41 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID57 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL PROGRESO: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE:0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024

ID125 Piamonte, PIAMONTE (sede principal): 0% Inicio 10/06/2024

ID127 Orito, ESC RUR MIX ALTO ORITO: 0% Inicio 10/06/2024

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 88,98% Inicio 05/04/2024

ID149 Mallama(Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024

ID172 Puerto Asís, SEDE PRINCIPAL: 0% Inicio 10/06/2024

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL: 0% Inicio 10/06/2024

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 15,74% Inicio 21/05/2024

Se solicitó prórroga para el contrato de obra por 3 meses, presentación de balance financiero, NPs y para la interventoría prórroga y adición, lo anterior, se presentó en Comité Técnico No. 54 y se encuentra en ejecución en Comité Fiduciario.

Se presentan dificultades en 3 instituciones de ID 41, 57 Y 172 con Rector dado que en sede principal quiere aulas nuevas y su matrícula no da para estas y no se encuentra de acuerdo con la implementación de sistemas constructivos alternativos. En ID125 no se ha podido conciliar Plan Logístico para entrega de aulas para inicio de trabajos con nuevo rector.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 1,59% Inicio 20/05/2024



REPELLO EN MUROS DE FACHADA DE GALPONES - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BODEGA - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



REPELLO EN MURO DE FACHADA LATERAL DE GALPONES - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BODEGA - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 36,42% Inicio 15/05/2024





MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA DE CUBIERTA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE LA ESPAÑOLA



APLICACIÓN DE ESTUCO -



INSTALACIÓN DE CUBIERTA BATERIAS SANITARIAS



MANTENIMIENTO DE PUNTOS HIDRÁULICOS

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024



ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 93,76% Inicio 22/04/2024



INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJANTES



MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, ELABORACIÓN DE MESÓN EN COCINA



INSTALACIÓN DE ESTRCUTRA Y CUBIERTA



INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN COCINA Y DUCHA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024




INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE FACHADAS





INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 88,98% Inicio 05/04/2024




INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE FACHADAS




FACHADAS Y MEJORMIENTOS DE PINTURA DE AULAS

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 15,74% Inicio 21/05/2024



Foto 1. DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 2. INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 3. DESMONTE DE CUBIERTA EN AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 4. RASAPADO DE PINTURA EN MUROS DE AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024




APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CANAL Y BAJANTES



MEJORAMIENTO DE ENCHAPE DE BATERIAS SANITARIAS – DUCHA NIÑOS



INSTALCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN AULA

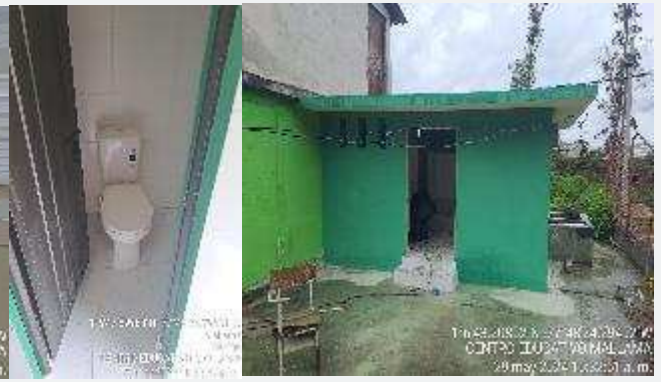

MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EXITENTE

Comité de seguimiento atención temporada lluvias MEN -FINDETER

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

1	MEN recomienda que las aulas nuevas que se están haciendo, tengan una ventilación apropiada.
2	**Grupo 4:** Se le informo al MEN que se encuentra en proceso de liquidación.
3	MEN recomienda que se confirme el saldo que quedo disponible del grupo 4 para poder realizar esa adición al grupo 5.
4	MEN recomienda tener actualizado los códigos DANE de cada Institución Educativa.
5	**Compromiso:** Cargar en la carpeta compartida las actas de entrega de las Instituciones Educativas que ya se han entregado del grupo 1,3,4,6 y grupos que ya han tenido entregas de sedes.
6	**Compromiso**: Enviar la base detallada actualizada.
7	**Compromiso:** MEN recomienda realizar una línea de tiempo con todos los procesos realizados de las Instituciones Educativas de Suarez.
8	**Compromiso:** Del grupo 10 se hace el compromiso de mostrar un avance actualizado con fotografías de la institución educativa Maria Inmaculada.

CCOM-FO-001 V18 // 1-Jun-2023 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

JESUS ALBERTO CAÑAS PÁEZ

Gestor Convenio

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Junio 04 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha: Abril 30 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23				$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 82.351.406,35	$ -		$ 82.351.406,35
sep-23	$ 108.927.246,74	$ -		$ 191.278.653,09
oct-23	$ 131.902.760,66	$ -		$ 323.181.413,75
nov-23	$ 144.907.033,92	$ -		$ 468.088.447,67
dic-23	$ 143.221.271,36	$ 468.088.448,00	13/12/2023	$ 143.221.271,03
ene-24	$ 133.626.379,48	$ 143.221.271,36	10/01/2024	$ 133.626.379,15
feb-24	$ 120.547.529,88	$ 133.626.379,15	12/02/2024	$ 120.547.529,88
mar-24	$ 117.745.976,50	$ 120.547.529,88	12/03/2024	$ 117.745.976,50
abr-24	$ 100.331.907,69	$ 117.745.976,50		$ 100.331.907,69
TOTALES	**$ 1.083.561.512,58**	**$ 983.229.604,89**		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23		$ -		$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 443.947.650,01	$ -		$ 443.947.650,01
sep-23	$ 548.880.836,71	$ -		$ 992.828.486,72
oct-23	$ 436.008.307,20	$ -		$ 1.428.836.793,92
nov-23	$ 718.224.229,49	$ -		$ 2.147.061.023,41
dic-23	$ 788.090.860,63	$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	$ 788.090.860,04
ene-24	$ 427.858.051,59	$ 788.090.860,63	10/01/2024	$ 427.858.051,00
feb-24	$ 474.970.095,24	$ 427.858.051,00	12/02/2024	$ 474.970.095,24
mar-24	$ 478.495.863,61	$ 474.970.095,24	12/03/2024	$ 478.495.863,61
abr-24	$ 259.736.382,70	$ 478.495.863,61		$ 259.736.382,70
TOTALES	**$ 4.576.212.277,18**	**$ 4.316.475.894,48**		
SALDO POR GIRAR	$ 360.068.290,39			

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

• Rendimientos Financieros – Soportes de giro

Marzo

Fecha Actual: 2024/03/14 | Hora: 09:31 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): KATHERIN PEREZ URUEÑA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	75516	PCK001RHQO	2024/03/12	$595,517,625.12	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/11	18:08:17	05:00:12	ANDRES FORERO PEREZ	2024/03/13	10:10:03	$595,517,625.12	$595,517,625.12

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	SERGIO ANDRES ARTETA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Cheques	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2024/03/12	$120,547,525.88	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado
500804650450	2024/03/12	$474,970,095.24	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado

Abril

Fecha Actual: 2024/04/12 | Hora: 09:59 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): KATHERIN PEREZ URUEÑA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	11028	PDJ001NBJO	2024/04/10	$596,241,840.11	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/04/10	14:02:10	14:05:05	CINDY JHANNYN CHIMB	2024/04/12	05:21:38	$596,241,840.11	$596,241,840.11

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	JORGE LADIES CIFUENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Cheques	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2024/04/10	$117,745,976.50	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado
500804650450	2024/04/10	$478,495,863.61	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Febrero 29 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Febrero

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 1 COMPONENTE I	209.689.697,70
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	310.538.200,37
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	Acta 1 COMPONENTE II	29.496.399,66
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 1 COMPONENTE II	9.031.097,08
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 2 COMPONENTE II	9.031.097,08
Nacion	PAF-MENAM-I-055-2023	Acta 1 COMPONENTE I Y Acta 1 COMPONENTE II	137.217.699,90
Nacion	PAF-MENAM-O-056-2023	Acta 1 COMPONENTE I	147.798.000,00
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	1.109.127.985,92
Nacion Nacion	FINDETER - REMUNERACION	Hito No. 1	690.748.453,00
TOTAL MUNICIPIO			**$ 2.652.678.630,71**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Marzo 31 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Marzo

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 1 COMPONENTE I	255.931.622,10
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	1.004.933.089,66
Nacion	PAF-MENAM-O-056-2023	Acta 1 COMPONENTE II	298.734.026,27
Nacion	PAF-MENAM-O-055-2023	Acta 1 COMPONENTE I	245.700.252,00
Nacion	PAF-MENAM-O-055-2023	Acta 1 COMPONENTE II	566.220.751,44
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 1 COMPONENTE I	49.678.199,10
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	Acta 2 COMPONENTE II	14.748.199,83
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	1.552.950.355,84
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	104.056.974,00
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 3 COMPONENTE II	15385359,95
Nacion	PAF-MENAM-I-054-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	106807150,8
TOTAL MUNICIPIO			**$ 4.215.145.980,99**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Abril 30 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Abril

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 3 COMPONENTE II	15.385.359,95
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	50.103.395,23
Nacion	PAF-MENAM-I-056-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	76.557.757,50
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	695.774.071,55
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS	123.112.949,40
Nacion	PAF-MENAM-I-054-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	132.142.411,82
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	692.966.996,28
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	Acta 3 COMPONENTE II	14.748.199,83
Nacion	PAF-MENAM-O-053-2023	ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II	138.348.408,00
Nacion	PAF-MENAM-O-056-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	922.334.346,79
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 4 COMPONENTE II	31.176.681,67
Nacion	PAF-MENAM-I-056-2023	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	32.400.000,00
Nacion	PAF-MENAM-I-053-2023	Acta 1 COMPONENTE II	53.014.500,00
Nacion	PAF-MENAM-O-055-2023	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	1.298.540.027,74
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	41.678.040,97
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 4 COMPONENTE II OBRA	520.868.451,89
Nacion	PAF-MENAM-I-055-2023	Acta 2 COMPONENTE II	39.665.394,95
Nacion	REMUNERACION	A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	221.354.930,84
TOTAL MUNICIPIO			**$ 5.100.171.924,41**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Soportes de Pagos de Contratos Derivados

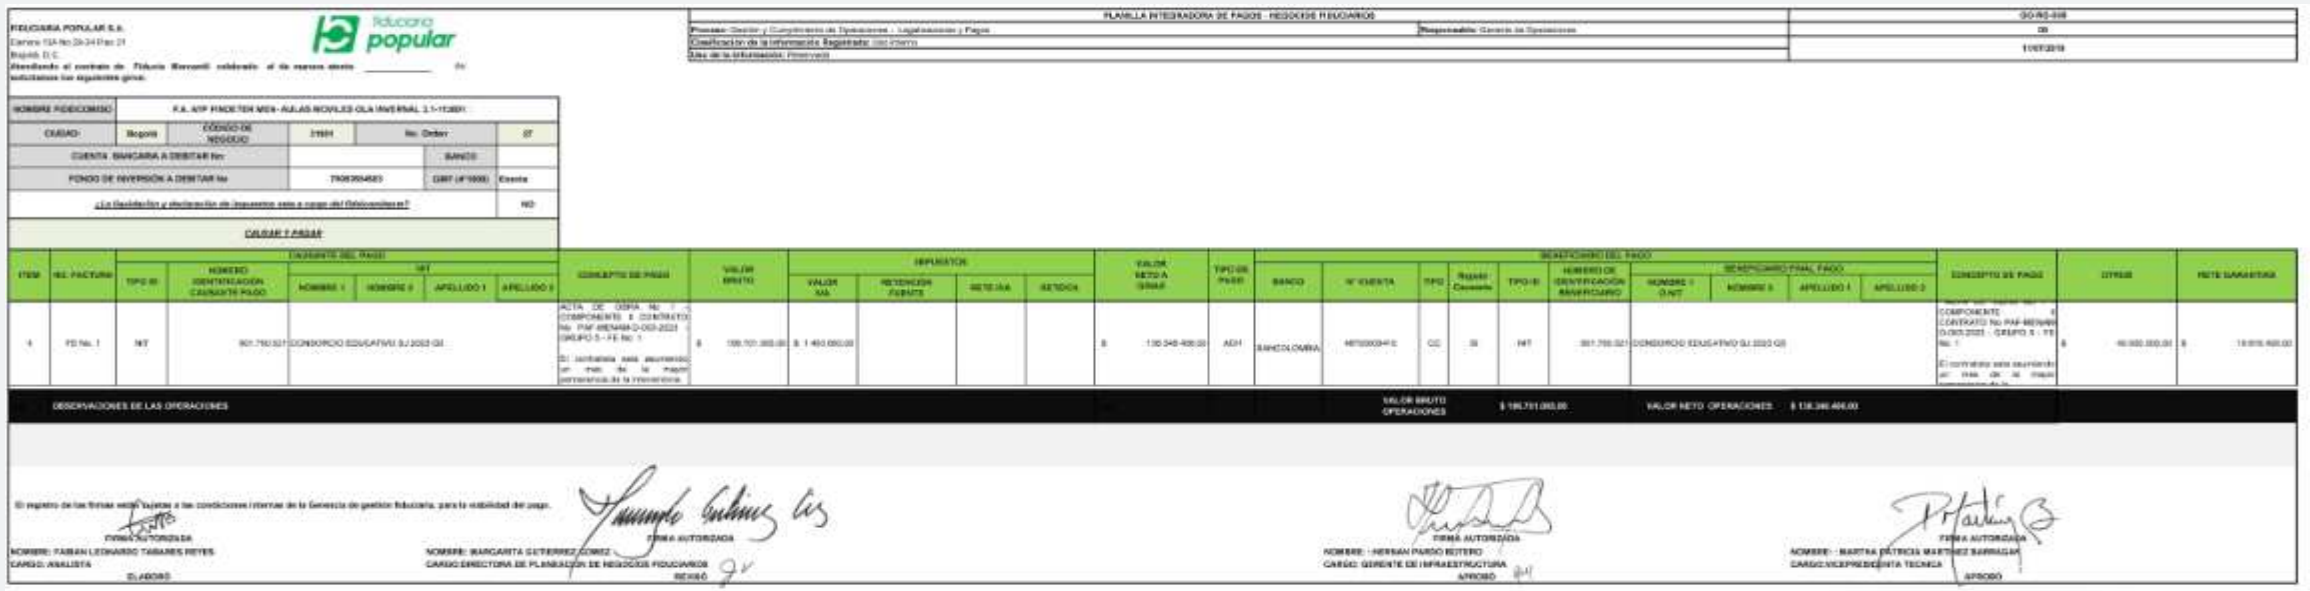

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. APP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-112001
CIUDAD	Bogotá
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No	7908304503
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomiso?	NO

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO					CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	DEPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIA
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	NIT					VALOR IVA	RETENCION FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Bajalo Convenio	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO						
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2														NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			
4	FE No. 1	NIT	901.750.521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2022 Q2				ACTA DE OBRA No. 1 COMPONENTE 2 CONTRATO No PAF-MEN-MM-O-003-2021 GRUPO 5 - FE No. 1 El contratista esta asumiendo un mas de la mano permanente de la interventoria	$ 139.701.000,00	$ 1.460.000,00				$ 138.240.400,00	ADH	BANCOLOMBIA		CC		NIT	901.750.521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2022 Q2					COMPONENTE 2 CONTRATO No PAF-MEN-MM-O-003-2021 - GRUPO 5 - FE No. 1 El contratista esta asumiendo un mas de la mano permanente de la	$ 10.000.000,00	$ 10.000.400,00

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 139.701.000,00 VALOR NETO OPERACIONES $ 138.240.400,00


El registro de las firmas está sujeto a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES
CARGO: ANALISTA
ELABORO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
REVISO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: HERNAN PARDO ROTERO
CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
APROBO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA
APROBO

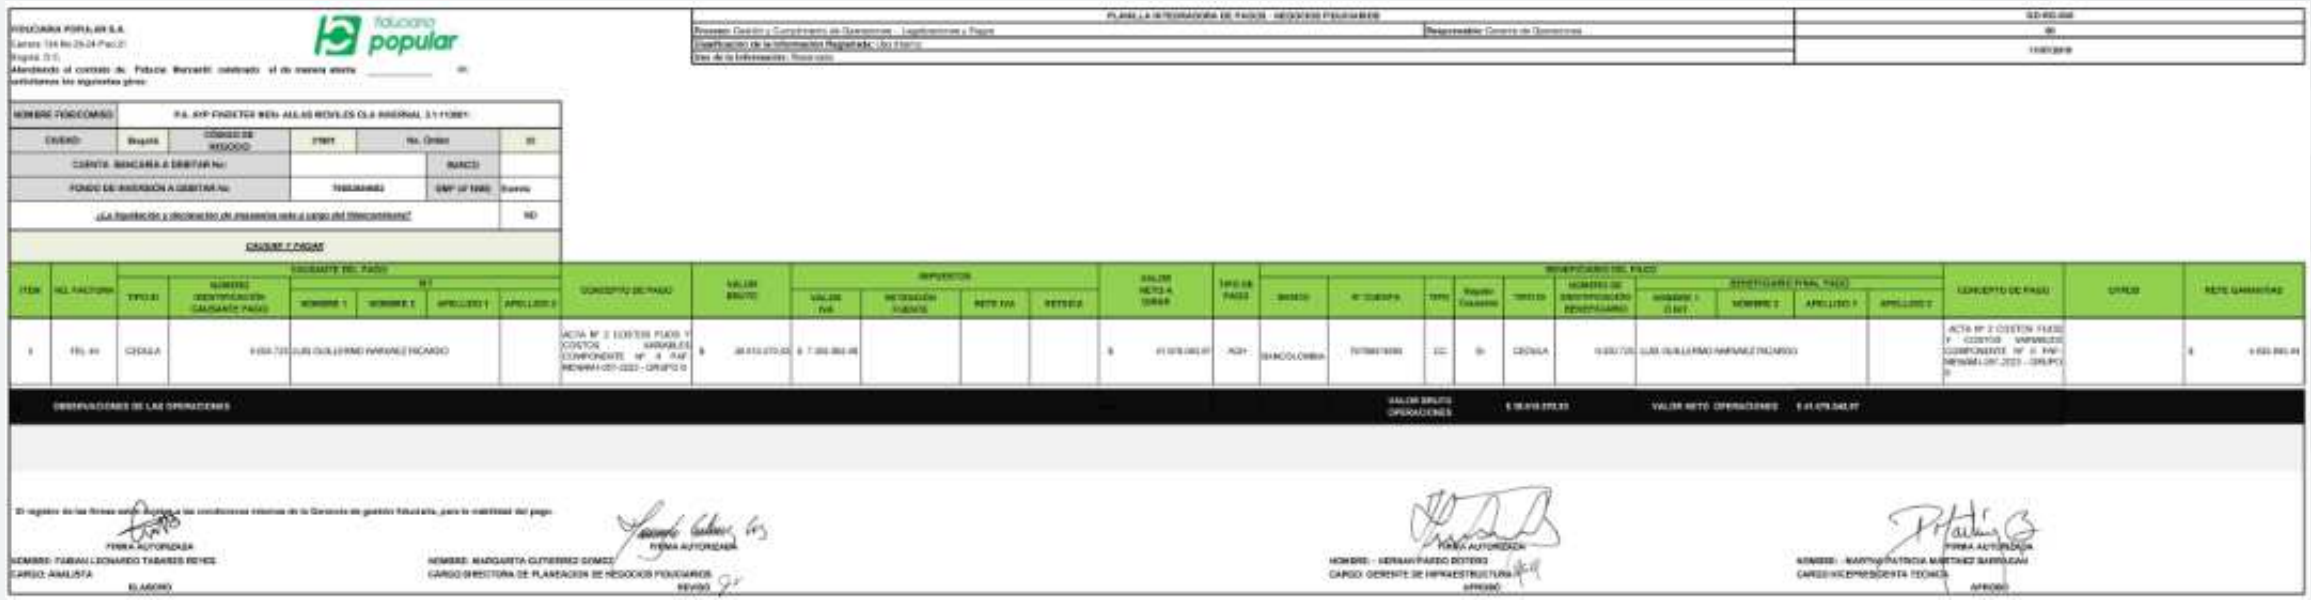

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. APP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-112001
CIUDAD	Bogotá
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No	7908304503
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomiso?	NO

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO					CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	DEPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIA
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	NIT					VALOR IVA	RETENCION FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Bajalo Convenio	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO						
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2														NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			
3	FE No. 01	CEDULA	9.650.720	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO				ACTA Nº 2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES COMPONENTE Nº 4 PAF MEN-MM-I-097-2022 - GRUPO 0	$ 48.913.370,00	$ 7.000.000,00				$ 41.978.040,97	ADH	BANCOLOMBIA		CC		CEDULA	9.650.720	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO				ACTA Nº 2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES COMPONENTE Nº 4 PAF MEN-MM-I-097-2022 - GRUPO 0		$ 6.935.369,44

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 48.913.370,00 VALOR NETO OPERACIONES $ 41.978.040,97

El registro de las firmas está sujeto a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES
CARGO: ANALISTA
ELABORO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
REVISO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: HERNAN PARDO ROTERO
CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
APROBO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA
APROBO

Estado Contrataciones Grupos 7 y 9

NO.	GRUPO	CONVOCATORIA	ACTA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	PROPUESTAS	HABILITADOS	RECHAZADO	OBSERVACIONES	SIGUIENTE ACTIVIDAD
1	Grupo 7	CONTRATACIÓN DIRECTA	N.A.	0	N.A.	N.A.	- Se firmó acta de inicio el día 31 de mayo de 2024	Inicio etapa 1 (diagnostico)
2	Grupo 7	PAF-MENAM-I-059-2023	N.A.	8	6	1	- Se firmó acta de inicio el día 31 de mayo de 2024	Inicio etapa 1 (diagnostico)
3	Grupo 9	CONTRATACIÓN DIRECTA	N.A.	0	N.A.	N.A.	En espera de firma acta de inicio.	• Firma de Acta de Inicio
4	Grupo 9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	N.A.	0	N.A.	N.A.	• Se realizó la declaratoria desierta de la convocatoria privada de interventoría. • Se está en revisión de información y ajuste de estudios previos para iniciar el proceso de contratación directa.	N.A.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

139 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Estado Actual
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [83,42%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [30,56%] 27/11/2023 - 15/07/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	En Obra [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	En Obra [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [50,17%] 14/11/2023 - 29/06/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	En Obra [100%] 15/11/2023 - 26/04/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En Obra [0,00%] 31/05/2024 - 15/09/2024
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [80,99%] 08/11/2023 - 08/08/2024
G9 [15 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En legalización Obra. En proceso de contratación Interventoría
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [33,87%] 19/02/2023 - 11/10/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Estudios [41,53%] 12/02/2023 - 12/08/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Estudios [26,49%] 20/02/2023 - 17/09/2024

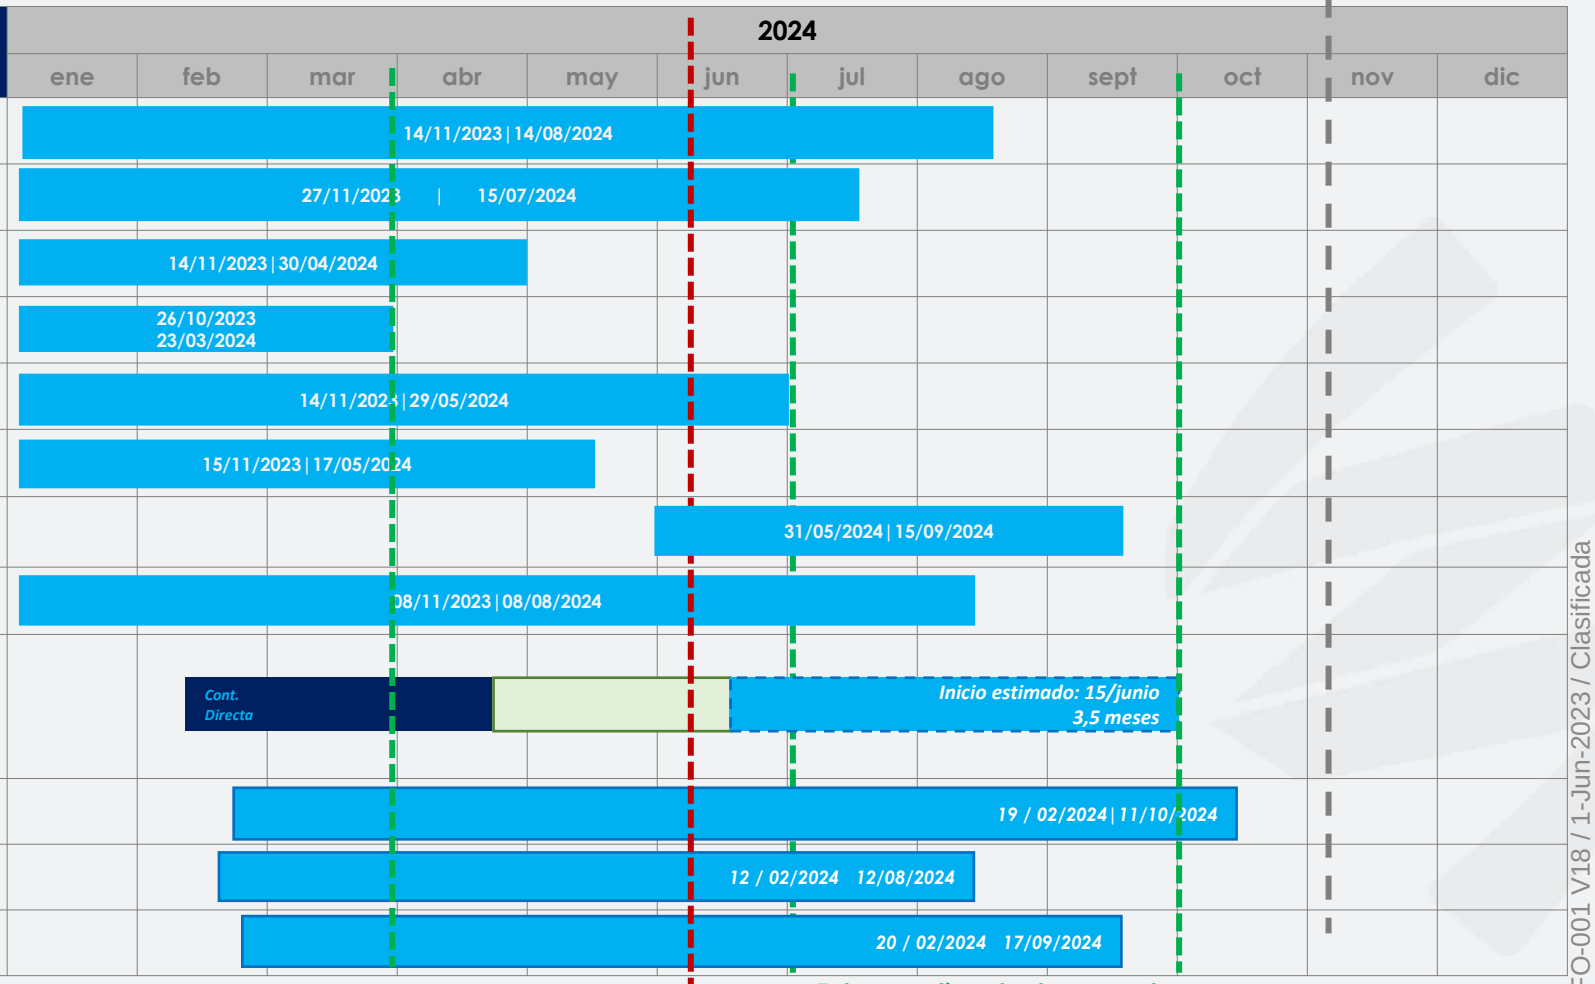

Entrega estimada de proyectos
- ✓ Trimestre II: 6 intervenciones
- ✓ Trimestre III: 107 intervenciones
- ✓ Trimestre III: 37 intervenciones
- * 8 sedes en validación jurídica

Convocatoria | Legalización | Ejecución

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2024									
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
Grupo 1	Antioquia I Chocó	En Obra [83,42%]							14/08			
Grupo 2	Atlántico	En Obra [30,56%]						15/07				
Grupo 3	Magdalena	En Obra [100%]			30/04							
Grupo 4	Bolívar	En Obra [100%]		23/03								
Grupo 5	Bolívar | Magdalena | C esar	En Obra [50,17%]					29/06					
Grupo 6	Cesar	En Obra [100%]			26/04							
Grupo 7	Guajira	En Obra [0,00%]								15/09		
Grupo 8	Córdoba | Bolívar	En Obra [80,99%]							08/08			
Grupo 9	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En proceso de contratación Interventoría								30/09		
Grupo 10	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [33,87%]									11/10	
Grupo 11	Cauca	En Estudios [41,53%]							12/08			
Grupo 12	Nariño | Putumayo | Cauca	En Estudios [26,49%]								17/09		

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

139 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 –
Fin Interadministrativo

ENTREGADAS
31 sedes
22%

EN EJECUCIÓN
83 sedes
60%

POR INICIAR
25 sedes
18%

Nota: Para el Mes de Junio se tiene proyección de entrega de 32 sedes (45%), de las cuales, en las primeras 2 semanas se entregarán 13 de estas en los departamentos de Atlántico (2), Bolivar (3), Cauca (1), Cesar (2), Córdoba (2), Huila (1) y Magdalena (2)

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

DOTACION ESCOLAR AULAS MOVILES

"EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS"



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Localización del Proyecto

El proyecto se ejecutará en 26 instituciones educativas ubicadas en diferentes departamentos del país:

Dep.	Municipio	IE	SEDE	CODIGO DANE
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	227615000668
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	205045000347
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA	127787000169
Atlántico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	208606000243
Atlántico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	108758077964
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	247268002052
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	213468000117
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	247692000477
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	247692000116
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	213074000235
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	213667001262
Cesar	La Paz (Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	420621013253
Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	220250000073
Córdoba	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	223555004629
Córdoba	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	223580001504
Córdoba	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	223068002159
Córdoba	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	223466002525
Bolívar	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	113442000653
Cauca	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	219698000661
Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	276111001087
Cauca	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	119780000322
Cauca	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	219256000042
Cauca	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	219100002134
Cauca	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	219100000778
Cauca	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	219397001026
Cauca	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	119622000226

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Alcance

Suministro, entrega e instalación de dotación de mobiliario escolar en las aulas educativas nuevas de las sedes afectadas por la temporada de lluvias, incluyendo todas las actividades necesarias para la puesta en condiciones de funcionalidad. El suministro se debe realizar de acuerdo con los elementos que conforman la tipología de dotación así:

A. Aulas Preescolares: puesto de trabajo preescolar, cada uno compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.

B. Aulas Primaria: puesto para alumno primaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

C. Aulas Secundaria o Multigrado: puesto alumno secundaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

D. Para todas las Aulas: (1) juego de puesto de trabajo docente compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

E. Un (1) tablero alta resistencia para marcador borrable por aula.

F. Un (1) tablero móvil para aulas multigrado.

G. Un (1) juego tándem de tres (3) canecas por aula.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Sedes a la fecha: 26

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INFORMACIÓN GENERAL		ALULAS NUEVAS POR GRADO					DOTACION POR CADA SEDE							
Municipio	SEDE	PREESC	PRIMA.	SECUN.	MULTIGR	TOTAL AULAS NUEVA	Puesto trabajo Presco	Puesto trabajo Prima	Puesto trabajo Secun	Puesto de trabajo Docen	Tablero	Tablero Movi	Mueble	Tandem
Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL				2	2	0	0	60	2	0	2	2	2
Apartadó	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Tadó	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA				2	2	0	0	60	2	0	2	2	2
Repelón	PITA	0	0	0	2	2	0	0	60	2	0	2	2	2
Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	0	0	0	3	3	0	0	90	3	0	3	3	3
El Retén	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE			9		9	0	0	0	9	9	0	9	9
Mompós	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL				6	6	0	0	180	6	0	6	6	6
San Sebastían de Buenavista	ERM MARIA AUXILIADORA				4	4	0	0	120	4	0	4	4	4
San Sebastían de Buenavista	ERM LA PACHA				3	3	0	0	90	3	0	3	3	3
Barranco de Loba	ATASCOZA		1			1	0	30	0	1	1	0	1	1
San Martín de Loba	PLAN BONITO		1			1	0	30	0	1	1	0	1	1
La Paz(Robles)	SEDE EL COSO	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
El Paso	SEDE LA ESTACION	0	1	0	0	1	0	30	0	1	1	0	1	1
Planeta Rica	LOS CERROS		1			1	0	30	0	1	1	0	1	1
Puerto Libertador	ESC NVA LA SOLITA				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Ayapel	ESC NVA PARCELAS LONDRES				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Montelíbano	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR		2			2	0	60	0	2	2	0	2	2
María la Baja	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA			2		2	0	0	0	2	2	0	2	2
Santander de Quilichao	DOMINGUILLO (sede principal)			8		8	0	0	0	8	8	0	8	8
Guadalajara de Buga	SEDE CRISTOBAL COLON				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Suarez	SEDE MARIA INMACULADA			6		6	0	0	0	6	6	0	6	6
El Tambo	HUISITO (sede principal)	2	3	1	0	6	20	90	0	6	6	0	8	6
Bolívar	CORRAL VIEJO	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Bolívar	LA FUENTE	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Rosas	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	1	0	0	0	1	10	0	0	1	1	0	2	1
	TOTALES	**3**	**9**	**26**	**30**	**68**	**30**	**270**	**900**	**68**	**38**	**30**	**71**	**68**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Presupuesto

OBJETO	VALOR CDR
CONTRATAR "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS"	$ 758.497.441

Plazo

PLAZO TOTAL
DOS (02) MESES

Estado Actual

Mayo 31
Publicación

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Balance General del Contrato

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Grupo	Obra		Interventoria		TOTAL
	Valor inicial	Valor adición	Valor inicial	Valor adición	
			TOTAL MONTO DISPONIBLE PARA CONVENIO		$ 59.485.981.308,00
GRUPO 1	$ 3.447.332.358,95		$ 271.455.247,34	$ 25.183.769,00	$ 3.743.971.375,29
GRUPO 2	$ 4.044.124.630,00		$ 295.715.000,00		$ 4.339.839.630,00
GRUPO 3	$ 4.744.960.153,00	$ -	$ 351.774.412,00	$ 10.000.000,00	$ 5.106.734.565,00
GRUPO 4	$ 3.361.652.674,57		$ 279.439.929,28	$ 10.000.000,00	$ 3.651.092.603,85
GRUPO 5	$ 4.102.044.984,00		$ 300.856.990,00		$ 4.402.901.974,00
GRUPO 6	$ 2.102.352.000,00	$ 394.497.571,44	$ 155.543.411,00	$ 36.738.473,21	$ 2.689.131.455,65
GRUPO 7	$ 4.158.777.883,00		$ 295.239.000,00		$ 4.454.016.883,00
GRUPO 8	$ 4.706.470.280,00	$ 858.000.000,00	$ 297.097.668,00	$ 49.106.877,00	$ 5.910.674.825,00
GRUPO 9	$ 4.810.476.306,00		$ 313.828.750,00		$ 5.124.305.056,00
GRUPO 10	$ 6.014.978.800,00		$ 327.496.568,00		$ 6.342.475.367,99
GRUPO 11	$ 4.728.021.810,00		$ 312.927.160,00		$ 5.040.948.970,00
GRUPO 12	$ 4.918.276.400,00		$ 318.105.088,00		$ 5.236.381.488,00
				SUBTOTAL (1)	$ 56.042.474.193,79
				SUBTOTAL (2)	$ 3.443.507.114,21
				DOTACIÓN	$ 1.200.000.000,00
				VISITAS	$ 84.371.774,00
				TOTAL (Remanente 1)	$ 2.159.135.340,21
				Alcance de actividades adicionales:	
				Sede Banco Magdalena	$ 514.127.857,00
				Adición La Chinela y Tronconal	$ 190.161.297,00
				Sedes El Nispero (María La Baja)	$ 657.000.000,00
				IE Demetrio Salazar (Tadó)	$ 201.152.963,00
				Interventoría Grupo 10	$ 69.110.455,20
				Interventoría Grupo 11	$ 19.522.736,00
				Interventoria Grupo 12	$ 50.441.503,50
				Mayores Cantidades Suarez (Inmaculada)	$ 341.572.704,00
				TOTAL (Remanente 2)	$ 116.045.824,51

NOTA:

Se cuenta con un saldo disponible para adiciones de **$116.045.824**, el cual podrá ser utilizado en las novedades de ejecución que puedan surgir en los grupos 7 o 9, los cuales no han iniciado actividades.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Mayo 31 de 2024



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4282 estudiantes.
- $ 3.743.971.376,32 Inversión

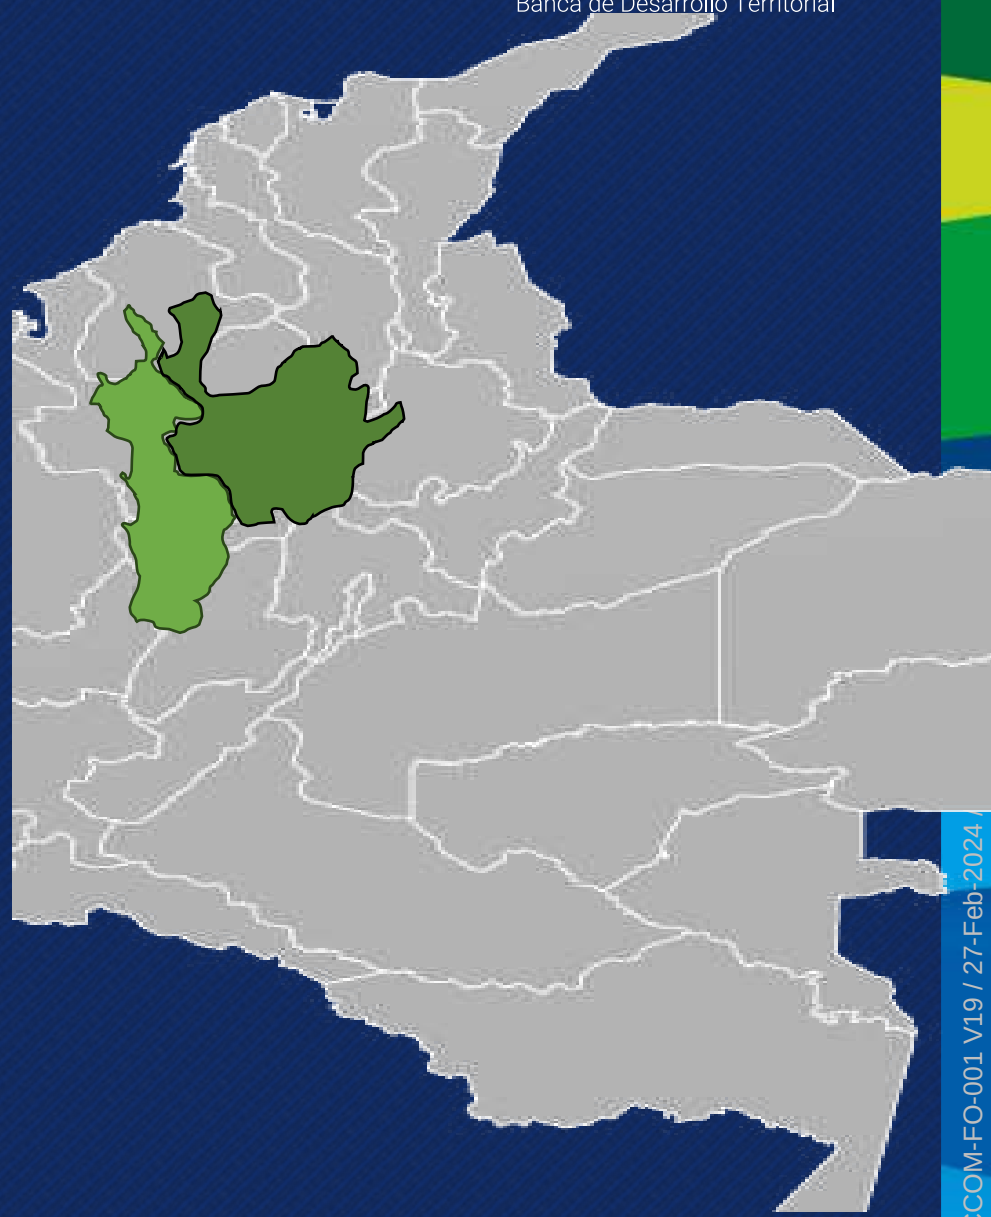

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN		
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4	
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		7	2 BS NUEVAS 5 MEJ

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 26 al día 12 de mayo de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 94.79% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 67.98%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 26.81% de atraso frente a lo programado.

NOTA: Se tramito adición por la suma de ($201,152,963,00) al valor de ejecución del Componente 2 del contrato obra, para la ejecución de las actividades diagnosticadas en alcance a la sede CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO, ubicada en el municipio de Tadó Chocó, y prórroga por un plazo de 3 MESES atribuible al contratista de obra para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para el CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL ubicado en el municipio del Carmen del Darién, Chocó y CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO, ubicada en el municipio de Tadó Chocó. Proceso que es aprobado en el comité técnico No. 48 y comité fiduciario No. 30 del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 el 14 de mayo de 2024.

Pendiente realizar la actualización de los porcentajes en cumplimiento a la programación soporte de la prórroga aprobada, proceso que se aplicara partir del informe semanal No. 27 con corte al domingo 19 de mayo de 2024.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra en proceso de revision de los productos por parte de la interventoría para emitir su aprobación.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE CHURIDO PUEBLO: Se realiza entrega parcial de las baterías sanitarias principales de hombres y mujeres en el bloque 2, así mismo, continúa el mejoramiento de unidades sanitarias del bloque 1 (profesores) y de las baterías sanitarias del área de preescolar. Culmina enrase de muros hasta la cubierta y procesos de revoques de columnetas del antepecho del balcón. Continúa proceso de reemplazo de estructura de cubierta del área de preescolar e instalación de tejas en UPVC.
2. I.E PUEBLO NUEVO: Transporte y acopio de material de playa, corte y acopio madera y trazado y excavación de pilotes para construcción de cimentación profunda.
3. IE. DEMETRIO SALAZAR: Se continúan actividades de corte y demolición estructuras existentes, excavación para construcción cimentación, cargue y retiro de escombros.
4. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Culmina proceso de acabados internos y externos de aula, se instala enchape perimetral de protección, instalación de luminarias, se encuentra en proceso de instalación de carpintería de puertas y ventanas. Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024.
5. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento, sin embargo, continúa subsanación de observaciones a los acabados de la carpintería metálica. Se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 02 de mayo del 2024.
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. El contratista realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024.
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. Se programa entrega de la placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024.
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. El contratista realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC.
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC. Se programa entrega de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – ANTES (FECHA INICIO 29/04/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – DURANTE (FECHA INICIO 29/04/2024)









Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – DURANTE (FECHA INICIO 29/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN – DURANTE (FECHA INICIO 29/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05 /2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05 /2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ. (FECHA INICIO 6/05 /2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO. - ANTES






IE EL OSITO, APARTADÓ - DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA INICIO 11/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA INICIO 11/04/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA TERMINACIÓN 07/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA ENTREGA 14/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL OSITO, APARTADO – DESPUÉS (EJECUCIÓN AULA MOVIL – FECHA ENTREGA 14/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL REPOSO, APARTADO. - ANTES









IE EL REPOSO, APARTADÓ - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE EL REPOSO, APARTADO – DESPUÉS (ENTREGA 14/03/2024)

















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CADENAS LAS PLAYAS, APARTADO. - ANTES









IE CADENAS LAS PLAYAS, APARTADÓ - DURANTE









Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CADENAS LAS PLAYAS, APARTADO - DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO. - ANTES









IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADÓ - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – EN EJECUCIÓN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – EN EJECUCIÓN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CHURIDÓ PUEBLO, APARTADO – DESPUÉS





Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. - ANTES










IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. - DURANTE



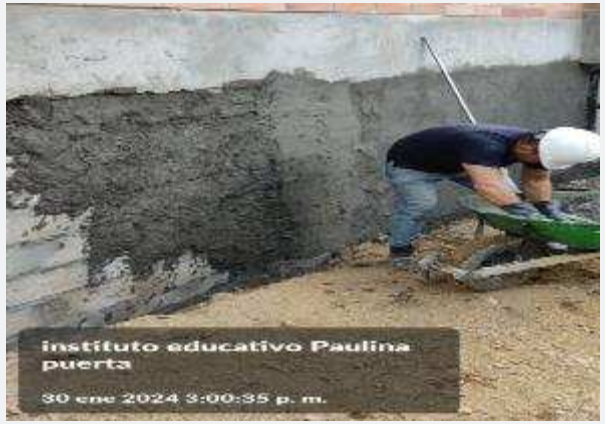





Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. DESPUES

















Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PAULINA PUERTA, CIUDAD BOLIVAR. DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE JESUS MORA, TURBO. - ANTES







IE JESUS MORA, TURBO - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE JESUS MORA, TURBO - DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE JESUS MORA, TURBO - DESPUÉS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ. - ANTES









IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ - DESPUÉS








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE MARÍA AUXILIADORA, TADÓ - DESPUÉS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. - ANTES









IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. - DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – EN EJECUCIÓN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – EN EJECUCIÓN













Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – DESPUÉS













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SAN MARTÍN DE PORRES, TURBO. – DESPUÉS (ENTREGA 14/05/2024)













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones
  Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT
  2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630
  Inversión

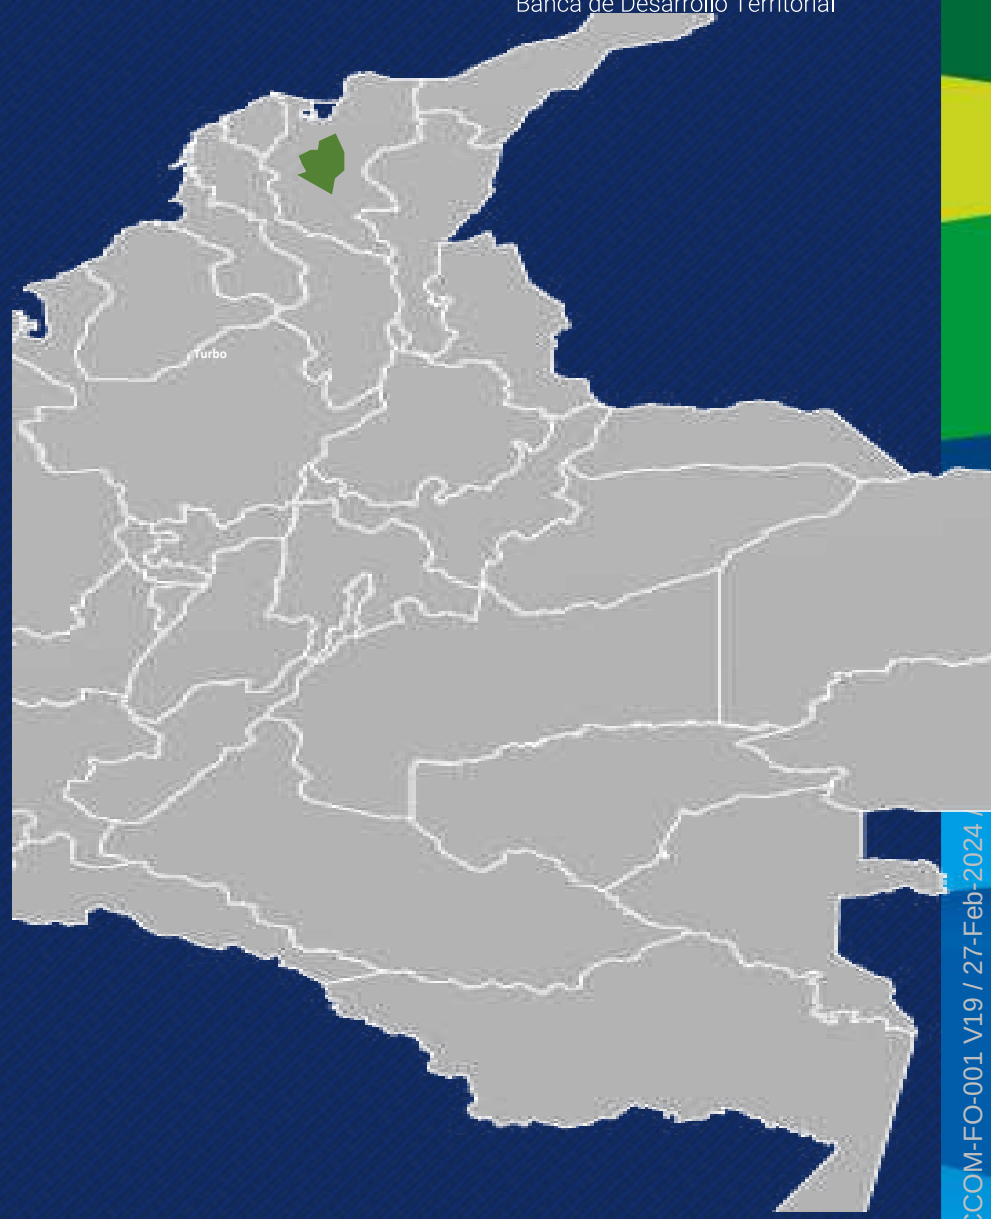

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ID MEN
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	2	NA	2	92
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3	NA	1	192
	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA	NA	12	EN CASO DE QUE APLIQUE	64
	Palmar de Varela	IE TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	NA	9	EN CASO DE QUE APLIQUE	91
	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL	NA	8	EN CASO DE QUE APLIQUE	83
		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	NA	5	8	84
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	IE JOSEFA DONADO	NA	16	EN CASO DE QUE APLIQUE	18
		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	NA	22	EN CASO DE QUE APLIQUE	144
	Luruaco	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NA	6	EN CASO DE QUE APLIQUE	191

Avance por Sede:

ID 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón: Se realiza socialización del proyecto a la comunidad el día 4 de abril, de acuerdo a la priorización efectuada sobre presupuesto y diagnostico preliminar.se realiza la revisión estudio de suelos ID 92 - IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS/SEDE PITA.- REPELÓN. Se da inicio activiades preliminares de desmontes 1 aula nueva. P:0 E: 5%

ID 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón: Abril 04 - 2.024 Jueves, Se retoma la actividad de elaboración de cerchas haciendo las correcciones de acuerdo a la solicitud de interventoria mediante oficio INT_AM_149. 8 aulas (1 aula de informatica) P:27.98 E: 19.0

ID 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón: Se realiza el englose entre las laminas de cubierta y los muros existentes-Continua hasta terminar la instalación de las correas para soporte de cubierta en el modulo o bloque 1-Inicia la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1-Continua hasta terminar la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1. 5 AULAS DE MEJORAMIENTO P:65.66 E: 73.8%

ID 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL – Soledad-Abril 01 - 2.024 Lunes, Inicia la Instalación de Cerchas para soporte de correas en el modulo de bachillerato-Abril 02 - 2.024 Martes, Continua el montaje de Cerchas para soporte de correas en el modulo de bachillerato-Abril 03 - 2.024 Miércoles, Inicia la Instalación de Correas en perfilería PAG Tipo C para soporte de laminas de cubierta en el modulo de bachillerato. 12 AULAS MEJORAMIENTO P: 44.13% E 37%

ID 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA – Soledad: Se realiza socialización del proyecto a la comunidad el día 4 de abril, de acuerdo a la priorización efectuada sobre presupuesto y diagnostico preliminar. 3 AULAS NUEVAS (Se pueden realizar 2)

ID 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – Soledad: Se realiza reunión de seguimiento del día 2 de abril de 2024, donde se realiza revisión de aspectos preliminares de diagnostico, priorización y presupuesto preliminar del proyecto. Se dejan comentarios finales y requerimiento de cierres del componente I. 22 aulas mejoramiento (No se ha dado incio por solicitud del rector por las prueba saber pro.

ID 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Galapa: 15 aulas mejoramiento P: 11.59 E:2%

ID 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA – Malambo: No se presentan avances por parte del contratista de obra al presente frente de trabajo.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

ID 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón

Se realiza socialización del proyecto a la comunidad el día 4 de abril, de acuerdo a la priorización efectuada sobre presupuesto y diagnostico preliminar.se realiza la revisión estudio de suelos ID 92 - IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS/SEDE PITA.- REPELÓN.

Se da inicio con actividades preliminres el 08 abril 2024.

PROGRAMADO 0%
EJECUTADO 5% 1 AULA NUEVA





VIDEO →

ID 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL - Repelón







El proyecto se encuentra con **cubierta** desmontada, elementos estructurales de cubierta con mantenimiento y complemento efectuado, instalado y en proceder con instalación de cubiertas.

Componente I, se encuentra en trámite de entregas, compromisos para los martes y miércoles 26 y 27 de marzo.

PROGRAMADO 27.98%
EJECUTADO 19.29% 8 AULAS MEJORAMIENTO

ID 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón







Se realiza el englose entre las laminas de cubierta y los muros existentes-Continua hasta terminar la instalación de las correas para soporte de cubierta en el modulo o bloque 1-Inicia la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1-Continua hasta terminar la instalación de laminas de cubierta en el modulo o bloque 1

PROGRAMDO 65%
EJECUTADO 73%
5 AULAS EN MEJORAMIENTO

VIDEO →

ID 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad







Continua el montaje de Cerchas para soporte de correas en el modulo de bachillerato-Abril 03 - 2.024 Miércoles, Inicia la Instalación de Correas en perfilería PAG Tipo C para soporte de laminas de cubierta en el modulo de bachillerato

ID 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

Se da inicio actividades preliminares

15 AULA MEJORAMIENTO

Programado 11.59%
Ejecutado 2%












3. REGISTRO DE ACTIVIDADES _ ID 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo

Una vez avalada la inclusión del frente al contrato, se gestiona la solicitud de entrega de registros de visitas y diagnósticos de la edificación.
8 AULAS EN MEJORAMIENTO



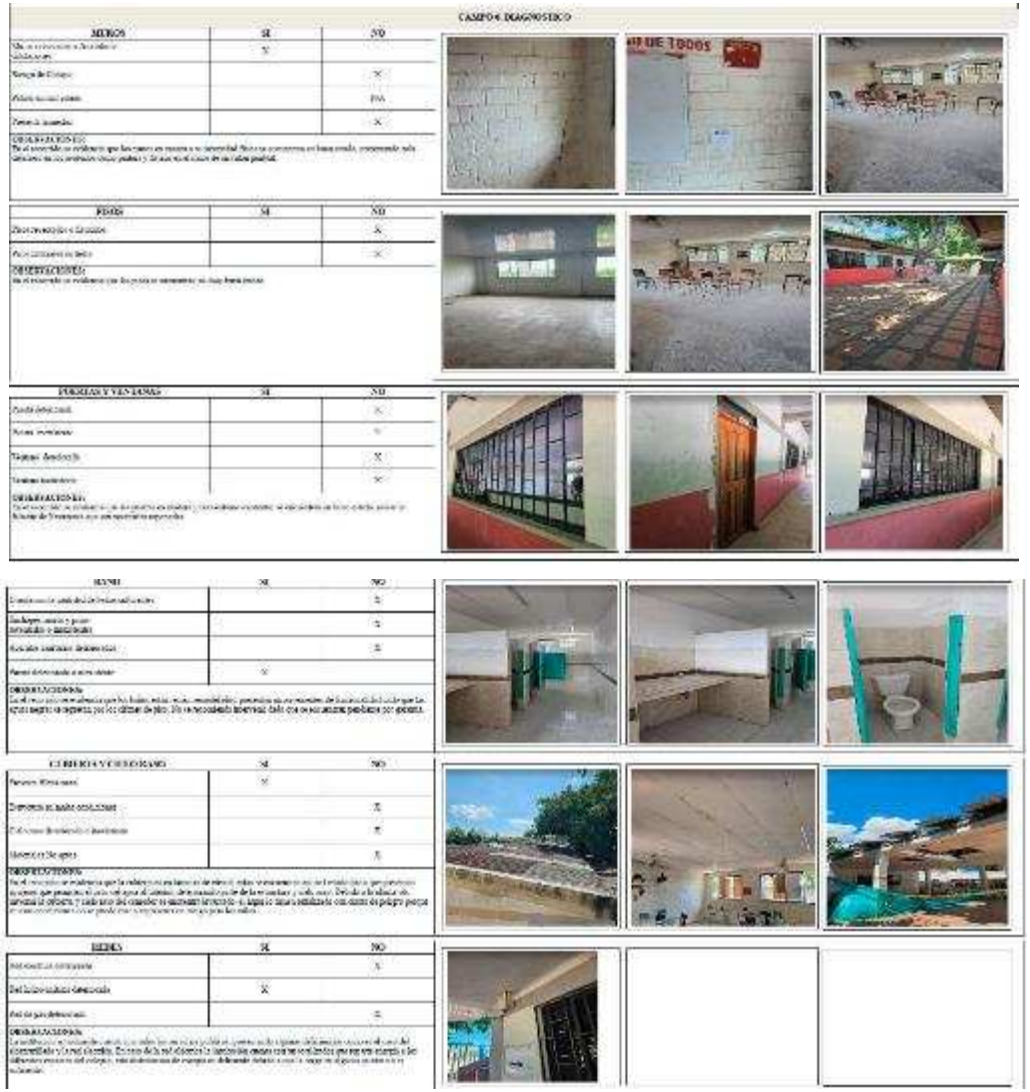


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

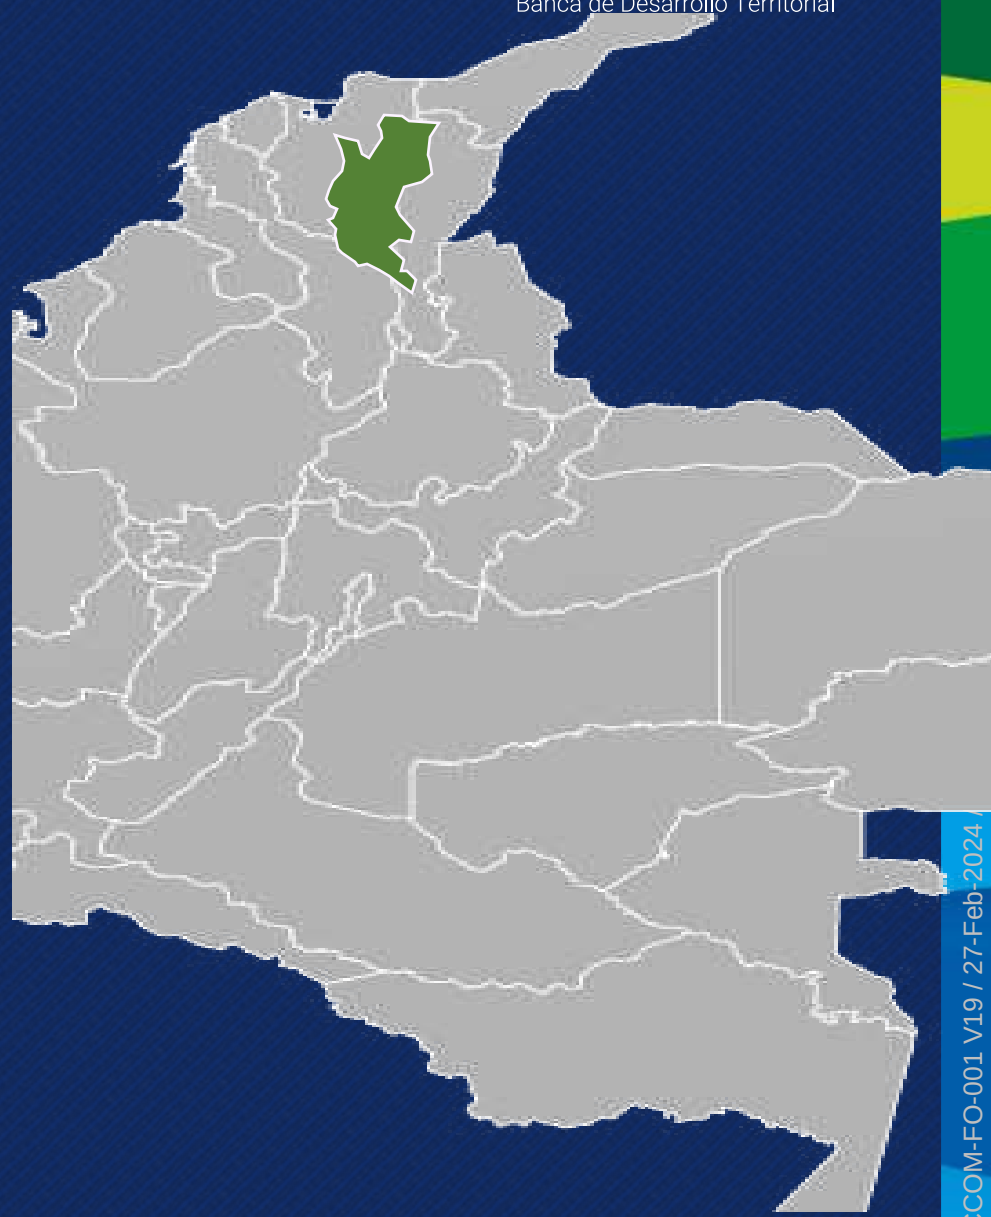

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 7 al 14 de abril de 2024 (Terminación 12/04/2024).

Avance general Componente I: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede Componente II: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

- **ID112 IE. RIOS VALLE, El Retén (Bachillerato):** Entregado 29/04/2024, terminadas 11 aulas mejoramientos (pintura, pisos baldosa, eléctrica y carpintería metálica) y 9 aulas nuevas en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto, instalada y cableado en ejecución) + baterías sanitarias + circulaciones cubiertas en concreto.
- **ID156 IE. GREGORIO GARZÓN, El Retén (Primaria):** Entregado 29/04/2024, terminadas 7 mejoramientos de aulas (pintura, pisos, eléctrica y carpintería metálica) + baterías sanitarias + circulaciones cubiertas en concreto.
- **ID154 IE. ENOC MENDOZA, Ciénaga** Entregado 29/04/2024, terminadas 24 aulas mejoramientos, en ejecución de primera fase: 12 aulas mejoramientos entregada y en funcionamiento, segunda fase: 12 aulas mejoramientos en limpieza con adecuaciones de cubierta y pañetes de protección) con reforzamiento estructural y pisos, lo anterior a Plan logístico con institución + circulaciones cubiertas en concreto.
- **ID126 IE. EL TRIUNFO, Puebloviejo:** Entregado 30/04/2024, terminadas 4 aulas mejoramientos, ejecutado (sistema de reforzamiento estructural y cubierta UPVC.
- **ID111 IE. CATAQUITA, Puebloviejo:** Entregado 30/04/2024, terminadas 2 aulas mejoramientos, ejecutado (sistema de reforzamiento estructural, en ejecución de (estructura de cubierta 100% instalada, montaje de cubierta UPVC.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID112. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE - COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE (BACHILLERATO)

Intervención Nuevas + Mejoramientos

- Matricula: 731
- Aulas Existentes: 28 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 18
- Aulas por demoler: 11
- **Aulas Nuevas: 9, nivel 30+**
- **Aulas Mejoramientos: 11**
- Aulas sin intervenir: 6
- Baterías requeridas: 29 (25est/1)
- **B. Nuevas: 11**
- Sistema Hidráulico propuesta, Se ejecutaría posterior (con diseños)


C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: 18/12/2023

Mejoramientos 11 Aulas:
- En acabados y limpieza.

Aulas nuevas 9 Aulas:
- En acabados y limpieza.

Baterías sanitarias nuevas 11:
- En acabados de (instalación de divisiones, aparatos, enchape y mesón en concreto y granito pulido)

Circulaciones cubiertas:
- En acabados y limpieza.

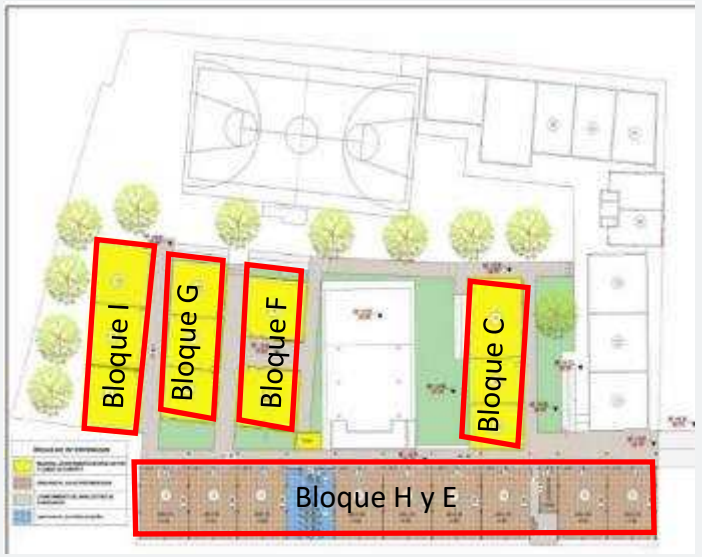






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID156. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE - SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON (PRIMARIA)

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 543
- Aulas Existentes: 18 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 6
- **Aulas Mejoramientos: 7**
- Baterías requeridas: 22 (25est/1)
- **B. Reemplazo 6 + B. Nuevas 9: 15 Baterías (faltarían 7 Baterías por falta de espacio)**
- Sistema Hidráulico propuesta, Se ejecutaría posterior (con diseños)

C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: 19/12/2023

Mejoramientos 7 Aulas:

- En acabados y limpieza.

Baterías sanitarias 15:

- En ejecución de: (pañete, instalación de divisiones, aparatos, enchape y mesón en concreto y granito pulido).

Circulaciones cubiertas:

- En acabados y limpieza.











Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID154. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 725
- Aulas Existentes: 24 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 32
- **Aulas Mejoramientos: 24**
- Baterías requeridas: 29 (25est/1)
- B. Nuevas: 0
- Sistema Hidráulico propuesta, Se ejecutaría posterior (con diseños



C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: 27/12/2023

Mejoramientos 24 Aulas:

Fase 1: Mejoramientos 12 Aulas: Inicia 27/12/2023

- Entregadas y en funcionamiento.

Fase 2: Mejoramientos 12 Aulas: Inicia 20/03/2024

- En ejecución de (adecuaciones de cubierta y pañetes de protección) con reforzamiento estructural y pisos) lo anterior a Plan logístico con institución.

Circulaciones cubiertas: En acabados y limpieza.











Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID126. INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM EL TRIUNFO

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 98
- Aulas Existentes: 4 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 3
- **Aulas Mejoramientos: 4**
- Baterías requeridas: 4 (25est/1)
- B. Nuevas: 0
- Sistema Hidráulico propuesta. N/A



C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: inicio 15/01/2024 por dificultades de acceso por orden público.

Mejoramientos 4 Aulas:

- En acabados y limpieza.







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID111. INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM ISLA DE CATAQUITA

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 115
- Aulas Existentes: 2 Promedio 29 estudiantes
- Baterías Existentes: 3
- **Aulas Mejoramientos: 2**
- Baterías requeridas: 5 (25est/1) (Faltarían 2 por espacio)
- B. Nuevas: 0
- Sistema Hidráulico propuesta. N/A



C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: inicio 15/01/2024 por dificultades de acceso por orden público.

Mejoramientos 2 Aulas:

- En acabados y limpieza.






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

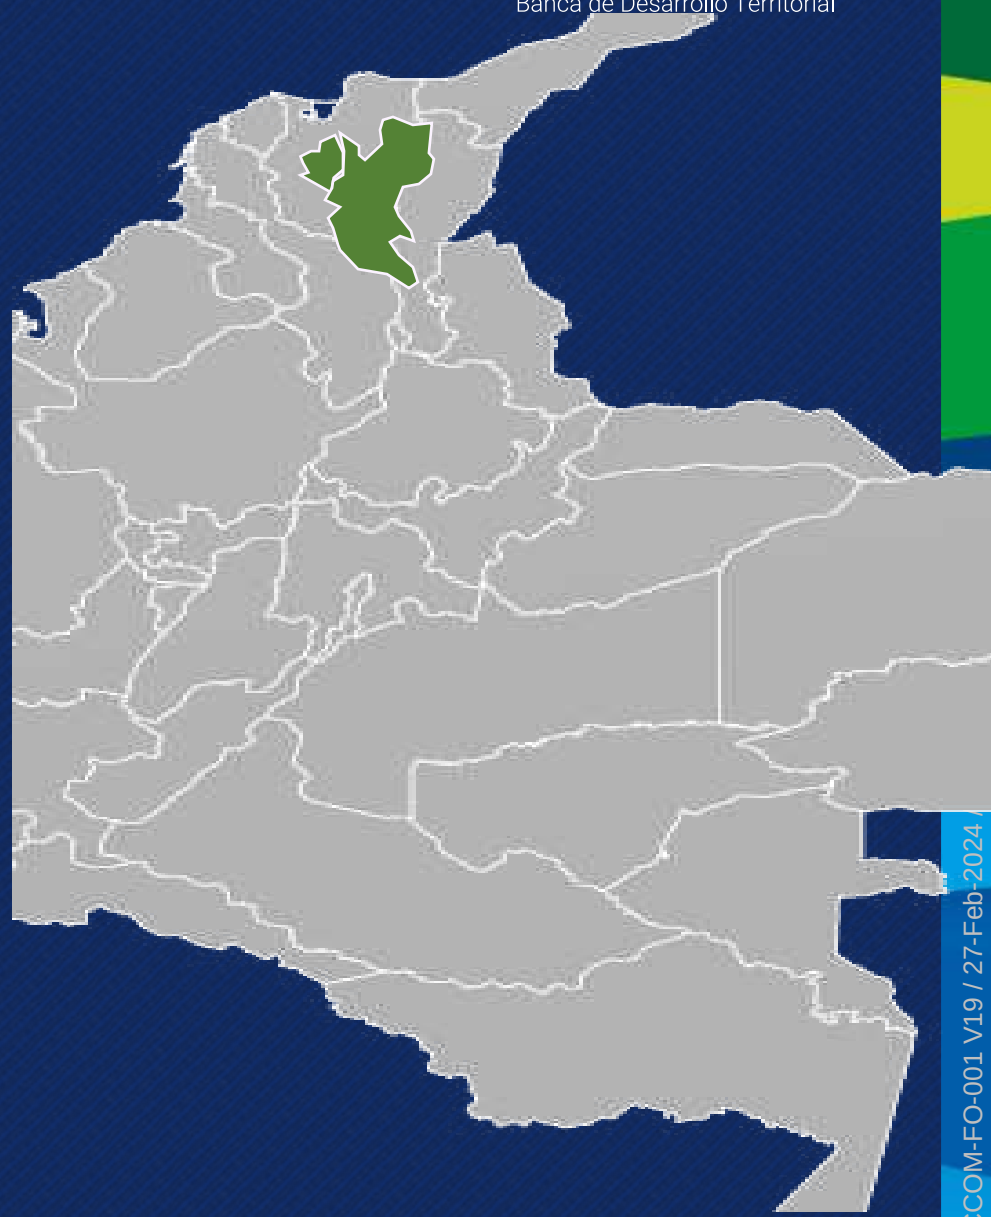

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

Se tramito Prorroga por el termino de 45 dias, con nueva fecha de terminacion: 23 de marzo 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA SEDE ERM LA PACHA

4 MEJORAMIENTOS 3 AULAS NUEVAS 8 MEJORAMIENTOS

INSTITUCIÓN	FECHA COMIENZO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	TIEMPO PRÓRROGA	FECHA TERMINACIÓN FINAL
TIERRAFIRME	22/12/2023	8/02/2024	45 días	23/03/2024
TACAMOCHITO	5/12/2023	8/02/2024	0 días	21/12/2023
LA PACHA	28/11/2023	8/02/2024	45 días	23/03/2024
SAN LUIS	26/01/2024	8/02/2024	0	7/02/2024
MARIA AUXILIADORA	3/01/2024	8/02/2024	45 días	23/03/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

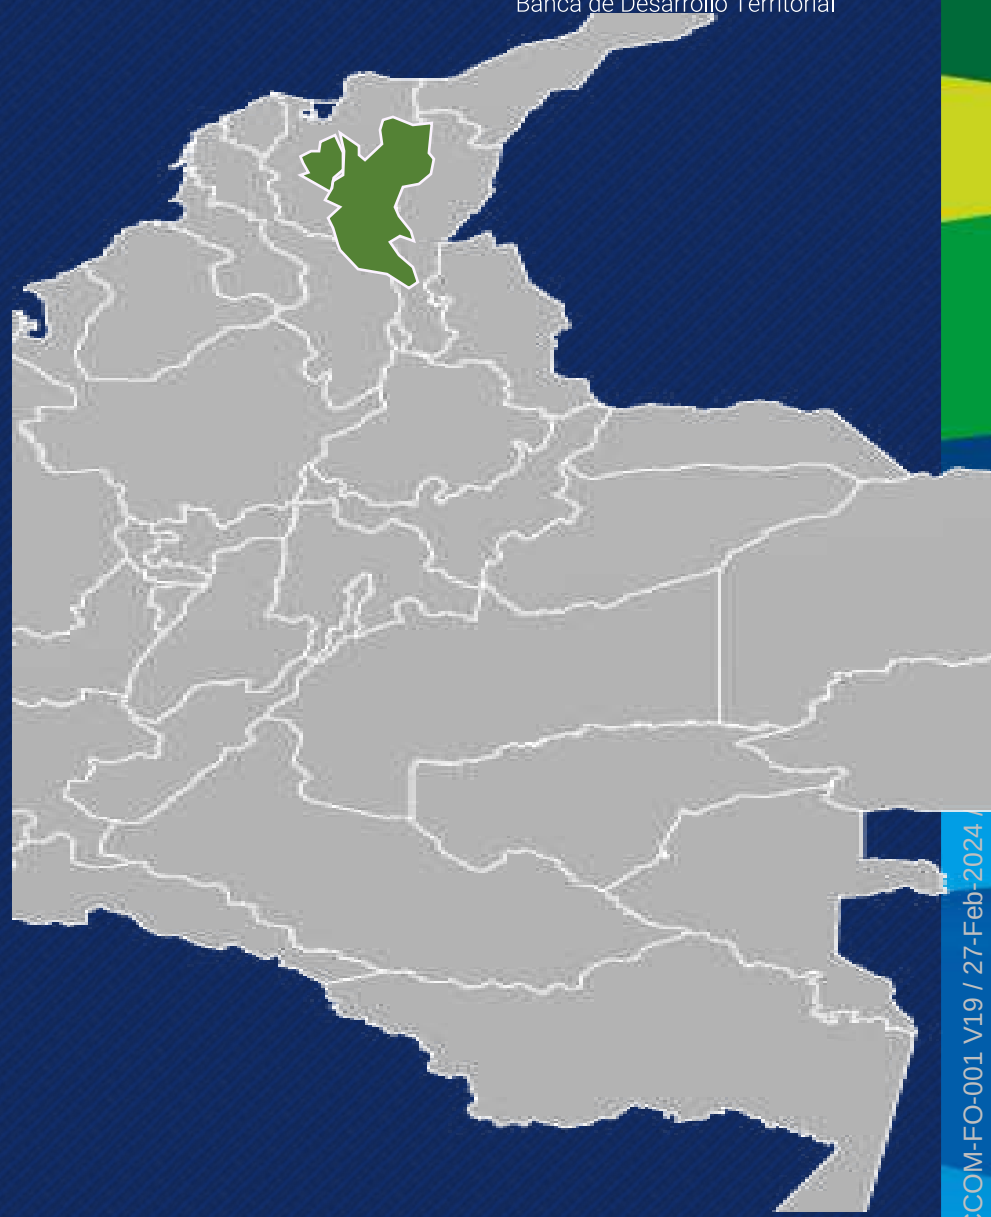

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 1 Departamentos
- 4 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.102.352.000 Inversión

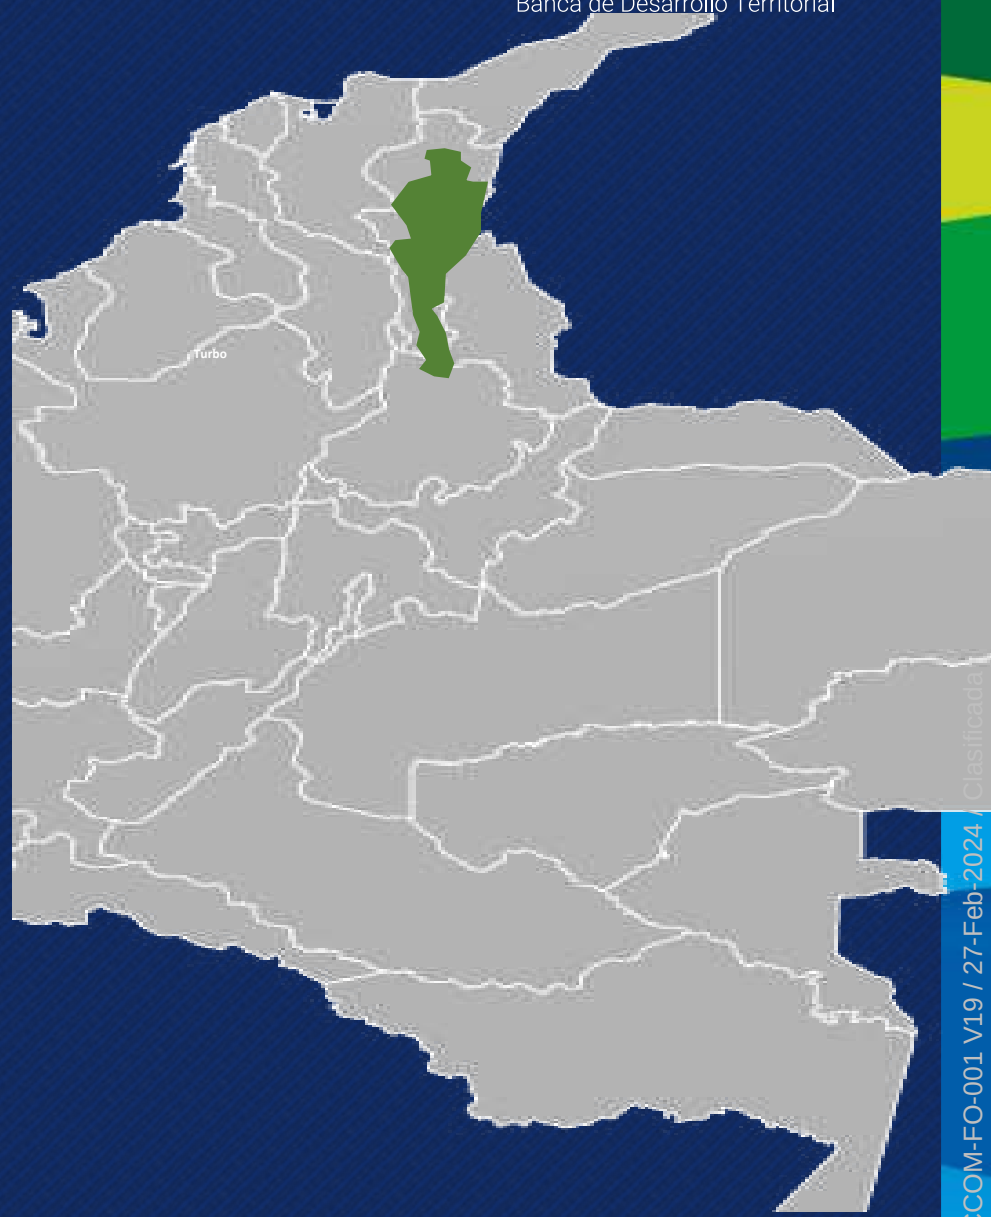

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	9	1	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

El contratista finalizó las entregas programadas de cada sede educativa.

Las entregas se realizaron en las siguientes fechas:

- ID No. 79 – 02/05/2024
- ID No. 45 – 04/05/2024
- ID No. 75 – 15/04/2024
- ID No. 74 – 10/05/2024
- ID No. 77 – 15/05/2024
- ID No. 4 – 16/05/2024
- ID No. 48 – 17/05/2024

Se realiza reunión el 24/05/2024 para verificación de documentación de:

- Información documental pendiente por entrega por parte del contratista y radicación en findeter
- Actas contractuales
- Pólizas
- Otrosíes
- Informe final

Esto con el fin de consolidar la información faltante e iniciar proceso de liquidación.

En la misma se verificaron los pendientes y se generaron compromisos de entregas de documentación para el cierre contractual.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		105 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	3	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Instalación de canales tipo amazonas. • Instalación de bajantes. • Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3. • Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1. • Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3. • Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3. • Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		15/04/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		65 estudiantes
ALCANCE		
Aulas nuevas	1	Aula prefabricada - Material WPC
Aulas mejoradas	1	* Cambio de cubierta * Cambio de red eléctrica
Baterías sanitarias	Mejoramiento	* Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes * Mantenimiento de carpintería metálica * Cambio de cubierta y red eléctrica * Suministro de tanque de agua potable 2000 L * Construcción de poza séptica con campos de infiltración.
FECHA DE ENTREGA		02/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

MUNICIPIO		La Paz (Robles)
POBLACIÓN BENEFICIADA		65 estudiantes
ALCANCE		
Aulas nuevas	1	• Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada. • Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		04/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		225 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	9	✓ 7 AULAS: • Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Instalación de canales tipo amazonas. • Instalación de bajantes. • Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6 • Reparación de muros con desprendimiento de pañetes. • Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6 • Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6. • Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6 ✓ 2 AULAS • Cambio de cubierta • Subida de nivel • Cambio de red eléctrica • Mejoramiento en muros y en carpintería metálica ✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE
Baterías sanitarias	SI	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas
FECHA DE ENTREGA		10/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		8 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	1	• Mantenimiento y limpieza de cubierta • Cambio de puerta de acceso principal • Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura.
Baterías sanitarias	SI	• Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada. • Instalación de sistema séptico. • Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable.
FECHA DE ENTREGA		15/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

MUNICIPIO		Valledupar
POBLACIÓN BENEFICIADA		385 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	11	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1. • Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5. • Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2. • Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 . En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2. • Desmonte de cielo raso. • Instalación de cielo raso en lamina PVC.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		16/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ

MUNICIPIO		Valledupar
POBLACIÓN BENEFICIADA		805 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	23	* Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas. * Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. * Instalación de canales tipo amazonas. * Instalación de bajantes. * Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		17/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

8
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3517 estudiantes.
- $ 5.945.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	Buenos Aires	0	6	6
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0
Bolivar	Maria La Baja	Institucion Educativa Técnica Agroindustrial De Flamenco	El Nispero	0	10	8

Avance General: Se realiza entrega técnica de 5 sedes ubicadas en los municipios de Cotorra, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano, María la Baja (Sede Buenos Aires).

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Ejecutada al 100%. Se proyecta su entrega el 06 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 14 de junio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 14 de junio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: En ejecución del componente 1 y componente 2. Se proyecta su entrega 08 de Agosto de 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Buenos Aires - María La Baja






Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







Sede Los Aguacates - Cotorra







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Los Cerros - Planeta Rica





Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Níspero-María La Baja













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

29
Proyectos

- 1 Departamento
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3297estudiantes.
- $ 6.342.475.368 Inversión

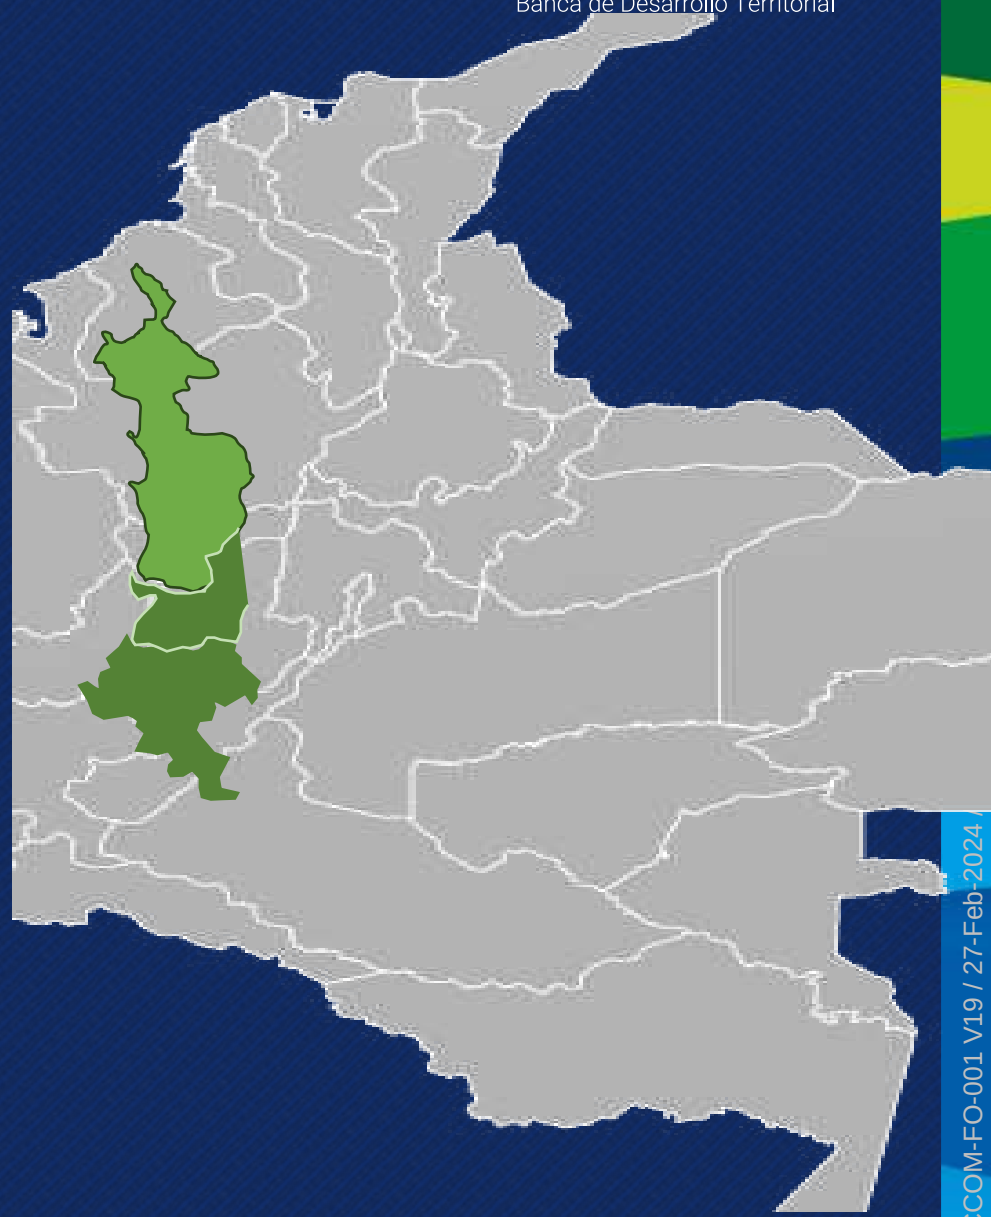

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN		
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM
CAUCA	TORIBIO	IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9	
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 12 al día 12 de mayo de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 40.19% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 15.76%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 24.43% de atraso frente a lo programado.
Se solicita a la interventoria y contratista de obra iniciar con la implementación del plan de contingencia con el ánimo de mitigar el atraso presente a la fecha e iniciar la etapa de obra en las sedes pendientes.

NOTAS:

1. Actualmente se tramito inicio del proceso de incumplimiento y aplicación cláusula de apremio con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales para cada proyecto.
2. Actualmente se evalúa el balance financiero y tiempos necesarios adicionar a los proyectos con el fin de dar cumplimiento a los diagnósticos aprobados teniendo en cuenta que a la fecha se tienen sedes en proceso de inicio debido a las diferentes variables presentadas a la fecha, por lo cual **se tramitara solicitud de aprobación de recursos por valor cercano a los $500.000.000 millones de pesos teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas y obras complementarias de contención requeridas para garantizar la estabilidad de las aulas en las sedes de Suarez Cauca**, así mismo, se evalúan los tiempos necesarios a tramitar en la **prórroga al contrato de obra e interventoria por un periodo que oscila entre los 4 a 5 meses teniendo en cuenta que se tienen sedes que no han sido iniciadas y el mismo acondicionamiento dado por los rectores para la ejecución de actividades, mayores tiempos que serán con atribución compartida a los proyectos y contratista de obra** debido a las demoras evidenciadas en las sedes que actualmente ya se encuentran en ejecución del componente 2. Cabe resaltar que dentro la evaluación adelantada para la prórroga a tramitar **los costos de los mayores tiempos de interventoria están cercanos a los $130.000.000 millones de pesos valor que está en proceso de revision**. Por lo anterior en la próxima semana se presentará la solicitud de modificatorios contratos de obra e interventoría en alcance a lo socializado en el presente comité de seguimiento.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra en proceso de terminación de los productos técnicos y entregas parciales a la interventoría que se encuentra en revisión y aprobación.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. **IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE PRINCIPAL – En proceso de inicio actividades de mantenimiento parcialmente por bloques en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora, se programa inicio actividades semana del 14 al 17 de mayo.**
2. **IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA. Se continua con actividades de mejoramientos sobre muros, cubiertas, pisos y excavaciones y figurado de aceros para cimentación aulas nuevas.**
3. **IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – se programarán actividades una vez se terminen las obras de mejoramiento sobre la sede principal y de esta forma reubicar los niños para intervenir obra, en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora.**
4. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA HONDA – Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta desmonte de cubierta asbesto y fibrocemento, reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete.**
5. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA PLANTA - Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta desmonte de cubierta asbesto y fibrocemento, reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete, demolición pañetes.**
6. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE SAN CRISTOBAL COLON – Se proyecta retomar la ejecución de actividades en la semana del 14 al 17 de mayo de 2024.**
7. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JHON F. KENNEDY - Desmonte de teja, desmonte de aparatos sanitarios, reparación de pañetes y pintura muros, mantenimiento estructura de cubierta, instalacion cubierta y caballete, mantenimiento de puertas metálicas.**
8. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO – Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.**
9. **IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE PRINCIPAL - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, cielos rasos, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, suministro de cubierta y mejoras eléctricas.**
10. **IE LA PLAYA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL – Se realiza socialización de inicio actividades el 7 de mayo y se proyecta iniciar actividades en la semana del 14 al 17 de mayo, con las gestiones adelantadas para autorización ingreso a la zona.**
11. **IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE DE SAN JOSE (HUACA) – Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 14 al 17 de mayo.**
12. **IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SIRENA DEL MAR - Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 14 al 17 de mayo.**
13. **IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SECUNDINO RIVAS - Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 14 al 17 de mayo.**
14. **IE DOMINGUILLO – SEDE PRINCIPAL - Se continúan actividades de explanación predio por parte de la alcaldía, pendiente de entrega predio para iniciar actividades, proceso que se proyecta iniciar en la semana del 14 al 17 de mayo.**
15. **IE DOMINGUILLO – SEDE DOMINGO LASSO - Se continua con el desmonte de cubiertas, mejoramiento de estructura metálica y suministró de estructura a reparar, cambio de cubierta, instalación sanitarios, entre otros.**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA. - ANTES






IE MARIA INMACULADA, SUÁREZ- DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (EJECUCIÓN – FECHA INICIO 12/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (EJECUCIÓN – FECHA INICIO 12/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (EJECUCIÓN – FECHA INICIO 12/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGO LASSO. - ANTES






IE DOMINGO LASSO, SANTADER DE QUILICHAO- DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGO LASSO- DURANTE (FECHA DE INICIO 09/04/2024)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. - ANTES









IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – DURANTE (FECHA DE INICIO 16/05/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – DURANTE
(FECHA DE INICIO 16/05/2024)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA-TORIBIO. - ANTES









IE LA PLAYA TORIBIO. – DURANTE (FECHA DE INICIO 27/05/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY - ANTES









IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL- ANTES





IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL- DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024)












CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA- ANTES





IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA- DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- ANTES







IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA- ANTES






IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.040.948.970 Inversión

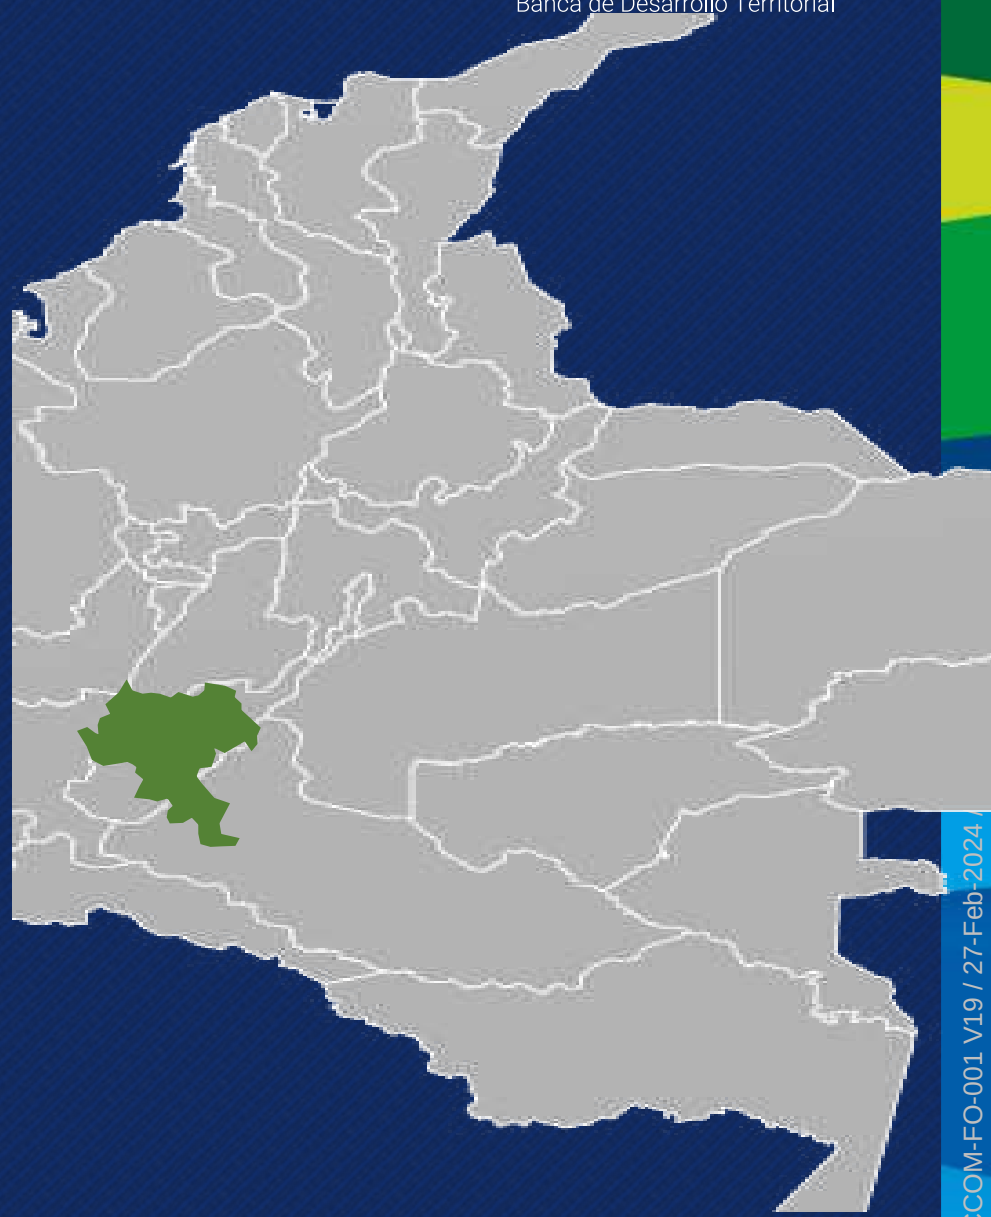

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	2	1
El Tambo	I.E. Huisito	Huisito (sede principal)	4	10	3
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	2
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	Según aplique
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	10	Según aplique
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	NA	2	1
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	7	3
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	1	Según aplique
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	7	Según aplique
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	4	Según aplique
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	11	Según aplique
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	19	Según aplique
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	NA	2	Según aplique
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	1	Según aplique
		El Altillo	NA	1	Según aplique
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	2	Según aplique
		El Retiro	NA	2	1
		Bellavista	NA	1	Según aplique

COMPONENTE 1

El 12 de febrero de 2024 inició la ejecución del componente 1 del contrato de obra. A la fecha se han adelantado las siguientes actividades:

- ✓ Visitas técnicas entre obra e interventoría a las 18 sedes educativas incluidas en el alcance del contrato.
- ✓ Consolidación de información de cada sede.
- ✓ Inicio de elaboración de diagnósticos, estudios, diseños, presupuestos y demás soportes de las sedes visitadas.

La fecha de terminación del componente 1 fue el 27 de marzo de 2024. Interventoría adelanta revisión de los productos derivados de este componente con el fin de dar visto bueno para el inicio de las obras en las sedes educativas restantes.

Se han adelantado socializaciones en las sedes educativas ubicadas en el municipio de Rosas, específicamente las adscritas a la IE Guillermo Leon Valencia (Sedes La Despensa y el Altillo), la IE Alfonso Córdoba (Sedes las Yerbas, El Retiro y Bellavista), IE Santa Teresita sede principal. En el municipio de Balboa se adelantaron socializaciones en las sedes Capitanes y Olaya.

COMPONENTE 2

Actualmente se adelanta ejecución en tres Instituciones: Sedes la Despensa y el Altillo de la IE Guillermo Leon Valencia, y en la IE Santa Teresita, sedes ubicadas en el municipio de Rosas. En la presente semana se prevé el inicio de las sedes restantes del municipio de Rosas.

Contratista e interventoría han manifestado condiciones particulares de orden público en algunas sedes educativas de este Grupo, al igual que afectaciones en vías a causa del invierno que han impedido el ingreso de materiales para el inicio de las obras.

Se analiza una posible prórroga a los contratos derivados.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial









Socialización de alcance de proyectos







Mejoramiento IE Santa Teresita - Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO







Mejoramientos IE Guillermo Leon Valencia
(Sede El Altillo)



Mejoramientos IE Guillermo Leon Valencia
(Sede La Despensa)

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

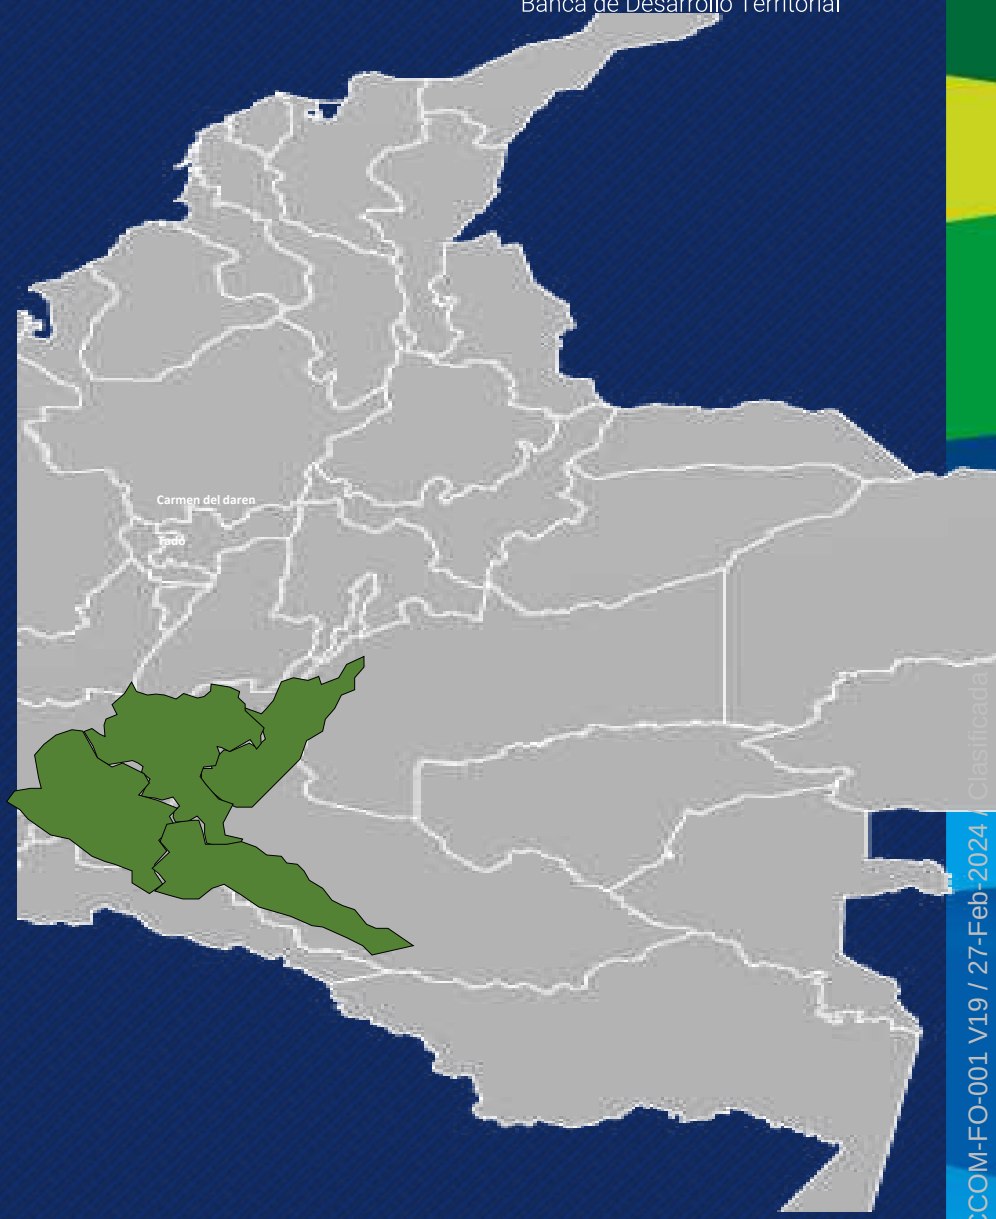

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.918.276.400 **I:** $318.105.088	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	**Progr**	33,37%	
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	29,65%	**Ejecut**	34,40%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	30,63%	En trámite de prórroga, modificación, aprobación NP obra e interventoria prórroga + adición		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	0
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	0
Cauca	Piamonte	Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	2	28	6
Cauca	Piamonte	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	1	1	2
Cauca	Piamonte	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	0
Huila	Acevedo	Institución Educativa Bateas	Bateas	0	3	8
Nariño	Pasto	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	7	0
Nariño	El Rosario	Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	7	0	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombon	0	2	2
Nariño	Ipiales	Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	0
Nariño	Mallama (Piedrancha)	Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	1	2
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	1	2
Putumayo	Pto Leguízamo	IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS		2	
Putumayo	Orito	Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	2
Putumayo	Puerto Asís	E. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	0

Avance General: En la semana del 26 al 2 de JUNIO de 2024.

Avance general Componente I: Terminado 04/04/2024, en proceso de entrega de productos (En trámite)

Avance general por Sede Componente II: Se inician 8 de 18, faltando 10 de inicio.

Se solicitará

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 1,59% Inicio 20/05/2024

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 93,76% Inicio 22/04/2024

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 36,42% Inicio 15/05/2024

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID41 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID57 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL PROGRESO: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE:0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON: 0% Inicio aproximado 10/06/2024

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024

ID125 Piamonte, PIAMONTE (sede principal): 0% Inicio 10/06/2024

ID127 Orito, ESC RUR MIX ALTO ORITO: 0% Inicio 10/06/2024

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 88,98% Inicio 05/04/2024

ID149 Mallama(Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024

ID172 Puerto Asís, SEDE PRINCIPAL: 0% Inicio 10/06/2024

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL: 0% Inicio 10/06/2024

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 15,74% Inicio 21/05/2024

Se solicitó prórroga para el contrato de obra por 3 meses, presentación de balance financiero, NPs y para la interventoría prórroga y adición, lo anterior, se presentó en Comité Técnico No. 54 y se encuentra en ejecución en Comité Fiduciario.

Se presentan dificultades en 3 instituciones de ID 41, 57 Y 172 con Rector dado que en sede principal quiere aulas nuevas y su matrícula no da para estas y no se encuentra de acuerdo con la implementación de sistemas constructivos alternativos. En ID125 no se ha podido conciliar Plan Logístico para entrega de aulas para inicio de trabajos con nuevo rector.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 1,59% Inicio 20/05/2024



REPELLO EN MUROS DE FACHADA DE GALPONES - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BODEGA - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



REPELLO EN MURO DE FACHADA LATERAL DE GALPONES - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BODEGA - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 36,42% Inicio 15/05/2024





MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA DE CUBIERTA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE LA ESPAÑOLA



APLICACIÓN DE ESTUCO -



INSTALACIÓN DE CUBIERTA BATERIAS SANITARIAS



MANTENIMIENTO DE PUNTOS HIDRÁULICOS

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024



ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 93,76% Inicio 22/04/2024



INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJANTES



MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, ELABORACIÓN DE MESÓN EN COCINA



INSTALACIÓN DE ESTRCUTRA Y CUBIERTA



INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN COCINA Y DUCHA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024




INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE FACHADAS





INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 88,98% Inicio 05/04/2024




INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE FACHADAS




FACHADAS Y MEJORMIENTOS DE PINTURA DE AULAS

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 15,74% Inicio 21/05/2024



Foto 1. DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 2. INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 3. DESMONTE DE CUBIERTA EN AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 4. RASAPADO DE PINTURA EN MUROS DE AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024




APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CANAL Y BAJANTES



MEJORAMIENTO DE ENCHAPE DE BATERIAS SANITARIAS – DUCHA NIÑOS



INSTALCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN AULA

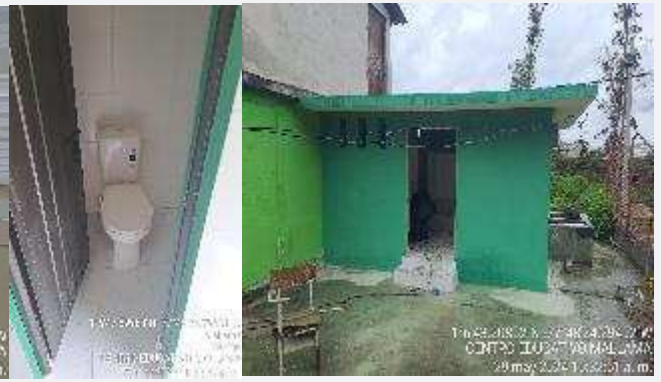

MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EXITENTE



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
PROYECTOS TERMINADOS
No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Junio 04 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

PROYECTOS TERMINADOS - Grupos 3, 4 y 6

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE
3	Magdalena	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
3	Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
3	Magdalena	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
3	Magdalena	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
3	Magdalena	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
4	Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
4	Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
4	Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
4	Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
4	Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
6	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
6	Cesar	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
6	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION

OLA INVERNAL - GRUPO 3, Departamento del Magdalena

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE BACHILLERATO - SEDE PRINCIPAL

MEJORAMIENTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO - SEDE ENOC MENDOZA RIAZCO

MEJORAMIENTO



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM EL TRIUNFO

MEJORAMIENTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE BACHILLERATO - SEDE PRINCIPAL

AULA NUEVA



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM ISLA DE CATAQUITA

MEJORAMIENTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE PRIMARIA - GREGORIO GARZÓN

MEJORAMIENTO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

OLA INVERNAL - GRUPO 4, Departamento de Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE DEPARTAMENTAL DE LA PACHA - SEDE ERM MARIA AUXILIADORA

AULA NUEVA



IE TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO – SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO

MEJORAMIENTO



IE DEPARTAMENTAL DE LA PACHA – SEDE ERM LA PACHA

AULA NUEVA



INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME – SEDE PRINCIPAL

AULA NUEVA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA– SEDE SAN LUIS

MEJORAMIENTO



IE DEPARTAMENTAL DE LA PACHA - SEDE ERM MARIA AUXILIADORA

AULA NUEVA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

OLA INVERNAL - GRUPO 6, Departamento de Cesar

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE EL VALLITO

MEJORAMIENTO



IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE LA ESTACION

AULA NUEVA



IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE LA ESPERANZA

MEJORAMIENTO





IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE SAN ANGEL

MEJORAMIENTOS – BAÑOS NUEVOS



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA - SEDE EL COSO

AULA MUEVA



IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL

MEJORAMIENTO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

JESUS ALBERTO CAÑAS PÁEZ

Gestor Convenio

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Junio 24 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado Contrataciones Grupos 9

NO.	GRUPO	CONVOCATORIA	ACTA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	PROPUESTAS	HABILITADOS	RECHAZADO	OBSERVACIONES	SIGUIENTE ACTIVIDAD/
3	Grupo 9	CONTRATACIÓN DIRECTA	N.A.	0	N.A.	N.A.	En espera de firma acta de inicio.	Firma de Acta de Inicio
4	Grupo 9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	N.A.	0	N.A.	N.A.	• Se realizó la declaratoria desierta de la convocatoria privada de interventoría. • Se realizó Comité de Contratación No. 110 para la convocatoria directa el 20/06/2024 • Estamos en proceso de apertura de comité técnico esta semana del 24 de junio.	N.A.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

139 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Estado Actual
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [74,96%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [57,28%] 27/11/2023 - 15/07/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [64,83%] 14/11/2023 - 29/06/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En Obra [0,00%] 31/05/2024 - 01/11/2024
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [93,45%] 08/11/2023 - 08/08/2024
G9 [15 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En legalización Obra. En proceso de contratación Interventoría
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [27,69%] 19/02/2023 - 11/10/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Obra [44,02%] 12/02/2023 - 12/08/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [40,88%] 20/02/2023 - 24/09/2024

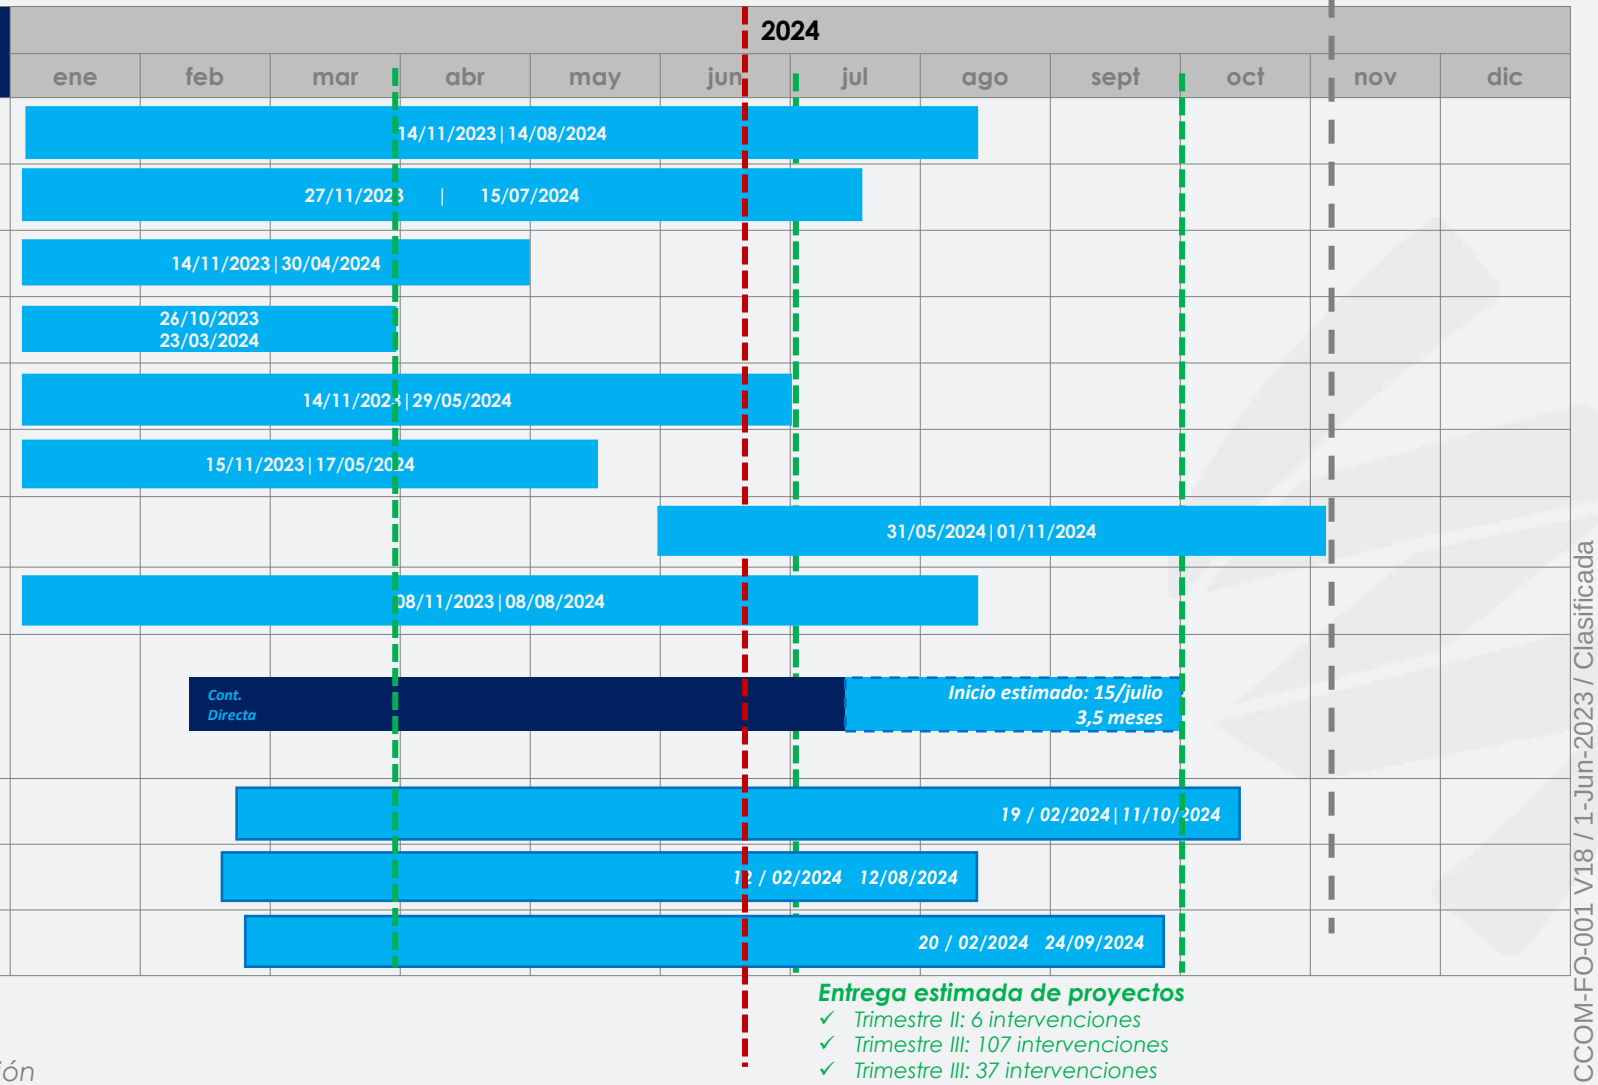

Entrega estimada de proyectos
- ✓ Trimestre II: 6 intervenciones
- ✓ Trimestre III: 107 intervenciones
- ✓ Trimestre III: 37 intervenciones
- * 8 sedes en validación jurídica

Convocatoria | Legalización | Ejecución

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

139
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2024									
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
Grupo 1	Antioquia I Chocó	En Obra [74,96%] 14/11/2023 - 14/08/2024							14/08			
Grupo 2	Atlántico	En Obra [57,28%] 27/11/2023 - 15/07/2024						15/07				
Grupo 3	Magdalena	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024			30/04							
Grupo 4	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024		23/03								
Grupo 5	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [64,83%] 14/11/2023 - 29/06/2024					29/06					
Grupo 6	Cesar	Entregado [100%] 15/11/2023 - 17/05/2024				17/05						
Grupo 7	Guajira	En Obra [0,00%] 31/05/2024 - 01/11/2024										01/11
Grupo 8	Córdoba | Bolívar	En Obra [93,45%] 08/11/2023 - 08/08/2024							08/08			
Grupo 9	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En legalización Obra. En proceso de contratación Interventoría								30/09		
Grupo 10	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [27,69%] 19/02/2023 - 11/10/2024									11/10	
Grupo 11	Cauca	En Obra [44,02%] 12/02/2023 - 12/08/2024							12/08			
Grupo 12	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [40,88%] 20/02/2023 - 24/09/2024								24/09		

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Balance del Contrato

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

	Obra		Interventoría		TOTAL
	Valor inicial	Valor adición	Valor inicial	Valor adición	
					$ 59.485.981.308,00
GRUPO 1	$ 3.447.332.358,95		$ 271.455.247,34	$ 25.183.769,00	$ 3.743.971.375,29
GRUPO 2	$ 4.044.124.630,00		$ 295.715.000,00		$ 4.339.839.630,00
GRUPO 3	$ 4.744.960.153,00	$ -	$ 351.774.412,00	$ 10.000.000,00	$ 5.106.734.565,00
GRUPO 4	$ 3.361.652.674,57		$ 279.439.929,28	$ 10.000.000,00	$ 3.651.092.603,85
GRUPO 5	$ 4.102.044.984,00		$ 300.856.990,00		$ 4.402.901.974,00
GRUPO 6	$ 2.102.352.000,00	$ 394.497.571,44	$ 155.543.411,00	$ 36.738.473,21	$ 2.689.131.455,65
GRUPO 7	$ 4.158.777.883,00		$ 295.239.000,00		$ 4.454.016.883,00
GRUPO 8	$ 4.706.470.280,00	$ 858.000.000,00	$ 297.097.668,00	$ 49.106.877,00	$ 5.910.674.825,00
GRUPO 9	$ 4.810.476.306,00		$ 313.828.750,00		$ 5.124.305.056,00
GRUPO 10	$ 6.014.978.800,00		$ 327.496.568,00		$ 6.342.475.367,99
GRUPO 11	$ 4.728.021.810,00		$ 312.927.160,00		$ 5.040.948.970,00
GRUPO 12	$ 4.918.276.400,00		$ 318.105.088,00		$ 5.236.381.488,00
				SUBTOTAL (1)	**$ 56.042.474.193,79**
				SUBTOTAL (2)	**$ 3.443.507.114,21**
				DOTACIÓN	$ 1.500.000.000,00
				VISITAS	$ 84.371.774,00
				TOTAL (Remanente 1)	**$ 1.859.135.340,21**
				Alcances adicionales:	
				Sede Banco Magdalena	$ 284.875.000,00
				Adición La Chinela y Tronconal	$ 150.000.000,00
				Sedes El Nispero (María La Baja)	$ 657.000.000,00
				IE Demetrio Salazar (Tadó)	$ 201.152.963,00
				Mayores Cantidades Suarez (Inmaculada)	$ 500.000.000,00
				TOTAL (Remanente 2)	**$ 66.107.377,21**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado de Proceso de Contratación de Dotación

Se está a la espera en Contratación Derivada de los Estudios Previos por parte de la Vicepresidencia Técnica., para posterior a esto solicitar el CDR.

Posterior a se espera publicar los documentos para el viernes 17 de mayo de 2024 para el inicio del proceso de contratación con los oferentes interesados.

Para la interventoría se está en revisión la parte social después de la aprobación del área jurídica y técnica. Se proyecta publicación para el próximo viernes 24 de mayo de 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Junio 24 de 2024



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

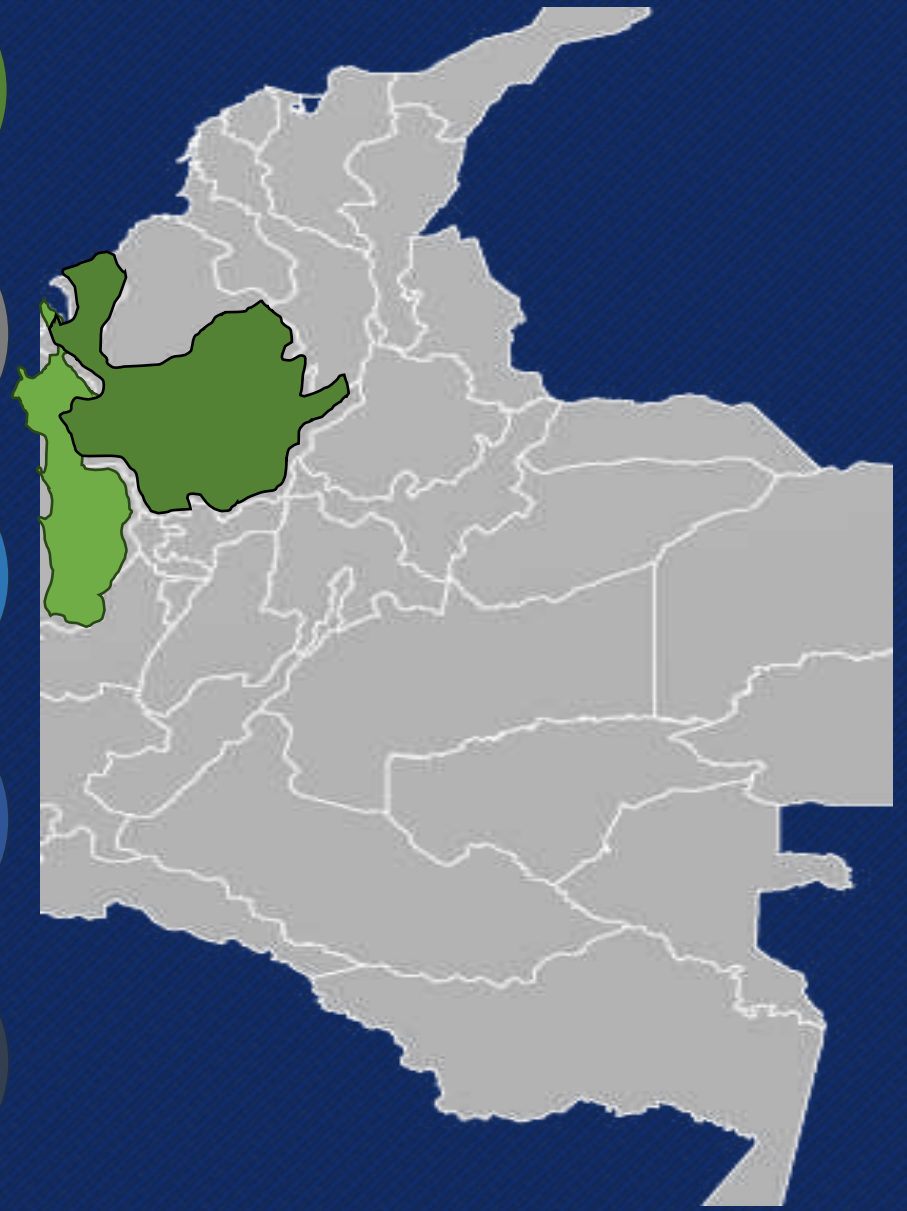

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ	27/2/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ	21/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4		14/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ	20/5/2024
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ	30/5/2024
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		6	3 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

75,30%
Porcentaje Programado

74,96%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 31 al día 16 de junio de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 75.30% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 74.96%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 0.34% de atraso frente a lo programado.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra aprobado y recibido a satisfacción por la interventoria.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. I.E PUEBLO NUEVO: se realiza construcción cimentación en concreto, pedestales palafito y construcción placa contrapiso y vigas de amarre en concreto, adicional se registra llegada de estructura aulas y baterías sanitarias a obra y se procede a iniciar su armado.
2. IE. DEMETRIO SALAZAR: Continúan las actividades de: Demoliciones de mampostería y superficies de pisos, Conformación de zapatas en concreto de 21MPA, Figuración de acero y fundida de columnas, cambio de estructura y cubiertas aulas.
3. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, así mismo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de mayo del 2024 y suscripción AEP&SC
4. IE CHURIDO PUEBLO: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, cabe aclarar qué, el rector de la I.E previamente manifestó no querer hacer parte del proceso, por lo que designó a la secretaría de educación para los fines pertinentes. Se realiza instalación de la placa el 17 de mayo del 2024. y suscripción AEP&SC
5. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Se culminan actividades de intervención general aula nueva, mejoramientos de aulas y baterías sanitarias, entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se entregaron el 14 de mayo, Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024, y suscripción AEP&SC
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalacion placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 14 de marzo del 2024 y suscripción AEP&SC
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024. Se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones
  Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT
  2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630
  Inversión

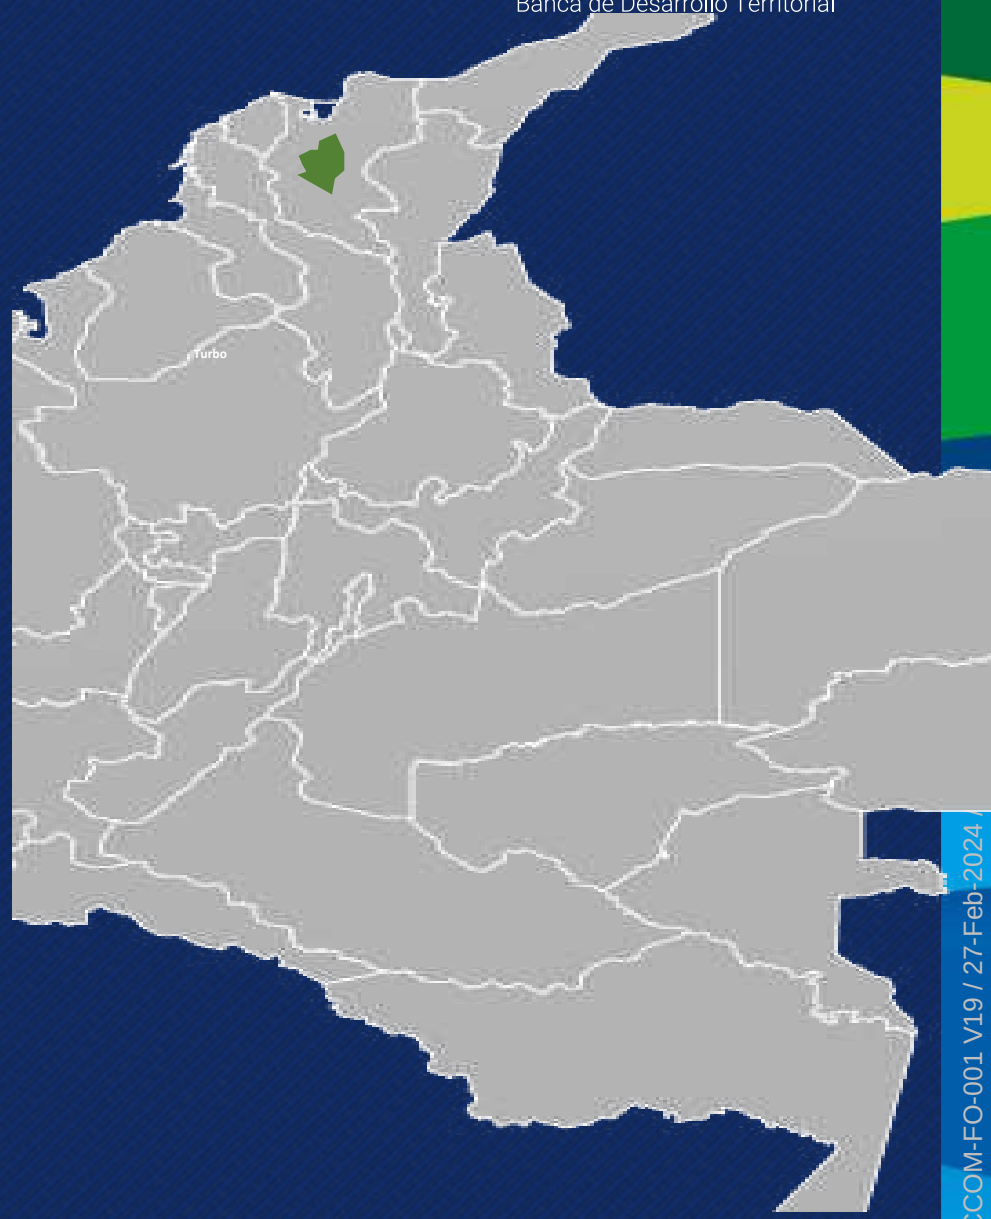

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
	C1	C1	C2	C2			
O: $4.044.124.630 I: $295.715.000	27-nov-23	11-ene-24	19-feb-2024	13-mar-24	**Programado**	35.35%	-16.39%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	93.46%	**Programado**	31.25%	**Ejecutado**	19%	
	Ejecutado	75.52%	Ejecutado	75.52%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ID MEN
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	2	NA	2	92
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3	NA	1	192
	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA	NA	12	EN CASO DE QUE APLIQUE	64
	Palmar de Varela	IE TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	NA	9	EN CASO DE QUE APLIQUE	91
	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL	NA	8	EN CASO DE QUE APLIQUE	83
		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	NA	5	8	84
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	IE JOSEFA DONADO	NA	16	EN CASO DE QUE APLIQUE	18
		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	NA	22	EN CASO DE QUE APLIQUE	144
	Luruaco	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NA	6	EN CASO DE QUE APLIQUE	191

Avance General: Se encuentra en ejecución en todas las sedes

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 42.055.385,00	$ 601.864.213,07	100,00%	100,00%	-10,85%	-24,32%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 37.492.375,73	$ 455.469.833,69	89,15%	75,68%		

ID 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 39.426.924,00	$ 401.446.955,45	100,00%	71,46%	-13,30%	-12,20%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 34.183.143,11	$ 332.897.740,00	86,70%	59,26%		

ID 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelon

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 21.027.693,00	$ 183.454.054,19	100,00%	93,76%	-11,55%	-23,84%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 18.595.994,46	$ 136.807.364,03	88,45%	69,92%		

ID 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelon

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 14.496.931,00	$ 329.499.981,12	100,00%	100,00%	-10,85%	-21,77%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 12.924.013,99	$ 257.763.412,27	89,15%	78,23%		

ID 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelon

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 13.946.458,00	$ 90.828.407,10	100,00%	43,45%	-12,00%	-3,12%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 12.272.883,04	$ 84.310.866,76	88,00%	40,33%		

ID 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE - Soledad

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 57.826.155,00	$ 397.461.823,23	100,00%	51,94%	-23,25%	-17,36%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 44.381.573,96	$ 264.606.749,43	76,75%	34,58%		

ID 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 23.528.804,00	$ 304.120.901,57	100,00%	44,86%	-11,45%	-2,98%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 20.834.755,94	$ 283.936.180,23	88,55%	41,88%		

ID 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 18.399.231,00	$ 210.108.285,91	100,00%	65,04%	-59,80%	-28,42%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 7.396.862,00	$ 118.292.742,46	40,20%	36,62%		

COMPONENTES- COMPILADOS

No.	INDICADORES	VALORES COMP I	VALORES COMP II	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP I	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR COMP II	DIFERENCIA (+) ADELANTO	DIFERENCIA (+)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 230.707.581,00	$ 2.518.784.621,64	87,53%	66,62%	-16,17%	-15,47%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoria.	$ 188.084.602,23	$ 1.934.084.888,88	71,36%	51,16%		

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS – SEDE PITA




IE JOSEFA DONADO – SEDE CABICA




IE MARIA AUXILIADORA – SEDE IE MARIA AUXILIADORA




IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS – SEDE PRINCIPAL




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA - SEDE LA LOMA




IE JOSEFA DONADO – SEDE IE JOSEFA DONADO





IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – SEDE IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

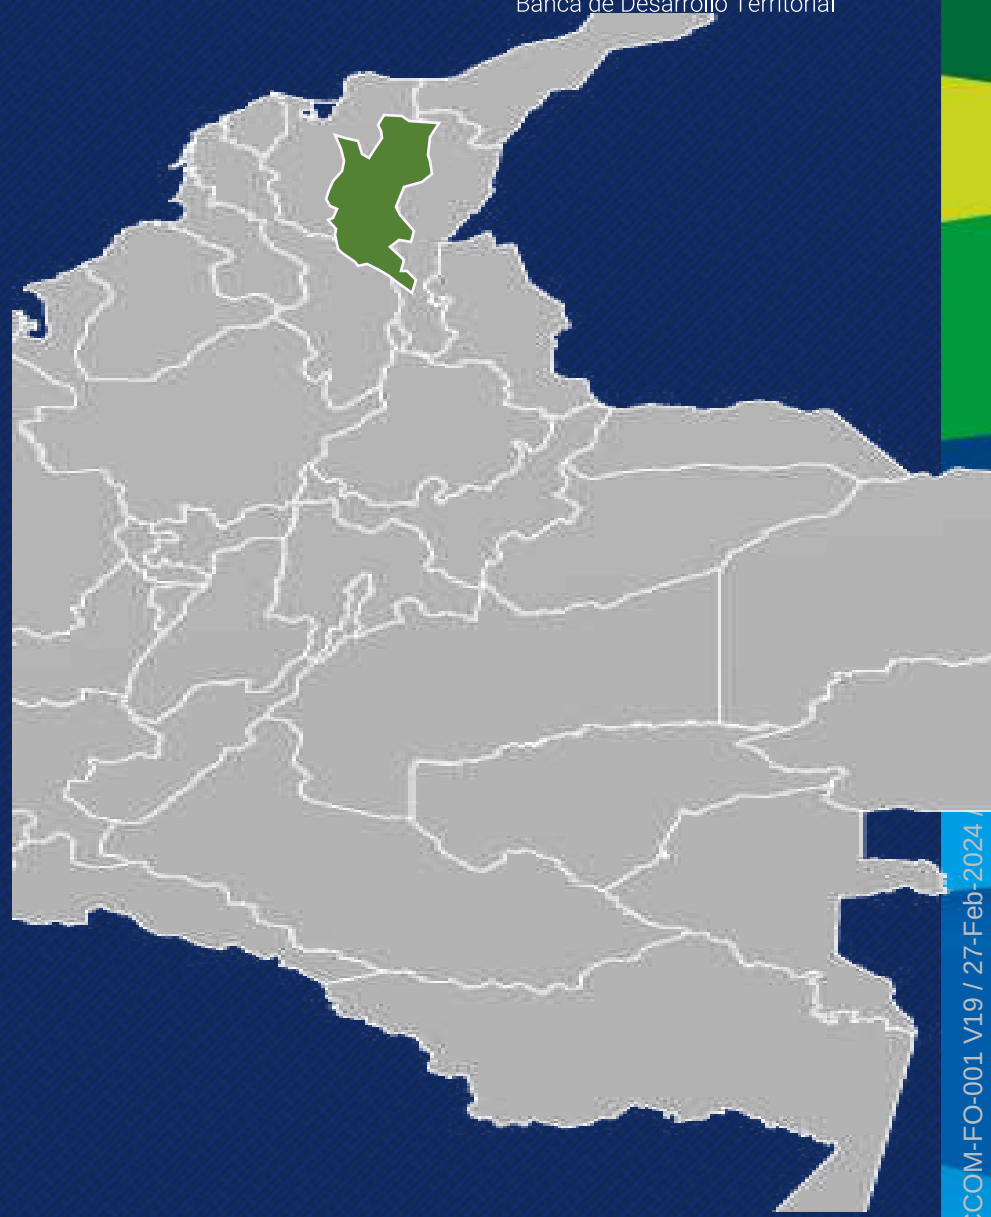

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
5.096.734.565	14-nov-23	28-dic-24	18-dic-23	12-abr-24	**Programado**	100,00%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**Entregadas entre 29 y 30 de abril de 2024**		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 16 al 23 de junio de 2024
Avance general Componente I: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede Componente II: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

Se encuentra en proceso de liquidación de obra e interventoría

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

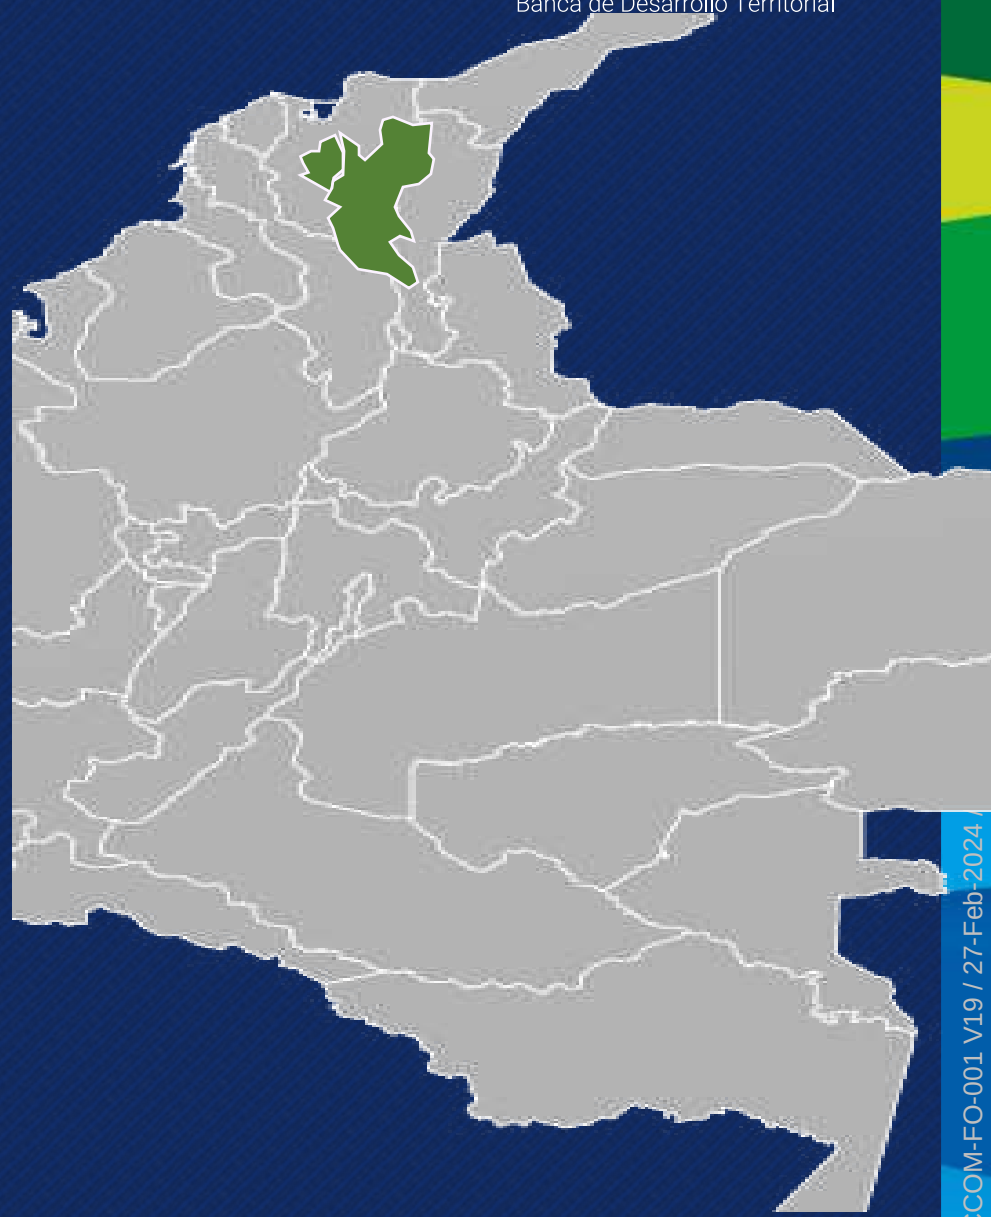

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO Proyectada C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4.744.960.153	24/10/2023	08-12-2023	08-12-2023	07-02-2024	**Programado**	100%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

En proceso de liquidación de obra e interventoría

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

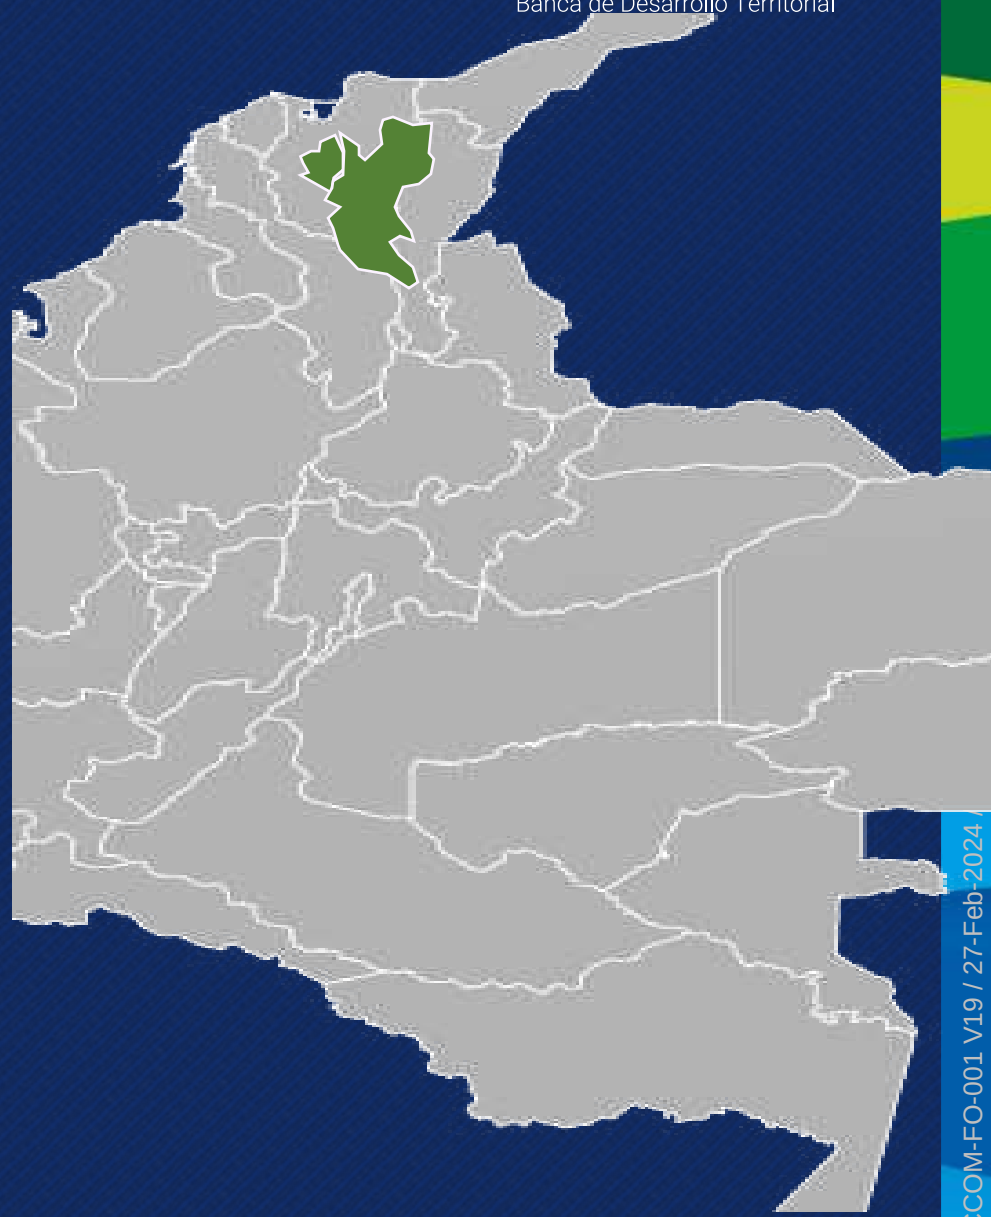

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4,102,044,984	14-Nov-23	29-Dic-23	16-Nov-23	29-Febrero-24	Programado	85.54%	-20,71%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	87,69%	Ejecutado	64.83%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	65,36%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

Avance General: Se encuentra en trámite de prorroga y adición en el comité técnico No. 55.

Prorroga 2 meses obra e interventoría
Adición Obra: $704.289.454
Adición interventoría: $69.224.091,43

Se realizará apertura de comité fiduciario el 25 de junio del 2024

ID MEN	INSTITUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO (-) / AVANCE (+)
30	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Principal	100,00%	99,80%	-0,20%
97	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Chinela	98,22%	40,00%	-58,22%
98	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Guaimaral	96,64%	70,00%	-26,64%
101	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Los Serenos	100,00%	100,00%	0,00%
147	Centro Educativo El Pueblito - Sede Puerto La Estancia	48,09%	80,00%	31,91%
148	Centro Educativo El Pueblito - Sede Torrecilla	100,00%	80,00%	-20,00%
146	Centro Educativo El Pueblito - Sede Tronconal	100,00%	45,00%	-55,00%
13	I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Primaria	55,04%	40,00%	-15,04%
14	I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Jardin Infantil	59,63%	0,00%	-59,63%
6	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal	100,00%	72,00%	-28,00%
10	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede El Cerrito	100,00%	40,00%	-60,00%
9	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede La Atascosa	93,17%	59,00%	-34,17%
43	I. E. Tec. Pesquera Leonidas Ortiz Alvear de Chimi - Sede Plan Bonito	87,62%	68,00%	-19,62%
32	I. E. Departamental Rural Silvia Cotes De Biswell - Sede La Islita	100,00%	100,00%	0,00%
133	I. E. Departamental Oscar Pisciotti Numa - Sede Inmaculada Concepción	100,00%	100,00%	0,00%
24	I. E. Departamental Antonio Nariño - Sede José Vanegas Ortiz	64,64%	52,00%	-12,64%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE PRINCIPAL (CURUMANI CESAR):



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE GUAIMARAL (CURUMANI CESAR):



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE SERRENOS (CURUMANI CESAR):



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA (CHIMICHAGUA CESAR):



INSTITUCION EDUCATIVA LEÓNIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMI - SEDE PLAN BONITO:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO - SEDE JOSÉ DE LA PAZ VANEGAS ORTIZ:



Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BÁLSAMO - SEDE ERM DE BÁLSAMO:





Avance General: Dificultades de orden público (grupos armados de la zona) en las SEDES 6, 9 y 10 municipio de Barranco de Loba – Bolivar, así:

ID6. I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal

ID9. I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede La Atascosa

ID10. I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede El Cerrito

Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.496.849.571,44 I: $200.301.842,00	15-nov-23	30-dic-23	30-nov-23	29-abr-2024	**Programado**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**En entregas de sedes educativas.**		

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	9	1	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

El contratista finalizó las entregas programadas de cada sede educativa.

Las entregas se realizaron en las siguientes fechas:

- ID No. 79 – 02/05/2024
- ID No. 45 – 04/05/2024
- ID No. 75 – 15/04/2024
- ID No. 74 – 10/05/2024
- ID No. 77 – 15/05/2024
- ID No. 4 – 16/05/2024
- ID No. 48 – 17/05/2024

Se encuentra en recopilación de documentación para realizar el trámite de liquidación.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

13
Proyectos

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT
  2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.158.777.879 I: $295.239.000	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/09/2024	Progr	4.44%	-0.31%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	62,19%	Programado	0,00%	Ejecut	4.13%	
	Ejecutado	57,80%	Ejecutado	0,00%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	KASICHE	1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN KASPOLIMANA	1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA	ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	1	3	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA CAMPANA	0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	WAYUUMAANA	0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA ESTRELLA	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN PRINCIPAL	1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	COOPERATIVO	0	6	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	JOSÉ ANTONIO GALÁN	0	2	12
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	APUNIMAANA1	0	6	1
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	WAKUAPAMANA	0	3	6

Avance General: En la semana del 10 junio al 16 de junio de 2024.
Avance general Componente I: -4.39%
Avance general por Sede Componente II: 0%

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 0%
ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 0%
ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 0%
ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 0%
ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 0%
ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 0%
ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 0%
ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 0%
ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 0%
ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 0%
ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 0%
ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 0%
ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 0%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

9
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$6.161.470.280 **I:** $441.204.280	08/11/2023	23/12/2023	24/12/2023	08/07/2024	**Progr**	94,25%	-0,80%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	93,98%	**Ejecut**	93,45%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	93,14%			

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	Buenos Aires	0	6	6
Bolívar	María la Baja	Técnica Agroindustrial de Flamenco	Níspero	0	8	8
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0

Avance General: Se realiza entrega técnica de 6 sedes ubicadas en los municipios de Cotorra, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano, María la Baja (Sede Buenos Aires).

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Entrega técnica el 14 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 05 de julio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 05 de julio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: En ejecución del componente 1 y componente 2. Se proyecta su entrega 08 de Agosto de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Buenos Aires - María La Baja






Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







Sede Los Aguacates - Cotorra







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Los Cerros - Planeta Rica





Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Níspero-María La Baja

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial














Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 6.753.158.527,2 Inversión - MEN

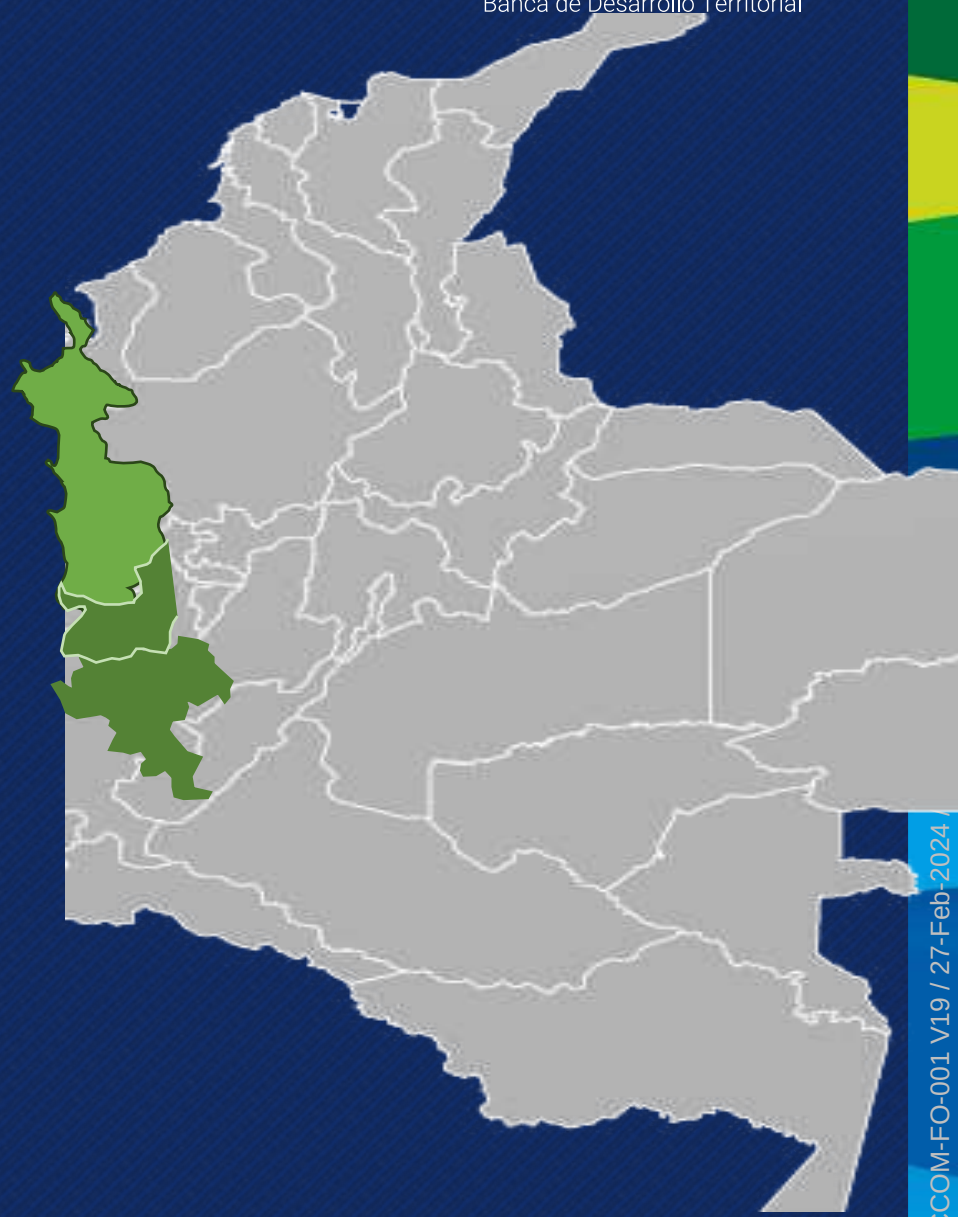

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	TORIBIO	IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	3/11/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/7/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	3/11/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	3/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	30/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	30/10/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	30/9/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

35,25%
Porcentaje Programado

27,69%
Porcentaje de avance

7,56%
Porcentaje de atraso

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 17 al día 16 de junio de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 35.25% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 27.69%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 7.56% de atraso frente a lo programado.

Se solicita a la interventoria y contratista de obra iniciar con la implementación del plan de contingencia con el ánimo de mitigar el atraso presente a la fecha e iniciar la etapa de obra en las sedes pendientes.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra aprobado y recibido a satisfacción por la interventoria.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE PRINCIPAL – En ejecución de actividades de mantenimiento parcialmente por bloques en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora, la ejecución de actividades se ha visto afectadas debido a los temas de orden público que han obligado a suspender obras por varios días.
2. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA. Se continua con actividades de mejoramientos sobre muros, cubiertas, pisos y excavaciones y figurado de aceros para cimentación aulas nuevas, la ejecución de actividades se ha visto afectadas debido a los temas de orden público que han obligado a suspender obras por varios días.
3. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – se programarán actividades una vez se terminen las obras de mejoramiento sobre la sede principal y de esta forma reubicar los niños para intervenir obra, en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora.
4. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA HONDA – Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete.
5. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA PLANTA - Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete.
6. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE SAN CRISTOBAL COLON – Se proyecta retomar la ejecución de actividades el 24 de junio de 2024.
7. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JHON F. KENNEDY - Desmonte de teja, desmonte de aparatos sanitarios, reparación de pañetes y pintura muros, mantenimiento estructura de cubierta, instalacion cubierta y caballete, mantenimiento de puertas metálicas.
8. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO – Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.
9. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE PRINCIPAL - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, cielos rasos, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, suministro de cubierta y mejoras eléctricas.
10. IE LA PLAYA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL – Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, cielos rasos, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, suministro de cubierta UPVC y mejoras eléctricas. la ejecución de actividades se ha visto afectadas debido a los temas de orden público que han obligado a suspender obras por varios días.
11. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE DE SAN JOSE (HUACA) – Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 24 de junio, adicional el inicio de actividades se está viendo afectado por temas de orden público y exigencias de las AUC para la comunidad, proceso que se está atendiendo con mesas de negociación.
12. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SIRENA DEL MAR - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.
13. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SECUNDINO RIVAS - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.
14. IE DOMINGUILLO – SEDE DOMINGO LASSO - Obras de mejoramientos terminadas y se programa entrega al rector y secretaria de educación, en la semana del 24 al 28 de junio de 2024, y suscripción del AEP&SC.
15. IE DOMINGUILLO – SEDE PRINCIPAL - Se continúan pendiente de entrega predio para iniciar actividades por parte de la alcaldía, proceso que se proyecta iniciar en la semana del 24 al 28 de junio.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGO LASSO - EJECUTADO










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. - ANTES









IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – EJECUCIÓN









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – EJECUCIÓN










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA-TORIBIO. - ANTES









IE LA PLAYA TORIBIO. – EJECUCIÓN









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA TORIBIO. – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – EJECUCIÓN











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – EJECUCIÓN










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – EJECUCIÓN







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – EJECUCIÓN












CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – EJECUCIÓN



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – EJECUCIÓN







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA - EJECUCIÓN











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA - EJECUCIÓN











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA - EJECUCIÓN










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Sirena del mar ANTES**





**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Sirena del mar DURANTE
(FECHA DE INICIO 21/05/2024)**





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Sirena del mar ANTES





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Sirena del mar DESPUES
(FECHA DE INICIO 21/05/2024)







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA - Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas ANTES






INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA - Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas DURANTE Y DESPUES (FECHA DE INICIO 21/05/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas
ANTES DURANTE






INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas
DURANTE Y DESPUES (FECHA DE INICIO 21/05/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas
ANTES DURANTE





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas
DURANTE Y DESPUES (FECHA DE INICIO 21/05/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.040.948.970 Inversión



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.728.021.810 **I:** $ 312.927.160	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/07/2024	**Progr**	53,21%	-9,19%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	50,35%	**Ejecut**	44,02%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	40,60%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 N
El Tambo	I.E. Huisito	Huisito (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	12	8 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	15	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	19	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	2	2 M
		El Altillo	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	1	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

Componente 1 recibido a satisfacción por la interventoría.

COMPONENTE 2

Actualmente se adelanta ejecución de mejoramientos en 15 Instituciones:

- ✓ Sedes Santa Teresita, La Despensa, El Altillo, Las Yerbas, El Retiro, Bellavista y Madre Caridad Brader. (Municipio de Rosas)
- ✓ IE Santa Rita Sede Principal y Francisco Javier sede Garay. (Municipio de la Vega)
- ✓ IE Nuestra Señora de los Remedios, IE Nuestra Señora del Carmen, IE el Carmen sede principal. (Municipio de Bolívar)
- ✓ Sedes Capitanes y Olaya (Municipio de Balboa)
- ✓ IE Comuneros Sede Principal (Municipio de Popayán)

A la fecha la interventoría ha reportado el inicio de intervenciones en 15 sedes educativas (ID 44, ID 65, ID 183, ID 186, ID 182, ID 184, ID 187, ID 175, ID 46, ID 3, ID 165, ID 59, ID 178, ID 93, ID 163). En comités de seguimiento se solicitó iniciar intervención cuanto antes con las sedes pendientes, y de esta forma dar cumplimiento al alcance contractual en el plazo establecido.

Interventoría y supervisión han solicitado la implementación inmediata de contingencias para nivelar la programación. Contratista ha informado que algunos atrasos se deben a que las intervenciones no se pueden ejecutar simultáneamente al interior de algunas sedes, con el fin de evitar afectaciones en la formación.

Continúan presentándose condiciones particulares de orden público en el departamento del Cauca, al igual que afectaciones en vías a causa del invierno, específicamente para la sede Huisitó en el Tambo.

Interventoría remitió informe de apremio. Supervisión elaboró concepto revisado por la jefatura de contratación derivada, y remitió el 2 de mayo de 2024 solicitud de inicio del procedimiento de apremio a la contratante. Por su parte la contratante notificó a contratista y aseguradora el inicio del procedimiento el 14 de mayo de 2024.

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




Mejoramiento IE Santa Teresita - Rosas




Mejoramientos CE Buenos Aires (Sede Capitanes) - Balboa





Mejoramientos IE Olaya (Sede Principal) - Balboa




CE Guillermo Leon Valencia (Sede La Despensa) – Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




CE Guillermo Leon Valencia (Sede El Altillo) – Rosas




IE Alfonso Cordoba (Sede Las Yerbas) – Rosas




IE Alfonso Cordoba (Sede Bellavista) – Rosas




IE Santa Rita (Sede Principal) – La Vega

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO





IE Comuneros (Sede principal) – Popayán





IE Alfonso Cordoba (Sede el Retiro) – Rosas





IE Nuestra Señora de los Remedios – Bolívar







IE Huisitó – El Tambo (Afectaciones en la vía)

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

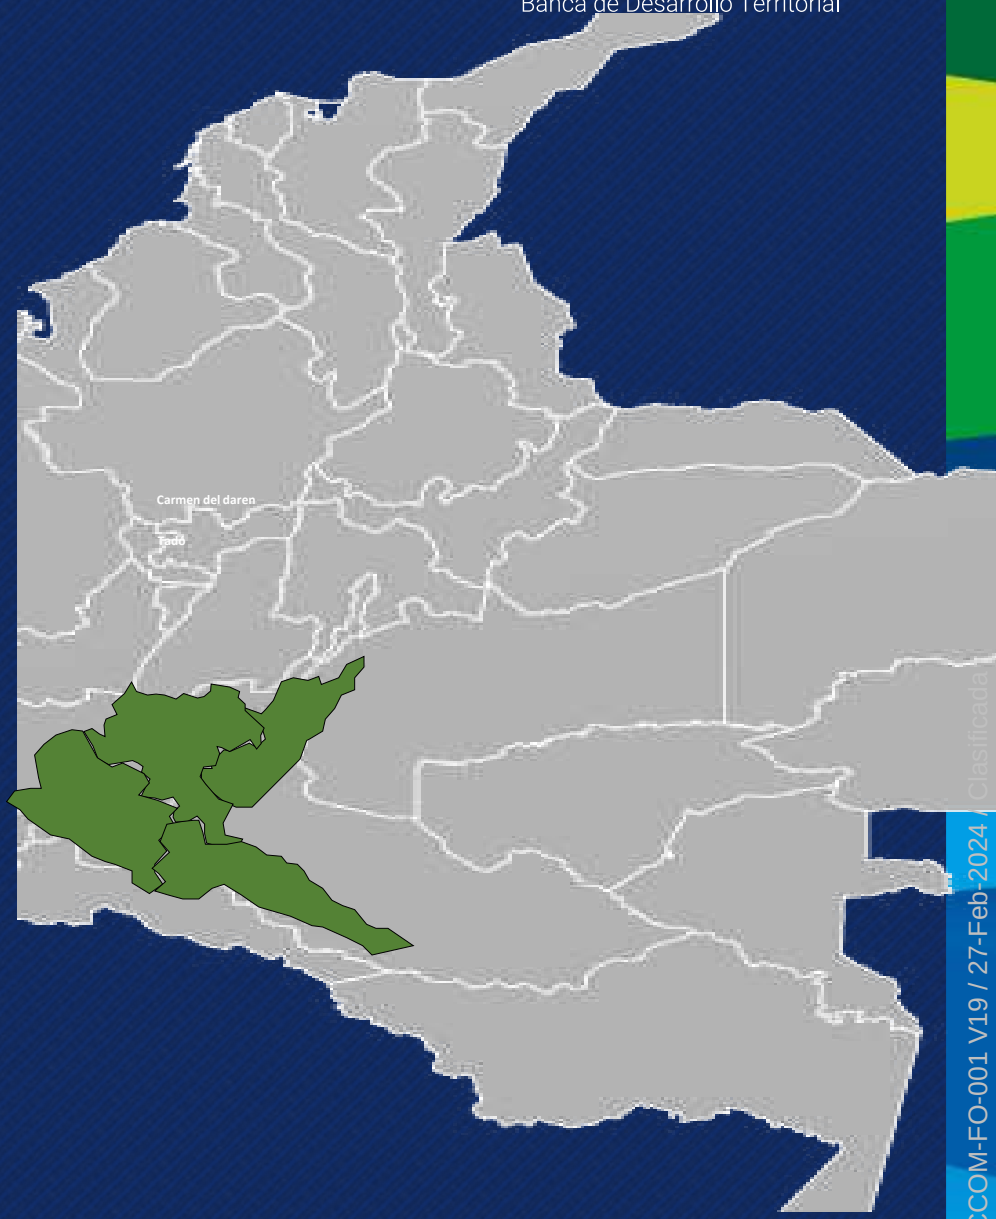

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.918.276.400 **I:** $318.105.088	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/09/2024	**Progr**	47,35%	
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	44,40%	**Ejecut**	40,88%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	37,50%	**En ejecución normal**		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	0
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	0
Cauca	Piamonte	Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	2	28	6
Cauca	Piamonte	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	1	1	2
Cauca	Piamonte	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	0
Huila	Acevedo	Institución Educativa Bateas	Bateas	0	3	8
Nariño	Pasto	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	7	0
Nariño	El Rosario	Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	7	0	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombon	0	2	2
Nariño	Ipiales	Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	0
Nariño	Mallama (Piedrancha)	Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	1	2
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	1	2
Putumayo	Pto Leguízamo	IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS		2	
Putumayo	Orito	Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	2
Putumayo	Puerto Asís	E. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	0

Avance General: En la semana del 16 al 23 de JUNIO de 2024.
Avance general Componente I: Terminado 04/04/2024 y recibido
Avance general por Sede Componente II: Se inician 10 de 18, faltando 8 de inicio.
Se solicitará

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 23,47% Inicio 20/05/2024
ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024
ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 100% Inicio 22/04/2024
ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 73,26% Inicio 15/05/2024
ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI: 0% Inicio aproximado 24/06/2024
ID41 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE: 0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID57 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL PROGRESO: 0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE:0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS: 25,41% Inicio 27/05/2024
ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON: 0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024
ID125 Piamonte, PIAMONTE (sede principal): 0% Inicio 25/06/2024
ID127 Orito, ESC RUR MIX ALTO ORITO: 0% Inicio 25/06/2024
ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 91,30% Inicio 05/04/2024
ID149 Mallama(Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024
ID172 Puerto Asís, SEDE PRINCIPAL: 0% Inicio 25/06/2024
ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL: 0% Inicio 17/06/2024
ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 61,53% Inicio 21/05/2024

Se presentan dificultades en 3 instituciones de ID 41, 57 Y 172 con Rector dado que en sede principal quiere aulas nuevas y su matrícula no da para estas y no se encuentra de acuerdo con la implementación de sistemas constructivos alternativos. Se solicita reunión para el 25/06/2024 de 9:00 am a 10:00 am

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 23,47% Inicio 20/05/2024



REPELLO EN MUROS DE FACHADA DE GALPONES - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BODEGA - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



REPELLO EN MURO DE FACHADA LATERAL DE GALPONES - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)



CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN BODEGA - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Nariño, Pasto)

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 73,26% Inicio 15/05/2024





MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA METÁLICA DE CUBIERTA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE LA ESPAÑOLA



APLICACIÓN DE ESTUCO -



INSTALACIÓN DE CUBIERTA BATERIAS SANITARIAS



MANTENIMIENTO DE PUNTOS HIDRÁULICOS

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024



ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 100% Inicio 22/04/2024



INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJANTES



MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, ELABORACIÓN DE MESÓN EN COCINA



INSTALACIÓN DE ESTRCUTRA Y CUBIERTA



INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN COCINA Y DUCHA

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024




INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE FACHADAS





INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 88,98% Inicio 05/04/2024




INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, MANTENIMIENTO DE FACHADAS




FACHADAS Y MEJORMIENTOS DE PINTURA DE AULAS

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 61,53 Inicio 21/05/2024



Foto 1. DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 2. INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 3. DESMONTE DE CUBIERTA EN AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)



Foto 4. RASAPADO DE PINTURA EN MUROS DE AULA - E.D.R PUERTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL (Cauca, Piamonte)

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024




APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CANAL Y BAJANTES



MEJORAMIENTO DE ENCHAPE DE BATERIAS SANITARIAS – DUCHA NIÑOS



INSTALCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN AULA

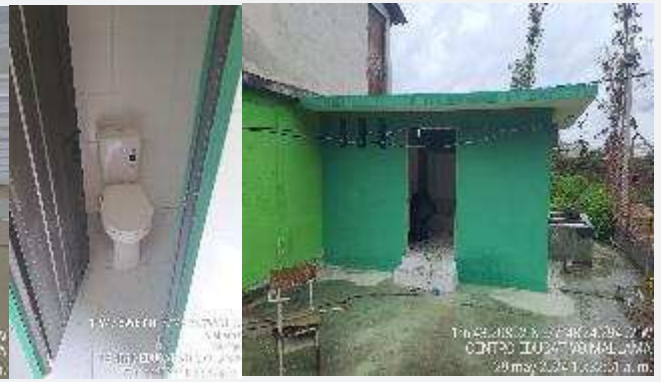

MEJORAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EXITENTE

Comité de seguimiento atención temporada lluvias MEN -FINDETER

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

1	**Grupo 11:** Se le informa al MEN el estado del Grupo 11, informando que Cauca esta difícil el acceso por orden público. MEN recomienda que tengamos presente las aulas, presupuesto y tiempos de la Sede de Huisitó, también recomienda que cada prorroga que realice Findeter debe ir con la matriz de riesgo.
2	**Grupo 1:** Se le informo al MEN que se encuentra en proceso de ejecución, asi mismo se informa que habra un comité para los items no imprevitos. MEN hace la recomiendación de seguir invitando a la secretaria municipal en todas las entregas de las intituciones educativas.
3	**Grupo 2:** Se le informa al MEN los avances del grupo y se le noticia que han tenido algunos retrasos por problemas de orden público. MEN recomienda que por calendario escolar se pueda avanzar lo suficiente mientras los estudiantes se encuentran en receso escolar.
4	**Grupo 3:** Se le informa al MEN que el grupo se encuentra en liquidación, en recopilación de la información.
5	**Grupo 4:** Se le informa al MEN que el grupo se encuentra en liquidación, en recopilación de la información.
6	**Grupo 5:** Se le informa al MEN avanzas transversales, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite de prorroga y adición y así mismo se le informa dificultades de acceso por orden público en Barranco de Loba - Bolívar.
7	**Grupo 6:** Se le informa al MEN que el grupo se encuentra en liquidación, en recopilación de la información.
8	**Grupo 7:**Se le informa al MEN que se encuentra en recopilación de documentos y visitas.
9	**Grupo 8:**Se le informa al MEN que se encuentra en ejecución, se le informa que se tuvo una reunión con la comunidad, donde quedaron temas muy claros sobre la intervención de las instituciones educativas.
10	**Grupo 9:**Se le informa al MEN se encuentra en proceso de apertura de convocatoria directa.
11	**Grupo 10:**Se le informa al MEN el avance general del grupo MEN recomienda que por calendario escolar se pueda avanzar lo suficiente mientras los estudiantes se encuentran en receso escolar.
12	**Grupo 12:**Se le informa al MEN el avance general del grupo MEN recomienda que por calendario escolar se pueda avanzar lo suficiente mientras los estudiantes se encuentran en receso escolar.

CCOM-FO-001 V18 // 1-Jun-2023 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Junio 25 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha: Abril 30 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23				$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 82.351.406,35	$ -		$ 82.351.406,35
sep-23	$ 108.927.246,74	$ -		$ 191.278.653,09
oct-23	$ 131.902.760,66	$ -		$ 323.181.413,75
nov-23	$ 144.907.033,92	$ -		$ 468.088.447,67
dic-23	$ 143.221.271,36	$ 468.088.448,00	13/12/2023	$ 143.221.271,03
ene-24	$ 133.626.379,48	$ 143.221.271,36	10/01/2024	$ 133.626.379,15
feb-24	$ 120.547.529,88	$ 133.626.379,15	12/02/2024	$ 120.547.529,88
mar-24	$ 117.745.976,50	$ 120.547.529,88	12/03/2024	$ 117.745.976,50
abr-24	$ 100.331.907,69	$ 117.745.976,50		$ 100.331.907,69
TOTALES	**$ 1.083.561.512,58**	**$ 983.229.604,89**		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23		$ -		$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 443.947.650,01	$ -		$ 443.947.650,01
sep-23	$ 548.880.836,71	$ -		$ 992.828.486,72
oct-23	$ 436.008.307,20	$ -		$ 1.428.836.793,92
nov-23	$ 718.224.229,49	$ -		$ 2.147.061.023,41
dic-23	$ 788.090.860,63	$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	$ 788.090.860,04
ene-24	$ 427.858.051,59	$ 788.090.860,63	10/01/2024	$ 427.858.051,00
feb-24	$ 474.970.095,24	$ 427.858.051,00	12/02/2024	$ 474.970.095,24
mar-24	$ 478.495.863,61	$ 474.970.095,24	12/03/2024	$ 478.495.863,61
abr-24	$ 259.736.382,70	$ 478.495.863,61		$ 259.736.382,70
TOTALES	**$ 4.576.212.277,18**	**$ 4.316.475.894,48**		
SALDO POR GIRAR	$ 360.068.290,39			

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

• Rendimientos Financieros – Soportes de giro

Marzo

Fecha Actual: 2024/03/14 | Hora: 09:31 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): KATHERIN PEREZ URUEÑA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	75516	PCK001RHQO	2024/03/12	$595,517,625.12	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/03/11	18:08:17	05:00:12	ANDRES FORERO PEREZ	2024/03/13	10:10:03	$595,517,625.12	$595,517,625.12

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	SERGIO ANDRES ARTETA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Cheques	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2024/03/12	$120,547,525.88	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado
500804650450	2024/03/12	$474,970,095.24	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado

Abril

Fecha Actual: 2024/04/12 | Hora: 09:59 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): KATHERIN PEREZ URUEÑA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	11028	PDJ001NBJO	2024/04/10	$596,241,840.11	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/04/10	14:02:10	14:05:05	CINDY JHANNYN CHIMB	2024/04/12	05:21:38	$596,241,840.11	$596,241,840.11

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	JORGE LADIES CIFUENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Cheques	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500804650450	2024/04/10	$117,745,976.50	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado
500804650450	2024/04/10	$478,495,863.61	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000008530053691	PAGOS		Procesado

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Febrero 29 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Febrero

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 1 COMPONENTE I	209.689.697,70
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	310.538.200,37
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	Acta 1 COMPONENTE II	29.496.399,66
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 1 COMPONENTE II	9.031.097,08
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 2 COMPONENTE II	9.031.097,08
Nacion	PAF-MENAM-I-055-2023	Acta 1 COMPONENTE I Y Acta 1 COMPONENTE II	137.217.699,90
Nacion	PAF-MENAM-O-056-2023	Acta 1 COMPONENTE I	147.798.000,00
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	1.109.127.985,92
Nacion Nacion	FINDETER - REMUNERACION	Hito No. 1	690.748.453,00
TOTAL MUNICIPIO			**$ 2.652.678.630,71**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Marzo 31 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Marzo

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 1 COMPONENTE I	255.931.622,10
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 1 COMPONENTE II OBRA	1.004.933.089,66
Nacion	PAF-MENAM-O-056-2023	Acta 1 COMPONENTE II	298.734.026,27
Nacion	PAF-MENAM-O-055-2023	Acta 1 COMPONENTE I	245.700.252,00
Nacion	PAF-MENAM-O-055-2023	Acta 1 COMPONENTE II	566.220.751,44
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 1 COMPONENTE I	49.678.199,10
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	Acta 2 COMPONENTE II	14.748.199,83
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	1.552.950.355,84
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	104.056.974,00
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 3 COMPONENTE II	15385359,95
Nacion	PAF-MENAM-I-054-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 1	106807150,8
TOTAL MUNICIPIO			**$ 4.215.145.980,99**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Abril 30 de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Abril

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 3 COMPONENTE II	15.385.359,95
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	50.103.395,23
Nacion	PAF-MENAM-I-056-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	76.557.757,50
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	695.774.071,55
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 3 COMPONENTE II SUMINISTROS	123.112.949,40
Nacion	PAF-MENAM-I-054-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	132.142.411,82
Nacion	PAF-MENAM-O-051-2023	Acta 3 COMPONENTE II OBRA	692.966.996,28
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	Acta 3 COMPONENTE II	14.748.199,83
Nacion	PAF-MENAM-O-053-2023	ACTA DE OBRA No 1 - COMPONENTE II	138.348.408,00
Nacion	PAF-MENAM-O-056-2023	ACTA DE COSTOS No 1 COMPONENTE 2	922.334.346,79
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	Acta 4 COMPONENTE II	31.176.681,67
Nacion	PAF-MENAM-I-056-2023	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	32.400.000,00
Nacion	PAF-MENAM-I-053-2023	Acta 1 COMPONENTE II	53.014.500,00
Nacion	PAF-MENAM-O-055-2023	Acta 2 COMPONENTE II OBRA	1.298.540.027,74
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	ACTA DE COSTOS No 2 COMPONENTE 2	41.678.040,97
Nacion	PAF-MENAM-O-052-2023	Acta 4 COMPONENTE II OBRA	520.868.451,89
Nacion	PAF-MENAM-I-055-2023	Acta 2 COMPONENTE II	39.665.394,95
Nacion	REMUNERACION	A la firma del Acta de Inicio de los Contratos Derivados	221.354.930,84
TOTAL MUNICIPIO			**$ 5.100.171.924,41**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Soportes de Pagos de Contratos Derivados

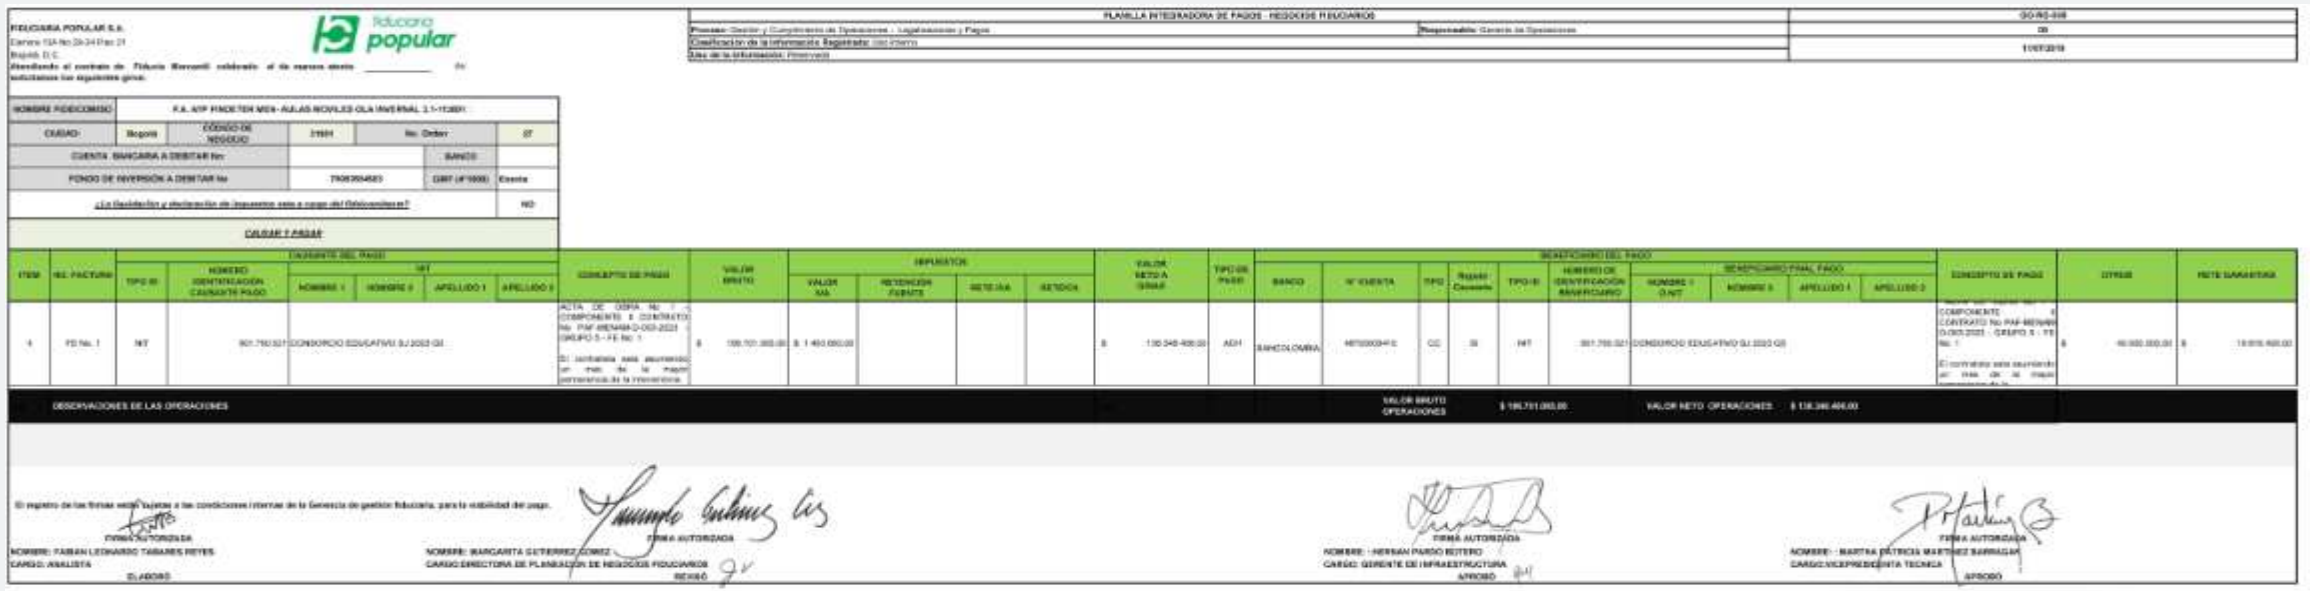

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. APP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-112001
CIUDAD	Bogotá
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No	7908304503
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomiso?	NO

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO					CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	DEPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIA
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	NIT					VALOR IVA	RETENCION FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Bajalo Convenio	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO						
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2														NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			
4	FE No. 1	NIT	901.750.521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2022 Q2				ACTA DE OBRA No. 1 COMPONENTE 2 CONTRATO No PAF-MEN-MM-O-003-2021 GRUPO 5 - FE No. 1 El contratista esta asumiendo un mas de la mano permanente de la interventoria	$ 139.701.000,00	$ 1.460.000,00				$ 138.240.400,00	ADH	BANCOLOMBIA		CC		NIT	901.750.521	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2022 Q2					COMPONENTE 2 CONTRATO No PAF-MEN-MM-O-003-2021 - GRUPO 5 - FE No. 1 El contratista esta asumiendo un mas de la mano permanente de la	$ 10.000.000,00	$ 10.000.400,00

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 139.701.000,00 VALOR NETO OPERACIONES $ 138.240.400,00


El registro de las firmas está sujeto a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES
CARGO: ANALISTA
ELABORO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
REVISO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: HERNAN PARDO ROTERO
CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
APROBO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA
APROBO

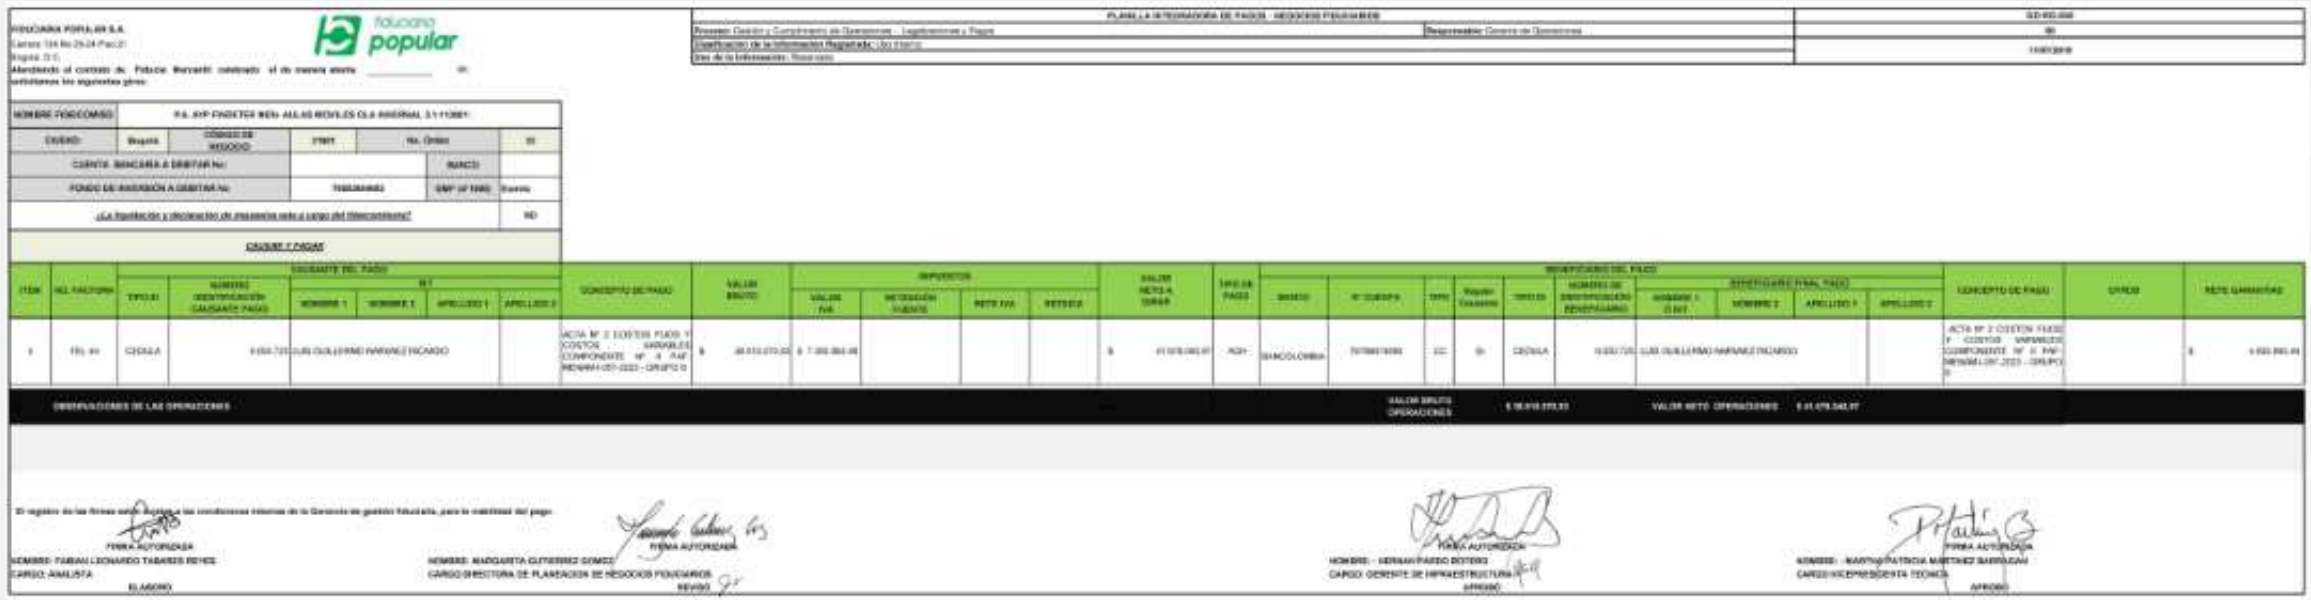

PLANILLA INTEGRADORA DE PAGOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

NOMBRE FIDEICOMISO	P.A. APP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL 3.1-112001
CIUDAD	Bogotá
CUENTA BANCARIA A DEBITAR No:	
FONDO DE INVERSIÓN A DEBITAR No	7908304503
¿La liquidación y declaración de impuestos esta a cargo del fideicomiso?	NO

CAUSAR Y PAGAR

ITEM	NO. FACTURA	CAUSANTE DEL PAGO					CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO	DEPUESTOS				VALOR NETO A GIRAR	TIPO DE PAGO	BENEFICIARIO DEL PAGO									CONCEPTO DE PAGO	OTROS	RETE GARANTIA
		TIPO ID	NUMERO IDENTIFICACION CAUSANTE PAGO	NIT					VALOR IVA	RETENCION FUENTE	RETE IVA	RETEICA			BANCO	N° CUENTA	TIPO	Bajalo Convenio	TIPO ID	NUMERO DE IDENTIFICACION BENEFICIARIO	BENEFICIARIO FINAL PAGO						
				NOMBRE 1	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2														NOMBRE 1 O NIT	NOMBRE 2	APELLIDO 1	APELLIDO 2			
3	FE No. 01	CEDULA	9.650.720	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO				ACTA Nº 2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES COMPONENTE Nº 4 PAF MEN-MM-I-097-2022 - GRUPO 0	$ 48.913.370,00	$ 7.000.000,00				$ 41.978.040,97	ADH	BANCOLOMBIA		CC		CEDULA	9.650.720	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO				ACTA Nº 2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES COMPONENTE Nº 4 PAF MEN-MM-I-097-2022 - GRUPO 0		$ 6.935.369,44

OBSERVACIONES DE LAS OPERACIONES

VALOR BRUTO OPERACIONES $ 48.913.370,00 VALOR NETO OPERACIONES $ 41.978.040,97

El registro de las firmas está sujeto a las condiciones internas de la Gerencia de gestión fiduciaria, para la viabilidad del pago.

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: FABIAN LEONARDO TABARES REYES
CARGO: ANALISTA
ELABORO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ
CARGO: DIRECTORA DE PLANEACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
REVISO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: HERNAN PARDO ROTERO
CARGO: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
APROBO

FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
CARGO: VICEPRESIDENTA TECNICA
APROBO

Estado Contrataciones Grupos 9

NO.	GRUPO	CONVOCATORIA	ACTA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	PROPUESTAS	HABILITADOS	RECHAZADO	OBSERVACIONES	SIGUIENTE ACTIVIDAD/
3	Grupo 9	CONTRATACIÓN DIRECTA	N.A.	0	N.A.	N.A.	En espera de firma acta de inicio.	Firma de Acta de Inicio
4	Grupo 9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	N.A.	0	N.A.	N.A.	• Se realizó la declaratoria desierta de la convocatoria privada de interventoría. • Se realizó Comité de Contratación No. 110 para la convocatoria directa el 20/06/2024 • Estamos en proceso de apertura de comité técnico esta semana del 24 de junio.	N.A.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

139 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Estado Actual
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [74,96%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [57,28%] 27/11/2023 - 15/07/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [64,83%] 14/11/2023 - 29/06/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En Obra [0,00%] 31/05/2024 - 01/11/2024
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [93,45%] 08/11/2023 - 08/08/2024
G9 [15 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En legalización Obra. En proceso de contratación Interventoría
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [27,69%] 19/02/2023 - 11/10/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Obra [44,02%] 12/02/2023 - 12/08/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [40,88%] 20/02/2023 - 24/09/2024

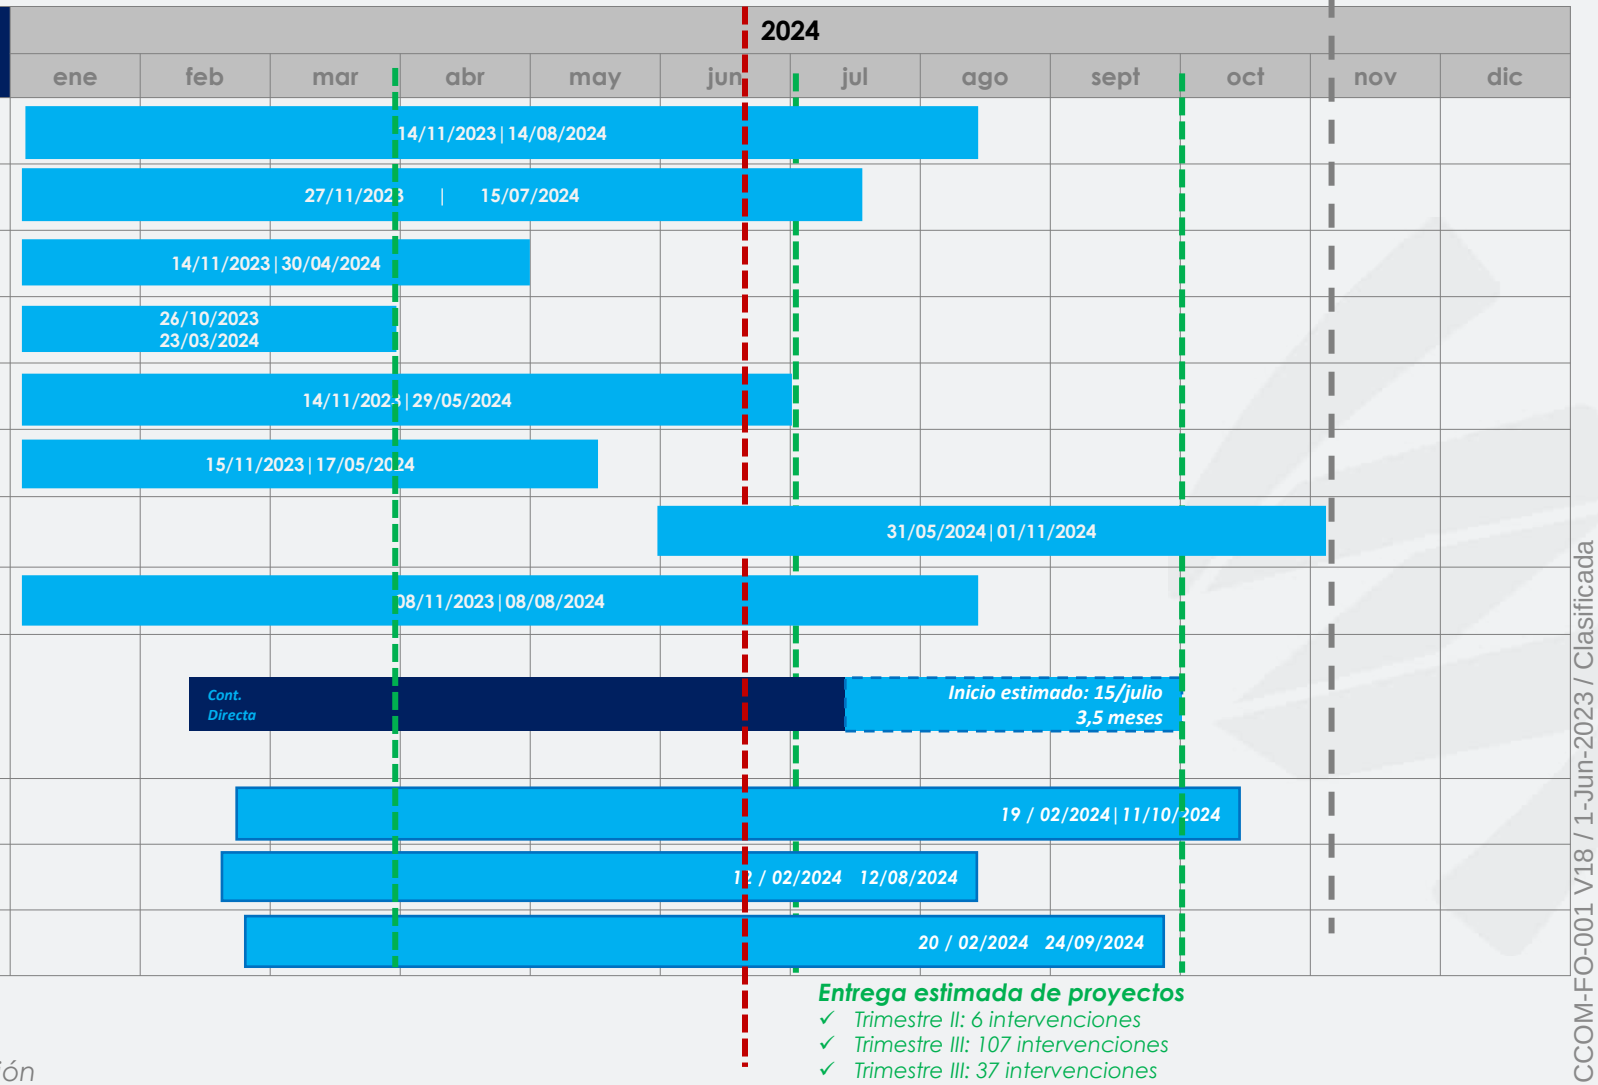

Entrega estimada de proyectos
- ✓ Trimestre II: 6 intervenciones
- ✓ Trimestre III: 107 intervenciones
- ✓ Trimestre III: 37 intervenciones
- * 8 sedes en validación jurídica

Convocatoria | Legalización | Ejecución

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Ola Invernal - Contrato No. 4917031-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2024									
			FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV
Grupo 1	Antioquia I Chocó	En Obra [83,42%]							14/08			
Grupo 2	Atlántico	En Obra [30,56%]						15/07				
Grupo 3	Magdalena	En Obra [100%]			30/04							
Grupo 4	Bolívar	En Obra [100%]		23/03								
Grupo 5	Bolívar | Magdalena | C esar	En Obra [50,17%]					29/06					
Grupo 6	Cesar	En Obra [100%]			26/04							
Grupo 7	Guajira	En Obra [0,00%]								15/09		
Grupo 8	Córdoba | Bolívar	En Obra [80,99%]							08/08			
Grupo 9	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En proceso de contratación Interventoría								30/09		
Grupo 10	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [33,87%]									11/10	
Grupo 11	Cauca	En Estudios [41,53%]							12/08			
Grupo 12	Nariño | Putumayo | Cauca	En Estudios [26,49%]								17/09		

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

139 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 –
Fin Interadministrativo

ENTREGADAS
31 sedes
22%

EN EJECUCIÓN
83 sedes
60%

POR INICIAR
25 sedes
18%

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

DOTACION ESCOLAR AULAS MOVILES

"EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS"



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Localización del Proyecto

El proyecto se ejecutará en 26 instituciones educativas ubicadas en diferentes departamentos del país:

Dep.	Municipio	IE	SEDE	CODIGO DANE
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	227615000668
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	205045000347
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA	127787000169
Atlántico	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	208606000243
Atlántico	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	108758077964
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	247268002052
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	213468000117
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	247692000477
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	247692000116
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	213074000235
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	213667001262
Cesar	La Paz (Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	420621013253
Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	220250000073
Córdoba	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	223555004629
Córdoba	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	223580001504
Córdoba	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	223068002159
Córdoba	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	223466002525
Bolívar	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	113442000653
Cauca	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	219698000661
Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	276111001087
Cauca	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	119780000322
Cauca	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	219256000042
Cauca	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	219100002134
Cauca	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	219100000778
Cauca	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	219397001026
Cauca	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	119622000226

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Alcance

Suministro, entrega e instalación de dotación de mobiliario escolar en las aulas educativas nuevas de las sedes afectadas por la temporada de lluvias, incluyendo todas las actividades necesarias para la puesta en condiciones de funcionalidad. El suministro se debe realizar de acuerdo con los elementos que conforman la tipología de dotación así:

A. Aulas Preescolares: puesto de trabajo preescolar, cada uno compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.

B. Aulas Primaria: puesto para alumno primaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

C. Aulas Secundaria o Multigrado: puesto alumno secundaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

D. Para todas las Aulas: (1) juego de puesto de trabajo docente compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.

E. Un (1) tablero alta resistencia para marcador borrable por aula.

F. Un (1) tablero móvil para aulas multigrado.

G. Un (1) juego tándem de tres (3) canecas por aula.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Sedes a la fecha: 26

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INFORMACIÓN GENERAL		ALULAS NUEVAS POR GRADO					DOTACION POR CADA SEDE							
Municipio	SEDE	PREESC	PRIMA.	SECUN.	MULTIGR	TOTAL AULAS NUEVA	Puesto trabajo Presco	Puesto trabajo Prima	Puesto trabajo Secun	Puesto de trabajo Docen	Tablero	Tablero Movi	Mueble	Tandem
Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL				2	2	0	0	60	2	0	2	2	2
Apartadó	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Tadó	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA				2	2	0	0	60	2	0	2	2	2
Repelón	PITA	0	0	0	2	2	0	0	60	2	0	2	2	2
Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	0	0	0	3	3	0	0	90	3	0	3	3	3
El Retén	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE			9		9	0	0	0	9	9	0	9	9
Mompós	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL				6	6	0	0	180	6	0	6	6	6
San Sebastían de Buenavista	ERM MARIA AUXILIADORA				4	4	0	0	120	4	0	4	4	4
San Sebastían de Buenavista	ERM LA PACHA				3	3	0	0	90	3	0	3	3	3
Barranco de Loba	ATASCOZA		1			1	0	30	0	1	1	0	1	1
San Martín de Loba	PLAN BONITO		1			1	0	30	0	1	1	0	1	1
La Paz(Robles)	SEDE EL COSO	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
El Paso	SEDE LA ESTACION	0	1	0	0	1	0	30	0	1	1	0	1	1
Planeta Rica	LOS CERROS		1			1	0	30	0	1	1	0	1	1
Puerto Libertador	ESC NVA LA SOLITA				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Ayapel	ESC NVA PARCELAS LONDRES				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Montelíbano	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR		2			2	0	60	0	2	2	0	2	2
María la Baja	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA			2		2	0	0	0	2	2	0	2	2
Santander de Quilichao	DOMINGUILLO (sede principal)			8		8	0	0	0	8	8	0	8	8
Guadalajara de Buga	SEDE CRISTOBAL COLON				1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Suarez	SEDE MARIA INMACULADA			6		6	0	0	0	6	6	0	6	6
El Tambo	HUISITO (sede principal)	2	3	1	0	6	20	90	0	6	6	0	8	6
Bolívar	CORRAL VIEJO	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Bolívar	LA FUENTE	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	0	0	0	1	1	0	0	30	1	0	1	1	1
Rosas	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	1	0	0	0	1	10	0	0	1	1	0	2	1
	TOTALES	**3**	**9**	**26**	**30**	**68**	**30**	**270**	**900**	**68**	**38**	**30**	**71**	**68**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Presupuesto

OBJETO	VALOR CDR
CONTRATAR "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS"	$ 758.497.441

Plazo

PLAZO TOTAL
DOS (02) MESES

Estado Actual

Mayo 31
Publicación

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Balance General del Contrato

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Grupo	Obra		Interventoria		TOTAL
	Valor inicial	Valor adición	Valor inicial	Valor adición	
			TOTAL MONTO DISPONIBLE PARA CONVENIO		$ 59.485.981.308,00
GRUPO 1	$ 3.447.332.358,95		$ 271.455.247,34	$ 25.183.769,00	$ 3.743.971.375,29
GRUPO 2	$ 4.044.124.630,00		$ 295.715.000,00		$ 4.339.839.630,00
GRUPO 3	$ 4.744.960.153,00	$ -	$ 351.774.412,00	$ 10.000.000,00	$ 5.106.734.565,00
GRUPO 4	$ 3.361.652.674,57		$ 279.439.929,28	$ 10.000.000,00	$ 3.651.092.603,85
GRUPO 5	$ 4.102.044.984,00		$ 300.856.990,00		$ 4.402.901.974,00
GRUPO 6	$ 2.102.352.000,00	$ 394.497.571,44	$ 155.543.411,00	$ 36.738.473,21	$ 2.689.131.455,65
GRUPO 7	$ 4.158.777.883,00		$ 295.239.000,00		$ 4.454.016.883,00
GRUPO 8	$ 4.706.470.280,00	$ 858.000.000,00	$ 297.097.668,00	$ 49.106.877,00	$ 5.910.674.825,00
GRUPO 9	$ 4.810.476.306,00		$ 313.828.750,00		$ 5.124.305.056,00
GRUPO 10	$ 6.014.978.800,00		$ 327.496.568,00		$ 6.342.475.367,99
GRUPO 11	$ 4.728.021.810,00		$ 312.927.160,00		$ 5.040.948.970,00
GRUPO 12	$ 4.918.276.400,00		$ 318.105.088,00		$ 5.236.381.488,00
				SUBTOTAL (1)	$ 56.042.474.193,79
				SUBTOTAL (2)	$ 3.443.507.114,21
				DOTACIÓN	$ 1.200.000.000,00
				VISITAS	$ 84.371.774,00
				TOTAL (Remanente 1)	$ 2.159.135.340,21
				Alcance de actividades adicionales:	
				Sede Banco Magdalena	$ 514.127.857,00
				Adición La Chinela y Tronconal	$ 190.161.297,00
				Sedes El Nispero (María La Baja)	$ 657.000.000,00
				IE Demetrio Salazar (Tadó)	$ 201.152.963,00
				Interventoría Grupo 10	$ 69.110.455,20
				Interventoría Grupo 11	$ 19.522.736,00
				Interventoria Grupo 12	$ 50.441.503,50
				Mayores Cantidades Suarez (Inmaculada)	$ 341.572.704,00
				TOTAL (Remanente 2)	$ 116.045.824,51

NOTA:

Se cuenta con un saldo disponible para adiciones de **$116.045.824**, el cual podrá ser utilizado en las novedades de ejecución que puedan surgir en los grupos 7 o 9, los cuales no han iniciado actividades.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Junio 25 de 2024



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4282 estudiantes.
- $ 3.743.971.376,32 Inversión

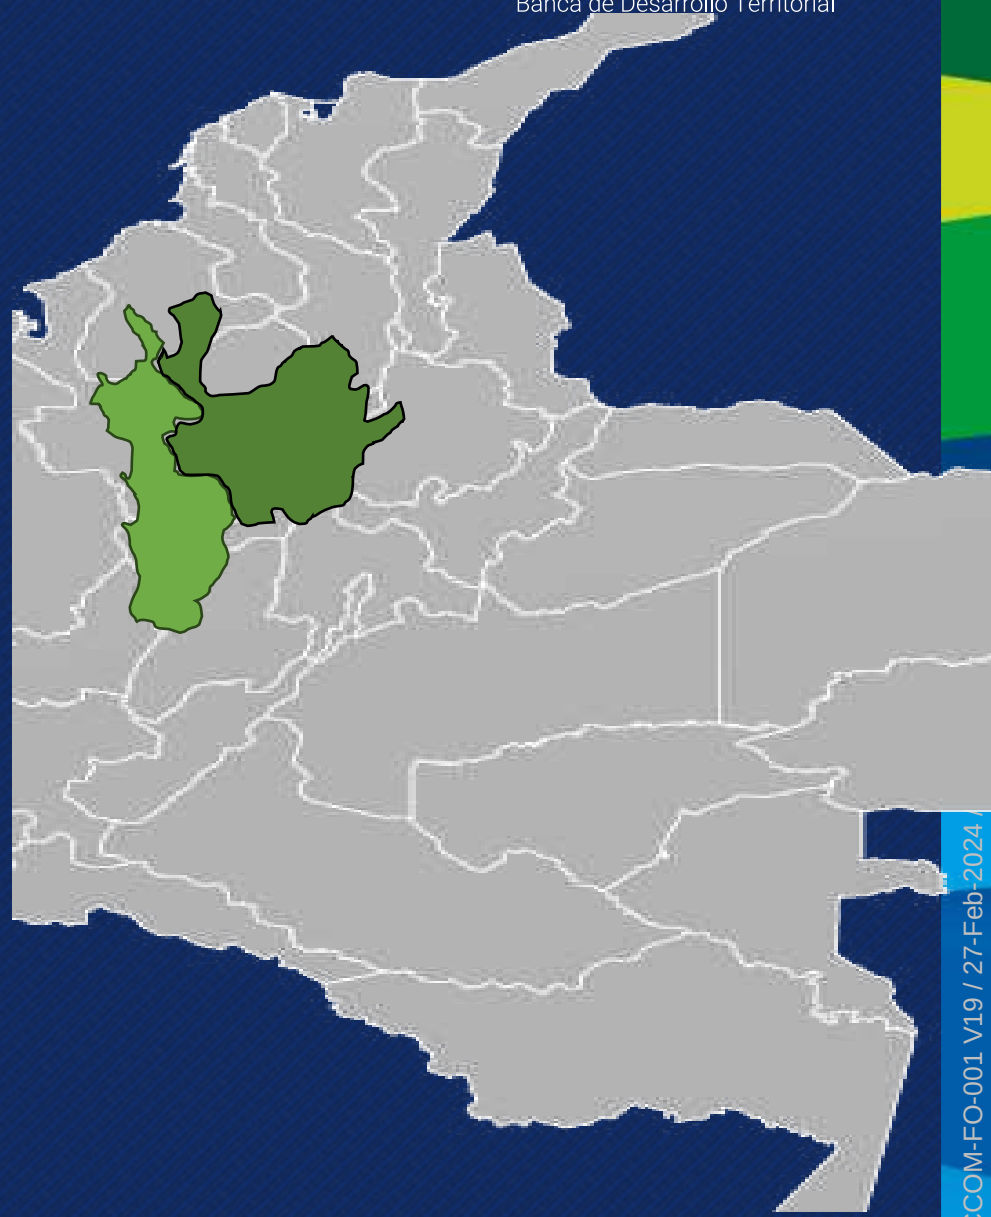

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ	27/2/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ	21/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4		14/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ	20/5/2024
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ	30/5/2024
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		6	3 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

75,30%
Porcentaje Programado

74,96%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 31 al día 16 de junio de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 75.30% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 74.96%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 0.34% de atraso frente a lo programado.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra aprobado y recibido a satisfacción por la interventoria.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. I.E PUEBLO NUEVO: se realiza construcción cimentación en concreto, pedestales palafito y construcción placa contrapiso y vigas de amarre en concreto, adicional se registra llegada de estructura aulas y baterías sanitarias a obra y se procede a iniciar su armado.
2. IE. DEMETRIO SALAZAR: Continúan las actividades de: Demoliciones de mampostería y superficies de pisos, Conformación de zapatas en concreto de 21MPA, Figuración de acero y fundida de columnas, cambio de estructura y cubiertas aulas.
3. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, así mismo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de mayo del 2024 y suscripción AEP&SC
4. IE CHURIDO PUEBLO: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, cabe aclarar qué, el rector de la I.E previamente manifestó no querer hacer parte del proceso, por lo que designó a la secretaría de educación para los fines pertinentes. Se realiza instalación de la placa el 17 de mayo del 2024. y suscripción AEP&SC
5. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Se culminan actividades de intervención general aula nueva, mejoramientos de aulas y baterías sanitarias, entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se entregaron el 14 de mayo, Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024, y suscripción AEP&SC
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalacion placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 14 de marzo del 2024 y suscripción AEP&SC
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024. Se adelanta gestiones para suscribir AEP&SC.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE PUEBLO NUEVO – CARMEN DEL DARIÉN













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE DEMETRIO SALAZAR, TADÓ.













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones
  Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT
  2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630
  Inversión

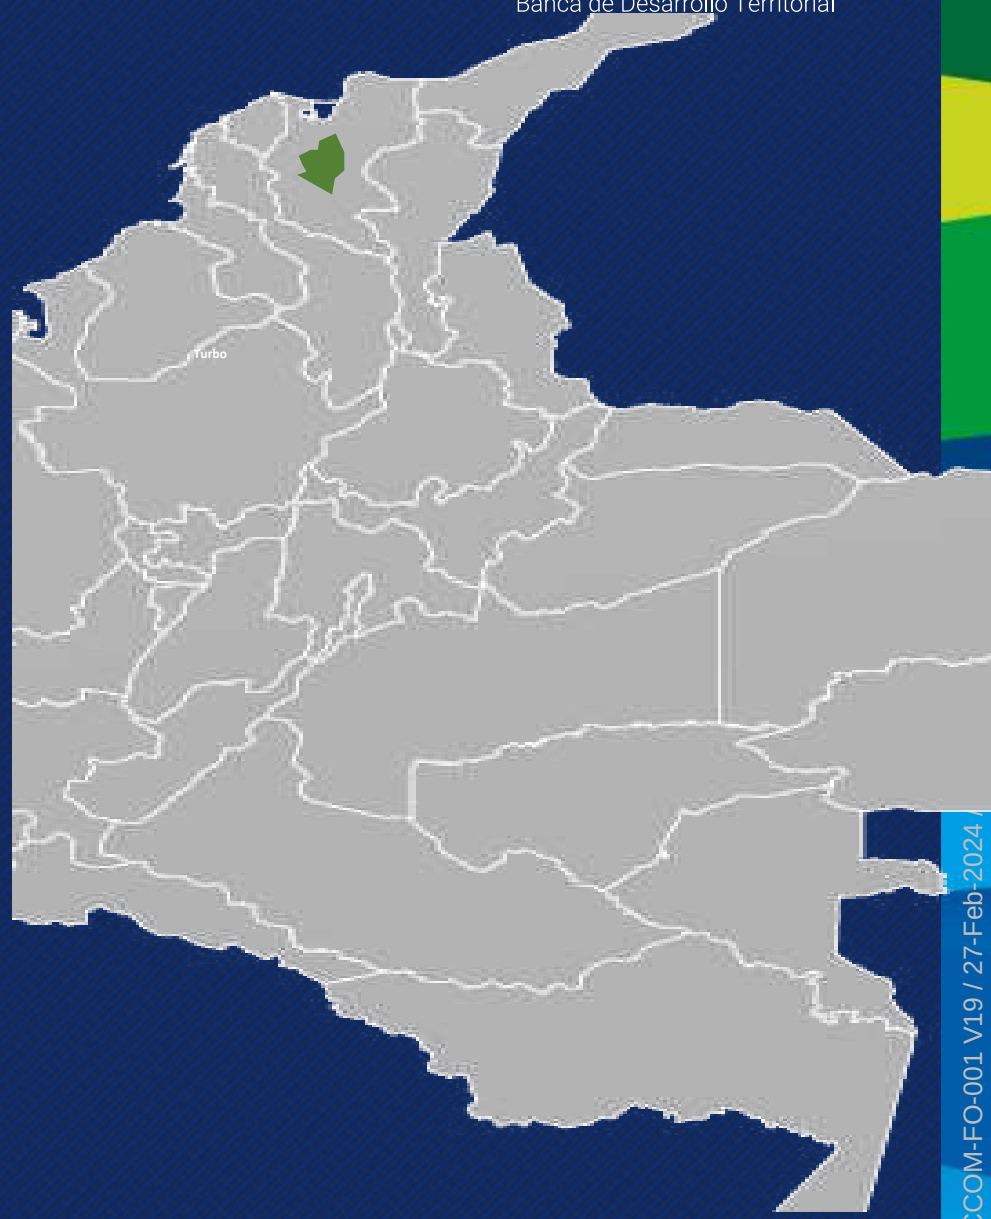

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023


Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
	C1	C1	C2	C2			
O: $4.044.124.630 I: $295.715.000	27-nov-23	11-ene-24	19-feb-2024	13-mar-24	Programado	35.35%	-16.39%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	93.46%	Programado	31.25%	Ejecutado	19%	
	Ejecutado	75.52%	Ejecutado	75.52%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ID MEN
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	2	NA	2	92
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3	NA	1	192
	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA	NA	12	EN CASO DE QUE APLIQUE	64
	Palmar de Varela	IE TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	NA	9	EN CASO DE QUE APLIQUE	91
	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL	NA	8	EN CASO DE QUE APLIQUE	83
		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	NA	5	8	84
	Soledad	IE JOSEFA DONADO	IE JOSEFA DONADO	NA	16	EN CASO DE QUE APLIQUE	18
		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	NA	22	EN CASO DE QUE APLIQUE	144
	Luruaco	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NA	6	EN CASO DE QUE APLIQUE	191

Avance General: Se encuentra en ejecución en todas las sedes

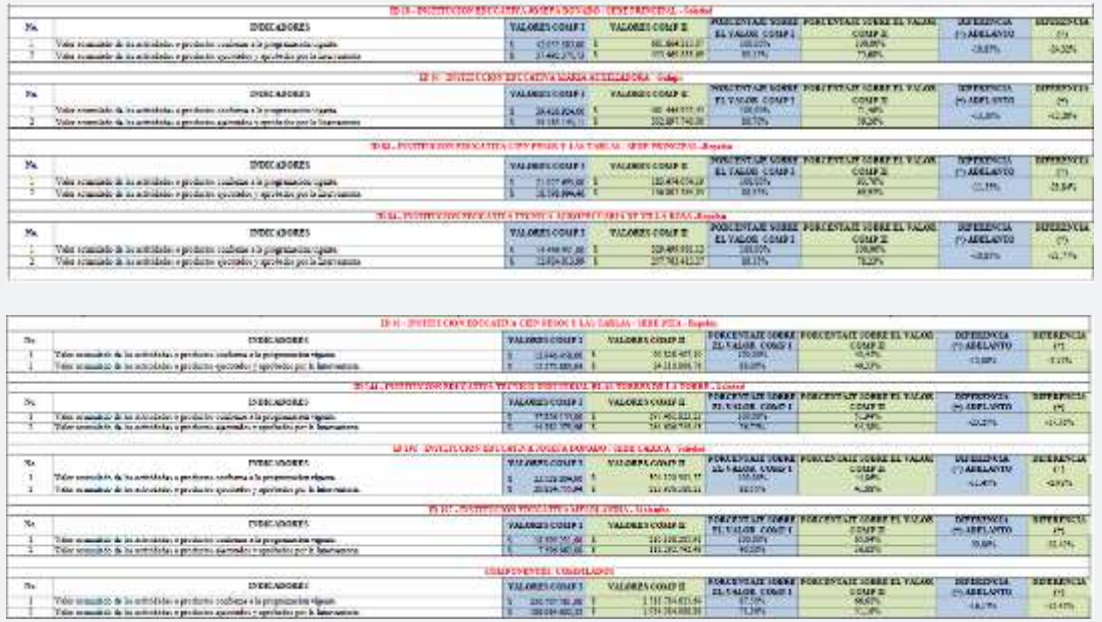

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS – SEDE PITA




IE MARIA AUXILIADORA – SEDE IE MARIA AUXILIADORA




IE JOSEFA DONADO – SEDE CABICA




IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS – SEDE PRINCIPAL




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA - SEDE LA LOMA




IE JOSEFA DONADO – SEDE IE JOSEFA DONADO





IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – SEDE IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

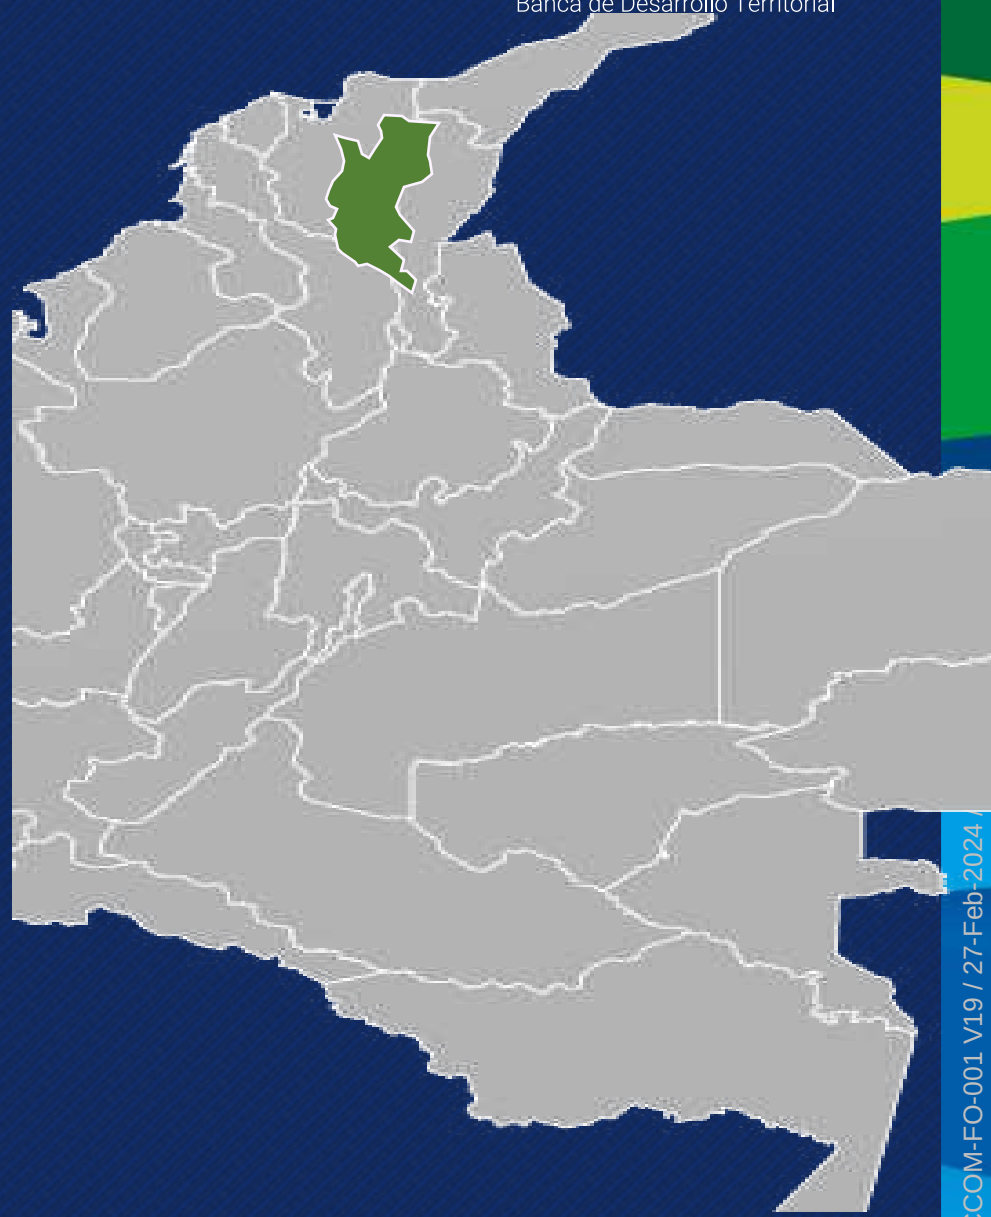

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
5.096.734.565	14-nov-23	28-dic-24	18-dic-23	12-abr-24	**Programado**	100,00%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**Entregadas entre 29 y 30 de abril de 2024**		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 16 al 23 de junio de 2024
Avance general Componente I: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede Componente II: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

Se encuentra en proceso de liquidación de obra e interventoría

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID112. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE - COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE (BACHILLERATO)

Intervención Nuevas + Mejoramientos

- Matricula: 731
- Aulas Existentes: 28 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 18
- Aulas por demoler: 11
- **Aulas Nuevas: 9, nivel 30+**
- **Aulas Mejoramientos: 11**
- Aulas sin intervenir: 6
- Baterías requeridas: 29 (25est/1)
- **B. Nuevas: 11**
- Sistema Hidráulico propuesta, Se ejecutaría posterior (con diseños)


C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: 18/12/2023

Mejoramientos 11 Aulas:
- En acabados y limpieza.

Aulas nuevas 9 Aulas:
- En acabados y limpieza.

Baterías sanitarias nuevas 11:
- En acabados de (instalación de divisiones, aparatos, enchape y mesón en concreto y granito pulido)

Circulaciones cubiertas:
- En acabados y limpieza.

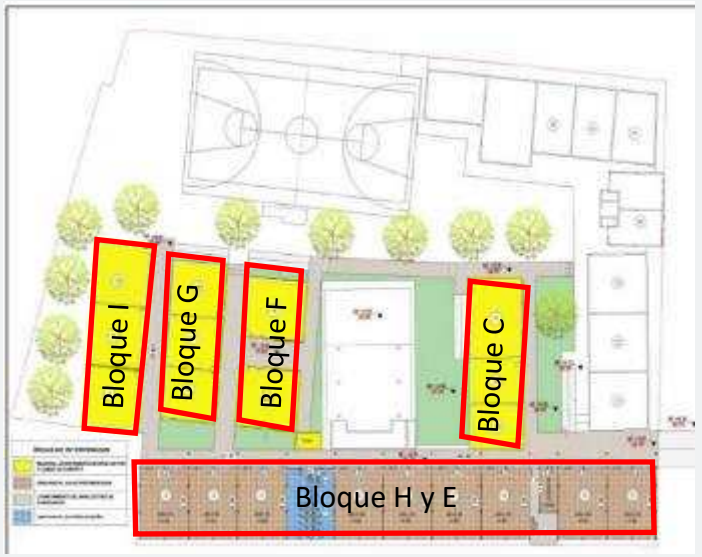






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID156. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE - SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON (PRIMARIA)

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 543
- Aulas Existentes: 18 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 6
- **Aulas Mejoramientos: 7**
- Baterías requeridas: 22 (25est/1)
- **B. Reemplazo 6 + B. Nuevas 9: 15 Baterías (faltarían 7 Baterías por falta de espacio)**
- Sistema Hidráulico propuesta, Se ejecutaría posterior (con diseños)

C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: 19/12/2023

Mejoramientos 7 Aulas:

- En acabados y limpieza.

Baterías sanitarias 15:

- En ejecución de: (pañete, instalación de divisiones, aparatos, enchape y mesón en concreto y granito pulido).

Circulaciones cubiertas:

- En acabados y limpieza.











Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID154. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 725
- Aulas Existentes: 24 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 32
- **Aulas Mejoramientos: 24**
- Baterías requeridas: 29 (25est/1)
- B. Nuevas: 0
- Sistema Hidráulico propuesta, Se ejecutaría posterior (con diseños



C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: 27/12/2023

Mejoramientos 24 Aulas:

Fase 1: Mejoramientos 12 Aulas: Inicia 27/12/2023

- Entregadas y en funcionamiento.

Fase 2: Mejoramientos 12 Aulas: Inicia 20/03/2024

- En ejecución de (adecuaciones de cubierta y pañetes de protección) con reforzamiento estructural y pisos) lo anterior a Plan logístico con institución.

Circulaciones cubiertas: En acabados y limpieza.











Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID126. INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM EL TRIUNFO

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 98
- Aulas Existentes: 4 Promedio 30 estudiantes
- Baterías Existentes: 3
- **Aulas Mejoramientos: 4**
- Baterías requeridas: 4 (25est/1)
- B. Nuevas: 0
- Sistema Hidráulico propuesta. N/A



C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: inicio 15/01/2024 por dificultades de acceso por orden público.

Mejoramientos 4 Aulas:

- En acabados y limpieza.







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID111. INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM ISLA DE CATAQUITA

Intervención Mejoramientos

- Matricula: 115
- Aulas Existentes: 2 Promedio 29 estudiantes
- Baterías Existentes: 3
- **Aulas Mejoramientos: 2**
- Baterías requeridas: 5 (25est/1) (Faltarían 2 por espacio)
- B. Nuevas: 0
- Sistema Hidráulico propuesta. N/A



C2 OBRA, Actividades: Inicio C2: inicio 15/01/2024 por dificultades de acceso por orden público.

Mejoramientos 2 Aulas:

- En acabados y limpieza.






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

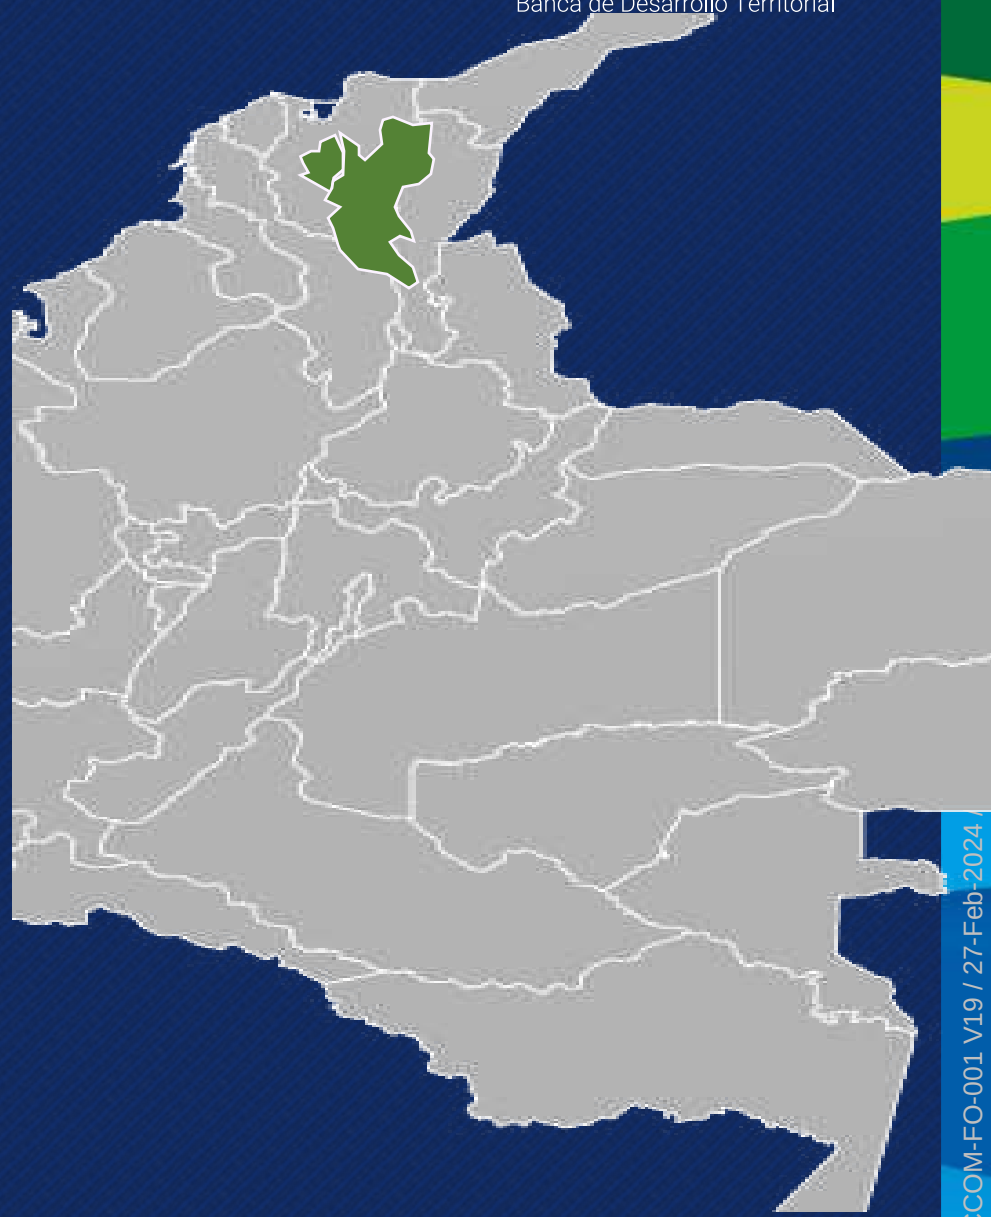

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO Proyectada C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4.744.960.153	24/10/2023	08-12-2023	08-12-2023	07-02-2024	**Programado**	100%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

En proceso de liquidación de obra e interventoría

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL



NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ERM MARIA AUXILIADORA







ERM LA PACHA







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

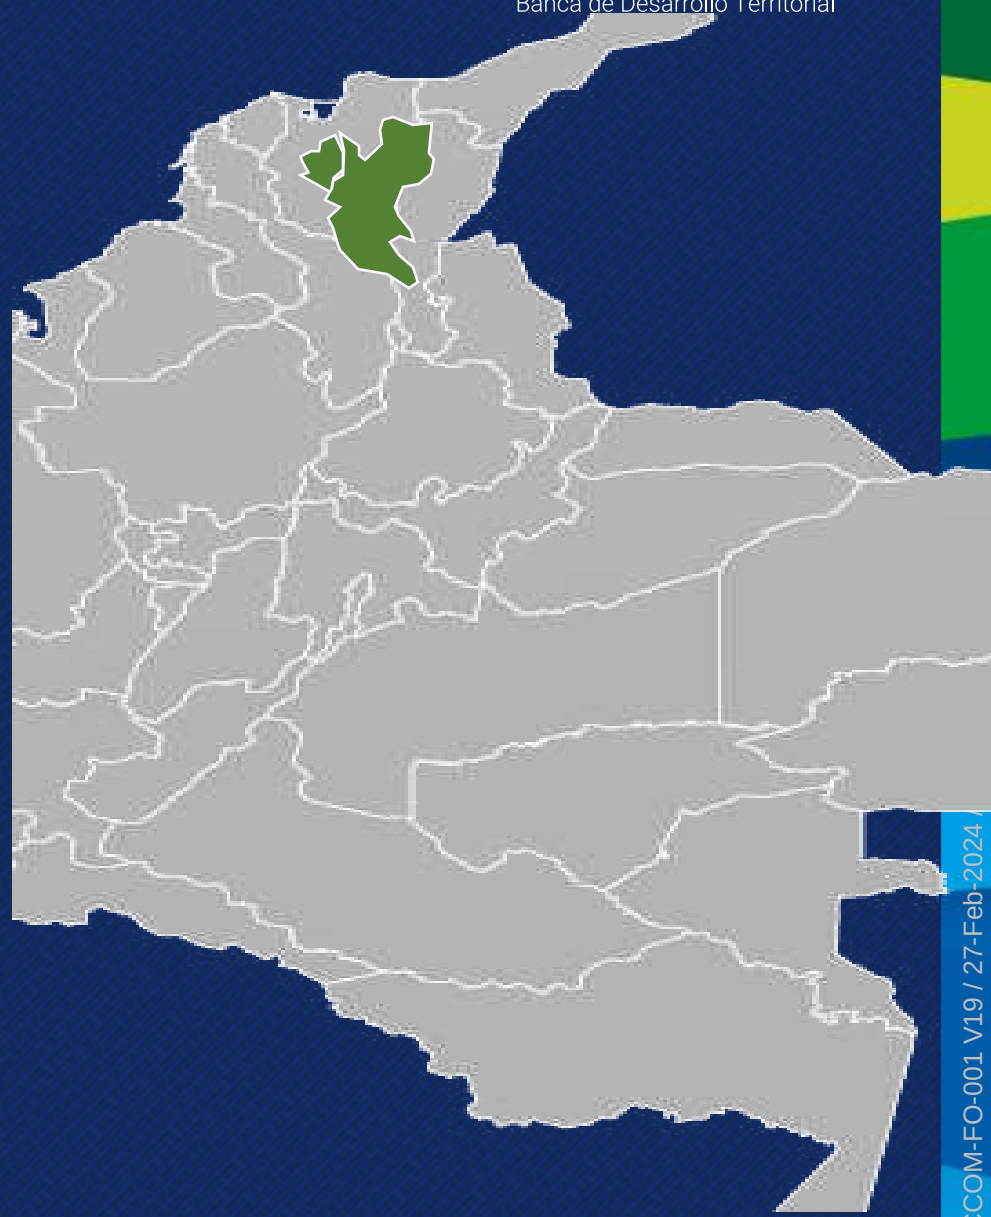

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4,102,044,984	14-Nov-23	29-Dic-23	16-Nov-23	29-Febrero-24	Programado	85.54%	-20,71%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	87,69%	Ejecutado	64.83%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	65,36%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

Avance General: Se encuentra en trámite de prorroga y adición en el comité técnico No. 55.

Prorroga 2 meses obra e interventoría
Adición Obra: $704.289.454
Adición interventoría: $69.224.091,43

Se realizará apertura de comité fiduciario el 25 de junio del 2024

Avance General: Dificultades de orden público (grupos armados de la zona) en las SEDES 6, 9 y 10 municipio de Barranco de Loba – Bolívar, así:

ID6. I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal

ID9. I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede La Atascosa

ID10. I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede El Cerrito

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Avance por Institución Educativa

ID MEN	INSTITUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO (-) / AVANCE (+)
30	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Principal	100,00%	99,80%	-0,20%
97	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Chinela	98,22%	40,00%	-58,22%
98	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Guaimaral	96,64%	70,00%	-26,64%
101	I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Los Serenos	100,00%	100,00%	0,00%
147	Centro Educativo El Pueblito - Sede Puerto La Estancia	48,09%	80,00%	31,91%
148	Centro Educativo El Pueblito - Sede Torrecilla	100,00%	80,00%	-20,00%
146	Centro Educativo El Pueblito - Sede Tronconal	100,00%	45,00%	-55,00%
13	I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Primaria	55,04%	40,00%	-15,04%
14	I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Jardin Infantil	59,63%	0,00%	-59,63%
6	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal	100,00%	72,00%	-28,00%
10	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede El Cerrito	100,00%	40,00%	-60,00%
9	I. E. Tec. Agro. y Acuicola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede La Atascosa	93,17%	59,00%	-34,17%
43	I. E. Tec. Pesquera Leonidas Ortiz Alvear de Chimi - Sede Plan Bonito	87,62%	68,00%	-19,62%
32	I. E. Departamental Rural Silvia Cotes De Biswell - Sede La Islita	100,00%	100,00%	0,00%
133	I. E. Departamental Oscar Pisciotti Numa - Sede Inmaculada Concepción	100,00%	100,00%	0,00%
24	I. E. Departamental Antonio Nariño - Sede José Vanegas Ortiz	64,64%	52,00%	-12,64%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE PRINCIPAL (CURUMANI CESAR):



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE GUAIMARAL (CURUMANI CESAR):



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA (CHIMICHAGUA CESAR):



INSTITUCION EDUCATIVA LEÓNIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMI - SEDE PLAN BONITO:



Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE SERRENOS (CURUMANI CESAR):



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO - SEDE JOSÉ DE LA PAZ VANEGAS ORTIZ:



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BÁLSAMO - SEDE ERM DE BÁLSAMO:




Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7 Proyectos

- 1 Departamentos
- 4 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.102.352.000 Inversión

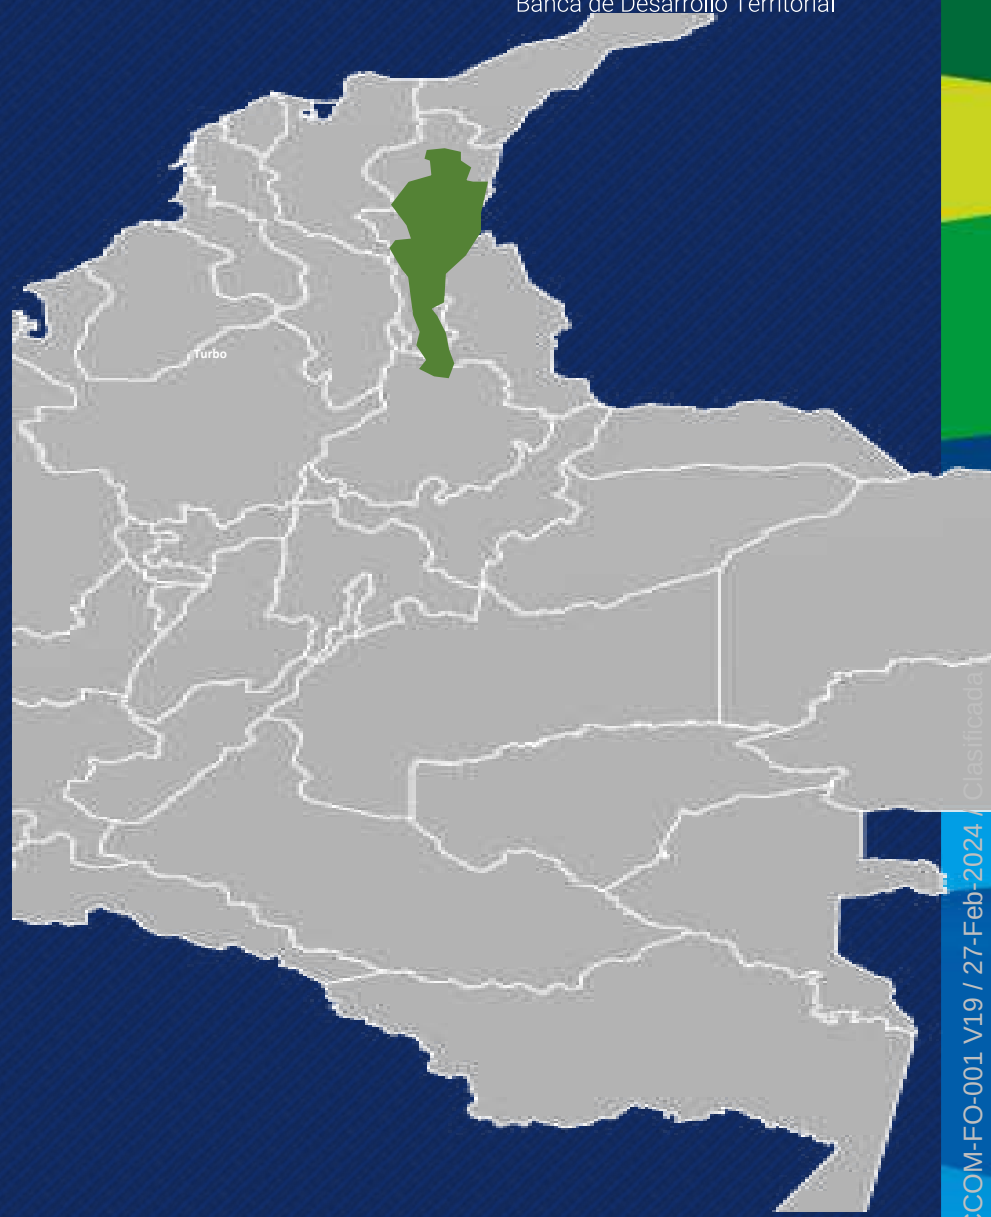

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.496.849.571,44 I: $200.301.842,00	15-nov-23	30-dic-23	30-nov-23	29-abr-2024	**Programado**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**En entregas de sedes educativas.**		

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	9	1	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

El contratista finalizó las entregas programadas de cada sede educativa.

Las entregas se realizaron en las siguientes fechas:

- ID No. 79 – 02/05/2024
- ID No. 45 – 04/05/2024
- ID No. 75 – 15/04/2024
- ID No. 74 – 10/05/2024
- ID No. 77 – 15/05/2024
- ID No. 4 – 16/05/2024
- ID No. 48 – 17/05/2024

Se encuentra en recopilación de documentación para realizar el trámite de liquidación.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		105 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	3	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Instalación de canales tipo amazonas. • Instalación de bajantes. • Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3. • Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1. • Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3. • Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3. • Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		15/04/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		65 estudiantes
ALCANCE		
Aulas nuevas	1	Aula prefabricada - Material WPC
Aulas mejoradas	1	* Cambio de cubierta * Cambio de red eléctrica
Baterías sanitarias	Mejoramiento	* Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes * Mantenimiento de carpintería metálica * Cambio de cubierta y red eléctrica * Suministro de tanque de agua potable 2000 L * Construcción de poza séptica con campos de infiltración.
FECHA DE ENTREGA		02/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

MUNICIPIO		La Paz (Robles)
POBLACIÓN BENEFICIADA		65 estudiantes
ALCANCE		
Aulas nuevas	1	• Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada. • Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		04/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		225 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	9	✓ 7 AULAS: • Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Instalación de canales tipo amazonas. • Instalación de bajantes. • Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6 • Reparación de muros con desprendimiento de pañetes. • Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6 • Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6. • Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6 ✓ 2 AULAS • Cambio de cubierta • Subida de nivel • Cambio de red eléctrica • Mejoramiento en muros y en carpintería metálica ✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE
Baterías sanitarias	SI	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas
FECHA DE ENTREGA		10/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

MUNICIPIO		El Paso
POBLACIÓN BENEFICIADA		8 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	1	• Mantenimiento y limpieza de cubierta • Cambio de puerta de acceso principal • Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura.
Baterías sanitarias	SI	• Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada. • Instalación de sistema séptico. • Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable.
FECHA DE ENTREGA		15/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

MUNICIPIO		Valledupar
POBLACIÓN BENEFICIADA		385 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	11	• Cambio de cubierta • Cambio de red eléctrica • Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1. • Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5. • Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2. • Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 . En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2. • Desmonte de cielo raso. • Instalación de cielo raso en lamina PVC.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		16/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ

MUNICIPIO		Valledupar
POBLACIÓN BENEFICIADA		805 estudiantes
ALCANCE		
Aulas mejoradas	23	* Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas. * Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. * Instalación de canales tipo amazonas. * Instalación de bajantes. * Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		17/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

13
Proyectos

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT
  2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.158.777.879 I: $295.239.000	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/09/2024	Progr	4.44%	-0.31%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	62,19%	Programado	0,00%	Ejecut	4.13%	
	Ejecutado	57,80%	Ejecutado	0,00%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	KASICHE	1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN KASPOLIMANA	1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA	ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	1	3	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA CAMPANA	0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	WAYUUMAANA	0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA ESTRELLA	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN PRINCIPAL	1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	COOPERATIVO	0	6	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	JOSÉ ANTONIO GALÁN	0	2	12
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	APUNIMAANA1	0	6	1
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	WAKUAPAMANA	0	3	6

Avance General: En la semana del 10 junio al 16 de junio de 2024.
Avance general Componente I: -4.39%
Avance general por Sede Componente II: 0%

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 0%
ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 0%
ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 0%
ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 0%
ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 0%
ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 0%
ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 0%
ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 0%
ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 0%
ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 0%
ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 0%
ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 0%
ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 0%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

8
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3517 estudiantes.
- $ 5.945.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$6.161.470.280 **I:** $441.204.280	08/11/2023	23/12/2023	24/12/2023	08/07/2024	**Progr**	94,25%	-0,80%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	93,98%	**Ejecut**	93,45%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	93,14%			

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marial abaja	Buenos Aires	0	6	6
Bolívar	María la Baja	Técnica Agroindustrial de Flamenco	Níspero	0	8	8
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0

Avance General: Se realiza entrega técnica de 6 sedes ubicadas en los municipios de Cotorra, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano, María la Baja (Sede Buenos Aires).

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Entrega técnica el 14 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 05 de julio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** En atención de observaciones de la interventoría y coordinando entrega con Rector. Se proyecta su entrega el 05 de julio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: En ejecución del componente 1 y componente 2. Se proyecta su entrega 08 de Agosto de 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Buenos Aires - María La Baja






Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







Sede Los Aguacates - Cotorra







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Los Cerros - Planeta Rica





Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Níspero-María La Baja














Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

29
Proyectos

- 1 Departamento
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3297estudiantes.
- $ 6.342.475.368 Inversión

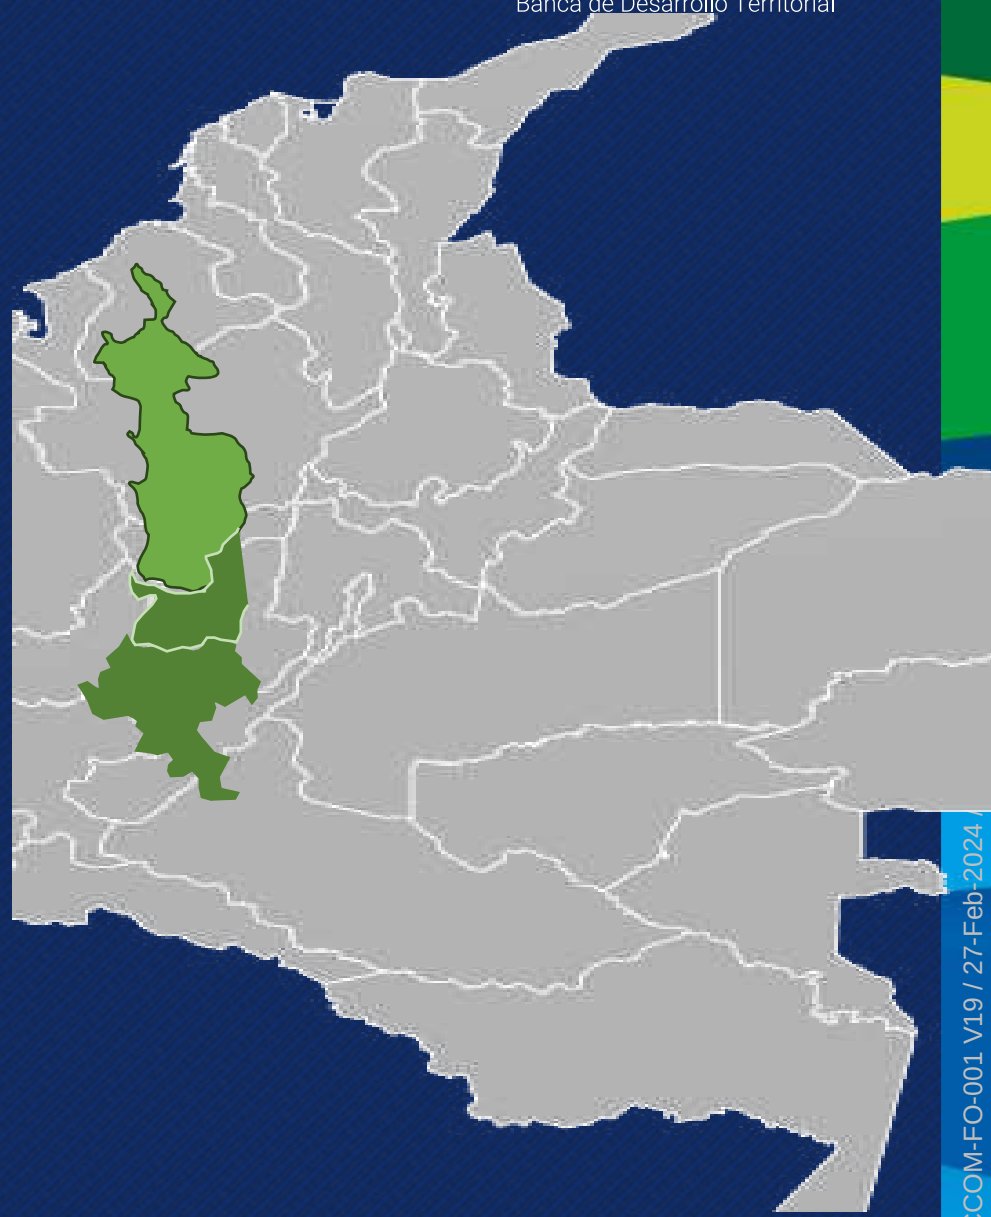

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	TORIBIO	IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	3/11/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/7/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	3/11/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	3/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	30/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	30/10/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	30/9/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

35,25%
Porcentaje Programado

27,69%
Porcentaje de avance

7,56%
Porcentaje de atraso

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Según programación en el presente corte en la semana No. 17 al día 16 de junio de 2024, el porcentaje físico programado del proyecto general es del 35.25% frente a un porcentaje físico real ejecutado del 27.69%, lo que en términos de ejecución nos deja actualmente con un 7.56% de atraso frente a lo programado.

Se solicita a la interventoria y contratista de obra iniciar con la implementación del plan de contingencia con el ánimo de mitigar el atraso presente a la fecha e iniciar la etapa de obra en las sedes pendientes.

COMPONENTE 1: Actualmente se encuentra aprobado y recibido a satisfacción por la interventoria.

COMPONENTE 2: Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE PRINCIPAL – En ejecución de actividades de mantenimiento parcialmente por bloques en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora, la ejecución de actividades se ha visto afectadas debido a los temas de orden público que han obligado a suspender obras por varios días.
2. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA. Se continua con actividades de mejoramientos sobre muros, cubiertas, pisos y excavaciones y figurado de aceros para cimentación aulas nuevas, la ejecución de actividades se ha visto afectadas debido a los temas de orden público que han obligado a suspender obras por varios días.
3. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – se programarán actividades una vez se terminen las obras de mejoramiento sobre la sede principal y de esta forma reubicar los niños para intervenir obra, en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora.
4. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA HONDA – Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete.
5. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA PLANTA - Se continúan actividades de mejoramiento de aulas, se adelanta reparación y mejoramiento estructura metálica cubierta y cambio de cubierta y caballete.
6. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE SAN CRISTOBAL COLON – Se proyecta retomar la ejecución de actividades el 24 de junio de 2024.
7. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JHON F. KENNEDY - Desmonte de teja, desmonte de aparatos sanitarios, reparación de pañetes y pintura muros, mantenimiento estructura de cubierta, instalacion cubierta y caballete, mantenimiento de puertas metálicas.
8. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO – Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.
9. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE PRINCIPAL - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, cielos rasos, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, suministro de cubierta y mejoras eléctricas.
10. IE LA PLAYA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL – Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, cielos rasos, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, suministro de cubierta UPVC y mejoras eléctricas. la ejecución de actividades se ha visto afectadas debido a los temas de orden público que han obligado a suspender obras por varios días.
11. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE DE SAN JOSE (HUACA) – Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal de confianza, se programa iniciar las actividades en la semana del 24 de junio, adicional el inicio de actividades se está viendo afectado por temas de orden público y exigencias de las AUC para la comunidad, proceso que se está atendiendo con mesas de negociación.
12. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SIRENA DEL MAR - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.
13. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SECUNDINO RIVAS - Se continúan desmonte manual de tejas de asbesto y fibrocemento, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta y suministro de cubierta, demolición cielo rasos.
14. IE DOMINGUILLO – SEDE DOMINGO LASSO - Obras de mejoramientos terminadas y se programa entrega al rector y secretaria de educación, en la semana del 24 al 28 de junio de 2024, y suscripción del AEP&SC.
15. IE DOMINGUILLO – SEDE PRINCIPAL - Se continúan pendiente de entrega predio para iniciar actividades por parte de la alcaldía, proceso que se proyecta iniciar en la semana del 24 al 28 de junio.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGO LASSO - EJECUTADO










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. - ANTES









IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – EJECUCIÓN









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – EJECUCIÓN










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA-TORIBIO. - ANTES









IE LA PLAYA TORIBIO. – EJECUCIÓN









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA TORIBIO. – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – EJECUCIÓN











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – EJECUCIÓN










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – EJECUCIÓN







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – EJECUCIÓN












CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – EJECUCIÓN



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL – EJECUCIÓN







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – EJECUCIÓN








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA - EJECUCIÓN











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA - EJECUCIÓN











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA - EJECUCIÓN










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Sirena del mar ANTES**





**INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Sirena del mar DURANTE
(FECHA DE INICIO 21/05/2024)**





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Sirena del mar ANTES





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Sirena del mar DESPUES
(FECHA DE INICIO 21/05/2024)







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA - Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas ANTES






INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA - Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas DURANTE Y DESPUES (FECHA DE INICIO 21/05/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas
ANTES DURANTE






INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas
DURANTE Y DESPUES (FECHA DE INICIO 21/05/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas
ANTES DURANTE





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas
DURANTE Y DESPUES (FECHA DE INICIO 21/05/2024)






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.040.948.970 Inversión

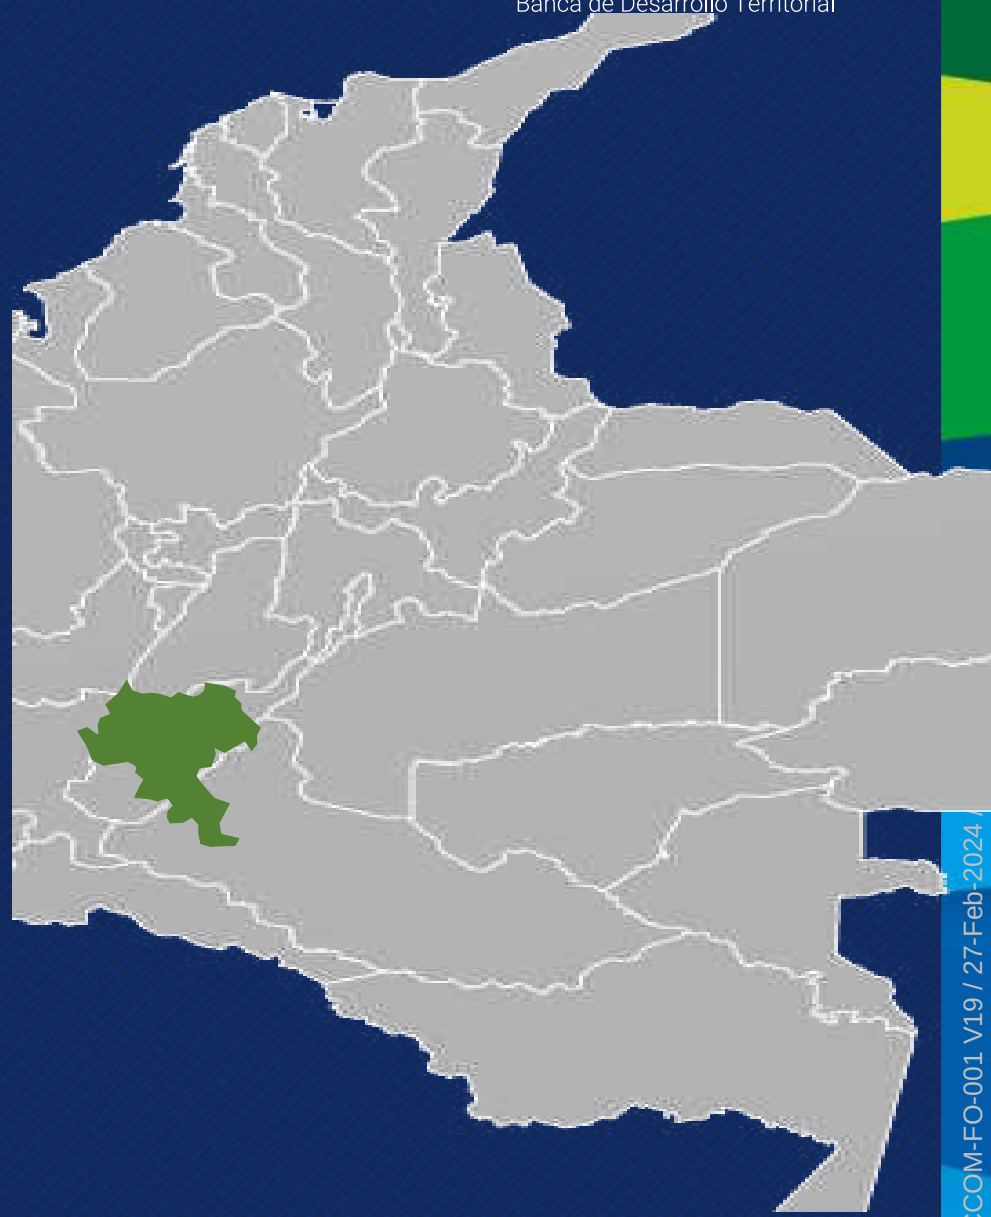

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.728.021.810 **I:** $ 312.927.160	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/07/2024	**Progr**	53,21%	-9,19%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	50,35%	**Ejecut**	44,02%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	40,60%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 N
El Tambo	I.E. Huisito	Huisito (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	12	8 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	15	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	19	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	2	2 M
		El Altillo	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	1	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

Componente 1 recibido a satisfacción por la interventoría.

COMPONENTE 2

Actualmente se adelanta ejecución de mejoramientos en 15 Instituciones:

- ✓ Sedes Santa Teresita, La Despensa, El Altillo, Las Yerbas, El Retiro, Bellavista y Madre Caridad Brader. (Municipio de Rosas)
- ✓ IE Santa Rita Sede Principal y Francisco Javier sede Garay. (Municipio de la Vega)
- ✓ IE Nuestra Señora de los Remedios, IE Nuestra Señora del Carmen, IE el Carmen sede principal. (Municipio de Bolívar)
- ✓ Sedes Capitanes y Olaya (Municipio de Balboa)
- ✓ IE Comuneros Sede Principal (Municipio de Popayán)

A la fecha la interventoría ha reportado el inicio de intervenciones en 15 sedes educativas (ID 44, ID 65, ID 183, ID 186, ID 182, ID 184, ID 187, ID 175, ID 46, ID 3, ID 165, ID 59, ID 178, ID 93, ID 163). En comités de seguimiento se solicitó iniciar intervención cuanto antes con las sedes pendientes, y de esta forma dar cumplimiento al alcance contractual en el plazo establecido.

Interventoría y supervisión han solicitado la implementación inmediata de contingencias para nivelar la programación. Contratista ha informado que algunos atrasos se deben a que las intervenciones no se pueden ejecutar simultáneamente al interior de algunas sedes, con el fin de evitar afectaciones en la formación.

Continúan presentándose condiciones particulares de orden público en el departamento del Cauca, al igual que afectaciones en vías a causa del invierno, específicamente para la sede Huisitó en el Tambo.

Interventoría remitió informe de apremio. Supervisión elaboró concepto revisado por la jefatura de contratación derivada, y remitió el 2 de mayo de 2024 solicitud de inicio del procedimiento de apremio a la contratante. Por su parte la contratante notificó a contratista y aseguradora el inicio del procedimiento el 14 de mayo de 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Mejoramiento IE Santa Teresita - Rosas




Mejoramientos IE Olaya (Sede Principal) - Balboa




Mejoramientos CE Buenos Aires (Sede Capitanes) - Balboa




CE Guillermo León Valencia (Sede La Despensa) – Rosas




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CE Guillermo León Valencia (Sede El Altillo) – Rosas





IE Alfonso Cordoba (Sede Las Yerbas) – Rosas





IE Alfonso Cordoba (Sede Bellavista) – Rosas





IE Santa Rita (Sede Principal) – La Vega





Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE Comuneros (Sede principal) – Popayán





IE Nuestra Señora de los Remedios – Bolívar





IE Alfonso Cordoba (Sede el Retiro) – Rosas





IE Huisitó – El Tambo (Afectaciones en la vía)







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

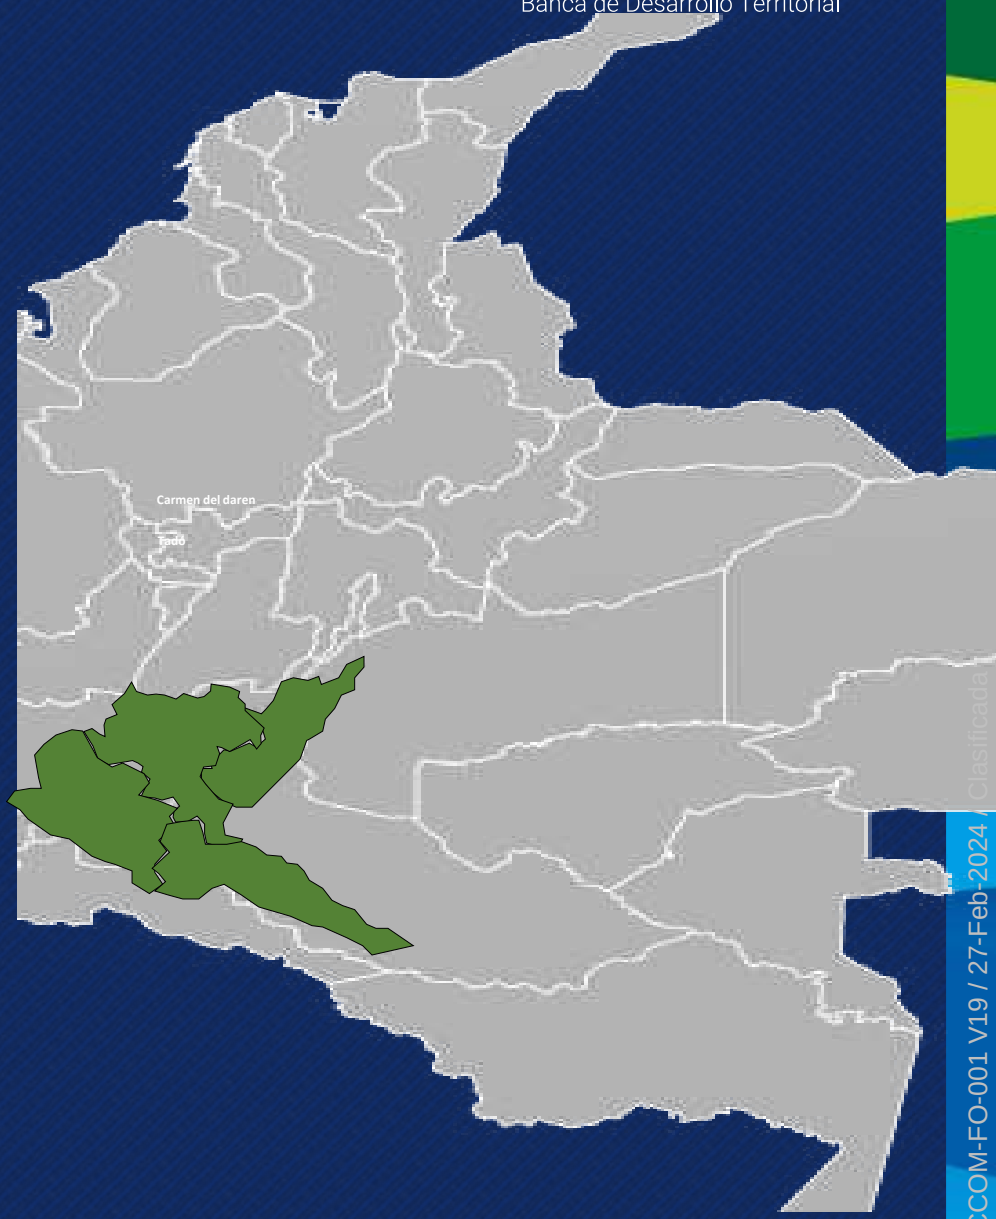

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.918.276.400 **I:** $318.105.088	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/09/2024	**Progr**	47,35%	
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	44,40%	**Ejecut**	40,88%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	37,50%	**En ejecución normal**		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	0
Cauca	Piamonte	Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	0
Cauca	Piamonte	Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	2	28	6
Cauca	Piamonte	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	1	1	2
Cauca	Piamonte	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	0
Huila	Acevedo	Institución Educativa Bateas	Bateas	0	3	8
Nariño	Pasto	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	7	0
Nariño	El Rosario	Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	7	0	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	0
Nariño	Barbacoas	Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombon	0	2	2
Nariño	Ipiales	Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	0
Nariño	Mallama (Piedrancha)	Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	1	2
Putumayo	Puerto Asís	I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	1	2
Putumayo	Pto Leguízamo	IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS		2	
Putumayo	Orito	Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	2
Putumayo	Puerto Asís	E. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	0

Avance General: En la semana del 16 al 23 de JUNIO de 2024.
Avance general Componente I: Terminado 04/04/2024 y recibido
Avance general por Sede Componente II: Se inician 10 de 18, faltando 8 de inicio.
Se solicitará
ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: 23,47% Inicio 20/05/2024
ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024
ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: 100% Inicio 22/04/2024
ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: 73,26% Inicio 15/05/2024
ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI: 0% Inicio aproximado 24/06/2024
ID41 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE: 0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID57 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL PROGRESO: 0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE:0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS: 25,41% Inicio 27/05/2024
ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON: 0% Inicio aproximado 25/06/2024
ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024
ID125 Piamonte, PIAMONTE (sede principal): 0% Inicio 25/06/2024
ID127 Orito, ESC RUR MIX ALTO ORITO: 0% Inicio 25/06/2024
ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: 91,30% Inicio 05/04/2024
ID149 Mallama(Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: 100% Inicio 17/04/2024
ID172 Puerto Asís, SEDE PRINCIPAL: 0% Inicio 25/06/2024
ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL: 0% Inicio 17/06/2024
ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: 61,53% Inicio 21/05/2024

Se presentan dificultades en 3 instituciones de ID 41, 57 Y 172 con Rector dado que en sede principal quiere aulas nuevas y su matrícula no da para estas y no se encuentra de acuerdo con la implementación de sistemas constructivos alternativos. Se solicita reunión para el 25/06/2024 de 9:00 am a 10:00 am

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: Inicio 20/05/2024






ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA: Inicio 15/05/2024







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA: 100% Entregada 14/05/2024






ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS: Inicio 22/04/2024






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO: 100% Inicio 15/05/2024









ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES: Inicio 05/04/2024









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL: Inicio 21/05/2024






ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA: Inicio 17/04/2024






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
PROYECTOS TERMINADOS
No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Junio 25 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

PROYECTOS TERMINADOS - Grupos 3, 4 y 6

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE
3	Magdalena	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
3	Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
3	Magdalena	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
3	Magdalena	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
3	Magdalena	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
4	Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
4	Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
4	Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
4	Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
4	Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
6	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
6	Cesar	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
6	Cesar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
6	Cesar	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION

OLA INVERNAL - GRUPO 3, Departamento del Magdalena

REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE BACHILLERATO - SEDE PRINCIPAL

MEJORAMIENTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO - SEDE ENOC MENDOZA RIAZCO

MEJORAMIENTO



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM EL TRIUNFO

MEJORAMIENTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE BACHILLERATO - SEDE PRINCIPAL

AULA NUEVA



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS - ERM ISLA DE CATAQUITA

MEJORAMIENTO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE PRIMARIA - GREGORIO GARZÓN

MEJORAMIENTO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

OLA INVERNAL - GRUPO 4, Departamento de Bolívar

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE DEPARTAMENTAL DE LA PACHA - SEDE ERM MARIA AUXILIADORA

AULA NUEVA



IE TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO – SEDE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO

MEJORAMIENTO



IE DEPARTAMENTAL DE LA PACHA – SEDE ERM LA PACHA

AULA NUEVA



INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME – SEDE PRINCIPAL

AULA NUEVA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA– SEDE SAN LUIS

MEJORAMIENTO



IE DEPARTAMENTAL DE LA PACHA - SEDE ERM MARIA AUXILIADORA

AULA NUEVA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

OLA INVERNAL - GRUPO 6, Departamento de Cesar

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REGISTRO FOTOGRAFICO



IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE EL VALLITO

MEJORAMIENTO



IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE LA ESTACION

AULA NUEVA



IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE LA ESPERANZA

MEJORAMIENTO





IE OCTAVIO MENDOZA DURAN - SEDE SAN ANGEL

MEJORAMIENTOS – BAÑOS NUEVOS



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA - SEDE EL COSO

AULA MUEVA



IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ - SEDE PRINCIPAL

MEJORAMIENTO

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
