

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Octubre 04 de 2024

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha: Julio 31 de 2024

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23				$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 82.351.406,35	$ -		$ 82.351.406,35
sep-23	$ 108.927.246,74	$ -		$ 191.278.653,09
oct-23	$ 131.902.760,66	$ -		$ 323.181.413,75
nov-23	$ 144.907.033,92	$ -		$ 468.088.447,67
dic-23	$ 143.221.271,36	$ 468.088.448,00	13/12/2023	$ 143.221.271,03
ene-24	$ 133.626.379,48	$ 143.221.271,36	10/01/2024	$ 133.626.379,15
feb-24	$ 120.547.529,88	$ 133.626.379,15	12/02/2024	$ 120.547.529,88
mar-24	$ 117.745.976,50	$ 120.547.529,88	12/03/2024	$ 117.745.976,50
abr-24	$ 100.331.907,69	$ 117.745.976,50	10/04/2024	$ 100.331.907,69
may-24	$ 89.374.457,56	$ 100.331.907,69	11/05/2024	$ 89.374.457,56
jun-24	$ 76.820.331,89	$ 89.374.457,56	13/06/2024	$ 76.820.331,89
jul-24	$ 68.012.790,67	$ 76.820.331,89	15/07/2024	$ 68.012.790,67
TOTALES	**$ 1.317.769.092,70**	**$ 1.249.756.302,03**		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23		$ -		$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 443.947.650,01	$ -		$ 443.947.650,01
sep-23	$ 548.880.836,71	$ -		$ 992.828.486,72
oct-23	$ 436.008.307,20	$ -		$ 1.428.836.793,92
nov-23	$ 718.224.229,49	$ -		$ 2.147.061.023,41
dic-23	$ 788.090.860,63	$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	$ 788.090.860,04
ene-24	$ 427.858.051,59	$ 788.090.860,63	10/01/2024	$ 427.858.051,00
feb-24	$ 474.970.095,24	$ 427.858.051,00	12/02/2024	$ 474.970.095,24
mar-24	$ 478.495.863,61	$ 474.970.095,24	12/03/2024	$ 478.495.863,61
abr-24	$ 259.736.382,70	$ 478.495.863,61	10/04/2024	$ 259.736.382,70
may-24	$ 353.632.163,66	$ 259.736.382,70	11/05/2024	$ 353.632.163,66
jun-24	$ 266.323.590,41	$ 353.632.163,66	13/06/2024	$ 266.323.590,41
jul-24	$ 294.233.627,01	$ 266.323.590,41	15/07/2024	$ 294.233.627,01
TOTALES	**$ 5.490.401.658,26**	**$ 5.196.168.031,25**		
SALDO POR GIRAR	$ 362.246.417,68			

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

- # Rendimientos Financieros – Soportes de giro

Julio

Fecha Actual: 2024/07/17 | Hora: 09:33 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	22108	PGO001.00XD	2024/07/15	$343,143,922.30	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/07/15	10:24:24	10:35:04	KATHERIN PEREZ URUEÑA	2024/07/16	15:10:03	$343,143,922.30	$343,143,922.30

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	SERGIO ANDRES ARTETA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
50080465460	2024/07/15	$76,820,331.80	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	300054583	0000008300539 91	PAGOS		Procesado
50080465460	2024/07/15	$266,323,590.41	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	300054583	0000008300539 91	PAGOS		Procesado

Pagos De Contratos Derivados – Relación de Pagos

Educación

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE PAGOS Y GASTOS DEL PERÍODO
Fecha: Julio 31 de 2024


COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FUENTE	CONTRATO No / CONVOCATORIA No.	CONCEPTO	MONTO TOTAL (FACTURA - RET. GARANTIA - AMOR. ANTICIPO)
Nacion	PAF-MENAM-I-057-2023	Acta 4 COMPONENTE II	31.059.710,59
Nacion	PAF-MENAM-O-076-2023	Acta 1 COMPONENTE I	233.263.800,00
Nacion	PAF-MENAM-O-079-2023	Acta 1 COMPONENTE II	914.006.327,40
Nacion	PAF-MENAM-I-063-2023	Acta 1 COMPONENTE II	56.799.170,08
Nacion	PAF-MENAM-O-049-2023	ACTA 2 DEL COMPONENTE I	24.879.988,35
Nacion	PAF-MENAM-O-049-2023	ACTA 3 DEL COMPONENTE II	1.433.416.214,76
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	ACTA 2 DEL COMPONENTE I	11.711.995,18
Nacion	PAF-MENAM-I-052-2023	ACTA 6 DEL COMPONENTE II	38.904.932,87
Nacion	PAF-MENAM-O-053-2023	ACTA 4 COMPONENTE II	448.361.964,00
Nacion	PAF-MENAM-I-056-2023	ACTA 5 COMPONENTE II	7.841.716,34
Nacion	PAF-MENAM-I-058-2023	ACTA 7 COMPONENTE II	9.211.815,50
Nacion	PAF-MENAM-O-080-2023	ACTA 1 COMPONENTE I	230.757.660,00
Nacion	PAF-MENAM-O-080-2023	ACTA 3 COMPONENTE II	375.599.589,30
Nacion	PAF-MENAM-I-062-2023	ACTA 1 COMPONENTE I	102.522.042,63
Nacion	PAF-MENAM-I-062-2023	ACTA 3 COMPONENTE II	21.681.070,46
Nacion	PAF-MENAM-O-079-2023	ACTA 2 COMPONENTE II	663.202.437,30
Nacion	PAF-MENAM-I-063-2023	ACTA 2 COMPONENTE II	32.933.355,47
Nacion	PAF-MENAM-O-076-2023	ACTA 2 COMPONENTE II	589.780.158,30
Nacion	PAF-MENAM-I-064-2023	ACTA 2 COMPONENTE II	33.279.378,28
Nacion	REMUNERACIÓN	Cobro variable, Hito 2,3,4, 5, 6 y 7	528.103.317,87
TOTAL MUNICIPIO			**$ 5.787.316.644,68**

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Soportes de Pagos de Contratos Derivados

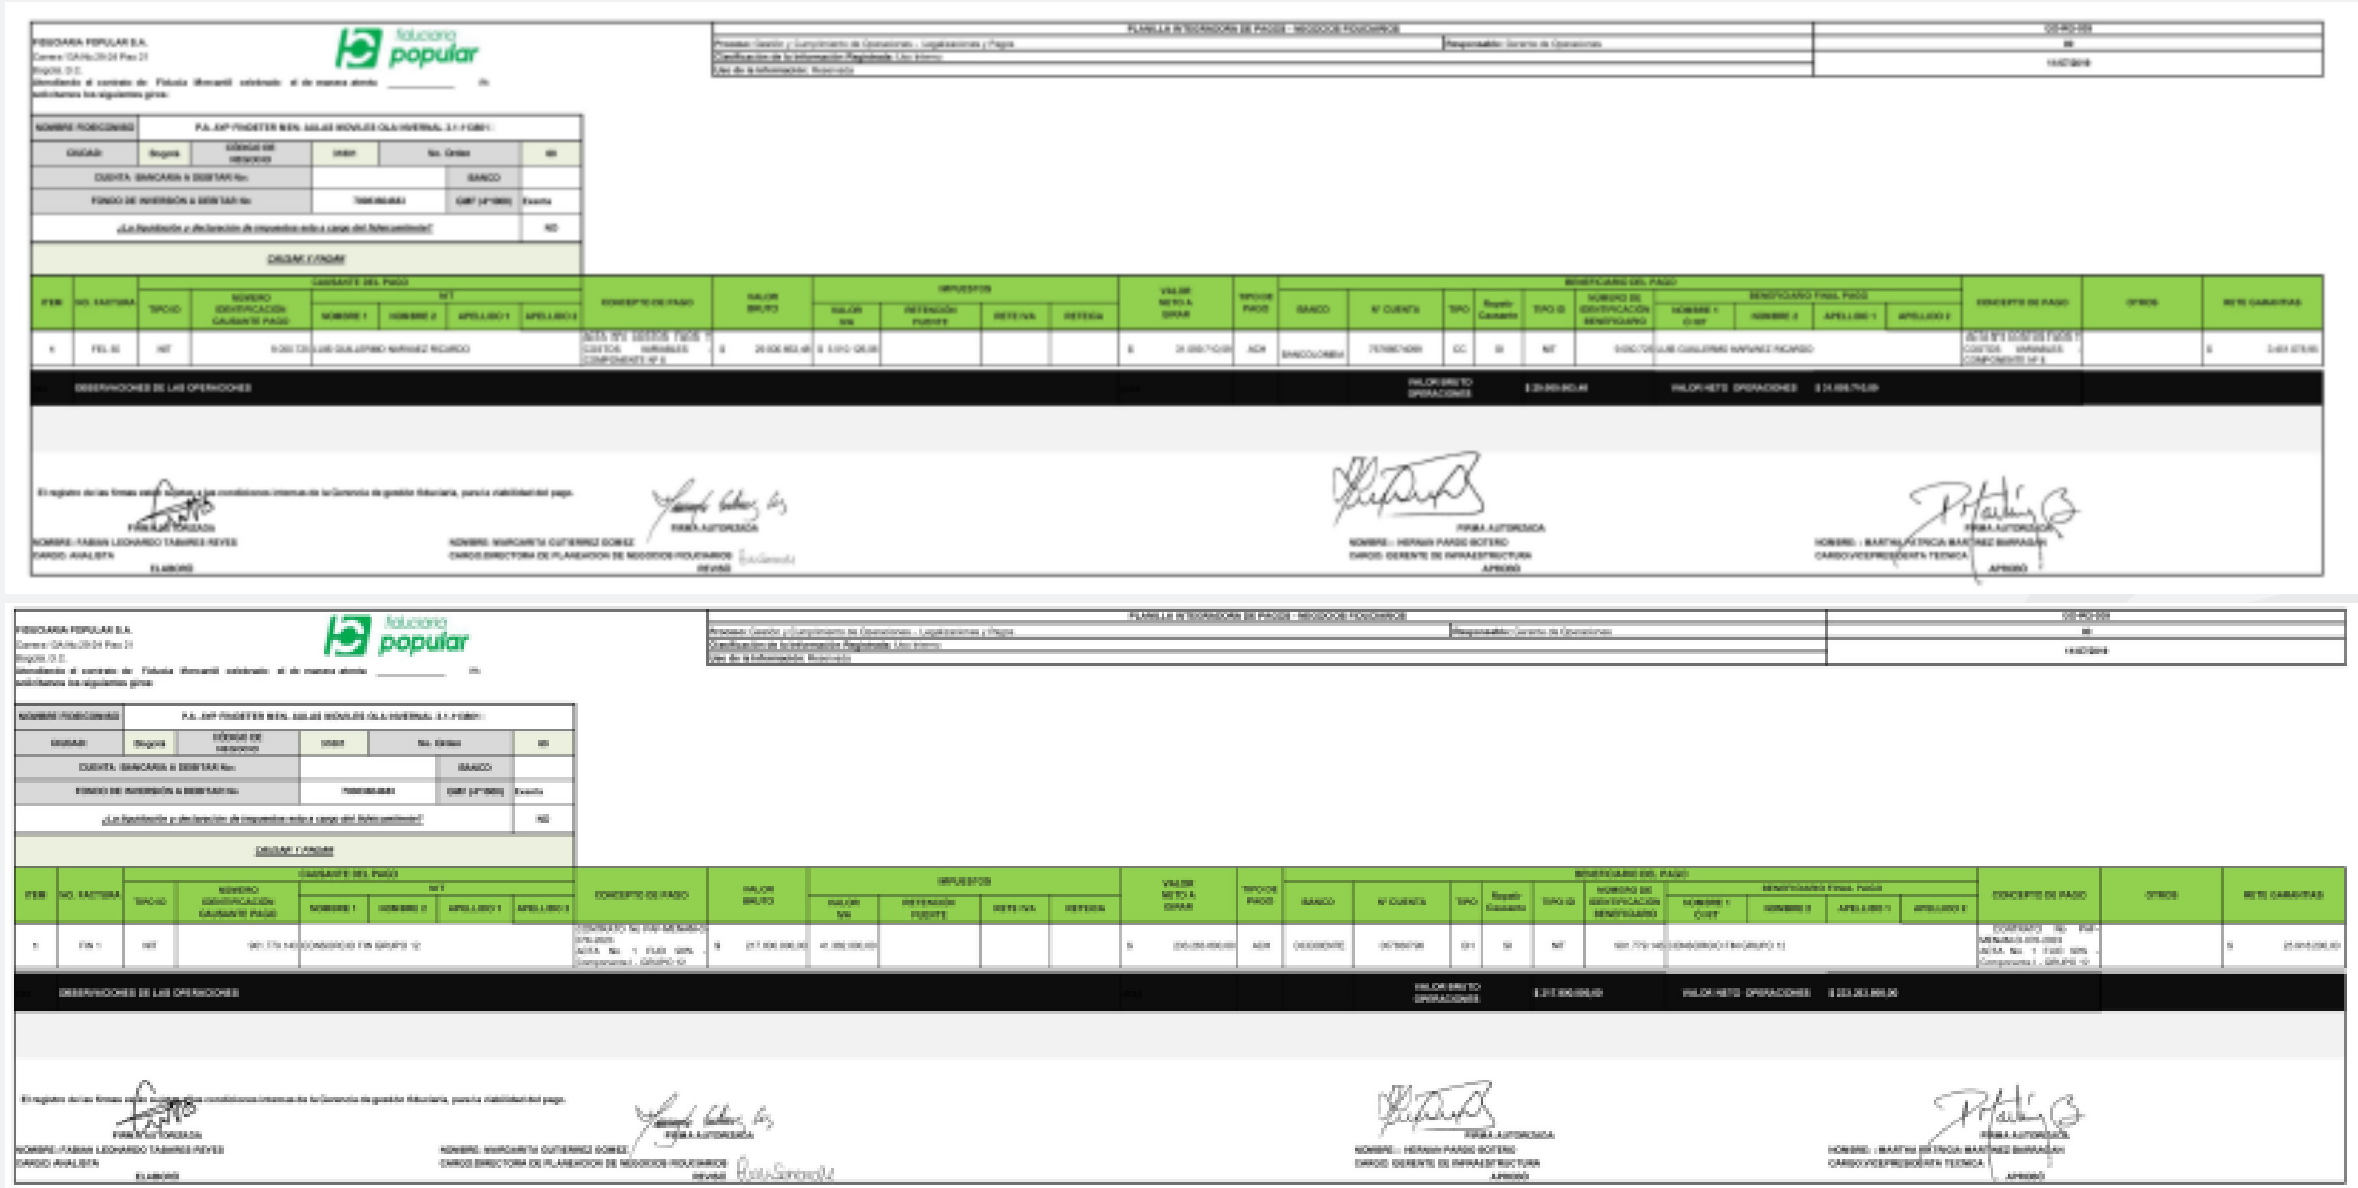


Contrato No. 4917031-2023

139 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/11/2024
Fecha Propuesta Fin: 01/05/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Estado Actual
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [97,50%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [86,70%] 14/11/2023 - 19/10/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En Obra [55,81%] 31/05/2024 - 30/10/2024
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [100%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [15 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	Estudios y Diseños[1,16%] 23/08/2024 - 08/12/2024
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [55,70%] 19/02/2023 - 03/11/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Obra [86,13%] 12/02/2023 - 28/10/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [71,54%] 20/02/2023 - 04/09/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	En legalización

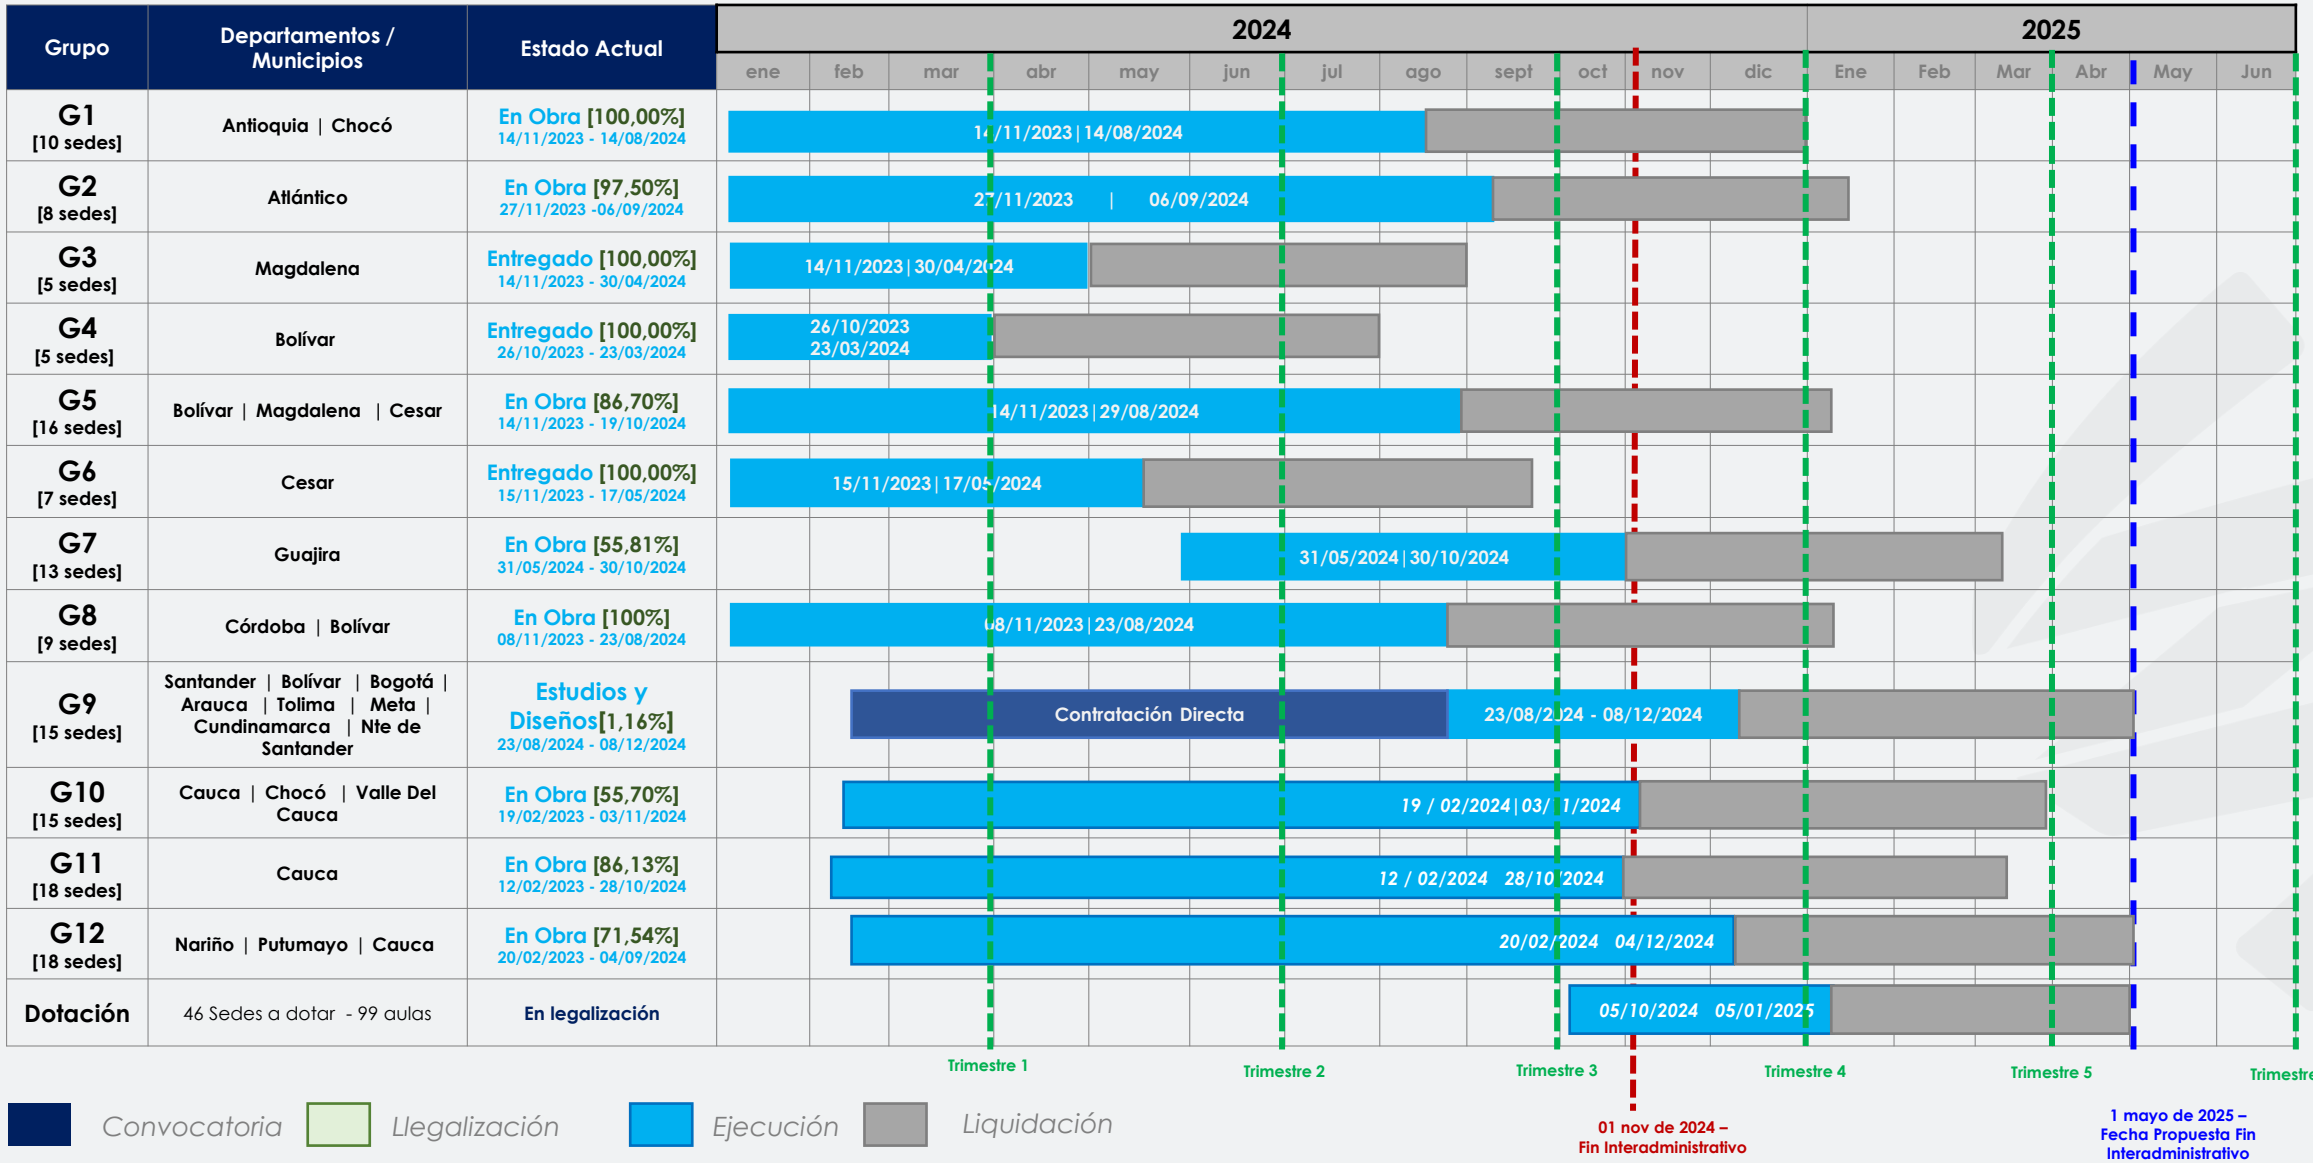

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

139 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 – Fin Interadministrativo

ENTREGADAS
79 sedes
56,83%

EN EJECUCIÓN
50 sedes
35,97%

POR INICIAR
2 sedes
1,44%

TERMINADAS
8 sedes
5,76%

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de Proceso de Contratación de Dotación

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada
17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:
Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:
DOTAESCOL SAS
Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

Suministro, entrega e instalación de dotación de mobiliario escolar en las aulas educativas nuevas de las sedes afectadas por la temporada de lluvias, incluyendo todas las actividades necesarias para la puesta en condiciones de funcionalidad. El suministro se debe realizar de acuerdo con los elementos que conforman la tipología de dotación así:

A. Aulas Preescolares: puesto de trabajo preescolar, cada uno compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.
B. Aulas Primaria: puesto para alumno primaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
C. Aulas Secundaria o Multigrado: puesto alumno secundaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
D. Para todas las Aulas: (1) juego de puesto de trabajo docente compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
E. Un (1) tablero alta resistencia para marcador borrable por aula.
F. Un (1) tablero móvil para aulas multigrado.
G. Un (1) juego tándem de tres (3) canecas por aula.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Septiembre 25 de 2024



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

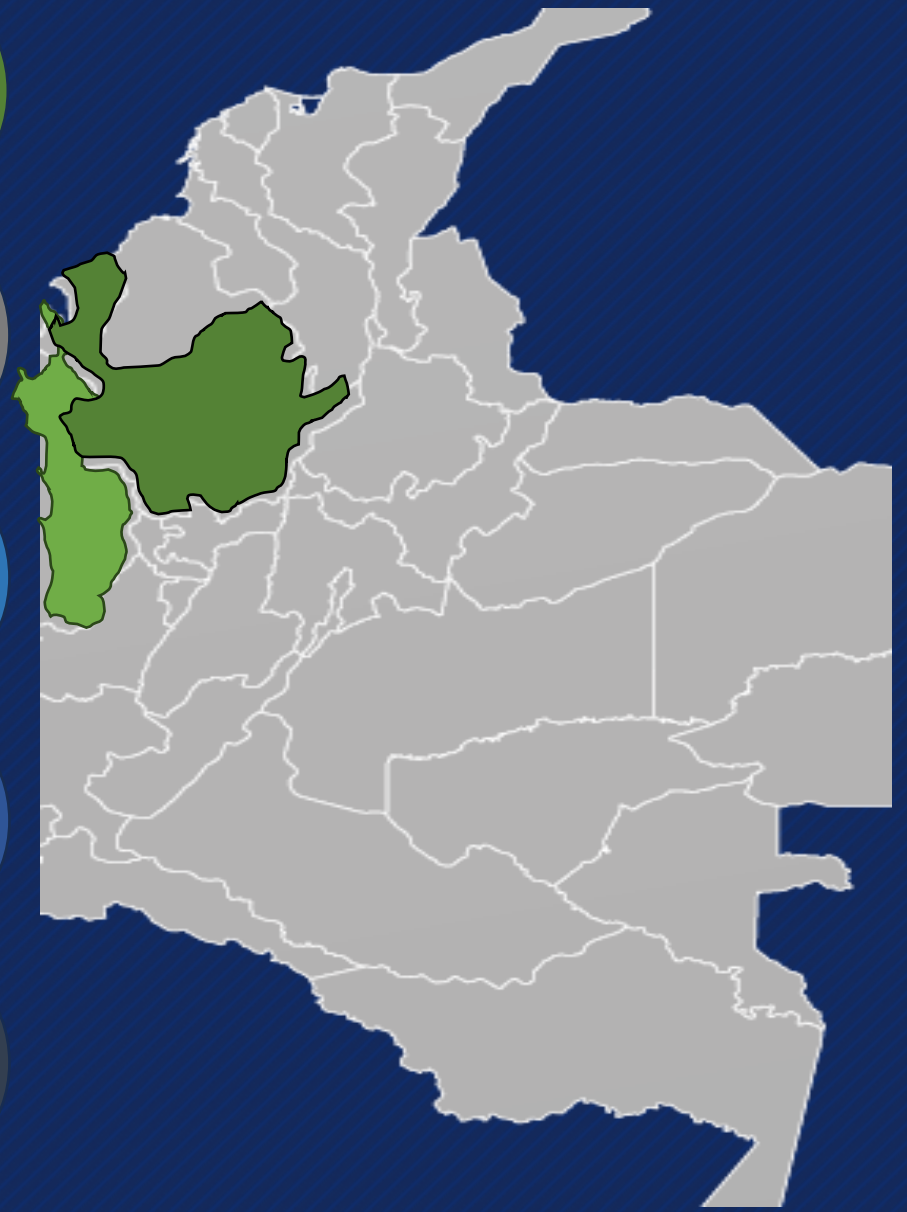

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ	27/2/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ	21/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4		14/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ	20/5/2024
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ	30/5/2024
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		6	3 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

100%
Porcentaje Programado

100%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con corte al 8 de septiembre de 2024, porcentaje programado 100% vs ejecutado 100%, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE. DEMETRIO SALAZAR: Se terminan las actividades de Mejoramientos aulas y baterías sanitarias - Se programo entrega del proyecto y suscripción AEP&SC el 21 de agosto, la Rectora y la SED municipal no recibieron manifestando que necesitan se amplie el alcance, se informó al MEN y solicito se remitiera el acta formal con la trazabilidad del alcance y se adelanta gestiones para realizar la suscripción AEP&SC, trámite que se ha realizado semana a semana, se realiza nuevamente reunión con la administración municipal, la CGR y el MEN el 20 de septiembre a las 9 am, en la cual se quedó por parte de la ETC y la IE. En presentar informe de observaciones frente a la intervención realizada para evaluar si aplican o no y posterior a esta poder definir la entrega y recibo del proyecto.
2. I.E PUEBLO NUEVO: Se terminan las actividades de construcción aulas y baterías nuevas - Se realiza entrega del proyecto y suscripción AEP&SC el 21 de agosto.
3. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, así mismo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de mayo del 2024 y suscripción AEP&SC
4. IE CHURIDO PUEBLO: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, cabe aclarar qué, el rector de la I.E previamente manifestó no querer hacer parte del proceso, por lo que designó a la secretaría de educación para los fines pertinentes. Se realiza instalación de la placa el 17 de mayo del 2024. y suscripción AEP&SC
5. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Se culminan actividades de intervención general aula nueva, mejoramientos de aulas y baterías sanitarias, entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se entregaron el 14 de mayo, Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024, y suscripción AEP&SC
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalacion placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 14 de marzo del 2024 y suscripción AEP&SC
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024 y se suscribe AEP&SC el 12 de mayo de 2024

Sumado a lo anterior, se inician los trámites de cierre del contrato y posterior liquidación

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO
ID No. 161

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 237.984.039,98
POBLACIÓN BENEFICIADA		97
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, mejoramiento puntual de red eléctrica e implementación de circulación entre bloques
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 54 M2 tipo multigrado, prefabricada.
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica general, accesorios hidrosanitarios y limpieza de enchapes.
FECHA DE ENTREGA		14 de mayo de 2024

Antes





Después







GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO

ID No. 118

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 265.366.273,19
POBLACIÓN BENEFICIADA		1670
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	23	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica y de aluminio, y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	11	• Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica e hidrosanitaria general, limpieza y cambio de enchapes, cambio de aparatos sanitarios y cielos falsos. • Instalación de 6 unidades sanitarias nuevas
FECHA DE ENTREGA		14 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS

ID No. 66

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 287.362.737,31
POBLACIÓN BENEFICIADA		767
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	14	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica y de aluminio, mejoramiento puntual de red eléctrica e implementación de red interna de manejo de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	5	Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios y accesorios hidrosanitarios, cubiertas, mampostería, carpintería metálica, red eléctrica general, y limpieza y cambio de algunas piezas de enchapes.
FECHA DE ENTREGA		21 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
ID No. 86

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 402.988.697,07
POBLACIÓN BENEFICIADA		567
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, aumento de nivel bloque 2, construcción de cárcamo para evacuación de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	6	Cambio de red hidrosanitaria, mantenimiento y cambio de aparatos sanitarios, adecuación de mampostería, realce de nivel y enchape de pisos, mejoramiento de cubiertas, carpintería metálica y red eléctrica general.
FECHA DE ENTREGA		17 de mayo de 2024

Antes



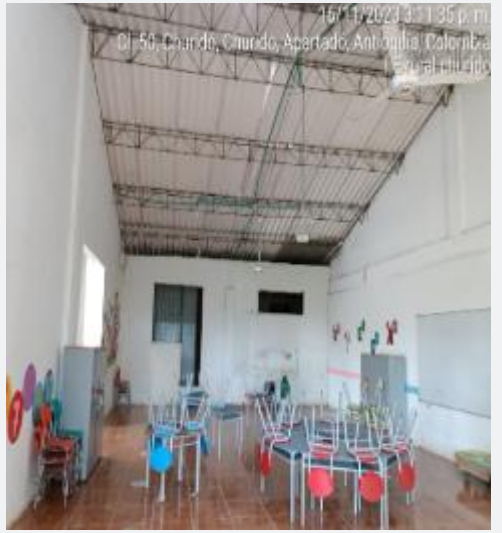



Después









GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA

ID No. 112

MUNICIPIO		Turbo - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 201.348.400,15
POBLACIÓN BENEFICIADA		581
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	3	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, mampostería, aumento de nivel de piso bloque principal (aulas y circulación), construcción de pompeyano al ingreso.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		14 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA

MUNICIPIO		Turbo - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 119.858.049,55
POBLACIÓN BENEFICIADA		387
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	4	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, acondicionamiento de cuarto técnico, implementación de andén de conexión al cuarto técnico y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	5	• Cambio de enchape y aparatos sanitarios, mantenimiento de cubierta y de red eléctrica e hidrosanitaria general, adecuación de mampostería y carpintería metálica • Instalación de 6 unidades sanitarias nuevas
FECHA DE ENTREGA		17 de mayo de 2024

Antes







Después









GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42

MUNICIPIO		Ciudad Bolívar - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 127.067.124,54
POBLACIÓN BENEFICIADA		84
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	6	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica, y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	3	Limpieza de aparatos sanitarios y enchapes, cambio de grifería y puesta en funcionamiento de los aparatos sanitarios, mejoramiento de la red eléctrica y mantenimiento de cubierta.
FECHA DE ENTREGA		27 de febrero de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150

MUNICIPIO		Tadó - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 155.995.803,88
POBLACIÓN BENEFICIADA		16
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, implementación de circulación entre bloques.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	4	Conexión al sistema hidráulico, mantenimiento de aparatos sanitarios y adecuación sistema sanitario con la instalación de pozo séptico y construcción de campo de infiltración para manejo de aguas residuales.
FECHA DE ENTREGA		05 de abril de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA

MUNICIPIO		Tadó - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 413.407.575,58 – En cierre de Balance
POBLACIÓN BENEFICIADA		140
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	6	• Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. • Construcción de cárcamos y cunetas
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	5	• Mejoramiento y mantenimiento de: cubiertas, mampostería, carpintería metálica, red eléctrica general y red hidrosanitaria. • Limpieza de enchape de pared, aparatos sanitarios y reemplazo de enchape de piso.
Baterías sanitarias nuevas	3	Construcción de 2 baterías sanitarias de 3,58 M2 y 1 baño PMR de 4,99 M2.
FECHA DE ENTREGA		21 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94

MUNICIPIO		Carmen del Darién - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 934.565.929,81 en Cierre de Balance
POBLACIÓN BENEFICIADA		38
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	N.A.	N.A.
Aulas nuevas	3	• Suministro e instalación de 2 aulas de 54 M2 cada una tipo multigrado y 1 aula múltiple de 18 M2, todas prefabricadas. • Construcción de acceso PMR y circulación. • Instalación de un sistema fotovoltaico independiente con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Baterías sanitarias nuevas	4	• Suministro e instalación de 3 baterías sanitarias de 3,45 M2 y de 1 baño PMR de 5,31 M2, todas prefabricadas. • Construcción de circulación • Construcción de pozo séptico y campo de infiltración para manejo de aguas residuales.
FECHA DE ENTREGA		21 de agosto de 2024

Antes





Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630 Inversión

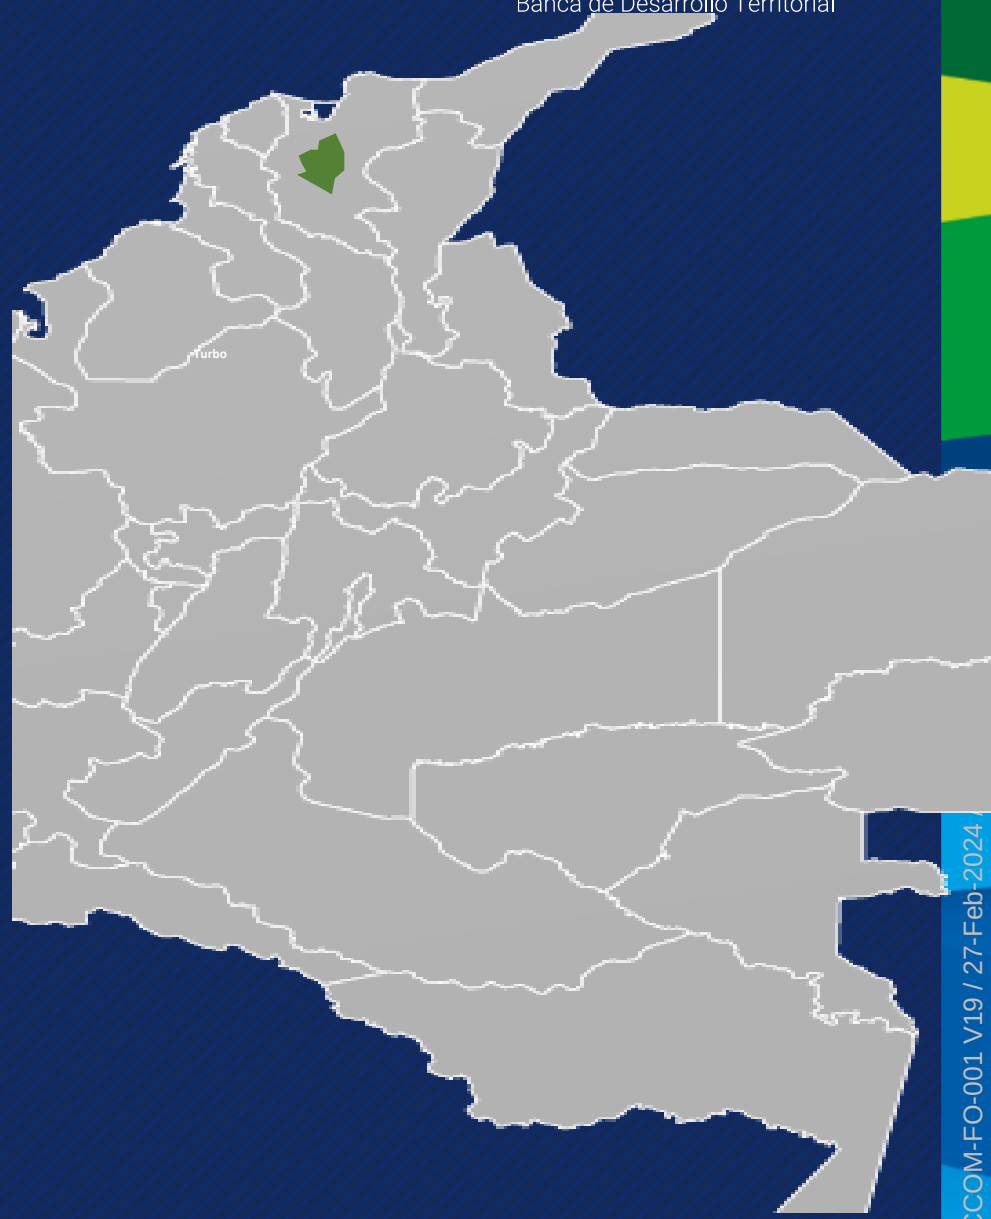

GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	1		2	16/09/2024
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3		1	13/09/2024
Atlántico	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA		15		16/08/2024
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL		8		18/07/2024
Atlántico		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA		5	8	11/07/2024
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE PRINCIPAL		16	8	16/07/2024
Atlántico		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE		22		17/09/2024
Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	SEDE MESOLANDIA		8		4/09/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

100%
Porcentaje Programado

97,50%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con fecha de terminación al 5 de septiembre, y en proceso de entregas y recibo a satisfacción, se resaltan las siguientes particularidades:

1. IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL – Soledad. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
2. IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Galapa. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
3. IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
4. IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
5. IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección, en actividades de terminaciones de batería sanitaria. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción
6. IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – Soledad. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
7. IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción. Se realizó visita por parte de la entidad territorial el 12 de septiembre en validación de atención de pendientes, se reportan faltantes.
8. IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.

Nota: Las fechas de terminación relacionadas corresponden a las fechas en las cuales se habilito el uso de los espacios dadas las necesidades institucionales, sin perjuicio de los detalles pendientes de atención entre otros documentos pendientes de entrega y aprobación de interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón






















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón





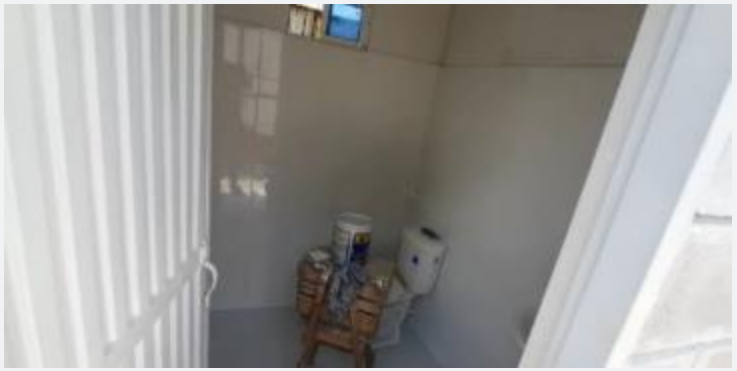


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE - Soledad





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153
  Interventoría $ 351.774.412
  Inversión Total
  $ 5.096.734.565

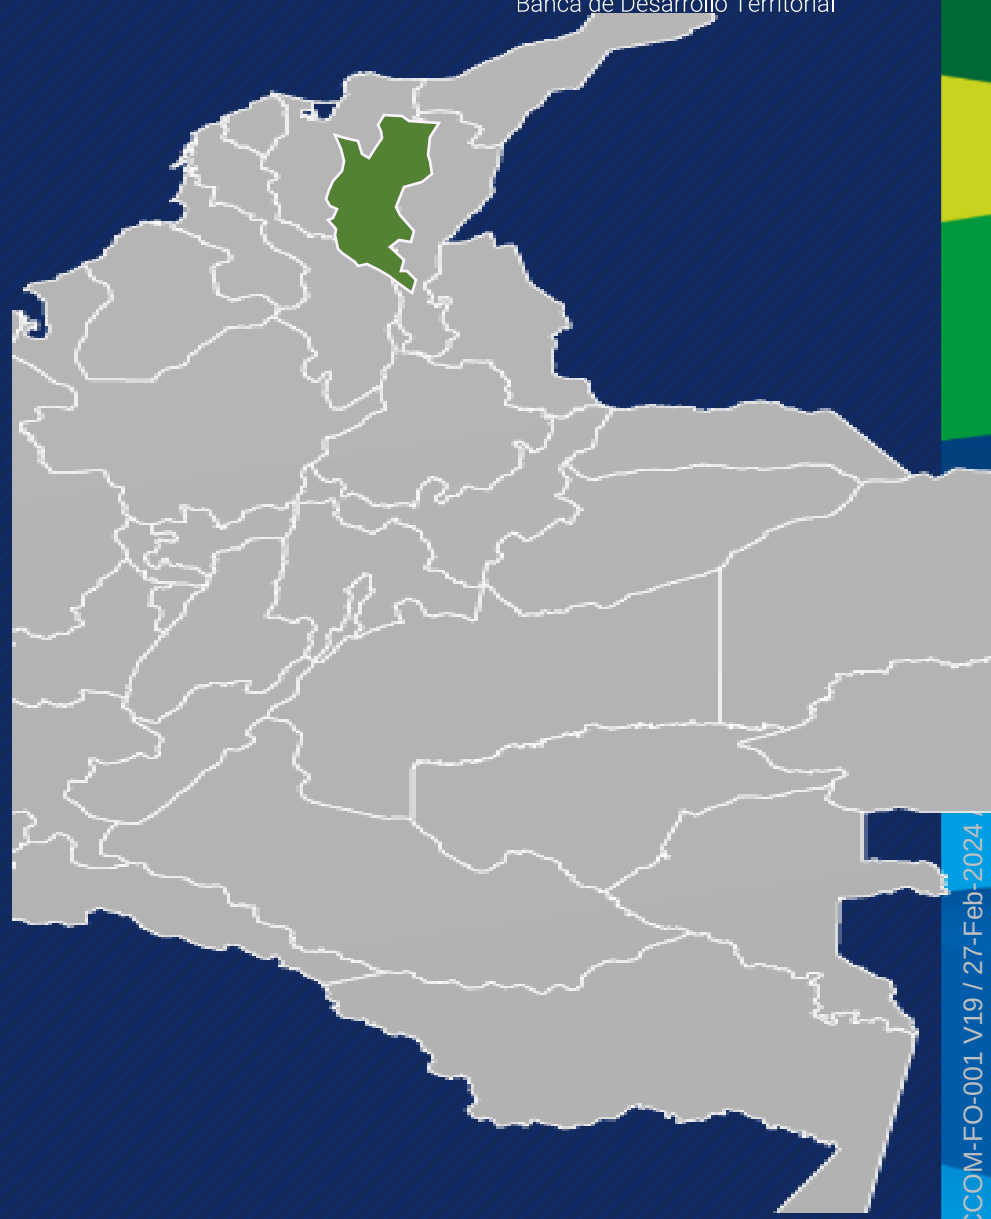

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
5.096.734.565	14-nov-23	28-dic-24	18-dic-23	12-abr-24	**Programado**	100,00%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**Entregadas entre 29 y 30 de abril de 2024**		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 16 al 23 de junio de 2024
Avance general Componente I: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede Componente II: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

Estado: En liquidación
Obra: En firmas de la Fiduciaria Popular
Interventoría: En recopilación de información de liquidación.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7
Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

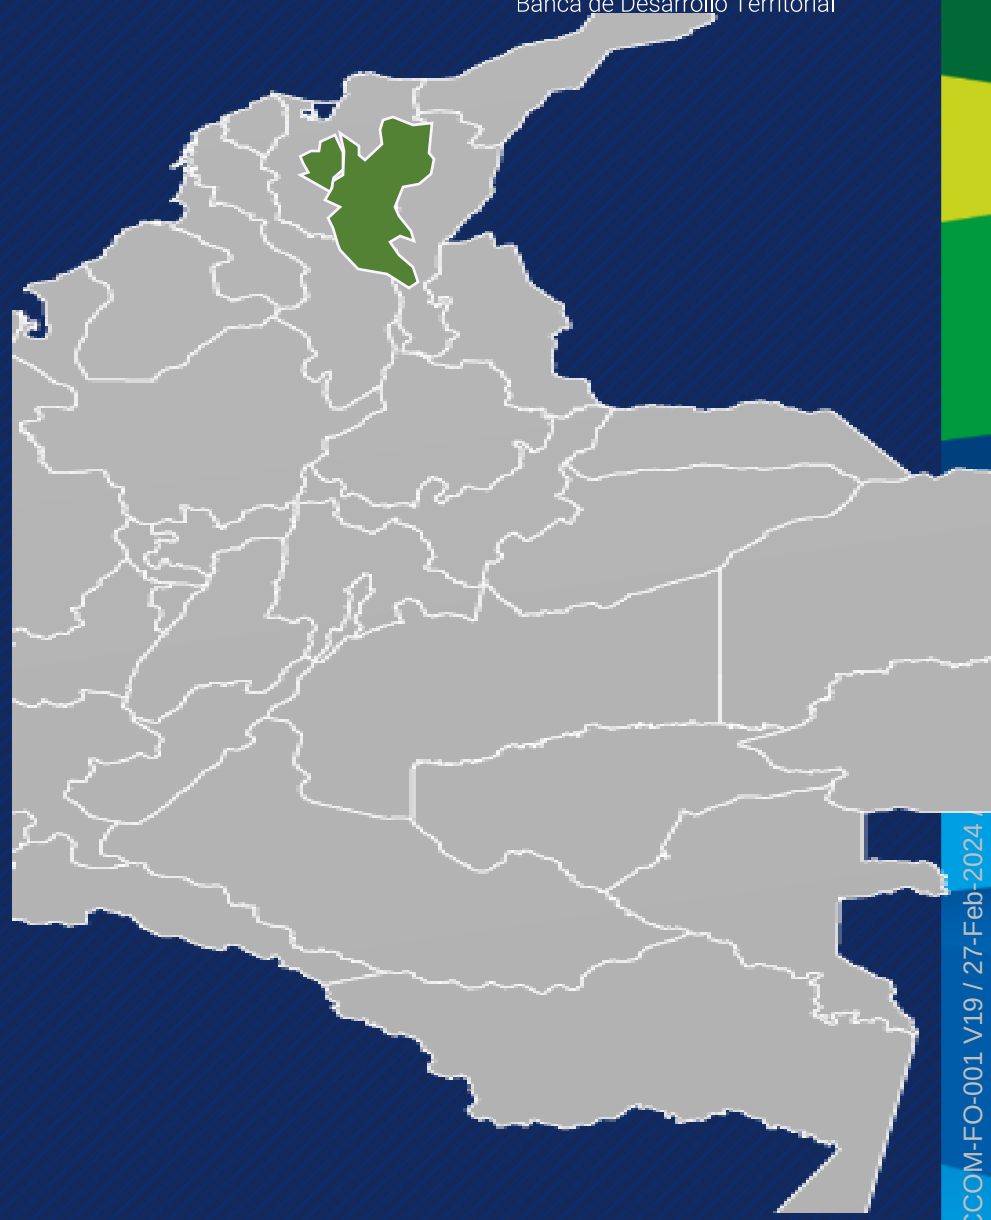

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO Proyectada C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4.744.960.153	24/10/2023	08-12-2023	08-12-2023	07-02-2024	**Programado**	100%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

En proceso de liquidación de obra e interventoría


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

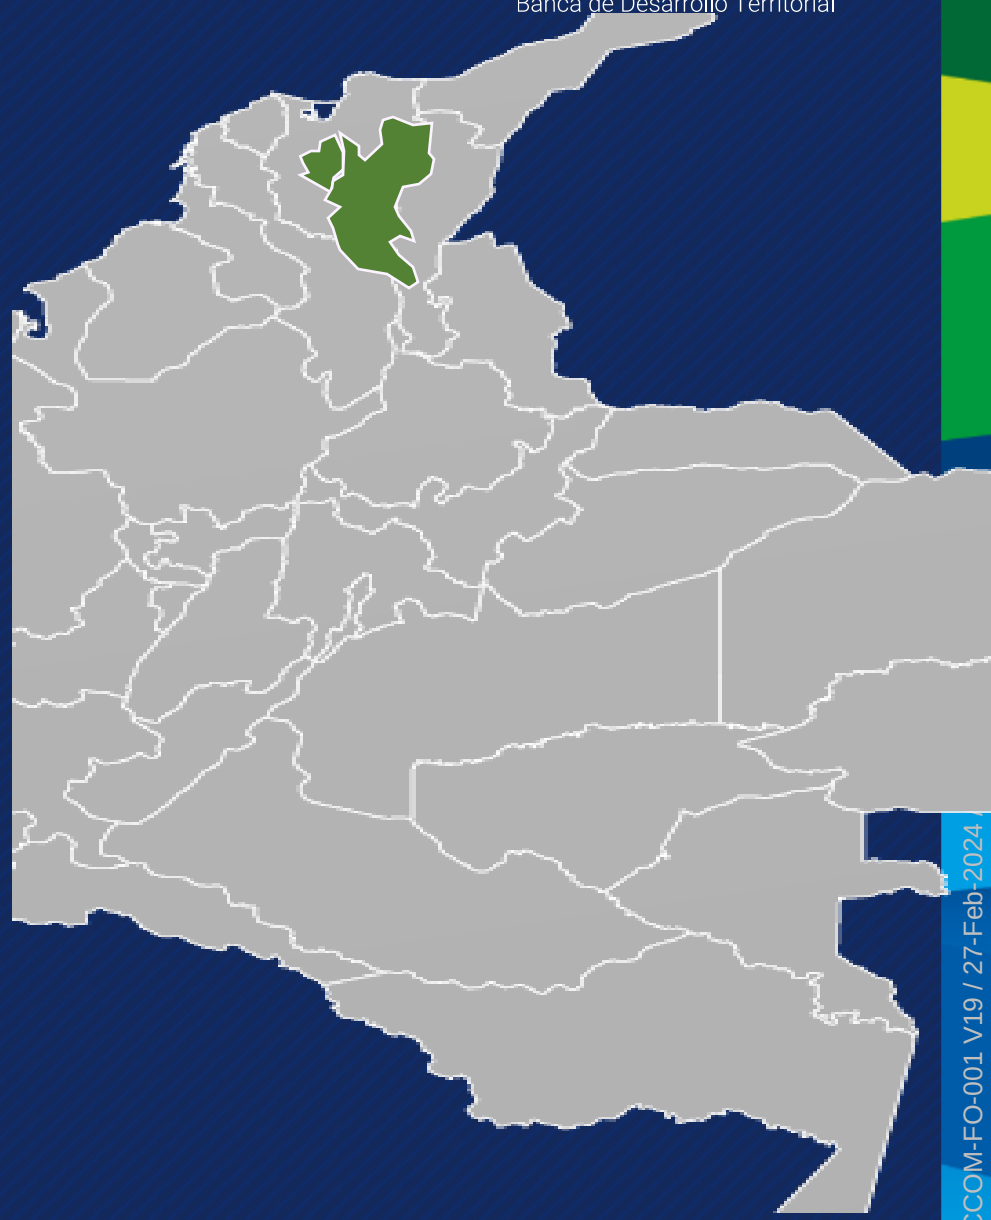

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4,102,044,984	14-Nov-23	29-Dic-23	16-Nov-23	29/08/2024	Programado	89,02%	-2,25%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	88,37%	Ejecutado	86,77%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	85,99%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

TRAMITES CONTRACTUALES:

En los días del 22 al 24 de agosto de 2024, se realizaron visitas a las diferentes sedes educativas y sobre la cual se contó con la participación de representantes del Ministerio de Educación Nacional, FINDETER, interventoría y el contratista de obra, y derivado de estas, se crea la necesidad de evaluar la inclusión de mayores cantidades para realizar la construcción de la batería sanitaria en la IE. CRISTIAN MORENO PALLARES - SEDE CHINELA, construcción que no fue incluida dentro del diagnóstico inicial ya que en su momento la sede no contaba con la disponibilidad de acometida hidráulica que garantizara su funcionalidad, derivado de lo anterior, se socializa al MEN los modificatorios a tramitar para los contratos derivados del G5, así:

CONTRATO No. PAF-MENAM-O-053-2023:

- Prórroga por un plazo de UN (1) MES, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención, incluida la construcción de la batería sanitaria de la IE. CRISTIAN MORENO PALLARES - SEDE CHINELA y de las demás sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 5
- Adicion por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.684.162,00) para la construcción de la batería sanitaria de la IE. CRISTIAN MORENO PALLARES - SEDE CHINELA, valor que será cubierto de los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023.

CONTRATO No. PAF-MENAM-I-056-2023:

- Prórroga por un plazo de UN (1) MES para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega del proyecto funcional según alcance priorizado al contrato.
- Adición por la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.000.000,00) INCLUIDA IVA, los cuales serán cubiertos por el contratista de obra y los mismos serán descontados de las facturas a tramitar del contrato de obra PAF-MENAM-O-053-2023, de acuerdo con lo indicado en su oficio No. CESJ-G5-048-2024 de fecha 12 de septiembre de 2024.

Por lo anterior se socializada la necesidad presente en el comité de seguimiento y se solicita al MEN se apruebe el trámite a realizar con el fin de poder darle los tiempos y recursos necesarios a los contratos derivados con el fin de poder continuar con la ejecución, terminación y entrega de las 16 sedes priorizadas dentro del GRUPO 5 del programa.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar- Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AVANCES DE OBRA POR SEDES - COMPONENTE II							
No.	**ID**	**SEDE**	**FECHA TERMINACIÓN**	**% ACUMULADO PROGRAMADO**	**% ACUMULADO EJECUTADO**	**% DEVIACION**	**OBSERVACION**
1	30	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
2	97	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE CHINELA	15/09/2024	100,00%	66,00%	-34,00%	En ejecución obras de aula, se está a la espera de la aprobación para la construcción de batería sanitaria.
3	98	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
4	101	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE LOS SERENOS	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
5	147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
6	148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
7	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL	21/09/2024	75,18%	65,00%	-10,18%	En ejecución obras de mejoramiento.
8	13	IE SANTA CRUZ DE BALSAMO - SEDE PRIMARIA	20/09/2024	99,82%	72,00%	-27,82%	En ejecución obra de mejoramiento, se tiene inconvenientes con suministro de materiales, debido a que la banca de la vía de acceso presenta deslizamiento, no permiten el tránsito de vehículos de carga
9	14	IE SANTA CRUZ DE BALSAMO - SEDE JARDIN INFANTIL	20/09/2024	97,59%	28,00%	-69,59%	En ejecución obra de mejoramiento, se tiene inconvenientes con suministro de materiales, debido a que la banca de la vía de acceso presenta deslizamiento, no permiten el tránsito de vehículos de carga
10	6	IE TEC AGRO Y ACUICOLA LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL	26/09/2024	94,93%	87,00%	-7,93%	En ejecución obras de mejoramientos, se ha tenido dificultades con el suministro de materiales
11	10	IE TEC AGRO Y ACUICOLA LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITO	26/09/2024	78,35%	56,00%	-22,35%	En ejecución obras de mejoramientos, se ha tenido dificultades con el suministro de materiales
12	9	IE TEC AGRO Y ACUICOLA LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA	28/09/2024	89,81%	80,00%	-9,81%	En ejecución obras de mejoramientos y aula nueva, se ha tenido dificultades con el suministro de materiales
13	43	IE TEC PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMI SEDE PLAN BONITO	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	En ejecución 1 aula nueva en sistema prefabricado, pendiente la instalación de carpintería metálica
14	32	IE DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE LA ISLITA	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
15	133	IE DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE INMACULADA CONCEPCION	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
16	24	IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS	20/09/2024	98,72%	85,00%	-13,72%	En ejecución 1 aula nueva, batería sanitarias y mejoramientos

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA - ANTES









IE CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA - DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL - ANTES









CE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL- DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM PRIMARIA - ANTES






IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM PRIMARIA- DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL - ANTES









IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL- DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL- DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS- DURANTE





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA- DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE TEC PESQUERA PLAN BONITO - ANTES









IE TEC PESQUERA PLAN BONITO- DURANTE







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS - ANTES









IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS - DURANTE







Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.496.849.571,44 I: $200.301.842,00	15-nov-23	30-dic-23	30-nov-23	29-abr-2024	**Programado**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**En proceso de cierre contractual y liquidación.**		

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1 - Mejorada	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	8	1 - Mejorada	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1 - Nueva	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

Las entregas de las sedes educativas se realizaron en las siguientes fechas:

- ID No. 79 – 02/05/2024
- ID No. 45 – 04/05/2024
- ID No. 75 – 15/04/2024
- ID No. 74 – 10/05/2024
- ID No. 77 – 15/05/2024
- ID No. 4 – 16/05/2024
- ID No. 48 – 17/05/2024

PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

Contrato de obra:

- Se radicó el acta de liquidación junto con sus anexos al grupo de liquidaciones por Prisa INC 2024-001373, se devolvió el acta con las observaciones subsanadas e incluyendo la actualización y aprobación de pólizas contra acta de entrega y recibo a satisfacción, el grupo de liquidaciones informó que el acta se encuentra en revisión jurídica.

Contrato de interventoría:

- Se radicó el acta de liquidación junto con sus anexos al grupo de liquidaciones por Prisa INC 2024-001503, se encuentra en espera de observaciones de la profesional asignada.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

13
Proyectos

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.158.777.879 I: $295.239.000	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	30/10/2024	Progr	63,84%	-8,03%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100,00%	Programado	64,19%	Ejecut	55,81%	
	Ejecutado	100,00%	Ejecutado	55,10%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	KASICHE	1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN KASPOLIMANA	1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA	ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA CAMPANA	0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	WAYUUMAANA	0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA ESTRELLA	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN PRINCIPAL	1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	COOPERATIVO	0	7	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	JOSÉ ANTONIO GALÁN	0	0	6
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	APUNIMAANA1	0	8	0
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	WAKUAPAMANA	0	9	6
TOTALES				8	36	24

Avance General: En la semana del 16 sept al 22 de sept de 2024.
Avance general Componente I: 100%
Avance general por Sede Componente II: - 4,46%

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 47,73%
ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 29.46%
ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 55.49%
ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 22.12%
ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 49.10%
ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%
ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%
ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 38.51%
ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 41.78%
ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%
ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 32.25%
ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%
ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 65,03%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

9
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$6.161.470.280 **I:** $441.204.280	08/11/2023	23/12/2023	24/12/2023	08/07/2024	**Progr**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100,00%	**Ejecut**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100,00%			

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	Buenos Aires	0	6	6
Bolívar	María la Baja	Técnica Agroindustrial de Flamenco	Níspero	0	8	8
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0

Avance General: Fueron recibidas las nueve sedes alcance del contrato, actualmente el proyecto está en cierre documental para posteriormente iniciar el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Entrega técnica el 14 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: Entrega técnica el 28 de junio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** Entrega técnica el 30 de julio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: Entrega técnica el 21 de agosto 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.810.476.306,00 I: $313.800.000	23-Ago-24	08-oct-24	08-oct-24	08-dic-24	**Programado**	4,04%	-2,88%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	70,00%	**Programado**	0%	**Ejecutado**	1,16%	
	Ejecutado	19,87%	**Ejecutado**	0%	**En ejecución componente I**		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS	ID MEN
Santander	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	4	9	Si aplica	7
	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	NA	1	Si aplica	17
	Barrancabermeja	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	3	3	2	141
Bolívar	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	NA	2	Si aplica	20
	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	1	1	Si aplica	123
			.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	NA	12	5	124
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	NA	8	4	33
		COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	NA	4	Si aplica	136
Arauca	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA	LA PAVA	NA	2	1	56
	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	NA	7	3	138
Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	1	1	2	67
			EL BRASIL	1	1	2	100
Meta	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	5	2	8	96
Cundinamarca	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	1	1	2	104
Norte de Santander	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	NA	1	Si aplica	132

Avance General: Se suscribió el acta de inicio del contrato y componente I el 23/08/2024, el contratista y la interventoría realizaron visitas y se encuentran en ejecución de diagnósticos, definición de alcances y realizando el presupuesto de las sedes educativas.

Avance por sede Componente I:

ID No. 132, 56 y 138: Diagnóstico entregado y aprobado, se encuentra en revisión el presupuesto por la interventoría.
ID No. 7: Diagnóstico entregado a la interventoría y con observaciones, se encuentran realizando el diseño arquitectónico y análisis de materiales para las aulas nuevas.
ID No. 17: Diagnóstico entregado a la interventoría y con observaciones, se analizó que las dos (2) aulas existentes requieren mejoramiento, se analizan las demás actividades con este alcance.
ID No. 20: Diagnóstico entregado a la interventoría y con observaciones, se está ajustando y complementando de acuerdo con observaciones de la interventoría.
ID No. 123: Diagnóstico entregado a la interventoría y con observaciones, se verifica que el aula existente corre riesgo de inundación por un río cercano, por lo cual, se analiza instalar un aula en palafito.
ID No. 124: Diagnóstico entregado a la interventoría y con observaciones, están en revisiones para mejorar las baterías sanitarias y cuantas se requieren nuevas, se está ajustando y complementando de acuerdo con observaciones de la interventoría.
ID No. 104: Diagnóstico entregado a la interventoría y con observaciones, se encuentran realizando el diseño arquitectónico y análisis de materiales para las aulas nuevas.
ID No. 67 y 100: Sedes por reubicar, se analizó que se requieren actividades adicionales a la instalación de las aulas y baterías sanitarias como zona del profesor, cocina, redes de servicios públicos, circulaciones, cerramiento, entre otros. Por lo anterior, se está en proyección de presupuestos con las actividades complementarias a la instalación del aula y batería sanitaria en los nuevos predios, requeridas para el funcionamiento de la sede.
ID No. 96: La IE manifestó que no están de acuerdo con instalación de aulas prefabricadas, se realizó el diagnóstico y se está proyectando una reunión para informar los beneficios de las aulas y las obras adicionales a realizar en la sede – Esta sede tiene aulas con malas condiciones estructurales.
ID No. 141, 33 y 136: Sedes por retirar, se encuentra en revisión la solicitud de retiro.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 6.753.158.527,2 Inversión - MEN

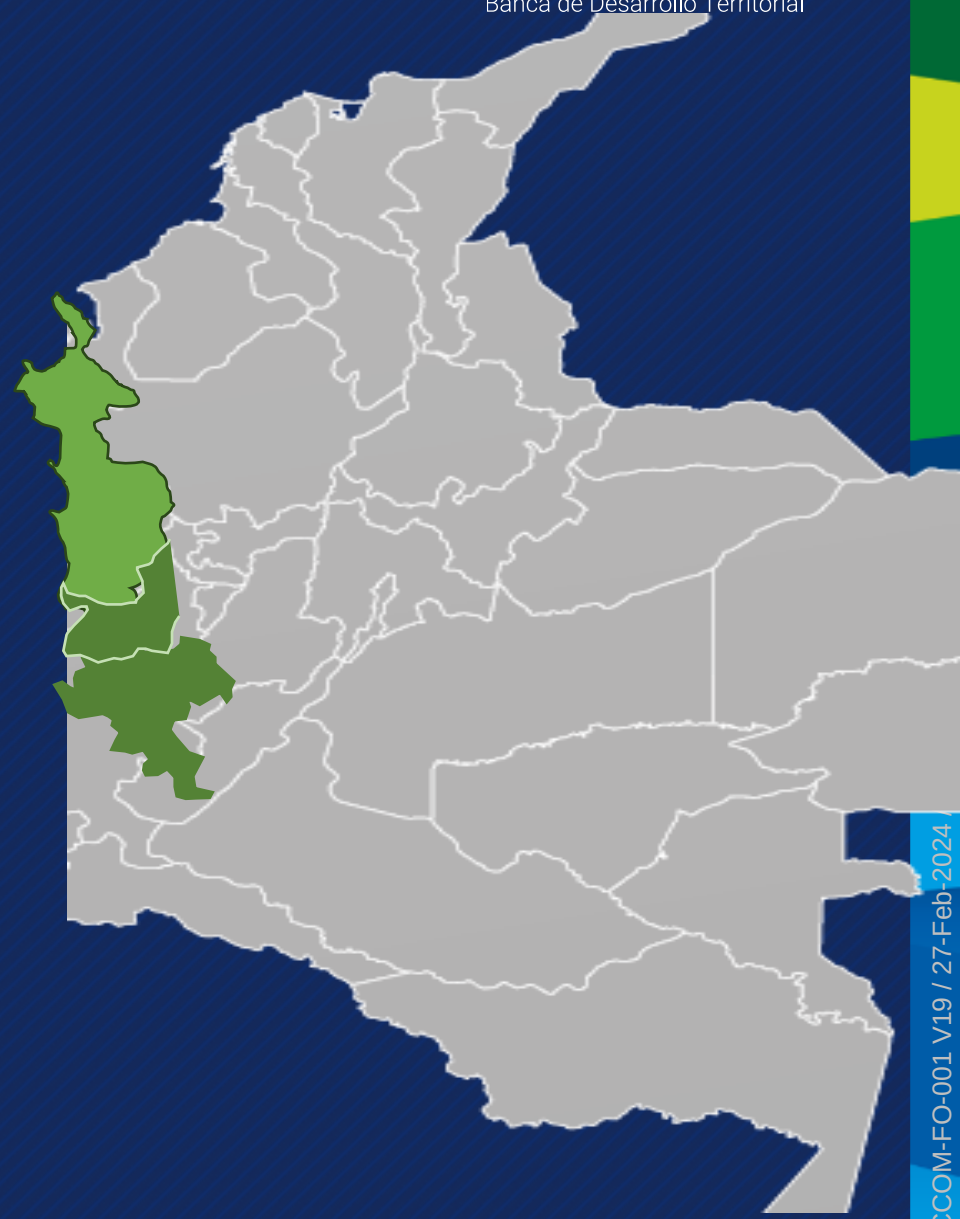

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	SUAREZ	IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	TORIBIO	IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	3/11/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/7/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	3/11/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	3/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	30/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	30/10/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	30/9/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

66,76%
Porcentaje Programado

55,70%
Porcentaje de avance

11,06%
Porcentaje de atraso

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Con corte al 15 de septiembre el avance general del contrato es 58.09% programado y 53.22% ejecutado
COMPONENTE 2:

Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE PRINCIPAL – Se continua ejecución de actividades de mantenimiento parcialmente por bloques en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora. Se han intervenido aulas con desmonte y cambio de cubiertas, resanes sobre muros, entre otros.
2. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA. Se continua con actividades de mejoramientos sobre muros, cubiertas, pisos y excavaciones y figurado y armado de aceros para cimentación aulas nuevas.
3. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – se programarán actividades una vez se terminen las obras de mejoramiento sobre la sede principal y de esta forma reubicar los niños para intervenir obra, en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora.
4. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA HONDA – Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y se suscribe AEP&SC.
5. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA PLANTA - Se continúan actividades de mejoramiento de aulas y construcción aula nueva.
6. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE SAN CRISTOBAL COLON – Obras de mejoramientos terminadas y se está realizando la programación de entregadas al rector y suscripción AEP&SC.
7. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JHON F. KENNEDY - Desmonte de teja, desmonte de aparatos sanitarios, reparación de pañetes y pintura muros, mantenimiento estructura de cubierta, instalacion cubierta y caballete, mantenimiento de puertas metálicas.
8. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO – Obras de mejoramientos terminadas y se está realizando la programación de entregadas al rector y suscripción AEP&SC.
9. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE PRINCIPAL - Se continúan actividades de cambio de cielo raso, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, y mejoras de acabado.
10. IE LA PLAYA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL – Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, y se realiza la suscripción del AEP&SC el 14 de agosto
11. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE DE SAN JOSE (HUACA) – Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal, adicional el inicio de actividades se está viendo afectado por temas de orden público y exigencias de las AUC para la comunidad, se realizó reunión con el rector y comunidad con el fin de buscar apoyo para poder ingresar a la zona a ejecutar las obras y se llega a un acuerdo y la semana del 9 al 13 de septiembre realizan nuevas exigencias en mayores costos mano de obra y transporte, proceso que se está siendo revisada a través del balance del proyecto, se tenía proyectado el inicio de actividades el 16 de septiembre pero se debe realizar previo con la comunidad para poder definir intervención.
12. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SIRENA DEL MAR - Obras de mejoramientos terminadas, se programa entrega al rector y secretaria de educación, y suscripción del AEP&SC para la semana del 23 al 30 de septiembre
13. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SECUNDINO RIVAS - Se continúan actividades de mejoramientos, se programa terminación para el 30 de septiembre
14. IE DOMINGUILLO – SEDE PRINCIPAL – Se continua con actividades de figurado de acero construcción cimentación aulas, construcción zapatas y vigas de amarre entre otras.
15. IE DOMINGUILLO – SEDE DOMINGO LASSO - Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, y se realiza la suscripción del AEP&SC

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MARIA INMACULADA– DURANTE (FECHA INICIO 12/03/2024 - FECHA ACTUAL 15/09/2024)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO. – DESPUÉS (FECHA DE INICIO 09/04/2024 - FECHA DE ENTREGA 28/05/2024)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL SUAREZ. – DURANTE
(FECHA DE INICIO 16/05/2024 – FECHA ACTUAL 15/09/2024)











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE LA PLAYA TORIBIO. – DURANTE (FECHA DE INICIO 27/05/2024- FECHA ACTUAL 28/07/2024)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL. – DURANTE (FECHA DE INICIO 16/07/2024- FECHA ACTUAL 15/09/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JHON F. KENNEDY – DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024 - FECHA ACTUAL 15/09/2024)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE PRINCIPAL- DURANTE (FECHA DE INICIO 8/04/2024 - FECHA ACTUAL 15/09/2024)







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE JULIAN MENDOZA- DURANTE (FECHA DE INICIO 25/03/2024 - FECHA ACTUAL 8/09/2024 TERMINADA)



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA PLANTA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024 - FECHA ACTUAL 15/09/2024)








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE LA HONDA- DURANTE (FECHA DE INICIO 15/04/2024 - FECHA ACTUAL 04/08/2024) TERMINADAS

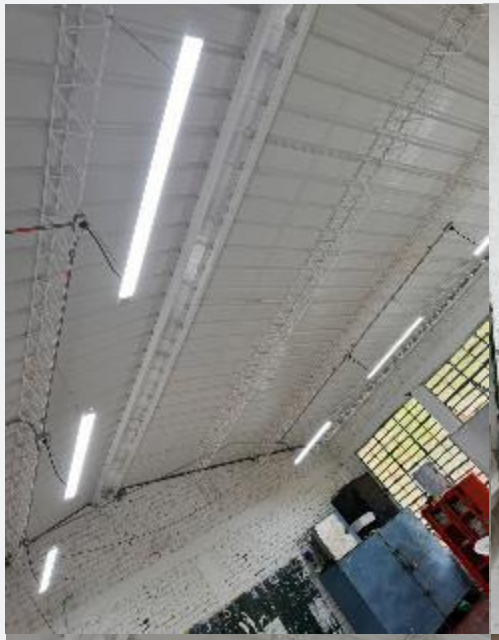









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE. SEDE CRISTOBAL COLON DURANTE (FECHA DE INICIO 20/06/2024 - FECHA ACTUAL 2/09/2024 TERMINADA)










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Sirena del mar
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 31/07/2024



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Sirena del mar
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 31/07/2024



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Sirena del mar
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 31/07/2024



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Sirena del mar
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 31/07/2024



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 17/08/2024



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 17/08/2024



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano – Choco- Sede Secundino Rivas
Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 17/08/2024



INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA -
Bahía Solano - Choco- Sede Secundino Rivas Fecha de inicio 20/05/2024
Fecha de terminación 17/08/2024



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.728.021.810 **I:** $ 358.032.903	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/10/2024	**Progr**	90,23%	-4,10%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	89,63%	**Ejecut**	86,13%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	85,28%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 M
El Tambo	I.E. Huisitó	Huisitó (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	13	6 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	6	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	17	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	3	2 M
		El Altillo	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	2	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

COMPONENTE 2

- 11 proyectos se encuentran entregados a los Directivos de cada sede.
- 2 proyectos están terminados, recibidos a satisfacción por interventoría y en gestión de entrega a Directivos de cada sede.
- 5 proyectos correspondientes a aulas móviles están en ejecución.

La IE Comuneros (Popayán) y la IE Santa Teresita (Rosas), se encuentran recibidas a satisfacción por interventoría y en gestión de entrega a Directivos.

Frente al atraso reportado, interventoría y supervisión han solicitado al contratista avanzar con mejor rendimiento hasta nivelar la programación. Contratista informó que la vía que comunica a la sede Huisitó del Tambo estuvo cerrada durante 2 semanas en agosto de 2024. De igual forma en la Sede la Fuente de la IE el Tambo de Bolívar los Directivos solicitaron suspender actividades durante una semana debido a eventos culturales en la sede. Estos aspectos han generado atrasos en el cronograma de actividades de estas sedes. Se evidencia mayor rendimiento en la sede Huisitó durante la anterior semana de ejecución.

Interventoría remitió informe de apremio. Supervisión elaboró concepto revisado por la jefatura de contratación derivada, y remitió el 2 de mayo de 2024 solicitud de inicio del procedimiento de apremio a la contratante. Por su parte la contratante notificó a contratista y aseguradora el inicio del procedimiento el 14 de mayo de 2024. Contratista presentó descargos, los cuales fueron remitidos a interventoría. Esta última informó que está elaborando el informe de cierre del apremio sin aplicación de multa, justificado en que el atraso está superado y que el contratista ha asumido parte de los recursos requeridos para las prórrogas de interventoría.

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO








I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega



C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO













C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial













I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista Rosas







I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas









I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO






I.E. Olaya – Sede principal
Balboa






I.E. Santa Teresita – Sede principal
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO






I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo
Bolívar




C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal
Rosas




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay
La Vega







I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

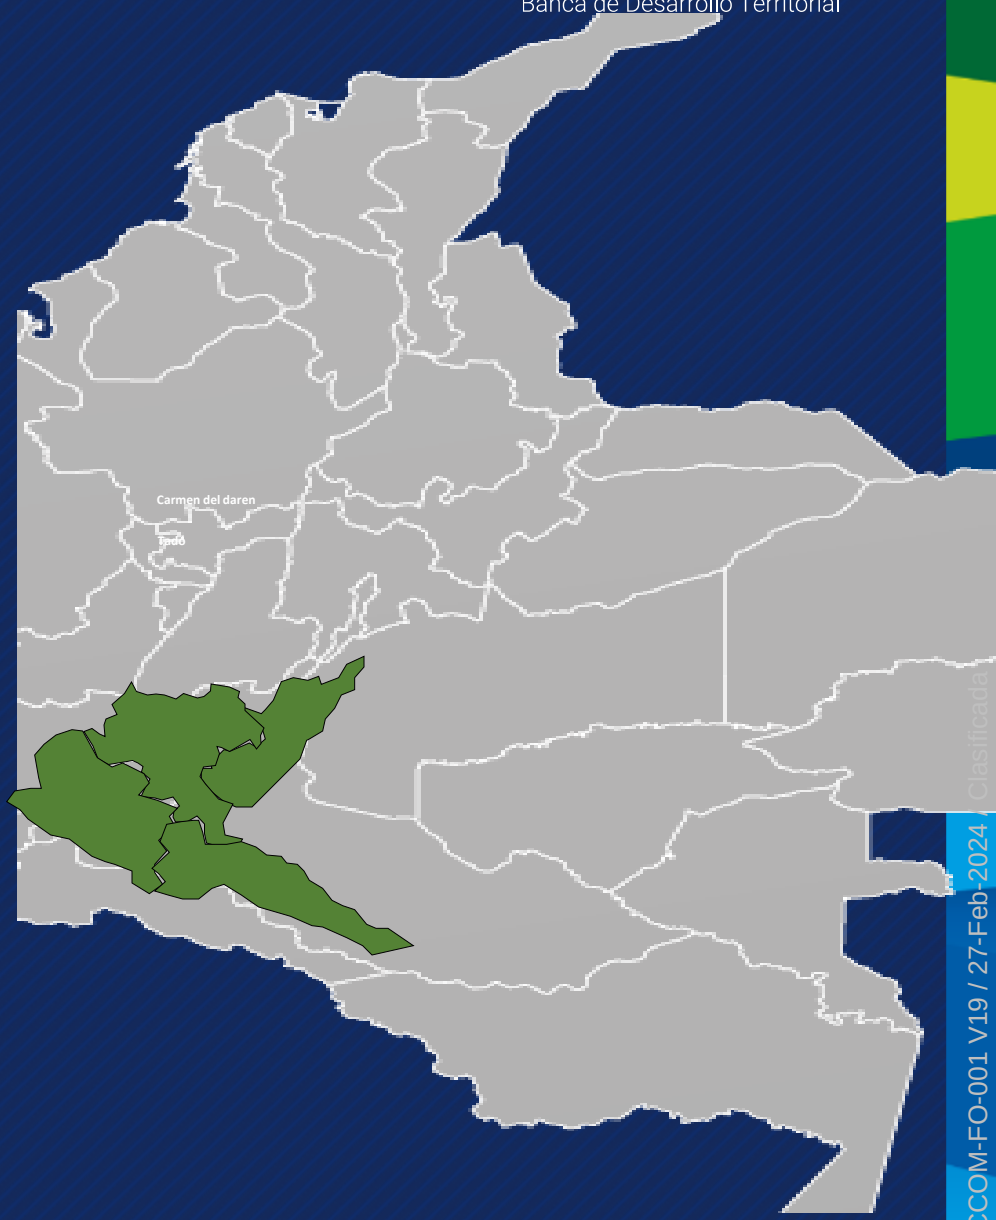

Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL	
O: $4.918.276.400 **I:** $318.105.088	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/12/2024	**Programado**	68,02%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	63,83%	**Ejecutado**	71,54%
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	69,77%	**En ejecución**	

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID125. Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	0	28	1
Cauca	Piamonte	ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	1
Huila	Acevedo	ID26. Institución Educativa Bateas	Bateas	0	5	5
Nariño	Pasto	ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	5	0
Nariño	El Rosario	ID8. Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	5	0	7
Nariño	Barbacoas	ID87. Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	2
Nariño	Barbacoas	ID110. Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombón	0	2	1
Nariño	Ipiales	ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	1
Nariño	Mallama (Piedrancha)	ID149. Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	1
Putumayo	Puerto Asís	ID41.I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID57. I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	0	1
Putumayo	Pto Leguízamo	ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	0	1	1
Putumayo	Orito	ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	12

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido

- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

- **ENTREGADOS (11) Y EN PROCESO DE ENTREGA Y RECIBO (1):**

1. **ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE:** 100% Entregada 15/08/2024
2. **ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA:** 100% Entregada 24/06/2024
3. **ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS:** 100% En firma acta entrega con correcciones el 04/10/2024.
4. **ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA:** 100% Entregada 05/07/2024
5. **ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE**: 100% Entregada 17/09/2024
6. **ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS:** 100% Entregada 01/08/2024
7. **ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON:** 100% Entregada 17/09/2024
8. **ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO:** 100% Entregada 16/08/2024
9. **ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES:** 100% Entregada 22/07/2024
10. **ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA:** 100% Entregada 19/06/2024
11. **ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL:** 100% Entregada 06/09/2024
12. **ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL:** 100% Entregada 16/08/2024

EN EJECUCIÓN DE OBRA (6):

1. **ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI:** 22,99% en ejecución normal
2. **ID41 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE:** 55,98% en ejecución normal - cambio de rector
3. **ID57 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL PROGRESO:** 49,65% en ejecución normal - cambio de rector
4. **ID125 Piamonte, PIAMONTE (sede principal):** 78,36% en ejecución normal
5. **ID127 Orito, ESC RUR MIX ALTO ORITO:** 25,68% en ejecución normal
6. **ID172 Puerto Asís, SEDE PRINCIPAL:** 0% Inicio 24/09/2024 se llegó acuerdo para la ejecución con comunidad y entes territoriales, hubo cambio de rector, en trámite de logística de materiales con comunidad.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Pasto - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 262.132.882
POBLACIÓN BENEFICIADA		986
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		15 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

MUNICIPIO		El Rosario - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 66.208.426
POBLACIÓN BENEFICIADA		8
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		24 de junio de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Acevedo - Huila
VALOR DE INVERSIÓN		$ 278.705.701
POBLACIÓN BENEFICIADA		193
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. • Mejoramiento de restaurante escolar
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 82.111.341
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		5 de julio de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes





Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes





Después









Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 112.235.014
POBLACIÓN BENEFICIADA		173
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		22 de julio de 2024

Antes



Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 57.066.573
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		19 de junio de 2024

Antes



Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 214.447.888
POBLACIÓN BENEFICIADA		33
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	4	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		16 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 97.200.260
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 135.500.591
POBLACIÓN BENEFICIADA		39
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 193.112.465
POBLACIÓN BENEFICIADA		24
ALCANCE		
Mejoramientos Aula múltiple	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	• Ejecutada dentro del aula
FECHA DE ENTREGA		6 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 193.112.465
POBLACIÓN BENEFICIADA		24
ALCANCE		
Mejoramientos Aula múltiple	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	• Ejecutada dentro del aula
FECHA DE ENTREGA		6 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

- **EN EJECUCIÓN DE OBRA (5):**

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI: 22,99% en ejecución normal



ID41 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE: 55,98% en ejecución normal - cambio de rector



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

- **EN EJECUCIÓN DE OBRA (5):**

ID57 Puerto Asís, ESC RUR MIX EL PROGRESO: 49,65% en ejecución normal - cambio de rector



ID125 Piamonte, PIAMONTE (sede principal): 78,36% en ejecución normal



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

- **EN EJECUCIÓN DE OBRA (5) + SIN INICIAR (1):**

ID127 Orito, ESC RUR MIX ALTO ORITO: 25,68% en ejecución normal



ID172 Puerto Asís, SEDE PRINCIPAL: 0% iniciado 24/09/2024



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

Fecha y lugar de la reunión: 14 de septiembre de 2024 – Reunión virtual

Hora inicio: 02:00 PM

Objetivo de la reunión: Socializar a comunidad actividades a no hacer para realizar estructura para tanque de almacenamiento.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
JORGE RUIZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MARCO ANTONIO BURBANO	CONTRATISTA	PROFESIONAL DE APOYO
OSCAR DUARTE	CONTRATISTA	APOYO EN OBRA CONTRATISTA
FERNELY LEGUIZAMO	COMUNIDAD CALUCACHA	PRESIDENTE PADRES DE FAMILIA

INVITADOS:

Se anexa captura de listado de asistencia

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Inicio de reunión

DESARROLLO

Marco Barbano da inicio a la reunión explicando los objetivos de la misma y por cual se da, explica que se va a hablar en la construcción de la estructura para un tanque de almacenamiento.

Se explica que atendiendo la solicitud realizada por la comunidad de la construcción tanto contratista, interventoría y supervisión se han encontrado trabajando para el cambio de ruta que permite la atención de la solicitud de la comunidad sin afectar el alcance inicial en gran medida.

Se inicia a explicar a la comunidad cuales actividades se requiere realizar o realizar para lograr construir el tanque de almacenamiento. Se inicia explicando que en la bateria sanitaria NO se van a instalar sanitarios nuevos, que solo se va a realizar un cambio del equipo interno de los sanitarios en los que



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

AULAS MOVILES

Hacienda

Octubre 16 de 2024


Contrato No. 4917031-2023

136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/11/2024
Fecha Propuesta Fin: 01/07/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [97,17%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [86,77%] 14/11/2023 - 19/10/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En Obra [60,92%] 31/05/2024 - 30/10/2024
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [100%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	Etapa I – Diseños [3,75%] 23/08/2024 - 08/12/2024
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [56,24%] 19/02/2023 - 03/11/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Obra [87,86%] 12/02/2023 - 27/10/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [73,93%] 20/02/2023 - 04/09/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	En Ejecución [5.6%] 03/10/2024 – 03/12/2024

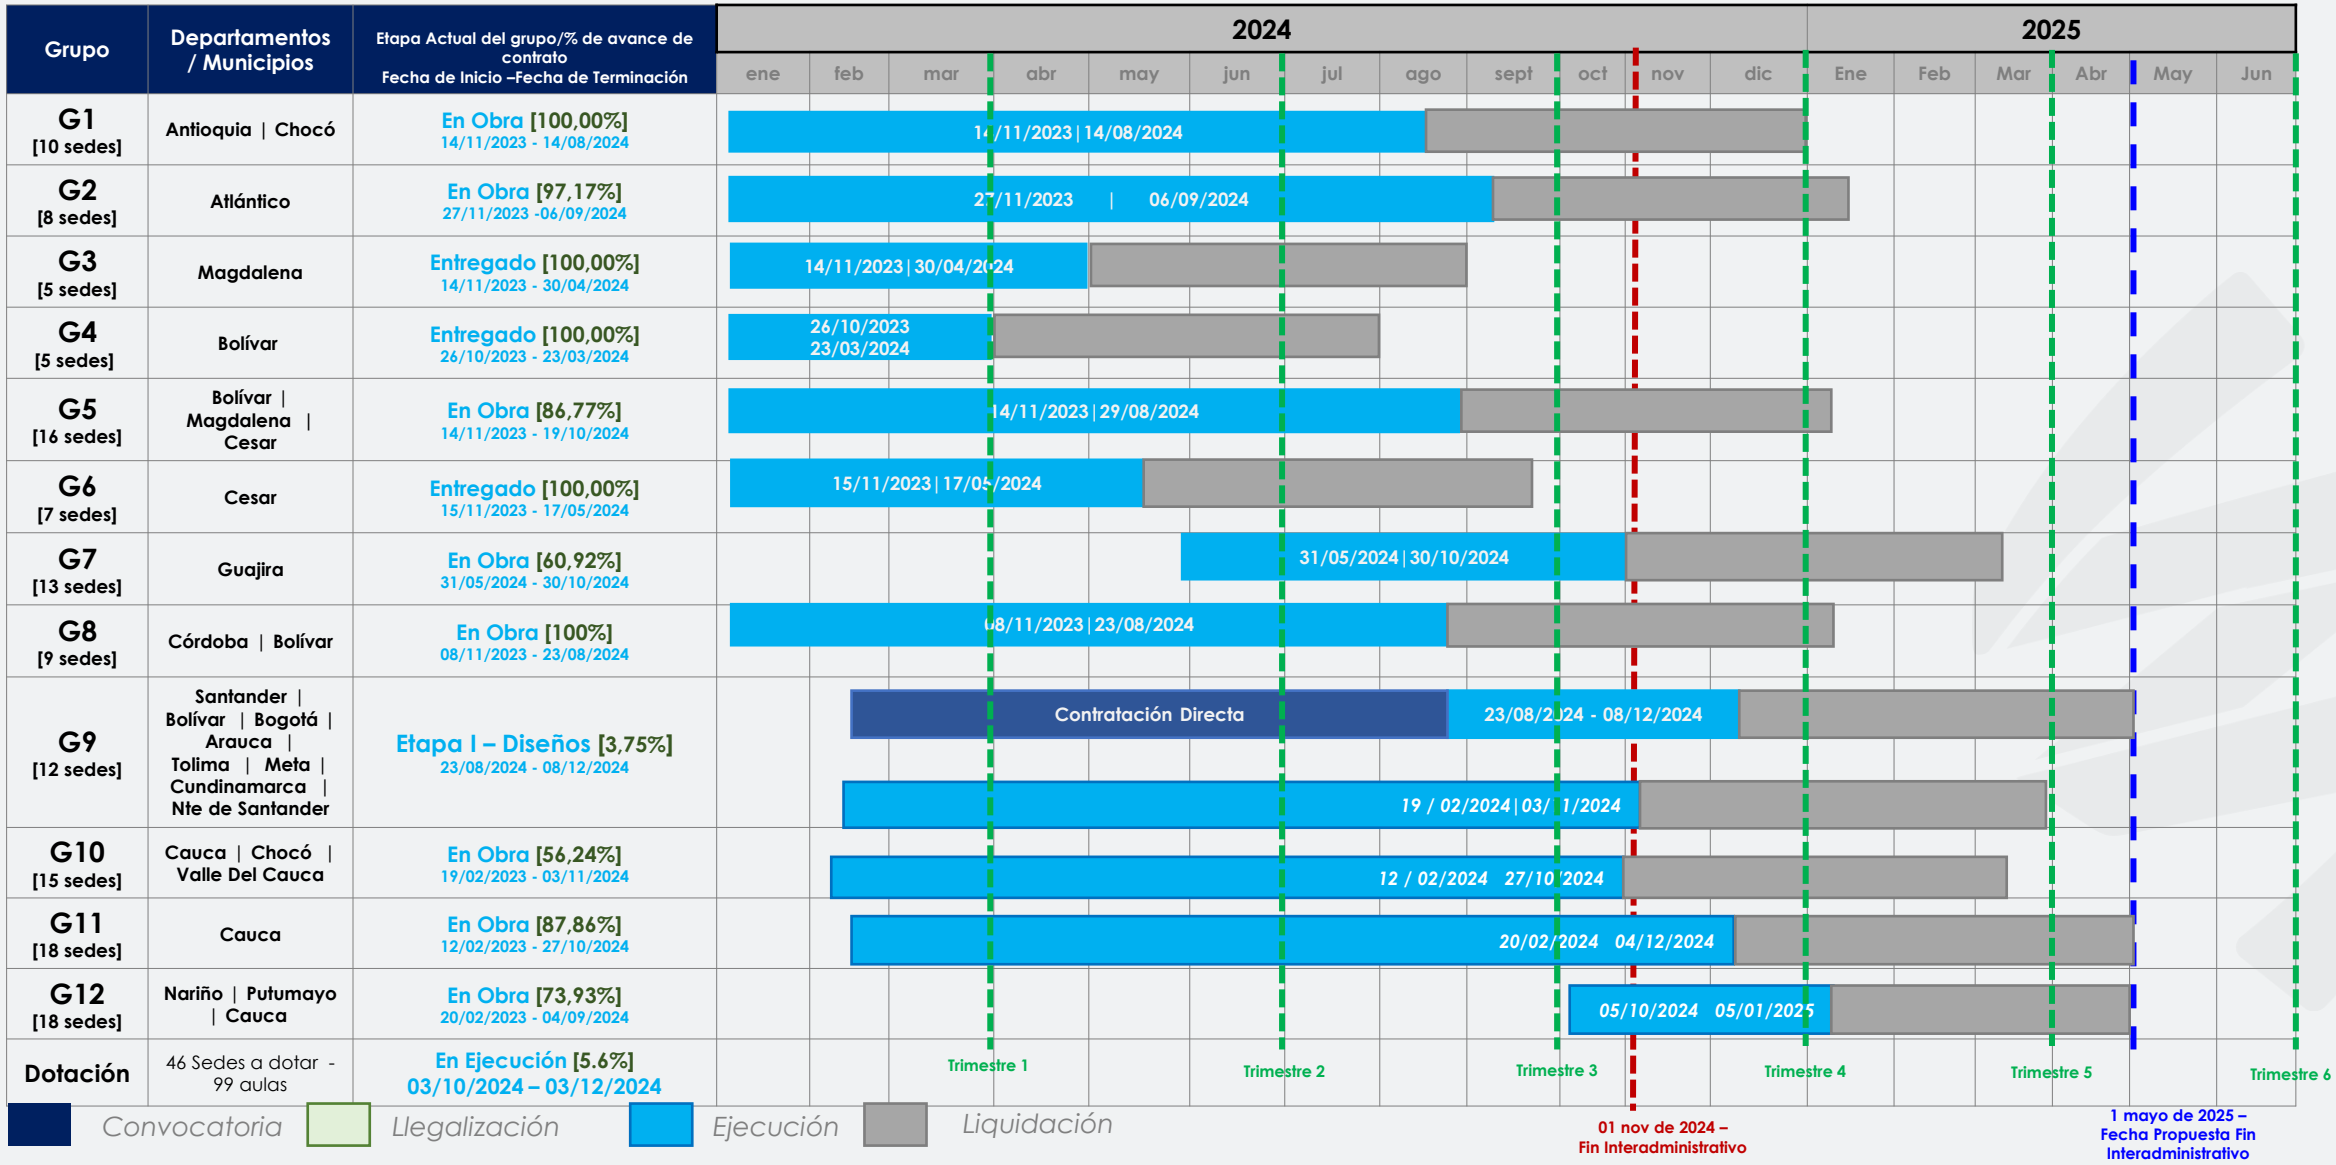

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 –
Fin Interadministrativo

ENTREGADAS	TERMINADAS	POR INICIAR	EN EJECUCIÓN
79 sedes	8 sedes	1 sedes	48 sedes
56,83%	5,76%	1,44%	35,97%

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 – Fin Interadministrativo

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
$ 34.832 mll	$ 28.217 mll	$ 59.022 mll	$ 463 mll

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de Proceso de Contratación de Dotación

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada
17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:
Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:
DOTAESCOL SAS
Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024
2 meses de ejecución

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

Suministro, entrega e instalación de dotación de mobiliario escolar en las aulas educativas nuevas de las sedes afectadas por la temporada de lluvias, incluyendo todas las actividades necesarias para la puesta en condiciones de funcionalidad. El suministro se debe realizar de acuerdo con los elementos que conforman la tipología de dotación así:

A. Aulas Preescolares: puesto de trabajo preescolar, cada uno compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.
B. Aulas Primaria: puesto para alumno primaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
C. Aulas Secundaria o Multigrado: puesto alumno secundaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
D. Para todas las Aulas: (1) juego de puesto de trabajo docente compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
E. Un (1) tablero alta resistencia para marcador borrable por aula.
F. Un (1) tablero móvil para aulas multigrado.
G. Un (1) juego tándem de tres (3) canecas por aula.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha: Agosto 31 de 2024

Educación

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23				$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 82.351.406,35	$ -		$ 82.351.406,35
sep-23	$ 108.927.246,74	$ -		$ 191.278.653,09
oct-23	$ 131.902.760,66	$ -		$ 323.181.413,75
nov-23	$ 144.907.033,92	$ -		$ 468.088.447,67
dic-23	$ 143.221.271,36	$ 468.088.448,00	13/12/2023	$ 143.221.271,03
ene-24	$ 133.626.379,48	$ 143.221.271,36	10/01/2024	$ 133.626.379,15
feb-24	$ 120.547.529,88	$ 133.626.379,15	12/02/2024	$ 120.547.529,88
mar-24	$ 117.745.976,50	$ 120.547.529,88	12/03/2024	$ 117.745.976,50
abr-24	$ 100.331.907,69	$ 117.745.976,50	10/04/2024	$ 100.331.907,69
may-24	$ 89.374.457,56	$ 100.331.907,69	11/05/2024	$ 89.374.457,56
jun-24	$ 76.820.331,89	$ 89.374.457,56	13/06/2024	$ 76.820.331,89
jul-24	$ 68.012.790,67	$ 76.820.331,89	15/07/2024	$ 68.012.790,67
ago-24	$ 21.741.419,32	$ 68.012.790,67	14/08/2024	$ 21.741.419,32
TOTALES	**$ 1.339.510.512,02**	**$ 1.317.769.092,70**		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23		$ -		$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 443.947.650,01	$ -		$ 443.947.650,01
sep-23	$ 548.880.836,71	$ -		$ 992.828.486,72
oct-23	$ 436.008.307,20	$ -		$ 1.428.836.793,92
nov-23	$ 718.224.229,49	$ -		$ 2.147.061.023,41
dic-23	$ 788.090.860,63	$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	$ 788.090.860,04
ene-24	$ 427.858.051,59	$ 788.090.860,63	10/01/2024	$ 427.858.051,00
feb-24	$ 474.970.095,24	$ 427.858.051,00	12/02/2024	$ 474.970.095,24
mar-24	$ 478.495.863,61	$ 474.970.095,24	12/03/2024	$ 478.495.863,61
abr-24	$ 259.736.382,70	$ 478.495.863,61	10/04/2024	$ 259.736.382,70
may-24	$ 353.632.163,66	$ 259.736.382,70	11/05/2024	$ 353.632.163,66
jun-24	$ 266.323.590,41	$ 353.632.163,66	13/06/2024	$ 266.323.590,41
jul-24	$ 294.233.627,01	$ 266.323.590,41	15/07/2024	$ 294.233.627,01
ago-24	$ 313.006.436,96	$ 294.233.627,01	14/08/2024	$ 313.006.436,96
TOTALES	**$ 5.803.408.095,22**	**$ 5.490.401.658,26**		
SALDO POR GIRAR	**$ 334.747.856,28**			

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Octubre 16 de 2024



UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

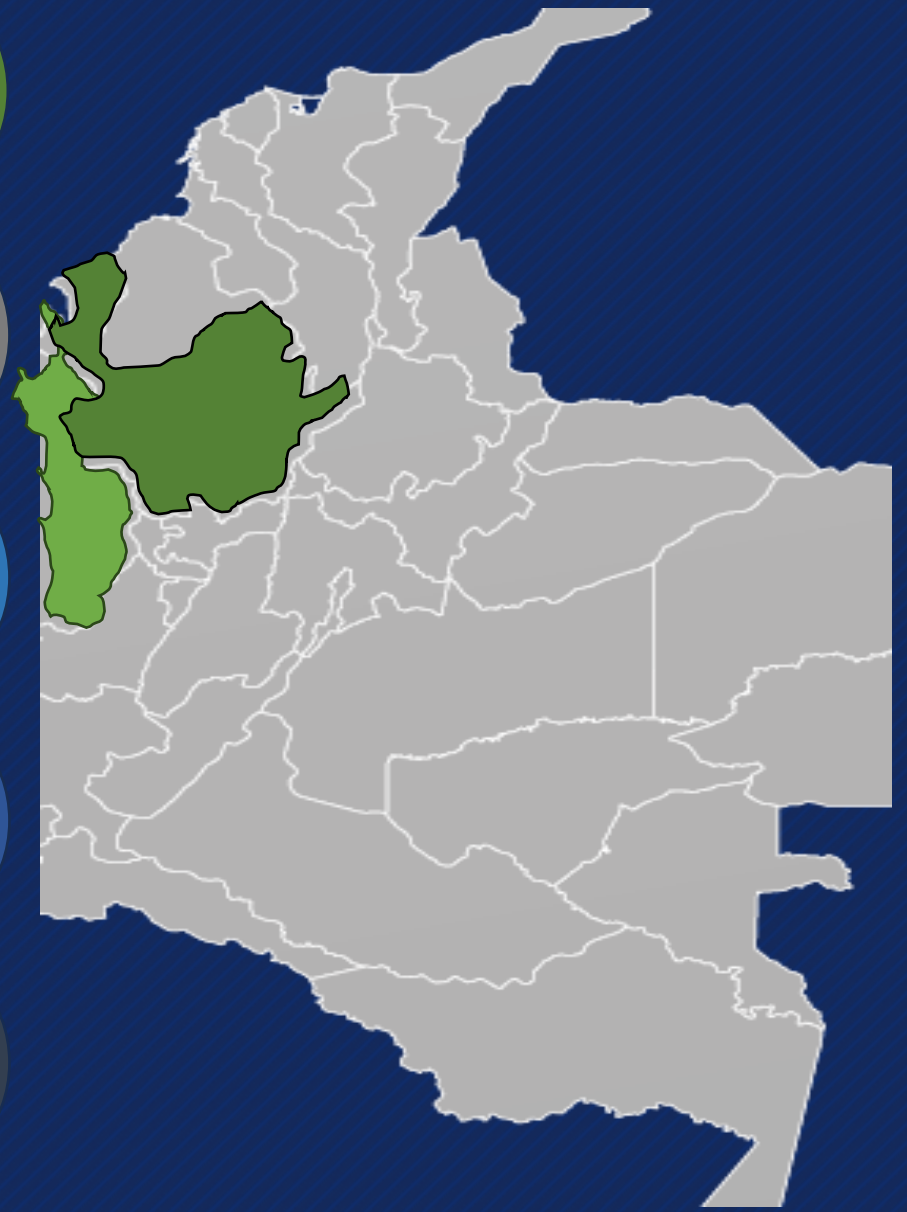

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ	27/2/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ	21/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4		14/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ	20/5/2024
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ	30/5/2024
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		6	3 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

100%
Porcentaje Programado

100%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con corte al 8 de septiembre de 2024, porcentaje programado 100% vs ejecutado 100%, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE. DEMETRIO SALAZAR: Se terminan las actividades de Mejoramientos aulas y baterías sanitarias - Se programo entrega del proyecto y suscripción AEP&SC el 21 de agosto, la Rectora y la SED municipal no recibieron manifestando que necesitan se amplie el alcance, se informó al MEN y solicito se remitiera el acta formal con la trazabilidad del alcance y se adelanta gestiones para realizar la suscripción AEP&SC, trámite que se ha realizado semana a semana, se realiza nuevamente reunión con la administración municipal, la CGR y el MEN el 20 de septiembre a las 9 am, en la cual se quedó por parte de la ETC y la IE. En presentar informe de observaciones frente a la intervención realizada para evaluar si aplican o no y posterior a esta poder definir la entrega y recibo del proyecto.
2. I.E PUEBLO NUEVO: Se terminan las actividades de construcción aulas y baterías nuevas - Se realiza entrega del proyecto y suscripción AEP&SC el 21 de agosto.
3. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, así mismo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de mayo del 2024 y suscripción AEP&SC
4. IE CHURIDO PUEBLO: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, cabe aclarar qué, el rector de la I.E previamente manifestó no querer hacer parte del proceso, por lo que designó a la secretaría de educación para los fines pertinentes. Se realiza instalación de la placa el 17 de mayo del 2024. y suscripción AEP&SC
5. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Se culminan actividades de intervención general aula nueva, mejoramientos de aulas y baterías sanitarias, entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se entregaron el 14 de mayo, Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024, y suscripción AEP&SC
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalacion placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 14 de marzo del 2024 y suscripción AEP&SC
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024 y se suscribe AEP&SC el 12 de mayo de 2024

Sumado a lo anterior, se inician los trámites de cierre del contrato y posterior liquidación

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO
ID No. 161

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 237.984.039,98
POBLACIÓN BENEFICIADA		97
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, mejoramiento puntual de red eléctrica e implementación de circulación entre bloques
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 54 M2 tipo multigrado, prefabricada.
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica general, accesorios hidrosanitarios y limpieza de enchapes.
FECHA DE ENTREGA		14 de mayo de 2024

Antes





Después







GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO

ID No. 118

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 265.366.273,19
POBLACIÓN BENEFICIADA		1670
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	23	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica y de aluminio, y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	11	• Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica e hidrosanitaria general, limpieza y cambio de enchapes, cambio de aparatos sanitarios y cielos falsos. • Instalación de 6 unidades sanitarias nuevas
FECHA DE ENTREGA		14 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS

ID No. 66

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 287.362.737,31
POBLACIÓN BENEFICIADA		767
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	14	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica y de aluminio, mejoramiento puntual de red eléctrica e implementación de red interna de manejo de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	5	Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios y accesorios hidrosanitarios, cubiertas, mampostería, carpintería metálica, red eléctrica general, y limpieza y cambio de algunas piezas de enchapes.
FECHA DE ENTREGA		21 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
ID No. 86

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 402.988.697,07
POBLACIÓN BENEFICIADA		567
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, aumento de nivel bloque 2, construcción de cárcamo para evacuación de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	6	Cambio de red hidrosanitaria, mantenimiento y cambio de aparatos sanitarios, adecuación de mampostería, realce de nivel y enchape de pisos, mejoramiento de cubiertas, carpintería metálica y red eléctrica general.
FECHA DE ENTREGA		17 de mayo de 2024

Antes



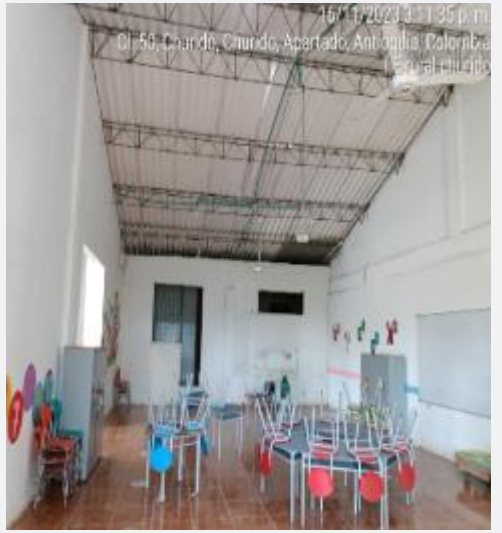



Después









GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA

ID No. 112

MUNICIPIO		Turbo - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 201.348.400,15
POBLACIÓN BENEFICIADA		581
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	3	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, mampostería, aumento de nivel de piso bloque principal (aulas y circulación), construcción de pompeyano al ingreso.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		14 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA

MUNICIPIO		Turbo - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 119.858.049,55
POBLACIÓN BENEFICIADA		387
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	4	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, acondicionamiento de cuarto técnico, implementación de andén de conexión al cuarto técnico y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	5	• Cambio de enchape y aparatos sanitarios, mantenimiento de cubierta y de red eléctrica e hidrosanitaria general, adecuación de mampostería y carpintería metálica • Instalación de 6 unidades sanitarias nuevas
FECHA DE ENTREGA		17 de mayo de 2024

Antes







Después









GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42

MUNICIPIO		Ciudad Bolívar - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 127.067.124,54
POBLACIÓN BENEFICIADA		84
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	6	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica, y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	3	Limpieza de aparatos sanitarios y enchapes, cambio de grifería y puesta en funcionamiento de los aparatos sanitarios, mejoramiento de la red eléctrica y mantenimiento de cubierta.
FECHA DE ENTREGA		27 de febrero de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150

MUNICIPIO		Tadó - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 155.995.803,88
POBLACIÓN BENEFICIADA		16
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, implementación de circulación entre bloques.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	4	Conexión al sistema hidráulico, mantenimiento de aparatos sanitarios y adecuación sistema sanitario con la instalación de pozo séptico y construcción de campo de infiltración para manejo de aguas residuales.
FECHA DE ENTREGA		05 de abril de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA

MUNICIPIO		Tadó - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 413.407.575,58 – En cierre de Balance
POBLACIÓN BENEFICIADA		140
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	6	• Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. • Construcción de cárcamos y cunetas
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	5	• Mejoramiento y mantenimiento de: cubiertas, mampostería, carpintería metálica, red eléctrica general y red hidrosanitaria. • Limpieza de enchape de pared, aparatos sanitarios y reemplazo de enchape de piso.
Baterías sanitarias nuevas	3	Construcción de 2 baterías sanitarias de 3,58 M2 y 1 baño PMR de 4,99 M2.
FECHA DE ENTREGA		21 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94

MUNICIPIO		Carmen del Darién - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 934.565.929,81 en Cierre de Balance
POBLACIÓN BENEFICIADA		38
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	N.A.	N.A.
Aulas nuevas	3	• Suministro e instalación de 2 aulas de 54 M2 cada una tipo multigrado y 1 aula múltiple de 18 M2, todas prefabricadas. • Construcción de acceso PMR y circulación. • Instalación de un sistema fotovoltaico independiente con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Baterías sanitarias nuevas	4	• Suministro e instalación de 3 baterías sanitarias de 3,45 M2 y de 1 baño PMR de 5,31 M2, todas prefabricadas. • Construcción de circulación • Construcción de pozo séptico y campo de infiltración para manejo de aguas residuales.
FECHA DE ENTREGA		21 de agosto de 2024

Antes





Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630 Inversión

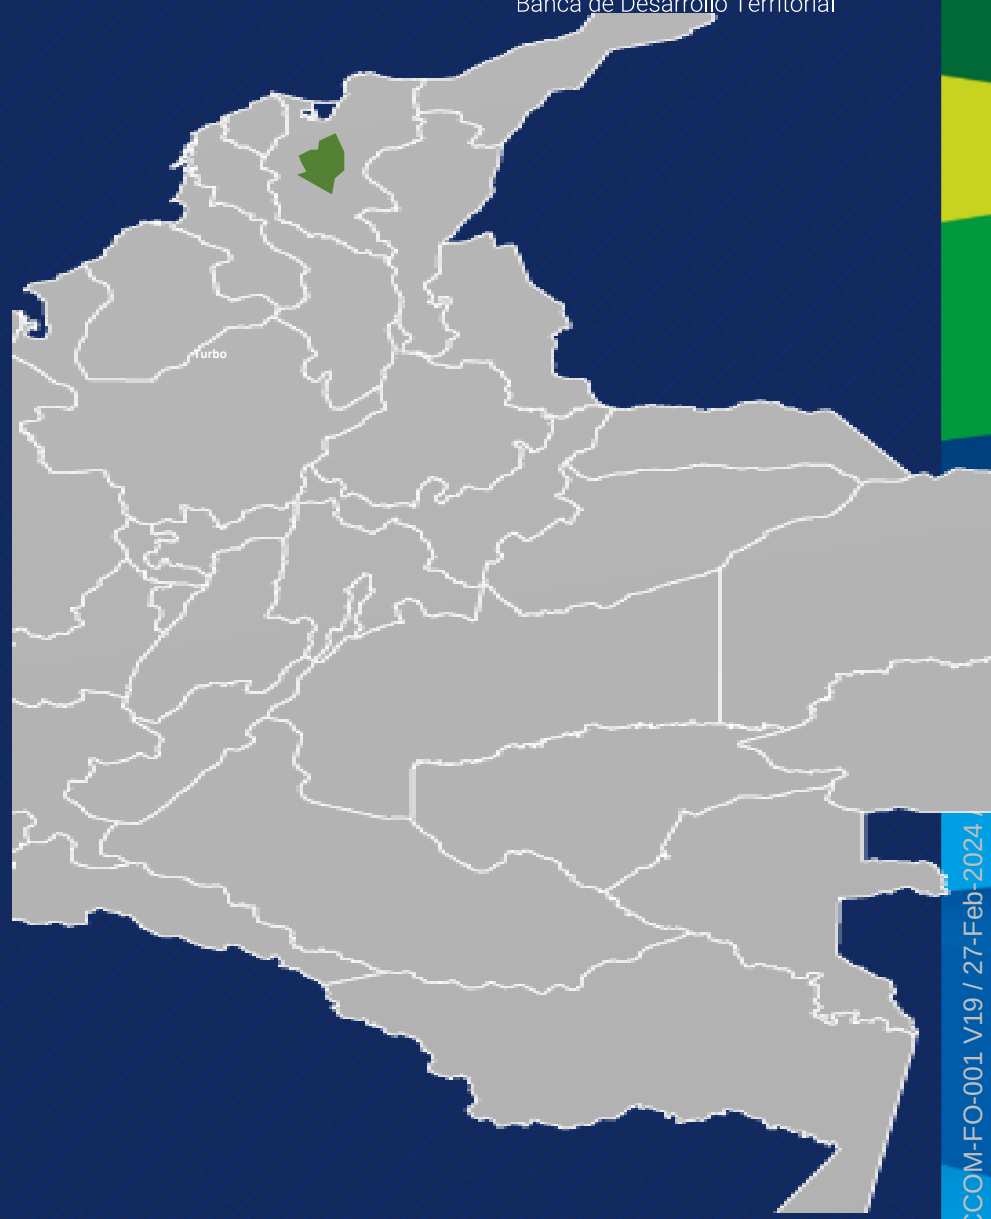

GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	1		2	16/09/2024
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3		1	13/09/2024
Atlántico	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA		15		16/08/2024
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL		8		18/07/2024
Atlántico		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA		5	8	11/07/2024
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE PRINCIPAL		16	8	16/07/2024
Atlántico		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE		22		17/09/2024
Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	SEDE MESOLANDIA		8		4/09/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

100%
Porcentaje Programado

97,17%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con fecha de terminación al 5 de septiembre, y en proceso de entregas y recibo a satisfacción, se resaltan las siguientes particularidades:

1. IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL – Soledad. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
2. IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Galapa. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
3. IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
4. IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
5. IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección, en actividades de terminaciones de batería sanitaria. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción
6. IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – Soledad. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
7. IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción. Se realizó visita por parte de la entidad territorial el 12 de septiembre en validación de atención de pendientes, se reportan faltantes.
8. IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.

Nota: Las fechas de terminación relacionadas corresponden a las fechas en las cuales se habilito el uso de los espacios dadas las necesidades institucionales, sin perjuicio de los detalles pendientes de atención entre otros documentos pendientes de entrega y aprobación de interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón






















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón





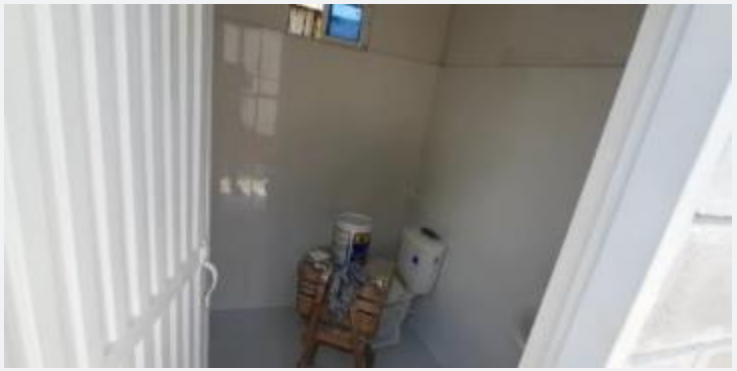


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE - Soledad





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153
  Interventoría $ 351.774.412
  Inversión Total
  $ 5.096.734.565

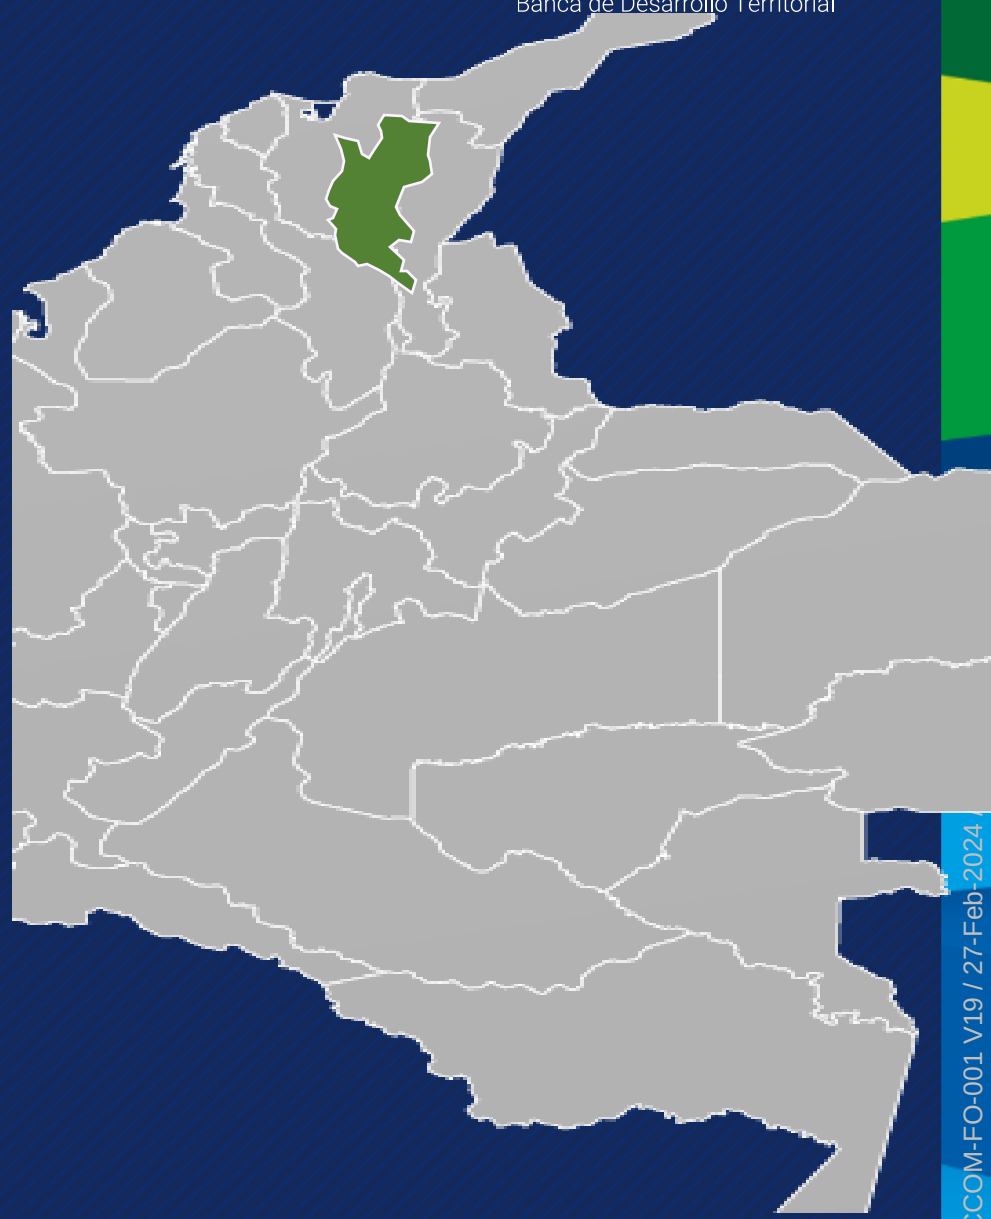

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
5.096.734.565	14-nov-23	28-dic-24	18-dic-23	12-abr-24	**Programado**	100,00%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**Entregadas entre 29 y 30 de abril de 2024**		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 16 al 23 de junio de 2024
Avance general Componente I: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede Componente II: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

Estado: En liquidación
Obra: Acta de liquidación
Interventoría: En recopilación de información de liquidación.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7
Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

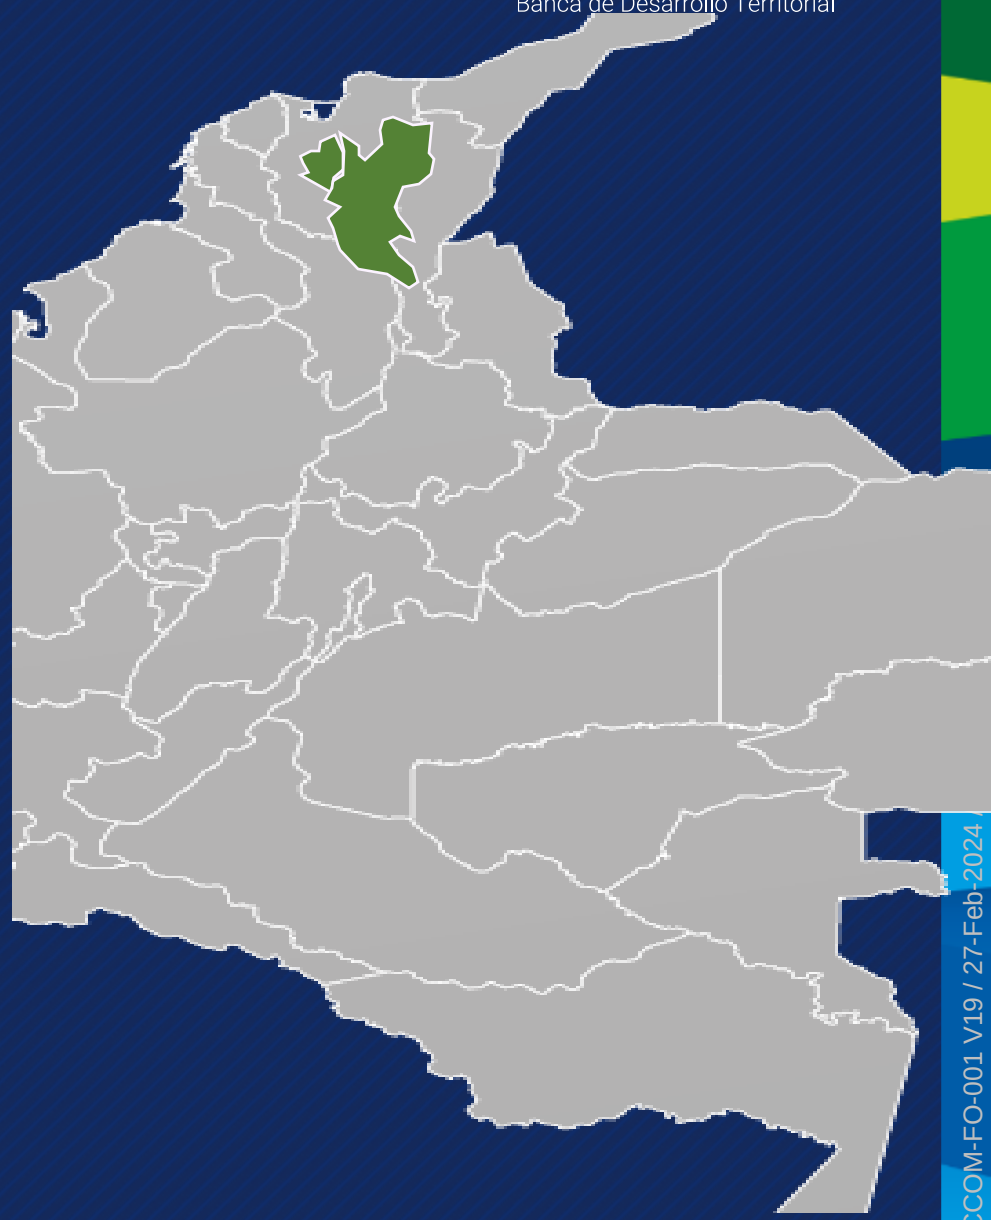

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO Proyectada C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4.744.960.153	24/10/2023	08-12-2023	08-12-2023	07-02-2024	**Programado**	100%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

En proceso de liquidación de obra e interventoría


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

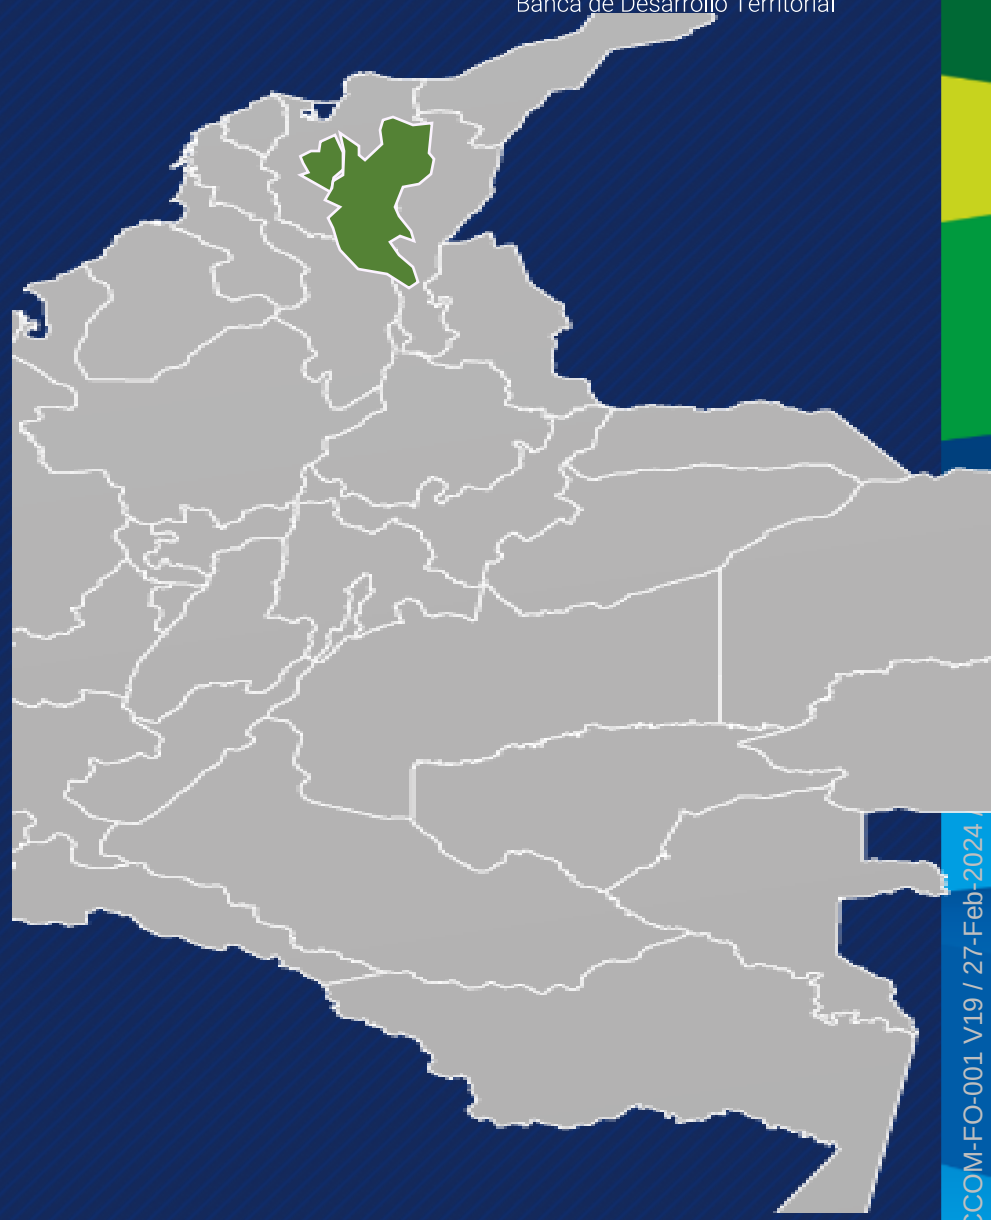

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4,102,044,984	14-Nov-23	29-Dic-23	16-Nov-23	29/08/2024	Programado	89,02%	-2,25%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	88,37%	Ejecutado	86,77%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	85,99%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

TRAMITES CONTRACTUALES:

Derivado de las diferentes situaciones que se presentan en la zona donde se ejecutan los proyectos, se ha visto afectada el avance obra y suspensión de las mismas, por lo anterior, es importante dejar constancia que, el día 26 de septiembre 2024, la supervisión de Findeter en su momento realizó visita presencial en la cual se evidenció lo manifestado por el contratista y que cuenta con la aprobación de interventoría sobre la imposibilidad que se generó y que hoy crean la necesidad de suspender los contratos derivados con el fin de poder dar el tiempo necesario al clima y de esta forma lograr el ingreso a las sedes y continuar la ejecución para realizar la entrega funcional

CONTRATO No. PAF-MENAM-O-053-2023:

- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-053-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5. POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO

CONTRATO No. PAF-MENAM-I-056-2023:

- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENAM-I-056-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5” POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar- Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AVANCES DE OBRA POR SEDES - COMPONENTE II							
No.	**ID**	**SEDE**	**FECHA TERMINACIÓN**	**% ACUMULADO PROGRAMADO**	**% ACUMULADO EJECUTADO**	**% DEVIACION**	**OBSERVACION**
1	30	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
2	97	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE CHINELA	15/09/2024	100,00%	66,00%	-34,00%	En ejecución obras de aula, se está a la espera de la aprobación para la construcción de batería sanitaria.
3	98	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE GUAIMARAL	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
4	101	IE CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE LOS SERENOS	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
5	147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
6	148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
7	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL	21/09/2024	75,18%	65,00%	-10,18%	En ejecución obras de mejoramiento.
8	13	IE SANTA CRUZ DE BALSAMO - SEDE PRIMARIA	20/09/2024	99,82%	72,00%	-27,82%	En ejecución obra de mejoramiento, se tiene inconvenientes con suministro de materiales, debido a que la banca de la vía de acceso presenta deslizamiento, no permiten el tránsito de vehículos de carga
9	14	IE SANTA CRUZ DE BALSAMO - SEDE JARDIN INFANTIL	20/09/2024	97,59%	28,00%	-69,59%	En ejecución obra de mejoramiento, se tiene inconvenientes con suministro de materiales, debido a que la banca de la vía de acceso presenta deslizamiento, no permiten el tránsito de vehículos de carga
10	6	IE TEC AGRO Y ACUICOLA LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL	26/09/2024	94,93%	87,00%	-7,93%	En ejecución obras de mejoramientos, se ha tenido dificultades con el suministro de materiales
11	10	IE TEC AGRO Y ACUICOLA LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITO	26/09/2024	78,35%	56,00%	-22,35%	En ejecución obras de mejoramientos, se ha tenido dificultades con el suministro de materiales
12	9	IE TEC AGRO Y ACUICOLA LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA	28/09/2024	89,81%	80,00%	-9,81%	En ejecución obras de mejoramientos y aula nueva, se ha tenido dificultades con el suministro de materiales
13	43	IE TEC PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMI SEDE PLAN BONITO	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	En ejecución 1 aula nueva en sistema prefabricado, pendiente la instalación de carpintería metálica
14	32	IE DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE LA ISLITA	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
15	133	IE DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE INMACULADA CONCEPCION	Entregada	100,00%	100,00%	0,00%	
16	24	IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS	20/09/2024	98,72%	85,00%	-13,72%	En ejecución 1 aula nueva, batería sanitarias y mejoramientos

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA - ANTES









IE CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA - DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL - ANTES









CE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL- DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM PRIMARIA - ANTES






IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM PRIMARIA- DURANTE






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL - ANTES









IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL- DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL- DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS- DURANTE





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA- DURANTE









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE TEC PESQUERA PLAN BONITO - ANTES









IE TEC PESQUERA PLAN BONITO- DURANTE







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS - ANTES









IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS - DURANTE







Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.496.849.571,44 I: $200.301.842,00	15-nov-23	30-dic-23	30-nov-23	29-abr-2024	**Programado**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**En proceso de cierre contractual y liquidación.**		

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1 - Mejorada	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	8	1 - Mejorada	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1 - Nueva	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

- Entregas realizadas entre el 15/04/2024 – 17/05/2024

PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

Contrato de obra:

- Radicación mediante INC 2024-001373 el 05/08/2024 y asignado el profesional liquidador.
- El 27/08/2024 se reciben observaciones del acta de liquidación
- El 12/09/2024 se recibe aprobación de las pólizas contra AERS
- El 16/09/2024 se devuelve el acta de liquidación con ajustes solicitados
- El 08/10/2024 el grupo de liquidaciones informa que se encuentran en revisión jurídica

Se han realizado reiteraciones con el fin de proceder con el acta a revisión de negocios fiduciarios.

Contrato de interventoría:

- Radicación mediante INC 2024-001503 el 28/08/2024 y asignado el profesional liquidador.
- Del 16/09/2024 al 08/10/2024 se ha solicitado información del estado de esta acta.
- El 08/10/2024 informan que se encuentran en espera de envío del acta de liquidación del contrato de obra a la fiduciaria

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

13
Proyectos

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.158.777.879 I: $295.239.000	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	30/10/2024	Progr	67,71%	-6,80%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100,00%	Programado	68,58%	Ejecut	60,92%	
	Ejecutado	100,00%	Ejecutado	60,89%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	KASICHE	1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN KASPOLIMANA	1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA	ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA CAMPANA	0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	WAYUUMAANA	0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA ESTRELLA	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN PRINCIPAL	1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	COOPERATIVO	0	7	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	JOSÉ ANTONIO GALÁN	0	0	6
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	APUNIMAANA1	0	8	0
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	WAKUAPAMANA	0	9	6
TOTALES				8	36	24

Avance General: En la semana del 30 sept al 06 de oct de 2024.
Avance general Componente I: 100%
Avance general por Sede Componente II: - 7,70%

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 60,54%
ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 49.82%
ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 61.94%
ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 22.12%
ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 55.12%
ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%
ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%
ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 63.78%
ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 62.64%
ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%
ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 72.22%
ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%
ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 65,03%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)





Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

9
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$6.161.470.280 **I:** $441.204.280	08/11/2023	23/12/2023	24/12/2023	08/07/2024	**Progr**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100,00%	**Ejecut**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100,00%			

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	Buenos Aires	0	6	6
Bolívar	María la Baja	Técnica Agroindustrial de Flamenco	Níspero	0	8	8
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0

Avance General: Fueron recibidas las nueve sedes alcance del contrato, actualmente el proyecto está en cierre documental para posteriormente iniciar el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Entrega técnica el 14 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: Entrega técnica el 28 de junio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** Entrega técnica el 30 de julio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: Entrega técnica el 21 de agosto 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.810.476.306,00 I: $313.800.000	23-Ago-24	08-oct-24	09-oct-24	08-dic-24	**Programado**	7,65%	-4,60%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	2,00%	**Ejecutado**	3,05%	
	Ejecutado	52,67%	**Ejecutado**	0%	**Terminado plazo del componente I – Próximo a inicio obras**		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS	ID MEN
Santander	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	4	9	Si aplica	7
	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	NA	1	Si aplica	17
	Barrancabermeja	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	3	3	2	141
Bolívar	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	NA	2	Si aplica	20
	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	1	1	Si aplica	123
			.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	NA	12	5	124
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	NA	8	4	33
		COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	NA	4	Si aplica	136
Arauca	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA	LA PAVA	NA	2	1	56
	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	NA	7	3	138
Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	1	1	2	67
			EL BRASIL	1	1	2	100
Meta	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	5	2	8	96
Cundinamarca	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	1	1	2	104
Norte de Santander	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	NA	1	Si aplica	132

Avance General: Se encuentran en terminación de actividades del componente I, revisiones de presupuestos y alcances y próximos a iniciar obras de algunas sedes educativas. Adicionalmente, están coordinando socializaciones para el inicio de las obras, teniendo en cuenta que algunas sedes ya están definidas.

- Se contempla solicitar inicio de proceso de apremio por los atrasos presentados y la terminación del componente I con pendientes.
- Se realizará solicitud de retiro de las 3 sedes educativas por medio de comité técnico y fiduciario.

Avance por sede Componente I:

ID No. 132, 56 y 138: Sedes con alcances definidos, en programación de socializaciones y próximas a iniciar obras.
ID No. 7: En revisiones de presupuestos por la interventoría y pendiente por programar presentación de las dos (2) alternativas de aulas prefabricadas que ha realizado el contratista.
ID No. 17: Sede con alcances definidos y en revisiones de presupuestos por la interventoría.
ID No. 20: Sede con alcances definidos y en revisiones de presupuestos por la interventoría.
ID No. 123: En revisiones de presupuestos por la interventoría y presentación de las dos (2) alternativas de aulas prefabricadas.
ID No. 124: Sede con alcances definidos y en revisiones de presupuestos por la interventoría.
ID No. 104: En revisión de presupuestos por parte de la interventoría y con los alcances definidos incluyendo el aula prefabricada.
ID No. 67 y 100: Sedes por reubicar, se ha avanzado en diseños, presupuestos y cronograma para la intervención de los espacios requeridos. Se realizó análisis de estudios de suelos y dependiendo del resultado, se verificará la estabilidad del terreno.
ID No. 96: Se realizó mesa de trabajo el 04/10/2024 y se aceptó por parte de la IE la intervención con aulas prefabricadas. Se encuentran realizando diseños de las aulas, muro de cerramiento e ingreso teniendo en cuenta los compromisos de la reunión realizada con Secretaría de Educación de Villavicencio y rector.
ID No. 141, 33 y 136: Sedes por retirar, se presentará la solicitud de retiro para comité técnico.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 6.753.158.527,2 Inversión - MEN

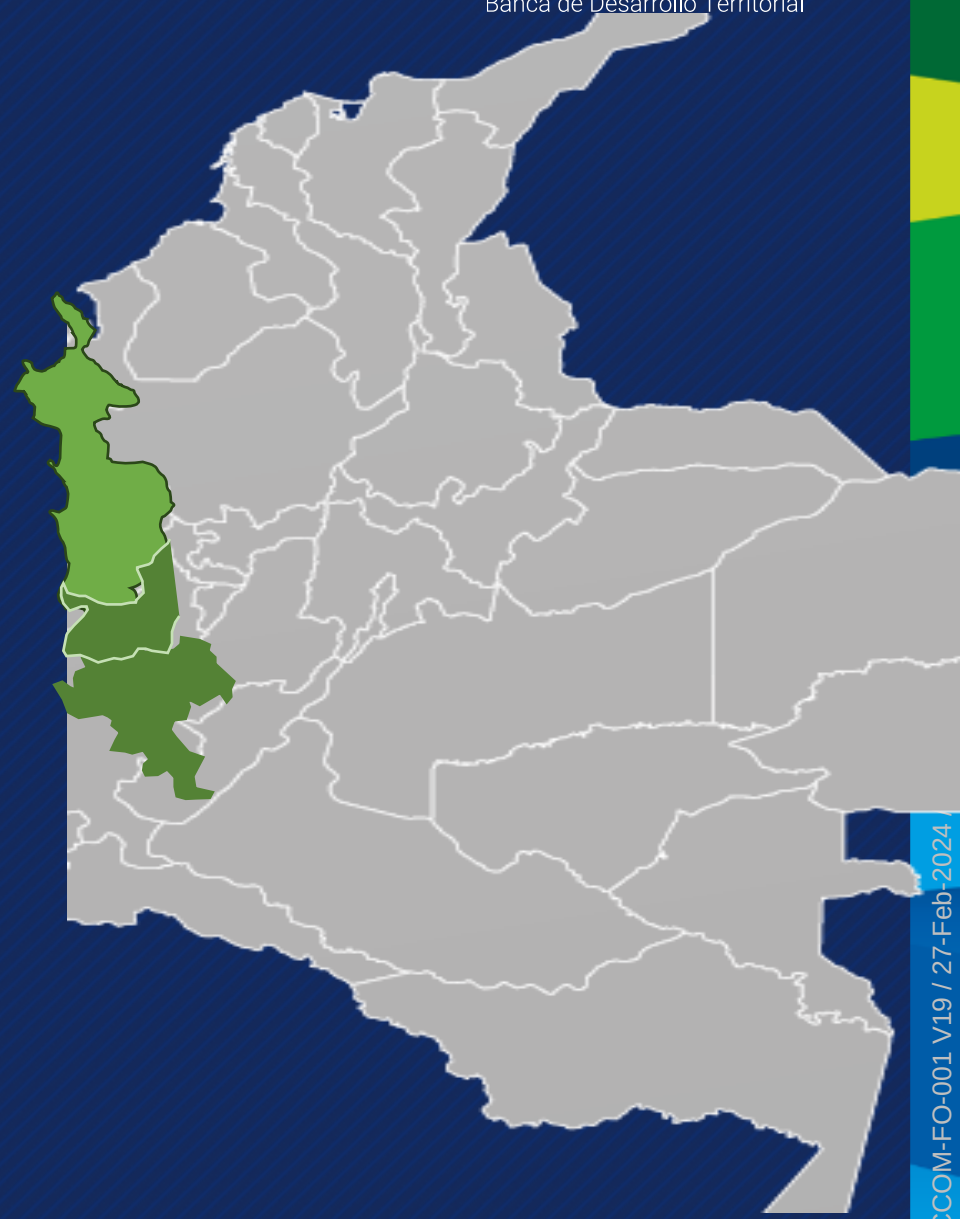

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	ID188. IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	ID189. IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	SUAREZ	ID190. IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	TORIBIO	ID12. IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ID16. IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	3/11/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ID164. IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/7/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	3/11/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	3/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	30/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	30/10/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	30/9/2024

Estado	Proyectos
Entregados	5
Terminados	5
Ejecución	4
Sin iniciar	1

PORCENTAJES DE AVANCE:

76,96%
Porcentaje Programado

58,51%
Porcentaje de avance

18,45%
Porcentaje de atraso

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

Con corte al 13 de octubre el avance general del componente 2 Ejecución de obra es 75.88% programado y 56.56% ejecutado

1. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE PRINCIPAL – Se continua ejecución de actividades de mantenimiento parcialmente por bloques en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora. Se han intervenido aulas con desmonte y cambio de cubiertas, resanes sobre muros, entre otros
2. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA SEDE MARIA INMACULADA. Se continua con actividades de mejoramientos sobre muros, cubiertas, pisos y excavaciones y figurado y armado de aceros para cimentación aulas nuevas.
3. IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA - SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – se tomó la semana de receso para ejecución, en cumplimiento al acuerdo llegado con la rectora.
4. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA HONDA – Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y se suscribe AEP&SC.
5. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE LA PLANTA - Se terminaron actividades de mejoramiento de aulas y se continua con construcción aula nueva.
6. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE SAN CRISTOBAL COLON – Obras de mejoramientos terminadas y se está realizando la programación de entregadas al rector y suscripción AEP&SC.
7. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JHON F. KENNEDY - Desmonte de teja, desmonte de aparatos sanitarios, reparación de pañetes y pintura muros, mantenimiento estructura de cubierta, instalación cubierta y caballete, mantenimiento de puertas metálicas.
8. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO – Obras de mejoramientos terminadas y se está realizando la programación de entregadas al rector y suscripción AEP&SC.
9. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE – SEDE PRINCIPAL - Se continúan actividades de cambio de cielo raso, red eléctrica interna, mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta, y mejoras de acabado.
10. IE LA PLAYA - CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL – Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, y se realiza la suscripción del AEP&SC el 14 de agosto
11. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE DE SAN JOSE (HUACA) – Se adelanta temas logísticos para ingresar a la zona materiales y personal, adicional el inicio de actividades se está viendo afectado por temas de orden público y exigencias de las AUC para la comunidad, se realizó reunión con el rector y comunidad con el fin de buscar apoyo para poder ingresar a la zona a ejecutar las obras y se llega a un acuerdo y la semana del 9 al 13 de septiembre realizan nuevas exigencias en mayores costos mano de obra y transporte, proceso que se está siendo revisada a través del balance del proyecto, se tenía proyectado el inicio de actividades el 16 de octubre pero se debe realizar previo con la comunidad para poder definir intervención.
12. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SIRENA DEL MAR - Obras de mejoramientos terminadas, se programa entrega al rector y secretaria de educación, y suscripción del AEP&SC para la semana del 23 al 30 de septiembre
13. IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE SECUNDINO RIVAS - Se continúan actividades de mejoramientos, se programa terminación para el 30 de septiembre
14. IE DOMINGUILLO – SEDE PRINCIPAL – Se continua con actividades de figurado de acero construcción cimentación aulas, construcción zapatas y vigas de amarre entre otras, se inician logística de replanteo en 2 módulo de aulas palafíticas, se solicitará prorroga aproximadamente de 1 mes y 27 días en elaboración de solicitud.
15. IE DOMINGUILLO – SEDE DOMINGO LASSO - Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, y se realiza la suscripción del AEP&SC

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

TRAMITES CONTRACTUALES:

Actualmente se evalúa el balance financiero y tiempos necesarios adicionar a los proyectos con el fin de dar cumplimiento a los diagnósticos aprobados y obras complementarias necesarias, teniendo en cuenta que a la fecha se tienen sedes en proceso de inicio debido a las diferentes variables presentadas a la fecha, por lo cual se tramitara solicitud de aprobación de recursos por valor cercano a los $261.003.846 millones de pesos teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas y obras complementarias adicionales necesarias para la funcionalidad de los espacios intervenidos en cada sede educativa, como: adecuaciones generales baterías sanitarias, reparaciones y actualización de los sistemas eléctricos aulas, baterías y demás espacios intervenidos del bloque 5 donde se ubica aula de audiovisuales y aula polivalente en la sede IE. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, adecuación y construcción acometidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias y construcción de muro de estabilización sobre terreno adecuado por la administración municipal y donde se construyen las aulas nuevas de la IE. DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL, adecuación y construcción acometidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, mayores cobros mano de obra y acarreos de materiales y personal para la construcción del aula y batería sanitaria nueva en la IE. SAN JOSE LA HUACA, así mismo, se evalúan los tiempos necesarios a tramitar en la prórroga al contrato de obra e interventoría por un periodo que oscila cercano a los CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS teniendo en cuenta que se tienen sedes que solo hasta la semana del 14 de octubre de 2024 se están iniciando, derivado del mismo acondicionamiento dado por los rectores para la ejecución de actividades, mayores tiempos que serán con atribución compartida a los proyectos y contratista de obra debido a las demoras evidenciadas en las sedes que actualmente ya se encuentran en ejecución del componente 2. Cabe resaltar que dentro la evaluación adelantada para la prórroga a tramitar los costos de los mayores tiempos de interventoría está cercana a los ($39.815.061,65) millones de pesos. Por lo anterior, para la semana del 21 al 25 de octubre se presentará la solicitud de modificación a los contratos de obra e interventoría en alcance a lo socializado en el presente comité de seguimiento, derivado de lo anterior, se socializa al MEN los modificatorios a tramitar para los contratos derivados del G10, así:

CONTRATO No. PAF-MENAM-O-080-2023:

- Nota aclaratoria a la cláusula tercera del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023 en la que se indique que los saldos disponibles del producto “SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS. INCLUYE, MATERIAL ENVOLVENTE DE MUROS Y CUBIERTA”, que corresponden a un valor de $14.991.564,00 según balance financiero, sean asignados al producto “EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD” del componente 2 del contrato No. PAF-MENAM-O-080-2023.

- Adición por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($261.003.846,00) al valor de ejecución del Componente 2 del contrato, valor que será cubierto con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4917031 para la ejecución de las actividades diagnosticadas y complementarias necesarias para cumplir el alcance de intervención de las 15 sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias.

- Prórroga por un plazo de CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 15 sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias, en funcionamiento, el cual dará terminación el 30 de diciembre de 2024.

CONTRATO No PAF-MENAM-I-062-2023:

- Prórroga por un plazo de CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de los 15 proyectos funcionales según alcance priorizado al contrato, es decir hasta el 1 de marzo de 2025.

- Adición por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($39.815.061,65) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, de los cuales, el valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($19.509.380.21) incluido IVA, que corresponde al (49%) del valor adicionar, será cubierto con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, y el valor de VEINTE MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($20.305.681,44) incluido IVA, que corresponden al (51%) del saldo adicionar, serán cubiertos por el contratista de obra CONSORCIO FIN GRUPO 10 y los mismos, serán descontados de la cuenta de cobro siguiente a la legalización del modificatorio 2 tramitado

Por lo anterior se socializada la necesidad presente en el comité de seguimiento y se solicita al MEN se apruebe el trámite a realizar con el fin de poder darle los tiempos y recursos necesarios a los contratos derivados con el fin de poder continuar con la ejecución, terminación y entrega de las 15 sedes priorizadas dentro del GRUPO 10 del programa.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Suárez
VALOR DE INVERSIÓN		$ 691.254.049
POBLACIÓN BENEFICIADA		755
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1527,62 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cinco bloques compuestos por 12 aulas mas aulas múltiples. Mantenimiento de paredes en bloque 4 y biblioteca. Instalación de redes eléctricas y mejoramiento de las mismas.
Baterías sanitarias	.	Mejoramiento de redes eléctricas
FECHA DE ENTREGA		Pendiente por definir

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE MARIA INMACULADA ID MEN. 189. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Suarez
VALOR DE INVERSIÓN		$ 1,751.056.805
POBLACIÓN BENEFICIADA		365
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mejoramiento de 7 aulas repartidas en dos bloques, instalación de teja upvc 2,5mm, mantenimiento de paredes general, instalación de enchape, mantenimiento y cambio de carpintería metálica puertas y ventanas, instalación de redes eléctricas aulas y pasillos.
Aulas nuevas	6	Construcción de 6 aulas en dos niveles, en estructura metálica y muros en mampostería, instalación de redes eléctricas.
Baterías sanitarias	1	Construcción de batería para niños conformada por 7 tazas sanitarias, un orinal, 2 lavamanos corridos y un lavamanos de pedestal. Incluye mejoramiento de batería de niñas, cambio de cubierta y mantenimiento de paredes, unidades sanitarias y grifería. Red sanitaria hasta la cámara de inspección.
FECHA DE ENTREGA		02 de noviembre de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Suárez
VALOR DE INVERSIÓN		$ 298.805.430
POBLACIÓN BENEFICIADA		356
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1077,08 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 5 bloques compuestos por 13 aulas.
Baterías sanitarias		Mejoramiento cambio de cubierta
FECHA DE ENTREGA		02 de noviembre de 2024

Ahora









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Toribio
VALOR DE INVERSIÓN		$ 299.723-010
POBLACIÓN BENEFICIADA		369
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 908 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cuatro bloques compuestos por 8 aulas mas espacios comunes. Y construcción de red para evacuación de aguas lluvias conformada por 10 cajas de inspección y 89,07m de tubería Novafort 200mm
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		14 de Agosto de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO. ID MEN:16. MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Santander de Quilichao
VALOR DE INVERSIÓN		$ 104.144.256
POBLACIÓN BENEFICIADA		26
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 310,20 m2 de teja Upvc 2,5 mm en dos bloques compuestos por 3 aulas más un salón de sistemas. Mantenimiento de puertas y ventanas en ambos bloques
Baterías sanitarias	N.A.	Mejoramiento de 3 unidades sanitarias, cambio de tazas e instalación de piso cerámico.
FECHA DE ENTREGA		28 de mayo de 2024

Antes





Después






Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID MEN. 16. MUNICIPIO DE SANTADER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Santander de Quilichao
VALOR DE INVERSIÓN		$ 1,061,543,992
POBLACIÓN BENEFICIADA		445
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	8	Construcción de 8 aulas de 52,3 m2 en sistema liviano (prefabricado), repartidas en 4 módulos, 2 de ellos construidos sobre terreno natural y otros 2 en sistema palafítico. Para un área útil de 418,4 m2 sin contar pasillos.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 4 tazas sanitarias con sus respectivos lavamanos para niñas y 2 tazas sanitarias, 2 orinales y 4 lavamanos para niños. Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA		02 de noviembre de 2024

Antes





Después






Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY ID MEN 62. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 484.431.971
POBLACIÓN BENEFICIADA		239
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	15	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de estructura metálica para cubiertas e instalación de 970,60 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cinco bloques compuestos por 15 aulas, Mantenimiento de puertas y ventanas en ambos bloques, cambio sistema eléctrico
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	11	Mejoramiento de 11 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		18 de octubre de 2024

Antes









Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO ID MEN.129.MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 184.642.086
POBLACIÓN BENEFICIADA		181
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 484,71 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 3 bloques compuestos por 7 aulas, Mantenimiento de puertas en ambos bloques, cambio sistema eléctrico en 3 aulas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	9	Mejoramiento de 9 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes









Después








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL ID MEN.128. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 350.578.489
POBLACIÓN BENEFICIADA		360
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1130 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 3 bloques compuestos por 11 aulas, repello, estuco y pintura en estructura de vigas en concreto.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	N.A	
FECHA DE ENTREGA		18 de octubre de 2024

Antes














Después

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA ID MEN.130. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 55.994.009
POBLACIÓN BENEFICIADA		3
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de cubierta 129,78 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 1 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento de 2 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		08 de agosto de 2024

Antes







Después








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA ID MEN.85. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO	Guadalajara de Buga	
VALOR DE INVERSIÓN	$ 279.879.927	
POBLACIÓN BENEFICIADA	8	
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Mantenimiento estructura metálica para cubierta, instalación de estructura de cubiertas e instalación de cubierta 163,81 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 2 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico.
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aulas de 52,3 m2 en sistema liviano (prefabricado)
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos, construcción en sistema prefabricado, y mejoramiento de 2 baterías sanitarias, con sus respectivos cambios de tazas y lavamanos, estuco y pintura
FECHA DE ENTREGA	02 de noviembre de 2024	

Antes



Después



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN ID MEN.158. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 149.223.224
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	5	Mantenimiento estructura metálica para cubierta, instalación de estructura de cubierta e instalación de cubierta 179,12m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 4 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico, estuco pintura, andenes, enchape de pisos, instalación sanitaria, cambio de puertas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	5	Mejoramiento de 5 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes








Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) ID MEN. 105. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$183.458.682
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aula de 87,55 m2 en sistema liviano (prefabricado),. Para un área útil de 74.71 m2.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA		02 de noviembre de 2024

Antes











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) ID MEN. 105. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$183.458.682
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aula de 87,55 m2 en sistema liviano (prefabricado),. Para un área útil de 74.71 m2.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA	02 de noviembre de 2024	

Despues

















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR ID MEN. 106. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$ 56.443.965
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	1	• Mantenimiento estructura madera para cubierta, instalación de 136,21 m2 de teja Upvc 2,5 mm en aula y baños. Mantenimiento de paredes interiores y exteriores. Instalación de 2 aparatos sanitarios . Instalación de luminarias. Instalación de canales y bajantes
Aulas nuevas	N.A	N.A
Baterías sanitarias	N.A	Mejoramiento de 2 unidades sanitarias,
FECHA DE ENTREGA		Pendiente por definir

Antes





Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS ID MEN.107. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$ 224.979.427
POBLACIÓN BENEFICIADA		52
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mantenimiento estructura madera para cubierta y entrepiso, instalación de 63 m2 de teja Upvc 2,5 mm en circulación fachada principal. Mantenimiento de paredes interiores y exteriores.. Instalación de luminarias tomas e interruptores. Instalación de cielorraso falso., mantenimiento entrepiso en madera.
Aulas nuevas	N.A	N.A
Baterías sanitarias	1	Mantenimiento de una batería sanitaria conformada por: 4 tazas sanitarias con sus respectivos lavamanos 2 para niñas y 2 para niños. Enchape de pisos y paredes. Instalación de puertas
FECHA DE ENTREGA		Pendiente por definir

Antes









Después



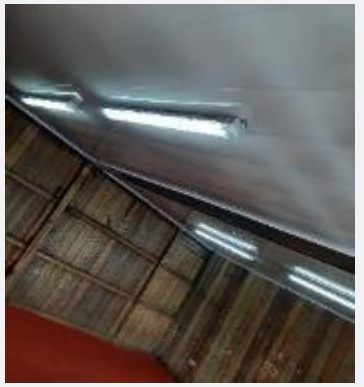


Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.728.021.810 **I:** $ 358.032.903	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/10/2024	**Progr**	95,60%	-6,57%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	95,33%	**Ejecut**	89,03%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	88,37%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 M
El Tambo	I.E. Huisitó	Huisitó (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	13	6 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	6	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	17	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	3	2 M
		El Altillo	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	2	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

COMPONENTE 2

Estado	Proyectos
Entregados	11
Terminados	3
Ejecución	4
Sin iniciar	0

En atención al último seguimiento, se solicitará prórroga al contrato con el fin de terminar actividades de las ultimas 4 sedes en ejecución, en especial por Huisitó, el cual, ha presentado diversas dificultades de ejecución deslizamientos en vías (suspensión en agosto), reubicación de poste (inoportunidad de respuesta empresa de servicio), cortes de energía que han retrasado las actividades de soldadura sobre la estructura metálica, consecución de equipos y maquinaria en zona, etc.

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO








I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega



C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO













C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial













I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista Rosas







I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas









I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO






I.E. Olaya – Sede principal
Balboa






I.E. Santa Teresita – Sede principal
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO






I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo
Bolívar




C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal
Rosas




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay
La Vega







I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

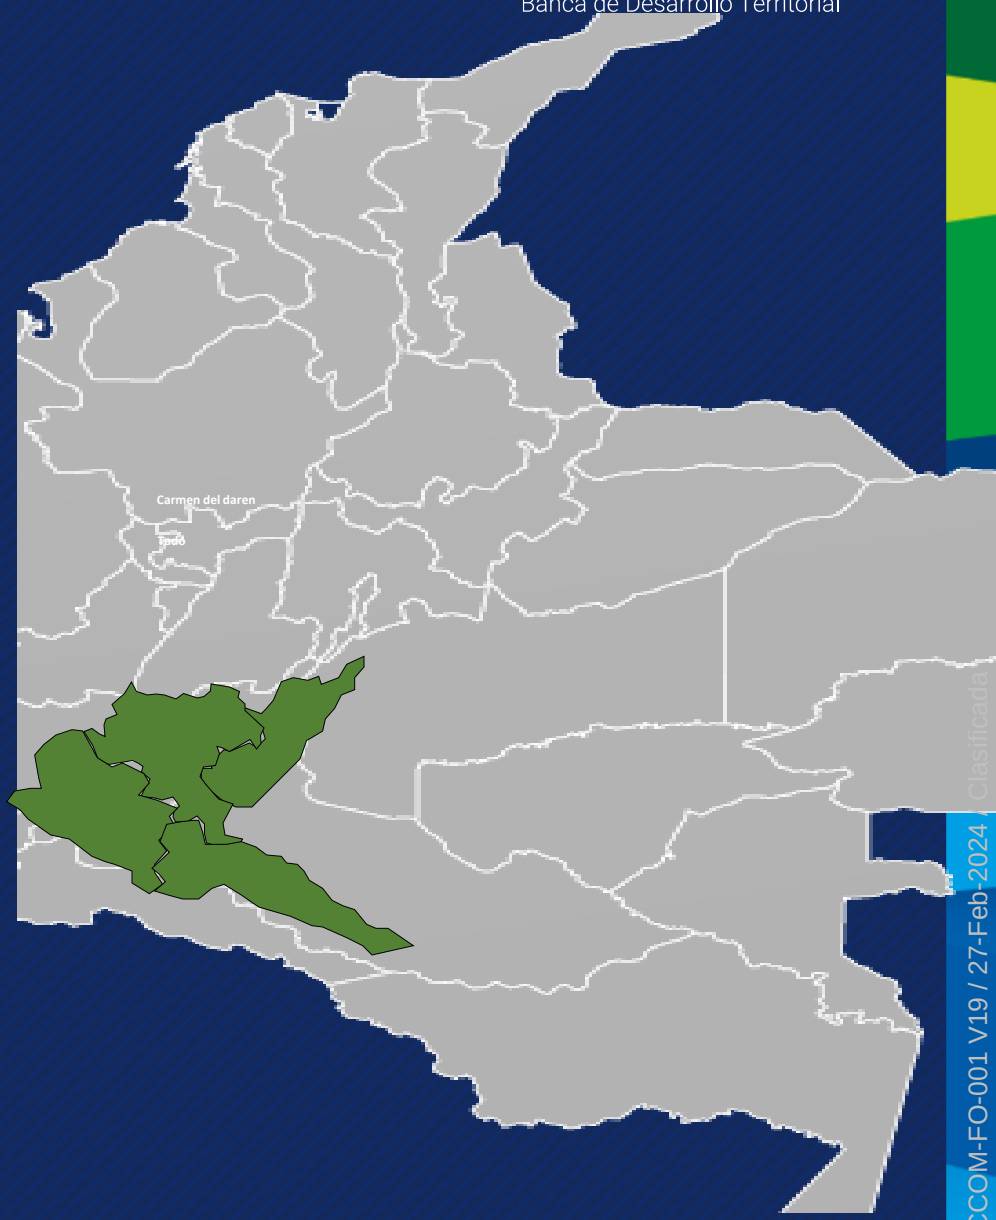

Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL	
O: $4.918.276.400 **I:** $318.105.088	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/12/2024	**Programado**	72,96%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	71,28%	**Ejecutado**	77,12%
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	75,70%	**En ejecución**	

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID125. Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	0	28	1
Cauca	Piamonte	ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	1
Huila	Acevedo	ID26. Institución Educativa Bateas	Bateas	0	5	5
Nariño	Pasto	ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	5	0
Nariño	El Rosario	ID8. Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	5	0	7
Nariño	Barbacoas	ID87. Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	2
Nariño	Barbacoas	ID110. Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombón	0	2	1
Nariño	Ipiales	ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	1
Nariño	Mallama (Piedrancha)	ID149. Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	1
Putumayo	Puerto Asís	ID41.I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID57. I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	0	1
Putumayo	Pto Leguízamo	ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	0	1	1
Putumayo	Orito	ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	12

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

Estado	Proyectos
Entregados	12
Terminados	0
Ejecución	6
Sin iniciar	0

- Se han presentado dificultades con la ejecución ID125 Piamonte sede principal, dado que no nos han dejado ejecutar las adecuaciones a las baterías de preescolar + circulaciones y cerramiento, se ha enviado 3 correos a la secretaria de educación departamental del Cauca, sin respuesta formal. Se solicita apoyo al MEN para cerrar esta obra.
- En la sede ID36. Tallambi, se presentaron observaciones sobre un aula, al cual, debe ser subsanada esta semana, se realizará armado de aulas en paralelo con cuadrilla especial y se solicitó balancear presupuesto al contractual.
- En la sede ID41. Teteye, se encuentra en ejecución de actividades eléctricas, enchapes e instalación de aparatos sanitarios, pendiente el sistema fotovoltaico.
- En la sede ID57. Progreso, se encuentra en ejecución de estucos y pinturas.
- En la sede ID127. Orito, se encuentra en instalación de estructura metálica de cubierta, falta instalar cubierta.
- En la sede ID172. Sede Principal Puerto Asís, se realizó cambio de estructura de cubierta e instalación de cubierta en internado aprovechando la semana de receso escolar, se continua con actividades de estructura de tanque y mejoramiento de baterías sanitarias.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Pasto - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 262.132.882
POBLACIÓN BENEFICIADA		986
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		15 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

MUNICIPIO		El Rosario - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 66.208.426
POBLACIÓN BENEFICIADA		8
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		24 de junio de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Acevedo - Huila
VALOR DE INVERSIÓN		$ 278.705.701
POBLACIÓN BENEFICIADA		193
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. • Mejoramiento de restaurante escolar
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 82.111.341
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		5 de julio de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes





Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes





Después









Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 112.235.014
POBLACIÓN BENEFICIADA		173
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		22 de julio de 2024

Antes



Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 57.066.573
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		19 de junio de 2024

Antes



Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 214.447.888
POBLACIÓN BENEFICIADA		33
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	4	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		16 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 97.200.260
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 135.500.591
POBLACIÓN BENEFICIADA		39
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 193.112.465
POBLACIÓN BENEFICIADA		24
ALCANCE		
Mejoramientos Aula múltiple	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	• Ejecutada dentro del aula
FECHA DE ENTREGA		6 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Cumbal - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 818.394.559
POBLACIÓN BENEFICIADA		171
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	5	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	7	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 184.632.555
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	1	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 197.031.005
POBLACIÓN BENEFICIADA		6
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	1	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 1.339.389.729
POBLACIÓN BENEFICIADA		850
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	28	
Aulas nuevas	N.A	
Mejoramientos Baterías sanitarias	3	
Baterías sanitarias nuevas	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Orito - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 206.821.177
POBLACIÓN BENEFICIADA		13
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A	
Aulas nuevas	1	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 224.052.916
POBLACIÓN BENEFICIADA		161
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas)	6	
Aulas nuevas	N.A	
Mejoramientos Baterías sanitarias	12	
Baterías sanitarias nuevas	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

AULAS MOVILES

Hacienda

Octubre 28 de 2024


Contrato No. 4917031-2023

136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/11/2024
Fecha Propuesta Fin: 01/07/2024

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	En Obra [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	En Obra [97,17%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	En Obra [86,77%] 14/11/2023 - 19/10/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	En Obra [60,92%] 31/05/2024 - 30/10/2024
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	En Obra [100%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	Etapa I – Diseños [3,75%] 23/08/2024 - 08/12/2024
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [56,24%] 19/02/2023 - 03/11/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	En Obra [87,86%] 12/02/2023 - 27/10/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	En Obra [79,31%] 20/02/2023 - 04/12/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	En Ejecución [5.6%] 03/10/2024 – 03/12/2024

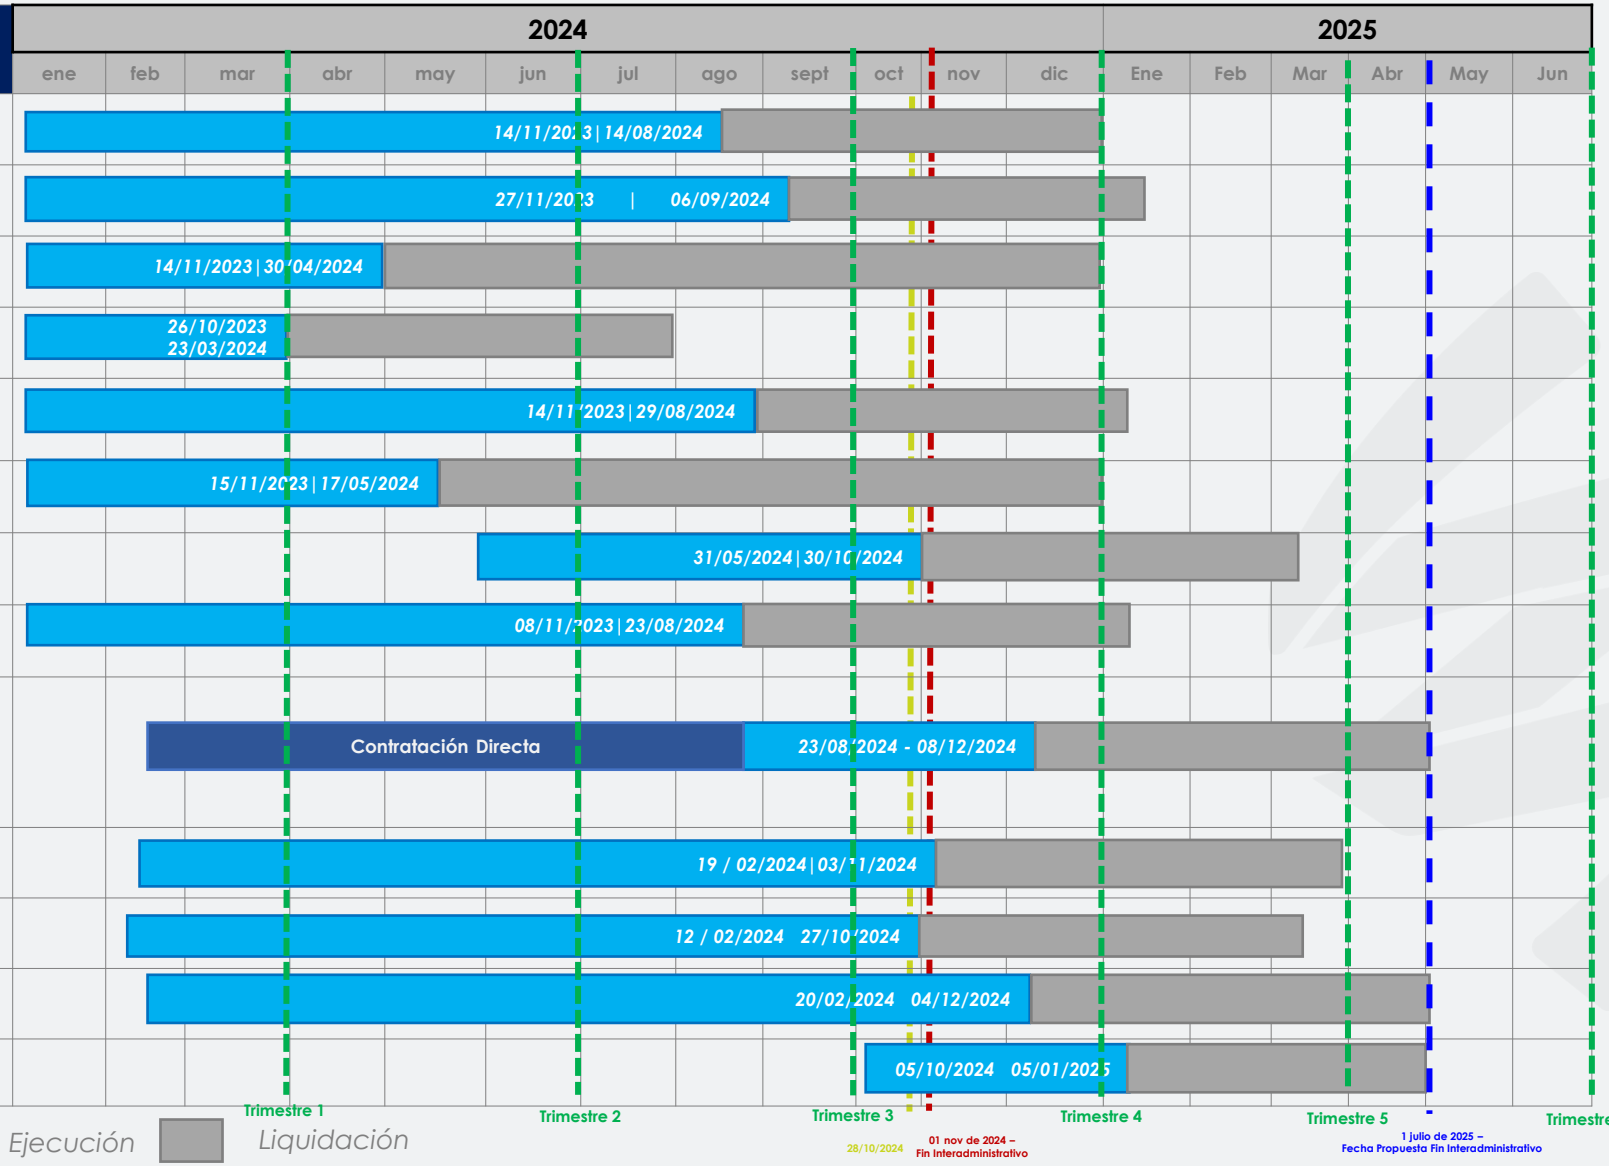

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 –
Fin Interadministrativo

ENTREGADAS	TERMINADAS	POR INICIAR	EN EJECUCIÓN
79 sedes	11 sedes	1 sedes	45 sedes
58,09%	8,09%	0,74%	33,09%

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

01 nov 24 – Fin Interadministrativo

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
$ 34.832 mll	$ 28.217 mll	$ 59.022 mll	$ 463 mll

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado Entrega de Dotación

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada
17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:
Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:
DOTAESCOL SAS
Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024
2 meses de ejecución

Suministro, entrega e instalación de dotación de mobiliario escolar en las aulas educativas nuevas de las sedes afectadas por la temporada de lluvias, incluyendo todas las actividades necesarias para la puesta en condiciones de funcionalidad. El suministro se debe realizar de acuerdo con los elementos que conforman la tipología de dotación así:

A. Aulas Preescolares: puesto de trabajo preescolar, cada uno compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas.
B. Aulas Primaria: puesto para alumno primaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
C. Aulas Secundaria o Multigrado: puesto alumno secundaria cada uno compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
D. Para todas las Aulas: (1) juego de puesto de trabajo docente compuesto por una (1) mesa y una (1) silla.
E. Un (1) tablero alta resistencia para marcador borrable por aula.
F. Un (1) tablero móvil para aulas multigrado.
G. Un (1) juego tándem de tres (3) canecas por aula.

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

ENTREGAS :

Sede La Paz – Cesar. Octubre 21

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023
MINISTERIO DE EDUCACION
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha: Agosto 31 de 2024

Educación

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23				$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 82.351.406,35	$ -		$ 82.351.406,35
sep-23	$ 108.927.246,74	$ -		$ 191.278.653,09
oct-23	$ 131.902.760,66	$ -		$ 323.181.413,75
nov-23	$ 144.907.033,92	$ -		$ 468.088.447,67
dic-23	$ 143.221.271,36	$ 468.088.448,00	13/12/2023	$ 143.221.271,03
ene-24	$ 133.626.379,48	$ 143.221.271,36	10/01/2024	$ 133.626.379,15
feb-24	$ 120.547.529,88	$ 133.626.379,15	12/02/2024	$ 120.547.529,88
mar-24	$ 117.745.976,50	$ 120.547.529,88	12/03/2024	$ 117.745.976,50
abr-24	$ 100.331.907,69	$ 117.745.976,50	10/04/2024	$ 100.331.907,69
may-24	$ 89.374.457,56	$ 100.331.907,69	11/05/2024	$ 89.374.457,56
jun-24	$ 76.820.331,89	$ 89.374.457,56	13/06/2024	$ 76.820.331,89
jul-24	$ 68.012.790,67	$ 76.820.331,89	15/07/2024	$ 68.012.790,67
ago-24	$ 21.741.419,32	$ 68.012.790,67	14/08/2024	$ 21.741.419,32
TOTALES	**$ 1.339.510.512,02**	**$ 1.317.769.092,70**		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GIRO DE RENDIMIENTOS**	**Fecha de Giro**	**SALDO POR GIRAR**
ene-23		$ -		$ -
feb-23	$ -	$ -		$ -
mar-23	$ -	$ -		$ -
abr-23	$ -	$ -		$ -
may-23	$ -	$ -		$ -
jun-23	$ -	$ -		$ -
jul-23	$ -	$ -		$ -
ago-23	$ 443.947.650,01	$ -		$ 443.947.650,01
sep-23	$ 548.880.836,71	$ -		$ 992.828.486,72
oct-23	$ 436.008.307,20	$ -		$ 1.428.836.793,92
nov-23	$ 718.224.229,49	$ -		$ 2.147.061.023,41
dic-23	$ 788.090.860,63	$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	$ 788.090.860,04
ene-24	$ 427.858.051,59	$ 788.090.860,63	10/01/2024	$ 427.858.051,00
feb-24	$ 474.970.095,24	$ 427.858.051,00	12/02/2024	$ 474.970.095,24
mar-24	$ 478.495.863,61	$ 474.970.095,24	12/03/2024	$ 478.495.863,61
abr-24	$ 259.736.382,70	$ 478.495.863,61	10/04/2024	$ 259.736.382,70
may-24	$ 353.632.163,66	$ 259.736.382,70	11/05/2024	$ 353.632.163,66
jun-24	$ 266.323.590,41	$ 353.632.163,66	13/06/2024	$ 266.323.590,41
jul-24	$ 294.233.627,01	$ 266.323.590,41	15/07/2024	$ 294.233.627,01
ago-24	$ 313.006.436,96	$ 294.233.627,01	14/08/2024	$ 313.006.436,96
TOTALES	**$ 5.803.408.095,22**	**$ 5.490.401.658,26**		
SALDO POR GIRAR	**$ 334.747.856,28**			

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Octubre 28 de 2024



UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10
Proyectos

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

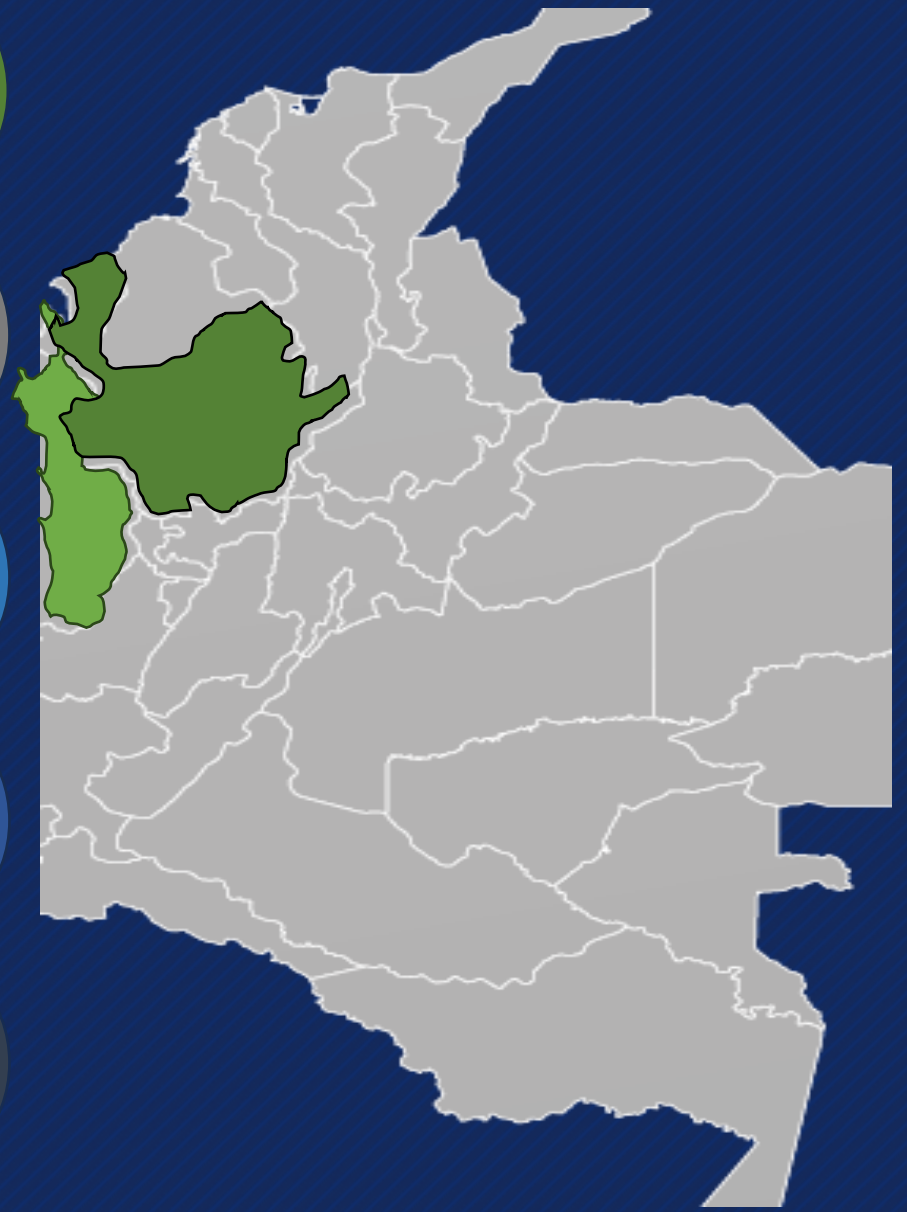

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Antioquia	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA		6	3 MEJ	27/2/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS		14	5 MEJ	21/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO		9	5 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO		23	8 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA		4		14/3/2024
Antioquia	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO		3	2 MEJ	30/5/2024
Antioquia	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA		4	5 MEJ	20/5/2024
Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	2		4 BS NUEVAS	14/8/2024
Chocó	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		2	4 MEJ	30/5/2024
Chocó	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA		6	3 BS NUEVAS 5 MEJ	14/8/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

100%
Porcentaje Programado

100%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con corte al 27 de octubre de 2024, porcentaje programado 100% vs ejecutado 100%, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE. DEMETRIO SALAZAR: Se terminan las actividades de construcción aulas y baterías el 14 de agosto de 2024- Se realiza entrega del proyecto y suscripción AEP&SC el 22 de octubre.
2. I.E PUEBLO NUEVO: Se terminan las actividades de construcción aulas y baterías nuevas - Se realiza entrega del proyecto y suscripción AEP&SC el 21 de agosto.
3. IE. SAN MARTÍN DE PORRES: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, así mismo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de mayo del 2024 y suscripción AEP&SC
4. IE CHURIDO PUEBLO: Se culminan actividades de mejoramiento de manera general, se realiza orden y aseo y se realiza entrega de las actividades a la entidad territorial el 17 de mayo del 2024, cabe aclarar qué, el rector de la I.E previamente manifestó no querer hacer parte del proceso, por lo que designó a la secretaría de educación para los fines pertinentes. Se realiza instalación de la placa el 17 de mayo del 2024. y suscripción AEP&SC
5. I.E EL GUINEO - SEDE EL OSITO: Se culminan actividades de intervención general aula nueva, mejoramientos de aulas y baterías sanitarias, entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se entregaron el 14 de mayo, Se realiza instalación de la placa informativa MEN el 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
6. I.E CADENAS LAS PLAYAS: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 21 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de abril del 2024, y suscripción AEP&SC
7. I.E RURAL EL REPOSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalacion placa informativa MEN el día 24 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
8. I.E MARÍA AUXILIADORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 5 de abril, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 17 de abril del 2024 y suscripción AEP&SC
9. I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - JESÚS MORA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 14 de marzo, se realiza instalación de la placa informativa MEN el 14 de marzo del 2024 y suscripción AEP&SC
10. I.E PAULINA PUERTA: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector y secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de febrero, se realiza instalación de la placa informativa MEN el día 23 de abril del 2024 y se suscribe AEP&SC el 12 de mayo de 2024

Sumado a lo anterior, se inician los trámites de cierre del contrato y posterior liquidación

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 1, Departamentos de Antioquia - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

BALANCE GENERAL POR CONTRATO DERIVADO

INTERVENTORÍA					
COMPONENTE	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**	**SALDO SOBRANTE**
1	$ 130.133.279,78	$ 130.133.279,78	$ 130.133.279,78	$ -	$ -
2	$ 195.086.032,54	$ 189.858.781,63	$ 170.349.123,63	$ 19.509.658,00	$ 5.227.250,91
TOTAL	$ 325.219.312,32	$ 319.992.061,41	$ 300.482.403,41	$ 19.509.658,00	$ 5.227.250,91
NOTA: De cada uno de los pagos, se efectuó una retención en garantía del diez por ciento (10%) la cual se devolverá al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del contrato. El valor de la rete garantía acumulado asciende a la suma de **$ 30.048.240,34**					

OBRA					
COMPONENTE	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR FACTURADO**	**PENDIENTE POR PAGAR**	**SALDO SOBRANTE**
1	$ 276.444.315,00	$ 276.444.315,00	$ 276.444.315,00	$ -	$ -
2	$ 3.372.041.007,00	$ 3.149.121.765,22	$ 3.145.944.631,16	$ 3.177.134,06	$ 222.919.241,78
TOTAL	$ 3.648.485.322,00	$ 3.425.566.080,22	$ 3.422.388.946,16	$ 3.177.134,06	$ 222.919.241,78
NOTA: De cada uno de los pagos, se efectuó una retención en garantía del diez por ciento (10%) la cual se devolverá al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidación del contrato. El valor de la rete garantía acumulado asciende a la suma de **$ 342.238.894,61.**					

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO
ID No. 161

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 237.984.039,98
POBLACIÓN BENEFICIADA		97
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, mejoramiento puntual de red eléctrica e implementación de circulación entre bloques
Aulas nuevas	1	Suministro e instalación de aula de 54 M2 tipo multigrado, prefabricada.
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica general, accesorios hidrosanitarios y limpieza de enchapes.
FECHA DE ENTREGA		14 de mayo de 2024

Antes





Después







GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO

ID No. 118

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 265.366.273,19
POBLACIÓN BENEFICIADA		1670
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	23	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica y de aluminio, y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	11	• Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios, cubiertas, mampostería, pisos en general, carpintería metálica, red eléctrica e hidrosanitaria general, limpieza y cambio de enchapes, cambio de aparatos sanitarios y cielos falsos. • Instalación de 6 unidades sanitarias nuevas
FECHA DE ENTREGA		14 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS

ID No. 66

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 287.362.737,31
POBLACIÓN BENEFICIADA		767
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	14	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica y de aluminio, mejoramiento puntual de red eléctrica e implementación de red interna de manejo de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	5	Mejoramiento y mantenimiento de aparatos sanitarios y accesorios hidrosanitarios, cubiertas, mampostería, carpintería metálica, red eléctrica general, y limpieza y cambio de algunas piezas de enchapes.
FECHA DE ENTREGA		21 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
ID No. 86

MUNICIPIO		Apartadó - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 402.988.697,07
POBLACIÓN BENEFICIADA		567
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, aumento de nivel bloque 2, construcción de cárcamo para evacuación de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	6	Cambio de red hidrosanitaria, mantenimiento y cambio de aparatos sanitarios, adecuación de mampostería, realce de nivel y enchape de pisos, mejoramiento de cubiertas, carpintería metálica y red eléctrica general.
FECHA DE ENTREGA		17 de mayo de 2024

Antes



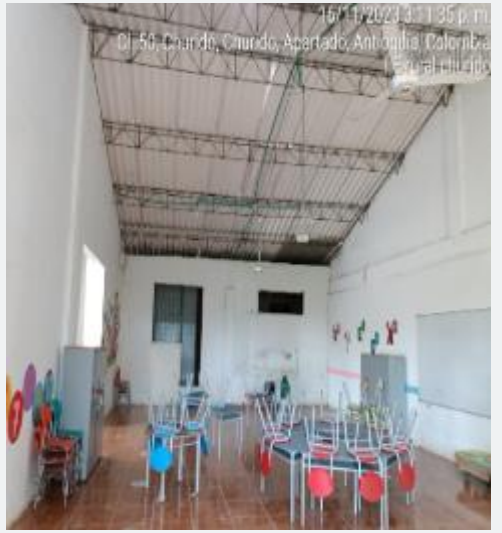



Después









GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA

ID No. 112

MUNICIPIO		Turbo - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 201.348.400,15
POBLACIÓN BENEFICIADA		581
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	3	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, mampostería, aumento de nivel de piso bloque principal (aulas y circulación), construcción de pompeyano al ingreso.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		14 de marzo de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA

MUNICIPIO		Turbo - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 119.858.049,55
POBLACIÓN BENEFICIADA		387
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	4	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, carpintería metálica, acondicionamiento de cuarto técnico, implementación de andén de conexión al cuarto técnico y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	5	• Cambio de enchape y aparatos sanitarios, mantenimiento de cubierta y de red eléctrica e hidrosanitaria general, adecuación de mampostería y carpintería metálica • Instalación de 6 unidades sanitarias nuevas
FECHA DE ENTREGA		17 de mayo de 2024

Antes







Después









GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42

MUNICIPIO		Ciudad Bolívar - Antioquia
VALOR DE INVERSIÓN		$ 127.067.124,54
POBLACIÓN BENEFICIADA		84
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	6	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, carpintería metálica, y mejoramiento puntual de red eléctrica.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	3	Limpieza de aparatos sanitarios y enchapes, cambio de grifería y puesta en funcionamiento de los aparatos sanitarios, mejoramiento de la red eléctrica y mantenimiento de cubierta.
FECHA DE ENTREGA		27 de febrero de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150

MUNICIPIO		Tadó - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 155.995.803,88
POBLACIÓN BENEFICIADA		16
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería, implementación de circulación entre bloques.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Baterías sanitarias	4	Conexión al sistema hidráulico, mantenimiento de aparatos sanitarios y adecuación sistema sanitario con la instalación de pozo séptico y construcción de campo de infiltración para manejo de aguas residuales.
FECHA DE ENTREGA		05 de abril de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA

MUNICIPIO		Tadó - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 413.407.575,58 – En cierre de Balance
POBLACIÓN BENEFICIADA		140
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	6	• Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. • Construcción de cárcamos y cunetas
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	5	• Mejoramiento y mantenimiento de: cubiertas, mampostería, carpintería metálica, red eléctrica general y red hidrosanitaria. • Limpieza de enchape de pared, aparatos sanitarios y reemplazo de enchape de piso.
Baterías sanitarias nuevas	3	Construcción de 2 baterías sanitarias de 3,58 M2 y 1 baño PMR de 4,99 M2.
FECHA DE ENTREGA		21 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94

MUNICIPIO		Carmen del Darién - Chocó
VALOR DE INVERSIÓN		$ 934.565.929,81 en Cierre de Balance
POBLACIÓN BENEFICIADA		38
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	N.A.	N.A.
Aulas nuevas	3	• Suministro e instalación de 2 aulas de 54 M2 cada una tipo multigrado y 1 aula múltiple de 18 M2, todas prefabricadas. • Construcción de acceso PMR y circulación. • Instalación de un sistema fotovoltaico independiente con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Baterías sanitarias nuevas	4	• Suministro e instalación de 3 baterías sanitarias de 3,45 M2 y de 1 baño PMR de 5,31 M2, todas prefabricadas. • Construcción de circulación • Construcción de pozo séptico y campo de infiltración para manejo de aguas residuales.
FECHA DE ENTREGA		22 de octubre de 2024

Antes





Después








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

9
Proyectos

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 9 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630 Inversión

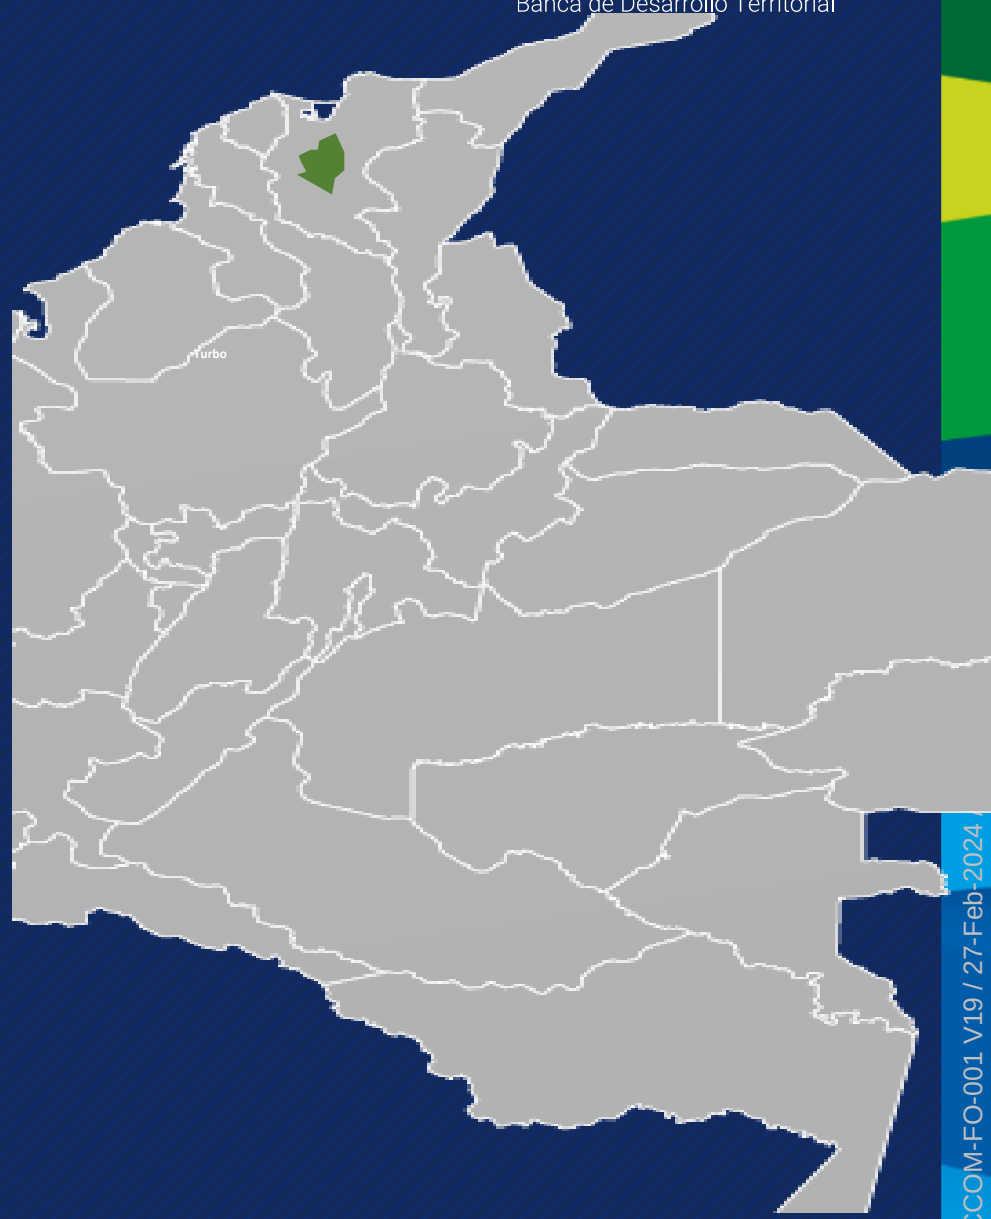

GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

SEDES INTERVENIDAS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
				AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERIAS SANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	1		2	16/09/2024
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE CABICA	3		1	13/09/2024
Atlántico	Galapa	IE MARIA AUXILIADORA	IE MARIA AUXILIADORA		15		16/08/2024
Atlántico	Repelón	IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS	SEDE PRINCIPAL		8		18/07/2024
Atlántico		IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA		5	8	11/07/2024
Atlántico	Soledad	IE JOSEFA DONADO	SEDE PRINCIPAL		16	8	16/07/2024
Atlántico		IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE		22		17/09/2024
Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	SEDE MESOLANDIA		8		4/09/2024

PORCENTAJES DE AVANCE:

100%
Porcentaje Programado

98,50%
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con corte al 27 de octubre, y en proceso de entregas y recibo a satisfacción, se resaltan las siguientes particularidades:

1. IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE – Soledad. Actividades ejecutadas, la IE. presenta observaciones por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto, se establecieron pendientes para recibo a satisfacción. Se realizará visita técnica para evaluar las observaciones y se emitirá concepto técnico.
2. IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL – Soledad. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
3. IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA – Galapa. Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
4. IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
5. IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.
6. IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección, en actividades de terminaciones de batería sanitaria. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción
7. IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción. Se realizó visita por parte de la entidad territorial el 12 de septiembre en validación de atención de pendientes, se reportan faltantes.
8. IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo . Actividades ejecutadas presentaron pendientes por detalles para corrección. Acta de terminación suscrita, de acuerdo a visitas del 27 y 28 de agosto se establecieron pendientes para recibo a satisfacción.

Nota: Las fechas de terminación relacionadas corresponden a las fechas en las cuales se habilito el uso de los espacios dadas las necesidades institucionales, sin perjuicio de los detalles pendientes de atención entre otros documentos pendientes de entrega y aprobación de interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 18 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE PRINCIPAL - Soledad



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 64 - INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - Galapa

















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 83 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PRINCIPAL -Repelón





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 84 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA -Repelón






















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 92 - INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS / SEDE PITA - Repelón





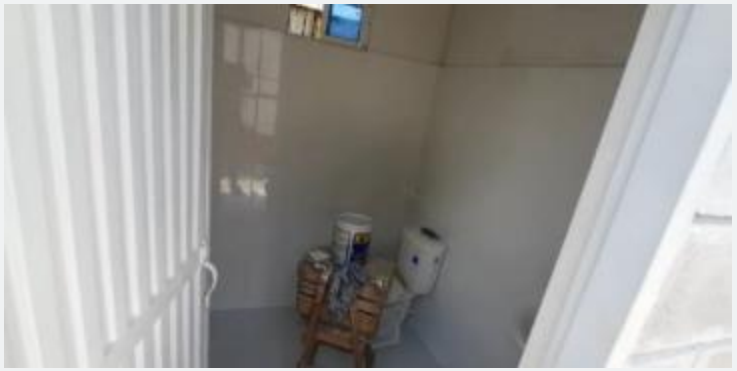


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 144 - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE - Soledad





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 192 - INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO / SEDE CABICA - Soledad








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVA SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IDMEN 197 - INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA - Malambo









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

5
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153
  Interventoría $ 351.774.412
  Inversión Total
  $ 5.096.734.565

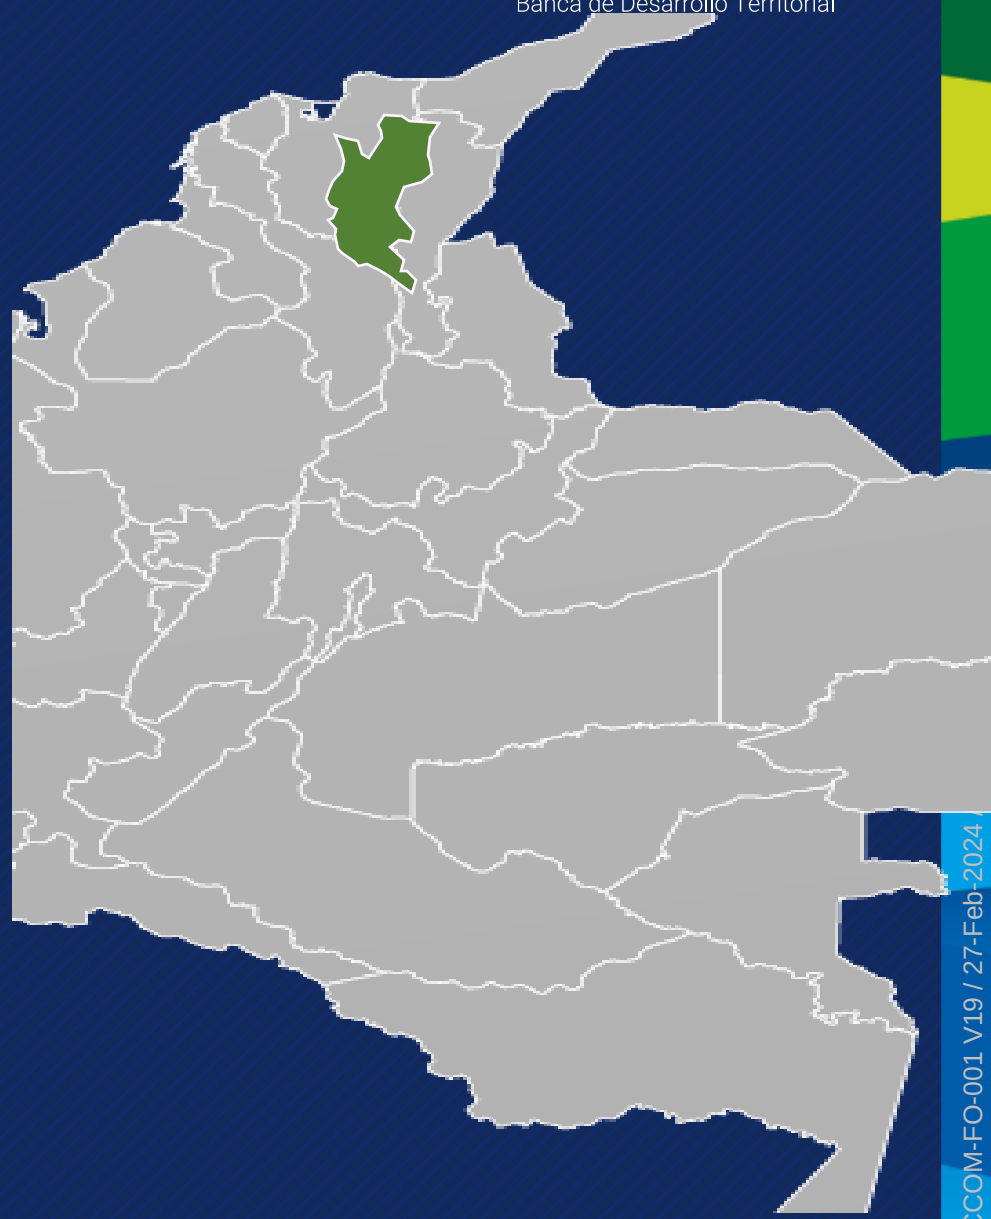

Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $ 4.744.960.153 **I:** $ 371.774.412	14-nov-23	28-dic-24	18-dic-23	12-abr-24	**Programado**	100,00%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**% Financiero G3:** 99,15% **Obra:** 100,00% **Interventoría:** 88,35%		

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Magdalena	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	10	8	25	4.224 M2
	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	NSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	N/A	32	EN CASO QUE APLIQUE	
	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	N/A	7	8	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	N/A	4	EN CASO QUE APLIQUE	
	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	N/A	2	EN CASO QUE APLIQUE	

Avance General: En la semana del 16 al 23 de junio de 2024

Avance general <u>Componente I</u>: Se suscribió acta de entrega 30/01/2024.

Avance general por Sede <u>Componente II</u>: Se realizó entrega el 29 al 30 de abril 2024 con acompañamiento del MEN y UNGRD.

Estado	Proyectos
Entregados	5
Terminados	0
Ejecución	0
Sin iniciar	0

<u>Estado: En liquidación</u>

Obra: LIQUIDADO - Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%.

Interventoría: EN LIQUIDACIÓN - En recopilación de información de liquidación, reunión de seguimiento semanal 25/10/2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7
Proyectos

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

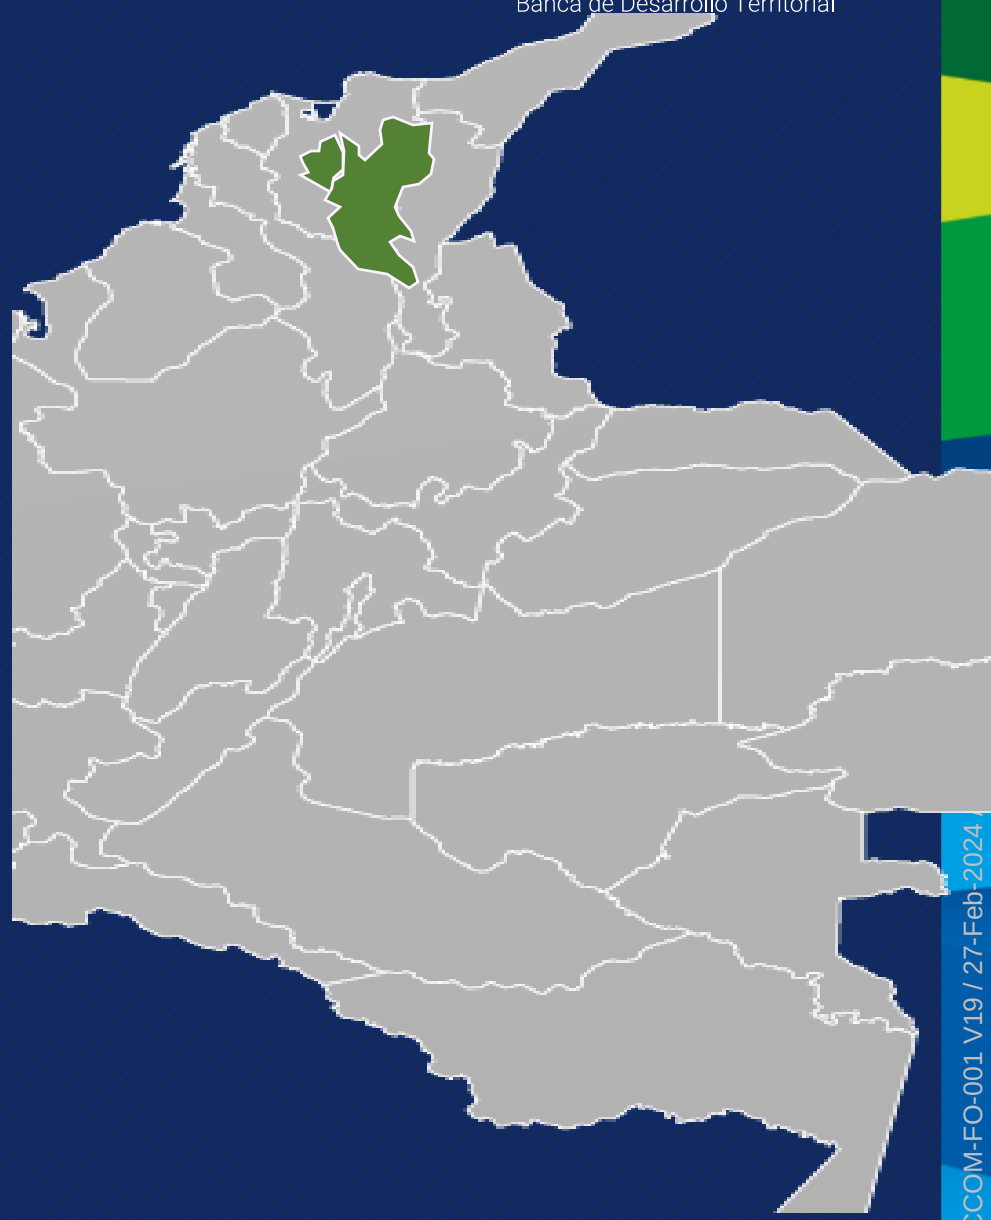

Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

VALOR EJECUCIÓN	FECHA INICIO Proyectada C1	FECHA FIN Proyectada C1	FECHA INICIO Proyectada C2	FECHA FIN Proyectada C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4.744.960.153	24/10/2023	08-12-2023	08-12-2023	07-02-2024	**Programado**	100%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO	ÁREA DESARROLLADA
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	3	13	4	4.224 M2
Bolívar	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	1	2	2	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	0	9	4	
Bolívar	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	1	7	4	
Magdalena	San Sebastían de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	3	2	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	2	6	1	
Magdalena	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	0	2	2	

En proceso de liquidación de obra e interventoría


Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

16
Proyectos

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

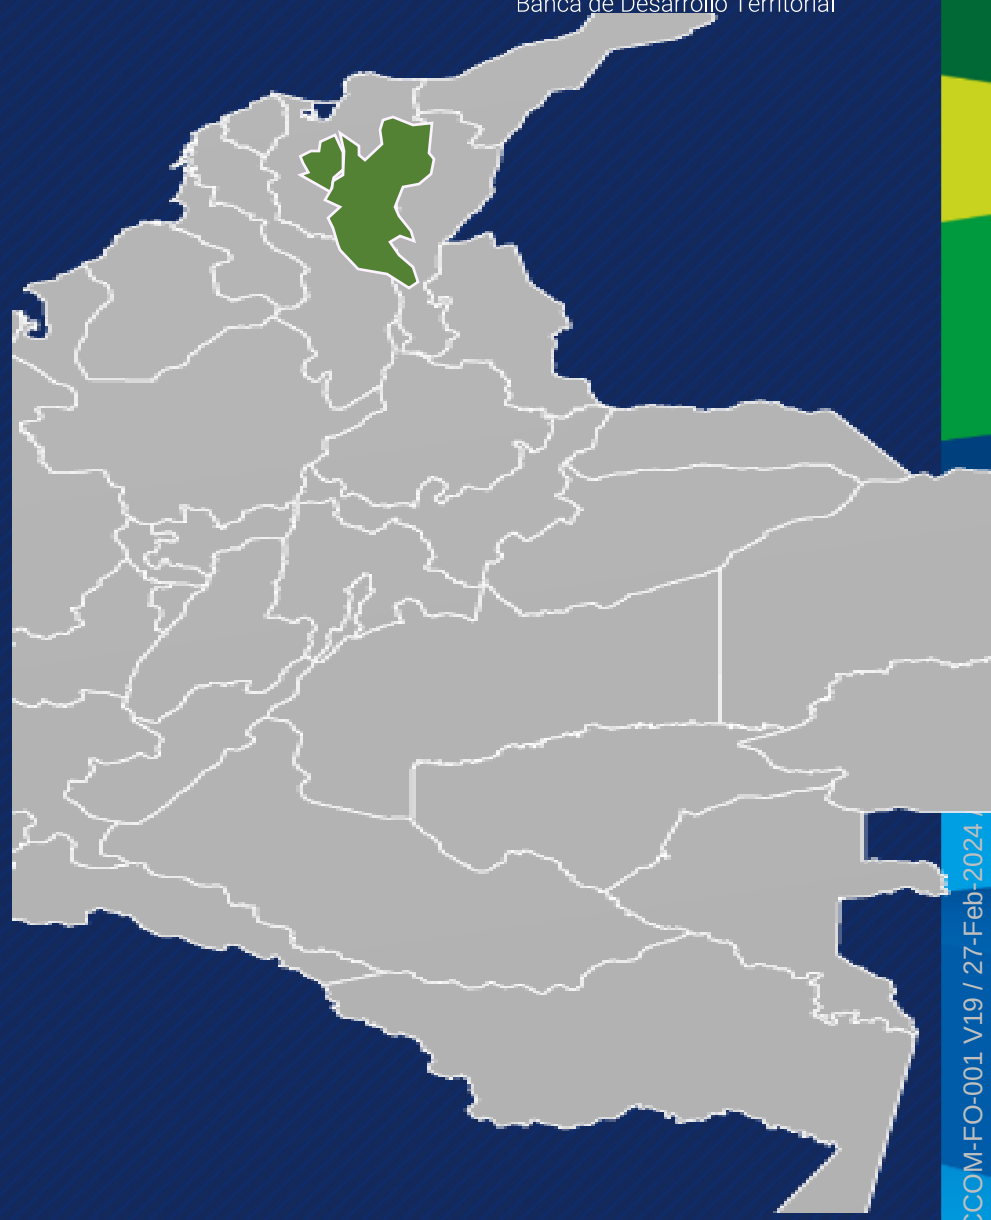

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
4,102,044,984	14-Nov-23	29-Dic-23	16-Nov-23	29/08/2024	Programado	99,53%	-4,23%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100%	Programado	100%	Ejecutado	95,30%	
	Ejecutado	100%	Ejecutado	95,02%			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	APARATOS SANITARIO
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	4
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	1	2	3
Bolívar	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	N.A	7	2
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	N.A	6	6
Magdalena	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	N.A	2	2
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	2	4	8
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE PRINCIPAL	N.A	11	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	2	1	EN CASO DE QUE APLIQUE
Bolívar	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	1	1	1
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	N.A	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Magdalena	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	1	2	EN CASO DE QUE APLIQUE
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	1	N.A	1
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	N.A	2	2
Cesar	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	N.A	3	EN CASO DE QUE APLIQUE

TRAMITES CONTRACTUALES:

Derivado de las diferentes situaciones que se presentan en la zona donde se ejecutan los proyectos, se ha visto afectada el avance obra y suspensión de las mismas, por lo anterior, es importante dejar constancia que, el día 26 de septiembre 2024, la supervisión de Findeter en su momento realizó visita presencial en la cual se evidenció lo manifestado por el contratista y que cuenta con la aprobación de interventoría sobre la imposibilidad que se generó y que hoy crean la necesidad de suspender los contratos derivados con el fin de poder dar el tiempo necesario al clima y de esta forma lograr el ingreso a las sedes y continuar la ejecución para realizar la entrega funcional

CONTRATO No. PAF-MENAM-O-053-2023:

- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENAM-O-053-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5. POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO

CONTRATO No. PAF-MENAM-I-056-2023:

- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENAM-I-056-2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 5” POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar- Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN	VALOR CI OBRA	VALOR CII OBRA	VALOR SEDE C I + CII OBRA	VALOR CI INTER	VALOR CII INTER	VALOR SEDE C I + CII	% PROG. COM I	% EJEC. COM I	% PROG. COM II	% EJEC. COM II	ATRASO (-) / AVANCE (+) COMP II	% PROG. GEN	% EJEC. GEN	ATRASO (-) / AVANCE (+) COM I + II	FECHA DE ENTREGA
I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Principal	$ 38.293.100,07	$ 498.417.023,00	$ 536.710.123,07	$ 8.170.540,00	$ 35.098.840,48	$ 43.269.380,48	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Chinela	$ 5.281.806,91	$ 280.001.244,26	$ 285.283.051,17	$ 8.170.540,00	$ 14.458.558,15	$ 22.629.098,15	100%	100%	97,14%	80,00%	-17,14%	97,20%	80,37%	-16,83%	18/10/2024
I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Guaimaral	$ 7.922.710,36	$ 155.169.361,00	$ 163.092.071,36	$ 8.170.540,00	$ 10.927.124,07	$ 19.097.664,07	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
I. E. Cristian Moreno Pallares - Sede Los Serenos	$ 5.281.806,91	$ 105.661.912,00	$ 110.943.718,91	$ 8.170.540,00	$ 7.440.778,35	$ 15.611.318,35	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
Centro Educativo El Pueblito - Sede Puerto La Estancia	$ 8.262.969,18	$ 73.156.095,00	$ 81.419.064,18	$ 8.170.540,00	$ 5.151.698,26	$ 13.322.238,26	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
Centro Educativo El Pueblito - Sede Torrecilla	$ 7.922.710,36	$ 89.032.758,00	$ 96.955.468,36	$ 8.170.540,00	$ 6.269.742,86	$ 14.440.282,86	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
Centro Educativo El Pueblito - Sede Tronconal	$ 8.465.300,54	$ 131.023.432,00	$ 139.488.732,54	$ 8.170.540,00	$ 9.226.752,55	$ 17.397.292,55	100%	100%	96,18%	78,00%	-18,18%	96,42%	79,34%	-17,08%	18/10/2024
I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Primaria	$ 30.789.979,75	$ 416.439.292,00	$ 447.229.271,75	$ 8.170.540,00	$ 29.325.917,07	$ 37.496.457,07	100%	100%	100,00%	88,00%	-12,00%	100,00%	88,83%	-11,17%	5/10/2024
I. E. Santa Cruz del Balsamo - Sede Jardín Infantil	$ 10.263.326,58	$ 136.243.633,00	$ 146.506.959,58	$ 8.170.540,00	$ 9.594.362,39	$ 17.764.902,39	100%	100%	92,66%	45,00%	-47,66%	93,17%	48,85%	-44,32%	10/10/2024
I. E. Tec. Agro. y Acuícola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede Principal	$ 29.730.455,64	$ 610.089.488,00	$ 639.819.943,64	$ 8.170.540,00	$ 42.962.885,76	$ 51.133.425,76	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	5/10/2024
I. E. Tec. Agro. y Acuícola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede El Cerrito	$ 18.826.583,00	$ 329.954.670,00	$ 348.781.253,00	$ 8.170.540,00	$ 23.235.615,55	$ 31.406.155,55	100%	100%	100,00%	98,00%	-2,00%	100,00%	98,11%	-1,89%	12/10/2024
I. E. Tec. Agro. y Acuícola Luis Guillermo Vides Escobar - Sede La Atascosa	$ 23.150.352,91	$ 504.844.588,00	$ 527.994.940,91	$ 8.170.540,00	$ 8.781.819,81	$ 16.952.359,81	100%	100%	100,00%	99,00%	-1,00%	100,00%	99,04%	-0,96%	5/10/2024
I. E. Tec. Pesquera Leónidas Ortiz Alvear de Chimi - Sede Plan Bonito	$ 14.809.717,04	$ 265.021.268,00	$ 279.830.985,04	$ 8.170.540,00	$ 6.053.156,26	$ 14.223.696,26	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
I. E. Departamental Rural Silvia Cotes De Biswell - Sede La Islita	$ 15.520.854,07	$ 85.957.145,00	$ 101.477.999,07	$ 8.170.540,00	$ 35.551.473,66	$ 43.722.013,66	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
I. E. Departamental Oscar Pisciotti Numa - Sede Inmaculada Concepción	$ 12.217.692,97	$ 124.705.216,00	$ 136.922.908,97	$ 8.170.540,00	$ 18.662.964,51	$ 26.833.504,51	100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Entregada
I. E. Departamental Antonio Nariño - Sede José Vanegas Ortiz	$ 34.667.685,71	$ 803.894.423,00	$ 838.562.108,71	$ 8.170.540,00	$ 56.610.751,27	$ 64.781.291,27	100%	100%	100,00%	99,00%	-1,00%	100,00%	99,04%	-0,96%	5/10/2024

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL - ANTES









CE EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL- DURANTE







Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM PRIMARIA - ANTES









IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE ERM PRIMARIA- DURANTE







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL - ANTES






IE SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL- DURANTE





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE PRINCIPAL- DURANTE







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE ATASCOZA- DURANTE







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS - ANTES









IE DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS - DURANTE









Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena – Bolívar - Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS - ANTES









IE LUIS GUILLERMO VIDES SEDE CERRITOS- DURANTE







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

7
Proyectos

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $2.496.849.571,44 I: $200.301.842,00	15-nov-23	30-dic-23	30-nov-23	29-abr-2024	**Programado**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	100,00%	**Ejecutado**	100%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	100,00%	**En proceso de cierre contractual y liquidación.**		

ALCANCE DEFINIDO

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	BATERÍAS SANITARIAS	ID MEN
Cesar	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	1	1	1 - Mejorada	79
	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	1	0	N.A.	45
	El Paso	IE OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	N.A.	3	N.A.	75
			SEDE LA ESPERANZA	N.A.	8	1 - Mejorada	74
			SEDE SAN ANGEL	N.A.	1	1 - Nueva	77
	Valledupar	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	N.A.	11	N.A.	4
		IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	N.A.	23	N.A.	48

Avance General:

- Entregas realizadas entre el 15/04/2024 – 17/05/2024

PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

Contrato de obra:

- Radicación mediante INC 2024-001373 el 05/08/2024 y asignado el profesional liquidador.
- El 27/08/2024 se reciben observaciones del acta de liquidación
- El 12/09/2024 se recibe aprobación de las pólizas contra AERS
- El 16/09/2024 se devuelve el acta de liquidación con ajustes solicitados
- El 08/10/2024 el grupo de liquidaciones informa que se encuentran en revisión jurídica
- El 16/10/2024 se presentaron observaciones por parte del área jurídica y se dio respuesta el 17/10/2024; adicionalmente, el 18/10/2024 se realizó mesa de trabajo aclarando una observación respecto a la retegarantía, quedando la versión del acta ajustada para envío a la fiduciaria.

Se han realizado reiteraciones con el fin de proceder con el acta a revisión de negocios fiduciarios.

Contrato de interventoría:

- Radicación mediante INC 2024-001503 el 28/08/2024 y asignado el profesional liquidador.
- Del 16/09/2024 al 08/10/2024 se ha solicitado información del estado de esta acta.
- El 08/10/2024 informan que se encuentran en espera de envío del acta de liquidación del contrato de obra a la fiduciaria

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

13
Proyectos

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.158.777.879 I: $295.239.000	31/05/2024	15/07/2024	15/07/2024	30/10/2024	Progr	86,30%	-20,97%
AVANCE POR COMPONENTE	Programado	100,00%	Programado	89,63%	Ejecut	65,34%	
	Ejecutado	100,00%	Ejecutado	65,89%			

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARAT SANIT
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	KASICHE	1	0	2
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN KASPOLIMANA	1	1	2
Guajira	Maicao	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA	2	0	6
Guajira	Manaure	I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA	ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	1	0	2
Guajira	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA CAMPANA	0	9	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	WAYUUMAANA	0	2	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 2	LA ESTRELLA	1	0	0
Guajira	Maicao	I.E. INDÍGENA No. 6	YAMAIN PRINCIPAL	1	0	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	COOPERATIVO	0	7	0
Guajira	Riohacha	I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN	JOSÉ ANTONIO GALÁN	0	0	6
Guajira	Riohacha	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	APUNIMAANA1	0	8	0
Guajira	Riohacha)	I. ETNOEDUCATIVA No. 7	WAKUAPAMANA	0	9	6
TOTALES				8	36	24

Avance General: En la semana del 14 al 20 de oct de 2024.
Avance general Componente I: 100%
Avance general por Sede Componente II: - 23,74%

ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 60,54%
ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 49.82%
ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 70.97%
ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 37.43%
ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 55.12%
ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%
ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%
ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 71.79%
ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 71.45%
ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%
ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 72.22%
ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%
ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 65,03%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)








I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)





REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)





REGISTRO FOTOGRAFICO

AFECTACIONES A LOS AVANCES DE OBRA POR LA FUERTES LLUVIAS CONSTANTES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS SEDES














REGISTRO FOTOGRAFICO

AFECTACIONES A LOS AVANCES DE OBRA POR LA FUERTES LLUVIAS CONSTANTES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS SEDES










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

9
Proyectos

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$6.161.470.280 **I:** $441.204.280	08/11/2023	23/12/2023	24/12/2023	08/07/2024	**Progr**	100%	0,00%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	100,00%	**Ejecut**	100%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	100,00%			

DPTO	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIO
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja	T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	2	22	0
Bolívar	María la Baja	Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja	Buenos Aires	0	6	6
Bolívar	María la Baja	Técnica Agroindustrial de Flamenco	Níspero	0	8	8
Córdoba	Ayapel	San Jerónimo	Esc Nva Parcelas Londres	1	0	1
Córdoba	Montelíbano	El Palmar	El Palmar Sed Ppal	2	5	8
Córdoba	Planeta Rica	Loma Azul	Los Cerros	1	7	0
Córdoba	Puerto Libertador	Pica Pica Viejo	Esc Nva La Solita	1	0	1
Córdoba	Cotorra	Los Aguacates	Centro Educativo Los Aguacates	0	2	0
Córdoba	Tuchín	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	Técnica Álvaro Ulcue Chocue	0	22	0

Avance General: Fueron recibidas las nueve sedes alcance del contrato, actualmente el proyecto está en cierre documental para posteriormente iniciar el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

Avance general por Sede Componente 2:

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Entrega técnica el 14 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: Entrega técnica el 28 de junio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** Entrega técnica el 30 de julio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: Entrega técnica el 21 de agosto 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.810.476.306,00 I: $313.800.000	23-Ago-24	08-oct-24	09-oct-24	08-dic-24	**Programado**	10,48%	-6,60%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	5,00%	**Ejecutado**	3,88%	
	Ejecutado	67,33%	**Ejecutado**	0%	**Terminado plazo del componente I – Próximo a inicio obras**		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS	ID MEN
Santander	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	4	9	Si aplica	7
	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	NA	1	Si aplica	17
	Barrancabermeja	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada			141
Bolívar	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	NA	2	Si aplica	20
	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	1	1	Si aplica	123
			I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	NA	12	5	124
Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada			33
		COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada			136
Arauca	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA	LA PAVA	NA	2	1	56
	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	NA	7	3	138
Tolima	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	1	1	2	67
			EL BRASIL	1	1	2	100
Meta	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	5	2	8	96
Cundinamarca	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	1	1	2	104
Norte de Santander	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	NA	1	Si aplica	132

Avance General: Se encuentran en terminación de actividades del componente I, ajuste y definición del presupuesto de acuerdo con las observaciones de la interventoría, en programación de socializaciones y próximos a iniciar obras de algunas sedes educativas.

- Se contempla solicitar inicio de proceso de apremio por los atrasos presentados.
- Se aprobó el de retiro de las 3 sedes educativas mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

Avance por sede Componente I:

ID No. 56: Se realizó socialización de inicio de obras y se encuentran en coordinación para iniciar obras en la semana del 28/10 al 01/11.

ID No. 132 y 138: Se encuentran en programación de socialización y coordinación para inicio de obras.

ID No. 7: En ajustes de presupuestos de acuerdo con las observaciones de la interventoría y pendiente por programar presentación de las dos (2) alternativas de aulas prefabricadas que ha realizado el contratista.

ID No. 17: Sede con alcances definidos, en ajuste de presupuestos de acuerdo con las observaciones recibidas por la interventoría y coordinación de socialización.

ID No. 20: Sede con alcances definidos, en ajuste mínimos de presupuestos de acuerdo con las observaciones recibidas por la interventoría.

ID No. 123: Sede con alcances definidos, en ajuste de presupuestos de acuerdo con las observaciones recibidas por la interventoría y pendiente por programar presentación de las dos (2) alternativas de aulas prefabricadas que ha realizado el contratista.

ID No. 124: Sede con alcances definidos, en ajuste de presupuestos de acuerdo con las observaciones recibidas por la interventoría

ID No. 104: En ajuste de presupuestos de acuerdo con las observaciones recibidas por la interventoría y pendiente por programar presentación de las dos (2) alternativas de aulas prefabricadas que ha realizado el contratista.

ID No. 67 y 100: Sedes con actividades definidas y en ajuste de presupuesto y programación.

ID No. 96: Sede con alcances definidos, en ejecución de presupuestos y pendiente por programar presentación de las dos (2) alternativas de aulas prefabricadas que ha realizado el contratista.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 56 - CENTRO EDUCATIVO LA PAVA
Arauca, Saravena





MEJORAMIENTO DE BATERÍA SANITARIA
- Cambio de cubierta y estructura existente,
- Cambio de red sanitaria de descarga
- Cambio de red hidráulica existente por rupturas, instalación de tubería nueva y tanque de almacenamiento.
- Cambio de aparatos sanitarios (no funcionales y rotos).
- Cambio de red eléctrica (Cortocircuito y sin accesorios), por red eléctrica nueva y funcional.
- Cambio de puertas (Presentan patologías de oxidación), por puestas nuevas que garanticen seguridad y privacidad.
- Retiro de pinturas y elementos que presenten patologías de grietas, fisuras y humedad.
- Cambio de enchapes (deterioro), a enchapes nuevos que garanticen hermeticidad y limpieza.

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE AULAS (3)
- Inspección y control de goteras de la cubierta y estructura existente
- Cambio de red eléctrica (Cortocircuito y sin accesorios), por red eléctrica nueva y funcional.
- Retiro de falso techo (Tipo cielo raso), instalación de cielo raso.
- Construcción de canal perimetral y bajantes de descarga para el control y manejo de aguas lluvias.

INTERVENCIONES ESTRUCTURALES
- Retiro y Raspado de pintura existente en muros, se remplaza con impermeabilizantes, estuco y pinturas tipo 1
- Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), se remplaza con resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso

ID No. 132 - Sede la Peña
Norte de Santander, La Playa





CANAL PERIMETRAL
Construcción de canal perimetral para el control de aguas de tipo escorrentía superficial, con área de descarga

BATERÍA SANITARIA (1)
- Cambio de cubierta y estructura existente
- Cambio de red sanitaria de descarga obstruida, por tubería nueva sanitaria.
- Cambio de red hidráulica existente por rupturas, instalación de tubería nueva y tanque de almacenamiento.
- Cambio de aparatos sanitarios (no funcionales y rotos), por aparatos sanitarios nuevos.
- Cambio de red eléctrica (Cortocircuito y sin accesorios), por red eléctrica nueva y funcional.
- Cambio de puertas (Presentan patologías de oxidación), por puestas nuevas que garanticen seguridad y privacidad.
- Retiro de pinturas y elementos que presenten patologías de grietas, fisuras y humedad.
- Instalación de revestimiento estructural de los elementos intervenidos, Impermeabilización y pintura.
- Cambio de enchapes (deterioro), a enchapes nuevos que garanticen hermeticidad y limpieza.

CAMBIO DE CUBIERTA AULA (1) Y OFICINA (1)
- Cambio de cubierta y estructura existente.
- Cambio de red eléctrica (Cortocircuito y sin accesorios), por red eléctrica nueva y funcional.
- Retiro de falso techo (Tipo cielo raso), instalación de cielo raso.
- Construcción de canal perimetral y bajantes de descarga para el control y manejo de aguas lluvias.

INTERVENCIONES ESTRUCTURALES
- Retiro y Raspado de pintura existente en muros, se remplaza con impermeabilizantes, estuco y pinturas tipo 1
- Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), se remplaza con resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 138 - CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE
Arauca, Arauca





BATERÍA SANITARIA (1)

- Cambio de cubierta y estructura existente (tejas en asbestos) a cubierta de tipo UPVC
- Cambio de red sanitaria de descarga obstruida, por tubería nueva sanitaria.
- Cambio de red hidráulica existente por rupturas, instalación de tubería nueva y tanque de almacenamiento.
- Cambio de aparatos sanitarios (no funcionales y rotos), por aparatos sanitarios nuevos.
- Cambio de red eléctrica (Cortocircuito y sin accesorios), por red eléctrica nueva y funcional.
- Cambio de puertas (Presentan patologías de oxidación), por puestas nuevas que garanticen seguridad y privacidad.
- Retiro de pinturas y elementos que presenten patologías de grietas, fisuras y humedad.
- Instalación de revestimiento estructural de los elementos intervenidos, Impermeabilización y pintura.
- Cambio de enchapes (deterioro), a enchapes nuevos que garanticen hermeticidad y limpieza.

CAMBIO DE CUBIERA AULAS (7) Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA


- Cambio de cubierta y estructura existente
- Inspección y control de goteras de la cubierta y estructura existente
- Cambio de red eléctrica (Cortocircuito y sin accesorios), por red eléctrica nueva y funcional.
- Retiro de falso techo (Tipo cielo raso), instalación de cielo raso.
- Construcción de canal perimetral y bajantes de descarga para el control y manejo de aguas lluvias.

INTERVENCIONES ESTRUCTURALES

- Retiro y Raspado de pintura existente en muros, se remplaza con impermeabilizantes, estuco y pinturas tipo 1
- Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), se remplaza con resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso

ID No. 7 - COLEGIO UNIVERSITARIO
Vélez, Santander



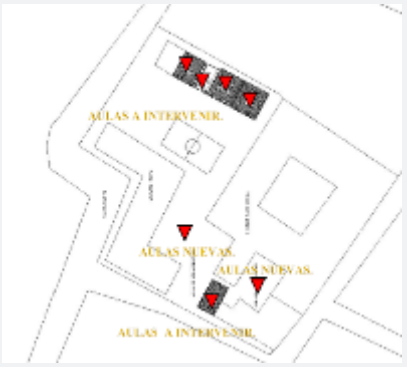

AREA A INTERVENIR	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD INTERVENIDA
Aula #1	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Plantilla Cambio de pisos Estuco Pintura Carpintería metálica Levante
Aula #2	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Cielo raso Plantilla Cambio de pisos Pañete Estuco Pintura Carpintería metálica Sistema eléctrico
Aula #3	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Estuco Pintura Carpintería metálica Sistema eléctrico Levante
Aula #4	Mejoramiento	Cielo raso Estuco Pintura Carpintería metálica
Aula #5	Mejoramiento	Cielo raso Estuco Pintura Carpintería metálica Sistema eléctrico
Aula #6	Mejoramiento	Plantilla Cambio de pisos Pañete Estuco Pintura
Aula #7	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Estuco Pintura
Aula #8	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Cielo raso Cambio de pisos Pañete Estuco Pintura
Aula #9	Mejoramiento	Estuco Pintura Carpintería metálica
Aula nuevas (4)	Construcción aulas	Proceso constructivo para aulas móviles. Espacio previamente asignado.

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 17 - CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
Betulia, Santander



AREA A INTERVENIR	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD INTERVENIDA
Aula #1	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Estuco Pintura Sistema Eléctrico
Aula #2	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Estuco Pintura Sistema Eléctrico

ID No. 20 - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA
Morales, Bolivar





AREA A INTERVENIR	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD INTERVENIDA
Aula #1	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Cielo raso Plantilla Cambio de pisos Estuco Pintura Sistema eléctrico Levante Canaleta Bajante
Aula #2	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Cielo raso Plantilla Cambio de pisos Estuco Pintura Sistema eléctrico Levante Canaleta Bajante

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 123 - CAMPO PAYARES
Simití, Bolivar





AREA A INTERVENIR	TIPO DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD INTERVENIDA
Aula nueva #1	Aula nueva	Fase de análisis de terreno y planimetría. Fase de excavación. Fase estructural. Fase de armado y ensamble, de muros y cubierta. Fase de redes eléctricas. Fase de acabados. Andenes de circulación
Aula a mejorar (sala informática) #1	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Plantilla Cambio de pisos Pañete Estuco Pintura Sistema eléctrico
Sanitarios	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Cielo raso Cambio de pisos Estuco Pintura Puertas Sistema eléctrico Sanitario Lavamanos Orinal
Sanitarios anulados	Demolición	Demolición Anulación de puntos sanitarios e hidráulicos Disposición final de escombros

ID No. 124 - I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
Simití, Bolivar





Aula #12	Mejoramiento	Cambio de cubierta Cambio estructura para cubierta Cielo raso Plantilla Cambio de pisos Resanes Estuco Pintura Sistema eléctrico
Aparatos sanitarios nuevos	Construcción nuevos aparatos sanitarios móviles	Proceso constructivo aparatos sanitarios móviles, según normativa.

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 104 - ESCUELA RURAL EL DESCANSO
Cundinamarca, Anolaima





- Construcción de aula móvil
- Cambio de cubierta salón existente de 42 M2
- Reposición de baños (12 M2) y (2) sanitarios

ID No. 67 - LA HUMAREDA
Tolima, Santa Isabel





- **57 m²** (aula + área para el docente)
- **5 m²** (unidades sanitarias)
- **75 m²** (circulación y zona recreativa)
- **17 m²** (cocina)
- **9 m²** (dormitorio del docente)

Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

ID No. 100 - EL BRASIL
Tolima, Santa Isabel





- **57 m²** (aula + área para el docente)
- **5 m²** (unidades sanitarias)
- **75 m²** (circulación y zona recreativa)
- **17 m²** (cocina)
- **9 m²** (dormitorio del docente)

ID No. 96 - ESCUELA SIETE DE AGOSTO
Meta, Villavicencio





- 5 Aulas nuevas
- Cerramiento
- Obras hidráulicas para manejo de aguas lluvias


Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

15
Proyectos

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 6.753.158.527,2 Inversión - MEN

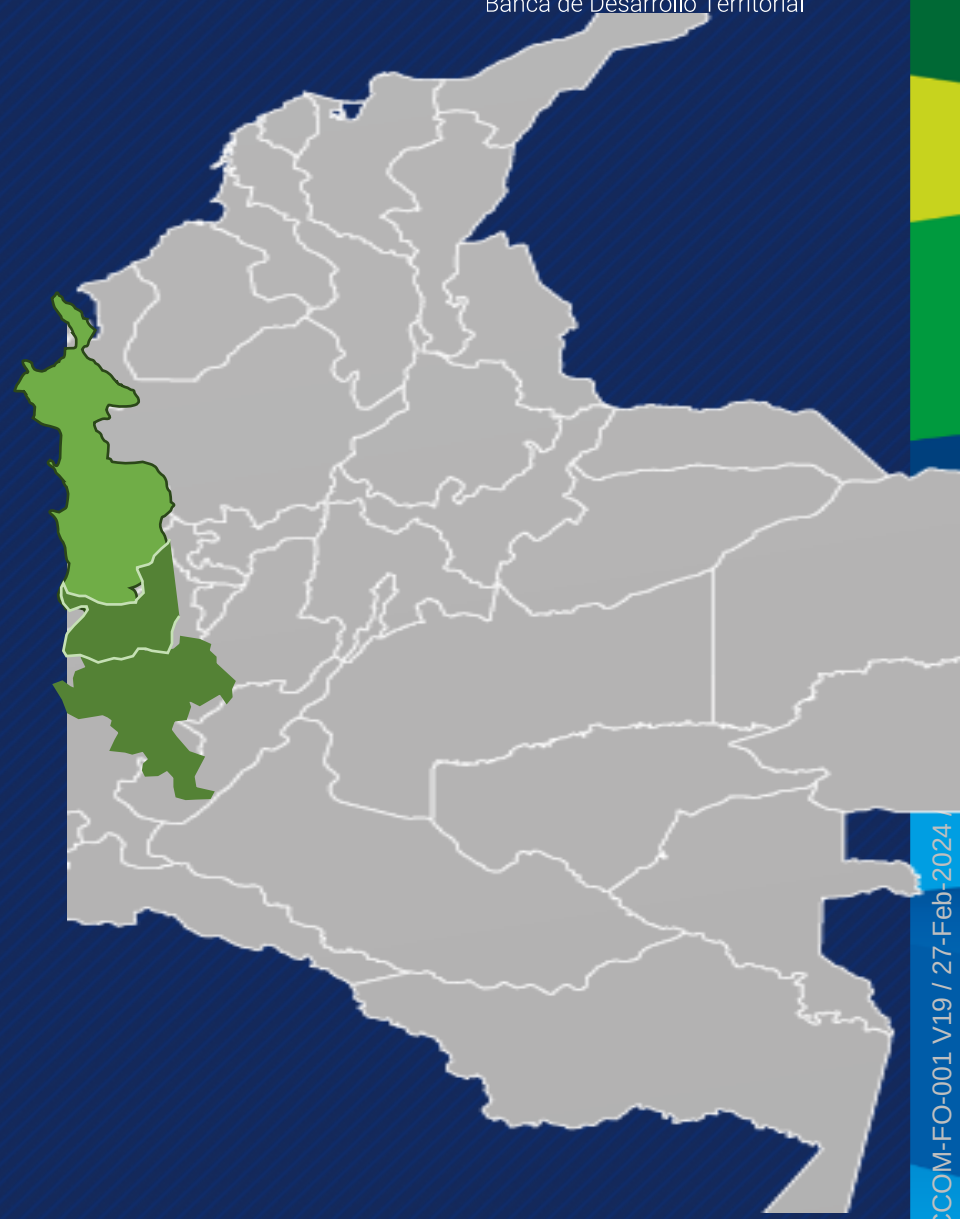

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

SEDES INTERVENIDAS:

				ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	IE	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJ	BSANITARIAS	FECHA DE ENTREGA
CAUCA	SUAREZ	ID188. IE TECNICA AGRICOLA	SEDE PRINCIPAL		9	24 MEJORAM	3/9/2024
CAUCA	SUAREZ	ID189. IE TECNICA AGRICOLA	MARIA INMACULADA	6	7	9 NUEVAS 7 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	SUAREZ	ID190. IE TECNICA AGRICOLA	FRANCISCO PAULA SANTANDER		13	10 MEJORAM	3/11/2024
CAUCA	TORIBIO	ID12. IE LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA		9		3/9/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ID16. IE DOMINGUILLO	SEDE PRINCIPAL	8		8 NUEVAS	3/11/2024
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	ID164. IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO		4	3 MEJORAM	30/7/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	1		2 NUEVAS	3/11/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR		1	2 MEJORAM	3/9/2024
CHOCO	BAHIA SOLANO	ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS		7	4 MEJORAM	3/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE PRINCIPAL		9	14 MEJORAM	30/9/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA HONDA		1	2 MEJORAM	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE LA PLANTA	1	2	2	3/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	1		2 MEJORAM	30/10/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JHN F KENNEDY		11	14 MEJORAM	30/8/2024
V DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO		5	10 MEJORAM	30/9/2024

Estado	Proyectos
Entregados	5
Terminados	5
Ejecución	4
Sin iniciar	1

PORCENTAJES DE AVANCE:

92,32%
Porcentaje Programado

61,72%
Porcentaje de avance

30,60%
Porcentaje de atraso

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con corte al 27 de octubre de 2024, porcentaje programado % vs ejecutado %, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

1. IE. TECNICA AGRARIA DE SUAREZ SEDE PRINCIPAL: Las actividades ejecutadas son; instalación de teja upvc 2,5mm en cinco bloques, mantenimiento de paredes, resanes, y pintura en paredes internas Y fachadas del bloque N°4 y biblioteca escolar del bloque N°3, instalación de canales en 4 bloques, instalación de redes eléctricas, en 5 bloques, e instalación de teja en 5 bloques. Se encuentra pendiente la instalación de bajantes y corrección de canales y el cambio de lámparas en la sala de profesores.
2. IE. TECNICA AGRARIA DE SUAREZ SEDE MARIA INMCULADA: Las actividades ejecutadas son: Mejoramiento de 7 aulas existentes, que incluye cambio de cubierta, raspado, pañete, estuco y pintura de paredes internas y fachada, instalación de redes eléctricas en aulas y pasillos, enchape de aulas y pasillos en tablón de gres, e instalación de carpintería metálica puertas y ventanas, cambio de cubierta por teja upvc 2,5mm para la batería de niñas, se realizó la demolición de la batería de niños y se inicia la fundición de cimientos para la nueva batería localizada en el mismo lugar. En aulas nuevas se realizó la demolición de la cimentación antigua, la fundición de zapatas aisladas, la fundición del muro de contención sobre zapata corrida, fundición de vigas de cimentación y placa de contrapiso. Esta pendiente culminar las obras de cimentación de aulas nuevas para continuar con el armado de pórticos en estructura metálica y levantamiento de muros, la continuación de obras hidrosanitarias para la batería nueva de niños y realizar el muro de refuerzo en el aula 3 del bloque N°2, así como la instalación de tubería y respectiva conexión para el manejo de aguas lluvias y aplicación de pintura en batería de niñas.
3. IE. TECNICA AGRARIA DE SUAREZ SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTADER: Desmonte de teja en bloque N°2 e instalación de teja termoacústica upvc 2,5mm en bloque N°2 y parcialmente en el bloque N°1
4. IE. LA PLAYA: Obras de mejoramiento terminadas y entregadas a satisfacción al rector y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de Julio, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 14 de agosto del 2024.
5. I.E DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO: Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 27 de mayo, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 28 de mayo del 2024, y suscripción.
6. I.E DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL: Obra nueva en ejecución, las actividades ejecutadas son: Localización y replanteo de los dos módulos sobre terreno natural y los dos módulos en palafitos y la batería sanitaria, fundición de zapatas aisladas, vigas y pedestales de los dos módulos, fundición de placa de contrapiso batería sanitaria y modulo 1 y 2 , obra de contención para el módulo 2 sobre terreno natural, instalación de placas macizas en concreto en aulas del módulo 1. Esta pendiente. Terminar instalación de envolvente de los módulos de la parte alta del terreno y las instalaciones hidrosanitarias para la batería sanitaria, instalación de estructura metálica y muros en placas de concreto.
7. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JHON F. KENNEDY las actividades ejecutadas son: mejoramiento de 15 aulas existentes, que incluye cambio de cubierta, raspado pintura, mantenimiento de estructura de cubierta, mantenimiento carpinteria metalica, enchape de pisos ent ablon de gres, mejoramiento de 11 baterias sanitarias, cambio de sanitarios lavamanos, mantenimiento de puertas, estuco y pintura, mejoramiento de sistema electrico en EMT en toda la institución, canales, bajantes, mesones en lavamanos, instalacion de orinales.
8. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JULIAN MENDOZA Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 30 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de septiembre del 2024, y suscripción.
9. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL las actividades ejecutadas son: mejoramiento de 11 aulas existentes, que incluye cambio de cubierta, raspado pintura, mantenimiento de estructura de cubierta, repello estuco y pintura en la mayor parte del sistema de vigas de porticos

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO

COMPONENTE 2: Con corte al 27 de octubre de 2024, porcentaje programado % vs ejecutado %, Frente a esta etapa se adelantan los siguientes trabajos de obra:

10. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 8 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 8 de agosto del 2024, y suscripción
11. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA las actividades ejecutadas son: mejoramiento de 3 aulas existentes, 1 bateria existente, 1 aula nueva y 1 bateria sanitaria nueva que incluye cambio de cubierta, raspado pintura, mantenimiento de estructura de cubierta, cambio de sanitarios lavamanos, estuco y pintura, mejoramiento de sistema electrico en EMT en toda la institución, canales, bajantes, mesones en lavamanos, instalacion de orinales, limpieza y descapote, excavaciónes, cimentación, fundición, estructura metalica de aula nueva y bateria, estructura de cubierta, instalaciones sanitarias de bateria nueva, sistema electrico nuevo.
12. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector a satisfacción y a secretaria de educación, las obras se terminaron el 29 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN el día 17 de septiembre del 2024, y suscripción.
13. IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) Esta sede aún no inicia su intervención. Actualmente se adelantan actividades de demolición por parte de la comunidad, el contratista ya tiene materiales y personal en la zona para iniciar actividades inicio que se proyecta para la semana del 28 al 31 de octubre.
14. IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector pendientes del recibo a satisfacción y suscripción de acta , las obras se terminaron el 29 de julio, se realiza instalación de la placa informativa del MEN
15. IE LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS Obras de mejoramientos terminadas y entregadas al rector pendientes del recibo a satisfacción y suscripción de acta , las obras se terminaron el 23 de agosto, se realiza instalación de la placa informativa del MEN

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Suárez
VALOR DE INVERSIÓN		$ 691.254.049
POBLACIÓN BENEFICIADA		755
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1527,62 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cinco bloques compuestos por 12 aulas mas aulas múltiples. Mantenimiento de paredes en bloque 4 y biblioteca. Instalación de redes eléctricas y mejoramiento de las mismas.
Baterías sanitarias	.	Mejoramiento de redes eléctricas
FECHA DE ENTREGA		31 de octubre de 2024

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE MARIA INMACULADA ID MEN. 189. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Suarez
VALOR DE INVERSIÓN		$ 1,751.056.805
POBLACIÓN BENEFICIADA		365
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mejoramiento de 7 aulas repartidas en dos bloques, instalación de teja upvc 2,5mm, mantenimiento de paredes general, instalación de enchape, mantenimiento y cambio de carpintería metálica puertas y ventanas, instalación de redes eléctricas aulas y pasillos.
Aulas nuevas	6	Construcción de 6 aulas en dos niveles, en estructura metálica y muros en mampostería, instalación de redes eléctricas.
Baterías sanitarias	1	Construcción de batería para niños conformada por 7 tazas sanitarias, un orinal, 2 lavamanos corridos y un lavamanos de pedestal. Incluye mejoramiento de batería de niñas, cambio de cubierta y mantenimiento de paredes, unidades sanitarias y grifería. Red sanitaria hasta la cámara de inspección.
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024



Antes







Después







Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190. MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Suárez
VALOR DE INVERSIÓN		$ 298.805.430
POBLACIÓN BENEFICIADA		356
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1077,08 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 5 bloques compuestos por 13 aulas.
Baterías sanitarias		Mejoramiento cambio de cubierta
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024

Ahora















CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Toribio
VALOR DE INVERSIÓN		$ 299.723-010
POBLACIÓN BENEFICIADA		369
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 908 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cuatro bloques compuestos por 8 aulas mas espacios comunes. Y construcción de red para evacuación de aguas lluvias conformada por 10 cajas de inspección y 89,07m de tubería Novafort 200mm
Baterías sanitarias	N.A.	N.A.
FECHA DE ENTREGA		14 de Agosto de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO. ID MEN:16. MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Santander de Quilichao
VALOR DE INVERSIÓN		$ 104.144.256
POBLACIÓN BENEFICIADA		26
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas		• Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 310,20 m2 de teja Upvc 2,5 mm en dos bloques compuestos por 3 aulas más un salón de sistemas. Mantenimiento de puertas y ventanas en ambos bloques
Baterías sanitarias	N.A.	Mejoramiento de 3 unidades sanitarias, cambio de tazas e instalación de piso cerámico.
FECHA DE ENTREGA		28 de mayo de 2024

Antes





Después






Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID MEN. 16. MUNICIPIO DE SANTADER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO		Santander de Quilichao
VALOR DE INVERSIÓN		$ 1,061,543,992
POBLACIÓN BENEFICIADA		445
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	8	Construcción de 8 aulas de 52,3 m2 en sistema liviano (prefabricado), repartidas en 4 módulos, 2 de ellos construidos sobre terreno natural y otros 2 en sistema palafítico. Para un área útil de 418,4 m2 sin contar pasillos.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 4 tazas sanitarias con sus respectivos lavamanos para niñas y 2 tazas sanitarias, 2 orinales y 4 lavamanos para niños. Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024

Antes





Después






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY ID MEN 62. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 484.431.971
POBLACIÓN BENEFICIADA		239
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	15	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de estructura metálica para cubiertas e instalación de 970,60 m2 de teja Upvc 2,5 mm en cinco bloques compuestos por 15 aulas, Mantenimiento de puertas y ventanas en ambos bloques, cambio sistema eléctrico
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	11	Mejoramiento de 11 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		3 de Noviembre de 2024

Antes









Después











Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO ID MEN.129.MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 184.642.086
POBLACIÓN BENEFICIADA		181
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 484,71 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 3 bloques compuestos por 7 aulas, Mantenimiento de puertas en ambos bloques, cambio sistema eléctrico en 3 aulas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	9	Mejoramiento de 9 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes









Después








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL ID MEN.128. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 357.870.673
POBLACIÓN BENEFICIADA		360
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de 1130 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 3 bloques compuestos por 11 aulas, repello, estuco y pintura en estructura de vigas en concreto.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de noviembre de 2024

Antes













Después

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA ID MEN.130. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 55.994.009
POBLACIÓN BENEFICIADA		3
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	Mantenimiento estructura metálica para cubierta e instalación de cubierta 129,78 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 1 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	2	Mejoramiento de 2 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		08 de agosto de 2024

Antes







Después








CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA ID MEN.85. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 232.214.220
POBLACIÓN BENEFICIADA		8
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	3	Mantenimiento estructura metálica para cubierta, instalación de estructura de cubiertas e instalación de cubierta 163,81 m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 2 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico.
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aulas de 52,3 m2 en sistema liviano (prefabricado)
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos, construcción en sistema prefabricado, y mejoramiento de 2 baterías sanitarias, con sus respectivos cambios de tazas y lavamanos, estuco y pintura
FECHA DE ENTREGA		02 de noviembre de 2024

Antes



Después



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN ID MEN.158. MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO		Guadalajara de Buga
VALOR DE INVERSIÓN		$ 149.223.224
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	5	Mantenimiento estructura metálica para cubierta, instalación de estructura de cubierta e instalación de cubierta 179,12m2 de teja Upvc 2,5 mm en 1 bloque compuestos por 4 aula y una vivienda, Mantenimiento de puertas y ventanas, cambio sistema eléctrico, estuco pintura, andenes, enchape de pisos, instalación sanitaria, cambio de puertas.
Aulas nuevas	N.A	
Baterías sanitarias	5	Mejoramiento de 5 unidades sanitarias, cambio de tazas y lavamanos, estuco pintura y mantenimiento de puertas.
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes








Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA) ID MEN. 105. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$183.458.682
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	N.A	N.A
Aulas nuevas	1	Construcción de 1 aula de 87,55 m2 en sistema liviano (prefabricado),. Para un área útil de 74.71 m2.
Baterías sanitarias	1	Construcción de una batería sanitaria conformada por: 1 taza sanitaria con su respectivo lavamanos Construcción en sistema prefabricado.
FECHA DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024

Antes













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR ID MEN. 106. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$ 56.443.965
POBLACIÓN BENEFICIADA		12
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	1	• Mantenimiento estructura madera para cubierta, instalación de 136,21 m2 de teja Upvc 2,5 mm en aula y baños. Mantenimiento de paredes interiores y exteriores. Instalación de 2 aparatos sanitarios . Instalación de luminarias. Instalación de canales y bajantes
Aulas nuevas	N.A	N.A
Baterías sanitarias	N.A	Mejoramiento de 2 unidades sanitarias,
FECHA DE ENTREGA		Pendiente por definir

Antes





Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS ID MEN.107. MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

MUNICIPIO		Bahía Solano
VALOR DE INVERSIÓN		$ 224.979.427
POBLACIÓN BENEFICIADA		52
ALCANCE		
Mejoramiento Aulas	7	Mantenimiento estructura madera para cubierta y entrepiso, instalación de 63 m2 de teja Upvc 2,5 mm en circulación fachada principal. Mantenimiento de paredes interiores y exteriores.. Instalación de luminarias tomas e interruptores. Instalación de cielorraso falso., mantenimiento entrepiso en madera.
Aulas nuevas	N.A	N.A
Baterías sanitarias	1	Mantenimiento de una batería sanitaria conformada por: 4 tazas sanitarias con sus respectivos lavamanos 2 para niñas y 2 para niños. Enchape de pisos y paredes. Instalación de puertas
FECHA DE ENTREGA		Pendiente por definir

Antes









Después



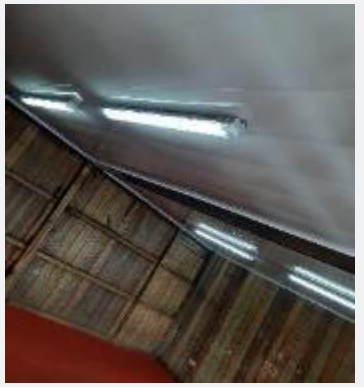


Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O: $4.728.021.810 **I:** $ 358.032.903	12/02/2024	27/03/2024	18/03/2024	27/11/2024	**Progr**	90,98%	0%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100%	**Programado**	90,43%	**Ejecut**	90,98%	
	Ejecutado	100%	**Ejecutado**	90,43%			

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	Aulas Nuevas	Aulas Mejoradas	BATERÍA SANITARIA
Bolívar	Centro Educativo el Tambo	La Fuente	1	0	1 M
El Tambo	I.E. Huisitó	Huisitó (sede principal)	6	0	6 N
La Vega	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay	1	0	1 N
Balboa	C.E. Buenos Aires	Capitanes	NA	2	0
	I.E. Olaya (antes C.E. Olaya)	Olaya (sede principal)	NA	13	6 M
Bolívar	Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen	Corral Viejo	1	0	2 M
		Nuestra Señora del Carmen (sede principal)	NA	13	8 M
	Institución Educativa el Carmen	El Carmen (sede principal)	NA	2	1 M
	Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios	Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios	NA	10	8 M
La Vega	Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita	Institución Educativa Santa Rita (sede principal)	NA	6	0
Popayán	I.E. Comuneros	sede principal	NA	6	0
Rosas	Institución Educativa Santa Teresita	Santa Teresita (sede principal)	NA	17	8 M
	Institución Educativa Madre Caridad Brader	Madre Caridad Brader (sede principal)	1	0	0
	Centro Educativo Guillermo León Valencia	La Despensa	NA	3	2 M
		El Altillo	NA	1	2 M
	Institución Educativa Alfonso Córdoba	Las Yerbas	NA	2	2 M
		El Retiro	NA	1	1 M
		Bellavista	NA	1	0

COMPONENTE 1

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

COMPONENTE 2

Estado	Proyectos
Entregados	11
Terminados	6
Ejecución	1
Sin iniciar	0

- 11 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y entregados a Directivos de cada sede.
- 6 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y en gestión de entrega a Directivos de cada sede.
- 1 proyecto, correspondiente a la intervención de la sede Huisitó del Tambo, se encuentra en ejecución.

El 23 de octubre de 2024 se aprobó e instruyó en comité fiduciario la prórroga por el término de 1 mes a los contratos de obra e interventoría, con el fin de dar correcta terminación a la intervención del proyecto en la sede Huisitó del Tambo. La nueva fecha de terminación del contrato de obra es el 27 de noviembre de 2024.

Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO








I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega



C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO













C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial













I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista Rosas







I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas









I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO






I.E. Olaya – Sede principal
Balboa






I.E. Santa Teresita – Sede principal
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO







I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo
Bolívar




C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal
Rosas




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay
La Vega








I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

18
Proyectos

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

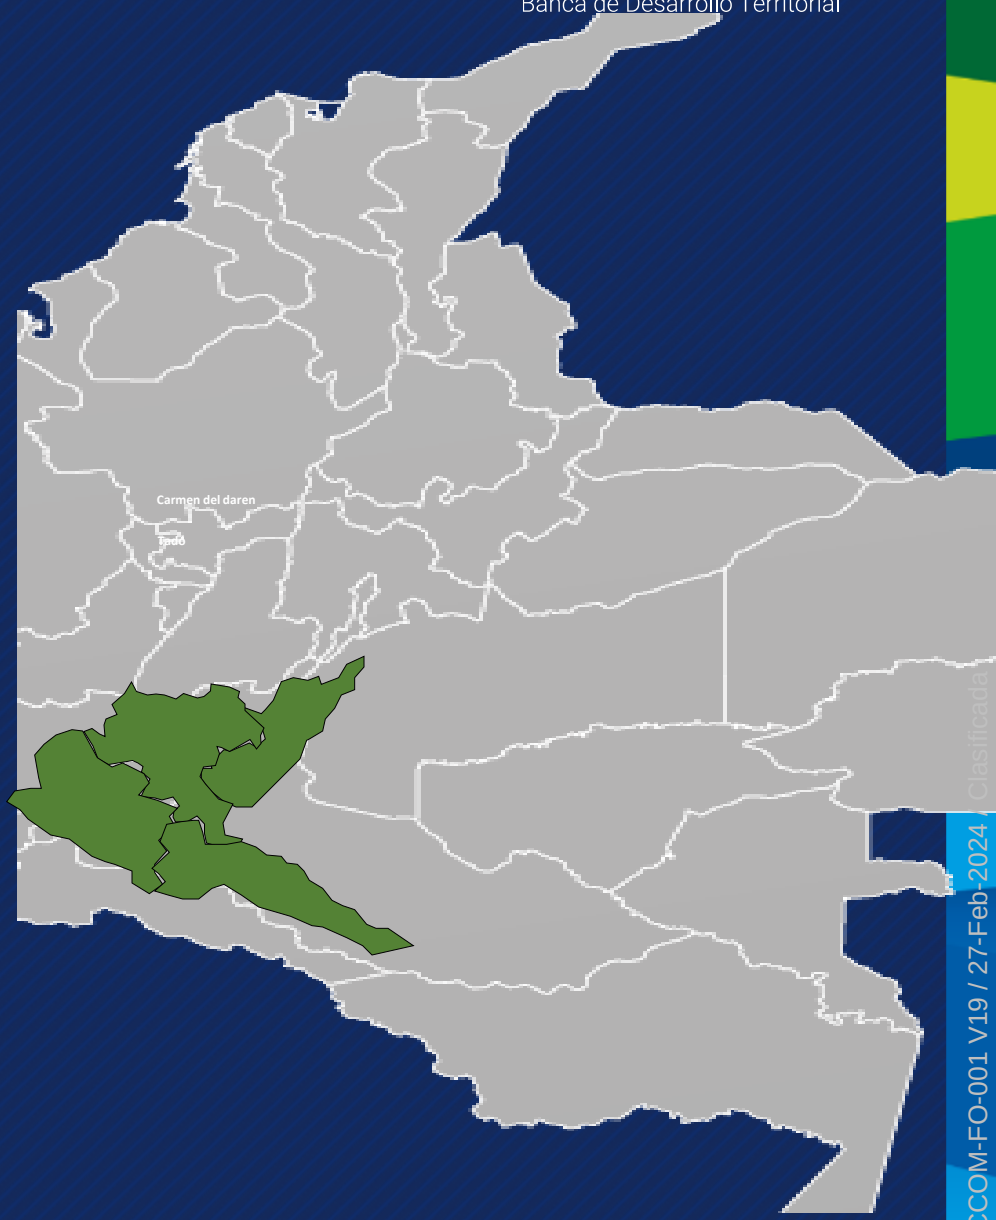

Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

VALOR EJECUCION	FECHA INICIO C1	FECHA FIN C1	FECHA INICIO C2	FECHA FIN C2	PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL		
O:$4.918.276.400 **I:** $418.988.095	20/02/2024	4/04/2024	05/04/2024	04/12/2024	**Programado**	76,18%	3,13%
AVANCE POR COMPONENTE	**Programado**	100,00%	**Programado**	74,70%	**Ejecutado**	79,31%	
	Ejecutado	100,00%	**Ejecutado**	78,02%	**% Financiero G12:** 78,36% **Obra:** 78,22% **Interventoría:** 80,06%		

DPTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORAD	APARATOS SANITARIOS
Cauca	Piamonte	ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Escuela Rural Mixta La Espanola	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco	Esc Rur Mix San Andresito	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID125. Inst Educ Agric Piamonte	PIAMONTE (Sede Principal)	0	28	1
Cauca	Piamonte	ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel	Esc Rur Mix Fray Ezequiel	0	1	1
Cauca	Piamonte	ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal	0	4	1
Huila	Acevedo	ID26. Institución Educativa Bateas	Bateas	0	5	5
Nariño	Pasto	ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe	I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal	0	5	0
Nariño	El Rosario	ID8. Centro Educativo La Claudia	Centro Educativo La Claudia	0	1	0
Nariño	Cumbal	ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi	Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi	5	0	7
Nariño	Barbacoas	ID87. Institución Educativa Teraimbe	Sede 9 Cumainde	0	1	2
Nariño	Barbacoas	ID110. Institución Educativa Teraimbe	Sede 2 Bombón	0	2	1
Nariño	Ipiales	ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos	Escuela Las Cruces	0	5	1
Nariño	Mallama (Piedrancha)	ID149. Centro Educativo Mallama	Centro Educativo De Mallama	0	1	1
Putumayo	Puerto Asís	ID41.I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID57. I. E. Rur Caucacia	Esc Rur Mix El Progreso	1	0	1
Putumayo	Pto Leguízamo	ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	0	1	1
Putumayo	Orito	ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara	ESC RUR MIX ALTO ORITO	1	0	1
Putumayo	Puerto Asís	ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal	SEDE PRINCIPAL	0	6	12

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

Estado	Proyectos
Entregados	12
Terminados	0
Ejecución	6
Sin iniciar	0

- **Sede ID125 Piamonte sede principal**, se empezaron actividades sobre el área de preescolar de acuerdo aceptación de ejecución del área de preescolar: mejoramiento de 2 aulas, 4 baterías sanitarias, circulaciones, cerramiento. Por parte de la Secretaria de Educación del Cauca de fecha 23/10/2024.

- **Sede ID36. Tallambi,** se realizó subsanación de desplome (falta de plomo) de aula 5, se armaron aula 1 y 2 estructura metálica, en aula 3 y 4 se funde palca, en baterías se realizó instalación de tubería, compactación y fundición de placa.

- **Sede ID41. Teteye**, se encuentra en ejecución de actividades instalación de bajantes, eléctricas, enchapes e instalación de aparatos sanitarios, pendiente el sistema fotovoltaico que se instalará la próxima semana con la empresa SYLVANIA.

- **Sede ID57. Progreso**, se encuentra en ejecución de estucos y pinturas, pendiente el sistema fotovoltaico que se instalará la próxima semana con la empresa SYLVANIA.

- **Sede ID127. Orito,** se encuentra terminación en instalación de estructura metálica de cubierta, demoras en el empalme por la forma de transporte en mula debía llegar desarmada para armarse en sitio, falta instalar cubierta, , pendiente el sistema fotovoltaico que se instalará la próxima semana con la empresa SYLVANIA.

- **Sede ID172. Sede Principal Puerto Asís**, se realizó cambio de estructura de cubierta e instalación de cubierta en internado aprovechando la semana de receso escolar, se continua con actividades de estructura de tanque y mejoramiento de baterías sanitarias.

Se realizará presentación de balanceo entre las ultimas sedes en ejecución, ante Comité Técnico y Fiduciario de esta semana.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Pasto - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 262.132.882
POBLACIÓN BENEFICIADA		986
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		15 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

MUNICIPIO		El Rosario - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 66.208.426
POBLACIÓN BENEFICIADA		8
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A.	
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		24 de junio de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Acevedo - Huila
VALOR DE INVERSIÓN		$ 278.705.701
POBLACIÓN BENEFICIADA		193
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. • Mejoramiento de restaurante escolar
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega

Antes







Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 82.111.341
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		5 de julio de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes





Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

MUNICIPIO		Puerto Leguizamo - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 117.694.769
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		1 de agosto de 2024

Antes





Después









Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 112.235.014
POBLACIÓN BENEFICIADA		173
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	5	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		22 de julio de 2024

Antes



Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

MUNICIPIO		Ipiales - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 57.066.573
POBLACIÓN BENEFICIADA		9
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		19 de junio de 2024

Antes



Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 214.447.888
POBLACIÓN BENEFICIADA		33
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	4	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		16 de agosto de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 97.200.260
POBLACIÓN BENEFICIADA		15
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

MUNICIPIO		Barbacoas - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 135.500.591
POBLACIÓN BENEFICIADA		39
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas	2	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica.
Baterías sanitarias nuevas	N.A.	
FECHA DE ENTREGA		17 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 193.112.465
POBLACIÓN BENEFICIADA		24
ALCANCE		
Mejoramientos Aula múltiple	1	• Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. • construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias
Aulas nuevas	N.A.	N.A.
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	• Ejecutada dentro del aula
FECHA DE ENTREGA		6 de septiembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Cumbal - Nariño
VALOR DE INVERSIÓN		$ 818.394.559
POBLACIÓN BENEFICIADA		171
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	5	
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	7	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 184.632.555
POBLACIÓN BENEFICIADA		5
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	1	Instalación eléctrica fotovoltaica
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 197.031.005
POBLACIÓN BENEFICIADA		6
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A.	
Aulas nuevas	1	Instalación eléctrica fotovoltaica
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Piamonte - Cauca
VALOR DE INVERSIÓN		$ 1.339.389.729
POBLACIÓN BENEFICIADA		850
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	28	Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. Circulación + cerramiento + cubierta de conexión de área de preescolar
Aulas nuevas	N.A	
Mejoramientos Baterías sanitarias + 1 ducha	3	Mejoramiento en preescolar
Baterías sanitarias nuevas	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Orito - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 206.821.177
POBLACIÓN BENEFICIADA		13
ALCANCE		
Mejoramientos Aula	N.A	
Aulas nuevas	1	Instalación eléctrica fotovoltaica
Mejoramientos Baterías sanitarias	N.A	
Baterías sanitarias nuevas	1	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO		Puerto Asís - Putumayo
VALOR DE INVERSIÓN		$ 224.052.916
POBLACIÓN BENEFICIADA		161
ALCANCE		
Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas)	6	
Aulas nuevas	N.A	
Mejoramientos Baterías sanitarias	12	• Se incluyo estructura de tanques para mejorar la columna de agua en zonas húmedas en internado por solicitud de comunidad.
Baterías sanitarias nuevas	N.A	
FECHA DE ENTREGA		3 de diciembre de 2024

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
