El futuro es de todos · Mininterior	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 906 de 2021, OCAMONTE - SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE SANTANDER."		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Vereda Buenavista, predio el naranjito, contiguo a la cabecera municipal en distancia de 2.5 km en dirección al municipio de Charalá, accesibilidad normal, vía con tramo de calzada en pavimento asfaltico y tramo de acceso al lote en placa huella, municipio de Ocamonte, Santander.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Ocamonte, Santander.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.250.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		El municipio de Ocamonte, aporta un lote de su propiedad
	APORTE MUNICIPIO ADICIONAL 1 (Obra)		$ 242.997.678
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$1.492.997.678
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/04/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	28/02/2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. EMANUEL ALFREDO MELGAREJO AGUDELO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. EMANUEL ALFREDO MELGAREJO AGUDELO	07/05/2021	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ALIRIO ENRIQUE SOTOMONTE MOTTA	07/05/2021	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	CDP 31421 (13-04-2021)		$ 550.000.000
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado de cupo vigencias futuras 2022: 2- 2021-009386		$ 700.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL / CDP- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	-	-	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	**No. 465-47-994000003625**	**04/06/2021**	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	**04/06/2021**		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA
			FECHA: DD/MM/AAAA

PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA FECHA: DD/MM/AAAA FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	-
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	$ 1.041.600.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 125.000.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 242.997.678

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: a. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. b. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto, en la cual el Municipio se compromete, con sustento en lo socializado, a entregar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseño y Ejecución de obra, así como el de interventoría.	0%	03/08/2021	$ 300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: a. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio interadministrativo. b. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.	0%	20/12/2021	$ 250.000.000
TERCER DESEMBOLSO	1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% de ejecución de la obra, la cual debe incluir:	90%		

	a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. b. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. c. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.			
CUARTO DESEMBOLSO	1. previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: a. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; b. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%		
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 550.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 83.333.000 Obra $ 0,00 Interventoria

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
No. 465-47-994000003625	Cumplimiento	$ 250.000.000	19-05-2021	28-08-2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción:***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 083 de 2021 (22 de septiembre 2021) **COMPONENTE 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 83.333.000 **COMPONENTE 2 –CONSTRUCCIÓN:** $ 1.041.600.000	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE-DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		$ 1.124.933.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE OCAMONTE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	15 de octubre de 2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	14 de marzo de 2022		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.124.933.000**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.	33-44-101217865
FECHA DE LA PÓLIZA	28-09-2021

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Construcción:***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato:093 de 2021 13 de Octubre de 2021	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO PUBLICO DENOMINADO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE-DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ACATANDO LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 906 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE OCAMONTE(SANTANDER)*		$ 125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	*CONSORCIO SACUDETE OCAMONTE .*		
Fecha de Acta de inicio del contrato	15 de octubre de 2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	14 de marzo de 2022		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
PÓLIZA No.	96-44-101165902		
FECHA DE LA PÓLIZA	15-10-2021		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 13 de enero de 2022	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A ENERO 31 DE 2022	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**5.12%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.18%**

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

EMANUEL ALFREDO MELGRAJE AGUDELO
Supervisor Convenio No. 906 de 2021
Municipio de Ocamonte

ALIRIO ENRIQUE SOTOMONTE MOTTA
Apoyo a la Supervisión-Convenio No. 906 de 2021
Municipio de Ocamonte

DAVIVIENDA

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos


CUENTA DE AHORROS
0488 0003 9280

INFORME DEL MES: ENERO /2022

Apreciado Cliente
MUNICIPIO DE OCAMONTE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE
mariferci1712@hotmail.com

Saldo Anterior	$479,297,454.72
Más Créditos	$40,020.50
Menos Débitos	$12,500,290.00
Nuevo Saldo	$466,837,185.22
Saldo Promedio	$470,829,516.33

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 01	$ 12,500,290.00-	1991	Descuento por Pago a Proveedores 8902051245 PAGO DE PROVEEDORES 202201	PORTAL EMPRESARIAL
31 01	$ 40,020.50+	0000	Rendimientos Financieros.	0000

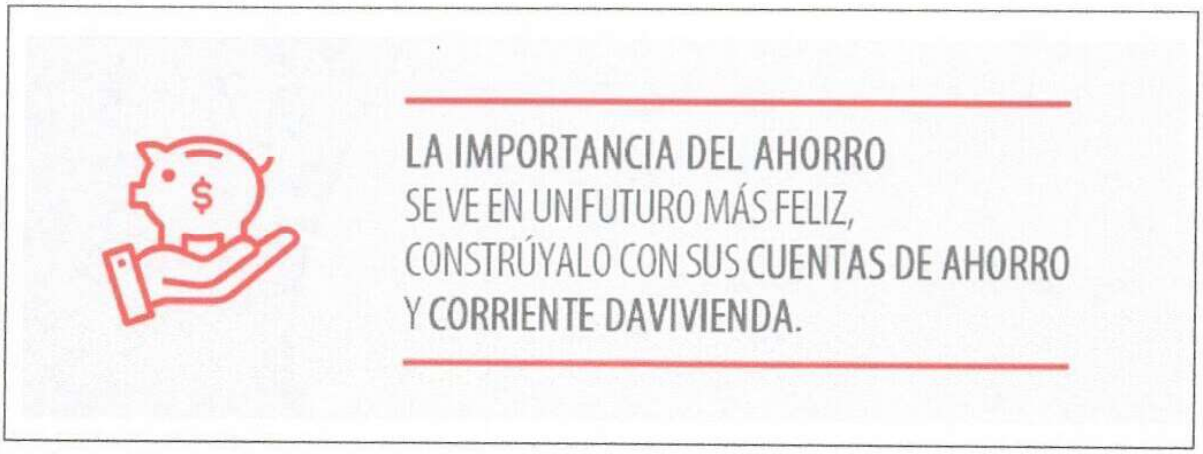

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 601-6092013 Fax: 601-4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com
