1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	12,4%	Se realiza el desmonte de la cubierta existente del comedor.	Se evidencia un avance significativo ya que este frente da inicio a sus actividades.
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	2,8%	0,0%		
CUBIERTAS	0,0%	0,0%		
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	2,8%	12,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	2,3%	2,7%
Durante el periodo	12,4%	2,8%	9,5%
Acumulado Actual	17,4%	5,1%	12,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,8%	5,1%
Valor de la Obra Programada	$ 4.016.240,75	$ 7.355.826,29

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	12,4%	17,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 17.679.431,12	$ 24.837.095,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

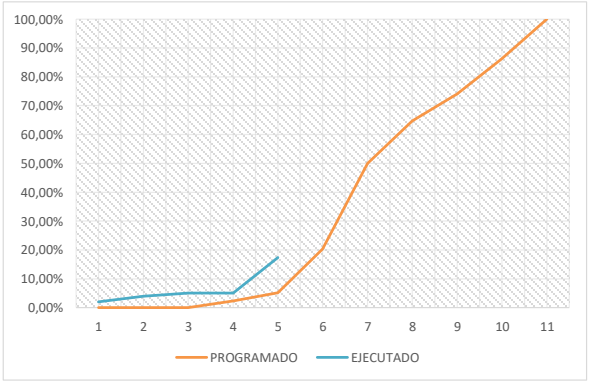

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza una observación respecto la cubierta instalada ya que esta no corresponde a la contratada, el contratista realizara el suministro de la teja correspondiente para su instalación.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Para este frente de obra el contratista realiza la instalación de una teja que no corresponde a la contratada, se le solicita al contratista de obra realizar el retiro de la cubierta que no corresponde y la cual no es tenida en cuenta para el calculo del porcentaje ejecutado de la semana 5 para este frente.

Se realizara el cambio de la cubierta según indicaciones de la interventoría y supervisión.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Desmonte de ventana existente.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Cambio de cubierta en el sector del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
ALMACENISTA	0,00%	0,00%		
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	2,33%	3,65%	Se realiza el retiro de salidas de iluminarias y tomacorrientes, que se encuentran en las materas a demoler.	Se realiza la solicitud en campo respecto a necesidad de ingresar mayor numero de personal a obra y que pueda adelantar las actividades de demolición de las materas existentes .
TECNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0,00%	0,00%		
MAESTRO	0,00%	0,00%		
OFICIAL	0,00%	0,00%		
AYUDANTE	0,00%	0,00%		
RESIDENTE	0,00%	0,00%		
TOTAL	2,33%	3,65%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,9%	2,3%	6,5%
Durante el periodo	0,5%	3,1%	-2,6%
Acumulado Actual	9,4%	5,4%	3,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,1%	5,4%
Valor de la Obra Programada	$ 3.713.738,97	$ 6.513.187,52

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,50%	9,35%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 600.000,00	$ 11.221.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

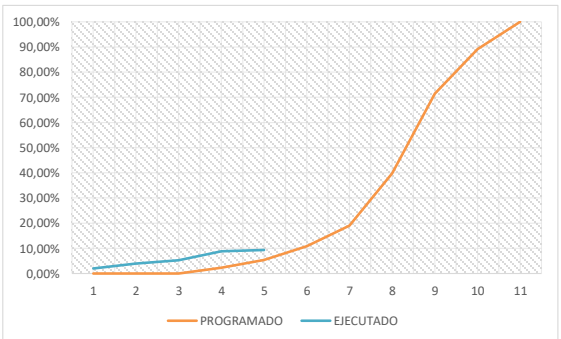

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza solamente la demolición de los muros de las materas existentes y el retiro de manto asfaltico de dos de estas materas.
Retiro de material de demolición en terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza seguimiento y control del estado actual de este frente de obra, se le solicita al contratista de obra el ingreso de mayor numero de personal ya que a la fecha solo se cuenta con dos trabajadores en este frente; se realiza reunión con el referente de Engativá el cual solicita modificaciones al presupuesto lo cual implico retrasos en la ejecución de este frente.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.




Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de materas existentes.

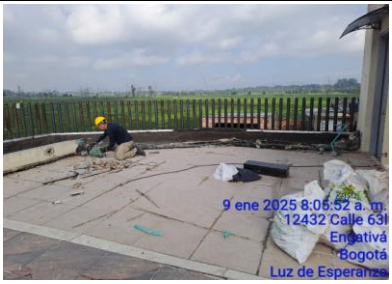

Fecha:10/01/25
Descripción: Enlonado de escombros, para su retiro.



Fecha:10/01/25
Descripción: Enlonado de escombros, para su retiro.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL SHUSH UREK			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	DIAGONAL 15D #98-40			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%		
CIMENTACION	0,0%	0,0%		
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%		
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%		
CUBIERTAS	6,4%	36,7%	Se realizo en su totalidad el mantenimiento de cubierta de los módulos a intervenir.	Se logro intervenir en su totalidad la intervención y mantenimiento de la cubierta.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%		
TOTAL	6,4%	36,7%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	0,0%	5,0%
Durante el periodo	36,7%	0,0%	36,7%
Acumulado Actual	41,7%	0,0%	41,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,4%	6,4%
Valor de la Obra Programada	389717236,91%	$ 3.897.172,37

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	36,7%	41,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 22.342.930,96	$ 25.385.793,92

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

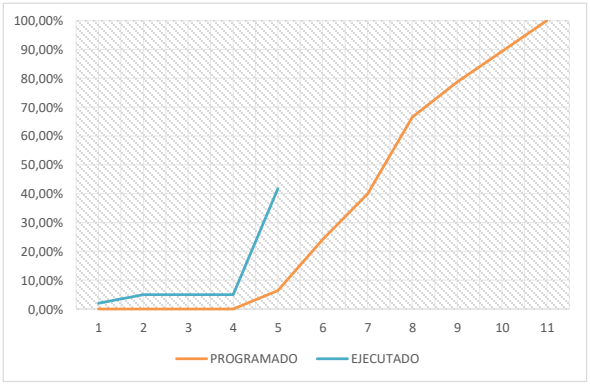

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR SST	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	0			VIERNES	S
AYUDANTE	1			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizo en su totalidad el mantenimiento de cubierta de los módulos a intervenir.
Se realiza el alistado de la superficie de los muros para realizar su posterior aplicación de pintura en esmalte a dos manos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio ejecutivo en este frente de obra y se logra realizarla intervención del mantenimiento de la cubierta de los módulos a intervenir.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.



Fecha:10/01/25
Descripción: Mantenimiento de cubierta



Fecha:10/01/25
Descripción: Reunión de seguimiento.



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.



Fecha:10/01/25
Descripción: Preparación de superficies para aplicación de pintura.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER FONTIBON			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CALLE 22F #106-26			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5,17%	10,08%	Se realiza el resane de la fisuras presentes el en comedor.	Se realiza el resane de la fisuras presentes el en comedor.
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACION DE LUMINARIAS	0,00%	42,90%	Se realiza la instalacion de luminarias del tercer y segundo piso, las cuales se encontraban en mal estado.	Se realiza la instalacion de luminarias del tercer y segundo piso, las cuales se encontraban en mal estado.
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	5,17%	52,98%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	15,1%	5,2%	9,9%
Durante el periodo	53,0%	10,8%	42,1%
Acumulado Actual	68,1%	16,0%	52,1%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,8%	16,0%
Valor de la Obra Programada	$ 2.372.855,04	$ 3.504.524,37

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

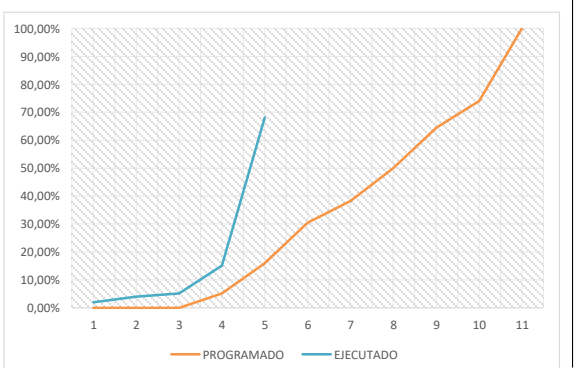

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	53,0%	68,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 11.590.400,49	$ 14.898.193,15

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza la instalacion de luminarias tipo tortuga del tercer piso (zona de las rampas de acceso); instalacion de paneles LED 120x30 e instalacion de iluminarias de energencia.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos del sector del comedor.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad; asi mismo se ha tenido un gran avance en la parte electrica teniendo ya instaladas mas del 50% de las luminarias.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Instalacion de reflectores.



Fecha:10/01/25
Descripción: Instalacion de luminarias de emergencia.



Fecha:10/01/25
Descripción: Resane y pintura del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Instalacion de luminarias de emergencia.



Fecha:10/01/25
Descripción: Resane y pintura del comedor.



Fecha:10/01/25
Descripción: Resane y pintura del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 100 #23-22						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	4,00%	13,04%	Se realiza el picado de la superficie de la cubierta en su totalidad.	Se realiza el enlonado del material de escombro para el retiro de material.
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,00%	20,50%	Se realiza la aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura epoxica en una altura de 1,50 m.	Se realiza la aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura epoxica en una altura de 1,50 m.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	8,0%	33,5%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	15,0%	8,0%	7,0%
Durante el periodo	33,5%	8,0%	25,5%
Acumulado Actual	48,5%	16,0%	32,5%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,0%	16,0%
Valor de la Obra Programada	$ 7.391.232,14	$ 14.782.464,27

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	33,5%	48,5%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 30.987.740,73	$ 44.846.300,99

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

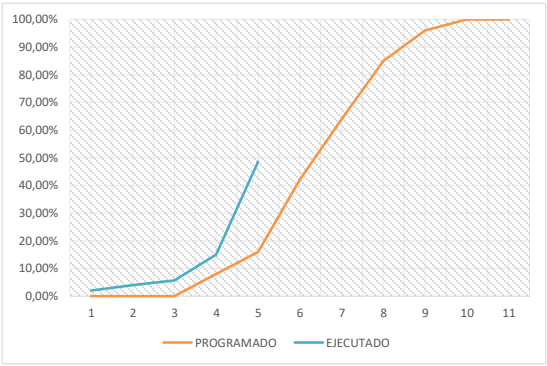

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	3			VIERNES	S
OFICIALES	2			SÁBADO	S
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el picado de la superficie de la cubierta en su totalidad.
Se realiza la aplicaciones pintura vinilo tipo 1, en el sector del comedor y deposito.
Se realiza la aplicación de pintura epoxica a una altura de 1,50 m.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de picado en la cubierta para la nivelación de con mortero impermeabilizado, de igual formas se realiza la aplicación de pintura en el sectordel comedor y depositor; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No. 06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN
CONTRATO OBRA No: 9176-2024	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No: 9355-2024	INTEVENTORÍA: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Aplicación de pintura en deposito.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demarcacion para aplicar pintura epoxica a 1,50.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolicion de mortero en zona de la cubierta.



Fecha:10/01/25
Descripción: Limpieza de elementos como guarda escobas.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolicion de mortero en zona de la cubierta.



Fecha:10/01/25
Descripción: Aplicación de pintura en elsector del comedor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	5	3. SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	8,20%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,00%	10,82%	Se realiza la instalación de luminarias de segundo piso, así como la instalación de luminarias de emergencia.	Se realiza la instalación de luminarias de segundo piso, así como la instalación de luminarias de emergencia.
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,64%	5,20%	Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector del comedor.	Se realizan actividades de resane de muros y techos en el sector del comedor.
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,00%	8,36%	Se realizan actividades de pintura de muros y techos en el sector del comedor.	Se realizan actividades de pintura de muros y techos en el sector del comedor.
EQUIPOS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	4,64%	32,58%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	6,8%	0,0%	6,8%
Durante el periodo	32,6%	4,6%	27,9%
Acumulado Actual	39,3%	4,6%	34,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,6%	4,6%
Valor de la Obra Programada	$ 5.819.598,25	$ 5.819.598,25

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	32,6%	39,3%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 40.907.741,96	$ 49.394.981,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

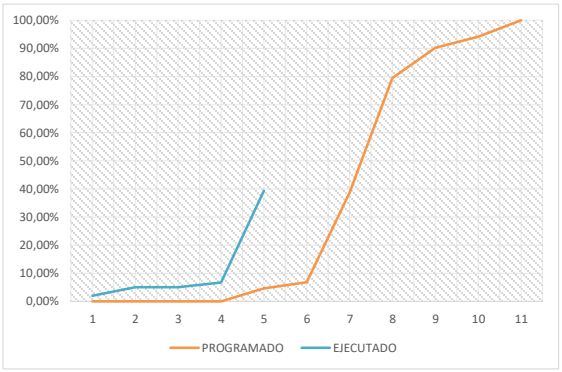

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
AYUDANTES	1			VIERNES	S
OFICIALES	1			SÁBADO	S
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de pintura de muros y techos en el sector del comedor.
En obra ya se encuentra el material necesario para realizar las actividades de obra
Se realiza la instalación de luminarias de segundo piso, así como la instalación de luminarias de emergencia.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes en el sector del comedor, de igual formas se a realizado la instalación de luminarias del segundo piso; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	No. INFORME	5	SEMANA No.	06/01/25 al 12/01/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:10/01/25
Descripción: Verificación de medidas en baños



Fecha:10/01/25
Descripción: Verificación de medidas en baños



Fecha:10/01/25
Descripción: Aplicación de primera mano de pintura epoxica en cocina



Fecha:10/01/25
Descripción: Verificación de luminarias segundo piso



Fecha:10/01/25
Descripción: Armado de mesones para lava colas.



Fecha:10/01/25
Descripción: Demolición de enchape.

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,00%	2,00%	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado	Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,00%	1,00%	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso	Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	2,08%	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores	Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,00%	5,08%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,1%	3,0%	2,1%
Acumulado Actual	10,8%	3,0%	7,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,0%	3,0%
Valor de la Obra Programada	$ 3.190.548,65	$ 3.190.548,65

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,1%	10,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.402.662,38	$ 11.464.704,81

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

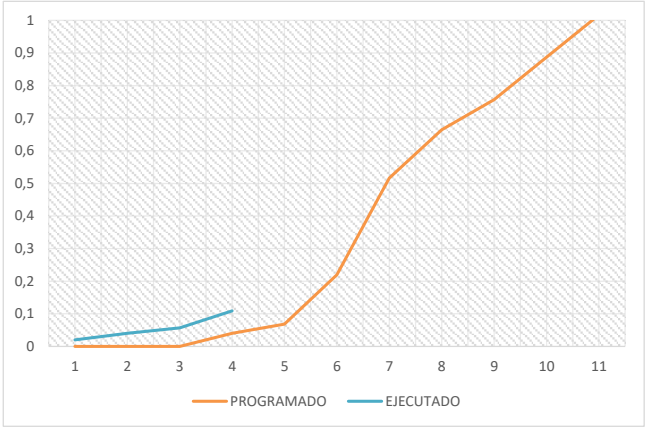

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro del piso de caucho de los salones que se encintraban en mal estado
Se realiza el retiro del cielo razo de las zonas de los corredores del segundo piso
Se realiza el resane de los cielo rasos en las zonas de los corredores

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas y levantamiento de piso de paucho de las aulas; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,33%	0,98%	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo	Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	2,33%	0,98%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	1,0%	2,3%	-1,4%
Acumulado Actual	6,7%	2,3%	4,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,3%	2,3%
Valor de la Obra Programada	$ 2.685.788,24	$ 2.685.788,24

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,0%	6,7%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 1.129.644,84	$ 7.700.028,08

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

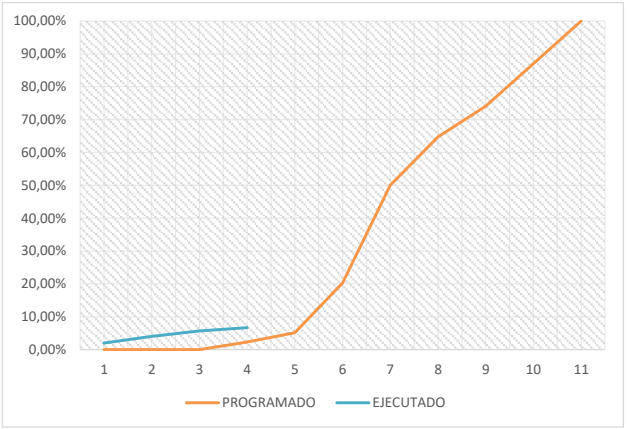

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
				VIERNES	S
				SÁBADO	F
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza el retiro de canaleta troquelada y puntos electricos ubicados en el piso para la posterior construccion de la division de cuarto de archivo

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades de retiro de puntos electricos existentes y de la oficina; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	6	1	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	30/12/24 al 05/01/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,0%	2,0%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2,0%	3,2%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	4,0%	5,2%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,7%	0,0%	5,7%
Durante el periodo	5,2%	4,0%	1,2%
Acumulado Actual	10,9%	4,0%	6,9%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,0%	4,0%
Valor de la Obra Programada	$ 4.570.473,54	$ 4.570.473,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,2%	10,9%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 5.941.615,61	$ 12.454.540,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

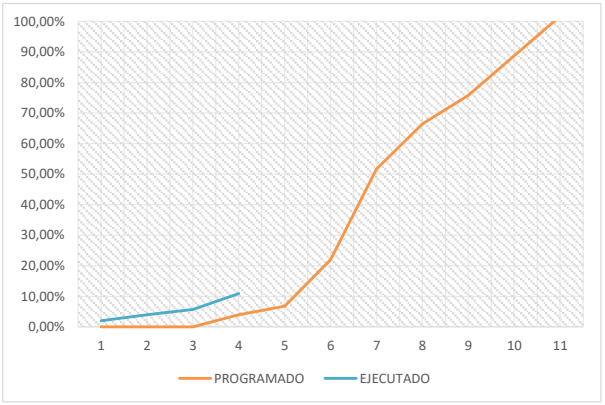

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
MAESTRO	0			VIERNES	L
OFICIAL	1			SÁBADO	L
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Retiro de cielo raso existente.
Retiro de luminarias existentes.
Se realiaza el alistado del cielo raso y muros del comedor.
Se realizan actividades de resane de muros y techos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se han adelantado actividades para el resane de las gritas existentes; el personal en obra cuenta con los respectivos implementos de seguridad.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista
