1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8		3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE CASA JUVENTUD ALDEA DE PENSADORES			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KRA 88A 69B 61					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	20,8%	12,4%	Se realiza la instalacion de estructura metalica para la cubierta.	Se realiza la instalacion de estructura metalica para la cubierta.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	20,8%	12,4%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	32,6%	19,0%	13,6%
Durante el periodo	12,4%	20,8%	-8,4%
Acumulado Actual	45,1%	39,8%	5,2%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	20,8%	39,8%
Valor de la Obra Programada	$ 27.276.242,97	$ 52.148.569,15

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	45,1%	12,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 58.971.978,75	$ 16.267.680,78

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

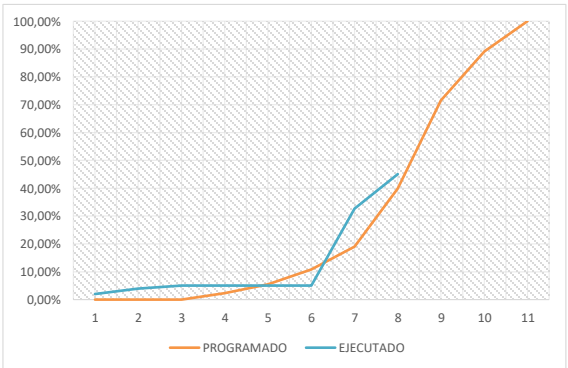

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	1			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza la instalacion de estructura metalica de la cubierta.
Se realiza disposicion final de cubierta en teja de asbesto.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza la instalacion de estructura metalica de la cubierta.
Se realiza disposicion final de cubierta en teja de asbesto.
Se solicitra concepto tecnico de los especialistas para la parte estructural.



Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:01/02/25
Descripción: Se instala la estructura de la cubierta.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se instala la estructura de la cubierta.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza la aplicación de pintura en estructura metalica



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza la aplicación de pintura en estructura metalica



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza la aplicación de pintura en estructura metalica



Fecha:01/02/25
Descripción: Se realiza disposicion final de cubierta en asbesto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	1,8%	N/A	Se realiza remates en muros de los baños.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACINES	14,2%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	14,2%	1,8%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	79,3%	50,0%	29,3%
Durante el periodo	1,8%	14,8%	-12,9%
Acumulado Actual	81,2%	64,7%	16,4%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	14,8%	64,7%
Valor de la Obra Programada	$ 21.143.214,96	$ 92.686.975,36

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,8%	81,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.634.020,51	$ 116.183.208,89

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

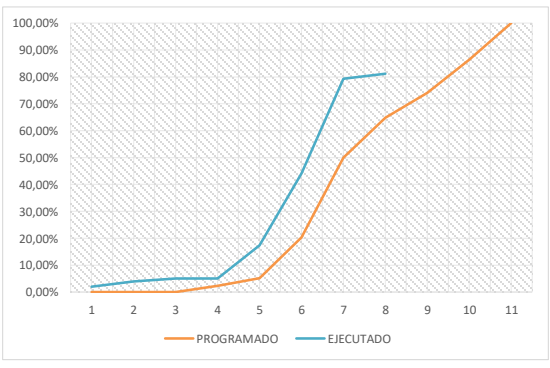

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza remates de la pintura de muros en los baños y comedor.
Se realiza observaciones a la instalación de la película de seguridad de la ventana instalada y la cual no se recibirá si no se subsana esta observación.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones a la instalación de la película de seguridad de la ventana instalada y la cual no se recibirá si no se subsana esta observación.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:29/01/25
Descripción: Se comienza a pintar los muros de lavanderia.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se termina de pintar los muros de lavanderia..



Fecha:3001/25
Descripción: Se comienza a pintar los esquineros de muros.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se termina de pintar los esquineros de muros y se instalan.



Fecha:27/01/25
Descripción: Se solicita entregar el area de colchonetas desocupado para realizar el cambio de teja.



Fecha:31/01/25
Descripción: Se entrega el area de colchonetas desocupado para realizar el cambio de teja.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDE JARDÍN INFANTIL ENGATIVÁ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CL 66B 122-03					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000			
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402			
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero de 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES									
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIMENTACION	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERIA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS	9,5%	7,5%	Se realiza levantamien de manto asfaltico y seyo de juntas.	Se realiza levantamien de manto asfaltico y seyo de juntas.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	9,5%	7,5%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	12,7%	18,5%	-5,8%
Durante el periodo	7,5%	9,5%	-2,0%
Acumulado Actual	20,2%	28,0%	-7,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,5%	28,0%
Valor de la Obra Programada	$ 11.396.783,04	$ 33.558.737,60

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,5%	20,2%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 8.988.987,05	$ 24.198.353,13

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

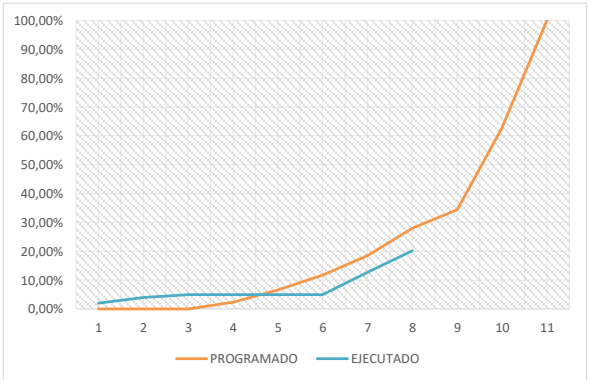

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	2			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza retiro de manto asfaltico en cubierta.
Se realiza sello de juntas en cubierta.
Se realiza alistado de fachada para aplicación de estuco impermeabilizado.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se suspende el uso de andamios ya que los existentes no cumplen con lo solicitado por esta interventoria.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:27/12/24
Descripción: Visita de obra



Fecha:20/01/25
Descripción: Se comienza a pelar la pintura de la fachada



Fecha:20/01/25
Descripción: Se comienza a pelar la pintura de la fachada

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMENTO	CENTRO LUZ DE ESPERANZA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	ENGATIVÁ			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	5,00%	8,30%	Se realiza construcción de media caña en granito, en el sector de la cocina.	Se realiza construcción de media caña en granito, en el sector de la cocina.
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	2,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	5,91%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	12,91%	8,30%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	25,4%	19,0%	6,4%
Durante el periodo	8,3%	10,9%	-2,6%
Acumulado Actual	33,7%	29,9%	3,8%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,9%	29,9%
Valor de la Obra Programada	$ 13.092.000,00	$ 35.897.685,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8,30%	33,69%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 9.960.000,00	$ 40.429.092,54

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

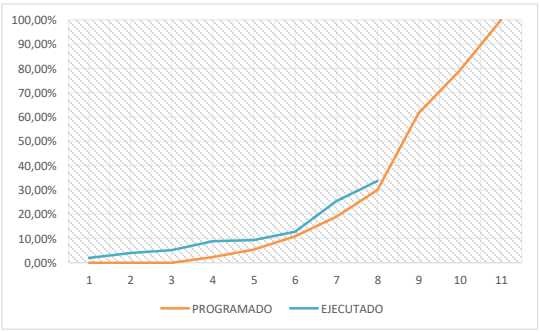

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
INSPECTOR TECNICO	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	0			MIERCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	0			VIERNES	F
INPECTOR SST	1			SÁBADO	S
AYUDANTE	1				
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza construcción de media caña en granito, en el sector de la cocina.
Se realiza actividades de enchape de shut de basuras.
Se instala puerta para el shut de basura y puerta de acceso para la terraza.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones al enchape del si de basuras, de igual formas se solicita corregir la instalación de película de seguridad de la puerta de la terraza, ya que esta presentaba burbujas por mala instalación.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORDE INTERVENTORIA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No. 27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

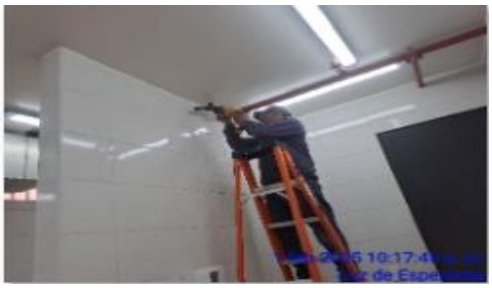

Fecha:01/02/25
Descripción: Se colocan los mediacañas en PVC en la cocina.



Fecha:01/02/25
Descripción: Se termina de cortar y fundir media caña en granito de la cocina.



Fecha:30/01/25
Descripción: Se coloca masilla en los muros exteriores del superboard del shut de basuras..



Fecha:30/01/25
Descripción: Se termina de enchapar el shut de basuras.



Fecha:30/01/25
Descripción: Se termina de hacer los guardaescobas en mortero impermeabilizado de las placas del punto fijo y ascensor



Fecha:29/01/25
Descripción: Se instala luminaria en el shut de basuras.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL SABANA GRANDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	CARRERA 106 #15A-32			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES DOMICILIARIAS	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	28,20%	18,00%	Se culmina con la instalacion de luminarios en la sede .	Se culmina con la instalacion de luminarios en la sede .
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERÍA MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA	12,56%	10,00%	Se culmina con la aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de epoxica.	Se culmina con la aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de epoxica.
INSTALACION DE SANITARIOS	0,00%	0,00%	Se realiza la intalacion de sanitarios en los baños del primer y segundo piso	Se realiza la intalacion de sanitarios en los baños del primer y segundo piso
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	40,76%	28,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	71,4%	38,7%	32,7%
Durante el periodo	28,0%	40,8%	-12,8%
Acumulado Actual	99,4%	79,4%	20,0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	40,8%	79,4%
Valor de la Obra Programada	$ 51.173.945,68	$ 99.741.288,12

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	28,0%	99,4%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 35.154.246,25	$ 124.825.949,79

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

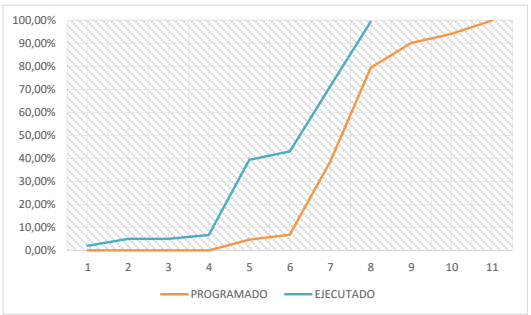

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	1			JUEVES	L
AYUDANTES	0			VIERNES	L
OFICIALES	1			SÁBADO	L
MAESTRO	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza la instalación de sanitarios en los baños del segundo piso y primer piso.
Se realiza el resane y pintura en el sector de los baños.
Se culmina con la instalación de luminarias de la sede.
Se intalan los lava colas de los baños del primer piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza observaciones en los acabados de la pintura en el sector del comedor, y en baños, se realiza observaciones a la instalacion de lava colas ya que no se encuentran rematados debidamente. Se debe realizar el respectivo ajuste, no se resibiran estos espacios sin estos remates.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVEN

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Entrega parcial con observaciones de los espacios intervenidos.



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Entrega parcial con observaciones de los espacios intervenidos.



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Entrega parcial con observaciones de los espacios intervenidos.



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Instalación de lava colas



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Instalación de lava colas



Fecha: 01/02/2025
Descripción: Instalación de lava colas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-016 Versión: 0 Fecha: Memo I2021022167 - Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000	
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV 12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.642.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	11,7%	85,1%	Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.	Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	11,7%	85,1%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,0%	27,7%	-22,7%
Durante el periodo	85,1%	11,7%	73,4%
Acumulado Actual	90,1%	39,3%	50,7%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,7%	39,3%
Valor de la Obra Programada	$ 8.829.233,03	$ 29.789.097,93

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	85,1%	90,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 64.412.565,72	$ 68.198.422,41

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

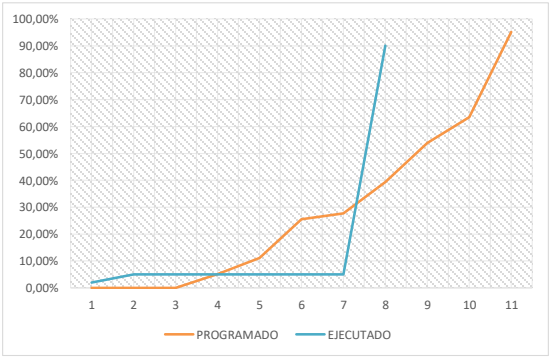

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da inicio con actividades del retiro de cubierta existente y asi mismo se procede con la instalacion de cubierta Ecoroof y policarbonato.
Se ha exigido los implementos de seguridad de los trabajadores.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Verificacion del espesor de cubierta




Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta



Fecha:01/02/25
Descripción: Instalacion de cubierta

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	AK 80 # 43-43 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
VV								
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.642.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO: 23 de febrero 2025 Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	4,1%	17,9%	Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.	Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICION FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	4,1%	17,9%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	5,3%	11,4%	-6,1%
Durante el periodo	17,9%	4,1%	13,7%
Acumulado Actual	23,1%	15,5%	7,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,1%	15,5%
Valor de la Obra Programada	$ 3.020.353,09	$ 11.409.901,21

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	17,9%	23,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 13.136.931,86	$ 17.008.094,98

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

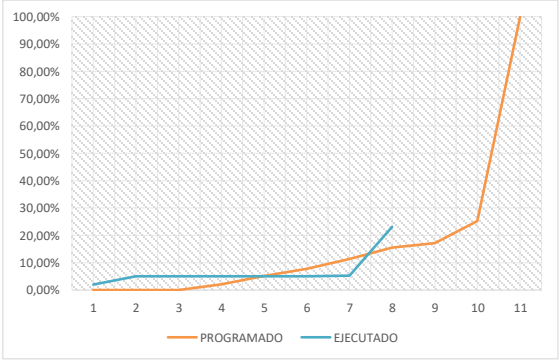

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	1			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	1			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.
Se realiza aplicación de pintura epoxica en cocina.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza resana, aplicación de vinilo tipo 1 y aplicación de pintura epoxica en las tres aulas de clase intervenidas.
Se verifica cantidades de obra y se verifica la calidad de las obras.
Se realiza impermeabilización de cubierta donde se encuentran los tanques.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicacion de pintura.



Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicacion de pintura.




Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicación de emulsion asfaltica.



Fecha:01/02/24
Descripción: Aplicación de emulsion asfaltica.



Fecha:01/02/24
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.



Fecha:01/02/24
Descripción: Instalacion de manto asfaltico.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL EL CARACOL			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 95A # 34-86 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000		
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso	Se termina con el levantamiento de piso de caucho en las aulas del segundo piso
MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3,24%	2,50%	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..	Se realiza el resane en los muros de los corresdores y aplicación de pintura en vinilo y Pintura epóxic..
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,24%	2,50%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	34,6%	69,4%	-34,9%
Durante el periodo	2,5%	3,2%	-0,7%
Acumulado Actual	37,05%	72,7%	-35,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,2%	72,7%
Valor de la Obra Programada	$ 3.446.453,96	$ 77.287.709,54

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,5%	37,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.658.790,54	$ 39.403.275,82

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

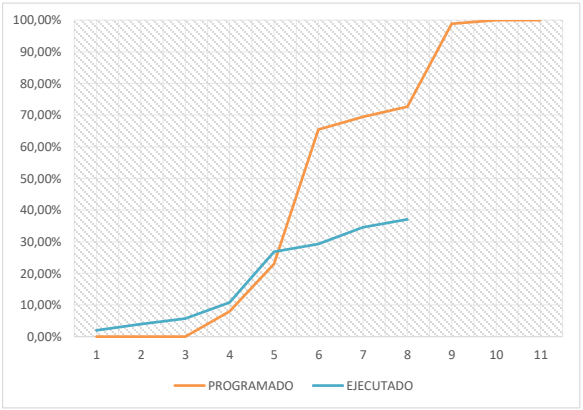

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	S
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	S
TÉCNICOS ELECTRICO	1			MIERCOLES	S
INSPECTOR SST	1			JUEVES	S
MAESTRO	0			VIERNES	S
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Resane de muros pasillo norte y sur segundo nivel.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al personal el suministro de dotacion de acuerdo al manual de identidad visual del distitivo

Se solicita realizar limpieza de los pisos ventanas y paredes salpicadas con pintura aplicada.

Se recomienda revisar el estado del cerramiento provisional de las aulas del segundo piso.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
CONTRATO OBRA No:	9176-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024
INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO


23	2	25	23 de febrero



FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realiza aplicación de pintura tipo vinilo en corredor nororiental de la sede.



FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se realizan resanes de filos en corredor del segundo piso

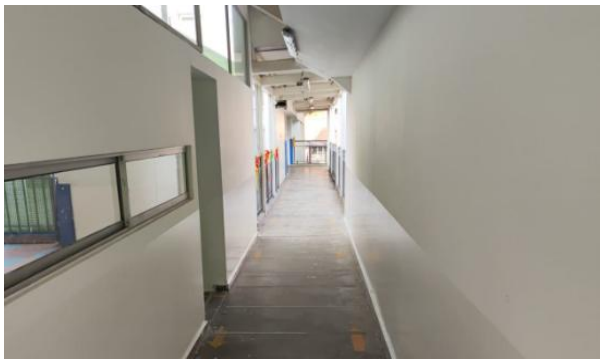

FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se observa muros pintados en vinilo y pintura epóxica.



FECHA FOTO: 01/02/25
DESCRIPCIÓN: Se observa muros pintados en vinilo y pintura epóxica.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 88 # 6A – 36						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 1.299.753.000				
9. FECHA ACTA INICIO:	11	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	11	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días	
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,00%	0,00%	N/A	N/A
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3,24%	2,50%	N/A	N/A
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,00%	0,00%	N/A	N/A
TOTAL	3,24%	2,50%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	34,6%	69,4%	-34,9%
Durante el periodo	2,5%	3,2%	-0,7%
Acumulado Actual	37,05%	72,67%	-35,6%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,2%	72,7%
Valor de la Obra Programada	$ 3.735.461,04	$ 83.768.775,46

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,5%	37,1%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.881.747,04	$ 42.707.491,07

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

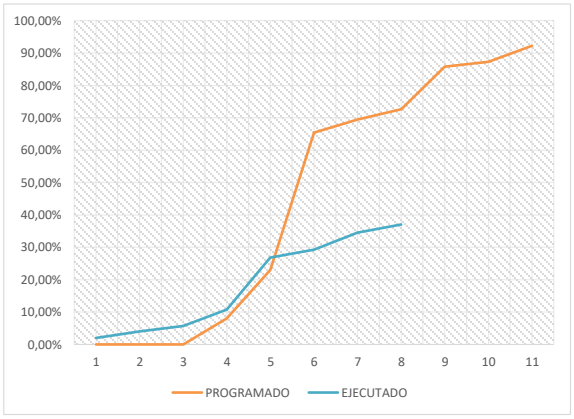

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
MAESTRO	0			VIERNES	F
AYUDANTE	1			SÁBADO	F
OFICIAL	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza impermeabilización de la cubierta con manto asfaltico.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan observaciones a la instalación de manto asfaltico y las cuales deberán ser atendidas por parte del contratista de obra.
Se realiza visita técnica por parte del especialista eléctrico de interventoría.

Nombre: MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN:Verificacion de instalacion de manto asfaltico con observaciones

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDÍN INFANTIL TINTALITO MIS PRIMEROS PASOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 86 B # 42 F - 03 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9176-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$	1.299.753.000
9. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	11. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
12. PRORROGAS:	23/02/2025	13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", GRUPO 03.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GT							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9355-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	11 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	23	2	25	22. PLAZO:	23 de febrero 2025	Meses/días
23. PRORROGAS:	23/02/2025	24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,0%	0,0%	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.	Se realiza el desmonte de luminarias existentes.
INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1,6%	0,0%	N/A	N/A
ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.	Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0,0%	0,0%	N/A	N/A
ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0,0%	0,0%	N/A	N/A
TOTAL	1,55%	0,00%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	37,8%	7,1%	30,7%
Durante el periodo	4,0%	5,6%	-1,6%
Acumulado Actual	41,78%	12,7%	29,12%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,6%	12,7%
Valor de la Obra Programada	$ 6.362.611,41	$ 14.472.083,17

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	4,0%	41,8%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 4.570.473,54	$ 47.741.792,04

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

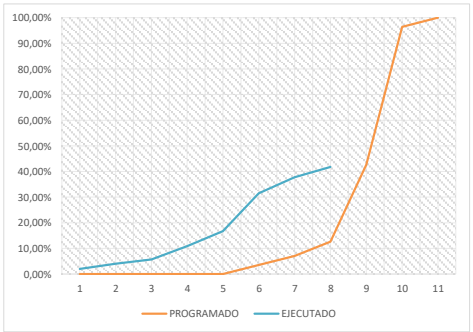

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
RESIDENTE	1			LUNES	L
INSPECTOR DE OBRA	1			MARTES	L
TÉCNICOS ELECTRICO	0			MIERCOLES	F
INSPECTOR SST	0			JUEVES	F
MAESTRO	0			VIERNES	F
OFICIAL	1			SÁBADO	F
AYUDANTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se alista superficie de muros para el respectivo resane.
Se realiza instalaciones electricas del segundo piso.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizan observaciones a la instalación de manto asfaltico y las cuales deberán ser atendidas por parte del contratista de obra.
Se realiza visita técnica por parte del especialista eléctrico de interventoría.

Nombre: MARGRITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	8	3. SEMANA No.	27/01/25 al 02/02/25

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

CONTRATO OBRA No:	9176-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS GT
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9355-2024	INTEVENTORÍA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas



FECHA FOTO: 01/02/2025
DESCRIPCIÓN: Verificacion de la instalacion de redes electricas
