INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTO

CONTRATO No. 490 DE 2024



CONSORCIO OBRAS RURALES 2024

NIT. 901.898.260-0

AVANCE DE ACTIVIDADES PERIODO No.1	DEL	**30 de diciembre de 2024**	AL	**31 de enero de 2025**

A. DATOS GENERALES

OBJETO:	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL	**HUILA**	**NEIVA**

CONTRATISTA OBRA:	**NIT**	**REPRESENTANTE LEGAL :**
CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	901.898.260-0	DEYANID GUILOMBO VALENZUELA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		**FECHA ACTA INICIO:**	**FECHA DE TERMINACION**	**PLAZO EN MESES:**
VALOR INICIAL	**$ 615.192.918,00**	30/12/2024	27/08/2025	8
ADICION N°1				
VALOR TOTAL	**$ 615.192.918,00**	**FECHA DE SUSPENSION N°1** N/A	**FECHA REINCIO N°1**	N/A
		FECHA DE SUSPENSION N°2 N/A	**FECHA REINCIO N°2**	N/A

DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**
OSCAR IVAN REINOSO MERCHAN	RICARDO HERNANDEZ GUZMAN

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES

	ACTIVIDAD	**CANTIDAD**				**ACTIVIDAD PROGRAMADA**	**% EJECUTADO AL 30 DE ENERO DE 2025**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	
		Contratada	**Unidad**	**Ejecutada**	**Unidad**	**Mes**		**EJECUTADO**	OK
								ATRASADO	ATR
								NO INICIADO	NI
	VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS			15		Enero	22,38%	OK	22,38%
1	**Construcción de ocho (8) secaderos solares de café parabolico en estructura tubo cerramiento negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm, correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**								
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	200,00	M2	0,00	M2	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	6,40	M3	0,00	M3	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	6,40	M3	0,00	M3	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CAFÉ EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO 2.5 mm x 6 mts NOTA: DEL MATERIAL DEBE OBTENER LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES interiores 8 TUBOS DE LONGITUD 0.40 MTS COMO APOYO A 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES INTERNAS PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS Nota: eL contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	8,00	UND	0,00	UND	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	8,00	UND	0,00	UND	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	8,00	UND	0	UND	Marzo	0,000%	NI	0,00%

1,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFE, PAREDES LATERALES EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR. INCLUYE 6 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	64,00	UND	0,00	UND	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	8,00	VIAJE	0,00	VIAJE	Marzo	0,000%	NI	0,00%
1,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	8,00	VIAJE	0,00	VIAJE	Marzo	0,000%	NI	0,00%
2,0	**Construcción de cinco (5) secadores solares de cacao parabolico en tubo de cerramiento de negro de 1/12 de diametro x 2.5 mm (incluye ventila de aire en la parte superior de la estructura y guayas de sujeción), correa en perfil cerrado rectangular de aguas negra 1 1/4 x 1" calibre 14 x 6 mts y acado con anticorrosivo gris, cubierta en plastico agrolen de 6 mm anclada con tornillo autoperforante sobre manguera de uso agrícola de 1/2, paseras en ángulo de 2" x 1/8, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la construcción e instalción de 8 paseras en madera. ver planos.**								
2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	125,00	M2	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA DADOS DE CONCRETO DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3	4,00	M3	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,3	CONSTRUCCIÓNDE DADOS EN CONCRETO DE 20.7 MPA DIMENSIONES: H=0.3, L1=0.3 Y L2=0.3, INCLUYE TRASNPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA	4,00	M3	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SECADERO PARABOLICO DE CACAO EN TUBO DE CERRAMIENTO NEGRO DE 1 1/2" DE DIAMETRO X 2.5 MM, CORREA EN PERFIL CERRADO RECTANGULAR DE AGUAS NEGRA 1 1/4 X 1" CALIBRE 14 X 6 MTS Y ACADO CON ANTICORROSIVO GRIS, INCLUYE GUAYA PARA AMARRE DE CUBIERTA EN LA PARTE SUPERIOR Y PERNOS PARA AMARRE DE LAS GUAYAS PARA PARALES O COLUMNAS METÁLICA: 6 TUBOS DE LONGITUD 2.6 MTS 6 TUBOS DE LONGITUD 1.7 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 1.20 MTS 4 TUBOS DE LONGITUD 0.60M MTS DE APOYO INTERMEDIO DE PASERAS INFERIORES 8 TUBOS DE LONGITUD 0.35 MTS PARA APOYOA 45 GRADOS DE LAS PASERAS SUPERIORES PARA CERCHA. 3 TUBOS CURVOS DE LONGITUD 5.09 MTS INCLUYE DOLBADURA DE LOS 3 TUBOS PARA ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 3 CURVAS DE 0.75 3 TUBOS RECTOS DE 0.25 Nota: el contratista debe cuando se requiera, utilizar y soldar el sobrante de tubos para completar algun elemento.	5,00	UND	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PASERAS O CAMILLAS DE SECADO DE GRANO DE CAFÉ, CONTRAMARCO EN EN ÁNGULO DE HIERRO 1 1/2 X 3/16 X 6M, APOYOS TRANSVERSALES EN ANGULO DE 1" X 3/16 X 6 TRANSVERSALES INCLÑUYE INTALACIÓN DE 5 HILOS ALAMBRE LISO EN SETIDO LONGITUDINAL, ACABADO EN ANTICORROSIVO GRIS	5,00	UND	**0,00**		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE PLÁSTICO AGROLENE CAL 6 X 8M DE ANCHO RESISTENTE RAYOS UV, INCLUYE INSTALACIÓN DE MANGUERA DE USO AGRÍCOLA 1/2" EN LA ESTRUCTURA PARA EVITAR DETERIORO DE LA CUBIERTA.	5,00	UND	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,7	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CACAO, PAREDES LATERALES EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1"y TIRA DE MADERA INFERIOR DE PISAMALL. INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR. INCLUYE 2 PLATINAS EN ÁNGULO, MALLA PARA SECADO DE CACAO COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	40,00	UND	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,8	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	5,00	VIAJE	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%
2,9	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	40,00	VIAJE	0,00		Marzo	0,00%	NI	0,00%

3,0	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras moviles para secaderos de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"**								
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASERA MOVIL PARA SECADO DE CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR. Incluye: Tabla de nogal cafetero seca de 1"x 10" x 3.0 m. Incluye toda la tabla requerida para el fondo de la pasera, laterales, tablilla superior y respectivos recortes. Angulos de 90O (Escuadras esquineras En Acero 2" x 5/8") para instalación en los vertices de las paseras. Dos por vertices. Colocados internamente. Balinera comun (eje 1/2") diametro de la balinera 2" Rodillo Metálico de apoyo (Yoyos metálicos) (eje 1/2") ; bore size: 4,8 y 15 mm. Tipo de puerta corredera con ranura en U de 2 pulgadas. Angulo 2" x 1/8" x 10 cm de longitud para la elaboración de 4 soportes de aclaje del sitema de rodamiento a la pasera sóldadura eléctrica 6013 Alambre liso galvanizado calibre 12 tornillo de 2pulgadas autoperforante para madera para anclaje de rodamientos tipo yoyo o de ppuesrta corredera MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO HUECO TIPO ROMBO. Nota: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla	16,00	UND	0,00		Abril	0,00%	NI	0,00%
3,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	3,00	VIAJE	0,00		Abril	0,00%		0,00%
3,3	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	10,00	VIAJE	0,00		Abril	0,00%		0,00%
4,0	**Suministro es instalación de dieciseis (16) paseras fijas para secadero de cacao existentes, construida en tabla de madera de pino o nogal de espesor de 1" y tiras de pisamalla, con 2 ángulos de refuerzo en los vertices de la pasera, reticula en alambre galvanizado de calibre 12 para ela poyo de la malla de secado negro en polietileno de alta densidad filtro uv, de 2mt de ancho, orificio tipo rombo. Incluye la instalción de 4 paseras en madera en el secador solar existente. ver planos. incluye posicionamiento y puesta en funcionamiento en el secadero de solar, el sistema de rodamiento metálico tipo yoyo y balineras apoyados sobre ángulo de 2"**								
4,1	SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE PASERA FIJA PARA SECADO DE CAFÉ O CACAO, CONSTRUIDA EN TABLA DE MADERA DE PINO O NOGAL DE ESPESOR DE 1". INCLUYE POSICIONAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECADERO DE SOLAR, ANGULOS DE ANCLAJE A 90O, MALLA CAFETERA COLOR NEGRO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD FILTRO UV, DE 2MT DE ANCHO., TABLA DE NOGAL O PINO SECA DE 30 X 300 X 2500 MM. INCLUYE TODA LA TABLA REQUERIDA PARA LOS LADOS DE LAS CAMILLA DE 10 CM DE ALTO, DIVISORIO DE LA CAMILLA DE 5 CM DE ALTO Y PISAMALLA DE 3CM X 3CM Y LARGO DE ACUERDO CON LA DIMENSIÓN DE LA CAMILLA., DE ACUERDO ALOS DISEÑOS O PLANOS. Dimensiones de la pasera: 1.50 x 2.50mts, en el proceso de construcción se deben realizar el ajuste conforme a las dimensiones utiles de la estructura. Nota1: se debe dejar 10 cm de sobrantes de malla en cada uno de los 4 lados de la pasera, para poder realizar el templado de la malla Nota 2: los ángulos de 90 grados, se colocan dobles en cada uno de los 4 vértices de la pasera y se colocan en la cara interna.	16,00	UND	0,00		Abril	0,00%	NI	0,00%
4,2	TRANSPORTE AUTOMOTOR	3,00	VIAJE	0,00		Abril	0,00%		0,00%
4,3	TRANSPORTE ANIMAL	10,00	VIAJE	0,00		Abril	0,00%		0,00%
5,0	**Construcción de doce (12) tanque australiano de un anillo, diametro 5 mts, altura util 1.10 m, de páneles laterales de lámina galvanizada undulada en sentido longitudinal y acabado cromado brillante, calibre 18, incluye suministro e instalación de bolsa almacenamiento de agua, construida en geomembrana calibre 40 polietileno de alta densidad (hdpe); espesor 1,1 mm; 5 m de diámetro; 1,4 m de alto. sellada con termofusión, sistema de desague en tuberia presion de 2", acometida hidráulica en tubería pvc presión de 1/2" y cubierta en polisombra negra al 80% anti uv**								
5,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN	156,00	M2	0,00		Mayo	0,00%	NI	0,00%
5,2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	6,00	M3	0,00		Mayo	0,00%	NI	0,00%
5,3	INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA, TANTO DE ACOMETIDA EN PVC EN 1/2" y TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 2", PARA TANQUE AUSTRALIANO, INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR	12,00	UND	0,00		Mayo	0,00%	NI	0,00%

5,4	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE AUSTRALIANO DE UN ANILLO, DIAMETRO 5 MTS, ALTURA UTIL 1.10 M, DE PÁNELES LATERALES DE LÁMINA GALVANIZADA UNDULADA EN SENTIDO LONGITUDINAL Y ACABADO CROMADO BRILLANTE, CALIBRE 18, FLOR REGULAR O MÍNIMA; CON O SKIN PASS, PASIVADO SECO NO ACEITADO RECUBRIMIENTOS: Z90 (G30); Z120 (G40); Z180 (G60); Z275 (G90)	12,00	UND	0,00		Mayo	0,00%	NI	0,00%
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA EN GEOMEMBRANA CALIBRE 40 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE); ESPESOR 1,1 MM; 5 M DE DIÁMETRO; 1,4 M DE ALTO. SELLADA CON TERMOFUSIÓN. LISA, ALTA RESISTENCIA CON OJALES EN EL EXTERIOR PARA AMARRE, DEBE QUEDAR MÍNIMO 20 CM DE GEOMENBRANA VISIBLE POR LA CARA EXTERNA DEL TANQUE PARA AMARRES, INCLUYE: TIRAS DE PROTECCIÓN DE GEOMEMBRANA CONTRA CABEZAS DE TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ANILLOS. ANCHO DE TIRA 20 CM POR 1.4 CM DE LARGO; INSTALACIÓN DE MAGUERA EN EL BORDE SUPERIOR DEL ANILLO DEL TANQUE AUSTRALIANO, PEGUE DE LA BRIDA Y LOS EMPALMES. LA BOLSA SE DEBE INSTALAR AL INTERIOR DEL TANQUE AUSTRALIANO	12,00	UND	0,00		Mayo	0,00%	NI	0,00%
5,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLISOMBRA NEGRA AL 80% ANTI UV, UNIDA CON PEGANTE Y CON COSTURA CON NYLON TRANSPATERENTE DE 40 LIBRAS. INCLUYE ANILLO EN MAGUERA DE POLIETILENO 1/2 PULGA DE USO AGRÍCOLA CON ALMA EN VARILLA DE 1/4" PARA AMARRE DE LA POLISOMBRA.	12,00	UND	0,00		Mayo	0,00%	NI	0,00%
5,7	TRANSPORTE AUTOMOTOR	6,00	VIAJE	0,00		Mayo	0,00%		0,00%
5,8	TRANSPORTE ANIMAL	96,00	VIAJE	0,00		Mayo	0,00%		0,00%
6,0	**Construcción de 21 sistemas sépticos para agua residual doméstica en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro de flujo ascendente en gravilla, caja de inspección de 80 x 80 cm, trampa de grasas de 40 x 40 y campo de infiltración y la respectiva tubería de 2" y 4" y sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema y cajillas**								
6,1	**SISTEMA SÉPTICO ARD**						0,00%		
6,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	84,00	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	140,70	M3	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	298,20	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	1.050,00	KG	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	84,00	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	84,00	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" INTERIOR SISTEMA SÉPTICO	21,00	UND	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2", PARA EL FAFA	14,70	M3	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA PERFORADA DEL FAFA,PERFORACIONES DE 1" E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	21,00	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,1,10	TUBERÍA SANITARIA PVC 4". I PARA CONEXIÓN A BATERIA EXISTENTE.	126,00	ML	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,2	**CAJA TRAMPA DE GRASAS 0.80 X 0.80**								
6,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	13,44	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	10,75	M3	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,2,3	CAJA DE DINSPECCIÓN 80 x 80 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE ELABORACIÓN DE CAÑUELA Y PAÑETE INTERIOR, H= 0.80, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	21,00	UND	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,2,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	126,00	UND	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,3	**CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 X 0.40**								
6,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	3,36	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M	2,02	M3	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,3,3	CAJA DE DINSPECCIÓN 0.40 x 0.40 EN LADRILLO TOLETE, INCLUYE PAÑETE INTERIOR, H= 0.60, TAPA EN CONCRETO REFORZADA CON HIERRO 1/4" DE 60000 PSI	21,00	UN	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,3,4	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2"	21,00	UND	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2".	126,00	ML	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,4	**CAMPO DE INFILTRACIÓN: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION, MATERIAL FILTRANTE.**								

6,4,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100,80	M2	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,4,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	33,60	M3	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION, INCLUYE ELABORACION DE PERFORACIONES DIAM 1/4 EN ZONA DE INFILTRACION	168,00	ML	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	21,00	UND	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	17,85	VIAJE	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
6,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	126,00	VIAJE	0,00		Junio	0,00%	NI	0,00%
7	**Construcción de doce (12) campos de infiltración, incluye instalación de tuberia perforada, material filtrante**								
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	57,60	M2	0,00		Julio	0,00%	NI	0,00%
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL	19,20	M3	0,00		Julio	0,00%	NI	0,00%
7,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML RED DE DESAGUE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA PERFORADA (DE 4" HASTA CAMPO DE INFILTRACION,. INCLUYE TAPADO DE TUBERÍA	96,00	ML	0,00		Julio	0,00%	NI	0,00%
7,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=0.25 (Grava de 2 a 6 cm H=0.15; Arena H=0.10)	12,00	UND	0,00		Julio	0,00%	NI	0,00%
7,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	6,00	VIAJE	0,00		Julio	0,00%	NI	0,00%
7,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	48,00	VIAJE	0,00		Julio	0,00%	NI	0,00%
8	**Cosntrucción de cinco (5) sistema séptico para aguas residuales no doméstica, en mampostería de ladrillo tolete común, con filtro en gravilla, caja de recolección de 50 x 50 cm en concreto, fosa de infiltración y la respectiva tuberia de 4" con sus accesorios y refuerzo en 3/8" en ambas direcciones cada 20 cm tanto para placa de fondo como para tapas del sistema.**								
8,1	**SISTEMA SÉPTICO**						0,00%		
8,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	20,00	M2	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA) H= 2 M, ACARREO HORIZONTAL, INCLUYE EXCAVACIÓN TUB 4" (INCLUYE TODASLASEXCAVIONES REQUERIDAS)	38,00	M3	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,3	MURO EN LADRILLO TOLETE (0.07 X 0.12 X 0.24) e=0.12 M	55,00	M2	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,4	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI DÍAMETRO 3/8 PARA TANQUE SÉPTICO. INCLUYE INCLUYE ACERO PARA PLACA DE FONDO Y TAPAS, AMARRE Y FIGURADO EN AMBAS DIRECCIONES RETICULA DE 20 X 20 CM.	250,00	KG	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA (3000 P.S.I) E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACA Y ACARREO HORIZONTAL	20,00	M2	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA, COLOCACIÓN DE REFUERZO ARMADO DE FORMALETA Y COSNTRUCCIÓN DE LA PLACAY Y ACARREO HORIZONTAL	20,00	M2	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA. INCLUYE TUBERIA 4" QUE PARA CONEXIONES INTERNAS	5,00	UND	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,8	TUBERÍA SANITARIA PVC 4" PARA CONEXIÓN A CAMARA RECOLECTORA.	30,00	ML	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 2"	2,00	M3	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE GRAVA DE 1"	1,50	M3	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,2	**CAJA RECOLECTORA 0.50 X 0.50 EN CONCRETO DE 20.7 MPA, CON EN REJILLA PERFORADA Y REJILLA INTERIOR HCAJA=0.5 emuro=0.07, INCLUYE ACCESORIOS DE PVC**						0,00%		
8,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL .	2,00	M2	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,2,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA)	1,10	M3	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,2,3	CAJA RECOLECTORA DE 50X50CM, EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,07, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REJA EN MALLA METALICA EXPANDIDA IMT CON DIAGONAL MENOR DE 10 MM COMO TAPA DE LA RECAMARA, INCLUYE CAÑUELA Y MARCO EN ÁNGULO DE 1"	5,00	UND	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,3	**FOZA DE INFILTRACIÓN: DE 1 X 1 M, H=0.8 : INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA (DE 4" HASTA FOSA DE INFILTRACION, Y DEL MATERIAL FILTRANTE.**								
8,3,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL	24,00	M2	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,3,2	EXCAVACIÓN MANUAL A TODO FACTOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.(MATERIAL COMUN, CONGLOMERADO Y ROCA), ACARREO HORIZONTAL	8,00	M3	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 ML DE EFLUENTE EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4".	40,00	ML	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE H=1 (Grava de 2") SECCIÓN DE LA FOSA DE INFILTRACIÓN	4,00	M3	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,3,5	TRANSPORTE AUTOMOTOR MATERIALES	2,50	VIAJE	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
8,3,6	TRANSPORTE ANIMAL MATERIALES	30,00	VIAJE	0,00		Agosto	0,00%	NI	0,00%
AVANCE TOTAL DE LA OBRA						**0,00%** **0,00%**	**0,00%**	**NI**	**0,00%**

Observaciones:

Al presente corte del primer informe correspondiente al mes de enero, el avance de la ejecución de las actividades contractuales es de 0%, debido a que, para el primer y segundo mes se contempla dentro del cronograma las visitas para verificación de cumplimiento de requisitos técnicos, y de socialización de los beneficios y reconocimiento del terreno de los beneficiarios, de lo cual, para el presente informe se tiene un avance del **22.38%**; total visitas realizadas 15 de 67 beneficiados considerados en el presente contrato.

2. DETALLE EJECUCION ACTIVIDADES MENSUAL

ACTIVIDADES	TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
VISITAS PREDIALES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS	X								

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En las visitas realizadas se presentaron inconvenientes en la localización de los beneficiarios, lo cual se solucionó con el apoyo de la entidad contratante. Se observa que algunos sitios se encuentran retirados, su acceso es a pie, dado que no se puede ingresar en vehículo tipo campero o en motocicleta; asi mismo, por la ubicación de los predios, la comunicación es dificil por falta de cobertura en el servicio de telefonía.

De las visitas realizadas se tiene:

1. Se evidencia que se requiere mayor longitud de tubería PVC-S D=4" para la conexión de la unidad sanitaria con el sistema séptico ARD, puesto que, las unidades sanitarias se encuentran retiradas del lugar consensuado con el beneficiario, de igual manera uno de los beneficiarios de la vereda Canoas no cuenta con la unidad sanitaria, tan solo, tiene instalada la taza del sanitario; adicionalmente se logra evidenciar que los beneficarios deben adecuar los terrenos que se encuentran enyerbados, y nivelar los que se encuentran en zona de pendiente.
2. El beneficiario Adelmo Lozano Tovar de la vereda el Vergel, desiste del beneficio, argumentando que ya tiene dos pozos en óptimo funcionamiento.
3. Se puede evidenciar en las visitas que algunos sistemas sépticos no están en óptimo funcionamiento, lo que podría causar que los campos de infiltración no funcionen correctamente.
4. En cuanto a los secaderos de café y secaderos de cacao se deben adecuar los terrenos.

De revisión técnica:

1. Se presentan diferencias técnicas en el capítulo 5 (tanques australianos), las cuales se presentarán ante la Interventoría para que se de respuesta.
2. En cuanto a los diseños de los secaderos de cacao y café, se encuentran diferencias en planos y especificaciones técnicas, sobre lo cual también se informará a la interventoría para la definición de estos aspectos.

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME		OBSERVACIONES
								El Contratista gestiona el suministro y fuentes de materiales para la ejecucíon del contrato.

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	3	DIR. DE OBRA RES. DE OBRA PSICOL. SOCIAL	PERSONAL CALIFICADO	2	TEC. EN OBRA MAESTRO DE OBRA	MANO DE OBRA	PERSONAL NO CALIFICADO	0

3.3 OTROS (GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL, SOCIALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL)

4. DOCUMENTOS

ITEM

EQUIPO	CONVENCIONES				A ACTIVO	R REPARACION	I INACTIVO	RE RETIRO DE EQUIPO	OBSERVACIONES
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4					
EQUIPO DE SOLDADURA									En el presente mes no fue necesario el uso de equipos, en vista de que, se realizaron visitas a benefciarios.
PULIDORA									
TALADRO ELECTRICO									
MEZCLADORA DE CONCRETO									
COMPRESOR DE PINTURA									
PISTOLA DE PINTURA									
TRONZADORA									
HERAMIENTA MENOR									

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA



VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA



VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA



VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA



VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA



VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

		
VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	VISITA TÉCNICA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

ARQ. OSCAR IVÁN REINOSO MERCHÁN
DIRECTOR DE OBRA

VoBo. ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
CONTRATISTA INTERVENTOR

CONTRATO DE OBRA No. 490 DE 2024

FECHA:	20 de diciembre de 2024
CONTRATO No.:	490 del 20 de diciembre de 2024
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS RURALES REQUERIDAS COMO ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO LORO, RIO LAS CEIBAS Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA y DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN LOS MUNICIPIOS DE ACEVEDO, ELÍAS Y PAICOL".
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024
INTERVENTOR:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
VALOR CONTRATO:	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($615.192.918) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Dentro del contrato No. 490 de 2024, se contempla la construcción de los siguientes beneficios: secaderos de café (8 unidades), secaderos de cacao (5 unidades) sistemas sépticos completos de aguas residuales domesticas ARD (21 unidades), sistemas sépticos completos de aguas residuales no domesticas ARnD (5 unidades) campos de infiltración (12 unidades), paseras móviles y fijas (16 unidades), tanques australianos (12 unidades), lo que permite que muchas familias del municipio de Neiva y municipios de zonas de interés eco sistémicos puedan contribuir tanto al desarrollo económico del departamento, y de igual manera contribuir en la disminución de la contaminación en las diferentes rondas hídricas que están cerca a sus viviendas.

Registro fotográfico

PAULINA ESCOBAR
VEREDA: SANTA LUCIA **BENEFICIO:** PASERAS FIJAS Y MÓVILES **OBSERVACIONES:** Se realiza visita a la beneficiara quien debe despejar el área dado que se evidencia presencia de objetos en el secadero existente, de igual manera la propietaria debe desyerbar el área a intervenir.




FAIBER BAHAMON BAHAMON

VEREDA: SANTA LUCIA
BENEFICIO: CAMPO DE INFILTRACIÓN
OBSERVACIONES: Se realiza visita al beneficiario, se puede evidenciar que cuenta con unidad sanitaria y sistema séptico, sin embargo, no cuenta con espacio para la construcción del campo de infiltración.











ONIAS TOVAR

VEREDA: SANTA LUCIA
BENEFICIO: SECADERO DE CACAO
OBSERVACIONES: Se realiza la visita al beneficiario, se evidencia área disponible para la construcción del beneficio, sin embargo, de acuerdo al consenso con el beneficiario menciona la construcción donde actualmente se encuentran unas paseras artesanales, por lo tanto, se indica que las debe desmontar y dejar despejado el espacio.









GLADYS CERQUERA

VEREDA: PLATANILLAL
BENEFICIO: TANQUE AUSTRALIANO
OBSERVACIONES: Se realiza la visita a la beneficiaria, se evidencia área disponible y apta para la construcción del beneficio, se dan las recomendaciones para descapotar y adecuar el terreno.









MARIA LUCIA HERRÁN
VEREDA: SANTA LUCIA **BENEFICIO:** TANQUE AUSTRALIANO **OBSERVACIONES:** Se realiza la visita a la beneficiaria, se evidencia área disponible para la construcción del beneficio, sin embargo, se dejan las recomendaciones para adecuar el terreno (desyerbar y descapotar el lote).






MARIA LILIA CASTAÑEDA
VEREDA: SANTA LUCIA **BENEFICIO:** TANQUE AUSTRALIANO **OBSERVACIONES:** Se realiza visita a la beneficiaria, se evidencia área disponible y apta para la construcción del beneficio, se hacen las recomendaciones para adecuar el terreno (desyerbar y descapotar el terreno a intervenir).







LUZ DARY Y MARCELA ESCOBAR
VEREDA: PALESTINA **BENEFICIO:** SISTEMA SÉPTICO COMPLETO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICO **OBSERVACIONES:** En la visita realizada a las beneficiarias se observa, área disponible y apta para la construcción del beneficio, no obstante, se observa que el área conciliada con los usuarios queda retirada del lugar de la unidad sanitaria longitud aproximada (20mt), adicional la unidad sanitaria es de mayor capacidad dado que, es un lugar de recreación, por lo tanto, se le manifiesta que es necesario que ellos coloquen la tubería adicional para lograr la conexión con el nuevo sistema, con lo cual están de acuerdo, se hacen las recomendaciones pertinentes de desyerbar y descapotar el terreno.











LUZ DARY Y MARCELA ESCOBAR
VEREDA: PALESTINA **BENEFICIO:** SISTEMA SÉPTICO COMPLETO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICO **OBSERVACIONES:** En la visita realizada a las beneficiarias se observa, área disponible y apta para la construcción del beneficio, no obstante, se observa que el área conciliada con los usuarios queda retirada del lugar de la unidad sanitaria longitud aproximada (20mt), adicional la unidad sanitaria es de mayor capacidad dado que, es un lugar de recreación, por lo tanto, se le manifiesta que es necesario que ellos coloquen la tubería adicional para lograr la conexión con el nuevo sistema, con lo cual están de acuerdo, se hacen las recomendaciones pertinentes de desyerbar y descapotar el terreno.









MARIA RUTH PEREZ

VEREDA: PRIMAVERA
BENEFICIO: SISTEMA SÉPTICO COMPLETO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICO
OBSERVACIONES: Se realiza la visita, el beneficiario menciona que el sistema séptico que tiene actualmente está desde que compró la casa, se evidencia una caja de inspección y un pozo, asimismo, se observa que cuenta con área disponible la cual es mayormente plana, permitiendo que sea apto para la construcción del beneficio. Se hacen las recomendaciones de adecuar el terreno (retirar la basura y descapotar).



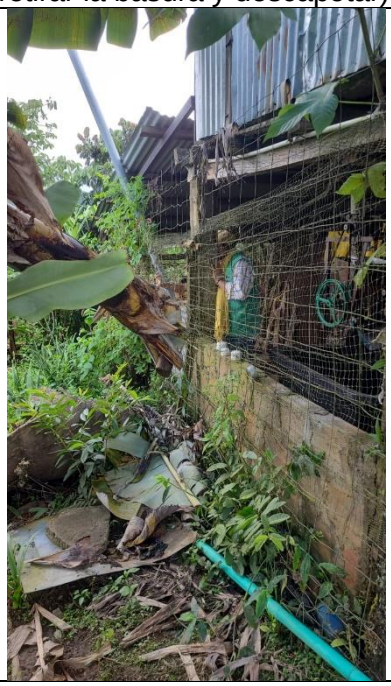





MARIA RUTH PEREZ

VEREDA: PRIMAVERA
BENEFICIO: SECADERO DE CAFÉ
OBSERVACIONES: Se realiza la visita a la beneficiaria, se procede a indicar las medidas necesarias para el beneficio, por lo cual, al validar la disponibilidad de área disponible para el secadero, se indica que se debe ampliar dado que, hay unas plantas de café que debe arrancar, lo cual es aceptado por el beneficiario. Se hace la recomendación de descapotar el terreno.











MARITZA NINCO ROJAS
VEREDA: PRIMAVERA **BENEFICIO:** SECADERO DE CAFÉ **OBSERVACIONES:** Se realiza visita, se evidencia área disponible y apta para la construcción del beneficio, se realiza la recomendación de adecuar el terreno (retirar objetos en la zona de intervención y descapotar), adicionalmente la casa no queda a borde de carretera, por lo que se requiere trasiego aprox. (100mt).











WILDER RODRIGUEZ REYES

VEREDA: PRIMAVERA
BENEFICIO: CAMPO DE INFILTRACIÓN
OBSERVACIONES: Se realiza la visita al beneficiario, quien manifiesta que el sistema séptico que tienen construido se colapsa y en reiteradas ocasiones se tapa, por lo cual tuvieron que desunir las aguas grises del pozo, dando como resultado que lo único que llega el pozo son las aguas negras procedentes del sanitario, lo cual en el presente contrato repercute la posibilidad de su construcción dado que se cumplir con las garantías del contrato, por lo tanto, se requiere visita técnica de interventoría y la supervisión.















ANAIS VILLAREAL
VEREDA: PRIMAVERA **BENEFICIO:** SECADERO DE CAFÉ **OBSERVACIONES:** Se realiza la visita a la beneficiaria, se válida área disponible y apta para la construcción del beneficio, se hacen las recomendaciones de adecuar el terreno (descapotar y retirar los objetos en la zona de intervención), adicionalmente, la vivienda queda en una de las zonas más alejadas.








MARTHA PIEDAD CASTRO
VEREDA: CANOAS **BENEFICIO:** CAMPO DE INFILTRACIÓN **OBSERVACIONES:** Se realiza visita, la beneficiaria, manifiesta que el sistema séptico que tenían en uso colapso, por lo que tuvo que construir otro, sin embargo, no se tiene certeza que esté funcionando, razón por la cual se requiere realizar visita con la interventoría y la supervisión de la CAM.











CAROLINA VANEGAS ROJAS
VEREDA: CANOAS **BENEFICIO:** SISTEMA SÉPTICO COMPLETO DE AGUA RESIDUALES DOMESTICAS **OBSERVACIONES:** Se realiza visita, no se encuentra a la beneficiaria, sin embargo, mediante llamada telefónica se logra conversar con ella, asimismo, se observa que en la vivienda no se cuenta con la unidad sanitaria disponible, como se ve en la primera imagen eso es lo que hay (un lavadero artesanal y un sanitario), motivo por el cual se requiere realizar visita con la interventoría y la supervisión de la CAM para establecer viable la construcción del beneficio.




CAROLINA VANEGAS ROJAS
VEREDA: CANOAS

BENEFICIO: SECADERO DE CAFÉ

OBSERVACIONES: Se realiza visita, no se encuentra a la beneficiaria, sin embargo, mediante llamada telefónica se logra conversar con ella para concertar el área del beneficio de acuerdo a las medidas necesarias, por lo tanto, se le indica que debe ampliar el terreno, despejar de objetos presentes en el área a intervenir y descapotar.









PLANILLA DE APORTES

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32363942	E	2025-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.418.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32363942	2025-02-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 93020394	URUEÑA PALMA NEMECIO	1.423.500	F	X															0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	759.200	121.500	0	0	EPS-S PIJAOSALUD-EPSIC6	759.200	94.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	759.200	30.400	759.200	52.900	0,06960	759.200	15.200	22.800	0	0	01	0	337.700	N	5429001
2	CC 93399584	REINOSO MERCHAN OSCAR IVAN	4.000.000	F	X															0			17	17	17	17	COLFONDOS-231001	2.266.667	362.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.266.667	283.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.266.667	90.700	2.266.667	157.800	0,06960	2.266.667	45.400	68.100	0	0	01	0	1.008.100	N	5429001
3	CC 1075319804	ALMANZA GARCIA VALENTINA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	89.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	711.750	14.300	21.400	0	0	01	0	316.700	N	5429001
4	CC 1110544123	HERNANDEZ GUZMAN RICARDO	3.000.000	F	X															0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	EPS-S PIJAOSALUD-EPSIC6	1.700.000	212.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	1.700.000	34.000	51.000	0	0	01	0	755.900	N	5429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901898260	0	CONSORCIO OBRAS RURALES 2024	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 25 44 28		3182084563			CONSORCIORURALES2024@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-02	32363942	E	2025-02-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.418.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	32363942	2025-02-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.437.617	5.437.617	5.437.617	5.437.617	5.437.617

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	870.100	0	0	0	870.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	385.900	0	0	0	385.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	484.200	0	0	0	484.200
EPS(Administradoras: 3)				4	679.800	0	0	0	679.800
EPS-S PIJAOSALUD	EPSIC6	809008362	2	2	307.400	0	0	0	307.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	89.000	0	0	0	89.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	283.400	0	0	0	283.400
ARP(Administradoras: 1)				4	378.700	0	0	0	378.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	378.700	0	0	0	378.700
CCF(Administradoras: 1)				4	217.600	0	0	0	217.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	217.600	0	0	0	217.600
SENA(Administradoras: 1)				4	108.900	0	0	0	108.900
SENA	PASENA	899999034	1	4	108.900	0	0	0	108.900
ICBF(Administradoras: 1)				4	163.300	0	0	0	163.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	4	163.300	0	0	0	163.300
Gran Total					2.418.400	0	0	0	2.418.400
