
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
448		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$3.866.352,00	447CC
449		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4 SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESF	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.042.010,00	448CC
450		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4 SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$495.179,00	449CC
451		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$85.437.868,00	450CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
452		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$9.496.997,00	451CC
453		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$3.206.895,00	452CC
454		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.814.412,00	453CC
455		**SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 2**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$148.815.211,00**	
456		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$10.525.070,00	454CC
457		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$9.021.488,00	456CC

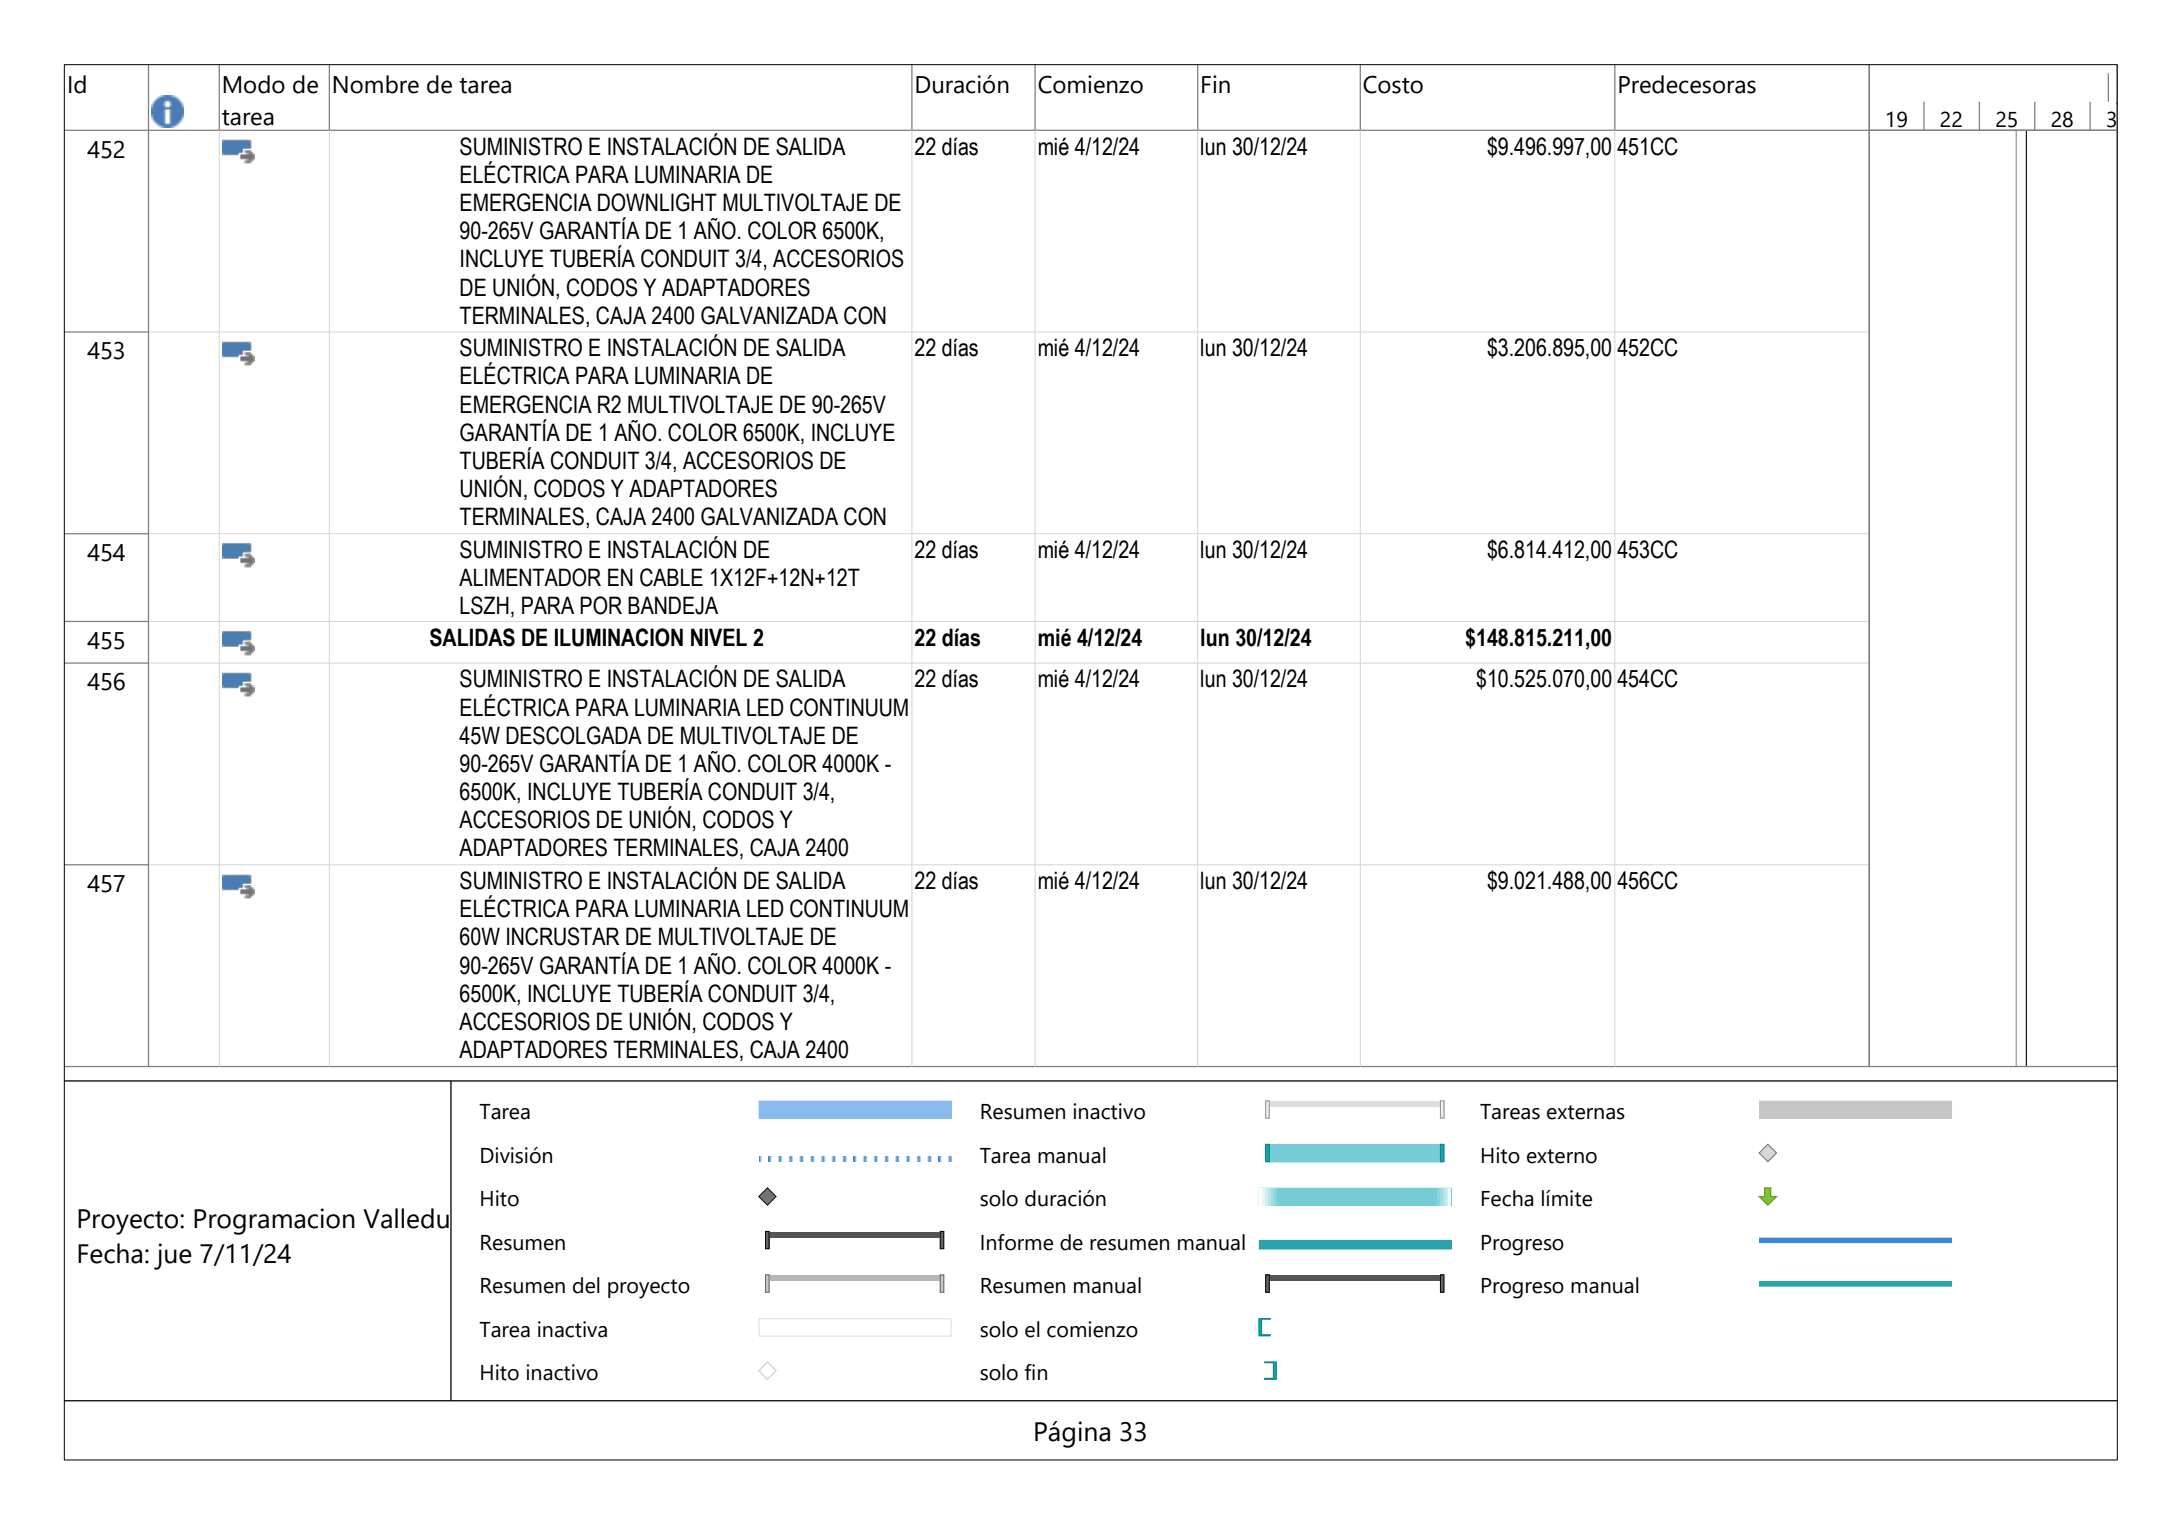

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
458		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALV	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.191.615,00	457CC
459		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.739.518,00	458CC
460		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$644.392,00	459CC
461		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$12.967.053,00	460CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
462		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$3.835.326,00	461CC
463		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$859.189,00	462CC
464		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4 SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESF	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$3.829.272,00	463CC
465		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4 SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$247.590,00	464CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
466		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$81.974.170,00	465CC
467		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$11.140.708,00	466CC
468		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.025.408,00	467CC
469		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.814.412,00	468CC
470		**SALIDAS DE ILUMINACION AUDITORIO**	**0 días**	**mié 4/12/24**	**mié 4/12/24**	**$0,00**	
471		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	469CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
472		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	471
473		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	472
474		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	473
475		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	474

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
476		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4 SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESF	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	475
477		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4 SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	476
478		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	477
479		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W EMERGENCIA INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 240	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	478

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

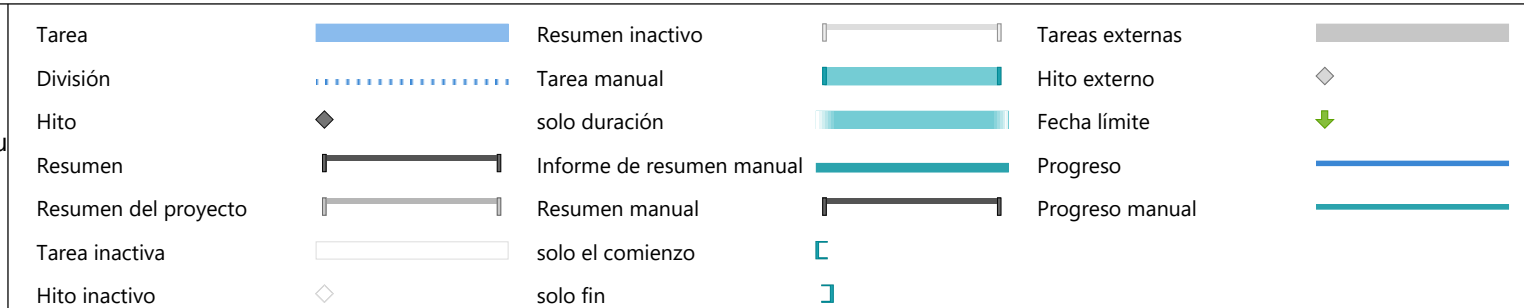


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
480		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	479
481		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	480
482		**ILUMINACIÓN**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$262.503.444,00**	
483		**ILUMINACIÓN NIVEL 1**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$119.543.345,00**	
484		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$55.316.515,00	469CC
485		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$31.151.319,00	484CC
486		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$7.533.600,00	485CC
487		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K -	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$621.192,00	486CC
488		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.654.136,00	487CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
489		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$5.385.385,00	488CC
490		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$13.258.496,00	489CC
491		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$3.622.702,00	490CC
492		**ILUMINACIÓN NIVEL 2**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$142.960.099,00**	
493		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$49.281.986,00	491CC
494		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$50.321.361,00	493CC
495		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$776.820,00	494CC
496		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.520.160,00	495CC
497		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K -	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$621.192,00	496CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
498		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$9.083.087,00	497CC
499		BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$9.317.483,00	498CC
500		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.196.752,00	499CC
501		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$15.553.236,00	500CC
502		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.288.022,00	501CC
503		**ILUMINACIÓN AUDITORIO**	**0 días**	**mié 4/12/24**	**mié 4/12/24**	**$0,00**	
504		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	502CC
505		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	504
506		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	505



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
507		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	506
508		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	507
509		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 30W DE EMERGENCIA INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	508
510		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	509
511		**SALIDAS DE TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL Y REGULADO**	**30 días**	**lun 25/11/24**	**lun 30/12/24**	**$157.757.242,00**	
512		**SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 1**	**30 días**	**lun 25/11/24**	**lun 30/12/24**	**$76.124.586,00**	
513		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$30.810.639,00	571CC+12 días
514		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$3.039.081,00	513CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
515		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$303.908,00	514CC
516		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI INTEMPERIE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$353.317,00	515CC
517		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$921.182,00	516CC
518		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$306.315,00	517CC

19 22 25 28 3


Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
519		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$614.122,00	518CC
520		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$6.330.953,00	519CC
521		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA PUERTA ELECTRICA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$758.365,00	520CC
522		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$1.228.243,00	521CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
523		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA CARGA VEHICULO ELÉCTRICO CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 1, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$379.182,00	522CC
524		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$15.680.983,00	523CC
525		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$6.814.412,00	524CC
526		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$3.398.224,00	525CC
527		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$5.185.660,00	526CC
528		**SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 2**	**30 días**	**lun 25/11/24**	**lun 30/12/24**	**$81.632.656,00**	
529		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$31.865.798,00	527CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
530		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$4.558.622,00	529CC
531		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$607.816,00	530CC
532		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$921.182,00	531CC
533		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$306.315,00	532CC



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
534		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$614.122,00	533CC
535		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$6.330.953,00	534CC
536		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$1.228.243,00	535CC
537		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA NEVERA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$307.061,00	536CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
538		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA HORNO MICROHONDAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$1.228.243,00	537CC
539		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA VENDING MACHINE CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$1.137.547,00	538CC
540		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$17.128.458,00	539CC
541		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$6.814.412,00	540CC
542		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH,	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$3.398.224,00	541CC
543		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	30 días	lun 25/11/24	lun 30/12/24	$5.185.660,00	542CC
544	✓	**SALIDAS TOMACORRIENTES AUDITORIO**	**0 días**	**lun 25/11/24**	**lun 25/11/24**	**$0,00**	

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
545		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	543CC
546		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	545
547		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	546
548		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	547



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
549		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	548
550		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	549
551		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	550
552		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA PUERTA AUTOMATICA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	551

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
553		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	552
554		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	553
555		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH,	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	554
556		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	$0,00	555
557		**BOMBA CONTRAINCENDIOS (BCI)**	**15 días**	**mié 11/12/24**	**lun 30/12/24**	**$91.870.581,00**	
558		TRANSFERENCIA RED CONTRAINCENDIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA RED CONTRAINCENDIOS CON TRANSFERENCIA A BASE DE INTERRUPTORES O	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$50.149.845,00	559CC
559		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N + 1/0AL T). DESDE TRANSFORMADOR AL TRANSFERENCIA DE BCI.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$13.611.244,00	560CC
560		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N + 1/0AL T). PLANTA ELÉCTRICA AL TRANSFERENCIA DE BCI.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$11.342.704,00	561CC
561		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N) + 2(2CU T). TRANSFERENCIA DE BCI A CONTROLADOR DE	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$8.372.741,00	562CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
562		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE APANTALLADO 4X16 AWG, INCLUYE	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$1.039.711,00	563CC
563		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$7.354.336,00	593CC
564		**CANALIZACIONES Y BANDEJA PORTACABLES**	**48 días**	**sáb 19/10/24**	**sáb 14/12/24**	**$308.550.913,00**	
565		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.	30 días	sáb 19/10/24	lun 25/11/24	$31.901.953,00	37
566		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.	30 días	mié 23/10/24	jue 28/11/24	$79.976.761,00	565CC+3 días
567		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.	30 días	sáb 26/10/24	lun 2/12/24	$31.901.953,00	566CC+3 días
568		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.	30 días	mié 30/10/24	mié 4/12/24	$79.976.761,00	567CC+3 días
569		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 12X4 CM PARA PUESTOS DE TRABAJO	30 días	vie 1/11/24	lun 9/12/24	$39.760.264,00	568CC+3 días
570		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1Ø1 EMT. INCLUYE: ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS, ADAPTADORES TERMINALES EMT, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MURO Y TECHO, ABRAZADERA DOBLE ALA DE 1 Y MARCACIÓN SEGÚN NORMAS	30 días	mié 6/11/24	mié 11/12/24	$29.987.990,00	569CC+3 días

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
571		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 20X20X15 METÁLICA. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	30 días	mar 12/11/24	sáb 14/12/24	$15.045.231,00	570CC+3 días
572		**TABLEROS ELECTRICOS**	**30 días**	**sáb 23/11/24**	**sáb 28/12/24**	**$312.545.757,00**	
573		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$81.754.469,00	571CC+11 días
574		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$70.366.957,00	573CC
575		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER DE 20A. TIN1	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$2.247.474,00	574CC
576		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 2 DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 9 BREAKER DE 20A. TIN2	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$2.162.167,00	575CC
577		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA AUDITORIO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X20A Y 7 BREAKER DE 20A.	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$2.038.227,00	576CC
578		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$6.353.309,00	577CC
579		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$6.337.955,00	578CC
580		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$10.780.481,00	579CC

19 22 25 28 3


Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
581		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE UPS – BYPASS 40 KVA SEGÚN	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$10.085.530,00	580CC
582		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 11 BREAKER DE 20A.	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$2.247.474,00	581CC
583		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 2 DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 16 BREAKER DE 20A.	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$3.336.710,00	582CC
584		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO AUDITORIO DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$3.192.666,00	583CC
585		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO PRINCIPAL . TAAEP	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$53.691.698,00	584CC
586	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS AUDITORIO. TAAAUD	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	$0,00	585CC
587	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE CONTROL PARA BOMBAS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE. TSUM	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	$0,00	585CC
588	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CUARTO DE BOMBAS DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A, 3 BREAKER DE 1X20A. Y 2 BREAKER DE 3X20A. TCBOM	0 días	sáb 23/11/24	sáb 23/11/24	$0,00	585CC
589		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES, AUTOMATICO DE 100 KVAR, 220VAC, CON MINIMO 15 PASOS, SENSIBILIDAD 4KVAR (DEFINIDOS POR EL PERFIL DE CARGA)	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$48.528.323,00	585CC

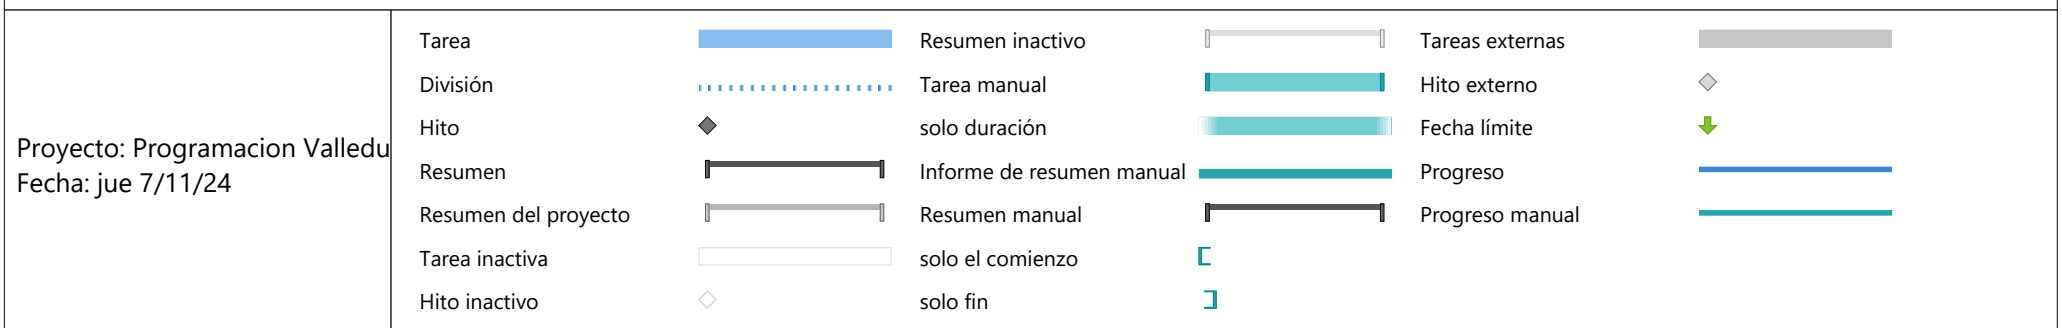

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
590		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE ASCENSORES.	30 días	sáb 23/11/24	sáb 28/12/24	$9.422.317,00	589CC
591		**ACOMETIDAS ELECTRICAS**	**15 días**	**mié 11/12/24**	**lun 30/12/24**	**$465.454.048,00**	
592		**BAJA TENSION**	**15 días**	**mié 11/12/24**	**lun 30/12/24**	**$275.491.463,00**	
593		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASE ENTRE TRANSFORMADOR POR BT Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD 7(3X500 KCMIL + 400KCMIL)AL + 2(400KCMIL) AL THWN 600V. INCLUIR INCIDENCIAS DE BORNAS	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$31.641.462,00	37FC+45 días
594		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ILUMINACIÓN NIVEL 1	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$1.628.196,00	593CC
595		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ILUMINACIÓN NIVEL 2	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.474.858,00	594CC
596		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE AUDITORIO	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	595CC
597		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 2/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES NIVEL 1	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$6.146.238,00	595CC
598		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0AL F + 4/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES NIVEL 2	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$11.211.419,00	597CC
599		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0AL F + 4/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES AUDITORIO	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	598CC
600		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 4/0 AL N + 2/0CU T. PARA TABLERO GENERAL RES REGULADA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$11.955.494,00	598CC



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
601		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 2/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO GENERAL CONTROL DE BOMBAS	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$7.375.486,00	600CC
602		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4AL F + 4AL N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE BOMBAS	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.369.225,00	601CC
603		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4(3X500AL F + 2/0AL N + 2/0CU T). PARA TABLERO AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$45.325.776,00	602CC
604		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X500AL F + 2/0AL N + 2/0CU T). PARA TABLERO AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO.	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	603CC
605		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6CU F + 6CU N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO NIVEL 1	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.362.034,00	603CC
606		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6CU F + 6CU N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO NIVEL 2	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.487.864,00	605CC
607		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2CU F + 2CU N + 2CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO AUDITORIO	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	606CC
608		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2AL F + 2AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ASCENSORES.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.695.016,00	606CC
609		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8CU F + 8CU N + 8CU T. PARA CONTROL DE ASCENSORES.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$1.527.825,00	608CC
610		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1Ø2, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$8.462.561,00	609CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
611		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1Ø3, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$10.043.806,00	610CC
612		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 4Ø4, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$34.958.179,00	611CC
613		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 2Ø4, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$11.722.370,00	612CC
614		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 7(3X500 KCMIL + 400KCMIL)AL + 2(400KCMIL) AL THWN 600V. DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD HASTA PLANTA. INCLUIR INCIDENCIAS DE BORNAS	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$79.103.654,00	613CC
615		**AIRES ACONDICIONADOS**	**15 días**	**mié 11/12/24**	**lun 30/12/24**	**$189.962.585,00**	
616		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA OCCIDENTAL UC-DX-RV-01EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 4 O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X150A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$17.710.295,00	571CC+27 días
617		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD INTERIOR RV-DX-01EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.537.479,00	616CC
618		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 1 ZONA OCCIDENTAL UC-DX-RV-02EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$14.490.242,00	617CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
619		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-02EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.537.479,00	618CC
620		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS PISO 1-2 OCCIDENTAL UC-DX-RV-03EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 40 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$5.952.592,00	619CC
621		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-03EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$5.259.206,00	620CC
622		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA MONITOREO SISTEMAS, ARCHIVO PSIO 1-2 UC-DX-RV-04EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 35 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$5.208.518,00	621CC
623		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-04EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$3.330.830,00	622CC
624		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA LOBBY PRINCIPAL UC-DX-RV-05EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 35 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$10.173.375,00	623CC




Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
625		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD MANEJADORA LOBBYEN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 65 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$7.802.026,00	624CC
626		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 1 ZONA ORIENTAL UC-DX-RV-06EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 30 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$8.508.841,00	625CC
627		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-06EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 67 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.833.518,00	626CC
628		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA ORIENTAL SUR UC-DX-RV-07EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 28 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$9.016.150,00	627CC
629		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES UC-DX-07EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 62 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.622.061,00	628CC
630		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA ORIENTAL NORTE UC-DX-RV-08EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 18 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X130A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$5.232.021,00	629CC



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
631		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-08EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 58 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.452.896,00	630CC
632		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS PISO 1-2 ORIENTAL UC-DX-RV-08EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 58 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$8.631.259,00	631CC
633		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-08EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.820.938,00	632CC
634		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION UPS NIVEL 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.114.566,00	633CC
635		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISIONEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.114.566,00	634CC
636		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION RACK PISO 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.537.479,00	635CC

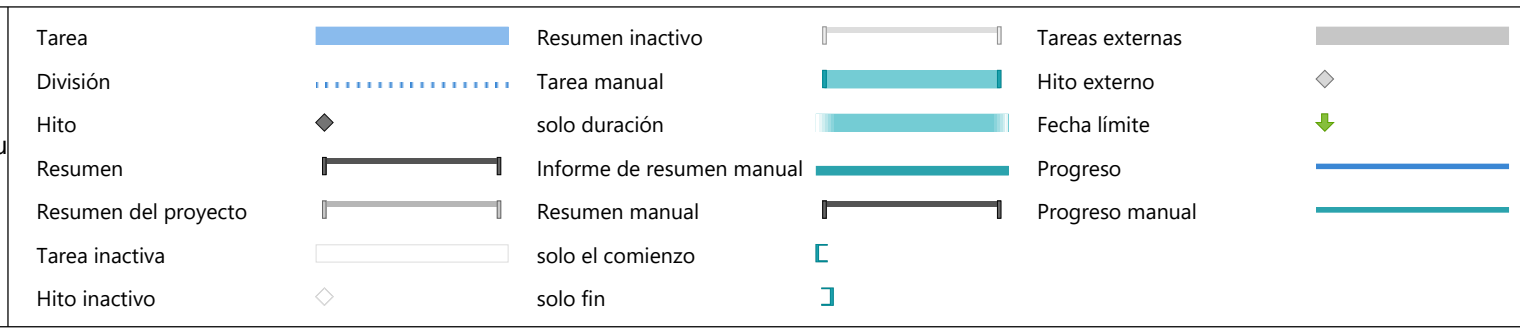


Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
637		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION RACK PISO 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$2.537.479,00	636CC
638		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION CUARTO TECNICO PISO 2EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.875.317,00	637CC
639		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION CUARTO TECNICO PISO 2EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$1.903.109,00	638CC
640		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION CUARTO RACK COMUNICACIONESEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.518.989,00	639CC
641		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION CUARTO RACK COMUNICACIONESEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.518.989,00	640CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
642		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO MUJERES PISO 1 UVE-TH-01EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.855.472,00	641CC
643		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO HOMBREES PISO 1 UVE-TH-02EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.855.472,00	642CC
644		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO MUJERES PISO 1 UVE-TH-03EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.855.472,00	643CC
645		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO 1 HOMBRES PISO 1 ZONA ORIENTAL -UVE-TH-04EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.855.472,00	644CC
646		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-05EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.046.227,00	645CC
647		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-06EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.450.850,00	646CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
648		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-07EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.450.850,00	647CC
649		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-08EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.450.850,00	648CC
650		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVS-01EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.450.850,00	649CC
651		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVS-02EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1O BANDEJA PORTACABLE Y	15 días	mié 11/12/24	lun 30/12/24	$4.450.850,00	650CC
652		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUX AUDITORIO UC-DX-RV-10EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 22 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	651CC
653		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD INTERIOR RV-DX-10EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	652
654		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUDITORIO 1 UC-DX-RV-11EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 28 METROS POR DUCTO IMC 4O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	653

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
655		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD AUDITORIO RV-DX-11EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 40 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	654
656		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUDITORIO 2 UC-DX-RV-12EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 25 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	655
657		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD AUDITORIO 2 RV-DX-12EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	656
658		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS AUDITORIOEN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 2O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X10A	0 días	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$0,00	657
659		**APANTALLAMIENTO**	**65 días**	**mar 24/09/24**	**lun 9/12/24**	**$40.028.005,00**	
660		PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO (ALTURA 100 CM	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$2.371.943,00	152
661		BASE MÓVIL DE ACERO GALVANIZADO PARA PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$1.515.651,00	660CC
662		ALAMBRÓN DE ALUMINIO D=8MM	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$4.153.302,00	661CC
663		SOPORTE PLÁSTICO PARA ALAMBRÓN	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$4.450.687,00	662CC
664	✓	CABLE DE COBRE 2/0 AWG	40 días	mar 24/09/24	sáb 9/11/24	$20.440.931,00	663CC-40 días
665		TUBERÍA PVC 3/4	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$67.281,00	664CC+40 días
666		TUBERÍA IMC 3/4”	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$1.029.158,00	665CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
667		GRAPA BIMETÁLICA	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$370.441,00	666CC
668		GRAPA UNIVERSAL	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$340.777,00	667CC
669		SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CONEXIÓN EN "T	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$331.119,00	668CC
670		CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM	25 días	mar 24/09/24	mié 23/10/24	$1.113.365,00	669CC-40 días
671		CAJA CONEXIÓN BIMETÁLICA 14X14:	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$185.220,00	670CC+40 días
672		VARILLA COPPERWELD 5/8"X2,44M	25 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24	$3.658.130,00	671CC
673		**ACOMETIDAS ELECTRICAS**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$14.793.240,00**	
674		ACOMETIDA DESDE TABLERO EXTRACCIÓN HASTA MAQUINAS DE EXTRACCIÓN EN CUBIERTA EN 3X10 CU FASES + 1X10 CU T	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.318.989,00	614CC-7 días
675		DUCTO EMT 1 PARA ACOMETIDAS DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN EN CUBIERTA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.921.782,00	674CC
676		DUCTO EMT 3/4 PARA SEÑAL DE CAMPAÑAS EXTRACTORAS Y PROCESSING CENTER	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.394.307,00	675CC
677		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$961.883,00	676CC
678		DUCTO EMT 2 PARA VERTICAL DE SEÑALES CAMPANAS EXTRACTORAS.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$558.364,00	677CC
679		SEÑAL MULTIFILAR PARA EXTRACCIÓN 4X16AWG	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.682.328,00	678CC
680		SEÑAL MULTIFILAR PARA EXTRACCIÓN DESDE PROGRESING HASTA TABLERO DE EXTRACCIÓN CUBIERTA 8X16 AWG.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$955.587,00	679CC
681		**SUBESTACION**	**100 días**	**mié 4/09/24**	**lun 30/12/24**	**$454.975.645,00**	
682		**OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: PUNTO DE CONEXIÓN**	**19 días**	**jue 5/12/24**	**sáb 28/12/24**	**$239.911.485,00**	

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
683		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15 KV, 3 X 185 MM2 DESDE PUNTO DE CONEXIÓN (POSTE PROYECTADO FRENTE AL PREDIO EN SEPARADOR) HASTA CELDA DE ENTRADA EN SUBESTACIÓN	19 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$81.250.553,00	680CC+2 días
684		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA Y SALIDA) SEGÚN NORMA CTS508 DOTADA CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTO A TIERRA), AISLADOS EN SF6 15KV 630 A, QUE PERMITE CONECTAR LOS CABLES	19 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$62.149.221,00	683CC
685		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA SF6 UNIDAD DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO HH, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN, CON TRES (3) FUSIBLES TIPO HH DE 40 AMP.	19 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$45.564.990,00	684CC
686		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN.	19 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$46.559.546,00	685CC
687		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15 KV, 3 X 95 MM2 DESDE CELDA HASTA TRANSFORMADOR DE 630 KVA	19 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$4.387.175,00	686CC
688		**OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUBESTACION**	**100 días**	**mié 4/09/24**	**lun 30/12/24**	**$215.064.160,00**	



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
689		TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INT 15 KV NO. 240 MM	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$3.604.586,00	687CC
690		TRAFO. 3F SECO CLASE F 630KVA 13200/208-120 V, INCLUYE SONDAS PT100	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$147.719.773,00	689CC
691		DPS EN TRANSFORMADOR 15KV-10KA	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.117.291,00	690CC
692		INTERFACE DE CONEXIÓN CON TRANSFORMADOR DE 2000A	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$18.075.875,00	691CC
693		PLATINA ESPECIAL 7 HUECOSTERMINAL BT TRANSFORMADOR	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$4.097.420,00	692CC
694		CANALIZACIÓN PVC 7Ø4 TDP SOBRE CARCAMO	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$7.970.261,00	693CC
695	✓	MALLA TIERRA SUBESTACION	20 días	mié 4/09/24	jue 26/09/24	$12.349.680,00	694CC-80 días
696	✓	CAMARA INSP. TIERRAS 0,3X0,3 M	20 días	mié 4/09/24	jue 26/09/24	$708.495,00	695CC
697		CONDUCTOR DE TIERRA TABLEROS Y/O EQUIPOS NO4/0 AWG CU	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.695.773,00	696CC+80 días
698		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE MEDIDAS 2000MM X 1500MM X 2300MM ; MEDIDAS APROXIMADAS A CONFIRMAR CON EL FABRICANTE DEL TRASNFORMADOR	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$15.236.195,00	697CC
699		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MARQUILLAS SEGÚN RETIE	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$999.014,00	698CC
700		PINTURA EPOXICA PARA INDICAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CUARTO DE CELDAS, TRASNFORMADOR Y PLANTA ELÉCTRICA	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.489.797,00	699CC
701		**PLANTA ELÉCTRICA**	**70 días**	**lun 7/10/24**	**lun 30/12/24**	**$679.678.353,00**	

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
702		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE SUPLENCIA TOTAL Y RED CONTRAINCENDIOS CON CAPACIDAD DE 630KVA ALTURA NIVEL DE VALLEDUPAR. PLANTA CERRADA, MOTOR CUMMINS Y ALTERNADOR STAMFORD O SIMILAR. NIVEL DE VOLTAJE DE GENERACIÓN 120-208V.	50 días	lun 7/10/24	vie 20/12/24	$664.460.482,00	700CC-50 días
703		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DE GASES DE PLANTA ELÉCTRICA	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$11.302.601,00	700CC
704		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRECALENTADOR DE CAMISAS PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 500KVA - 1000KVA	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.305.090,00	703CC
705		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA CONEXIÓN DE PRECALENTADOR, CARGADOR DE BATERÍAS, SEÑALES DE PLANTA.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$2.610.180,00	704CC
706	✓	**URBANISMO - OBRAS CIVILES PARA MT Y BT**	**60 días**	**jue 12/09/24**	**vie 22/11/24**	**$187.243.357,00**	
707	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 6Ø6 PVC	30 días	jue 12/09/24	jue 17/10/24	$98.200.729,00	717CC-70 días
708	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 4Ø6 PVC	30 días	jue 17/10/24	vie 22/11/24	$29.111.696,00	707CC+30 días
709	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA VEHICULAR	30 días	jue 12/09/24	jue 17/10/24	$42.258.302,00	708CC-30 días
710	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERIA 40X40 PARA RED REGULADA	30 días	jue 17/10/24	vie 22/11/24	$9.857.590,00	709CC+30 días
711	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 60X60X20.	30 días	jue 17/10/24	vie 22/11/24	$799.593,00	710CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
712		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE CONEXIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN SEGÚN NORMA LA228. INCLUYE DPS, BAJANTE EN TUBERÍA IMC DE 6 X 6 M, CONECTORES AMPAC, PUESTA A TIERRA, VARILLA COOPERWELD, CABLE DE COBRE 4 AWG BAJANTE 1/2 Y TODOS	30 días	jue 17/10/24	vie 22/11/24	$7.015.447,00	711CC
713		**CANALIZACION**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$55.058.138,00**	
714		**INFRAESTRUCTURA CIVIL**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$18.753.593,00**	
715		CAJA DE PASO PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30CMX30CM PARA CANALIZACIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN Y	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.455.872,00	614CC-7 días
716		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1 TDP	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.676.529,00	715CC
717		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA AP 10M. MATERIAL CONCRETO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$14.621.192,00	716CC
718		**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$36.304.545,00**	
719		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LUMINARIA.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.660.274,00	717CC
720		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3 X 10 + 10 CU, INCLUYE MARCACIÓN	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.697.940,00	719CC
721		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME EN GEL O RESINA PARA DERIVACIÓN DE AP.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.673.335,00	720CC
722		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED II 74W.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$21.505.145,00	721CC
723		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA DERIVACIÓN DESDE LUMINARIA Y HASTA CAJA AP MÁS CERCANA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.434.588,00	722CC
724		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LUMINARIA BRAZO SENCILLO 60CM	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.333.263,00	723CC
725		**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**	**23 días**	**mié 4/12/24**	**mar 31/12/24**	**$1.433.029.180,00**	

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
726		**CCTV - NIVEL 1 - NIVEL 2 - AUDITORIO**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$290.951.991,00**	
727		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8 Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$79.477.345,00	742CC
728		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CÁMARAS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾ O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$11.943.384,00	727CC
729		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$14.757.324,00	728CC
730		CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.644.424,00	729CC
731		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0 MM, 3 METROS, AMARILLO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$28.162.344,00	730CC
732		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO INTERIOR DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$23.026.517,00	731CC
733		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BALA DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$16.384.119,00	732CC
734		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO EXTERIOR DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$27.057.732,00	733CC


19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
735		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR IP NVR 16 CANALES	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$23.925.708,00	734CC
736		CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CCTV	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$11.769.838,00	735CC
737		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS PARA GRABACIÓN DE CCTV, 4TB DISEÑADOS PARA VIDEO VIGILANCIA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$14.560.403,00	736CC
738		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR GRADO INDUSTRIAL 49 LED, PARA CUARTO DE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$11.664.288,00	737CC
739		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADOR CORE I7, CON PUERTOS DE RED 1GBPS, LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO, TECLADO Y	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$21.578.565,00	738CC
740		**CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCES**	**23 días**	**mié 4/12/24**	**mar 31/12/24**	**$1.142.077.189,00**	
741		**CABLEADO ESTRUCTRUCTURADO NIVEL 1**	**23 días**	**mié 4/12/24**	**mar 31/12/24**	**$276.249.070,00**	
742		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8 Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$114.000.537,00	566CC+35 días
743		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$6.284.469,00	742CC
744		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$2.358.976,00	743CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
745		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$52.601.729,00	744CC
746		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾ O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$386.737,00	745CC
747		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$1.887.181,00	746CC
748		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$22.843.935,00	747CC
749		CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$9.022.429,00	748CC
750		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDI	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$1.740.314,00	749CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
751		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$19.011.952,00	750CC
752		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$22.641.088,00	751CC
753		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$12.464.659,00	752CC
754		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$5.445.488,00	753CC
755		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4 DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS	23 días	mié 4/12/24	mar 31/12/24	$5.559.576,00	754CC
756		**CABLEADO ESTRUCTRUCTURADO NIVEL 2**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$267.952.085,00**	
757		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8 Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$130.269.547,00	755CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
758		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.574.521,00	757CC
759		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$59.615.293,00	758CC
760		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾ O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$386.737,00	759CC
761		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.887.181,00	760CC
762		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$25.320.988,00	761CC
763		CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$9.791.783,00	762CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
764		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDI	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.063.526,00	763CC
765		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$11.618.415,00	764CC
766		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.966.489,00	765CC
767		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.232.329,00	766CC
768		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$5.445.488,00	767CC
769		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4 DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.779.788,00	768CC
770		**CABLEADO ESTRUCTRUCTURADO AUDITORIO**	**0 días**	**lun 30/12/24**	**lun 30/12/24**	**$0,00**	

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
771		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8 Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	769
772		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4 O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	771
773		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	772
774		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾ O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	773
775		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	774
776		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	775




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
777		CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	776
778		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4 DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	777
779		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	778
780		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	779
781		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	780
782		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	781
783		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4 DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	782
784		**EQUIPOS Y CONFIGURACIONES**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$552.737.174,00**	

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
785		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GX PARA SERVIDORES 42 UR, 800X1000 MM. MARCA: LINKEO, INCLUYE: PUERTA FRONTAL COMPLETA PERFORADA, PUERTA POSTERIOR COMPLETA PERFORADA, PANELES LATERALES, NIVELADORES, CABLES EQUITEPOTENCIALES, KIT ANTI INCLINACIÓN,	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$45.450.631,00	769CC
786		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PLANO HD 24 PUERTOS 1 U/UTP - F/UTP - S/FTP PARA CAT6 Y CAT 6A. MONTAJE QUICK-FIX (SIN TORNILLOS). (INCLUYE 24 JACK HD63 CAT 6A F/UTP - S/FTP PARA PATCH PANEL QUICK-FIX. 100% METÁLICO. AUTOPONCHABLE. Y 24 PATCH CORD V-S	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$50.882.680,00	785CC
787		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA AJUSTABLE VENTILADA 1 U, PARA GABINETE DE 800 MM DE PROFUNDIDAD	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$3.430.487,00	786CC
788		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU BÁSICA HORIZONTAL ENTRADA: 120V - 15A NEMA 5-15P, 8 SALIDAS NEMA 5-15R. INCLUYE SUPRESOR DE 13KA.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.972.941,00	787CC
789		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL TIPO CANAL CON PUERTA, 42 U, ANCHO 4, (KIT 2 UND)	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.489.947,00	788CC
790		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U DELANTERO - TRASERO ALTA CAPACIDAD CON TAPA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$26.672.086,00	789CC




Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
791		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK DE 1X19-1/4 QUE INCLUYE: 1 BARRAJE HORIZONTAL DE 1" X 4"; 1 PLACA DE EMPALME DE 3 CON DOS PERFORACIONES; 2 AISLADORES BLANCOS DELRIN; 2 TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 12-24 X 5/8; 2	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.396.787,00	790CC
792		MARQUILLAS	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$4.892.153,00	791CC
793		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE COMUNICACIONES	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$6.299.628,00	792CC
794		SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$769.082,00	793CC
795		LECTOR DE HUELLA PARA ENROLAMIENTO DE USUARIO, CONEXIÓN USB CON ESTACIÓN DE TRABAJO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.066.403,00	794CC
796		CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, Y PUESTA EN MARCHA	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$1.368.073,00	795CC
797		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA PARA ENROLAMIENTO DE TARJETAS , MIFARE, FELICA, NFC ISO 18092.	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.404.749,00	796CC
798		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 40 KVA ONLINE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$179.106.043,00	797CC
799		SUMINISTRO E INSTALACION, SWICHT DE ACCESO = 48-PUERTOS GIGABITETHERNET RJ45= 2-PUERTOS GIGABITETHERNET SFP+, = 200 GBPS (CAPACIDAD FULL-DUPLEX), SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DEFENSORIA,	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$115.884.806,00	798CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
800		SUMINISTRO E INSTALACION, ACCES POINT , BANDS DE FRECUENCIA 2,4 GHZ Y 5 GHZ (DUAL), ANCHO DE BANDA DEL CANAL 20 MHZ @ 2,4 GHZ 20/40/80 MHZ @ 5 GHZ, CAPACIDAD MÁXIMA DE USUARIOS = 400, ANTENA OBNIDIRECCIONAL. ALIMENTACIO POE	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$47.987.028,00	799CC
801		SUMINISTRO E INSTALACION, MODULO DE REGISTRO BIOMETRICO, TECNOLOGÍA INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA BIOSTAR 2 V2.7.0.50 (FABRICANTE SUPREMA PLATAFORMA EXISTENTE) SOPORTE DE LFD (LIVE FINGER DETECTION)	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$40.836.563,00	800CC
802		SUMINISTRO E INSTALACION,UNIDAD CENTRAL (SERVIDOR BIOSTAR 2) PARA CONTROL DE ACCESO, LICENCIAS SEGÚN	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$12.827.087,00	801CC
803		**BACKBONE DE FIBRA OPTICA**	**22 días**	**mié 4/12/24**	**lun 30/12/24**	**$45.138.860,00**	
804		CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, TIPO INTERIOR PARA CONEXIÓN DE CUARTOS TECNICOS NIVEL 1 A CUARTO TECNICO NIVEL	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$27.096.483,00	802CC
805		BANDEJA DE FIBRA OPTICA 1U, PARA CUATRO MODULOS DE 6 PUERTOS	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$5.995.499,00	804CC
806		MODULO FIBRA OPTICA (FO) LC - LC	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$7.175.201,00	805CC
807		PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC, L= 2,1 M	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.795.288,00	806CC
808		CERTIFICACIÓN DE FIBRA, MEDIANTE INSTRUMENTO CERTIFICADO/CALIBRADO	22 días	mié 4/12/24	lun 30/12/24	$2.076.389,00	807CC
809		**TELEFONIA**	**0 días**	**lun 30/12/24**	**lun 30/12/24**	**$0,00**	
810		SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE TELEFONO GRANDSTRING IP 2 LINEAS	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	807

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
811		SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE GXP 2160 GRANDSTREAM (TELEFONO IP DE 6 1 19 0 355,463.00 355,463 LINEAS HD)	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	810
812		SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PLATA IP CON TRONCAL DE OPERADOR DIGITAL PARA ENTRADA Y	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	810
813		**SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO**	**33 días**	**vie 22/11/24**	**mar 31/12/24**	**$3.268.673.734,00**	
814		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 408.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$99.602.144,00	853CC
815		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 456.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$102.695.139,00	814CC
816		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 216.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$99.923.320,00	815CC
817		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 264.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$53.678.608,00	816CC
818		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 360.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$171.853.954,00	817CC
819		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 480.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$205.110.248,00	818CC
820		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 384.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	$0,00	819CC
821		UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 312.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	$0,00	819CC



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
822		UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 76.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$57.687.194,00	819CC
823		UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 58.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$108.331.887,00	822CC
824		UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 54.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$62.447.994,00	823CC
825		UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$7.501.222,00	824CC
826		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$5.268.546,00	825CC
827		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$5.917.508,00	826CC
828		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$13.032.117,00	827CC
829		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 36.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$65.961.859,00	828CC

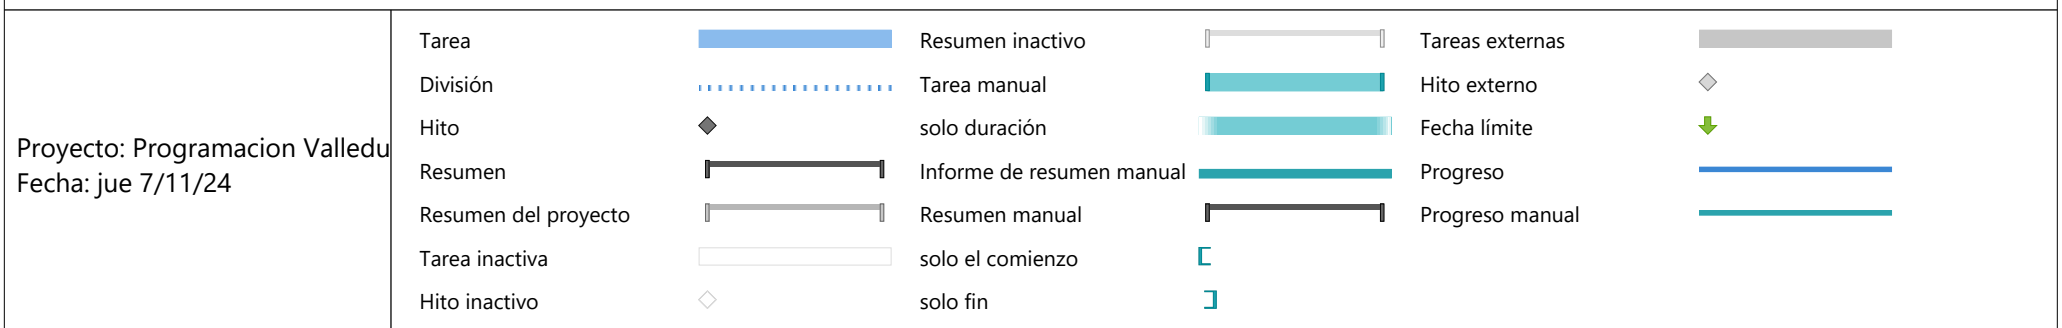

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
830		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$13.471.566,00	829CC
831		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE REDONDO PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$7.392.414,00	830CC
832		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$5.749.126,00	831CC
833		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$17.296.511,00	832CC
834		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$11.758.247,00	833CC
835		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$55.944.346,00	834CC
836		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$85.060.392,00	835CC
837		UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$11.399.987,00	836CC

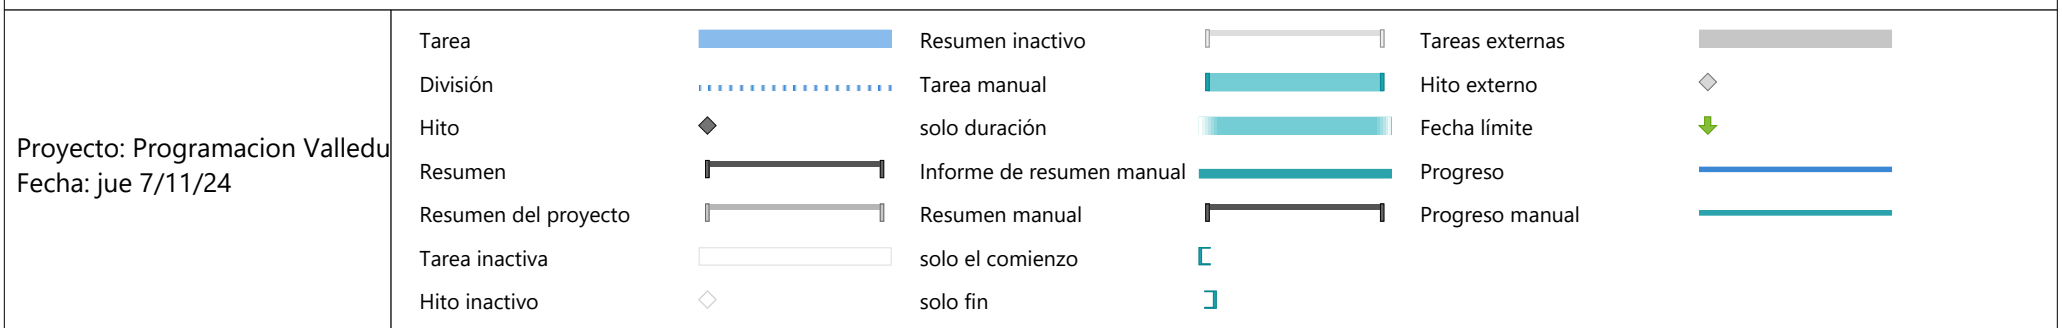

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
838		UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$16.942.730,00	837CC
839		UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$14.708.723,00	838CC
840		UNIDAD MANEJADORA PARA EXTERIOR DE 360.000 BTU/H CON 15.000 CFM, 208V/3PH/60HZ. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA ALAMBRICO	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$307.328.812,00	839CC
841		UNIDAD MANEJADORA PARA EXTERIOR DE 300.000 BTU/H CON 4.500 CFM, 208V/3PH/60HZ. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA ALAMBRICO	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	$0,00	840CC
842		UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN CON CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$107.524.702,00	840CC
843		UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$349.067.048,00	842CC
844		CAJA DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE CON DESCARGA HORIZONTAL PARA CAUDAL DE 4800 CFM @ 1" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$51.111.982,00	843CC
845		VENTILADOR DE TECHO PARA RECIRCULACIÓN DE AIRE ZONA LÚDICA DE TERRAZA	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$7.428.176,00	843CC
846		VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO PARA CAUDAL DE 1450 CFM @ 0,6" CDA,	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$117.348.575,00	845CC
847		VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO PARA CAUDAL DE 2650 CFM @ 0,6" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	$0,00	846CC
848		VENTILADOR JET LINE UVS-JL-150. 110V/1PH/60 HZ (SUMINISTRO DE AIRE)	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$11.593.473,00	846CC
849		VENTILADOR JET LINE UVE-JL-200. 110V/1PH/60 HZ (PARQUEADERO PRIVADO-BASURAS)	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$6.578.479,00	848CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
850		VENTILADOR CENTRIFUGO FALSO PLAFON DE 120 CFM Y CAIDA DE PRESIÓN DE 0,3 CDA. 110V/1PH/60 HZ. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$3.529.808,00	849CC
851		CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 24, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	20 días	vie 22/11/24	sáb 14/12/24	$214.886.587,00	37FC+28 días
852		CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 22, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	20 días	lun 25/11/24	mar 17/12/24	$23.171.009,00	851CC+2 días
853		CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 20, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$43.753.735,00	852CC+2 días
854		CAJA PORTAFILTRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 12 X 6. INCLUYE FILTRO LAVABLE DE 35% DE EFICIENCIA MERV 8 DE 12 X 6 X 1/2.	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$1.691.896,00	853CC
855		CAJA PORTAFILTRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 12 X 8. INCLUYE FILTRO LAVABLE DE 35% DE EFICIENCIA MERV 8 DE 12 X 8 X 1/2.	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$2.936.644,00	854CC
856		DUCTO EN LÁMINA DE POLISOCIANURATO DE 20 MM. INCLUYE SOPORTES Y MEDIOS DE SUJECIÓN, APLICACIÓN DE SELLANTES EN LAS UNIONES DE LOS DUCTOS Y APLICACIÓN DE SILICONA EN LA PARTE INTERNA EN LOS LATERALES DEL DUCTO	25 días	vie 22/11/24	vie 20/12/24	$150.107.268,00	851CC
857		DÁMPER INDUSTRIAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL	25 días	vie 22/11/24	vie 20/12/24	$7.663.181,00	858CC
858		AISLAMIENTO INTERNO PARA DUCTO EN AEROCOR DE ESPESOR DE 1”	25 días	vie 22/11/24	vie 20/12/24	$108.832.095,00	856CC
859		TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L Ø1/4. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	vie 22/11/24	sáb 14/12/24	$7.734.178,00	851CC
860		TUBO DE COBRE TIPO L Ø3/8 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	lun 25/11/24	mar 17/12/24	$19.764.868,00	859CC+2 días
861		TUBO DE COBRE TIPO L Ø1/2 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$16.418.811,00	860CC+2 días

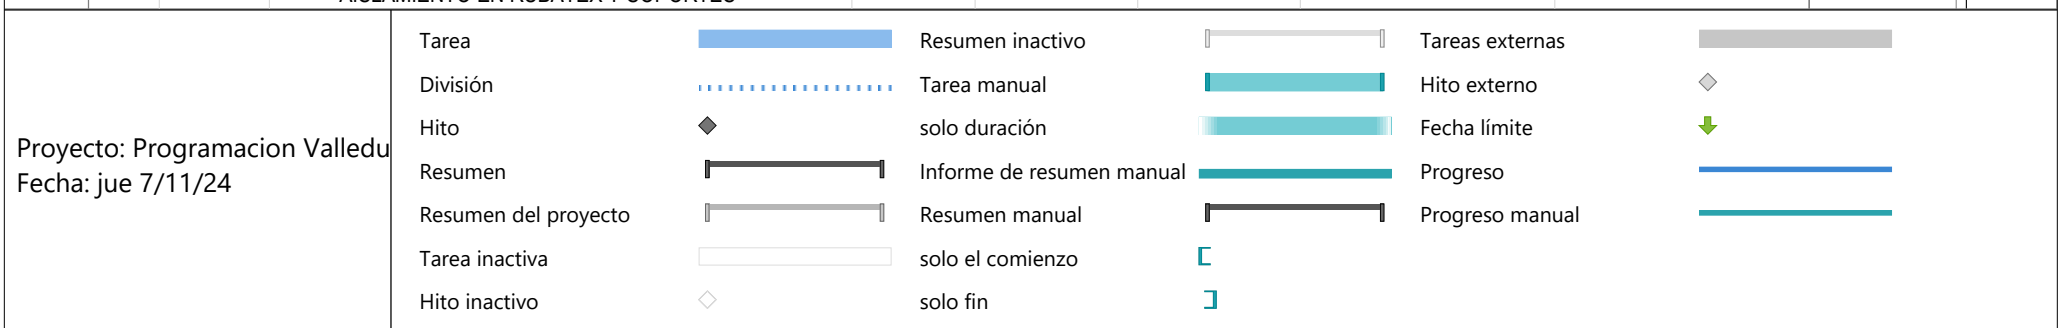

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
862		TUBO DE COBRE TIPO K Ø5/8 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	vie 29/11/24	sáb 21/12/24	$24.853.670,00	861CC+2 días
863		TUBO DE COBRE TIPO K Ø3/4 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	lun 2/12/24	mar 24/12/24	$32.060.339,00	862CC+2 días
864		TUBO DE COBRE TIPO K Ø7/8 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	mié 4/12/24	vie 27/12/24	$20.074.362,00	863CC+2 días
865		TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 1/8 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$23.196.109,00	864CC+2 días
866		TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 3/8 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	19 días	lun 9/12/24	mar 31/12/24	$18.709.919,00	865CC+2 días
867		TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 5/8 RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	17 días	mar 10/12/24	mar 31/12/24	$28.931.410,00	866CC+2 días
868		ACCESORIOS TUBERÍAS REFRIGERANTE VARIABLE	33 días	vie 22/11/24	mar 31/12/24	$47.317.990,00	859CC
869		KIT DE TUBERIA Y CONTROL PARA MANEJADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE (AIR HANDLING UNIT KIT)	33 días	vie 22/11/24	mar 31/12/24	$18.947.092,00	868CC
870		REFRIGERANTE R410A	33 días	vie 22/11/24	mar 31/12/24	$14.782.831,00	869CC
871		REFRIGERANTE R407C	33 días	vie 22/11/24	mar 31/12/24	$1.440.973,00	870CC
872		DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA ALTOS VOLÚMENES DE AIRE DE UN CONO Y DIÁMETRO DE 14	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$8.243.307,00	865CC
873		DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA ALTOS VOLÚMENES DE AIRE DE UN CONO Y DIÁMETRO DE 10	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24	$0,00	872CC
874		DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 15X15	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.953.633,00	872CC
875		DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 12X12	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$26.697.330,00	874CC
876		DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 9X9	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$2.909.452,00	875CC


19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
877		DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 6X6	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$195.275,00	876CC
878		DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 4X4	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.518.892,00	877CC
879		REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER ALETAS OPUESTAS DE 40X20	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24	$0,00	880CC
880		REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 40X20	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$2.740.781,00	878CC
881		REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 36X16	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$510.927,00	880CC
882		REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 32X14	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24	$0,00	881CC
883		REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 30X16	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.843.084,00	881CC
884		REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 24X16	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$3.015.710,00	883CC
885		REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 14X14	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$437.379,00	884CC
886		REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 12X12	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$193.867,00	885CC
887		REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 10X10	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.327.793,00	886CC
888		REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 8X8	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$4.553.710,00	887CC
889		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 20X6 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$418.187,00	888CC
890		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 16X6 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$176.850,00	889CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
891		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 8X6 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$396.970,00	890CC
892		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 12X8 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$1.237.950,00	891CC
893		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 12X6 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$481.801,00	892CC
894		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 10X6 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$899.115,00	893CC
895		REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 36X16 CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24	$0,00	894CC
896		TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. TODOS LOS INTERRUPTORES, BREAKERS Y DEMÁS EN MARCA LG O SIEMENS	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24	$0,00	894CC
897		CONTROL ALAMBRADO PARA FAN COIL DUCTO DE REFRIGERANTE VARIABLE	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$2.723.595,00	901CC
898		SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO REFRIGERANTE VARIABLE	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$6.889.621,00	901CC
899		TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIC	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$33.873.790,00	894CC
900		TUBERIA IMC 3/4, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIO	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$26.700.007,00	899CC
901		CABLE DE COMUNICACIÓN BLINDADO APANTALLADO DE 2X18	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$19.082.100,00	899CC
902		PUESTA EN MARCHA Y BALANCEO DEL SISTEMA	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$32.130.804,00	898CC
903		**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**	**59 días**	**mar 22/10/24**	**mar 31/12/24**	**$591.401.728,00**	
904		**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**	**59 días**	**mar 22/10/24**	**mar 31/12/24**	**$522.560.687,00**	


Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
905		EXCAVACIÓN MECANICA	20 días	mar 22/10/24	vie 15/11/24	$34.264.525,00	37FC+2 días
906		MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN RAJÓN	20 días	lun 28/10/24	jue 21/11/24	$17.184.922,00	905CC+5 días
907		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (NT 2000)	20 días	vie 1/11/24	mié 27/11/24	$11.795.849,00	906CC+5 días
908		RELLENO EN SUB-BASE (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y	20 días	vie 8/11/24	mar 3/12/24	$32.823.326,00	907CC+5 días
909		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON M.R.40 KG/CM2 (INCLUYE ACERO DE ANCLAJE Y DE TRANSMISION DE CARGA)	15 días	jue 21/11/24	lun 9/12/24	$172.574.868,00	910CC+5 días
910		ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	20 días	vie 15/11/24	lun 9/12/24	$218.889.667,00	908CC+5 días
911		SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10	20 días	mié 27/11/24	jue 19/12/24	$18.944.718,00	909CC+5 días
912		PINTURA DEMARCACIÓN ESPACIOS PARQUEO, ANCHO 10CM. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS	19 días	lun 9/12/24	mar 31/12/24	$3.722.809,00	909
913		PINTURA DEMARCACIÓN. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	19 días	lun 9/12/24	mar 31/12/24	$2.423.521,00	909
914		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE E=0,10 M; DE ALTURA PROMEDIO 2,00	30 días	lun 28/10/24	mar 3/12/24	$9.936.482,00	905CC+5 días
915		**CUARTO BASURAS**	**22 días**	**jue 5/12/24**	**mar 31/12/24**	**$68.841.041,00**	
916		EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$433.341,00	911CC+7 días
917		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$549.461,00	916CC
918		CONCRETO 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25X0.30MT	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$1.302.683,00	922CC




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
919		CONCRETO 21 MPA PARA ZAPATA	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$680.650,00	921CC
920		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLAD	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$109.566,00	917CC
921		ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$2.034.559,00	920CC
922		CONCRETO 21 MPA PARA PEDESTALES	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$511.433,00	919CC
923		CONCRETO 21 MPA PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	18 días	vie 6/12/24	sáb 28/12/24	$4.841.347,00	924CC+2 días
924		MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	20 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	$1.398.596,00	918CC
925		ACERO DE REFUERZO PARA CUARTO	18 días	vie 6/12/24	sáb 28/12/24	$15.668.355,00	918CC+2 días
926		MURO EN BLOQUE EN CONCRETO, DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4.	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$3.282.147,00	923CC
927		DOVELA EN GROUTING PARA BLOQUE DE 0.10M X 0.20M X 0.40M INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$2.045.914,00	926CC
928		CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DINTEL DE 0.10M X 0.10M, INCLUYE REFUERZO	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$1.213.184,00	927CC
929		CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA SOBRE MAMPOSTERIA, INCLUYE REFUERZO	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$5.147.700,00	925CC
930		PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$3.295.661,00	926CC
931		PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 EN MUROS EXTERIORES	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$968.894,00	930CC
932		ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR	18 días	mar 10/12/24	mar 31/12/24	$3.873.528,00	930CC+2 días
933		ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR PARA FILOS Y DILATACIONES	18 días	mar 10/12/24	mar 31/12/24	$428.114,00	931CC+2 días
934		IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	20 días	vie 6/12/24	mar 31/12/24	$1.929.230,00	929CC
935		VENTANA EN ALUMINIO - PORTERIA (1.5+0.82)X(1.2	18 días	mar 10/12/24	mar 31/12/24	$1.957.635,00	931CC+2 días



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
936		VENTANA EN ALUMINIO - WC PORTERIA (0.60)X(0.6	18 días	mar 10/12/24	mar 31/12/24	$447.825,00	931CC+2 días
937		SANITARIO PARA PORTERIA (REF: ECOCLEAN SINGLE)	10 días	mié 18/12/24	mar 31/12/24	$862.791,00	936FF
938		LAVAMANOS DE PEDESTAL PARA PORTERIA. INCLUYE GRIFERIA (REF: AVANTI CON PEDESTAL	10 días	mié 18/12/24	mar 31/12/24	$665.364,00	937FF
939		PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.00X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGÚN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA MARCA YALE DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	$2.759.626,00	931CC+2 días
940		PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.80X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA MARCA YALE DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	10 días	mar 10/12/24	vie 20/12/24	$4.880.525,00	931CC+2 días
941		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS DE 40 X 15 X 10	10 días	lun 9/12/24	jue 19/12/24	$5.152.979,00	909
942		LOSETA TOPEROL DE 0.20 X 0.20 PARA ANDEN	10 días	mié 11/12/24	lun 23/12/24	$536.610,00	941CC+3 días
943		BOLARDOS PROTECTORES TIPO M60 O SIMILAR EMPOTRADO EN CONCRETO	10 días	sáb 14/12/24	vie 27/12/24	$1.863.323,00	942CC+3 días
944		**ANDENES Y PLAZOLETAS**	**24 días**	**lun 2/12/24**	**lun 30/12/24**	**$484.840.051,00**	
945		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	20 días	lun 2/12/24	mar 24/12/24	$99.266.706,00	37FC+36 días
946		LOSETA PREFABRICADA 40X40	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$134.896.642,00	948CC
947		CINTA EN CONCRETO	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$19.009.567,00	946CC
948		CONCRETO 21 MPA PARA LOS DE CONTRA PISO, ANDEN Y RAMPA E= 0.1MT	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$145.209.350,00	949CC+2 días



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
949		MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPI	20 días	mié 4/12/24	vie 27/12/24	$32.953.250,00	945CC+2 días
950		SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10	20 días	mié 4/12/24	vie 27/12/24	$5.118.722,00	945CC+2 días
951		BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80	20 días	mié 4/12/24	vie 27/12/24	$11.457.860,00	945CC+2 días
952		ESCALERA EN CONCRETO. INCLUYE DOS ESCALONES (SEGÚN DISEÑO)	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$5.214.437,00	948CC
953		SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) (EMPRADIZACION)	0 días	lun 9/12/24	lun 9/12/24	$0,00	961CC+2 días
954		SUMINISTROS Y SIEMBRA DE PALMA REAL DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	959
955		SUMINISTROS Y SIEMBRA DE OLIVO NEGRO DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	959
956		SUMINISTROS Y SIEMBRA DE CAÑAGUATE DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	959
957		SUMINISTROS Y SIEMBRA DE COTOPRIX DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	959
958		SUMINISTROS Y SIEMBRA DE MANGO DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	959
959		CONTENEDOR DE RAICES DE 1.20MX1.20MX1.40M. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA.	0 días	mié 4/12/24	mié 4/12/24	$0,00	945CC+2 días
960		CARCAMO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE LONGITUD=8.60M, ANCHO=1.00M, ALTURA VARIABLE, INCLUYE REJILLA PARA PLAZOLETA.	18 días	jue 5/12/24	vie 27/12/24	$5.476.731,00	961CC

19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
961		SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU ESPESOR 1.5, ANCHO 0.60, LARGO VARIABLE (COLORES DE REFERENCIA)	20 días	jue 5/12/24	lun 30/12/24	$26.236.786,00	948CC
962		**CERRAMIENTO**	**40 días**	**lun 2/09/24**	**jue 17/10/24**	**$235.117.096,00**	
963		EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO	30 días	lun 2/09/24	vie 4/10/24	$3.600.374,00	961CC-82 días
964		CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO	30 días	mié 4/09/24	lun 7/10/24	$19.307.141,00	963CC+2 días
965		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA PARA CIMIENTO	30 días	jue 5/09/24	mié 9/10/24	$90.672.568,00	964CC+2 días
966		CONCRETO 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO	30 días	lun 9/09/24	vie 11/10/24	$21.843.977,00	965CC+2 días
967		CONCRETO 21 MPA PARA COLUMNETAS DE 0.25M X 0.25M	30 días	mar 10/09/24	mar 15/10/24	$6.639.809,00	966CC+2 días
968		CERRAMIENTO METALICO TUBULAR H:2.00, SEGÚN DISEÑO	30 días	jue 12/09/24	jue 17/10/24	$93.053.227,00	967CC+2 días
969		**SEÑALIZACION**	**7 días**	**vie 20/12/24**	**lun 30/12/24**	**$20.472.000,00**	
970		AVISO DE 2.50X3,00 LOGO, LETRAS ARMADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304 CALIBRE 18 CON CANTONERA DE 5 CENTÍMETROS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$20.472.000,00	214CC+10 días
971		SEÑALES DE 12X15 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO, TEXTO INCLUSIVO EN BRAILLE, DILATADORES EN ACERO.	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$0,00	970CC
972		SEÑALES DE 25X13 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, TEXTO INCLUSIVO EN BRAILLE, DILATADORES EN ACERO.	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$0,00	971CC

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
973		SEÑALES DE 20X30 CENTÍMETROS, (PUNTO DE ENCUENTRO Y GABINETE DE INCENDIOS) EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, DILATADORES EN ACERO.	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$0,00	972CC
974		SEÑALES DE 25X13 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, INSTALADAS AL TECHO CON TUBOS Y ACCESORIOS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$0,00	973CC
975		SEÑALES DE 100X0.40 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 6 M.M	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$0,00	974CC
976		LÍNEAS DE 20 CENTÍMETROS CON EL LOGO EN CORTE EN VINILO FROSTED	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$0,00	975CC
977		**SISTEMA PANELES SOLARES**	**0 días**	**lun 30/12/24**	**lun 30/12/24**	**$0,00**	
978		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR DE 580 WP	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
979		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÉTALICA PARA FIJACIÓN DE 10 PANELES SOLARES	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	152CC+58 días
980		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAR CONECTADO A LA RED DE 15 KW TRIFÁSICO	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
981		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN EL LADO DE CORRIENTE CONTINUA (CC) PARA 10 PANELES HASTA INVERSOR	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
982		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN EL LADO DE CORRIENTE ALTERNA (CA) PARA INVERSOR DE 10 KW	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
983		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL PROYECTADO	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
984		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA (POLO) A TIERRA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
985		CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
986		LEGALIZACIÓN DE SISTEMA SOLAR EN MODALIDAD AGPE SEGÚN LA RESOLUCIÓN CREG 174 DE 2021	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	979
987		**DOTACION**	**7 días**	**vie 20/12/24**	**lun 30/12/24**	**$654.071.977,00**	
988		PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS EN L CON CAJONERA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$168.419.367,00	214CC+10 días
989		PUESTO CONTROL DE ACCESO PISO 1	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.570.011,00	988CC
990		PUESTOS DE TRABAJO OFICINA CORRESPONDENCIA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.911.260,00	989CC
991		MESAS PARA CAMERINOS MUJERES Y HOMBRES	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	$0,00	990CC
992		PUESTO ACCESO A PARQUEADERO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.243.851,00	990CC
993		PUESTO CONTROL DE ACCESO PISO 2	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.765.851,00	992CC
994		PUESTOS DE TRABAJO SALA DE MONITOREO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$4.366.887,00	993CC
995		PUESTOS DE TRABAJO PASANTES	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$10.141.004,00	994CC
996		PUESTOS DE CONSULTA BIBLIOTECA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$15.018.510,00	995CC
997		PUESTO CONTROL ACCESO BIBLIOTECA SALA VIRTU	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.097.813,00	996CC
998		PUESTO ENFERMERIA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$856.253,00	997CC
999		PUESTO DE TRABAJO DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.174.951,00	998CC
1000		PUESTOS DE TRABAJO CUARTO DE CONTROL AUDITORIO PISO 2	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	$0,00	999CC
1001		PUESTOS DE TRABAJO RECEPCION AUDITORIO Y CENTRO DE CONCILIACION	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$12.708.870,00	999CC
1002		PUESTOS DE TRABAJO RECEPCION Y REGISTRO - RUP HALL PRINCIPAL PISO 1	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$32.233.100,00	1001CC
1003		MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS CUADRADA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$834.293,00	1002CC
1004		MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS ORGANICA O REDONDA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$4.171.465,00	1003CC


19 22 25 28 3

Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1005		MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONAS RECTANGU	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$12.186.678,00	1004CC
1006		MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS RECTANGULAR CON BASES ENTAMBORADAS -	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$4.536.829,00	1005CC
1007		BARRA CAFETIN EMPLEADOS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.828.261,00	1006CC
1008		MESA CAFETIN EMPLEADOS Y TERRAZA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$6.586.504,00	1007CC
1009		BARRA ALTA PARA CAFETIN 3.50 MTS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$6.706.299,00	1008CC
1010		BARRA ALTA PARA CAFETIN 4.40 MTS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$6.768.983,00	1009CC
1011		MUEBLE PARA MICROONDAS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.844.731,00	1010CC
1012		ESTANTERIAS PARA BODEGAS Y ARCHIVO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$18.790.280,00	1011CC
1013		BIBLIOFIJOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIBROS EN BIBLIOTECA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$20.420.101,00	1012CC
1014		MESAS INFANTILES PARA LUDOTECA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.424.710,00	1013CC
1015		SILLAS INFANTILES PARA LUDOTECA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.889.440,00	1014CC
1016		CORRAL BEBES CON COLCHON PARA LUDOTECA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$3.335.553,00	1015CC
1017		SOFA SALA DE ESPERA PARA LUDOTECA-LACTANCIA-CONDUCTORES-EXTERNA DEFENSOR	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$6.629.088,00	1016CC
1018		POLTRONA SALA DE ESPERA EXTERNA DEFENSOR	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.231.362,00	1017CC
1019		MESA DE CENTRO SALA DE ESPERA PARA LUDOTECA-CONDUCTORES-EXTERNA DEFENSOR	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.711.053,00	1018CC
1020		ALMACENAMIENTO AREA MATERNIDAD	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.766.586,00	1019CC
1021		CAMILLA Y ESCALERA 2 PASOS PARA ENFERMERIA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$602.753,00	1020CC
1022		LOCKERS PARA VESTIR MUJERES Y HOMBRES	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$3.061.236,00	1021CC
1023		BANCAS PARA VESTIR MUJERES Y HOMBRES	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$531.444,00	1022CC
1024		ARCHIVO RODANTE AREA DE ARCHIVO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$16.203.190,00	1023CC


Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1025		SILLA GIRATORIA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBL	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$3.174.224,00	1024CC
1026		POLTRONA INTERLOCUTORA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.628.620,00	1025CC
1027		POLTRONA SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.006.054,00	1026CC
1028		SOFA SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$3.644.751,00	1027CC
1029		MESAS DE CENTRO SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$1.381.653,00	1028CC
1030		CREDENZA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.760.468,00	1029CC
1031		CREDENZA SECRETARIA DEFENSOR DEL PUEBLO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.760.468,00	1030CC
1032		SILLA OPERATIVA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$62.368.718,00	1031CC
1033		SILLA INTERLOCUTORA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$51.633.689,00	1032CC
1034		SILLA PARA SALAS DE JUNTAS Y OTROS	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$67.929.840,00	1033CC
1035		SILLA ALTA PARA RECEPCIONES	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$3.907.988,00	1034CC
1036		BUTACOS PARA BARRA CAFETIN EMPLEADOS Y ACCESO AUDITORIO	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$2.802.900,00	1035CC
1037		TANDEM 2 PUESTOS SALAS DE ESPERA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$3.336.924,00	1036CC
1038		TANDEM 3 PUESTOS SALAS DE ESPERA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$7.361.728,00	1037CC
1039		TANDEM 4 PUESTOS SALAS DE ESPERA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$12.624.510,00	1038CC
1040		SILLAS AULA MULTIPLE	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$12.009.800,00	1039CC
1041		SILLAS PARA AUDITORIO	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	$0,00	1040CC
1042		SILLAS PARA CAFETINES	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$6.313.600,00	1040CC
1043		BUTACO ALTO PARA BARRAS EN TERRAZA	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$7.957.865,00	1042CC
1044		SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCANSA PIES	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$11.602.570,00	1043CC



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1045		S/I TELEVISOR DE 55	7 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24	$5.297.040,00	1044CC
1046		**TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS, SERVICIOS PUBLICOS Y CERTIFICADO RETIE Y RETILAP**	185 días	lun 27/05/24	mar 31/12/24	$31.946.688,00	2
1047		**PGIO**	185 días	lun 27/05/24	mar 31/12/24	$59.217.983,00	2
1048		**PAPSO**	0 días	lun 27/05/24	lun 27/05/24	$0,00	2
1049		**ACTA DE TERMINACION DEL PROYECTO**	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	$0,00	1045



Proyecto: Programacion Valledu
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01

CONTRATO No:	LIC-4-2023
CONTRATANTE:	DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL, representado por Adrián Eduardo Mafioli Petro
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.
VALOR:	VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($22.800.001.058,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	24 DE OCTUBRE DE 2024

En la Sede de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2024, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La supervisora del contrato LIC-4-2023 **DIANA MARRUGO OTERO**, el Interventor de la Obra **JVM INGENIERA S.A.S. BIC** Representado por **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y el Contratista **CONSORCIO EDIFICACIONES ARL** Representado por **ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO** con el propósito de modificar las cantidades de algunos ítems que hacen parte del presupuesto de obra del contrato mencionado.

Los ítems que se detallan en el cuadro a continuación, son aquellos que presentan variación con respecto a las cantidades obra del presupuesto oficial, esto de acuerdo al replanteo y mediciones realizadas por el contratista e interventor, esto motiva a la modificación sin generar variación en el alcance contractual.

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
Contrato No.: LIC-4-2023
Fecha: octubre 24 de 2024

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
		CONSTRUCCION Y DOTACION										
	1.00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
4	1.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	297.30	$ 137,282.00	$ 40,813,939.00		$ -	85.60	$ 11,751,339.00	211.70	$ 29,062,599.00
5	1.04	DEMOLICION CUNETA EXISTENTE	M	71.70	$ 24,024.00	$ 1,722,521.00		$ -	48.95	$ 1,175,975.00	22.75	$ 546,546.00
7	1.06	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UND	7.00	$ 1,184,080.00	$ 8,288,560.00		$ -	4.00	$ 4,736,320.00	3.00	$ 3,552,240.00
8	1.07	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	4,412.00	$ 5,936.00	$ 26,189,632.00		$ -	11.00	$ 65,296.00	4,401.00	$ 26,124,336.00
9	1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	300.00	$ 31,916.00	$ 9,574,800.00	81.00	$ 2,585,196.00		$ -	381.00	$ 12,159,996.00
	3.00	**EDIFICACION - MODULO A**										
	3.01	**CIMIENTOS**										
12	3.01.01	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	177.78	$ 33,450.00	$ 5,946,741.00	165.16	$ 5,524,602.00		$ -	342.94	$ 11,471,343.00
13	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	KG	14,603.09	$ 9,856.00	$ 143,928,055.00		$ -	728.98	$ 7,184,827.00	13,874.11	$ 136,743,228.00
14	3.01.03	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.60MTS	ML	48.60	$ 246,993.00	$ 12,003,860.00		$ -	48.60	$ 12,003,860.00		$ -
16	3.01.05	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS	ML	355.35	$ 327,813.00	$ 116,488,350.00	36.65	$ 12,014,346.00		$ -	392.00	$ 128,502,696.00
17	3.01.06	CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	M3	60.25	$ 831,197.00	$ 50,079,619.00		$ -	0.45	$ 374,039.00	59.80	$ 49,705,581.00
18	3.01.07	CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	12.08	$ 888,250.00	$ 10,730,060.00		$ -	12.08	$ 10,730,060.00	-	$ -
19	3.01.08	CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	M2	1,559.87	$ 145,530.00	$ 227,007,881.00		$ -	13.45	$ 1,957,379.00	1,546.42	$ 225,050,503.00
21	3.01.10	MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	5,611.88	$ 9,109.00	$ 51,118,615.00	507.12	$ 4,619,356.00		$ -	6,119.00	$ 55,737,971.00
22	3.01.11	CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA	M	1,012.84	$ 5,408.00	$ 5,477,439.00	186.04	$ 1,006,104.00		$ -	1,198.88	$ 6,483,543.00
23	3.01.12	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO	M3	371.77	$ 61,803.00	$ 22,976,501.00		$ -	92.76	$ 5,732,846.00	279.01	$ 17,243,655.00
	3.02	**ESTRUCTURAS**										
24	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	19,424.67	$ 9,856.00	$ 191,449,548.00		$ -	0.01	$ 99.00	19,424.66	$ 191,449,449.00
27	3.02.04	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS	ML	239.22	$ 443,276.00	$ 106,040,485.00	55.13	$ 24,437,806.00		$ -	294.35	$ 130,478,291.00
28	3.02.05	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS	ML	24.75	$ 499,483.00	$ 12,362,204.00	3.15	$ 1,573,371.00		$ -	27.90	$ 13,935,576.00
29	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	KG	41,620.90	$ 9,856.00	$ 410,215,590.00		$ -	561.47	$ 5,533,848.00	41,059.43	$ 404,681,742.00
30	3.02.07	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE PISO 2; RELACION 0,229 M3/M2, FORMALETA Y CASETON	M2	1,217.80	$ 500,398.00	$ 609,384,684.00		$ -	10.44	$ 5,224,155.00	1,207.36	$ 604,160,529.00
31	3.02.08	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA; RELACION 0,223 M3/M2, FORMALETA Y CASETON	M2	1,546.60	$ 525,765.00	$ 813,148,149.00		$ -	53.35	$ 28,049,563.00	1,493.25	$ 785,098,586.00
32	3.02.09	MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO	KG	9,959.20	$ 9,109.00	$ 90,718,353.00	1,012.80	$ 9,225,595.00		$ -	10,972.00	$ 99,943,948.00
33	3.02.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA	KG	474.21	$ 9,856.00	$ 4,673,814.00	12.61	$ 124,284.00		$ -	486.82	$ 4,798,098.00
34	3.02.11	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA ESCALERA	M3	16.80	$ 1,633,915.00	$ 27,449,772.00		$ -	8.17	$ 13,349,086.00	8.63	$ 14,100,686.00
	3.03	**FOSO ASCENSOR**										
36	3.03.01	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	7.65	$ 61,803.00	$ 472,793.00	4.18	$ 258,337.00		$ -	11.83	$ 731,129.00
37	3.03.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	2.33	$ 124,114.00	$ 289,186.00	2.31	$ 286,703.00		$ -	4.64	$ 575,889.00
38	3.03.03	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	6.65	$ 33,450.00	$ 222,443.00	5.80	$ 194,010.00		$ -	12.45	$ 416,453.00
39	3.03.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	515.83	$ 9,856.00	$ 5,084,020.00		$ -	61.49	$ 606,045.00	454.34	$ 4,477,975.00
40	3.03.05	CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR	M3	2.50	$ 874,523.00	$ 2,186,308.00		$ -	0.88	$ 769,580.00	1.62	$ 1,416,727.00
41	3.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22 O SIMILAR	ML	4.05	$ 90,127.00	$ 365,014.00		$ -	4.05	$ 365,014.00	-	$ -
42	3.03.07	MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M	M2	3.63	$ 187,215.00	$ 679,590.00	1.77	$ 331,371.00		$ -	5.40	$ 1,010,961.00
	3.04	**ESCALERA DE EMERGENCIA**										
43	3.04.01	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	5.37	$ 61,803.00	$ 331,882.00	3.27	$ 202,096.00		$ -	8.64	$ 533,978.00
44	3.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	3.31	$ 124,114.00	$ 410,817.00		$ -	3.31	$ 410,817.00	-	$ -
45	3.04.03	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	2.56	$ 33,450.00	$ 85,632.00	4.96	$ 165,912.00		$ -	7.52	$ 251,544.00
46	3.04.04	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT - ESCALERA DE EMERGENCIA	ML	13.18	$ 80,975.00	$ 1,067,251.00	1.53	$ 123,892.00		$ -	14.71	$ 1,191,142.00
47	3.04.05	CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA - ESCALERA DE EMERGENCIA	M3	0.64	$ 831,197.00	$ 531,966.00	0.32	$ 265,983.00		$ -	0.96	$ 797,949.00
48	3.04.06	CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	0.45	$ 888,250.00	$ 399,713.00	0.23	$ 204,298.00		$ -	0.68	$ 604,010.00
49	3.04.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	155.13	$ 9,856.00	$ 1,528,961.00	242.12	$ 2,386,335.00		$ -	397.25	$ 3,915,296.00
50	3.04.08	ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS	KG	2,776.00	$ 21,992.00	$ 61,049,792.00	2,430.04	$ 53,441,440.00		$ -	5,206.04	$ 114,491,232.00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
Contrato No.: LIC-4-2023
Fecha: octubre 24 de 2024

	3.05	**TANQUES**												
51	3.05.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	472.28	$	42,164.00	$	19,913,214.00	633.54	$	26,712,581.00		$ -	1,105.82	$	46,625,794.00
52	3.05.02	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	196.17	$	61,803.00	$	12,123,895.00		$	-	166.61	$ 10,296,998.00	29.56	$	1,826,897.00
53	3.05.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	38.31	$	124,114.00	$	4,754,807.00		$	-	38.31	$ 4,754,807.00	-	$	-
54	3.05.04	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	144.98	$	33,450.00	$	4,849,581.00		$	-	19.86	$ 664,317.00	125.12	$	4,185,264.00
55	3.05.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES	KG	24,234.69	$	9,856.00	$	238,857,105.00	1,453.17	$	14,322,444.00		$ -	25,687.86	$	253,179,548.00
56	3.05.06	CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES	M3	197.03	$	1,211,730.00	$	238,747,162.00	5.70	$	6,906,861.00		$ -	202.73	$	245,654,023.00
57	3.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22	ML	129.00	$	90,127.00	$	11,626,383.00	5.07	$	456,944.00		$ -	134.07	$	12,083,327.00
58	3.05.08	TAPA METALICA PARA ESCOTILLA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1.00M X 1.00M	UND	9.00	$	452,402.00	$	4,071,618.00		$	-	7.00	$ 3,166,814.00	2.00	$	904,804.00
59	3.05.09	ESCALERA ACCESO TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO	UND	6.00	$	1,252,402.00	$	7,514,412.00	3.00	$	3,757,206.00		$ -	9.00	$	11,271,618.00
60	3.05.10	IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA	M2	505.20	$	109,892.00	$	55,517,438.00	24.68	$	2,712,135.00		$ -	529.88	$	58,229,573.00
61	3.05.11	IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS TANQUE CON EMULSION ASFALTICA	M2	276.96	$	39,892.00	$	11,048,488.00	12.12	$	483,491.00		$ -	289.08	$	11,531,979.00
	3.06	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**												
62	3.06.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	3,888.09	$	75,848.00	$	294,903,850.00		$	-	1,025.33	$ 77,769,230.00	2,862.76	$	217,134,620.00
63	3.06.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	209.50	$	45,100.00	$	9,448,450.00		$	-	209.50	$ 9,448,450.00	-	$	-
64	3.06.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA ASCENSOR, CON DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	112.43	$	93,429.00	$	10,504,222.00	94.71	$	8,848,661.00		$ -	207.14	$	19,352,883.00
65	3.06.04	DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	M	4,608.20	$	30,284.00	$	139,554,729.00		$	-	1,941.65	$ 58,800,929.00	2,666.55	$	80,753,800.00
66	3.06.05	DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #5 PARA DOVELAS	M	39.61	$	36,213.00	$	1,434,397.00	349.19	$	12,645,217.00		$ -	388.80	$	14,079,614.00
67	3.06.06	CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL	M	1,431.70	$	35,780.00	$	51,226,226.00		$	-	1,431.70	$ 51,226,226.00	-	$	-
69	3.06.08	CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO	M	103.90	$	35,780.00	$	3,717,542.00	70.35	$	2,517,123.00		$ -	174.25	$	6,234,665.00
70	3.06.09	CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA SUPERIOR DE ASCENSOR DE 0.15 MTS X 0.20 MTS INCLUYE REF.	M	7.60	$	118,603.00	$	901,383.00	46.20	$	5,479,459.00		$ -	53.80	$	6,380,841.00
71	3.06.10	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	M2	5,792.72	$	28,806.00	$	166,865,092.00		$	-	1,542.16	$ 44,423,461.00	4,250.56	$	122,441,631.00
72	3.06.11	PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	ML	883.70	$	15,645.00	$	13,825,487.00		$	-	423.48	$ 6,625,345.00	460.22	$	7,200,142.00
73	3.06.12	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	M2	1,139.01	$	34,569.00	$	39,374,437.00		$	-	442.29	$ 15,289,523.00	696.72	$	24,084,914.00
74	3.06.13	PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	ML	739.16	$	20,557.00	$	15,194,912.00		$	-	380.43	$ 7,820,500.00	358.73	$	7,374,413.00
	3.07	**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**												
79	3.07.01	AFINADO DE PISO CON MORTERO 1:3 PARA CONCRETO A LA VISTA Y ESPESOR DE 0,075M. INCLUYE AFINADO Y ESMALTADO	M2	271.37		80,055.00	$	21,724,525.00		$	-	19.46	$ 1,558,017.00	251.91	$	20,166,509.00
82	3.07.04	ACABADO PARA PISO EN PORCELANATO APARIENCIA MATE, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1,173.82		255,392.00	$	299,784,237.00		$	-	72.91	$ 18,620,631.00	1,100.91	$	281,163,607.00
89	3.07.11	ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.30m x 0.45m	M2	371.72		109,600.00	$	40,740,512.00	0.02	$	2,192.00		$ -	371.74	$	40,742,704.00
117	3.07.39	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU DARK GRIS Espesor 1, Ancho 0.40, Largo variable JP (COLORES DE REFERENCIA)	M2	514.92		357,957.00	$	184,319,218.00	624.42	$	223,515,510.00		$ -	1,139.34	$	407,834,728.00
118	3.07.40	GUARDA ESCOBA EN PISO SINU DARK	M	275.78		50,112.00	$	13,819,887.00		$	-	64.41	$ 3,227,714.00	211.37	$	10,592,173.00
	3.10	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES**												
136	3.10.01	PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 - IMPERMEABILIZADA, E= 0,06M	M2	1,521.94		51,462.00	$	78,322,076.00		$	-	17.09	$ 879,486.00	1,504.85	$	77,442,591.00
137	3.10.02	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4. INCLUYE DILATACION PARA REMATE IMPERMEABILIZACION	M	316.50		13,815.00	$	4,372,448.00	134.08	$	1,852,315.00		$ -	450.58	$	6,224,763.00
138	3.10.03	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	M2	1,680.19		105,000.00	$	176,419,950.00	78.61	$	8,254,050.00		$ -	1,758.80	$	184,674,000.00
139	3.10.04	CONCRETO DE 21 Mpa PARA BORDILLO PLACA DE 0.10m x 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4	ML	316.50		48,093.00	$	15,221,435.00		$	-	148.50	$ 7,141,811.00	168.00	$	8,079,624.00
	3.11	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**												
168	3.11.29	MQ-01 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	23.40		1,170,888.00	$	27,398,779.00	18.72	$	21,919,023.00		$ -	42.12	$	49,317,803.00
176	3.11.37	CTS-02 - REJILLA CORTA SOL EN ALUMINIO PERFILES CURVO EXTERNO.	M2	7.88		709,044.00	$	5,587,267.00	6.03	$	4,275,535.00		$ -	13.91	$	9,862,802.00
	12.00	**CERRAMIENTO**												
880	12.01	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO	M3	44.82	$	61,803.00	$	2,770,010.00	0.71	$	43,880.00		$ -	45.53	$	2,813,891.00
881	12.02	CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO	M3	26.28	$	558,874.00	$	14,687,209.00	0.72	$	402,389.00		$ -	27.00	$	15,089,598.00
882	12.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	KG	8,010.00	$	9,856.00	$	78,946,560.00		$	-	819.90	$ 8,080,934.00	7,190.10	$	70,865,626.00
883	12.04	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO	ML	45.02	$	88,407.00	$	3,980,083.00	148.09	$	13,092,193.00		$ -	193.11	$	17,072,276.00
884	12.05	CONCRETO 21 Mpa PARA COLUMNETAS DE 0.25m X 0.25m	ML	135.05	$	81,402.00	$	10,993,340.00		$	-	71.30	$ 5,803,963.00	63.75	$	5,189,378.00

Adicional a lo anterior, se expresan a continuación las razones de la variación de las cantidades de obra ya relacionadas en el cuadro anterior, las cuales difieren con respecto al presupuesto oficial, pero se hacen necesarias estas modificaciones para el proyecto cumpla su alcance contractual.

ITEM	DESCRIPCION	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO Y/O VARIACION
1.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
1.04	DEMOLICION CUNETA EXISTENTE	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
1.06	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
1.07	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.01.01	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.01.03	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.60MTS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.01.05	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.01.06	CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.01.07	CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.01.08	CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.01.10	MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.01.11	CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.01.12	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.

3.02.04	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.02.05	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.02.07	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE PISO 2; RELACION 0,229 M3/M2, FORMALETA Y CASETON	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.02.08	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA; RELACION 0,223 M3/M2, FORMALETA Y CASETON	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.02.09	MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.02.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.02.11	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA ESCALERA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.03.01	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.03.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.03.03	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.03.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.03.05	CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22 O SIMILAR	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.03.07	MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.04.01	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.04.03	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.

3.04.04	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT - ESCALERA DE EMERGENCIA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.04.05	CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA - ESCALERA DE EMERGENCIA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.04.06	CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.04.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.04.08	ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.02	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.05.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.05.04	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.05.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.06	CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.08	TAPA METALICA PARA ESCOTILLA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1.00M X 1.00M	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.05.09	ESCALERA ACCESO TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.10	IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.05.11	IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS TANQUE CON EMULSION ASFALTICA	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.06.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.06.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.

3.06.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA ASCENSOR, CON DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.06.04	DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.06.05	DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #5 PARA DOVELAS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.06.06	CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.06.08	CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.06.09	CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA SUPERIOR DE ASCENSOR DE 0.15 MTS X 0.20 MTS INCLUYE REF.	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.06.10	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.06.11	PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.06.12	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.06.13	PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.07.01	AFINADO DE PISO CON MORTERO 1:3 PARA CONCRETO A LA VISTA Y ESPESOR DE 0,075M. INCLUYE AFINADO Y ESMALTADO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.07.04	ACABADO PARA PISO EN PORCELANATO APARIENCIA MATE, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.07.11	ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.30m x 0.45m	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.07.39	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU DARK GRIS Espesor 1, Ancho 0.40, Largo variable JP (COLORES DE REFERENCIA)	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.07.40	GUARDA ESCOBA EN PISO SINU DARK	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.10.01	PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 - IMPERMEABILIZADA, E= 0,06M	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.10.02	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4. INCLUYE DILATACION PARA REMATE IMPERMEABILIZACION	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.

3.10.03	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.10.04	CONCRETO DE 21 Mpa PARA BORDILLO PLACA DE 0.10m x 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
3.11.29	MQ-01 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
3.11.37	CTS-02 - REJILLA CORTA SOL EN ALUMINIO PERFILES CURVO EXTERNO.	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
12.01	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
12.02	CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
12.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.
12.04	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD AUMENTO.
12.05	CONCRETO 21 Mpa PARA COLUMNETAS DE 0.25m X 0.25m	DE ACUERDO A LA REVISIÓN REALIZADA POR LAS PARTES Y AL REPLANTEO EN OBRA ESTA CANTIDAD DISMINUYE.

El Interventor certifica que revisó y verificó los ítems que presentan variaciones en sus cantidades, de esta forma y teniendo en cuenta lo anterior se anexa el balance de obra No. 01, el cual no produce variación del costo del contrato.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cálculo entregadas.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
Contratista

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
JVM INGENIERA S.A.S. BIC
Interventoría

DIANA MARRUGO OTERO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Supervisora Contrato

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
				ESTUDIOS Y DISEÑOS										
1	0.10			ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR - VALLEDUPAR	UND	1.00	$ 270,226,493.00	$ 270,226,493.00		$ -		$ -	1.00	$ 270,226,493.00
				CONSTRUCCION Y DOTACION										
	1.00			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
2	1.01			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	5,000.00	$ 2,483.00	$ 12,415,000.00		$ -		$ -	5,000.00	$ 12,415,000.00
3	1.02			DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN MURO, INCLUYE RETIRO DE REJAS DE PROTECCION, DEMOLICION DE COLUMNAS COLUMNAS Y RETIRO DE MATERIAL	M	71.00	$ 74,048.00	$ 5,257,408.00		$ -		$ -	71.00	$ 5,257,408.00
4	1.03			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	297.30	$ 137,282.00	$ 40,813,939.00		$ -	85.60	$ 11,751,339.00	211.70	$ 29,062,599.00
5	1.04			DEMOLICION CUNETA EXISTENTE	M	71.70	$ 24,024.00	$ 1,722,521.00		$ -	48.95	$ 1,175,975.00	22.75	$ 546,546.00
6	1.05			REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 8M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UND	2.00	$ 635,640.00	$ 1,271,280.00		$ -		$ -	2.00	$ 1,271,280.00
7	1.06			REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UND	7.00	$ 1,184,080.00	$ 8,288,560.00		$ -	4.00	$ 4,736,320.00	3.00	$ 3,552,240.00
8	1.07			DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	4,412.00	$ 5,936.00	$ 26,189,632.00		$ -	11.00	$ 65,296.00	4,401.00	$ 26,124,336.00
9	1.08			CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	300.00	$ 31,916.00	$ 9,574,800.00	81.00	$ 2,585,196.00		$ -	381.00	$ 12,159,996.00
	2.00			**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
10	2.01			EXCAVACION MECANICA	M3	3,300.00	$ 42,164.00	$ 139,141,200.00		$ -		$ -	3,300.00	$ 139,141,200.00
11	2.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	1,303.13	$ 124,114.00	$ 161,736,677.00		$ -		$ -	1,303.13	$ 161,736,677.00
	3.00			**EDIFICACION - MODULO A**										
	3.01			**CIMIENTOS**										
12	3.01.01			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	177.78	$ 33,450.00	$ 5,946,741.00	165.16	$ 5,524,602.00		$ -	342.94	$ 11,471,343.00
13	3.01.02			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	KG	14,603.09	$ 9,856.00	$ 143,928,055.00		$ -	728.98	$ 7,184,827.00	13,874.11	$ 136,743,228.00
14	3.01.03			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.60MTS	ML	48.60	$ 246,993.00	$ 12,003,860.00		$ -	48.60	$ 12,003,860.00	-	$ -
15	3.01.04			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.80MTS	ML	-	$ 316,011.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
16	3.01.05			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS	ML	355.35	$ 327,813.00	$ 116,488,350.00	36.65	$ 12,014,346.00		$ -	392.00	$ 128,502,696.00
17	3.01.06			CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	M3	60.25	$ 831,197.00	$ 50,079,619.00		$ -	0.45	$ 374,039.00	59.80	$ 49,705,581.00
18	3.01.07			CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	12.08	$ 888,250.00	$ 10,730,060.00		$ -	12.08	$ 10,730,060.00	-	$ -
19	3.01.08			CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	M2	1,559.87	$ 145,530.00	$ 227,007,881.00		$ -	13.45	$ 1,957,379.00	1,546.42	$ 225,050,503.00
20	3.01.09			CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.15MT	M2	-	$ 179,370.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
21	3.01.10			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	5,611.88	$ 9,109.00	$ 51,118,615.00	507.12	$ 4,619,356.00		$ -	6,119.00	$ 55,737,971.00
22	3.01.11			CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA	M	1,012.84	$ 5,408.00	$ 5,477,439.00	186.04	$ 1,006,104.00		$ -	1,198.88	$ 6,483,543.00
23	3.01.12			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO	M3	371.77	$ 61,803.00	$ 22,976,501.00		$ -	92.76	$ 5,732,846.00	279.01	$ 17,243,655.00
	3.02			**ESTRUCTURAS**										
24	3.02.01			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	19,424.67	$ 9,856.00	$ 191,449,548.00		$ -	0.01	$ 99.00	19,424.66	$ 191,449,449.00
25	3.02.02			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 30X40 MTS	ML	-	$ 176,319.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
26	3.02.03			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 40X60 MTS	ML	-	$ 315,819.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
27	3.02.04			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS	ML	239.22	$ 443,276.00	$ 106,040,485.00	55.13	$ 24,437,806.00		$ -	294.35	$ 130,478,291.00
28	3.02.05			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS	ML	24.75	$ 499,483.00	$ 12,362,204.00	3.15	$ 1,573,371.00		$ -	27.90	$ 13,935,576.00
29	3.02.06			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	KG	41,620.90	$ 9,856.00	$ 410,215,590.00		$ -	561.47	$ 5,533,848.00	41,059.43	$ 404,681,742.00
30	3.02.07			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE PISO 2; RELACION 0,229 M3/M2. FORMALETA Y CASETON	M2	1,217.80	$ 500,398.00	$ 609,384,684.00		$ -	10.44	$ 5,224,155.00	1,207.36	$ 604,160,529.00
31	3.02.08			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA LOSA ALIGERADA DE CUBIERTA; RELACION 0,223 M3/M2. FORMALETA Y CASETON	M2	1,546.60	$ 525,765.00	$ 813,148,149.00		$ -	53.35	$ 28,049,563.00	1,493.25	$ 785,098,586.00
32	3.02.09			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE ENTREPISO	KG	9,959.20	$ 9,109.00	$ 90,718,353.00	1,012.80	$ 9,225,595.00		$ -	10,972.00	$ 99,943,948.00
33	3.02.10			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA	KG	474.21	$ 9,856.00	$ 4,673,814.00	12.61	$ 124,284.00		$ -	486.82	$ 4,798,098.00
34	3.02.11			CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA ESCALERA	M3	16.80	$ 1,633,915.00	$ 27,449,772.00		$ -	8.17	$ 13,349,086.00	8.63	$ 14,100,686.00
35	3.02.12			ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA	KG	-	$ 21,106.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	3.03			**FOSO ASCENSOR**										
36	3.03.01			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	7.65	$ 61,803.00	$ 472,793.00	4.18	$ 258,337.00		$ -	11.83	$ 731,129.00
37	3.03.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	2.33	$ 124,114.00	$ 289,186.00	2.31	$ 286,703.00		$ -	4.64	$ 575,889.00
38	3.03.03			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	6.65	$ 33,450.00	$ 222,443.00	5.80	$ 194,010.00		$ -	12.45	$ 416,453.00
39	3.03.04			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	515.83	$ 9,856.00	$ 5,084,020.00		$ -	61.49	$ 606,045.00	454.34	$ 4,477,975.00
40	3.03.05			CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR	M3	2.50	$ 874,523.00	$ 2,186,308.00		$ -	0.88	$ 769,580.00	1.62	$ 1,416,727.00
41	3.03.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22 O SIMILAR	ML	4.05	$ 90,127.00	$ 365,014.00		$ -	4.05	$ 365,014.00	-	$ -
42	3.03.07			MUROS FOSO DEL ASCENSOR EN CONCRETO DE 21 MPa IMPERMEABILIZADO E=0.15 M	M2	3.63	$ 187,215.00	$ 679,590.00	1.77	$ 331,371.00		$ -	5.40	$ 1,010,961.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	3.04			**ESCALERA DE EMERGENCIA**										
43	3.04.01			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	5.37	$ 61,803.00	$ 331,882.00	3.27	$ 202,096.00		$ -	8.64	$ 533,978.00
44	3.04.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	3.31	$ 124,114.00	$ 410,817.00		$ -	3.31	$ 410,817.00	-	$ -
45	3.04.03			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	2.56	$ 33,450.00	$ 85,632.00	4.96	$ 165,912.00		$ -	7.52	$ 251,544.00
46	3.04.04			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT - ESCALERA DE EMERGENCIA	ML	13.18	$ 80,975.00	$ 1,067,251.00	1.53	$ 123,892.00		$ -	14.71	$ 1,191,142.00
47	3.04.05			CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA - ESCALERA DE EMERGENCIA	M3	0.64	$ 831,197.00	$ 531,966.00	0.32	$ 265,983.00		$ -	0.96	$ 797,949.00
48	3.04.06			CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	0.45	$ 888,250.00	$ 399,713.00	0.23	$ 204,298.00		$ -	0.68	$ 604,010.00
49	3.04.07			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	155.13	$ 9,856.00	$ 1,528,961.00	242.12	$ 2,386,335.00		$ -	397.25	$ 3,915,296.00
50	3.04.08			ESTRUCTURA METALICA - ESCALERA DE EMERGENCIA. INCLUYE PASAMANOS Y BARANDAS	KG	2,776.00	$ 21,992.00	$ 61,049,792.00	2,430.04	$ 53,441,440.00		$ -	5,206.04	$ 114,491,232.00
	3.05			**TANQUES**										
51	3.05.01			EXCAVACIÓN MECÁNICA	M3	472.28	$ 42,164.00	$ 19,913,214.00	633.54	$ 26,712,581.00		$ -	1,105.82	$ 46,625,794.00
52	3.05.02			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	196.17	$ 61,803.00	$ 12,123,895.00		$ -	166.61	$ 10,296,998.00	29.56	$ 1,826,897.00
53	3.05.03			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	38.31	$ 124,114.00	$ 4,754,807.00		$ -	38.31	$ 4,754,807.00	-	$ -
54	3.05.04			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	144.98	$ 33,450.00	$ 4,849,581.00		$ -	19.86	$ 664,317.00	125.12	$ 4,185,264.00
55	3.05.05			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA TANQUES	KG	24,234.69	$ 9,856.00	$ 238,857,105.00	1,453.17	$ 14,322,444.00		$ -	25,687.86	$ 253,179,548.00
56	3.05.06			CONCRETO IMPERMEABILIZADO RESISTENCIA 28 MPA PARA TANQUES	M3	197.03	$ 1,211,730.00	$ 238,747,162.00	5.70	$ 6,906,861.00		$ -	202.73	$ 245,654,023.00
57	3.05.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA PVC H=0.22	ML	129.00	$ 90,127.00	$ 11,626,383.00	5.07	$ 456,944.00		$ -	134.07	$ 12,083,327.00
58	3.05.08			TAPA METALICA PARA ESCOTILLA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1.00M X 1.00M	UND	9.00	$ 452,402.00	$ 4,071,618.00		$ -	7.00	$ 3,166,814.00	2.00	$ 904,804.00
59	3.05.09			ESCALERA ACCESO TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO	UND	6.00	$ 1,252,402.00	$ 7,514,412.00	3.00	$ 3,757,206.00		$ -	9.00	$ 11,271,618.00
60	3.05.10			IMPERMEABILIZACION TANQUE CON GEOMEMBRANA	M2	505.20	$ 109,892.00	$ 55,517,438.00	24.68	$ 2,712,135.00		$ -	529.88	$ 58,229,573.00
61	3.05.11			IMPERMEABILIZACION MUROS EXTERNOS TANQUE CON EMULSION ASFALTICA	M2	276.96	$ 39,892.00	$ 11,048,488.00	12.12	$ 483,491.00		$ -	289.08	$ 11,531,979.00
	3.06			**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**										
62	3.06.01			LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	3,888.09	$ 75,848.00	$ 294,903,850.00		$ -	1,025.33	$ 77,769,230.00	2,862.76	$ 217,134,620.00
63	3.06.02			LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, CON DIMENSIONES DE 0.10M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	ML	209.50	$ 45,100.00	$ 9,448,450.00		$ -	209.50	$ 9,448,450.00	-	$ -
64	3.06.03			LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA ASCENSOR, CON DIMENSIONES DE 0.15M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	112.43	$ 93,429.00	$ 10,504,222.00	94.71	$ 8,848,661.00		$ -	207.14	$ 19,352,883.00
65	3.06.04			DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA (3000 PSI) PARA BLOQUE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	M	4,608.20	$ 30,284.00	$ 139,554,729.00		$ -	1,941.65	$ 58,800,929.00	2,666.55	$ 80,753,800.00
66	3.06.05			DOVELA EN GROUTING CONCRETO FLUIDO 21 MPA PARA BLOQUE 0.15m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #5 PARA DOVELAS	M	39.61	$ 36,213.00	$ 1,434,397.00	349.19	$ 12,645,217.00		$ -	388.80	$ 14,079,614.00
67	3.06.06			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL	M	1,431.70	$ 35,780.00	$ 51,226,226.00		$ -	1,431.70	$ 51,226,226.00	-	$ -
68	3.06.07			CONCRETO DE 21 Mpa PARA PLACA SOBRE MAMPOSTERIA GRADERIA Y PALCO, INCLUYE REFUERZO	M2	-	$ 277,410.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
69	3.06.08			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DE 0.10m x 0.10m SOBRE ANTEPECHO DE VANO DE VENTANAS, INCLUYE REFUERZO DE ACERO	M	103.90	$ 35,780.00	$ 3,717,542.00	70.35	$ 2,517,123.00		$ -	174.25	$ 6,234,665.00
70	3.06.09			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA SUPERIOR DE ASCENSOR DE 0.15 MTS X 0.20 MTS INCLUYE REF.	M	7.60	$ 118,603.00	$ 901,383.00	46.20	$ 5,479,459.00		$ -	53.80	$ 6,380,841.00
71	3.06.10			PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	M2	5,792.72	$ 28,806.00	$ 166,865,092.00		$ -	1,542.16	$ 44,423,461.00	4,250.56	$ 122,441,631.00
72	3.06.11			PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES	ML	883.70	$ 15,645.00	$ 13,825,487.00		$ -	423.48	$ 6,625,345.00	460.22	$ 7,200,142.00
73	3.06.12			PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	M2	1,139.01	$ 34,569.00	$ 39,374,437.00		$ -	442.29	$ 15,289,523.00	696.72	$ 24,084,914.00
74	3.06.13			PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	ML	739.16	$ 20,557.00	$ 15,194,912.00		$ -	380.43	$ 7,820,500.00	358.73	$ 7,374,413.00
75	3.06.14			FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4	M	4,275.37	$ 16,581.00	$ 70,889,910.00		$ -		$ -	4,275.37	$ 70,889,910.00
76	3.06.15			PLACA FUNDIDA IN SITU SOBRE PRELOSA PREFABRICADA CONCRETO DE 21 Mpa PARA GRADERIA, INCLUYE VIGAS SOBRE MAMPOSTERIA Y REFUERZO	M2	-	$ 133,443.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
77	3.06.16			PRELOSA PREFABRICADA CONCRETO DE 21 Mpa PARA GRADERIA, INCLUYE REFUERZO	M2	-	$ 131,827.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
78	3.06.17			MURO PARA DIVISIONES EN SUPERBOARD EN LAMINA 8MM DOBLE CARA, INCLUYE PERFIL METALICO EN C, CAL 26 BASE 9, CANALES METALICOS CAL 26 BASE 9, TORNILLERIA, ESTUCO PLASTICO, PINTURA 3 MANOS, CINTA MALLA, PUNTILLA DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M2	-	118,577.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	3.07			**PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS**										
79	3.07.01			AFINADO DE PISO CON MORTERO 1:3 PARA CONCRETO A LA VISTA Y ESPESOR DE 0,075M. INCLUYE AFINADO Y ESMALTADO	M2	271.37	80,055.00	$ 21,724,525.00		$ -	19.46	$ 1,558,017.00	251.91	$ 20,166,509.00
80	3.07.02			PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05 M	M2	1,948.38	34,100.00	$ 66,439,758.00		$ -		$ -	1,948.38	$ 66,439,758.00
81	3.07.03			PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 Y ESPESOR DE 0,05 M	M2	463.25	46,700.00	$ 21,633,775.00		$ -		$ -	463.25	$ 21,633,775.00
82	3.07.04			ACABADO PARA PISO EN PORCELANATO APARIENCIA MATE, INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1,173.82	255,392.00	$ 299,784,237.00		$ -	72.91	$ 18,620,631.00	1,100.91	$ 281,163,607.00
83	3.07.05			ACABADO PARA PISO EN MADERA REF: GRANADILLO O SAPAN. INCLUYE JUMBOLON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	-	239,887.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
84	3.07.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA AUDITORIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	-	205,669.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
85	3.07.07			PIRLAN BOCAPUERTA EN MADERA GRANADILLO O SAPAN	M	-	34,312.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
86	3.07.08			GUARDA ESCOBA EN MORTERO 1:3 PARA CONCRETO A LA VISTA H=0.15M	M	-	15,130.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
87	3.07.09			GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO	M	787.90	42,572.00	$ 33,542,479.00		$ -		$ -	787.90	$ 33,542,479.00
88	3.07.10			GUARDA ESCOBA EN MADERA H=0.10M	M	-	16,744.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
89	3.07.11			ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.30m x 0.45m	M2	371.72	109,600.00	$ 40,740,512.00	0.02	$ 2,192.00		$ -	371.74	$ 40,742,704.00
90	3.07.12			CIELO RASO EN DRY WALL	M2	1,865.52	92,393.00	$ 172,360,989.00		$ -		$ -	1,865.52	$ 172,360,989.00
91	3.07.13			CIELO RASO EN DRY WALL PARA ZONAS HUMEDAS	M2	160.39	101,009.00	$ 16,200,834.00		$ -		$ -	160.39	$ 16,200,834.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
92	3.07.14			SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA PERFORADA, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, SISTEMA DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	80.00	1,189,713.00	$ 95,177,040.00		$ -		$ -	80.00	$ 95,177,040.00
93	3.07.15			SISTEMA LIVIANO DRYWALL 1 CARA - PARA PROYECCION CLARABOYA	M2	70.98	111,166.00	$ 7,890,563.00		$ -		$ -	70.98	$ 7,890,563.00
94	3.07.16			ESTUCO PARA INTERIOR EXTERIOR HASTA 3.00M DE ALTURA	M2	1,369.50	18,038.00	$ 24,703,041.00		$ -		$ -	1,369.50	$ 24,703,041.00
95	3.07.17			ESTUCO PARA INTERIOR EXTERIOR A ALTURA SUPERIOR 3.00M	M2	1,681.54	21,248.00	$ 35,729,362.00		$ -		$ -	1,681.54	$ 35,729,362.00
96	3.07.18			PINTURA PARA MUROS INTERIORES A 3 MANOS	M2	1,635.41	14,784.00	$ 24,177,901.00		$ -		$ -	1,635.41	$ 24,177,901.00
97	3.07.19			ESTUCO PARA FILOS Y DILATACIONES	M	3,747.47	9,016.00	$ 33,787,190.00		$ -		$ -	3,747.47	$ 33,787,190.00
98	3.07.20			PINTURA PARA FILOS Y DILATACIONES	M	3,747.47	7,397.00	$ 27,720,036.00		$ -		$ -	3,747.47	$ 27,720,036.00
99	3.07.21			PINTURA EPOXICA SOBRE CONCRETO PARA ESCALERAS	M2	79.16	39,502.00	$ 3,126,978.00		$ -		$ -	79.16	$ 3,126,978.00
100	3.07.22			REVESTIMIENTO PARA MURO EN EKOWOOD WALLPANEL 3D, COMPUESTO POR PERFILES DE SECCIÓN RECTANGULAR Y BORDES DOBLADOS EN ÁNGULO RECTO, ACABADO LISO, INSTALADOS CON UNA SEPARACIÓN SEGÚN DISEÑO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	200.00	488,491.00	$ 97,698,200.00		$ -		$ -	200.00	$ 97,698,200.00
101	3.07.23			MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR:0.10 MTS,PROFUNDIDAD:0.55M, H FALDON :0.30M, SALPICADERO DE 0.30M. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: REF.3/8" @ 0.15 MTS Y ACABADO EN GRANITO SAN GABRIEL.	ML	32.88	1,521,719.00	$ 50,034,121.00		$ -		$ -	32.88	$ 50,034,121.00
102	3.07.24			ESPEJO CRISTAL 4MM FLOTADO 2.5CM DE MURO, DIMENSIONES 2.00X0.90 (INCLUYE SISTEMA DE FIJACION A MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	8.00	1,374,773.00	$ 10,998,184.00		$ -		$ -	8.00	$ 10,998,184.00
103	3.07.25			ESPEJO CRISTAL 4MM FLOTADO 2.5CM DE MURO, DIMENSIONES 0.60X0.80 (INCLUYE SISTEMA DE FIJACION A MURO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	4.00	432,899.00	$ 1,731,596.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,731,596.00
104	3.07.26			S/I DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADAS, CAL.20 CON POLIETILENO EXPANDIDO. INCLUYE INSTALACION, BISAGRAS, SEGUROS, PUERTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	122.58	1,057,000.00	$ 129,567,060.00		$ -		$ -	122.58	$ 129,567,060.00
105	3.07.27			S/I LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SEMIEMPOTRAR PORCELANA BLANCA INCLUYE GRIFERIA PUSH Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TAPAREGISTRO	UND	16.00	816,448.00	$ 13,063,168.00		$ -		$ -	16.00	$ 13,063,168.00
106	3.07.28			S/I DE DISPENSADOR DE EMPOTRAR PARA JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO PUSH	UND	11.00	456,395.00	$ 5,020,345.00		$ -		$ -	11.00	$ 5,020,345.00
107	3.07.29			S/I DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MURO, PARA TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE - ANTIVANDALICO.	UND	11.00	507,887.00	$ 5,586,757.00		$ -		$ -	11.00	$ 5,586,757.00
108	3.07.30			S/I DE SECADOR MANOS DE SOBREPONER EN MURO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	UND	8.00	1,228,661.00	$ 9,829,288.00		$ -		$ -	8.00	$ 9,829,288.00
109	3.07.31			S/I DE BARRA DE SEGURIDAD FORMA DE L FIJA A PARED	UND	8.00	622,674.00	$ 4,981,392.00		$ -		$ -	8.00	$ 4,981,392.00
110	3.07.32			S/I DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PMR ANCLADA DE PISO A PARED	UND	8.00	429,744.00	$ 3,437,952.00		$ -		$ -	8.00	$ 3,437,952.00
111	3.07.33			S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPA REGISTRO.	UND	12.00	2,130,048.00	$ 25,560,576.00		$ -		$ -	12.00	$ 25,560,576.00
112	3.07.34			S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPAREGISTRO, PAPELERA, PORTARROLLO.	UND	8.00	2,740,448.00	$ 21,923,584.00		$ -		$ -	8.00	$ 21,923,584.00
113	3.07.35			S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS. INCLUYE TAPAREGISTRO, PAPELERA, PORTARROLLO.	UND	26.00	2,442,948.00	$ 63,516,648.00		$ -		$ -	26.00	$ 63,516,648.00
114	3.07.36			S/I DE LAVATRAPEROS PREFABRICADO DE 0.40MX0.35M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE TAPA REGISTRO	UND	4.00	601,561.00	$ 2,406,244.00		$ -		$ -	4.00	$ 2,406,244.00
115	3.07.37			S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	4.00	66,287.00	$ 265,148.00		$ -		$ -	4.00	$ 265,148.00
116	3.07.38			SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE	UND	8.00	414,549.00	$ 3,316,392.00		$ -		$ -	8.00	$ 3,316,392.00
117	3.07.39			SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU DARK GRIS Espesor 1, Ancho 0.40, Largo variable JP (COLORES DE REFERENCIA)	M2	514.92	357,957.00	$ 184,319,218.00	624.42	$ 223,515,510.00		$ -	1,139.34	$ 407,834,728.00
118	3.07.40			GUARDA ESCOBA EN PISO SINU DARK	M	275.78	50,112.00	$ 13,819,887.00		$ -	64.41	$ 3,227,714.00	211.37	$ 10,592,173.00
119	3.07.41			S/I SISTEMA DE CIELO RASO EN ALUZINC CON APARIENCIA DE MADERA, COMPUESTO POR PERFILES DE SECCIÓN RECTANGULAR Y BORDES DOBLADOS EN ÁNGULO RECTO, ACABADO LISO, INSTALADOS CON UNA SEPARACIÓN DE 10CM SEGÚN DISEÑO Y FIJADOS MEDIANTE PORTA PANEL. INCLUYE AISLANTE TERMICO Y ACUTICO DE BAJA REFLECTIVIDAD DE LUZ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (SEGUN REFERENCIA)	M2	-	841,201.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	3.08			**CARPINTERIA METALICA**										
120	3.08.01			PS-1 - PUERTA CORTAFUEGO HOMOLOGADA NFPA. EN LAMNIA DE ACERO GALVANIZADO CAL.18 REFORZADA. BISAGRAS REGULABLES. 1.20X2.44. INCLUYE BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA.	UND	4.00	$ 4,423,265.00	$ 17,693,060.00		$ -		$ -	4.00	$ 17,693,060.00
121	3.08.02			PS-2 - PUERTA CORTAFUEGO HOMOLOGADA NFPA. EN LAMNIA DE ACERO GALVANIZADO CAL.18 REFORZADA. BISAGRAS REGULABLES. 0.90X2.44. INCLUYE BARRA ANTIPANICO Y CERRADURA.	UND	1.00	$ 3,815,944.00	$ 3,815,944.00		$ -		$ -	1.00	$ 3,815,944.00
122	3.08.03			PT-1 - MARCO Y HOJA DOBLE EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 2.35X2.55	UND	2.00	$ 3,708,000.00	$ 7,416,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 7,416,000.00
123	3.08.04			PT-2 - MARCO Y HOJA DOBLE EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 1.60X2.55	UND	2.00	$ 2,800,000.00	$ 5,600,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 5,600,000.00
124	3.08.05			PT-3 - MARCO Y HOJA DOBLE EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 2.00X2.55	UND	3.00	$ 3,151,800.00	$ 9,455,400.00		$ -		$ -	3.00	$ 9,455,400.00
125	3.08.06			PT-4 - MARCO Y HOJA SENCILLA EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 1.00X2.55	UND	3.00	$ 1,854,020.00	$ 5,562,060.00		$ -		$ -	3.00	$ 5,562,060.00
126	3.08.07			PT-5 - MARCO Y HOJA SENCILLA EN LAMINA Y CELOSIAS EN COLD ROLLED 0.05MM. PASACANDADO EN ACERO INOXIDABLE. 1.10X2.55	UND	-	$ 1,854,020.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
127	3.08.08			PP-1 - PUERTA SECCIONAL PARA PARQUEADERO AUTOMATICA. MOTOR ELECTOMECANICO. 5.35X2.55	UND	1.00	$ 21,003,500.00	$ 21,003,500.00		$ -		$ -	1.00	$ 21,003,500.00
128	3.08.09			BARANDA METALICA ESCALERA INCLUYE PINTURA	M	23.42	$ 357,000.00	$ 8,360,940.00		$ -		$ -	23.42	$ 8,360,940.00
129	3.08.10			BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCOLORO PASAMANOS EN ACERO DE 2" PARALES EN 11/2" VIDRIO SUJETO A ACCESORIOS TIPO SPIDER , ACABADO SATINADO DE 1.92 MTS DE ALTURA	M	21.90	$ 950,000.00	$ 20,805,000.00		$ -		$ -	21.90	$ 20,805,000.00
130	3.08.11			PASAMANOS TUBULAR INCLUYE PINTURA	M	68.60	$ 285,600.00	$ 19,592,160.00		$ -		$ -	68.60	$ 19,592,160.00
131	3.08.12			ESCOTILLA TAPA ACCESO CUBIERTA	UND	1.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 650,000.00
132	3.08.13			ESCALERA DE GATO ACCESO CUBIERTA	UND	-	$ 650,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	3.09			**REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADA**										
133	3.09.01			ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE FACHADA	KG	1,635.73	$ 21,992.00	$ 35,973,062.00		$ -		$ -	1,635.73	$ 35,973,062.00
134	3.09.02			ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR	M2	1,878.17	$ 40,496.00	$ 76,058,372.00		$ -		$ -	1,878.17	$ 76,058,372.00
135	3.09.03			FILOS Y DILATACIONES EN GRANIPLAST O SIMILAR	M	684.82	$ 9,268.00	$ 6,346,912.00		$ -		$ -	684.82	$ 6,346,912.00
	3.10			**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES**										
136	3.10.01			PENDIENTADO EN MORTERO 1:3 - IMPERMEABILIZADA, E= 0,06M	M2	1,521.94	51,462.00	$ 78,322,076.00		$ -	17.09	$ 879,486.00	1,504.85	$ 77,442,591.00
137	3.10.02			MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4. INCLUYE DILATACION PARA REMATE IMPERMEABILIZACION	M	316.50	13,815.00	$ 4,372,448.00	134.08	$ 1,852,315.00		$ -	450.58	$ 6,224,763.00
138	3.10.03			IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	M2	1,680.19	105,000.00	$ 176,419,950.00	78.61	$ 8,254,050.00		$ -	1,758.80	$ 184,674,000.00
139	3.10.04			CONCRETO DE 21 Mpa PARA BORDILLO PLACA DE 0.10m x 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4	ML	316.50	48,093.00	$ 15,221,435.00		$ -	148.50	$ 7,141,811.00	168.00	$ 8,079,624.00
	3.11			**CARPINTERIA DE ALUMINIO**										
140	3.11.01			FC-01 - FACHADA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH, PUERTAS.	M2	222.68	2,830,000.00	$ 630,184,400.00		$ -		$ -	222.68	$ 630,184,400.00
141	3.11.02			FC-02 - PUERTA VENTANA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	12.17	2,319,381.00	$ 28,226,867.00		$ -		$ -	12.17	$ 28,226,867.00
142	3.11.03			FC-03 - FACHADA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH, PUERTAS.	M2	-	2,137,877.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
143	3.11.04			VT-01 - VENTANA CORREDIZA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	3.34	2,081,908.00	$ 6,953,573.00		$ -		$ -	3.34	$ 6,953,573.00
144	3.11.05			VT-02 - VENTANA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	20.40	1,647,085.00	$ 33,600,534.00		$ -		$ -	20.40	$ 33,600,534.00
145	3.11.06			VT-03 - VENTANA SISTEMA 3890 CON PERFILES A LA VISTAS, CRISTAL DVH.	M2	10.65	1,346,116.00	$ 14,336,135.00		$ -		$ -	10.65	$ 14,336,135.00
146	3.11.07			VT-03 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	10.65	707,339.00	$ 7,533,160.00		$ -		$ -	10.65	$ 7,533,160.00
147	3.11.08			VT-04 - VENTANA SISTEMA 3890 CON PERFILES A LA VISTAS, CRISTAL DVH.	M2	11.70	1,352,829.00	$ 15,828,099.00		$ -		$ -	11.70	$ 15,828,099.00
148	3.11.09			VT-04 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	11.70	707,339.00	$ 8,275,866.00		$ -		$ -	11.70	$ 8,275,866.00
149	3.11.10			VT-05 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	81.60	707,339.00	$ 57,718,862.00		$ -		$ -	81.60	$ 57,718,862.00
150	3.11.11			VT-05A - PUERTA VENTANA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	14.89	2,004,888.00	$ 29,852,782.00		$ -		$ -	14.89	$ 29,852,782.00
151	3.11.12			VT-06 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3	M2	19.50	707,339.00	$ 13,793,111.00		$ -		$ -	19.50	$ 13,793,111.00
152	3.11.13			VT-07 - PUERTA VENTANA UNITIZADA EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	12.30	1,948,565.00	$ 23,967,350.00		$ -		$ -	12.30	$ 23,967,350.00
153	3.11.14			VT-08 - VENTANA SISTEMA 3890 CON PERFILES A LA VISTAS, CRISTAL DVH.	M2	13.92	1,315,449.00	$ 18,311,050.00		$ -		$ -	13.92	$ 18,311,050.00
154	3.11.15			VT-09 - VENTANA CORREDIZA SISTEMA 5020ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	-	707,339.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
155	3.11.16			VT-10 - VENTANA PROYECTANTE PIEL DE CRISTAL, SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	-	1,938,367.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
156	3.11.17			VT-10 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020 ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	1.00	707,339.00	$ 707,339.00		$ -		$ -	1.00	$ 707,339.00
157	3.11.18			VT-12 - VENTANA FIJA SISTEMA 5020ALUMINA CRISTAL LAMINADO 3+3.	M2	11.50	707,339.00	$ 8,134,399.00		$ -		$ -	11.50	$ 8,134,399.00
158	3.11.19			VT-13 - PUERTA CORREDIZA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	6.51	1,774,992.00	$ 11,555,198.00		$ -		$ -	6.51	$ 11,555,198.00
159	3.11.20			VT-14 - PUERTA CORREDIZA PIEL DE CRISTAL EN SILICONA ESTRUCTURAL, CRISTAL DVH.	M2	12.38	1,518,283.00	$ 18,796,344.00		$ -		$ -	12.38	$ 18,796,344.00
160	3.11.21			VT-15 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	9.08	1,229,324.00	$ 11,162,262.00		$ -		$ -	9.08	$ 11,162,262.00
161	3.11.22			VT-16 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	13.78	1,379,375.00	$ 19,007,788.00		$ -		$ -	13.78	$ 19,007,788.00
162	3.11.23			VT-17 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	4.85	1,334,792.00	$ 6,473,741.00		$ -		$ -	4.85	$ 6,473,741.00
163	3.11.24			VT-18 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	4.85	1,334,792.00	$ 6,473,741.00		$ -		$ -	4.85	$ 6,473,741.00
164	3.11.25			PV-01 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	10.20	1,585,676.00	$ 16,173,895.00		$ -		$ -	10.20	$ 16,173,895.00
165	3.11.26			PV-02 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	12.24	1,813,217.00	$ 22,193,776.00		$ -		$ -	12.24	$ 22,193,776.00
166	3.11.27			PV-03 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	4.08	1,813,217.00	$ 7,397,925.00		$ -		$ -	4.08	$ 7,397,925.00
167	3.11.28			PV-04 - PUERTA VENTANA, CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM, ACCESORIOS ALUMINIO.	M2	18.29	1,122,466.00	$ 20,529,903.00		$ -		$ -	18.29	$ 20,529,903.00
168	3.11.29			MQ-01 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	23.40	1,170,888.00	$ 27,398,779.00	18.72	$ 21,919,023.00		$ -	42.12	$ 49,317,803.00
169	3.11.30			MQ-02 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	10.08	1,095,457.00	$ 11,042,207.00		$ -		$ -	10.08	$ 11,042,207.00
170	3.11.31			MQ-03 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	2.88	1,072,131.00	$ 3,087,737.00		$ -		$ -	2.88	$ 3,087,737.00
171	3.11.32			MQ-04 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	2.16	1,126,375.00	$ 2,432,970.00		$ -		$ -	2.16	$ 2,432,970.00
172	3.11.33			MQ-05 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	1.41	1,245,764.00	$ 1,756,527.00		$ -		$ -	1.41	$ 1,756,527.00
173	3.11.34			MQ-06 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	1.52	1,211,566.00	$ 1,841,580.00		$ -		$ -	1.52	$ 1,841,580.00
174	3.11.35			MQ-07 - MARQUESINA EN CRISTAL TEMPLADO 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	M2	-	1,140,020.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
175	3.11.36			CTS-01 - REJILLA CORTA SOL EN ALUMINIO PERFILES CURVO EXTERNO.	M2	46.80	699,630.00	$ 32,742,684.00		$ -		$ -	46.80	$ 32,742,684.00
176	3.11.37			CTS-02 - REJILLA CORTA SOL EN ALUMINIO PERFILES CURVO EXTERNO.	M2	7.88	709,044.00	$ 5,587,267.00	6.03	$ 4,275,535.00		$ -	13.91	$ 9,862,802.00
	3.12			**CARPINTERIA DE MADERA**										
177	3.12.01			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.00X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	14.00	1,650,000.00	$ 23,100,000.00		$ -		$ -	14.00	$ 23,100,000.00
178	3.12.02			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.90X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	4.00	1,650,000.00	$ 6,600,000.00		$ -		$ -	4.00	$ 6,600,000.00
179	3.12.03			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.80X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	11.00	1,520,000.00	$ 16,720,000.00		$ -		$ -	11.00	$ 16,720,000.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
180	3.12.04			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.75X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	10.00	1,500,000.00	$ 15,000,000.00		$ -		$ -	10.00	$ 15,000,000.00
181	3.12.05			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.70X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2.00	1,500,000.00	$ 3,000,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 3,000,000.00
182	3.12.06			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.20X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2.00	2,100,000.00	$ 4,200,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 4,200,000.00
183	3.12.07			MUEBLE COCINA CAFETIN DE EMPLEADOS, INCLUYE MUEBLE BASE Y GABINETE ALTO, BARRA COMEDOR AUXILIAR, MUEBLES EN MELAMINA RH CON MESONES EN QUARTZONE BLANCO POLAR, POCETA LAVAPLATOS Y GRIFERIA, MEDIDAS 2.95 MTS	UND	-	11,900,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
184	3.12.08			MUEBLE CAFETIN TERRAZA, INCLUYE MUEBLE BASE MELAMINA RH, MUEBLE GABINETE SUPERIOR RH, MESONES EN QUARTZONE BLANCO POLAR, MEDIDAS DE AREAS 2.3+2.9+1.75+0.83	UND	-	13,400,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
185	3.12.09			MUEBLE CAFETIN AUDITORIO, INCLUYE MUEBLE POCETA LAVA PLATOS EN MELAMINA RH, MUEBLE BASE RH, MESONES Y BARRA SERVICIOS BEBIDAS EN QUARTZONE BLANCO POLAR, MEDIDAS BARRA; 5.25MT, MUEBLES 4.48MT	UND	-	14,200,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
186	3.12.10			MUEBLE TINTOS OFICINA DEFENSOR Y PORTERIA, INCLUYE MUEBLE INFEIOR CON MESONES EN QUARZONE BLACO POLAR, MUEBLES EN MELAMINA RH. MEDIDAS 1.3 + 0.70 MT	UND	1.00	3,900,000.00	$ 3,900,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 3,900,000.00
187	3.12.11			MUEBLE LAVA MANOS OFICINA DEFENSOR, INCLUYE MUEBLE INFERIOR EN MELAMINA RH CON MESON EN QUARTZONE BLANCO, POCETA DE SOBRE PONER Y GRIFERIA EN ACERO, MEDIDAS 0.70X0.55	UND	1.00	2,790,400.00	$ 2,790,400.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,790,400.00
188	3.12.12			BAÑO GUARDERIA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, POCETA DE SOBRE PONER, GRIFERIA EN ACERO Y DIVISION INFERIOR EN MADERA MELAMINA RH, MEDIDAS 1.05X0.50	UND	1.00	3,571,200.00	$ 3,571,200.00		$ -		$ -	1.00	$ 3,571,200.00
189	3.12.13			MUEBLE SALA DE LACTANCIA MATERNA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, POCETA DE LAVAMANOS Y GRIFERIA, MEDIDAS 1.25X0.60	UND	1.00	3,200,000.00	$ 3,200,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 3,200,000.00
190	3.12.14			MUEBLE ENFERMERIA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, POCETA LAVAMANOS Y GRIFERIA EN ACERO, DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, MEDIDAS 1.15X0.50	UND	1.00	2,368,000.00	$ 2,368,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,368,000.00
191	3.12.15			MUEBLE GUARDERIA, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR, INFERIOR EN MELAMINA RH, MEDIDAS 2.05X0.60	UND	1.00	4,500,000.00	$ 4,500,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,500,000.00
192	3.12.16			MUEBLES BAÑOS CAMERINOS, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR CON POCETA DE SOBRE PONER, GRIFERIA EN ACERO, DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, MEDIDAS 1.95X0.55 MT	UND	-	4,646,400.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
193	3.12.17			MUEBLE BAÑO PISO 2 AUDITORIO, INCLUYE MESON EN QUARTZONE BLANCO POLAR CON DIVISION INFERIOR EN MELAMINA RH, POCETA DE LAVA MANOS SOBRE PONER Y GRIFERIA EN ACERO, MEDIDAS 1.50X50	UND	-	3,800,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	3.13			**ASCENSOR**										
194	3.13.01			S/I ASCENSOR CON UNIDAD MOTRIZ SIN SALA DE MAQUINAS, VELOCIDAD1M/SEG-60M/MIN TIPO PASAJEROS DE 2 PARADAS CAPACIDAD 630 KG, 8 PASAJEROS MAXIMO, MATERIALES DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PASAMANOS, BOTONERAS, ILUMINACION LED, EN CABINA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA NIVELACION CON BATERIA, VENTILADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDO PARA SU CORRECTO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	2.00	158,077,935.00	$ 316,155,870.00		$ -		$ -	2.00	$ 316,155,870.00
	3.14			**DIVISIONES MODULARES**										
195	3.14.01			DIVISIONES MODULARES PISO TECHO PISOS 1 Y 2	M2	202.50	1,297,020.00	$ 262,646,550.00		$ -		$ -	202.50	$ 262,646,550.00
196	3.14.02			DIVISIONES MODULARES MEDIA ALTURA PARA TODOS LOS CUBICULOS DE LOS PISOS 1 Y 2	M2	223.00	1,056,640.00	$ 235,630,720.00		$ -		$ -	223.00	$ 235,630,720.00
197	3.14.03			BRANDING SEÑALIZACION OFICINAS CERRDAS PISO TECHO	UND	15.00	180,880.00	$ 2,713,200.00		$ -		$ -	15.00	$ 2,713,200.00
198	3.14.04			BRANDING SEÑALIZACION CUBICULOS MEDIA ALTURA	UND	20.00	180,880.00	$ 3,617,600.00		$ -		$ -	20.00	$ 3,617,600.00
	4.00			**SISTEMA HIDROSANITARIO**										
	4.01			**ACOMETIDA**										
199	4.01.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-P RDE 11 DE 3/4"	M	116.13	$ 8,979.00	$ 1,042,731.00		$ -		$ -	116.13	$ 1,042,731.00
200	4.01.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC UZ RDE 21 DE 3"	M	28.13	$ 50,983.00	$ 1,434,152.00		$ -		$ -	28.13	$ 1,434,152.00
201	4.01.03			SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE MEDICION DE 3/4"	GLOB	1.00	$ 283,500.00	$ 283,500.00		$ -		$ -	1.00	$ 283,500.00
202	4.01.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC UZ RDE 21 DE 3"	UND	6.00	$ 89,484.00	$ 536,904.00		$ -		$ -	6.00	$ 536,904.00
203	4.01.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PF+UAD DE 3/4"	M	6.00	$ 8,287.00	$ 49,722.00		$ -		$ -	6.00	$ 49,722.00
204	4.01.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC P RDE 11 DE 3/4"	UND	25.00	$ 4,222.00	$ 105,550.00		$ -		$ -	25.00	$ 105,550.00
205	4.01.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE 3/4"	UND	3.00	$ 84,090.00	$ 252,270.00		$ -		$ -	3.00	$ 252,270.00
206	4.01.08			SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO DE 3/4" A. INOX.	UND	3.00	$ 47,920.00	$ 143,760.00		$ -		$ -	3.00	$ 143,760.00
	4.02			**SISTEMA HIDRAULICO**										
207	4.02.01			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1/2"	M	48.24	$ 6,884.00	$ 332,084.00		$ -		$ -	48.24	$ 332,084.00
208	4.02.02			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø3/4"	M	61.02	$ 8,979.00	$ 547,899.00		$ -		$ -	61.02	$ 547,899.00
209	4.02.03			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1"	M	28.70	$ 10,302.00	$ 295,667.00		$ -		$ -	28.70	$ 295,667.00
210	4.02.04			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/4"	M	23.85	$ 16,133.00	$ 384,772.00		$ -		$ -	23.85	$ 384,772.00
211	4.02.05			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø1-1/2"	M	66.51	$ 18,320.00	$ 1,218,463.00		$ -		$ -	66.51	$ 1,218,463.00
212	4.02.06			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2"	M	39.89	$ 24,102.00	$ 961,429.00		$ -		$ -	39.89	$ 961,429.00
213	4.02.07			SUMINISTRO INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø2-1/2"	M	47.76	$ 37,443.00	$ 1,788,278.00		$ -		$ -	47.76	$ 1,788,278.00
214	4.02.08			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1/2"	M	163.00	$ 2,760.00	$ 449,880.00		$ -		$ -	163.00	$ 449,880.00
215	4.02.09			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø3/4"	M	18.00	$ 3,671.00	$ 66,078.00		$ -		$ -	18.00	$ 66,078.00
216	4.02.10			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1"	M	10.00	$ 5,732.00	$ 57,320.00		$ -		$ -	10.00	$ 57,320.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
217	4.02.11			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/4"	M	34.00	$ 6,678.00	$ 227,052.00		$ -		$ -	34.00	$ 227,052.00
218	4.02.12			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø1-1/2"	M	60.00	$ 9,385.00	$ 563,100.00		$ -		$ -	60.00	$ 563,100.00
219	4.02.13			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2"	M	21.00	$ 17,594.00	$ 369,474.00		$ -		$ -	21.00	$ 369,474.00
220	4.02.14			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC PRESIÓN Ø2-1/2"	M	19.00	$ 41,552.00	$ 789,488.00		$ -		$ -	19.00	$ 789,488.00
221	4.02.15			EQUIPO DE PRESIÓN CON (3) BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES, Q=58 GPM - HDT=58PSI, IMPULSOR EN ACERO INOXIDABLE 304, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL, CLASE F, 220V/440V, 3 FASES A 60HZ DE 5HP, INCLUYE TANQUE HIDRONEUMÁTICO MEMBRANA EN NEOPRENO VOL.=25LTR Y TABLERO DE CONTROL PARA TRES (3) MOTOBOMBAS DE 5HP CON ALTERNACIÓN, Y SUPLENCIA, CON VARIADORES DE VELOCIDAD POR CADA BOMBA, IP 55, CON RELÉ DE PROTECCIÓN, SELECTORES DE POSICIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL DEL TABLERO Y DE TRES POSICIONES POR CADA BOMBA (MANUAL-AUT-OFF).	GLOB	1.00	$ 51,856,000.00	$ 51,856,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 51,856,000.00
222	4.02.16			EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE COMPUESTO POR DOS (2) BOMBAS TIPO CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES, Q=70 GPM - HDT=21 FT, IMPULSOR EN HIERRO FUNDIDO O SIMILAR, MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA, REFRIGERACIÓN EN ACEITE, 220V, 1 FASE A 60HZ DE 3/4HP, INCLUYE TABLERO DE CONTROL PARA DOS (2) MOTOBOMBAS DE 3/4HP CON ALTERNACIÓN, Y SUPLENCIA, IP 55, CON RELÉ DE PROTECCIÓN, SELECTORES DE POSICIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL DEL TABLERO Y DE TRES POSICIONES POR CADA BOMBA (MANUAL-AUT-OFF).	GLOB	1.00	$ 16,946,000.00	$ 16,946,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 16,946,000.00
223	4.02.17			PRUEBA DE PRESIÓN	UND	1.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 200,000.00
224	4.02.18			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1/2"	UND	7.00	$ 9,647.00	$ 67,529.00		$ -		$ -	7.00	$ 67,529.00
225	4.02.19			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3/4"	UND	24.00	$ 9,647.00	$ 231,528.00		$ -		$ -	24.00	$ 231,528.00
226	4.02.20			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1"	UND	1.00	$ 11,813.00	$ 11,813.00		$ -		$ -	1.00	$ 11,813.00
227	4.02.21			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/4"	UND	4.00	$ 10,423.00	$ 41,692.00		$ -		$ -	4.00	$ 41,692.00
228	4.02.22			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/2"	UND	4.00	$ 14,313.00	$ 57,252.00		$ -		$ -	4.00	$ 57,252.00
229	4.02.23			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	11.00	$ 14,313.00	$ 157,443.00		$ -		$ -	11.00	$ 157,443.00
230	4.02.24			VÁLVULA DE PIE DN 3" EN BRONCE CON CANASTA EN BRONCE, ROSCADA	UND	2.00	$ 704,942.00	$ 1,409,884.00		$ -		$ -	2.00	$ 1,409,884.00
231	4.02.25			NIPLE EN A. INOX. DN 3" ROSCADO	UND	7.00	$ 79,595.00	$ 557,165.00		$ -		$ -	7.00	$ 557,165.00
232	4.02.26			CODO A. INOX. DN 3" X 90° ROSCADO	UND	4.00	$ 187,891.00	$ 751,564.00		$ -		$ -	4.00	$ 751,564.00
233	4.02.27			NIPLE PASAMURO EN A. INOX. DN 3" ROSCADO	UND	2.00	$ 179,531.00	$ 359,062.00		$ -		$ -	2.00	$ 359,062.00
234	4.02.28			REGISTRO P/D EN BRONCE DN 3" ROSCADO	UND	2.00	$ 1,391,002.00	$ 2,782,004.00		$ -		$ -	2.00	$ 2,782,004.00
235	4.02.29			TEE A. INOX. DN 3" ROSCADA O FLAUTA DE SUCCIÓN/DESCARGA DN 3"	UND	6.00	$ 273,102.00	$ 1,638,612.00		$ -		$ -	6.00	$ 1,638,612.00
236	4.02.30			BUSHING A. INOX. DN 3" X 2"	UND	3.00	$ 41,018.00	$ 123,054.00		$ -		$ -	3.00	$ 123,054.00
237	4.02.31			NIPLE PASAMURO EN A. INOX. DN 2" ROSCADO	UND	3.00	$ 44,850.00	$ 134,550.00		$ -		$ -	3.00	$ 134,550.00
238	4.02.32			REGISTRO DE CORTE TIPO CORTINA O TIPO BOLA DN 3" ROSCADO	UND	6.00	$ 610,042.00	$ 3,660,252.00		$ -		$ -	6.00	$ 3,660,252.00
239	4.02.33			REDUCCIÓN A. INOX. BRIDA POR ROSCA DN 2" (O SEGÚN DIÁM./BOMBA)	UND	6.00	$ 185,563.00	$ 1,113,378.00		$ -		$ -	6.00	$ 1,113,378.00
240	4.02.34			CHEQUE TIPO CORTINA EN BRONCE DN 2" ROSCADO	UND	3.00	$ 701,858.00	$ 2,105,574.00		$ -		$ -	3.00	$ 2,105,574.00
241	4.02.35			CONEXIÓN PARA HIDRONEUMÁTICO INCLUYE REGISTRO DE CORTE Y UNIVERSAL DN 1-1/4"	UND	1.00	$ 437,962.00	$ 437,962.00		$ -		$ -	1.00	$ 437,962.00
242	4.02.36			ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN DN 3"	UND	4.00	$ 52,810.00	$ 211,240.00		$ -		$ -	4.00	$ 211,240.00
243	4.02.37			TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 DN 3"	M	3.92	$ 58,704.00	$ 230,120.00		$ -		$ -	3.92	$ 230,120.00
244	4.02.38			CODO PVC PRESIÓN DN 3"	UND	2.00	$ 80,425.00	$ 160,850.00		$ -		$ -	2.00	$ 160,850.00
	4.03			**PUNTOS DE SUMINISTRO**										
245	4.03.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO FLUXOMETRO	UND	32.00	$ 48,730.00	$ 1,559,360.00		$ -		$ -	32.00	$ 1,559,360.00
246	4.03.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA INODORO DE TANQUE	UND	6.00	$ 48,730.00	$ 292,380.00		$ -		$ -	6.00	$ 292,380.00
247	4.03.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA ORINALES	UND	12.00	$ 48,730.00	$ 584,760.00		$ -		$ -	12.00	$ 584,760.00
248	4.03.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS	UND	22.00	$ 48,730.00	$ 1,072,060.00		$ -		$ -	22.00	$ 1,072,060.00
249	4.03.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAPLATOS	UND	4.00	$ 48,730.00	$ 194,920.00		$ -		$ -	4.00	$ 194,920.00
250	4.03.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA POCETA DE ASEO	UND	4.00	$ 48,730.00	$ 194,920.00		$ -		$ -	4.00	$ 194,920.00
	4.04			**SISTEMA SANITARIO**										
251	4.04.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"	M	103.65	$ 30,396.00	$ 3,150,545.00		$ -		$ -	103.65	$ 3,150,545.00
252	4.04.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"	M	85.80	$ 49,014.00	$ 4,205,401.00		$ -		$ -	85.80	$ 4,205,401.00
253	4.04.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"	M	45.75	$ 92,732.00	$ 4,242,489.00		$ -		$ -	45.75	$ 4,242,489.00
254	4.04.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LIVIANA DE 2"	M	75.24	$ 28,615.00	$ 2,152,993.00		$ -		$ -	75.24	$ 2,152,993.00
255	4.04.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DE 0.60x 0.60 MTS	UND	-	$ 515,130.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
256	4.04.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 2"	UND	113.00	$ 11,364.00	$ 1,284,132.00		$ -		$ -	113.00	$ 1,284,132.00
257	4.04.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 4"	UND	85.00	$ 31,402.00	$ 2,669,170.00		$ -		$ -	85.00	$ 2,669,170.00
258	4.04.08			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 6"	UND	14.00	$ 159,032.00	$ 2,226,448.00		$ -		$ -	14.00	$ 2,226,448.00
259	4.04.09			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC NOV. DE 8"	UND	-	$ 122,657.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	4.05			**PUNTO DE DESAGUE A.N**										
260	4.05.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA INODORO FLUXOMETRO	UND	40.00	$ 136,561.00	$ 5,462,440.00		$ -		$ -	40.00	$ 5,462,440.00
261	4.05.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA ORINALES EN GRIFERIA ESTANDAR	UND	12.00	$ 74,352.00	$ 892,224.00		$ -		$ -	12.00	$ 892,224.00
262	4.05.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS	UND	19.00	$ 74,352.00	$ 1,412,688.00		$ -		$ -	19.00	$ 1,412,688.00
263	4.05.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAPLATOS	UND	4.00	$ 74,352.00	$ 297,408.00		$ -		$ -	4.00	$ 297,408.00
264	4.05.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA POCETA DE ASEO	UND	5.00	$ 74,352.00	$ 371,760.00		$ -		$ -	5.00	$ 371,760.00
265	4.05.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA SIFÓN 2"	UND	15.00	$ 74,352.00	$ 1,115,280.00		$ -		$ -	15.00	$ 1,115,280.00
266	4.05.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE INSPECCIÓN 4"	UND	1.00	$ 39,645.00	$ 39,645.00		$ -		$ -	1.00	$ 39,645.00
267	4.05.08			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	24.00	$ 14,313.00	$ 343,512.00		$ -		$ -	24.00	$ 343,512.00
268	4.05.09			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø4"	UND	19.00	$ 22,448.00	$ 426,512.00		$ -		$ -	19.00	$ 426,512.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
									(+)		(-)			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
	4.06			**SISTEMA AGUAS LLUVIAS**										
269	4.06.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2"	M	4.00	$ 30,396.00	$ 121,584.00		$ -		$ -	4.00	$ 121,584.00
270	4.06.02			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 3"	M	111.25	$ 38,844.00	$ 4,321,395.00		$ -		$ -	111.25	$ 4,321,395.00
271	4.06.03			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 4"	M	72.95	$ 49,014.00	$ 3,575,571.00		$ -		$ -	72.95	$ 3,575,571.00
272	4.06.04			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 6"	M	164.00	$ 92,732.00	$ 15,208,048.00		$ -		$ -	164.00	$ 15,208,048.00
273	4.06.05			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"	M	378.80	$ 86,142.00	$ 32,630,590.00		$ -		$ -	378.80	$ 32,630,590.00
274	4.06.06			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 10"	M	39.00	$ 117,690.00	$ 4,589,910.00		$ -		$ -	39.00	$ 4,589,910.00
275	4.06.07			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 12"	M	77.57	$ 151,882.00	$ 11,781,487.00		$ -		$ -	77.57	$ 11,781,487.00
276	4.06.08			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO NOVAFORT DE 14"	M	300.00	$ 179,701.00	$ 53,910,300.00		$ -		$ -	300.00	$ 53,910,300.00
277	4.06.09			TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 DN 3"	M	37.50	$ 50,983.00	$ 1,911,863.00		$ -		$ -	37.50	$ 1,911,863.00
278	4.06.10			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 2"	UND	2.00	$ 11,364.00	$ 22,728.00		$ -		$ -	2.00	$ 22,728.00
279	4.06.11			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 3"	UND	36.00	$ 18,786.00	$ 676,296.00		$ -		$ -	36.00	$ 676,296.00
280	4.06.12			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 4"	UND	58.00	$ 31,402.00	$ 1,821,316.00		$ -		$ -	58.00	$ 1,821,316.00
281	4.06.13			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SANITARIA DE 6"	UND	47.00	$ 159,032.00	$ 7,474,504.00		$ -		$ -	47.00	$ 7,474,504.00
282	4.06.14			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 8"	UND	2.00	$ 130,486.00	$ 260,972.00		$ -		$ -	2.00	$ 260,972.00
283	4.06.15			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 10"	UND	1.00	$ 153,706.00	$ 153,706.00		$ -		$ -	1.00	$ 153,706.00
284	4.06.16			SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC TIPO NOVAFORT DE 14"	UND	4.00	$ 302,616.00	$ 1,210,464.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,210,464.00
285	4.06.17			SUMINISTRO E INSTALACION SIFON 3"	UND	24.00	$ 24,652.00	$ 591,648.00		$ -		$ -	24.00	$ 591,648.00
286	4.06.18			SUMINISTRO E INSTALACION SIFON + TRAGANTE DE 3"	UND	1.00	$ 38,152.00	$ 38,152.00		$ -		$ -	1.00	$ 38,152.00
287	4.06.19			SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO CONCRETO X REJILLA EN PLAZOLETA	M	8.60	$ 461,546.00	$ 3,969,296.00		$ -		$ -	8.60	$ 3,969,296.00
288	4.06.20			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	2.00	$ 14,313.00	$ 28,626.00		$ -		$ -	2.00	$ 28,626.00
289	4.06.21			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3"	UND	32.00	$ 16,013.00	$ 512,416.00		$ -		$ -	32.00	$ 512,416.00
290	4.06.22			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø4"	UND	35.00	$ 22,448.00	$ 785,680.00		$ -		$ -	35.00	$ 785,680.00
291	4.06.23			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø6"	UND	2.00	$ 24,148.00	$ 48,296.00		$ -		$ -	2.00	$ 48,296.00
	4.07			**SISTEMA DE REDES PARA AIRE ACONDICIONADO**										
292	4.07.01			SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SANITARIA PARA SIFÓN 3/4"	UND	29.00	$ 23,509.00	$ 681,761.00		$ -		$ -	29.00	$ 681,761.00
	5.00			**SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIO**										
	5.01			**CONEXIÓN GABINETES INCENDIO**										
293	5.01.01			VALVULA DE TOMA DE BOMBEROS 2-1/2" INCLUYE GABINETE TIPO I PARA PROTECCIÓN VALVVULA (0.40 x 0.30 x 0.24)	UND	1.00	$ 1,097,695.00	$ 1,097,695.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,097,695.00
294	5.01.02			GABINETE TIPO II INCLUYE VALVULA Y BOQUILLA 1-1/2" PARA CONEXION BOMBEROS, MANGUERA 1-1/2, HACHA PICO, LLAVE SPANNER, EXTINTOR 10LBS	UND	-	$ 1,362,091.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
295	5.01.03			GABINETE TIPO III INCLUYE VALVULA Y BOQUILLA 1-1/2" PARA CONEXION BOMBEROS, VALVULA 2-1/2" MANGUERA 1-1/2, HACHA PICO, LLAVE SPANNER, EXTINTOR 10LBS	UND	8.00	$ 1,843,306.00	$ 14,746,448.00		$ -		$ -	8.00	$ 14,746,448.00
	5.02			**TUBERIAS DE ACERO AL CARBON**										
296	5.02.01			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 Ø1"	M	377.29	$ 64,082.00	$ 24,177,498.00		$ -		$ -	377.29	$ 24,177,498.00
297	5.02.02			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 Ø1-1/4"	M	140.69	$ 66,658.00	$ 9,378,114.00		$ -		$ -	140.69	$ 9,378,114.00
298	5.02.03			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø1-1/2"	M	74.21	$ 73,259.00	$ 5,436,550.00		$ -		$ -	74.21	$ 5,436,550.00
299	5.02.04			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø2"	M	56.83	$ 86,508.00	$ 4,916,250.00		$ -		$ -	56.83	$ 4,916,250.00
300	5.02.05			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø2-1/2"	M	44.56	$ 106,982.00	$ 4,767,118.00		$ -		$ -	44.56	$ 4,767,118.00
301	5.02.06			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø3"	M	182.32	$ 125,719.00	$ 22,921,088.00		$ -		$ -	182.32	$ 22,921,088.00
302	5.02.07			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø4"	M	0.68	156,168.00	$ 106,194.00		$ -		$ -	0.68	$ 106,194.00
303	5.02.08			TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 Ø6"	M	7.00	203,830.00	$ 1,426,810.00		$ -		$ -	7.00	$ 1,426,810.00
	5.03			**TUBERÍAS DE POLIETILENO**										
304	5.03.01			TUB. POLIETILENOS PEAD APROB. FM Ø110MM	M	124.09	166,980.00	$ 20,720,548.00		$ -		$ -	124.09	$ 20,720,548.00
305	5.03.02			TUB. POLIETILENOS PEAD APROB. FM Ø160MM	M	135.19	251,855.00	$ 34,048,277.00		$ -		$ -	135.19	$ 34,048,277.00
	5.04			**ACCESORIOS DE CONEXIONES DE TUBERÍAS**										
	5.04.01			**ACCESORIOS ACERO AL CARBON**										
306	5.04.01.01			CODO ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1"	UND	331.00	21,060.00	$ 6,970,860.00		$ -		$ -	331.00	$ 6,970,860.00
307	5.04.01.02			CODO ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1-1/4"	UND	17.00	23,842.00	$ 405,314.00		$ -		$ -	17.00	$ 405,314.00
308	5.04.01.03			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"	UND	6.00	26,815.00	$ 160,890.00		$ -		$ -	6.00	$ 160,890.00
309	5.04.01.04			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2"	UND	3.00	37,263.00	$ 111,789.00		$ -		$ -	3.00	$ 111,789.00
310	5.04.01.05			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2-1/2"	UND	6.00	48,361.00	$ 290,166.00		$ -		$ -	6.00	$ 290,166.00
311	5.04.01.06			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3"	UND	8.00	55,761.00	$ 446,088.00		$ -		$ -	8.00	$ 446,088.00
312	5.04.01.07			CODO RANURADO A.C. SCH10 DE Ø6"	UND	1.00	132,227.00	$ 132,227.00		$ -		$ -	1.00	$ 132,227.00
313	5.04.01.08			TEE ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1"	UND	16.00	29,819.00	$ 477,104.00		$ -		$ -	16.00	$ 477,104.00
314	5.04.01.09			TEE ROSCADO A.C. SCH40 DE Ø1-1/4"	UND	70.00	29,850.00	$ 2,089,500.00		$ -		$ -	70.00	$ 2,089,500.00
315	5.04.01.10			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"	UND	6.00	40,014.00	$ 240,084.00		$ -		$ -	6.00	$ 240,084.00
316	5.04.01.11			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2"	UND	7.00	54,274.00	$ 379,918.00		$ -		$ -	7.00	$ 379,918.00
317	5.04.01.12			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2-1/2"	UND	8.00	65,221.00	$ 521,768.00		$ -		$ -	8.00	$ 521,768.00
318	5.04.01.13			TEE RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3"	UND	19.00	82,505.00	$ 1,567,595.00		$ -		$ -	19.00	$ 1,567,595.00
319	5.04.01.14			STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2" X 1"	UND	22.00	23,694.00	$ 521,268.00		$ -		$ -	22.00	$ 521,268.00
320	5.04.01.15			STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø2" X1"	UND	29.00	27,785.00	$ 805,765.00		$ -		$ -	29.00	$ 805,765.00
321	5.04.01.16			STRAP RANURADO A.C. SCH10 DE Ø3" X 1"	UND	75.00	42,167.00	$ 3,162,525.00		$ -		$ -	75.00	$ 3,162,525.00
322	5.04.01.17			REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1"XØ1/2"	UND	189.00	22,483.00	$ 4,249,287.00		$ -		$ -	189.00	$ 4,249,287.00
323	5.04.01.18			REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1-1/4"XØ1/2"	UND	28.00	22,483.00	$ 629,524.00		$ -		$ -	28.00	$ 629,524.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
324	5.04.01.19			REDUCCIÓN TIPO COPA DE Ø1-1/2"XØ1/2"	UND	1.00	13,000.00	$ 13,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 13,000.00
325	5.04.01.20			REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE Ø1-1/4""XØ1"	UND	52.00	10,183.00	$ 529,516.00		$ -		$ -	52.00	$ 529,516.00
326	5.04.01.21			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø1-1/2"XØ1"	UND	2.00	13,651.00	$ 27,302.00		$ -		$ -	2.00	$ 27,302.00
327	5.04.01.22			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø1-1/2"XØ1-1/4"	UND	9.00	13,651.00	$ 122,859.00		$ -		$ -	9.00	$ 122,859.00
328	5.04.01.23			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø2"XØ1"	UND	2.00	14,509.00	$ 29,018.00		$ -		$ -	2.00	$ 29,018.00
329	5.04.01.24			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø2"XØ1-1/2"	UND	3.00	13,212.00	$ 39,636.00		$ -		$ -	3.00	$ 39,636.00
330	5.04.01.25			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø2-1/2"XØ1-1/2"	UND	8.00	18,169.00	$ 145,352.00		$ -		$ -	8.00	$ 145,352.00
331	5.04.01.26			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø3"XØ1"	UND	1.00	19,329.00	$ 19,329.00		$ -		$ -	1.00	$ 19,329.00
332	5.04.01.27			REDUCCIÓN COPA ROSCA-RANURA DE Ø3"XØ1-1/4"	UND	2.00	25,264.00	$ 50,528.00		$ -		$ -	2.00	$ 50,528.00
333	5.04.01.28			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ1-1/2"	UND	-	28,857.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
334	5.04.01.29			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ2"	UND	6.00	29,284.00	$ 175,704.00		$ -		$ -	6.00	$ 175,704.00
335	5.04.01.30			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø3"XØ2-1/2"	UND	3.00	28,300.00	$ 84,900.00		$ -		$ -	3.00	$ 84,900.00
336	5.04.01.31			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø4"XØ1-1/2"	UND	-	39,542.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
337	5.04.01.32			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø4"XØ2-1/2"	UND	4.00	33,528.00	$ 134,112.00		$ -		$ -	4.00	$ 134,112.00
338	5.04.01.33			REDUCCIÓN RANURADA DE Ø4"XØ3"	UND	2.00	36,522.00	$ 73,044.00		$ -		$ -	2.00	$ 73,044.00
339	5.04.01.34			VALVULAS VENTOSAS Ø1-1/2"	UND	4.00	461,607.00	$ 1,846,428.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,846,428.00
	5.05			**ACCESORIOS POLIETILENO**										
340	5.05.01			CODO POLIETILENO PEAD DE Ø4"	UND	14.00	327,065.00	$ 4,578,910.00		$ -		$ -	14.00	$ 4,578,910.00
341	5.05.02			CODO POLIETILENO PEAD DE Ø6"	UND	4.00	579,685.00	$ 2,318,740.00		$ -		$ -	4.00	$ 2,318,740.00
342	5.05.03			TEE POLIETILENO PEAD DE Ø4"	UND	2.00	414,251.00	$ 828,502.00		$ -		$ -	2.00	$ 828,502.00
343	5.05.04			TEE POLIETILENO PEAD DE Ø6"	UND	5.00	561,954.00	$ 2,809,770.00		$ -		$ -	5.00	$ 2,809,770.00
344	5.05.05			REDUCCIÓN PEAD DE Ø6"XØ4"	UND	5.00	337,523.00	$ 1,687,615.00		$ -		$ -	5.00	$ 1,687,615.00
	5.06			**TRANCISIONES Y PRUEBAS DE PRESIÓN**										
345	5.06.01			TRANSICIÓN DE TUBERÍA HDPE A AC DE Ø4"	UND	8.00	479,796.00	$ 3,838,368.00		$ -		$ -	8.00	$ 3,838,368.00
346	5.06.02			TRANSICIÓN DE TUBERÍA HDPE A AC DE Ø6"	UND	2.00	456,615.00	$ 913,230.00		$ -		$ -	2.00	$ 913,230.00
347	5.06.03			CABEZAL DE PRUEBA Ø4" PARA DOS BOQUILLAS DE Ø2-1/2"	UND	1.00	1,114,624.00	$ 1,114,624.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,114,624.00
348	5.06.04			PRUEBA DE PRESIÓN SPCI	UND	4.00	900,754.00	$ 3,603,016.00		$ -		$ -	4.00	$ 3,603,016.00
	5.07			**UNIONES RÍGIDAS**										
349	5.07.01			UNIÓN ROSCADA A.C. SCH40 DE Ø1"	UND	20.00	10,884.00	$ 217,680.00		$ -		$ -	20.00	$ 217,680.00
350	5.07.02			UNIÓN ROSCADA A.C. SCH40 DE Ø1-1/4"	UND	81.00	13,016.00	$ 1,054,296.00		$ -		$ -	81.00	$ 1,054,296.00
351	5.07.03			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø1-1/2"	UND	12.00	27,393.00	$ 328,716.00		$ -		$ -	12.00	$ 328,716.00
352	5.07.04			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø2"	UND	17.00	29,694.00	$ 504,798.00		$ -		$ -	17.00	$ 504,798.00
353	5.07.05			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø2-1/2"	UND	69.00	39,465.00	$ 2,723,085.00		$ -		$ -	69.00	$ 2,723,085.00
354	5.07.06			COUPLING RÍGIDO A.C. SCH10 DE Ø3"	UND	85.00	37,345.00	$ 3,174,325.00		$ -		$ -	85.00	$ 3,174,325.00
	5.08			**CONEXIÓN CARRO DE BOMBEROS SIAMESA**										
355	5.08.01			CHEQUE RANURADO Ø6"	UND	1.00	1,291,681.00	$ 1,291,681.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,291,681.00
356	5.08.02			SIAMESA DE Ø4"XØ2-1/2"XØ2-1/2"	UND	1.00	974,530.00	$ 974,530.00		$ -		$ -	1.00	$ 974,530.00
	5.09			**ESTACIONES DE CONTROL RED DE INCENDIO Y PUNTO ROCIADORES**										
357	5.09.01			ESTACION DE CONTROL PARA RED DE ROCIADORES Ø3" (INCLUYE VALVULA MARIPOSA RANURADA, VÁLVULA CHEQUE RANURADA, VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE, SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO,	UND	2.00	2,680,627.00	$ 5,361,254.00		$ -		$ -	2.00	$ 5,361,254.00
358	5.09.02			PUNTO DE ROCIADOR SPRINKLER PENDENT K5.6 DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA INCLUYE ROCIADOR,	UND	226.00	71,401.00	$ 16,136,626.00		$ -		$ -	226.00	$ 16,136,626.00
	5.10			**SOPORTERIA TUBERIA RED DE INCENDIO**										
359	5.10.01			PLACA ANTIVÓRTICE DE 50CM X 50CM	UND	1.00	271,946.00	$ 271,946.00		$ -		$ -	1.00	$ 271,946.00
360	5.10.02			NIPLE A.C. SHC 10 Ø6"X0.91M, EXTREMOS LISOS PARA SOLDAR	UND	1.00	382,503.00	$ 382,503.00		$ -		$ -	1.00	$ 382,503.00
361	5.10.03			CODO EN AC Ø6", EXTREMOS LISOS PARA SOLDAR	UND	1.00	393,592.00	$ 393,592.00		$ -		$ -	1.00	$ 393,592.00
362	5.10.04			NIPLE AC SHC 10 Ø6"X0.91M, EXTREMO LISO PARA SOLDAR X BRIDA, CON SALIDA LATERAL DN Ø6"	UND	1.00	617,572.00	$ 617,572.00		$ -		$ -	1.00	$ 617,572.00
363	5.10.05			SALIDA LATERAL AC DN X 25CM, EXTREMO LISO PARA SOLDAR X ROSCA Ø2"	UND	1.00	225,873.00	$ 225,873.00		$ -		$ -	1.00	$ 225,873.00
364	5.10.06			VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO ASCENDENTE DE Ø6", TIPO OS&Y, EXTREMOS BRIDADOS BXB, LISTADA UL Y APROBADA POR FM.	UND	1.00	1,724,489.00	$ 1,724,489.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,724,489.00
365	5.10.07			REDUCCIÓN BRIDADA A.C. DN Ø6" X Ø4" EXCENTRICA	UND	1.00	423,576.00	$ 423,576.00		$ -		$ -	1.00	$ 423,576.00
366	5.10.08			SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO COMPUESTO POR UNA (1) BOMBA CONTRA INCENDIOS DE CARCAZA PARTIDA, HORIZONTAL DE EJE LIBRE, LISTADA UL Y APROBADA POR FM, Q = 500 GPM - HDT=142MCA, MOTOR ELECTRICO HORIZONTAL JAULA DE ARDILLA 440V, 3 FASES A 60HZ DE 75 KW, Y BOMBA JOCKEY PARA MANTENIMIENTO DE PRESIÓN (JOCKEY PUMP) Q=5GPM, HDT=210 PSI, (BOMBA TIPO CENTRIFUGA, VERTICAL, MULTIETAPA). LISTADA UL Y APROBADA POR FM. CON MOTOR ELÉCTRICO	UND	1.00	168,759,228.00	$ 168,759,228.00		$ -		$ -	1.00	$ 168,759,228.00
367	5.10.09			VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO DE AIRE, DE SEGURIDAD DE LA CARCAZA, CON DESAGÜE.	UND	1.00	1,115,279.00	$ 1,115,279.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,115,279.00
368	5.10.10			BRIDA CON CUELLO DN 4", RANURADA (VERFICIAR DIÁMETRO SEGÚN BOMBA SELECCIONADA)	UND	1.00	184,196.00	$ 184,196.00		$ -		$ -	1.00	$ 184,196.00
369	5.10.11			REDUCCIÓN CONCENTRICA EN ACERO AL CARBÓN RANURADA, DIÁMETRO SEGÚN DIÁMETRO DE DESCARGA DE LA BOMBA. (OPCIONAL SI EL DIÁMETRO DE DESCARGA ES DIFERENTE A 4")	UND	1.00	93,943.00	$ 93,943.00		$ -		$ -	1.00	$ 93,943.00
370	5.10.12			CHEQUE TIPO CORTINA DN 6", RANURADO UL/FM	UND	1.00	1,291,681.00	$ 1,291,681.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,291,681.00
371	5.10.13			TEE A.C. DN 6" RANURADA UL/FM	UND	2.00	144,402.00	$ 288,804.00		$ -		$ -	2.00	$ 288,804.00
372	5.10.14			CODO AC DN 6" X 90° EXTREMOS RANURADOS UL/FM	UND	3.00	132,227.00	$ 396,681.00		$ -		$ -	3.00	$ 396,681.00
373	5.10.15			NIPLE DE 50 CM AC SCH 10 DN 6" EXTREMOS RANURADOS	UND	1.00	529,046.00	$ 529,046.00		$ -		$ -	1.00	$ 529,046.00
374	5.10.16			VÁLVULA DE MARIPOSA, CON ACTUADOR Y VOLANTE CON TESTIGO, MONITOREADA, DE 6" DE DIÁMETRO, RANURADA, UL/FM	UND	4.00	872,585.00	$ 3,490,340.00		$ -		$ -	4.00	$ 3,490,340.00
375	5.10.17			NIPLE AC SHC 10 DN 6"X0.33M, RANURADO CON SALIDA LATERAL DN 2"	UND	1.00	383,930.00	$ 383,930.00		$ -		$ -	1.00	$ 383,930.00
376	5.10.18			SALIDA LATERAL AC DN 2" X 50CM, EXTREMO LISO PARA SOLDAR X RANURA	UND	1.00	125,378.00	$ 125,378.00		$ -		$ -	1.00	$ 125,378.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
377	5.10.19			VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO ASCENDENTE DE 2", TIPO OS&Y, EXTREMOS BRIDADOS BXB, LISTADA UL Y APROBADA POR FM.	UND	2.00	404,766.00	$ 809,532.00		$ -		$ -	2.00	$ 809,532.00
378	5.10.20			NIPLE DE 50 CMAC SCH 10 DN 2" EXTREMOS RANURADOS	UND	6.00	116,201.00	$ 697,206.00		$ -		$ -	6.00	$ 697,206.00
379	5.10.21			CODO AC DN 2" X 90° EXTREMOS RANURADOS UL/FM	UND	4.00	37,263.00	$ 149,052.00		$ -		$ -	4.00	$ 149,052.00
380	5.10.22			NIPLE A.INOX. DN 2" RANURA X BRIDA (INCLUYE REDUCCIÓN, SI APLICA)	UND	2.00	449,007.00	$ 898,014.00		$ -		$ -	2.00	$ 898,014.00
381	5.10.23			CHEQUE TIPO CORTINA DN 2", RANURADO UL/FM	UND	1.00	323,227.00	$ 323,227.00		$ -		$ -	1.00	$ 323,227.00
382	5.10.24			BRIDA LOCA DN 6"	UND	1.00	137,964.00	$ 137,964.00		$ -		$ -	1.00	$ 137,964.00
383	5.10.25			TOPE BRIDA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN 6"	UND	1.00	182,964.00	$ 182,964.00		$ -		$ -	1.00	$ 182,964.00
384	5.10.26			TUBERÍA HDPE DN 6" PN16	ML	1.50	5,169,933.00	$ 7,754,900.00		$ -		$ -	1.50	$ 7,754,900.00
385	5.10.27			NIPLE 50 CM A.C. SHC 10 DN 6", RANURA X EXTREMO LISO	UND	1.00	132,979.00	$ 132,979.00		$ -		$ -	1.00	$ 132,979.00
386	5.10.28			BASE EN CONCRETO F´C 28 MPA	UND	1.00	1,225,156.00	$ 1,225,156.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,225,156.00
387	5.10.29			BRIDA CON CUELLO DN 6", RANURADA (VERFICIAR DIÁMETRO SEGÚN BOMBA SELECCIONADA)	UND	1.00	124,684.00	$ 124,684.00		$ -		$ -	1.00	$ 124,684.00
	5.11			**SOPORTERIA TUBERIA RED DE INCENDIO**										
388	5.11.01			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1"	UND	257.00	17,003.00	$ 4,369,771.00		$ -		$ -	257.00	$ 4,369,771.00
389	5.11.02			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø1-1/4"	UND	28.00	21,294.00	$ 596,232.00		$ -		$ -	28.00	$ 596,232.00
390	5.11.03			SOPORTES TIPO CHANEL PARA TUBERÍA DE Ø1-1/2"	UND	11.00	21,528.00	$ 236,808.00		$ -		$ -	11.00	$ 236,808.00
391	5.11.04			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø2"	UND	22.00	21,399.00	$ 470,778.00		$ -		$ -	22.00	$ 470,778.00
392	5.11.05			SOPORTES TIPO PERA PARA TUBERÍA DE Ø3"	UND	66.00	21,924.00	$ 1,446,984.00		$ -		$ -	66.00	$ 1,446,984.00
393	5.11.06			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS TRANSVERSAL Ø2"	UND	3.00	75,514.00	$ 226,542.00		$ -		$ -	3.00	$ 226,542.00
394	5.11.07			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS TRANSVERSAL Ø3"	UND	19.00	79,729.00	$ 1,514,851.00		$ -		$ -	19.00	$ 1,514,851.00
395	5.11.08			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS LONGITUDINAL Ø2"	UND	3.00	87,975.00	$ 263,925.00		$ -		$ -	3.00	$ 263,925.00
396	5.11.09			SOPORTE ANTISÍSMICO DE 2 VÍAS LONGITUDINAL Ø3"	UND	12.00	110,549.00	$ 1,326,588.00		$ -		$ -	12.00	$ 1,326,588.00
	6.00			**RED INTERNA DE GAS**										
397	6.01			PUNTO APARATO A GAS ø1/2" - ESTUFA	UND	-	$ 77,531.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
398	6.02			CODO 90° COBRE TIPO L ø1/2"	UND	-	$ 5,160.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
399	6.03			TUBERÍA COBRE TIPO L Ø1/2"	M	-	$ 36,045.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
400	6.04			VÁLVULA BOLA DE ø1/2"	UND	-	$ 64,801.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	7.00			**SISTEMA ELECTRICO**										
	7.01			**SALIDAS DE ILUMINACION, NO INCLUYE LUMINARIAS**										
	7.01.01			**SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 1**										
401	7.01.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	55.00	$ 167,876.00	$ 9,233,180.00		$ -		$ -	55.00	$ 9,233,180.00
402	7.01.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	26.00	$ 167,876.00	$ 4,364,776.00		$ -		$ -	26.00	$ 4,364,776.00
403	7.01.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	25.00	$ 142,739.00	$ 3,568,475.00		$ -		$ -	25.00	$ 3,568,475.00
404	7.01.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	3.00	$ 167,876.00	$ 503,628.00		$ -		$ -	3.00	$ 503,628.00
405	7.01.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	41.00	$ 142,739.00	$ 5,852,299.00		$ -		$ -	41.00	$ 5,852,299.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
406	7.01.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	18.00	$ 167,876.00	$ 3,021,768.00		$ -		$ -	18.00	$ 3,021,768.00
407	7.01.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	19.00	$ 166,266.00	$ 3,159,054.00		$ -		$ -	19.00	$ 3,159,054.00
408	7.01.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	2.00	$ 193,505.00	$ 387,010.00		$ -		$ -	2.00	$ 387,010.00
409	7.01.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.	UND	74.00	$ 902,357.00	$ 66,774,418.00		$ -		$ -	74.00	$ 66,774,418.00
410	7.01.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	52.00	$ 142,739.00	$ 7,422,428.00		$ -		$ -	52.00	$ 7,422,428.00
411	7.01.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	19.00	$ 131,914.00	$ 2,506,366.00		$ -		$ -	19.00	$ 2,506,366.00
412	7.01.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	$ 14,794.00	$ 5,325,840.00		$ -		$ -	360.00	$ 5,325,840.00
	7.01.02			**SALIDAS DE ILUMINACION NIVEL 2**										
413	7.01.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA 1/2, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	49.00	$ 167,876.00	$ 8,225,924.00		$ -		$ -	49.00	$ 8,225,924.00
414	7.01.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	42.00	$ 167,876.00	$ 7,050,792.00		$ -		$ -	42.00	$ 7,050,792.00
415	7.01.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	12.00	$ 142,739.00	$ 1,712,868.00		$ -		$ -	12.00	$ 1,712,868.00
416	7.01.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	15.00	$ 142,739.00	$ 2,141,085.00		$ -		$ -	15.00	$ 2,141,085.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					**MODIFICACIONES** (+)		**MODIFICACIONES** (-)		**CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01**	
N°	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN**		**ACTIVIDADES**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr.Unitario**	**Vr.Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr.Total**
		INVIAS	**PARTICULAR**											
417	7.01.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	3.00	$ 167,876.00	$ 503,628.00		$ -		$ -	3.00	$ 503,628.00
418	7.01.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	71.00	$ 142,739.00	$ 10,134,469.00		$ -		$ -	71.00	$ 10,134,469.00
419	7.01.02.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	21.00	$ 142,739.00	$ 2,997,519.00		$ -		$ -	21.00	$ 2,997,519.00
420	7.01.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	4.00	$ 167,876.00	$ 671,504.00		$ -		$ -	4.00	$ 671,504.00
421	7.01.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	18.00	$ 166,266.00	$ 2,992,788.00		$ -		$ -	18.00	$ 2,992,788.00
422	7.01.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	1.00	$ 193,505.00	$ 193,505.00		$ -		$ -	1.00	$ 193,505.00
423	7.01.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.	UND	71.00	$ 902,357.00	$ 64,067,347.00		$ -		$ -	71.00	$ 64,067,347.00
424	7.01.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	61.00	$ 142,739.00	$ 8,707,079.00		$ -		$ -	61.00	$ 8,707,079.00
425	7.01.02.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	12.00	$ 131,914.00	$ 1,582,968.00		$ -		$ -	12.00	$ 1,582,968.00
426	7.01.02.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	$ 14,794.00	$ 5,325,840.00		$ -		$ -	360.00	$ 5,325,840.00
	7.01.03			**SALIDAS DE ILUMINACION AUDITORIO**										
427	7.01.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 167,876.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
428	7.01.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 167,876.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
429	7.01.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
430	7.01.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
431	7.01.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
432	7.01.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	-	$ 166,266.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
433	7.01.03.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE CON TAPA A PRESIÓN COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIAMETRO DE 3/4" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33 Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	-	$ 229,481.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
434	7.01.03.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES PARA TUBERÍA, FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, FIJACIÓN DIRECTA A PLACA MEDIANTE ABRAZADERAS DOBLES FIJAS, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE LIBRE DE HALÓGENOS NO.12 AWG, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTODESFORRE PARA CABLE NO.10-12AWG, Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. INCLUYE SENSOR.	UND	-	$ 902,357.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
435	7.01.03.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA BALA LED JUPITER RECESADA 30W EMERGENCIA INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, PRENSAESTOPAS PLÁSTICA DE 1/2", CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG, COLA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 142,739.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
436	7.01.03.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-HFFR-LS A 90ºC, CABLE NO 12 CU DESNUDO, CONECTORES DE RESORTE O DE AUTO DESFORRÉ PARA CABLE NO.10-12AWG Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES. NO INCLUYE LUMINARIA	UND	-	$ 131,914.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
437	7.01.03.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-	$ 14,794.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	7.02			**ILUMINACIÓN**										
	7.02.01			**ILUMINACIÓN NIVEL 1**										
438	7.02.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K	UND	55.00	$ 786,053.00	$ 43,232,915.00		$ -		$ -	55.00	$ 43,232,915.00
439	7.02.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	26.00	$ 936,403.00	$ 24,346,478.00		$ -		$ -	26.00	$ 24,346,478.00
440	7.02.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90 265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	25.00	$ 235,517.00	$ 5,887,925.00		$ -		$ -	25.00	$ 5,887,925.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
441	7.02.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	3.00	$ 161,832.00	$ 485,496.00		$ -		$ -	3.00	$ 485,496.00
442	7.02.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	41.00	$ 50,594.00	$ 2,074,354.00		$ -		$ -	41.00	$ 2,074,354.00
443	7.02.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	18.00	$ 233,832.00	$ 4,208,976.00		$ -		$ -	18.00	$ 4,208,976.00
444	7.02.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	52.00	$ 199,274.00	$ 10,362,248.00		$ -		$ -	52.00	$ 10,362,248.00
445	7.02.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	19.00	$ 149,018.00	$ 2,831,342.00		$ -		$ -	19.00	$ 2,831,342.00
	7.02.02			ILUMINACIÓN NIVEL 2										
446	7.02.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 45W DESCOLGADA DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K	UND	49.00	$ 786,053.00	$ 38,516,597.00		$ -		$ -	49.00	$ 38,516,597.00
447	7.02.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	42.00	$ 936,403.00	$ 39,328,926.00		$ -		$ -	42.00	$ 39,328,926.00
448	7.02.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 18W REDONDO INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	12.00	$ 50,594.00	$ 607,128.00		$ -		$ -	12.00	$ 607,128.00
449	7.02.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90 265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	15.00	$ 235,517.00	$ 3,532,755.00		$ -		$ -	15.00	$ 3,532,755.00
450	7.02.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 36W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	3.00	$ 161,832.00	$ 485,496.00		$ -		$ -	3.00	$ 485,496.00
451	7.02.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	71.00	$ 99,985.00	$ 7,098,935.00		$ -		$ -	71.00	$ 7,098,935.00
452	7.02.02.07			BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	21.00	346,768.00	$ 7,282,128.00		$ -		$ -	21.00	$ 7,282,128.00
453	7.02.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	4.00	233,832.00	$ 935,328.00		$ -		$ -	4.00	$ 935,328.00
454	7.02.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DOWNLIGHT MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	61.00	199,274.00	$ 12,155,714.00		$ -		$ -	61.00	$ 12,155,714.00
455	7.02.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	12.00	149,018.00	$ 1,788,216.00		$ -		$ -	12.00	$ 1,788,216.00
	7.02.03			ILUMINACIÓN AUDITORIO										
456	7.02.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CONTINUUM 60W INCRUSTAR DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
457	7.02.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA MODULO LED 36W SOBREPONER DE MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
458	7.02.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 30W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90 265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
459	7.02.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 20W INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90 265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
460	7.02.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPOT DIRIGIBLE 7W MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
461	7.02.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED JUPITER RECESADA 30W DE EMERGENCIA INCRUSTAR MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 4000K - 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
462	7.02.03.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA R2 MULTIVOLTAJE DE 90-265V GARANTÍA DE 1 AÑO. COLOR 6500K.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	7.03			SALIDAS DE TOMACORRIENTES SISTEMA NORMAL Y REGULADO										
	7.03.01			SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 1										
463	7.03.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	146.00	$ 164,933.00	$ 24,080,218.00		$ -		$ -	146.00	$ 24,080,218.00
464	7.03.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	10.00	$ 237,521.00	$ 2,375,210.00		$ -		$ -	10.00	$ 2,375,210.00
465	7.03.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 237,521.00	$ 237,521.00		$ -		$ -	1.00	$ 237,521.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
466	7.03.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI INTEMPERIE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 276,137.00	$ 276,137.00		$ -		$ -	1.00	$ 276,137.00
467	7.03.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	3.00	$ 239,985.00	$ 719,955.00		$ -		$ -	3.00	$ 719,955.00
468	7.03.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 239,402.00	$ 239,402.00		$ -		$ -	1.00	$ 239,402.00
469	7.03.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 239,985.00	$ 479,970.00		$ -		$ -	2.00	$ 479,970.00
470	7.03.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	30.00	$ 164,933.00	$ 4,947,990.00		$ -		$ -	30.00	$ 4,947,990.00
471	7.03.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA PUERTA ELECTRICA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 296,352.00	$ 592,704.00		$ -		$ -	2.00	$ 592,704.00
472	7.03.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	4.00	239,985.00	$ 959,940.00		$ -		$ -	4.00	$ 959,940.00
473	7.03.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA CARGA VEHICULO ELÉCTRICO CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 1", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	296,352.00	$ 296,352.00		$ -		$ -	1.00	$ 296,352.00
474	7.03.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	65.00	188,547.00	$ 12,255,555.00		$ -		$ -	65.00	$ 12,255,555.00
475	7.03.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	14,794.00	$ 5,325,840.00		$ -		$ -	360.00	$ 5,325,840.00
476	7.03.01.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	14,755.00	$ 2,655,900.00		$ -		$ -	180.00	$ 2,655,900.00
477	7.03.01.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	22,516.00	$ 4,052,880.00		$ -		$ -	180.00	$ 4,052,880.00
	7.03.02			**SALIDAS TOMACORRIENTES NIVEL 2**										

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
478	7.03.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	151.00	$ 164,933.00	$ 24,904,883.00		$ -		$ -	151.00	$ 24,904,883.00
479	7.03.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	15.00	$ 237,521.00	$ 3,562,815.00		$ -		$ -	15.00	$ 3,562,815.00
480	7.03.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 237,521.00	$ 475,042.00		$ -		$ -	2.00	$ 475,042.00
481	7.03.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS FOTOCOPIADORA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	3.00	$ 239,985.00	$ 719,955.00		$ -		$ -	3.00	$ 719,955.00
482	7.03.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 239,402.00	$ 239,402.00		$ -		$ -	1.00	$ 239,402.00
483	7.03.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	2.00	$ 239,985.00	$ 479,970.00		$ -		$ -	2.00	$ 479,970.00
484	7.03.02.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	30.00	$ 164,933.00	$ 4,947,990.00		$ -		$ -	30.00	$ 4,947,990.00
485	7.03.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	4.00	$ 239,985.00	$ 959,940.00		$ -		$ -	4.00	$ 959,940.00
486	7.03.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA NEVERA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	1.00	$ 239,985.00	$ 239,985.00		$ -		$ -	1.00	$ 239,985.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
487	7.03.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA HORNO MICROHONDAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	4.00	239,985.00	$ 959,940.00		$ -		$ -	4.00	$ 959,940.00
488	7.03.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V TRIFASICA PARA VENDING MACHINE CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, CON POLO A TIERRA, COLOR NEGRO CON TAPA, CABLE NO.10 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	3.00	296,352.00	$ 889,056.00		$ -		$ -	3.00	$ 889,056.00
489	7.03.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	71.00	188,547.00	$ 13,386,837.00		$ -		$ -	71.00	$ 13,386,837.00
490	7.03.02.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	360.00	14,794.00	$ 5,325,840.00		$ -		$ -	360.00	$ 5,325,840.00
491	7.03.02.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	14,755.00	$ 2,655,900.00		$ -		$ -	180.00	$ 2,655,900.00
492	7.03.02.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	180.00	22,516.00	$ 4,052,880.00		$ -		$ -	180.00	$ 4,052,880.00
	7.03.03			**SALIDAS TOMACORRIENTES AUDITORIO**										
493	7.03.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
494	7.03.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
495	7.03.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS GFCI UTENSILIOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
496	7.03.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 208V PARA TOMA CAFETERA CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
497	7.03.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMA SERVICIO RACK CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
498	7.03.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA FLUXOMETRO BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
499	7.03.03.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA SECAMANOS EN BAÑOS CIRCUITO INDEPENDIENTE, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
500	7.03.03.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA PUERTA AUTOMATICA, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR BLANCA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
501	7.03.03.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA NORMAL A 120V PARA TOMAS REGULADAS, INCLUYE TUBERÍA CONDUIT DE 3/4", ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS Y ADAPTADORES TERMINALES, CAJA 2400 GALVANIZADA CON SUPLEMENTO, 1 TOMACORRIENTE NEMA 5-15R, 125V, 15A, DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA CON TAPA, CABLE NO.12 AWG-LSZH A 90ºC, TERMINALES DE OJO PARA CABLE NO.10-12AWG, CONECTORES DE RESORTE PARA CABLE NO.10-12AWG, CINTA AISLANTE NEGRA NO.33, ACCESORIOS PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MUEBLE Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN RETIE.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
502	7.03.03.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
503	7.03.03.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X12F+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
504	7.03.03.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3X12F+12N+12T LSZH, PARA POR BANDEJA	ML	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	7.04			**BOMBA CONTRAINCENDIOS (BCI)**										
505	7.04.01			TRANSFERENCIA RED CONTRAINCENDIOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DE LA RED CONTRAINCENDIOS CON TRANSFERENCIA A BASE DE INTERRUPTORES O CONTACTORES.	UND	1.00	39,194,877.00	$ 39,194,877.00		$ -		$ -	1.00	$ 39,194,877.00
506	7.04.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N + 1/0AL T). DESDE TRANSFORMADOR AL TRANSFERENCIA DE BCI.	ML	30.00	354,598.00	$ 10,637,940.00		$ -		$ -	30.00	$ 10,637,940.00
507	7.04.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N + 1/0AL T). PLANTA ELÉCTRICA AL TRANSFERENCIA DE BCI.	ML	25.00	354,598.00	$ 8,864,950.00		$ -		$ -	25.00	$ 8,864,950.00
508	7.04.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X350AL F + 250AL N) + 2(2CU T). TRANSFERENCIA DE BCI A CONTROLADOR DE BCI.	ML	20.00	327,188.00	$ 6,543,760.00		$ -		$ -	20.00	$ 6,543,760.00
509	7.04.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE APANTALLADO 4X16 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	57.00	14,256.00	$ 812,592.00		$ -		$ -	57.00	$ 812,592.00
510	7.04.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	ML	52.00	110,535.00	$ 5,747,820.00		$ -		$ -	52.00	$ 5,747,820.00
	7.05			**CANALIZACIONES Y BANDEJA PORTACABLES**										
	7.05.01			**BANDEJAS, TUBERIAS Y CAJAS DE PASO**										
511	7.05.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.	ML	95.50	261,080.00	$ 24,933,140.00		$ -		$ -	95.50	$ 24,933,140.00
512	7.05.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED NORMAL Y REGULADA.	ML	198.50	314,893.00	$ 62,506,261.00		$ -		$ -	198.50	$ 62,506,261.00
513	7.05.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 20X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.	ML	95.50	261,080.00	$ 24,933,140.00		$ -		$ -	95.50	$ 24,933,140.00
514	7.05.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES DE 30X8CM METÁLICA CON DIVISIÓN INCLUYE CONDUCTOR DE ATERRIZAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE. PARA RED DE COMUNICACIONES Y CCTV.	ML	198.50	314,893.00	$ 62,506,261.00		$ -		$ -	198.50	$ 62,506,261.00
515	7.05.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 12X4 CM PARA PUESTOS DE TRABAJO	ML	220.50	140,929.00	$ 31,074,845.00		$ -		$ -	220.50	$ 31,074,845.00
516	7.05.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1Ø1" EMT. INCLUYE: ACCESORIOS DE UNIÓN, CODOS, ADAPTADORES TERMINALES EMT, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN MURO Y TECHO, ABRAZADERA DOBLE ALA DE 1" Y MARCACIÓN SEGÚN NORMAS LOCALES.	ML	585.80	40,009.00	$ 23,437,272.00		$ -		$ -	585.80	$ 23,437,272.00
517	7.05.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 20X20X15 METÁLICA. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND	90.00	130,652.00	$ 11,758,680.00		$ -		$ -	90.00	$ 11,758,680.00
	7.06			**TABLEROS ELECTRICOS**										
	7.06.01			**TABLEROS**										
518	7.06.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD.	UND	1.00	63,895,638.00	$ 63,895,638.00		$ -		$ -	1.00	$ 63,895,638.00
519	7.06.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD.	UND	1.00	$ 54,995,668.00	$ 54,995,668.00		$ -		$ -	1.00	$ 54,995,668.00
520	7.06.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER DE 20A. TIN1	UND	1.00	$ 1,756,525.00	$ 1,756,525.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,756,525.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
521	7.06.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA NIVEL 2 DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 9 BREAKER DE 20A. TIN2	UND	1.00	$ 1,689,853.00	$ 1,689,853.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,689,853.00
522	7.06.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN NORMAL Y DE EMERGENCIA AUDITORIO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X20A Y 7 BREAKER DE 20A. TIAUD	UND	1.00	$ 1,592,987.00	$ 1,592,987.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,592,987.00
523	7.06.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES NIVEL 1. TNN1	UND	1.00	$ 4,965,462.00	$ 4,965,462.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,965,462.00
524	7.06.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES NIVEL 2. TNN2	UND	1.00	$ 4,953,462.00	$ 4,953,462.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,953,462.00
525	7.06.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO TOMAS NORMALES AUDITORIO. TNAUD	UND	1.00	$ 8,425,542.00	$ 8,425,542.00		$ -		$ -	1.00	$ 8,425,542.00
526	7.06.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE UPS – BYPASS 40 KVA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. TUPS	UND	1.00	$ 7,882,399.00	$ 7,882,399.00		$ -		$ -	1.00	$ 7,882,399.00
527	7.06.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 1 DE 18 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 11 BREAKER DE 20A. TRN1	UND	1.00	$ 1,756,525.00	$ 1,756,525.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,756,525.00
528	7.06.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO NIVEL 2 DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A Y 16 BREAKER DE 20A. TRN2	UND	1.00	$ 2,607,823.00	$ 2,607,823.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,607,823.00
529	7.06.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO REGULADO AUDITORIO DE 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X40A Y 11 BREAKER DE 20A. TRAUD	UND	1.00	$ 2,495,245.00	$ 2,495,245.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,495,245.00
530	7.06.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR PARA TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO PRINCIPAL . TAAEP	UND	1.00	$ 41,963,031.00	$ 41,963,031.00		$ -		$ -	1.00	$ 41,963,031.00
531	7.06.01.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS AUDITORIO. TAAAUD	UND	-	19,732,279.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
532	7.06.01.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE CONTROL PARA BOMBAS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE. TSUM	UND	-	$ 8,209,396.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
533	7.06.01.16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CUARTO DE BOMBAS DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X50A, 3 BREAKER DE 1X20A, Y 2 BREAKER DE 3X20A. TCBOM	UND	-	$ 1,792,832.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
534	7.06.01.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES, AUTOMATICO DE 100 KVAR, 220VAC, CON MINIMO 15 PASOS, SENSIBILIDAD 4KVAR (DEFINIDOS POR EL PERFIL DE CARGA)	UND	1.00	$ 37,927,568.00	$ 37,927,568.00		$ -		$ -	1.00	$ 37,927,568.00
535	7.06.01.18			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR TABLERO GENERAL DE ASCENSORES. TASCEN	UND	1.00	$ 7,364,062.00	$ 7,364,062.00		$ -		$ -	1.00	$ 7,364,062.00
	7.07			**ACOMETIDAS ELECTRICAS**										
	7.07.01			**BAJA TENSION**										
536	7.07.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASE ENTRE TRANSFORMADOR POR BT Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD 7(3X500 KCMIL + 400KCMIL)AL + 2(400KCMIL) AL THWN 600V. INCLUIR INCIDENCIAS DE BORNAS	ML	12.00	$ 2,060,796.00	$ 24,729,552.00		$ -		$ -	12.00	$ 24,729,552.00
537	7.07.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ILUMINACIÓN NIVEL 1	ML	25.00	$ 50,901.00	$ 1,272,525.00		$ -		$ -	25.00	$ 1,272,525.00
538	7.07.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ILUMINACIÓN NIVEL 2	ML	38.00	$ 50,901.00	$ 1,934,238.00		$ -		$ -	38.00	$ 1,934,238.00
539	7.07.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6AL F + 4AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE AUDITORIO	ML	-	$ 50,901.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
540	7.07.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 2/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES NIVEL 1	ML	25.00	$ 192,145.00	$ 4,803,625.00		$ -		$ -	25.00	$ 4,803,625.00
541	7.07.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0AL F + 4/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES NIVEL 2	ML	38.00	$ 230,588.00	$ 8,762,344.00		$ -		$ -	38.00	$ 8,762,344.00
542	7.07.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0AL F + 4/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO DE TOMAS NORMALES AUDITORIO	ML	-	$ 230,588.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
543	7.07.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 4/0 AL N + 2/0CU T. PARA TABLERO GENERAL RES REGULADA	ML	40.00	$ 233,597.00	$ 9,343,880.00		$ -		$ -	40.00	$ 9,343,880.00
544	7.07.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0AL F + 2/0 AL N + 2CU T. PARA TABLERO GENERAL CONTROL DE BOMBAS	ML	30.00	192,145.00	$ 5,764,350.00		$ -		$ -	30.00	$ 5,764,350.00
545	7.07.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4AL F + 4AL N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE BOMBAS	ML	32.00	$ 57,865.00	$ 1,851,680.00		$ -		$ -	32.00	$ 1,851,680.00
546	7.07.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4(3X500AL F + 2/0AL N + 2/0CU T). PARA TABLERO AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO PRINCIPAL.	ML	30.00	$ 1,180,820.00	$ 35,424,600.00		$ -		$ -	30.00	$ 35,424,600.00
547	7.07.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2(3X500AL F + 2/0AL N + 2/0CU T). PARA TABLERO AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO.	ML	-	$ 585,124.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
548	7.07.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6CU F + 6CU N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO NIVEL 1	ML	20.00	$ 92,303.00	$ 1,846,060.00		$ -		$ -	20.00	$ 1,846,060.00
549	7.07.01.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6CU F + 6CU N + 6CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO NIVEL 2	ML	38.00	$ 92,303.00	$ 3,507,514.00		$ -		$ -	38.00	$ 3,507,514.00
550	7.07.01.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2CU F + 2CU N + 2CU T. PARA TABLERO CUARTO DE REGULADO AUDITORIO	ML	-	$ 181,979.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
551	7.07.01.16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2AL F + 2AL N + 8CU T. PARA TABLERO DE ASCENSORES.	ML	32.00	$ 65,822.00	$ 2,106,304.00		$ -		$ -	32.00	$ 2,106,304.00
552	7.07.01.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8CU F + 8CU N + 8CU T. PARA CONTROL DE ASCENSORES.	ML	20.00	$ 59,704.00	$ 1,194,080.00		$ -		$ -	20.00	$ 1,194,080.00
553	7.07.01.18			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1Ø2", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	129.00	$ 51,271.00	$ 6,613,959.00		$ -		$ -	129.00	$ 6,613,959.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
554	7.07.01.19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1Ø3", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	130.00	$ 60,383.00	$ 7,849,790.00		$ -		$ -	130.00	$ 7,849,790.00
555	7.07.01.20			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 4Ø4", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	30.00	$ 910,725.00	$ 27,321,750.00		$ -		$ -	30.00	$ 27,321,750.00
556	7.07.01.21			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC 2Ø4", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS.	ML	80.00	$ 114,521.00	$ 9,161,680.00		$ -		$ -	80.00	$ 9,161,680.00
557	7.07.01.22			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 7(3X500 KCMIL + 400KCMIL)AL + 2(400KCMIL) AL THWN 600V. DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TGD HASTA PLANTA. INCLUIR INCIDENCIAS DE BORNAS	ML	30.00	2,060,796.00	$ 61,823,880.00		$ -		$ -	30.00	$ 61,823,880.00
	7.07.02			**AIRES ACONDICIONADOS**										
				EDIFICIO PRINCIPAL										
558	7.07.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA OCCIDENTAL UC-DX-RV-01EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 4" O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X150A	ML	55.00	251,665.00	$ 13,841,575.00		$ -		$ -	55.00	$ 13,841,575.00
559	7.07.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD INTERIOR RV-DX-01EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	60.00	33,053.00	$ 1,983,180.00		$ -		$ -	60.00	$ 1,983,180.00
560	7.07.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 1 ZONA OCCIDENTAL UC-DX-RV-02EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	ML	45.00	$ 251,665.00	$ 11,324,925.00		$ -		$ -	45.00	$ 11,324,925.00
561	7.07.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-02EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA	ML	60.00	$ 33,053.00	$ 1,983,180.00		$ -		$ -	60.00	$ 1,983,180.00
562	7.07.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS PISO 1-2 OCCIDENTAL UC-DX-RV-03EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 40 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	40.00	$ 116,307.00	$ 4,652,280.00		$ -		$ -	40.00	$ 4,652,280.00
563	7.07.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-03EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X20A	ML	60.00	$ 68,506.00	$ 4,110,360.00		$ -		$ -	60.00	$ 4,110,360.00
564	7.07.02.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA MONITOREO SISTEMAS, ARCHIVO PSIO 1-2 UC-DX-RV-04EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 35 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	35.00	$ 116,307.00	$ 4,070,745.00		$ -		$ -	35.00	$ 4,070,745.00
565	7.07.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-04EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X20A	ML	38.00	$ 68,506.00	$ 2,603,228.00		$ -		$ -	38.00	$ 2,603,228.00
566	7.07.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA LOBBY PRINCIPAL UC-DX-RV-05EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 35 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X130A	ML	35.00	227,173.00	$ 7,951,055.00		$ -		$ -	35.00	$ 7,951,055.00
567	7.07.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD MANEJADORA LOBBYEN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 65 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	65.00	93,811.00	$ 6,097,715.00		$ -		$ -	65.00	$ 6,097,715.00
568	7.07.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 1 ZONA ORIENTAL UC-DX-RV-06EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 30 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	ML	30.00	221,671.00	$ 6,650,130.00		$ -		$ -	30.00	$ 6,650,130.00
569	7.07.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-06EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 67 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X30A	ML	67.00	33,053.00	$ 2,214,551.00		$ -		$ -	67.00	$ 2,214,551.00
570	7.07.02.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA ORIENTAL SUR UC-DX-RV-07EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 28 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X180A	ML	28.00	$ 251,665.00	$ 7,046,620.00		$ -		$ -	28.00	$ 7,046,620.00
571	7.07.02.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES UC-DX-07EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 62 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA	ML	62.00	$ 33,053.00	$ 2,049,286.00		$ -		$ -	62.00	$ 2,049,286.00
572	7.07.02.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA PISO 2 ZONA ORIENTAL NORTE UC-DX-RV-08EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 18 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X130A	ML	18.00	$ 227,173.00	$ 4,089,114.00		$ -		$ -	18.00	$ 4,089,114.00
573	7.07.02.16			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-08EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 58 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X30A	ML	58.00	$ 33,053.00	$ 1,917,074.00		$ -		$ -	58.00	$ 1,917,074.00
574	7.07.02.17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS PISO 1-2 ORIENTAL UC-DX-RV-08EN CALIBRE 3X2 AL F + 4 AL + 8CU T CON UNA DISTANCIA DE 58 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X90A	ML	58.00	$ 116,307.00	$ 6,745,806.00		$ -		$ -	58.00	$ 6,745,806.00
575	7.07.02.18			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDADES INTERIORES RV-DX-08EN CALIBRE 2X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X20A	ML	55.00	$ 68,506.00	$ 3,767,830.00		$ -		$ -	55.00	$ 3,767,830.00
576	7.07.02.19			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION UPS NIVEL 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	50.00	33,053.00	$ 1,652,650.00		$ -		$ -	50.00	$ 1,652,650.00
577	7.07.02.20			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISIONEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	50.00	33,053.00	$ 1,652,650.00		$ -		$ -	50.00	$ 1,652,650.00
578	7.07.02.21			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION RACK PISO 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	60.00	33,053.00	$ 1,983,180.00		$ -		$ -	60.00	$ 1,983,180.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
579	7.07.02.22			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION RACK PISO 1EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X40A	ML	60.00	33,053.00	$ 1,983,180.00		$ -		$ -	60.00	$ 1,983,180.00
580	7.07.02.23			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION CUARTO TECNICO PISO 2EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	45.00	$ 84,674.00	$ 3,810,330.00		$ -		$ -	45.00	$ 3,810,330.00
581	7.07.02.24			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION CUARTO TECNICO PISO 2EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2"O	ML	45.00	$ 33,053.00	$ 1,487,385.00		$ -		$ -	45.00	$ 1,487,385.00
582	7.07.02.25			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UC-PRECISION CUARTO RACK COMUNICACIONESEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	60.00	$ 58,864.00	$ 3,531,840.00		$ -		$ -	60.00	$ 3,531,840.00
583	7.07.02.26			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UMA-PRECISION CUARTO RACK COMUNICACIONESEN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	60.00	$ 58,864.00	$ 3,531,840.00		$ -		$ -	60.00	$ 3,531,840.00
584	7.07.02.27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO MUJERES PISO 1 UVE-TH-01EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	$ 63,247.00	$ 3,794,820.00		$ -		$ -	60.00	$ 3,794,820.00
585	7.07.02.28			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO HOMBREES PISO 1 UVE-TH-02EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	$ 63,247.00	$ 3,794,820.00		$ -		$ -	60.00	$ 3,794,820.00
586	7.07.02.29			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO MUJERES PISO 1 UVE-TH-03EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	63,247.00	$ 3,794,820.00		$ -		$ -	60.00	$ 3,794,820.00
587	7.07.02.30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑO 1 HOMBRES PISO 1 ZONA ORIENTAL -UVE-TH-04EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 60 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	60.00	63,247.00	$ 3,794,820.00		$ -		$ -	60.00	$ 3,794,820.00
588	7.07.02.31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-05EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 50 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	50.00	63,247.00	$ 3,162,350.00		$ -		$ -	50.00	$ 3,162,350.00
589	7.07.02.32			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-06EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	55.00	63,247.00	$ 3,478,585.00		$ -		$ -	55.00	$ 3,478,585.00
590	7.07.02.33			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-07EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 5X3A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00		$ -		$ -	55.00	$ 3,478,585.00
591	7.07.02.34			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVE-TH-08EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00		$ -		$ -	55.00	$ 3,478,585.00
592	7.07.02.35			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVS-01EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X12.5A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00		$ -		$ -	55.00	$ 3,478,585.00
593	7.07.02.36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UVS-02EN CALIBRE 3X12 CU + 12CU N + 12 CU T CON UNA DISTANCIA DE 55 METROS POR DUCTO IMC 1"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X12.5A	ML	55.00	$ 63,247.00	$ 3,478,585.00		$ -		$ -	55.00	$ 3,478,585.00
				AUDITORIO										
594	7.07.02.37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUX AUDITORIO UC-DX-RV-10EN CALIBRE 3X4/0 AL F + 1/0 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 22 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X140A	ML	-	$ 252,681.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
595	7.07.02.38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD INTERIOR RV-DX-10EN CALIBRE 2X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 45 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 2X25A	ML	-	$ 58,864.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
596	7.07.02.39			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUDITORIO 1 UC-DX-RV-11EN CALIBRE 3X2/0 AL F + 2 AL N + 2CU T CON UNA DISTANCIA DE 28 METROS POR DUCTO IMC 4"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X110A	ML	-	227,173.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
597	7.07.02.40			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD AUDITORIO RV-DX-11EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 40 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X40A	ML	-	63,247.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
598	7.07.02.41			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA AUDITORIO 2 UC-DX-RV-12EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 25 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X110A	ML	-	63,247.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
599	7.07.02.42			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA UNIDAD AUDITORIO 2 RV-DX-12EN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X40A	ML	-	63,247.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
600	7.07.02.43			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BAÑOS AUDITORIOEN CALIBRE 3X6 AL F + 6 AL N + 10CU T CON UNA DISTANCIA DE 38 METROS POR DUCTO IMC 2"O BANDEJA PORTACABLE Y UNA PROTECCIÓN DE 3X10A	ML	-	63,247.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	7.08			**APANTALLAMIENTO**										
601	7.08.01			PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO (ALTURA 100 CM)	UND	15.00	$ 123,587.00	$ 1,853,805.00		$ -		$ -	15.00	$ 1,853,805.00
602	7.08.02			BASE MÓVIL DE ACERO GALVANIZADO PARA PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO	UND	15.00	$ 78,971.00	$ 1,184,565.00		$ -		$ -	15.00	$ 1,184,565.00
603	7.08.03			ALAMBRÓN DE ALUMINIO D=8MM	ML	342.12	$ 9,488.00	$ 3,246,035.00		$ -		$ -	342.12	$ 3,246,035.00
604	7.08.04			SOPORTE PLÁSTICO PARA ALAMBRÓN	UND	362.00	$ 9,609.00	$ 3,478,458.00		$ -		$ -	362.00	$ 3,478,458.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
605	7.08.05			CABLE DE COBRE 2/0 AWG	ML	205.87	$ 77,601.00	$ 15,975,718.00		$ -		$ -	205.87	$ 15,975,718.00
606	7.08.06			TUBERÍA PVC 3/4"	ML	8.00	$ 6,573.00	$ 52,584.00		$ -		$ -	8.00	$ 52,584.00
607	7.08.07			TUBERÍA IMC 3/4"	ML	8.00	$ 100,543.00	$ 804,344.00		$ -		$ -	8.00	$ 804,344.00
608	7.08.08			GRAPA BIMETÁLICA	UND	8.00	$ 36,190.00	$ 289,520.00		$ -		$ -	8.00	$ 289,520.00
609	7.08.09			GRAPA UNIVERSAL	UND	16.00	$ 16,646.00	$ 266,336.00		$ -		$ -	16.00	$ 266,336.00
610	7.08.10			SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA CONEXIÓN EN "T"	UND	4.00	$ 64,697.00	$ 258,788.00		$ -		$ -	4.00	$ 258,788.00
611	7.08.11			CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM	UND	7.00	$ 124,308.00	$ 870,156.00		$ -		$ -	7.00	$ 870,156.00
612	7.08.12			CAJA CONEXIÓN BIMETÁLICA 14X14:	UND	4.00	$ 36,190.00	$ 144,760.00		$ -		$ -	4.00	$ 144,760.00
613	7.08.13			VARILLA COPPERWELD 5/8"X2,44M	UND	7.00	$ 408,433.00	$ 2,859,031.00		$ -		$ -	7.00	$ 2,859,031.00
	7.09			**ACOMETIDAS ELECTRICAS**										
614	7.09.01			ACOMETIDA DESDE TABLERO EXTRACCIÓN HASTA MAQUINAS DE EXTRACCIÓN EN CUBIERTA EN 3X10 Cu FASES + 1X10 Cu T	ML	51.00	$ 20,213.00	$ 1,030,863.00		$ -		$ -	51.00	$ 1,030,863.00
615	7.09.02			DUCTO EMT 1" PARA ACOMETIDAS DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN EN CUBIERTA	ML	47.00	$ 31,957.00	$ 1,501,979.00		$ -		$ -	47.00	$ 1,501,979.00
616	7.09.03			DUCTO EMT 3/4" PARA SEÑAL DE CAMPAÑAS EXTRACTORAS Y PROCESSING CENTER	ML	157.00	$ 11,919.00	$ 1,871,283.00		$ -		$ -	157.00	$ 1,871,283.00
617	7.09.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4".	ML	47.00	$ 15,995.00	$ 751,765.00		$ -		$ -	47.00	$ 751,765.00
618	7.09.05			DUCTO EMT 2" PARA VERTICAL DE SEÑALES CAMPANAS EXTRACTORAS.	ML	12.00	$ 36,366.00	$ 436,392.00		$ -		$ -	12.00	$ 436,392.00
619	7.09.06			SEÑAL MULTIFILAR PARA EXTRACCIÓN 4X16AWG	ML	581.00	$ 8,989.00	$ 5,222,609.00		$ -		$ -	581.00	$ 5,222,609.00
620	7.09.07			SEÑAL MULTIFILAR PARA EXTRACCIÓN DESDE PROGRESING HASTA TABLERO DE EXTRACCIÓN CUBIERTA 8X16 AWG.	ML	42.00	$ 17,782.00	$ 746,844.00		$ -		$ -	42.00	$ 746,844.00
	7.10			**SUBESTACION**										
	7.10.01			**OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: PUNTO DE CONEXIÓN**										
621	7.10.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15 KV, 3 X 185 MM2 DESDE PUNTO DE CONEXIÓN (POSTE PROYECTADO FRENTE AL PREDIO EN SEPARADOR) HASTA CELDA DE ENTRADA EN SUBESTACIÓN	ML	200.00	$ 317,509.00	$ 63,501,800.00		$ -		$ -	200.00	$ 63,501,800.00
622	7.10.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE LINEA (ENTRADA Y SALIDA) SEGUN NORMA CTS508 DOTADA CON UN INTERRUPTOR-SECCIONADOR DE TRES POSICIONES (CONECTADO, SECCIONADO Y PUESTO A TIERRA), AISLADOS EN SF6 15KV 630 A, QUE PERMITE CONECTAR LOS CABLES DE MEDIA TENSION CON EL BARRAJE DEL CONJUNTO DE CELDAS, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR. CELDAS DE ENTRADA Y SALIDA.	UND	1.00	$ 48,573,053.00	$ 48,573,053.00		$ -		$ -	1.00	$ 48,573,053.00
623	7.10.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CELDA SF6 UNIDAD DE PROTECCIÓN CON FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE TIPO HH, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN, CON TRES (3) FUSIBLES TIPO HH DE 40 AMP.	UND	1.00	$ 35,611,559.00	$ 35,611,559.00		$ -		$ -	1.00	$ 35,611,559.00
624	7.10.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA, CON APERTURA Y CIERRE A TRAVÉS DE DOBLE RESORTE DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN.	UND	1.00	$ 36,388,860.00	$ 36,388,860.00		$ -		$ -	1.00	$ 36,388,860.00
625	7.10.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLPE 15 KV, 3 X 95 MM2 DESDE CELDA HASTA TRANSFORMADOR DE 630 KVA	ML	12.00	$ 285,735.00	$ 3,428,820.00		$ -		$ -	12.00	$ 3,428,820.00
	7.10.02			**OBRAS ELECTRICAS MEDIA TENSION: SUBESTACION**										
626	7.10.02.01			TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INT 15 KV No. 240 mm	JG	3.00	$ 939,061.00	$ 2,817,183.00		$ -		$ -	3.00	$ 2,817,183.00
627	7.10.02.02			TRAFO. 3F SECO CLASE F 630KVA 13200/208-120 V, incluye sondas PT100	UND	1.00	$ 115,451,171.00	$ 115,451,171.00		$ -		$ -	1.00	$ 115,451,171.00
628	7.10.02.03			DPS EN TRANSFORMADOR 15KV-10KA	JG	1.00	$ 873,225.00	$ 873,225.00		$ -		$ -	1.00	$ 873,225.00
629	7.10.02.04			INTERFACE DE CONEXIÓN CON TRANSFORMADOR DE 2000A	UND	4.00	$ 3,531,824.00	$ 14,127,296.00		$ -		$ -	4.00	$ 14,127,296.00
630	7.10.02.05			PLATINA ESPECIAL 7 HUECOSTERMINAL BT TRANSFORMADOR	UND	4.00	$ 800,590.00	$ 3,202,360.00		$ -		$ -	4.00	$ 3,202,360.00
631	7.10.02.06			CANALIZACIÓN PVC 7Ø4" TDP SOBRE CARCAMO	ML	12.00	$ 519,100.00	$ 6,229,200.00		$ -		$ -	12.00	$ 6,229,200.00
632	7.10.02.07			MALLA TIERRA SUBESTACION	GLB	1.00	$ 9,651,958.00	$ 9,651,958.00		$ -		$ -	1.00	$ 9,651,958.00
633	7.10.02.08			CAMARA INSP. TIERRAS 0,3X0,3 M	UND	2.00	$ 276,864.00	$ 553,728.00		$ -		$ -	2.00	$ 553,728.00
634	7.10.02.09			CONDUCTOR DE TIERRA TABLEROS Y/O EQUIPOS No4/0 AWG Cu	ML	18.00	$ 73,630.00	$ 1,325,340.00		$ -		$ -	18.00	$ 1,325,340.00
635	7.10.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE MEDIDAS 2000MM X 1500MM X 2300MM ; MEDIDAS APROXIMADAS A CONFIRMAR CON EL FABRICANTE DEL TRASNFORMADOR	UND	1.00	$ 11,907,929.00	$ 11,907,929.00		$ -		$ -	1.00	$ 11,907,929.00
636	7.10.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MARQUILLAS SEGÚN RETIE	GLB	1.00	$ 780,785.00	$ 780,785.00		$ -		$ -	1.00	$ 780,785.00
637	7.10.02.12			PINTURA EPOXICA PARA INDICAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CUARTO DE CELDAS, TRASNFORMADOR Y PLANTA ELÉCTRICA	GLB	1.00	$ 1,164,359.00	$ 1,164,359.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,164,359.00
	7.11			**PLANTA ELÉCTRICA**										
638	7.11.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE SUPLENCIA TOTAL Y RED CONTRAINCENDIOS CON CAPACIDAD DE 630KVA ALTURA NIVEL DE VALLEDUPAR. PLANTA CERRADA, MOTOR CUMMINS Y ALTERNADOR STAMFORD O SIMILAR. NIVEL DE VOLTAJE DE GENERACIÓN 120-208V.	UND	1.00	$ 519,312,608.00	$ 519,312,608.00		$ -		$ -	1.00	$ 519,312,608.00
639	7.11.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DE GASES DE PLANTA ELÉCTRICA	ML	12.00	$ 736,134.00	$ 8,833,608.00		$ -		$ -	12.00	$ 8,833,608.00
640	7.11.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRECALENTADOR DE CAMISAS PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 500KVA 1000KVA	UND	1.00	$ 1,020,000.00	$ 1,020,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,020,000.00
641	7.11.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA CONEXIÓN DE PRECALENTADOR, CARGADOR DE BATERÍAS, SEÑALES DE PLANTA.	GLB	1.00	$ 2,040,000.00	$ 2,040,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,040,000.00
	7.12			**URBANISMO - OBRAS CIVILES PARA MT Y BT**										
642	7.12.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 6Ø6" PVC	ML	150.00	$ 511,662.00	$ 76,749,300.00		$ -		$ -	150.00	$ 76,749,300.00
643	7.12.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE BANCO DE DUCTOS DE 4Ø6" PVC	ML	50.00	$ 455,048.00	$ 22,752,400.00		$ -		$ -	50.00	$ 22,752,400.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
644	7.12.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA VEHICULAR	UND	4.00	$ 8,256,800.00	$ 33,027,200.00		$ -		$ -	4.00	$ 33,027,200.00
645	7.12.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERIA 40X40 PARA RED REGULADA	UND	4.00	$ 1,926,063.00	$ 7,704,252.00		$ -		$ -	4.00	$ 7,704,252.00
646	7.12.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE 60X60X20.	UND	1.00	$ 624,926.00	$ 624,926.00		$ -		$ -	1.00	$ 624,926.00
647	7.12.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE CONEXIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN SEGÚN NORMA LA228. INCLUYE DPS, BAJANTE EN TUBERÍA IMC DE 6" X 6 M, CONECTORES AMPAC, PUESTA A TIERRA, VARILLA COOPERWELD, CABLE DE COBRE 4 AWG BAJANTE 1/2" Y TODOS LOS ACCESORIOS SEGÚN LA NORMA.	UND	1.00	$ 5,482,960.00	$ 5,482,960.00		$ -		$ -	1.00	$ 5,482,960.00
	7.13			**CANALIZACION**										
	7.13.01			**INFRAESTRUCTURA CIVIL**										
648	7.13.01.01			CAJA DE PASO PREFABRICADA EN CONCRETO DE 30CMX30CM PARA CANALIZACIÓN DE RED DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR	UND	10.00	$ 191,940.00	$ 1,919,400.00		$ -		$ -	10.00	$ 1,919,400.00
649	7.13.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1" TDP	ML	100.00	$ 13,103.00	$ 1,310,300.00		$ -		$ -	100.00	$ 1,310,300.00
650	7.13.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA AP 10M. MATERIAL CONCRETO	UND	10.00	$ 1,142,727.00	$ 11,427,270.00		$ -		$ -	10.00	$ 11,427,270.00
	7.13.02			**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**										
651	7.13.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LUMINARIA.	UND	3.00	$ 432,532.00	$ 1,297,596.00		$ -		$ -	3.00	$ 1,297,596.00
652	7.13.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3 X 10 + 10 CU, INCLUYE MARCACIÓN	ML	100.00	$ 36,717.00	$ 3,671,700.00		$ -		$ -	100.00	$ 3,671,700.00
653	7.13.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME EN GEL O RESINA PARA DERIVACIÓN DE AP.	UND	30.00	$ 121,749.00	$ 3,652,470.00		$ -		$ -	30.00	$ 3,652,470.00
654	7.13.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ROY ALPHA RALED II 74W.	UND	10.00	$ 1,680,746.00	$ 16,807,460.00		$ -		$ -	10.00	$ 16,807,460.00
655	7.13.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA DERIVACIÓN DESDE LUMINARIA Y HASTA CAJA AP MÁS CERCANA	UND	10.00	$ 112,121.00	$ 1,121,210.00		$ -		$ -	10.00	$ 1,121,210.00
656	7.13.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA LUMINARIA BRAZO SENCILLO 60CM	UND	6.00	$ 303,929.00	$ 1,823,574.00		$ -		$ -	6.00	$ 1,823,574.00
	8.00			**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**										
	8.01			**CCTV - NIVEL 1 - NIVEL 2 - AUDITORIO**										
657	8.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	4,059.60	$ 15,301.00	$ 62,115,940.00		$ -		$ -	4,059.60	$ 62,115,940.00
658	8.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CÁMARAS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	95.00	$ 98,257.00	$ 9,334,415.00		$ -		$ -	95.00	$ 9,334,415.00
659	8.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE CÁMARAS.	UND	95.00	$ 121,407.00	$ 11,533,665.00		$ -		$ -	95.00	$ 11,533,665.00
660	8.01.04			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	95.00	$ 54,663.00	$ 5,192,985.00		$ -		$ -	95.00	$ 5,192,985.00
661	8.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0 MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	149.00	$ 147,721.00	$ 22,010,429.00		$ -		$ -	149.00	$ 22,010,429.00
662	8.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO INTERIOR DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	UND	42.00	$ 428,488.00	$ 17,996,496.00		$ -		$ -	42.00	$ 17,996,496.00
663	8.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BALA DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	UND	29.00	$ 441,555.00	$ 12,805,095.00		$ -		$ -	29.00	$ 12,805,095.00
664	8.01.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA IP TIPO DOMO EXTERIOR DE 4MP, CHASIS ,METÁLICO, ALCANCE HASTA 30M	UND	6.00	$ 3,524,519.00	$ 21,147,114.00		$ -		$ -	6.00	$ 21,147,114.00
665	8.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRABADOR IP NVR 16 CANALES	UND	8.00	$ 2,337,408.00	$ 18,699,264.00		$ -		$ -	8.00	$ 18,699,264.00
666	8.01.10			CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CCTV	GLB	1.00	$ 9,198,779.00	$ 9,198,779.00		$ -		$ -	1.00	$ 9,198,779.00
667	8.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS DUROS PARA GRABACIÓN DE CCTV, 4TB DISEÑADOS PARA VIDEO VIGILANCIA	UND	10.00	$ 1,137,976.00	$ 11,379,760.00		$ -		$ -	10.00	$ 11,379,760.00
668	8.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR GRADO INDUSTRIAL 49" LED, PARA CUARTO DE MONITOREO	UND	3.00	$ 3,038,762.00	$ 9,116,286.00		$ -		$ -	3.00	$ 9,116,286.00
669	8.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADOR CORE I7, CON PUERTOS DE RED 1GBPS, LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO, TECLADO Y MOUSE	UND	3.00	$ 5,621,614.00	$ 16,864,842.00		$ -		$ -	3.00	$ 16,864,842.00
	8.02			**CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO**										
	8.02.01			**CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 1**										
670	8.02.01.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	5,823.00	$ 15,301.00	$ 89,097,723.00		$ -		$ -	5,823.00	$ 89,097,723.00
671	8.02.01.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	65.00	$ 75,564.00	$ 4,911,660.00		$ -		$ -	65.00	$ 4,911,660.00
672	8.02.01.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DATOS.	UND	5.00	$ 368,734.00	$ 1,843,670.00		$ -		$ -	5.00	$ 1,843,670.00
673	8.02.01.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	UND	60.00	$ 685,186.00	$ 41,111,160.00		$ -		$ -	60.00	$ 41,111,160.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
674	8.02.01.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	4.00	$ 75,564.00	$ 302,256.00		$ -		$ -	4.00	$ 302,256.00
675	8.02.01.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	UND	4.00	$ 368,734.00	$ 1,474,936.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,474,936.00
676	8.02.01.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	249.00	$ 71,702.00	$ 17,853,798.00		$ -		$ -	249.00	$ 17,853,798.00
677	8.02.01.08			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	129.00	$ 54,663.00	$ 7,051,527.00		$ -		$ -	129.00	$ 7,051,527.00
678	8.02.01.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	18.00	$ 75,564.00	$ 1,360,152.00		$ -		$ -	18.00	$ 1,360,152.00
679	8.02.01.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	UND	18.00	$ 825,494.00	$ 14,858,892.00		$ -		$ -	18.00	$ 14,858,892.00
680	8.02.01.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	UND	26.00	$ 680,587.00	$ 17,695,262.00		$ -		$ -	26.00	$ 17,695,262.00
681	8.02.01.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	UND	20.00	$ 487,091.00	$ 9,741,820.00		$ -		$ -	20.00	$ 9,741,820.00
682	8.02.01.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	510.00	$ 8,345.00	$ 4,255,950.00		$ -		$ -	510.00	$ 4,255,950.00
683	8.02.01.14			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	12.00	$ 362,093.00	$ 4,345,116.00		$ -		$ -	12.00	$ 4,345,116.00
	8.02.02			**CABLEADO ESTRUCTURADO NIVEL 2**										
684	8.02.02.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	6,654.00	$ 15,301.00	$ 101,812,854.00		$ -		$ -	6,654.00	$ 101,812,854.00
685	8.02.02.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	68.00	$ 75,564.00	$ 5,138,352.00		$ -		$ -	68.00	$ 5,138,352.00
686	8.02.02.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	UND	68.00	$ 685,186.00	$ 46,592,648.00		$ -		$ -	68.00	$ 46,592,648.00
687	8.02.02.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	4.00	$ 75,564.00	$ 302,256.00		$ -		$ -	4.00	$ 302,256.00
688	8.02.02.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	UND	4.00	$ 368,734.00	$ 1,474,936.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,474,936.00
689	8.02.02.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	276.00	$ 71,702.00	$ 19,789,752.00		$ -		$ -	276.00	$ 19,789,752.00
690	8.02.02.07			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	140.00	$ 54,663.00	$ 7,652,820.00		$ -		$ -	140.00	$ 7,652,820.00
691	8.02.02.08			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTROL DE ACCESO EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	11.00	$ 75,564.00	$ 831,204.00		$ -		$ -	11.00	$ 831,204.00
692	8.02.02.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	UND	11.00	$ 825,494.00	$ 9,080,434.00		$ -		$ -	11.00	$ 9,080,434.00
693	8.02.02.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	UND	8.00	$ 680,587.00	$ 5,444,696.00		$ -		$ -	8.00	$ 5,444,696.00
694	8.02.02.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	UND	10.00	$ 487,091.00	$ 4,870,910.00		$ -		$ -	10.00	$ 4,870,910.00
695	8.02.02.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	510.00	$ 8,345.00	$ 4,255,950.00		$ -		$ -	510.00	$ 4,255,950.00
696	8.02.02.13			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	6.00	$ 362,093.00	$ 2,172,558.00		$ -		$ -	6.00	$ 2,172,558.00
	8.02.03			**CABLEADO ESTRUCTURADO AUDITORIO**										

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
697	8.02.03.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE F-UTP 4 PARES, CATEGORÍA 6A, CLASIFICACIÓN LSZH, COLOR AMARILLO, MARCA LEGRAND, INCLUYE LABELS, CINTA AUTOADHESIVA, VELCRO 3/8" Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN BANDEJA TIPO ESCALERILLA Y GABINETE DE CABLEADO.	ML	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
698	8.02.03.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA DATOS EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE 3/4" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS, GRAPAS GALVANIZADAS Y MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
699	8.02.03.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ-45 CATEGORÍA 6A, MARCA LEGRAND, PARA INSTALACIÓN SALIDAS VOZ Y DATOS.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
700	8.02.03.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ACCES POINT EN TUBERÍA CONDUIT SEGÚN UBICACIÓN CON DIÁMETRO DE ¾" O SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, INCLUYE ACCESORIOS DE UNIÓN PARA TUBERÍA EMT, ADAPTADORES TERMINALES Y CODOS EMT, ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN MURO MEDIANTE CHAZOS Y GRAPAS GALVANIZADAS, MARCACIÓN DE TUBERÍA SEGÚN NORMAS LOCALES.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
701	8.02.03.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS CON MÓDULO JACK RJ45 CAT 6A F/UTP - S/FTP CATEGORÍA 6A, MARCA ORTRONICS, PARA INSTALACIÓN SALIDAS DE ACCES POINT.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
702	8.02.03.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 3 METROS, AMARILLO PARA USUARIO	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
703	8.02.03.07			CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS EN CATEGORÍA 6A, MEDIANTE INSTRUMENTO CALIBRADO Y CERTIFICADO.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
704	8.02.03.08			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
705	8.02.03.09			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA DE PROXIMIDAD DUAL HUELLA / TARJETA, TAMPER, HASTA 1024 USUARIOS Y 1200 EVENTOS DE MEMORIA. INLCUYE CABLE DE CONEXIÓN PARA FUNCIONAMIENTO.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
706	8.02.03.10			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROIMÁN 400 LBS	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
707	8.02.03.11			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTÓN NO TOUCH, 12 O 24 VDC, INCLUYE SOPORTE EN U PARA PUERTA DE VIDRIO	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
708	8.02.03.12			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X18 AWG, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS.	ML	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
709	8.02.03.13			SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA HDMI INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE 1.1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE INCIDENCIA DE: TOMA, CAJA 10X10CM , TERMINALES, CURVAS , MARQUILLADO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE E INSTALADOS SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	-		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	8.02.04			**EQUIPOS Y CONFIGURACIONES**										
710	8.02.04.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GX PARA SERVIDORES 42 UR, 800X1000 MM. MARCA: LINKEO, INCLUYE: PUERTA FRONTAL COMPLETA PERFORADA, PUERTA POSTERIOR COMPLETA PERFORADA, PANELES LATERALES, NIVELADORES, CABLES EQUITEPOTENCIALES, KIT ANTI INCLINACIÓN, PORCENTAJE DE PERFORACIÓN EN LAS PUERTAS: 80%, VELCRO 3/8" PARA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO, ACCESORIOS PARA ENSAMBLE Y ANCLAJE DEL RACK. CAPACIDAD DE CARGA: 1500 KG. GRADO DE PROTECCIÓN: IP20. COLOR: NEGRO RAL 9005. CUMPLIMIENTO NORMATIVO: IEC 60917, IEC 60297, IEC 60068-1, IEC 60068-2, IEC 60695-11-10, IEC 60950-1	UND	3.00	$ 11,840,727.00	$ 35,522,181.00		$ -		$ -	3.00	$ 35,522,181.00
711	8.02.04.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE PLANO HD 24 PUERTOS 1 U/UTP - F/UTP - S/FTP PARA CAT6 Y CAT 6A. MONTAJE QUICK-FIX (SIN TORNILLOS). (INCLUYE 24 JACK HD63 CAT 6A F/UTP - S/FTP PARA PATCH PANEL QUICK-FIX. 100% METÁLICO. AUTOPONCHABLE. Y 24 PATCH CORD V-SERIES CATEGORÍA 6A, F/UTP, DIÁMETRO REDUCIDO 26 AWG 6.0MM, 1 METRO, AMARILLO)	UND	12.00	$ 3,313,969.00	$ 39,767,628.00		$ -		$ -	12.00	$ 39,767,628.00
712	8.02.04.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA AJUSTABLE VENTILADA 1 U, PARA GABINETE DE 800 MM DE PROFUNDIDAD	UND	3.00	$ 893,705.00	$ 2,681,115.00		$ -		$ -	3.00	$ 2,681,115.00
713	8.02.04.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PDU BÁSICA HORIZONTAL ENTRADA: 120V - 15A NEMA 5-15P, 8 SALIDAS NEMA 5-15R. INCLUYE SUPRESOR DE 13KA.	UND	3.00	$ 774,506.00	$ 2,323,518.00		$ -		$ -	3.00	$ 2,323,518.00
714	8.02.04.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL TIPO CANAL CON PUERTA, 42 U, ANCHO 4", (KIT 2 UND)	UND	3.00	$ 1,169,714.00	$ 3,509,142.00		$ -		$ -	3.00	$ 3,509,142.00
715	8.02.04.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U DELANTERO - TRASERO ALTA CAPACIDAD CON TAPA ABATIBLE.	UND	15.00	$ 1,389,714.00	$ 20,845,710.00		$ -		$ -	15.00	$ 20,845,710.00
716	8.02.04.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK DE 1"X19-1/4" QUE INCLUYE: 1 BARRAJE HORIZONTAL DE 1" X 4"; 1 PLACA DE EMPALME DE 3" CON DOS PERFORACIONES; 2 AISLADORES BLANCOS DELRIN; 2 TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 12-24 X 5/8"; 2 TORNILLO DE BRONCE COBRIZADO 12-24 X 3/4"; · 8 ARANDELA PLANA DE COBRE # 12; 8 TERMINAL DE ANILLO # 6-32 X 1/4".	UND	3.00	$ 1,145,444.00	$ 3,436,332.00		$ -		$ -	3.00	$ 3,436,332.00
717	8.02.04.08			MARQUILLAS	UND	576.00	$ 6,638.00	$ 3,823,488.00		$ -		$ -	576.00	$ 3,823,488.00
718	8.02.04.09			SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE COMUNICACIONES	UND	2.00	$ 2,461,754.00	$ 4,923,508.00		$ -		$ -	2.00	$ 4,923,508.00
719	8.02.04.10			SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA FUNCIONARIOS	UND	40.00	$ 15,027.00	$ 601,080.00		$ -		$ -	40.00	$ 601,080.00
720	8.02.04.11			LECTOR DE HUELLA PARA ENROLAMIENTO DE USUARIO, CONEXIÓN USB CON ESTACIÓN DE TRABAJO	UND	4.00	$ 403,752.00	$ 1,615,008.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,615,008.00
721	8.02.04.12			CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, Y PUESTA EN MARCHA	UND	1.00	$ 1,069,225.00	$ 1,069,225.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,069,225.00
722	8.02.04.13			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTORA PARA ENROLAMIENTO DE TARJETAS , MIFARE, FELICA, NFC ISO 18092.	UND	4.00	$ 469,861.00	$ 1,879,444.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,879,444.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
723	8.02.04.14			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 40 KVA ONLINE	UND	1.00	$ 139,981,276.00	$ 139,981,276.00		$ -		$ -	1.00	$ 139,981,276.00
724	8.02.04.15			SUMINISTRO E INSTALACION, SWICHT DE ACCESO = 48-PUERTOS GIGABITETHERNET RJ45= 2-PUERTOS GIGABITETHERNET SFP+, = 200 GBPS (CAPACIDAD FULL-DUPLEX), SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DEFENSORIA,	UND	8.00	$ 11,321,298.00	$ 90,570,384.00		$ -		$ -	8.00	$ 90,570,384.00
725	8.02.04.16			SUMINISTRO E INSTALACION, ACCES POINT , BANDS DE FRECUENCIA 2,4 GHZ Y 5 GHZ (DUAL), ANCHO DE BANDA DEL CANAL 20 MHZ @ 2,4 GHZ 20/40/80 MHZ @ 5 GHZ, CAPACIDAD MÁXIMA DE USUARIOS = 400, ANTENA OBNIDIRECCIONAL. ALIMENTACIO POE	UND	14.00	$ 2,678,894.00	$ 37,504,516.00		$ -		$ -	14.00	$ 37,504,516.00
726	8.02.04.17			SUMINISTRO E INSTALACION, MODULO DE REGISTRO BIOMETRICO, TECNOLOGÍA INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA BIOSTAR 2 V2.7.0.50 (FABRICANTE SUPREMA PLATAFORMA EXISTENTE) SOPORTE DE LFD (LIVE FINGER DETECTION)	UND	16.00	$ 1,994,752.00	$ 31,916,032.00		$ -		$ -	16.00	$ 31,916,032.00
727	8.02.04.18			SUMINISTRO E INSTALACION,UNIDAD CENTRAL (SERVIDOR BIOSTAR 2) PARA CONTROL DE ACCESO, LICENCIAS SEGÚN SPECIFICACIONES	UND	1.00	$ 10,025,078.00	$ 10,025,078.00		$ -		$ -	1.00	$ 10,025,078.00
	8.02.05			**BACKBONE DE FIBRA OPTICA**										
728	8.02.05.01			CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, TIPO INTERIOR PARA CONEXIÓN DE CUARTOS TECNICOS NIVEL 1 A CUARTO TECNICO NIVEL 2 Y CUARTO TECNICO SEGURIDAD	ML	200.00	$ 105,887.00	$ 21,177,400.00		$ -		$ -	200.00	$ 21,177,400.00
729	8.02.05.02			BANDEJA DE FIBRA OPTICA 1U, PARA CUATRO MODULOS DE 6 PUERTOS	UND	3.00	$ 1,561,938.00	$ 4,685,814.00		$ -		$ -	3.00	$ 4,685,814.00
730	8.02.05.03			MODULO FIBRA OPTICA (FO) LC - LC	UND	12.00	$ 467,318.00	$ 5,607,816.00		$ -		$ -	12.00	$ 5,607,816.00
731	8.02.05.04			PATCH CORD DE FIBRA OPTICA LC-LC, L= 2,1 M	UND	6.00	$ 364,112.00	$ 2,184,672.00		$ -		$ -	6.00	$ 2,184,672.00
732	8.02.05.05			CERTIFICACIÓN DE FIBRA, MEDIANTE INSTRUMENTO CERTIFICADO/CALIBRADO	GLB	1.00	$ 1,622,813.00	$ 1,622,813.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,622,813.00
	8.02.06			**TELEFONIA**										
733	8.02.06.01			SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE TELEFONO GRANDSTRING IP 2 LINEAS	UND	-	$ 398,636.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
734	8.02.06.02			SUMINISTRO E INSTALACION E INSTALACION DE GXP 2160 GRANDSTREAM (TELEFONO IP DE 6 1 19 0 355,463.00 355,463 LINEAS HD)	UND	-	$ 455,636.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
735	8.02.06.03			SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PLATA IP CON TRONCAL DE OPERADOR DIGITAL PARA ENTRADA Y SALIDA DE LLAMAS	UND	-	$ 9,331,316.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	9.00			**SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO**										
736	9.01			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 408.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	1.00	$ 77,844,583.00	$ 77,844,583.00		$ -		$ -	1.00	$ 77,844,583.00
737	9.02			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 456.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	1.00	$ 80,261,930.00	$ 80,261,930.00		$ -		$ -	1.00	$ 80,261,930.00
738	9.03			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 216.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	2.00	$ 39,047,800.00	$ 78,095,600.00		$ -		$ -	2.00	$ 78,095,600.00
739	9.04			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 264.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	1.00	$ 41,952,800.00	$ 41,952,800.00		$ -		$ -	1.00	$ 41,952,800.00
740	9.05			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 360.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	2.00	$ 67,156,684.00	$ 134,313,368.00		$ -		$ -	2.00	$ 134,313,368.00
741	9.06			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 480.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	2.00	$ 80,152,500.00	$ 160,305,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 160,305,000.00
742	9.07			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 384.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	-	$ 69,659,200.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
743	9.08			UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE R410 CON CAPACIDAD DE 312.000 BTU/H. 208V/3PH/60HZ. DESCARGA VERTICAL	UND	-	$ 65,627,890.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
744	9.09			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 76.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	4.00	$ 11,271,433.00	$ 45,085,732.00		$ -		$ -	4.00	$ 45,085,732.00
745	9.10			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 58.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	8.00	$ 10,583,420.00	$ 84,667,360.00		$ -		$ -	8.00	$ 84,667,360.00
746	9.11			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 54.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	8.00	$ 6,100,820.00	$ 48,806,560.00		$ -		$ -	8.00	$ 48,806,560.00
747	9.12			UNIDAD INTERIOR TIPO FAN COIL PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO ALAMBRADO Y BOMBA DE CONDENSADOS	UND	1.00	$ 5,862,620.00	$ 5,862,620.00		$ -		$ -	1.00	$ 5,862,620.00
748	9.13			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 4,117,660.00	$ 4,117,660.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,117,660.00
749	9.14			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 4,624,860.00	$ 4,624,860.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,624,860.00
750	9.15			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 5,092,660.00	$ 10,185,320.00		$ -		$ -	2.00	$ 10,185,320.00
751	9.16			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 36.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	10.00	$ 5,155,284.00	$ 51,552,840.00		$ -		$ -	10.00	$ 51,552,840.00
752	9.17			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 5,264,387.00	$ 10,528,774.00		$ -		$ -	2.00	$ 10,528,774.00
753	9.18			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE REDONDO PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 48.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 5,777,580.00	$ 5,777,580.00		$ -		$ -	1.00	$ 5,777,580.00
754	9.19			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	1.00	$ 4,493,260.00	$ 4,493,260.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,493,260.00
755	9.20			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	3.00	$ 4,506,060.00	$ 13,518,180.00		$ -		$ -	3.00	$ 13,518,180.00
756	9.21			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2 VÍAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 4,594,860.00	$ 9,189,720.00		$ -		$ -	2.00	$ 9,189,720.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
757	9.22			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	10.00	$ 4,372,360.00	$ 43,723,600.00		$ -		$ -	10.00	$ 43,723,600.00
758	9.23			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	15.00	$ 4,431,960.00	$ 66,479,400.00		$ -		$ -	15.00	$ 66,479,400.00
759	9.24			UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 24.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO Y PANEL DECORATIVO	UND	2.00	$ 4,454,860.00	$ 8,909,720.00		$ -		$ -	2.00	$ 8,909,720.00
760	9.25			UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	UND	4.00	$ 3,310,420.00	$ 13,241,680.00		$ -		$ -	4.00	$ 13,241,680.00
761	9.26			UNIDAD INTERIOR TIPO PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE DE 12.000 BTU/H, 208V/1PH/60HZ. INCLUYE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO	UND	4.00	$ 2,873,920.00	$ 11,495,680.00		$ -		$ -	4.00	$ 11,495,680.00
762	9.27			UNIDAD MANEJADORA PARA EXTERIOR DE 360.000 BTU/H CON 15.000 CFM, 208V/3PH/60HZ. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA ALAMBRICO	UND	1.00	$ 240,194,460.00	$ 240,194,460.00		$ -		$ -	1.00	$ 240,194,460.00
763	9.28			UNIDAD MANEJADORA PARA EXTERIOR DE 300.000 BTU/H CON 4.500 CFM, 208V/3PH/60HZ. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA ALAMBRICO	UND	-	$ 126,362,420.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
764	9.29			UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN CON CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL	UND	1.00	$ 84,036,500.00	$ 84,036,500.00		$ -		$ -	1.00	$ 84,036,500.00
765	9.30			UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU/H. 208V/1PH/60HZ. CONDENSADORA CON DESCARGA HORIZONTAL	UND	3.00	$ 90,938,400.00	$ 272,815,200.00		$ -		$ -	3.00	$ 272,815,200.00
766	9.31			CAJA DE VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE CON DESCARGA HORIZONTAL PARA CAUDAL DE 4800 CFM @ 1" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	UND	2.00	$ 19,973,420.00	$ 39,946,840.00		$ -		$ -	2.00	$ 39,946,840.00
767	9.32			VENTILADOR DE TECHO PARA RECIRCULACIÓN DE AIRE ZONA LÚDICA DE TERRAZA	UND	1.00	$ 5,805,530.00	$ 5,805,530.00		$ -		$ -	1.00	$ 5,805,530.00
768	9.33			VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO PARA CAUDAL DE 1450 CFM @ 0,6" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	UND	8.00	$ 11,464,300.00	$ 91,714,400.00		$ -		$ -	8.00	$ 91,714,400.00
769	9.34			VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE TIPO HONGO PARA CAUDAL DE 2650 CFM @ 0,6" CDA, 208V/3PH/60HZ. BAÑOS	UND	-	$ 12,654,900.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
770	9.35			VENTILADOR JET LINE UVS-JL-150. 110V/1PH/60 HZ (SUMINISTRO DE AIRE)	UND	7.00	$ 1,294,420.00	$ 9,060,940.00		$ -		$ -	7.00	$ 9,060,940.00
771	9.36			VENTILADOR JET LINE UVE-JL-200. 110V/1PH/60 HZ (PARQUEADERO PRIVADO-BASURAS)	UND	3.00	$ 1,713,815.00	$ 5,141,445.00		$ -		$ -	3.00	$ 5,141,445.00
772	9.37			VENTILADOR CENTRIFUGO FALSO PLAFON DE 120 CFM Y CAIDA DE PRESION DE 0,3" CDA. 110V/1PH/60 HZ. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	UND	3.00	$ 919,580.00	$ 2,758,740.00		$ -		$ -	3.00	$ 2,758,740.00
773	9.38			CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 24, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	950.00	$ 176,785.00	$ 167,945,750.00		$ -		$ -	950.00	$ 167,945,750.00
774	9.39			CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 22, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	93.00	$ 194,725.00	$ 18,109,425.00		$ -		$ -	93.00	$ 18,109,425.00
775	9.40			CONDUCTO EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO ACESCO CALIBRE 20, UNIÓN TDC, INCLUYE UNIONES, REFUERZOS Y SOPORTES	M2	167.50	$ 204,155.00	$ 34,195,963.00		$ -		$ -	167.50	$ 34,195,963.00
776	9.41			CAJA PORTAFILTRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 12" X 6". INCLUYE FILTRO LAVABLE DE 35% DE EFICIENCIA MERV 8 DE 12" X 6" X 1/2".	UND	3.00	$ 440,770.00	$ 1,322,310.00		$ -		$ -	3.00	$ 1,322,310.00
777	9.42			CAJA PORTAFILTRO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 12" X 8". INCLUYE FILTRO LAVABLE DE 35% DE EFICIENCIA MERV 8 DE 12" X 8" X 1/2".	UND	5.00	$ 459,030.00	$ 2,295,150.00		$ -		$ -	5.00	$ 2,295,150.00
778	9.43			DUCTO EN LÁMINA DE POLISOCIANURATO DE 20 MM. INCLUYE SOPORTES Y MEDIOS DE SUJECIÓN, APLICACIÓN DE SELLANTES EN LAS UNIONES DE LOS DUCTOS Y APLICACIÓN DE SILICONA EN LA PARTE INTERNA EN LOS LATERALES DEL DUCTO	M2	627.70	$ 186,900.00	$ 117,317,130.00		$ -		$ -	627.70	$ 117,317,130.00
779	9.44			DÁMPER INDUSTRIAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL	GLB	1.00	$ 5,989,200.00	$ 5,989,200.00		$ -		$ -	1.00	$ 5,989,200.00
780	9.45			AISLAMIENTO INTERNO PARA DUCTO EN AEROCOR DE ESPESOR DE 1"	M2	755.00	$ 112,660.00	$ 85,058,300.00		$ -		$ -	755.00	$ 85,058,300.00
781	9.46			TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L Ø1/4". INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	117.00	$ 51,664.00	$ 6,044,688.00		$ -		$ -	117.00	$ 6,044,688.00
782	9.47			TUBO DE COBRE TIPO L Ø3/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	249.40	$ 61,938.00	$ 15,447,337.00		$ -		$ -	249.40	$ 15,447,337.00
783	9.48			TUBO DE COBRE TIPO L Ø1/2" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	175.50	$ 73,118.00	$ 12,832,209.00		$ -		$ -	175.50	$ 12,832,209.00
784	9.49			TUBO DE COBRE TIPO K Ø5/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	201.70	$ 96,304.00	$ 19,424,517.00		$ -		$ -	201.70	$ 19,424,517.00
785	9.50			TUBO DE COBRE TIPO K Ø3/4" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	224.75	$ 111,488.00	$ 25,056,928.00		$ -		$ -	224.75	$ 25,056,928.00
786	9.51			TUBO DE COBRE TIPO K Ø7/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	106.52	$ 147,289.00	$ 15,689,224.00		$ -		$ -	106.52	$ 15,689,224.00
787	9.52			TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 1/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	101.70	$ 178,260.00	$ 18,129,042.00		$ -		$ -	101.70	$ 18,129,042.00
788	9.53			TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 3/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	68.25	$ 214,254.00	$ 14,622,836.00		$ -		$ -	68.25	$ 14,622,836.00
789	9.54			TUBO DE COBRE TIPO K Ø1 5/8" RÍGIDO. INCLUYE AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTES	M	92.20	$ 245,244.00	$ 22,611,497.00		$ -		$ -	92.20	$ 22,611,497.00
790	9.55			ACCESORIOS TUBERÍAS REFRIGERANTE VARIABLE	GLB	1.00	$ 36,981,626.00	$ 36,981,626.00		$ -		$ -	1.00	$ 36,981,626.00
791	9.56			KIT DE TUBERIA Y CONTROL PARA MANEJADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE (AIR HANDLING UNIT KIT)	GLB	1.00	$ 14,808,200.00	$ 14,808,200.00		$ -		$ -	1.00	$ 14,808,200.00
792	9.57			REFRIGERANTE R410A	KG	120.00	$ 96,280.00	$ 11,553,600.00		$ -		$ -	120.00	$ 11,553,600.00
793	9.58			REFRIGERANTE R407C	KG	15.00	$ 75,080.00	$ 1,126,200.00		$ -		$ -	15.00	$ 1,126,200.00
794	9.59			DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA ALTOS VOLÚMENES DE AIRE DE UN CONO Y DIÁMETRO DE 14"	UND	10.00	$ 644,260.00	$ 6,442,600.00		$ -		$ -	10.00	$ 6,442,600.00
795	9.60			DIFUSOR DE SUMINISTRO PARA ALTOS VOLÚMENES DE AIRE DE UN CONO Y DIÁMETRO DE 10"	UND	-	$ 615,960.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
796	9.61			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 15"X15"	UND	4.00	$ 381,718.00	$ 1,526,872.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,526,872.00
797	9.62			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 12"X12"	UND	80.00	$ 260,818.00	$ 20,865,440.00		$ -		$ -	80.00	$ 20,865,440.00
798	9.63			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 9"X9"	UND	11.00	$ 206,718.00	$ 2,273,898.00		$ -		$ -	11.00	$ 2,273,898.00
799	9.64			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 6"X6"	UND	1.00	$ 152,618.00	$ 152,618.00		$ -		$ -	1.00	$ 152,618.00
800	9.65			DIFUSOR DE SUMINISTRO DE TECHO CON ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE Y DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 4"X4"	UND	11.00	$ 107,918.00	$ 1,187,098.00		$ -		$ -	11.00	$ 1,187,098.00
801	9.66			REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER ALETAS OPUESTAS DE 40x20	UND	-	$ 354,818.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
802	9.67			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 40"X20"	UND	4.00	$ 535,518.00	$ 2,142,072.00		$ -		$ -	4.00	$ 2,142,072.00
803	9.68			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 36"X16"	UND	1.00	$ 399,318.00	$ 399,318.00		$ -		$ -	1.00	$ 399,318.00
804	9.69			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 32"X14"	UND	-	$ 331,318.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
805	9.70			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 30"X16"	UND	4.00	$ 360,118.00	$ 1,440,472.00		$ -		$ -	4.00	$ 1,440,472.00
806	9.71			REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 24"X16"	UND	8.00	$ 294,618.00	$ 2,356,944.00		$ -		$ -	8.00	$ 2,356,944.00
807	9.72			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 14"X14"	UND	2.00	$ 170,918.00	$ 341,836.00		$ -		$ -	2.00	$ 341,836.00
808	9.73			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 12"X12"	UND	1.00	$ 151,518.00	$ 151,518.00		$ -		$ -	1.00	$ 151,518.00
809	9.74			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 10"X10"	UND	8.00	$ 129,718.00	$ 1,037,744.00		$ -		$ -	8.00	$ 1,037,744.00
810	9.75			REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO CUBO CON DÁMPER ALETAS OPUESTAS DE 8"X8"	UND	32.00	$ 111,218.00	$ 3,558,976.00		$ -		$ -	32.00	$ 3,558,976.00
811	9.76			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 20"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	2.00	$ 163,418.00	$ 326,836.00		$ -		$ -	2.00	$ 326,836.00
812	9.77			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 16"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	1.00	$ 138,218.00	$ 138,218.00		$ -		$ -	1.00	$ 138,218.00
813	9.78			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA DESCARGA DE AIRE 8"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	3.00	$ 103,418.00	$ 310,254.00		$ -		$ -	3.00	$ 310,254.00
814	9.79			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 12"X8" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	7.00	$ 138,218.00	$ 967,526.00		$ -		$ -	7.00	$ 967,526.00
815	9.80			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 12"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	3.00	$ 125,518.00	$ 376,554.00		$ -		$ -	3.00	$ 376,554.00
816	9.81			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 10"X6" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	6.00	$ 117,118.00	$ 702,708.00		$ -		$ -	6.00	$ 702,708.00
817	9.82			REJILLA TIPO MINILOUVER SIN DÁMPER PARA TOMA DE AIRE EXTERIOR 36"X16" CON MALLA PLÁSTICA PROTECCIÓN CONTRA INSECTOS.	UND	-	$ 431,518.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
818	9.83			TABLERO ELÉCTRICO DE FUERZA SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. TODOS LOS INTERRUPTORES, BREAKERS Y DEMÁS EN MARCA LG O SIEMENS	GLB	-	$ 77,443,950.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
819	9.84			CONTROL ALAMBRADO PARA FAN COIL DUCTO DE REFRIGERANTE VARIABLE	UND	2.00	$ 1,064,320.00	$ 2,128,640.00		$ -		$ -	2.00	$ 2,128,640.00
820	9.85			SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO REFRIGERANTE VARIABLE	UND	1.00	$ 5,384,620.00	$ 5,384,620.00		$ -		$ -	1.00	$ 5,384,620.00
821	9.86			TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	M	592.00	$ 44,720.00	$ 26,474,240.00		$ -		$ -	592.00	$ 26,474,240.00
822	9.87			TUBERIA IMC 3/4", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	M	241.50	$ 86,408.00	$ 20,867,532.00		$ -		$ -	241.50	$ 20,867,532.00
823	9.88			CABLE DE COMUNICACIÓN BLINDADO APANTALLADO DE 2x18	M	824.60	$ 18,086.00	$ 14,913,716.00		$ -		$ -	824.60	$ 14,913,716.00
824	9.89			PUESTA EN MARCHA Y BALANCEO DEL SISTEMA	GLB	1.00	$ 25,112,000.00	$ 25,112,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 25,112,000.00
	10.00			**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**										
	10.01			**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO**										
825	10.01.01			EXCAVACIÓN MECANICA	M3	635.13	$ 42,164.00	$ 26,779,621.00		$ -		$ -	635.13	$ 26,779,621.00
826	10.01.02			MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN RAJÓN	M3	140.10	$ 95,867.00	$ 13,430,967.00		$ -		$ -	140.10	$ 13,430,967.00
827	10.01.03			GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (NT 2000)	M2	1,033.88	$ 8,917.00	$ 9,219,108.00		$ -		$ -	1,033.88	$ 9,219,108.00
828	10.01.04			RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR TIPO C (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	186.80	$ 137,330.00	$ 25,653,244.00		$ -		$ -	186.80	$ 25,653,244.00
829	10.01.05			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON M.R.40 Kg/cm2 (INCLUYE ACERO DE ANCLAJE Y DE TRANSMISION DE CARGA)	M3	145.99	$ 923,877.00	$ 134,876,803.00		$ -		$ -	145.99	$ 134,876,803.00
830	10.01.06			ACERO DE REFUERZO PARA PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	KG	17,357.38	$ 9,856.00	$ 171,074,379.00		$ -		$ -	17,357.38	$ 171,074,379.00
831	10.01.07			SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10	M	215.55	$ 68,691.00	$ 14,806,345.00		$ -		$ -	215.55	$ 14,806,345.00
832	10.01.08			PINTURA DEMARCACIÓN ESPACIOS PARQUEO, ANCHO 10cm. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	M	231.95	$ 12,544.00	$ 2,909,581.00		$ -		$ -	231.95	$ 2,909,581.00
833	10.01.09			PINTURA DEMARCACIÓN. CON PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA PARA TRAFICO PESADO, DE LOS COLORES INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	M2	42.00	$ 45,098.00	$ 1,894,116.00		$ -		$ -	42.00	$ 1,894,116.00
834	10.01.10			CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DE 1,50 M DE DIAMETRO EXTERNO, MUROS DE E=0,10 M; DE ALTURA PROMEDIO 2,00 MT-CONCRETO DE 3.000 PSI	UND	2.00	$ 3,882,955.00	$ 7,765,910.00		$ -		$ -	2.00	$ 7,765,910.00
	10.02			**CUARTO BASURAS**										
835	10.02.01			EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD)	M3	5.48	$ 61,803.00	$ 338,680.00		$ -		$ -	5.48	$ 338,680.00
836	10.02.02			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	3.46	$ 124,114.00	$ 429,434.00		$ -		$ -	3.46	$ 429,434.00
837	10.02.03			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.25x0.30MT	ML	14.10	$ 72,207.00	$ 1,018,119.00		$ -		$ -	14.10	$ 1,018,119.00
838	10.02.04			CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	M3	0.64	$ 831,197.00	$ 531,966.00		$ -		$ -	0.64	$ 531,966.00
839	10.02.05			CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	M2	2.56	$ 33,450.00	$ 85,632.00		$ -		$ -	2.56	$ 85,632.00
840	10.02.06			ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION	KG	161.34	$ 9,856.00	$ 1,590,120.00		$ -		$ -	161.34	$ 1,590,120.00
841	10.02.07			CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	M3	0.45	$ 888,250.00	$ 399,713.00		$ -		$ -	0.45	$ 399,713.00
842	10.02.08			CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	M2	26.00	$ 145,530.00	$ 3,783,780.00		$ -		$ -	26.00	$ 3,783,780.00
843	10.02.09			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	120.00	$ 9,109.00	$ 1,093,080.00		$ -		$ -	120.00	$ 1,093,080.00
844	10.02.10			ACERO DE REFUERZO PARA CUARTO	KG	1,242.46	$ 9,856.00	$ 12,245,686.00		$ -		$ -	1,242.46	$ 12,245,686.00
845	10.02.11			MURO EN BLOQUE EN CONCRETO, DE 0.10m x 0.20m x 0.40m Y PEGA CON MORTERO 1:4. INCLUYE GRAFIL.	M2	33.82	$ 75,848.00	$ 2,565,179.00		$ -		$ -	33.82	$ 2,565,179.00
846	10.02.12			DOVELA EN GROUTING PARA BLOQUE DE 0.10m x 0.20m x 0.40m INCLUYE ANCLAJE CON EPOXICO Y ACERO #4 PARA DOVELAS	M	52.80	$ 30,284.00	$ 1,598,995.00		$ -		$ -	52.80	$ 1,598,995.00
847	10.02.13			CONCRETO DE 21 Mpa PARA VIGA DINTEL DE 0.10m x 0.10m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 2 #4	M	26.50	$ 35,780.00	$ 948,170.00		$ -		$ -	26.50	$ 948,170.00
848	10.02.14			CONCRETO DE 21 Mpa PARA PLACA SOBRE MAMPOSTERIA, INCLUYE REFUERZO	M2	14.36	$ 280,168.00	$ 4,023,212.00		$ -		$ -	14.36	$ 4,023,212.00
849	10.02.15			PAÑETE LISO CON MORTERO 1:4 PARA MUROS EXTERIORES	M2	73.58	$ 35,006.00	$ 2,575,741.00		$ -		$ -	73.58	$ 2,575,741.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
850	10.02.16			PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:4 EN MUROS EXTERIORES	M	44.72	$ 16,933.00	$ 757,244.00		$ -		$ -	44.72	$ 757,244.00
851	10.02.17			ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR	M2	73.58	$ 41,144.00	$ 3,027,376.00		$ -		$ -	73.58	$ 3,027,376.00
852	10.02.18			ACABADO EN GRANIPLAST O SIMILAR PARA FILOS Y DILATACIONES	M	44.72	$ 7,482.00	$ 334,595.00		$ -		$ -	44.72	$ 334,595.00
853	10.02.19			IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO BICAPA FV 3MM + MANTO FV 3MM	M2	14.36	$ 105,000.00	$ 1,507,800.00		$ -		$ -	14.36	$ 1,507,800.00
854	10.02.20			VENTANA EN ALUMINIO - PORTERIA (1.5+0.82)X(1.2)	UND	1.00	$ 1,530,000.00	$ 1,530,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,530,000.00
855	10.02.21			VENTANA EN ALUMINIO - WC PORTERIA (0.60)X(0.6)	UND	1.00	$ 350,000.00	$ 350,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 350,000.00
856	10.02.22			SANITARIO PARA PORTERIA (REF: ECOCLEAN SINGLE)	UND	1.00	$ 674,319.00	$ 674,319.00		$ -		$ -	1.00	$ 674,319.00
857	10.02.23			LAVAMANOS DE PEDESTAL PARA PORTERIA. INCLUYE GRIFERIA (REF: AVANTI CON PEDESTAL + CASCADE)	UND	1.00	$ 520,019.00	$ 520,019.00		$ -		$ -	1.00	$ 520,019.00
858	10.02.24			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 1.00X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA MARCA YALE DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1.00	$ 2,156,800.00	$ 2,156,800.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,156,800.00
859	10.02.25			PUERTA EN MDP RH, DIMENSIONES DE VANO 0.80X2.55MTS UNA HOJA BATIENTE, INCLUYE: MARCO EN MELAMINA RH, ACABADO EN MELANINA SEGUN DISEÑO, BISAGRAS, CERRADURA MARCA YALE DE MANIJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2.00	$ 1,907,200.00	$ 3,814,400.00		$ -		$ -	2.00	$ 3,814,400.00
860	10.02.26			SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS DE 40 X 15 X 10	UND	63.00	$ 63,926.00	$ 4,027,338.00		$ -		$ -	63.00	$ 4,027,338.00
861	10.02.27			LOSETA TOPEROL DE 0.20 X 0.20 PARA ANDEN	ML	10.00	$ 41,939.00	$ 419,390.00		$ -		$ -	10.00	$ 419,390.00
862	10.02.28			BOLARDOS PROTECTORES TIPO M60 O SIMILAR EMPOTRADO EN CONCRETO	UND	10.00	$ 145,629.00	$ 1,456,290.00		$ -		$ -	10.00	$ 1,456,290.00
	11.00			**ANDENES Y PLAZOLETAS**										
863	11.01			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIAL GANULAR TIPO SBG-50	M3	625.09	$ 124,114.00	$ 77,582,420.00		$ -		$ -	625.09	$ 77,582,420.00
864	11.02			LOSETA PREFABRICADA 40x40	M2	1,124.53	$ 93,754.00	$ 105,429,186.00		$ -		$ -	1,124.53	$ 105,429,186.00
865	11.03			CINTA EN CONCRETO	M	999.80	$ 14,860.00	$ 14,857,028.00		$ -		$ -	999.80	$ 14,857,028.00
866	11.04			CONCRETO 21 Mpa PARA LOS DE CONTRA PISO, ANDEN Y RAMPA E= 0.1MT	M2	772.14	$ 146,980.00	$ 113,489,137.00		$ -		$ -	772.14	$ 113,489,137.00
867	11.05			MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	KG	2,827.40	$ 9,109.00	$ 25,754,787.00		$ -		$ -	2,827.40	$ 25,754,787.00
868	11.06			SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO A-10	M	58.24	$ 68,691.00	$ 4,000,564.00		$ -		$ -	58.24	$ 4,000,564.00
869	11.07			BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80	M	137.76	$ 65,004.00	$ 8,954,951.00		$ -		$ -	137.76	$ 8,954,951.00
870	11.08			ESCALERA EN CONCRETO. INCLUYE DOS ESCALONES (SEGÚN DISEÑO)	M	39.30	$ 103,699.00	$ 4,075,371.00		$ -		$ -	39.30	$ 4,075,371.00
871	11.09			SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA) (EMPRADIZACION)	M2	-	$ 27,965.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
872	11.10			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE PALMA REAL DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE.	UND	-	$ 281,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
873	11.11			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE OLIVO NEGRO DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE.	UND	-	$ 371,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
874	11.12			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE CAÑAGUATE DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	UND	-	$ 590,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
875	11.13			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE COTOPRIX DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	UND	-	$ 479,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
876	11.14			SUMINISTROS Y SIEMBRA DE MANGO DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO Y TRANSPORTE.	UND	-	$ 290,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
877	11.15			CONTENEDOR DE RAICES DE 1.20MX1.20MX1.40M. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA.	UND	-	$ 1,650,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
878	11.16			CARCAMO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE LONGITUD=8.60M, ANCHO=1.00M, ALTURA VARIABLE, INCLUYE REJILLA PARA PLAZOLETA.	UND	1.00	$ 4,280,368.00	$ 4,280,368.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,280,368.00
879	11.17			SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN PIEDRA SINU ESPESOR 1.5, ANCHO 0.60, LARGO VARIABLE (COLORES DE REFERENCIA)	M2	68.40	$ 299,788.00	$ 20,505,499.00		$ -		$ -	68.40	$ 20,505,499.00
	12.00			**CERRAMIENTO**										
880	12.01			EXCAVACION MANUAL Y RETIRO VIGAS Y CICLOPEO	M3	44.82	$ 61,803.00	$ 2,770,010.00	0.71	$ 43,880.00		$ -	45.53	$ 2,813,891.00
881	12.02			CONCRETO CICLOPEO 21MPA (F) PARA CIMENTACION CERRAMIENTO	M3	26.28	$ 558,874.00	$ 14,687,209.00	0.72	$ 402,389.00		$ -	27.00	$ 15,089,598.00
882	12.03			ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	KG	8,010.00	$ 9,856.00	$ 78,946,560.00		$ -	819.90	$ 8,080,934.00	7,190.10	$ 70,865,626.00
883	12.04			CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0,25X0,35 MT Y ANTEPECHO	ML	45.02	$ 88,407.00	$ 3,980,083.00	148.09	$ 13,092,193.00		$ -	193.11	$ 17,072,276.00
884	12.05			CONCRETO 21 Mpa PARA COLUMNETAS DE 0.25m X 0.25m	ML	135.05	$ 81,402.00	$ 10,993,340.00		$ -	71.30	$ 5,803,963.00	63.75	$ 5,189,378.00
885	12.06			CERRAMIENTO METALICO TUBULAR H:2.00, SEGÚN DISEÑO	M	211.86	$ 343,275.00	$ 72,726,242.00		$ -		$ -	211.86	$ 72,726,242.00
	13.00			**SEÑALIZACION**										
886	13.01			AVISO DE 2.50X3,00 LOGO, LETRAS ARMADAS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304 CALIBRE 18 CON CANTONERA DE 5 CENTÍMETROS	UND	2.00	$ 8,000,000.00	$ 16,000,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 16,000,000.00
887	13.02			SEÑALES DE 12X15 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO, TEXTO INCLUSIVO EN BRAILLE, DILATADORES EN ACERO.	UND	-	$ 80,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
888	13.03			SEÑALES DE 25X13 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, TEXTO INCLUSIVO EN BRAILLE, DILATADORES EN ACERO.	UND	-	$ 150,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
889	13.04			SEÑALES DE 20X30 CENTÍMETROS, (PUNTO DE ENCUENTRO Y GABINETE DE INCENDIOS) EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, DILATADORES EN ACERO.	UND	-	$ 180,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
890	13.05			SEÑALES DE 25X13 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 3 M.M. CON IMPRESIÓN DIGITAL EN VINILO ADHESIVO Ó VINILO FOTO LUMINISCENTE, INSTALADAS AL TECHO CON TUBOS Y ACCESORIOS EN ACERO.	UND	-	$ 160,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
891	13.06			SEÑALES DE 100X0.40 CENTÍMETROS EN ACRÍLICO DE 6 M.M INSTALADAS AL TECHO CON TUBOS Y ACCESORIOS EN ACERO.	UND	-	$ 400,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

				CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES (+)		MODIFICACIONES (-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
892	13.07			LÍNEAS DE 20 CENTÍMETROS CON EL LOGO EN CORTE EN VINILO FROSTED	ML	-	$ 35,000.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	14.00			**SISTEMA PANELES SOLARES**										
893	14.01			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR DE 580 WP	UND	-	$ 1,920,690.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
894	14.02			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÉTALICA PARA FIJACIÓN DE 10 PANELES SOLARES	UND	-	$ 8,090,965.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
895	14.03			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAR CONECTADO A LA RED DE 15 KW TRIFÁSICO	UND	-	$ 18,566,245.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
896	14.04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN EL LADO DE CORRIENTE CONTINUA (CC) PARA 10 PANELES HASTA INVERSOR	UND	-	$ 1,941,157.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
897	14.05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA CONEXIONES EN EL LADO DE CORRIENTE ALTERNA (CA) PARA INVERSOR DE 10 KW	UND	-	$ 1,331,271.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
898	14.06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL PROYECTADO	UND	-	$ 19,170,225.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
899	14.07			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA (POLO) A TIERRA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	-	$ 1,930,782.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
900	14.08			CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	UND	-	$ 1,078,220.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
901	14.09			LEGALIZACIÓN DE SISTEMA SOLAR EN MODALIDAD AGPE SEGÚN LA RESOLUCIÓN CREG 174 DE 2021	UND	-	$ 17,052,529.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	15.00			**DOTACION**										
902	15.01			PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS EN L CON CAJONERA	UND	83.00	$ 2,029,149.00	$ 168,419,367.00		$ -		$ -	83.00	$ 168,419,367.00
903	15.02			PUESTO CONTROL DE ACCESO PISO 1	UND	1.00	$ 2,570,011.00	$ 2,570,011.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,570,011.00
904	15.03			PUESTOS DE TRABAJO OFICINA CORRESPONDENCIA	UND	2.00	$ 1,455,630.00	$ 2,911,260.00		$ -		$ -	2.00	$ 2,911,260.00
905	15.04			MESAS PARA CAMERINOS MUJERES Y HOMBRES	UND	-	$ 1,243,851.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
906	15.05			PUESTO ACCESO A PARQUEADERO	UND	1.00	$ 1,243,851.00	$ 1,243,851.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,243,851.00
907	15.06			PUESTO CONTROL DE ACCESO PISO 2	UND	1.00	$ 1,765,851.00	$ 1,765,851.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,765,851.00
908	15.07			PUESTOS DE TRABAJO SALA DE MONITOREO	UND	3.00	$ 1,455,629.00	$ 4,366,887.00		$ -		$ -	3.00	$ 4,366,887.00
909	15.08			PUESTOS DE TRABAJO PASANTES	UND	4.00	$ 2,535,251.00	$ 10,141,004.00		$ -		$ -	4.00	$ 10,141,004.00
910	15.09			PUESTOS DE CONSULTA BIBLIOTECA	UND	10.00	$ 1,501,851.00	$ 15,018,510.00		$ -		$ -	10.00	$ 15,018,510.00
911	15.10			PUESTO CONTROL ACCESO BIBLIOTECA SALA VIRTUAL	UND	1.00	$ 1,097,813.00	$ 1,097,813.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,097,813.00
912	15.11			PUESTO ENFERMERIA	UND	1.00	$ 856,253.00	$ 856,253.00		$ -		$ -	1.00	$ 856,253.00
913	15.12			PUESTO DE TRABAJO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 2,174,951.00	$ 2,174,951.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,174,951.00
914	15.13			PUESTOS DE TRABAJO CUARTO DE CONTROL AUDITORIO PISO 2	UND	-	$ 1,243,851.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
915	15.14			PUESTOS DE TRABAJO RECEPCION AUDITORIO Y CENTRO DE CONCILIACION	UND	1.00	$ 12,708,870.00	$ 12,708,870.00		$ -		$ -	1.00	$ 12,708,870.00
916	15.15			PUESTOS DE TRABAJO RECEPCION Y REGISTRO - RUP HALL PRINCIPAL PISO 1	UND	2.00	$ 16,116,550.00	$ 32,233,100.00		$ -		$ -	2.00	$ 32,233,100.00
917	15.16			MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS CUADRADA	UND	1.00	$ 834,293.00	$ 834,293.00		$ -		$ -	1.00	$ 834,293.00
918	15.17			MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS ORGANICA O REDONDA	UND	5.00	$ 834,293.00	$ 4,171,465.00		$ -		$ -	5.00	$ 4,171,465.00
919	15.18			MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONAS RECTANGULAR	UND	6.00	$ 2,031,113.00	$ 12,186,678.00		$ -		$ -	6.00	$ 12,186,678.00
920	15.19			MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS RECTANGULAR CON BASES ENTAMBORADAS - DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 4,536,829.00	$ 4,536,829.00		$ -		$ -	1.00	$ 4,536,829.00
921	15.20			BARRA CAFETIN EMPLEADOS	UND	1.00	$ 2,828,261.00	$ 2,828,261.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,828,261.00
922	15.21			MESA CAFETIN EMPLEADOS Y TERRAZA	UND	8.00	$ 823,313.00	$ 6,586,504.00		$ -		$ -	8.00	$ 6,586,504.00
923	15.22			BARRA ALTA PARA CAFETIN 3.50 MTS	UND	1.00	$ 6,706,299.00	$ 6,706,299.00		$ -		$ -	1.00	$ 6,706,299.00
924	15.23			BARRA ALTA PARA CAFETIN 4.40 MTS	UND	1.00	$ 6,768,983.00	$ 6,768,983.00		$ -		$ -	1.00	$ 6,768,983.00
925	15.24			MUEBLE PARA MICROONDAS	UND	1.00	$ 2,844,731.00	$ 2,844,731.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,844,731.00
926	15.25			ESTANTERIAS PARA BODEGAS Y ARCHIVO	UND	40.00	$ 469,757.00	$ 18,790,280.00		$ -		$ -	40.00	$ 18,790,280.00
927	15.26			BIBLIOFIJOS PARA ALMACENAMIENTO DE LIBROS EN BIBLIOTECA	UND	13.00	$ 1,570,777.00	$ 20,420,101.00		$ -		$ -	13.00	$ 20,420,101.00
928	15.27			MESAS INFANTILES PARA LUDOTECA	UND	10.00	$ 242,471.00	$ 2,424,710.00		$ -		$ -	10.00	$ 2,424,710.00
929	15.28			SILLAS INFANTILES PARA LUDOTECA	UND	10.00	$ 188,944.00	$ 1,889,440.00		$ -		$ -	10.00	$ 1,889,440.00
930	15.29			CORRAL BEBES CON COLCHON PARA LUDOTECA	UND	3.00	$ 1,111,851.00	$ 3,335,553.00		$ -		$ -	3.00	$ 3,335,553.00
931	15.30			SOFA SALA DE ESPERA PARA LUDOTECA-LACTANCIA-CONDUCTORES-EXTERNA DEFENSOR	UND	4.00	$ 1,657,272.00	$ 6,629,088.00		$ -		$ -	4.00	$ 6,629,088.00
932	15.31			POLTRONA SALA DE ESPERA EXTERNA DEFENSOR	UND	1.00	$ 1,231,362.00	$ 1,231,362.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,231,362.00
933	15.32			MESA DE CENTRO SALA DE ESPERA PARA LUDOTECA-CONDUCTORES-EXTERNA DEFENSOR	UND	3.00	$ 570,351.00	$ 1,711,053.00		$ -		$ -	3.00	$ 1,711,053.00
934	15.33			ALMACENAMIENTO AREA MATERNIDAD	UND	2.00	$ 1,383,293.00	$ 2,766,586.00		$ -		$ -	2.00	$ 2,766,586.00
935	15.34			CAMILLA Y ESCALERA 2 PASOS PARA ENFERMERIA	UND	1.00	$ 602,753.00	$ 602,753.00		$ -		$ -	1.00	$ 602,753.00
936	15.35			LOCKERS PARA VESTIR MUJERES Y HOMBRES	UND	2.00	$ 1,530,618.00	$ 3,061,236.00		$ -		$ -	2.00	$ 3,061,236.00
937	15.36			BANCAS PARA VESTIR MUJERES Y HOMBRES	UND	2.00	$ 265,722.00	$ 531,444.00		$ -		$ -	2.00	$ 531,444.00
938	15.37			ARCHIVO RODANTE AREA DE ARCHIVO	UND	2.00	$ 8,101,595.00	$ 16,203,190.00		$ -		$ -	2.00	$ 16,203,190.00
939	15.38			SILLA GIRATORIA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 3,174,224.00	$ 3,174,224.00		$ -		$ -	1.00	$ 3,174,224.00
940	15.39			POLTRONA INTERLOCUTORA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	2.00	$ 814,310.00	$ 1,628,620.00		$ -		$ -	2.00	$ 1,628,620.00
941	15.40			POLTRONA SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	2.00	$ 503,027.00	$ 1,006,054.00		$ -		$ -	2.00	$ 1,006,054.00
942	15.41			SOFA SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 3,644,751.00	$ 3,644,751.00		$ -		$ -	1.00	$ 3,644,751.00
943	15.42			MESAS DE CENTRO SALA DE ESPERA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	3.00	$ 460,551.00	$ 1,381,653.00		$ -		$ -	3.00	$ 1,381,653.00
944	15.43			CREDENZA DESPACHO DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 2,760,468.00	$ 2,760,468.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,760,468.00
945	15.44			CREDENZA SECRETARIA DEFENSOR DEL PUEBLO	UND	1.00	$ 2,760,468.00	$ 2,760,468.00		$ -		$ -	1.00	$ 2,760,468.00
946	15.45			SILLA OPERATIVA	UND	94.00	$ 663,497.00	$ 62,368,718.00		$ -		$ -	94.00	$ 62,368,718.00
947	15.46			SILLA INTERLOCUTORA	UND	157.00	$ 328,877.00	$ 51,633,689.00		$ -		$ -	157.00	$ 51,633,689.00
948	15.47			SILLA PARA SALAS DE JUNTAS Y OTROS	UND	90.00	$ 754,776.00	$ 67,929,840.00		$ -		$ -	90.00	$ 67,929,840.00
949	15.48			SILLA ALTA PARA RECEPCIONES	UND	7.00	$ 558,284.00	$ 3,907,988.00		$ -		$ -	7.00	$ 3,907,988.00
950	15.49			BUTACOS PARA BARRA CAFETIN EMPLEADOS Y ACCESO AUDITORIO	UND	6.00	$ 467,150.00	$ 2,802,900.00		$ -		$ -	6.00	$ 2,802,900.00
951	15.50			TANDEM 2 PUESTOS SALAS DE ESPERA	UND	6.00	$ 556,154.00	$ 3,336,924.00		$ -		$ -	6.00	$ 3,336,924.00
952	15.51			TANDEM 3 PUESTOS SALAS DE ESPERA	UND	11.00	$ 669,248.00	$ 7,361,728.00		$ -		$ -	11.00	$ 7,361,728.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO N°: LIC-4-2023
OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
REPRESENTANTE: ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO

INTERVENTOR: JVM INGENIERA S.A.S. BIC

CONTRATO N°: CM-2-2023
REPRESENTANTE: CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO: TRECE (13) MESES

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR CONTRACTUAL : $ 22,800,001,058.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA : $ -

BALANCE No. 01

FECHA DEL BALANCE
23/10/2024

BALANCE No. 01

									MODIFICACIONES					
									(+)		(-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 01	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN INVIAS	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Vr.Total
953	15.52			TANDEM 4 PUESTOS SALAS DE ESPERA	UND	15.00	$ 841,634.00	$ 12,624,510.00		$ -		$ -	15.00	$ 12,624,510.00
954	15.53			SILLAS AULA MULTIPLE	UND	25.00	$ 480,392.00	$ 12,009,800.00		$ -		$ -	25.00	$ 12,009,800.00
955	15.54			SILLAS PARA AUDITORIO	UND	-	$ 887,517.00	$ -		$ -		$ -	-	$ -
956	15.55			SILLAS PARA CAFETINES	UND	32.00	$ 197,300.00	$ 6,313,600.00		$ -		$ -	32.00	$ 6,313,600.00
957	15.56			BUTACO ALTO PARA BARRAS EN TERRAZA	UND	19.00	$ 418,835.00	$ 7,957,865.00		$ -		$ -	19.00	$ 7,957,865.00
958	15.57			SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCANSA PIES	UND	83.00	$ 139,790.00	$ 11,602,570.00		$ -		$ -	83.00	$ 11,602,570.00
959	15.58			S/I TELEVISOR DE 55"	UND	2.00	$ 2,648,520.00	$ 5,297,040.00		$ -		$ -	2.00	$ 5,297,040.00
				SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 270,226,493.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 270,226,493.00**
				I.V.A ESTUDIOS Y DISEÑOS			**19.00%**	**$ 51,343,034.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 51,343,034.00**
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 16,954,142,597.00**		**$ 477,170,246.00**		**$ 445,619,304.00**		**$ 16,985,693,539.00**
				TOTAL DOTACION				**$ 654,071,977.00**		**$ -**		**$ -**		**$ 654,071,977.00**
				COSTO ADMINISTRATIVOS	**A**		**20.00%**	$ 3,390,828,519.00		$ 95,434,049.00		$ 89,123,861.00		$ 3,397,138,707.00
				COSTO POR IMPREVISTO	**I**		**2.00%**	$ 339,082,852.00		$ 9,543,405.00		$ 8,912,386.00		$ 339,713,871.00
				COSTO POR UTILIDAD	**U**		**5.00%**	$ 847,707,130.00		$ 23,858,512.00		$ 22,280,965.00		$ 849,284,677.00
				I.V.A SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	$ 161,064,355.00		$ 4,533,117.00		$ 4,233,383.00		$ 161,364,089.00
				TRAMITE DE LICENCIAS, PERMISOS, SERVICIOS PUBLICOS Y CERTIFICADO RETIE Y RETILAP				$ 31,946,688.00		$ -		$ -		$ 31,946,688.00
				PGIO				$ 59,217,983.00		$ -		$ -		$ 59,217,983.00
				PAPSO				$ 40,369,430.00		$ -		$ 40,369,430.00		$ -
				TOTAL VALOR DEL PROYECTO				**$ 22,800,001,058.00**		**$ 610,539,329.00**		**$ 610,539,329.00**		**$ 22,800,001,058.00**
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA														**$ -**

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cálculo entregadas.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, a los veintitres (23) días del mes de octubre del año 2024.

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EDIFICACIONES ARL
CONTRATISTA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
REPRESENTANTE LEGAL JVM INGENIERA S.A.S. BIC
INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
AREA DEL LOTE	71.00	70.42		1.00	5,000.00

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.02	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN MURO, INCLUYE RETIRO DE REJAS DE PROTECCION, DEMOLICION DE COLUMNAS COLUMNAS Y RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD	M

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
CERRAMIENTO A DEMOLAR	71.00			1.00	71.00

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.03	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
DEMOLICIÓN DE PLACA 1	29.37	11.20	0.25	1.00	82.23
DEMOLICION DE BORDILLO 1	104.74	0.15	0.20	1.00	3.14
DEMOLICIÓN DE PLACA 2	35.23	12.00	0.25	1.00	105.69
DEMOLICION DE BORDILLO 2	34.80	0.15	0.20	1.00	1.04
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EJE 5 ENTRE EJE A Y B- DADOS	1.50	1.50	0.89	1.00	2.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EJE 5 ENTRE EJE A Y B - DADOS	1.50	1.50	0.89	1.00	2.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EJE 5 ENTRE EJE A Y B PLACA	6.50	5.00	0.20	1.00	6.50
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EJE 1 ENTRE EJE C Y D PLACA	7.00	6.50	0.20	1.00	9.10

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.04	DEMOLICION CUNETA EXISTENTE	UNIDAD	M

DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Area del eje 2 al eje 6, sector norte del bloque A	22.75			1.00	22.75

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.05	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 8M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UNIDAD	UND

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Árboles alturas mayores H= 8M				2.00	2.00

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.06	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS MENORES H= 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓNDE RAÍZ)	UNIDAD	UND

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
Árboles alturas mayores H= 15M				3.00	3.00

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.07	DESCAPOTE A MAQUINA E= 0.20M - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
AREA DEL LOTE	71.00	70.42		1.00	5,000.00
DESCUENTO AREA PLACA	60.19	9.95		-1.00	(599.00)

MEMORIA DE CANTIDADES


SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ITEM	1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	VOLQUETA PLACA	M3	VIAJES	CANTIDAD	
MATERIAL BASURA	ETU 797	15.00	10.00	1.00	150.00
MATERIAL BASURA	SOP 510	15.50	7.00	1.00	108.50
MATERIAL ESCOMBRO	SOP 510	15.50	5.00	1.00	77.50
MATERIAL ESCOMBRO	ETU 797	15.00	3.00	1.00	45.00
				TOTAL CANTIDAD	381.00

ESQUEMA

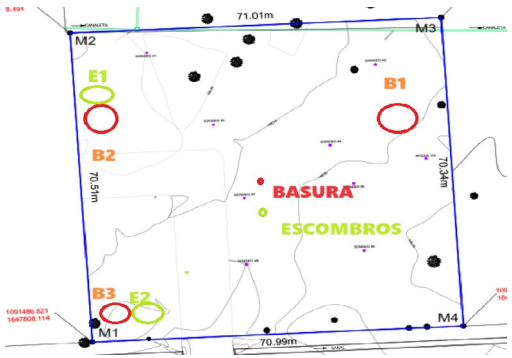

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.01	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) PARA SOLADO	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
ZAPATA Z-1	1.95	1.95		2.00	7.61
ZAPATA Z-2	2.15	2.15		2.00	9.25
ZAPATA Z-3	1.70	1.70		3.00	8.67
ZAPATA Z-4	2.10	2.10		1.00	4.41
ZAPATA Z-5	2.35	2.35		1.00	5.52
ZAPATA Z-6	1.90	1.90		1.00	3.61
ZAPATA Z-7	2.55	2.55		1.00	6.50
ZAPATA Z-8	2.60	2.60		3.00	20.28
ZAPATA Z-9	2.65	2.65		1.00	7.02
ZAPATA Z-10	2.70	2.70		1.00	7.29
ZAPATA Z-11	2.25	2.25		2.00	10.13
ZAPATA Z-12	2.20	2.20		1.00	4.84
ZAPATA Z-13	2.85	2.85		3.00	24.37
ZAPATA Z-14	2.80	2.80		3.00	23.52
ZAPATA Z-15	1.70	1.70		1.00	2.89
ZAPATA Z-16	2.00	2.00		5.00	20.00
ZAPATA Z-17	1.75	1.75		1.00	3.06
VIGA VC-01 - EJE D	38.88	0.40		1.00	15.55
VIGA VC-02 - EJE C	34.60	0.40		1.00	13.84
VIGA VC-03 - EJE B	33.33	0.40		1.00	13.33
VIGA VC-04 - EJE A	38.83	0.40		1.00	15.53
VIGA VC-05 - EJE 1	19.33	0.40		1.00	7.73
VIGA VC-06 - EJE 2	18.03	0.40		1.00	7.21
VIGA VC-07 - EJE 3	18.23	0.40		1.00	7.29
VIGA VC-08 - EJE 4	18.25	0.40		1.00	7.30
VIGA VC-09 - EJE 5	18.25	0.40		1.00	7.30
VIGA VC-10 - EJE 6	17.95	0.40		1.00	7.18
VIGA VC-11 - EJE 7	17.83	0.40		1.00	7.13
VIGA VC-12 - EJE 8	19.18	0.40		1.00	7.67
VIGA VTC-01	2.00	0.20		2.00	0.80
VIGA VTC-02	2.00	0.15		1.00	0.30
VIGA VTC-03	7.10	0.40		1.00	2.84
VIGA CERRAMIENTO NORTE	71.01	0.25		1.00	17.75
VIGA CERRAMIENTO ORIENTE	70.34	0.25		1.00	17.59
VIGA CERRAMIENTO OCCIDENTE	70.51	0.25		1.00	17.63
			TOTAL CANTIDAD		342.94

ESQUEMA

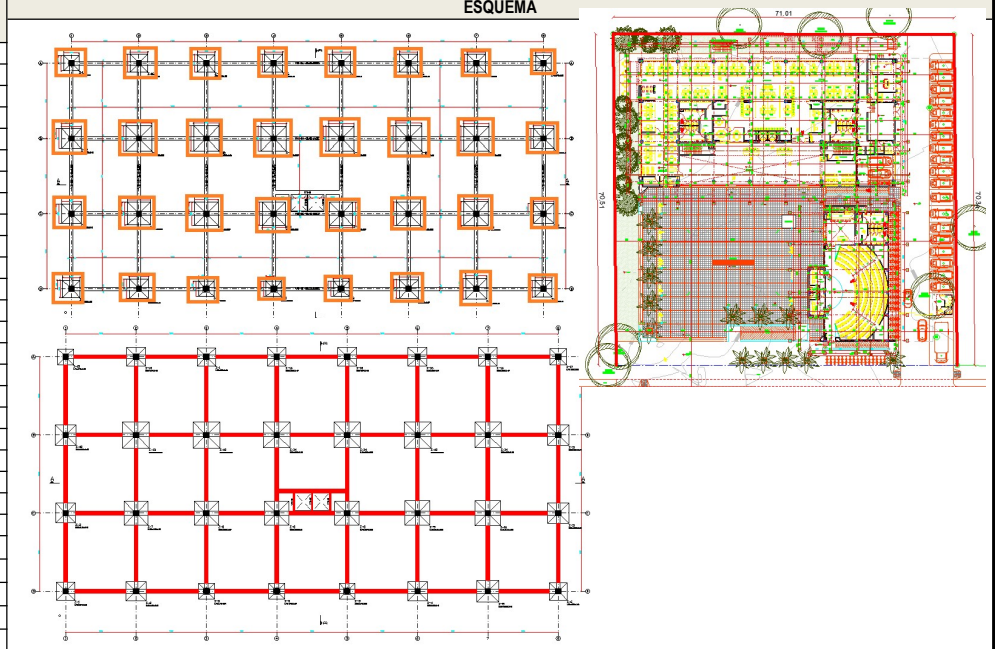

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS


ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #4 longitudinal 2.10 m	ZAPATA Z-1	4	0.994	2.08	13.00	2.00	53.76
Varilla #4 transversal 2.10 m		4	0.994	2.08	13.00	2.00	53.76
Varilla #4 longitudinal 2.30 m	ZAPATA Z-2	4	0.994	2.28	16.00	2.00	72.52
Varilla #4 transversal 2.30 m		4	0.994	2.28	16.00	2.00	72.52
Varilla #3 longitudinal 1.81 m	ZAPATA Z-3	3	0.560	1.79	15.00	3.00	45.11
Varilla #3 transversal 1.81 m		3	0.560	1.79	15.00	3.00	45.11
Varilla #3 longitudinal 2.25 m	ZAPATA Z-4	4	0.994	2.23	14.00	1.00	31.03
Varilla #3 transversal 2.25 m		4	0.994	2.23	14.00	1.00	31.03
Varilla #3 longitudinal 2.50 m	ZAPATA Z-5	4	0.994	2.48	17.00	1.00	41.91
Varilla #4 transversal 2.50 m		4	0.994	2.48	17.00	1.00	41.91
Varilla #4 longitudinal 2.05 m	ZAPATA Z-6	4	0.994	2.03	12.00	1.00	24.21
Varilla #4 trasnversal 2.05 m		4	0.994	2.03	12.00	1.00	24.21
Varilla #4 longitudinal 2.70 m	ZAPATA Z-7	4	0.994	2.68	21.00	1.00	55.94
Varilla #4 transversal 2.70 m		4	0.994	2.68	21.00	1.00	55.94
Varilla #4 longitudinal 2.75 m	ZAPATA Z-8	4	0.994	2.73	22.00	3.00	179.10
Varilla #4 transversal 2.75 m		4	0.994	2.73	22.00	3.00	179.10
Varilla #4 longitudinal 2.80 m	ZAPATA Z-9	4	0.994	2.78	23.00	1.00	63.56
Varilla #4 transversal 2.80 m		4	0.994	2.78	23.00	1.00	63.56
Varilla #4 longitudinal 2.85 m	ZAPATA Z-10	4	0.994	2.83	24.00	1.00	67.51
Varilla #4 transversal 2.85 m		4	0.994	2.83	24.00	1.00	67.51
Varilla #4 longitudinal 2.40 m	ZAPATA Z-11	4	0.994	2.38	16.00	2.00	75.70
Varilla #4 transversal 2.40 m		4	0.994	2.38	16.00	2.00	75.70
Varilla #4 longitudinal 2.35 m	ZAPATA Z-12	4	0.994	2.33	16.00	1.00	37.06
Varilla #4 transversal 2.35 m		4	0.994	2.33	16.00	1.00	37.06
Varilla #4 longitudinal 3.00 m	ZAPATA Z-13	4	0.994	2.98	27.00	3.00	239.93
Varilla #4 transversal 3.00 m		4	0.994	2.98	27.00	3.00	239.93
						TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 10	1,974.68

ESQUEMA

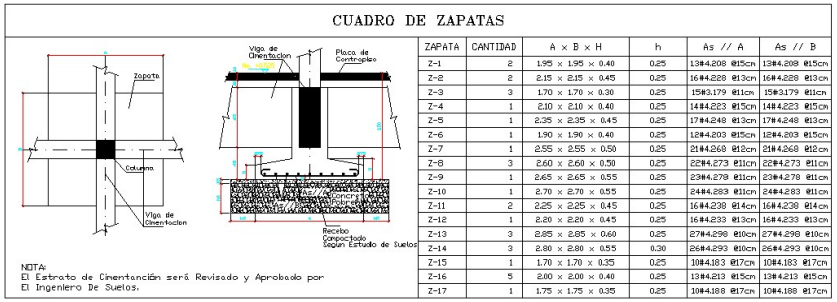

ZAPATA	CANTIDAD	A x B x H	h	As // A	As // B
Z-1	2	1.95 x 1.95 x 0.40	0.25	13#4.208 @15cm	13#4.208 @15cm
Z-2	2	2.15 x 2.15 x 0.45	0.25	16#4.228 @13cm	16#4.228 @13cm
Z-3	3	1.70 x 1.70 x 0.30	0.25	15#3.179 @11cm	15#3.179 @11cm
Z-4	1	2.10 x 2.10 x 0.40	0.25	14#4.223 @15cm	14#4.223 @15cm
Z-5	1	2.35 x 2.35 x 0.45	0.25	17#4.248 @13cm	17#4.248 @13cm
Z-6	1	1.90 x 1.90 x 0.40	0.25	12#4.203 @15cm	12#4.203 @15cm
Z-7	1	2.55 x 2.55 x 0.50	0.25	21#4.268 @12cm	21#4.268 @12cm
Z-8	3	2.60 x 2.60 x 0.50	0.25	22#4.273 @11cm	22#4.273 @11cm
Z-9	1	2.65 x 2.65 x 0.55	0.25	23#4.278 @11cm	23#4.278 @11cm
Z-10	1	2.70 x 2.70 x 0.55	0.25	24#4.283 @11cm	24#4.283 @11cm
Z-11	2	2.25 x 2.25 x 0.45	0.25	16#4.238 @14cm	16#4.238 @14cm
Z-12	1	2.20 x 2.20 x 0.45	0.25	16#4.233 @13cm	16#4.233 @13cm
Z-13	3	2.85 x 2.85 x 0.60	0.25	27#4.298 @10cm	27#4.298 @10cm
Z-14	3	2.80 x 2.80 x 0.55	0.30	26#4.293 @10cm	26#4.293 @10cm
Z-15	1	1.70 x 1.70 x 0.35	0.25	10#4.183 @17cm	10#4.183 @17cm
Z-16	5	2.00 x 2.00 x 0.40	0.25	13#4.213 @15cm	13#4.213 @15cm
Z-17	1	1.75 x 1.75 x 0.35	0.25	10#4.188 @17cm	10#4.188 @17cm

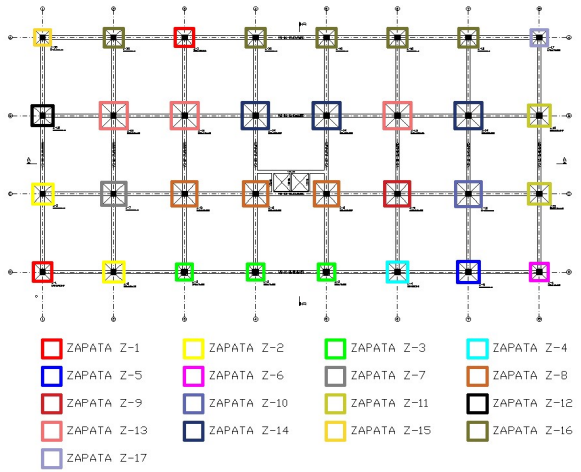

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #4 longitudinal 2.95 m	ZAPATA Z-14	4	0.994	2.93	26.00	3.00	227.17
Varilla #4 transversal 2.95 m		4	0.994	2.93	26.00	3.00	227.17
Varilla #4 longitudinal 1.85 m	ZAPATA Z-15	4	0.994	1.83	10.00	1.00	18.19
Varilla #4 transversal 1.85 m		4	0.994	1.83	10.00	1.00	18.19
Varilla #4 longitudinal 2.15 m	ZAPATA Z-16	4	0.994	2.13	13.00	5.00	137.62
Varilla #4 transversal 2.15 m		4	0.994	2.13	13.00	5.00	137.62
Varilla #4 longitudinal 1.90 m	ZAPATA Z-17	4	0.994	1.90	10.00	1.00	18.89
Varilla #4 transversal 1.90 m		4	0.994	1.90	10.00	1.00	18.89
Varilla #7 longitudinal 6.05 m	VIGA VC-01	7	3.042	6.05	4.00	1.00	73.62
Varilla #6 longitudinal 6.00 m		6	2.235	6.00	2.00	1.00	26.82
Varilla #6 longitudinal 10.75 m		6	2.235	10.75	1.00	1.00	24.03
Varilla #7 longitudinal 11.05 m		7	3.042	11.05	2.00	1.00	67.23
Varilla #7 longitudinal 8.75 m		7	3.042	8.75	2.00	1.00	53.24
Varilla #6 longitudinal 8.35 m		6	2.235	8.35	1.00	1.00	18.66
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	4.00	1.00	107.08
Varilla #7 longitudinal 8.85 m		7	3.042	8.85	2.00	1.00	53.84
Varilla #6 longitudinal 8.40 m		6	2.235	8.40	2.00	1.00	37.55
Varilla #6 longitudinal 8.45 m		6	2.235	8.45	1.00	1.00	18.89
Varilla #6 longitudinal 8.30 m		6	2.235	8.30	1.00	1.00	18.55
Varilla #6 longitudinal 8.25 m		6	2.235	8.25	2.00	1.00	36.88
Varilla #6 longitudinal 8.20 m		6	2.235	8.20	1.00	1.00	18.33
Varilla #7 longitudinal 8.55 m		7	3.042	8.55	2.00	1.00	52.02
Varilla #7 longitudinal 8.50 m		7	3.042	8.50	4.00	1.00	103.43
Varilla #7 longitudinal 8.45 m		7	3.042	8.45	2.00	1.00	51.41
					TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 10		1,565.32

ESQUEMA

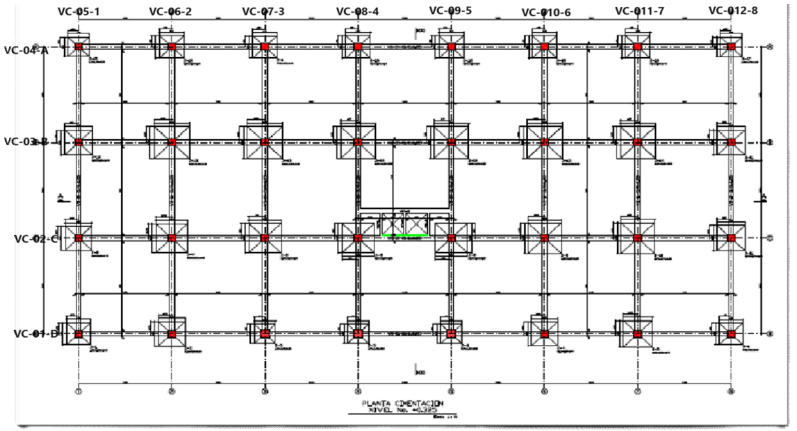

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #7 longitudinal 11.35 m	VIGA VC-01	7	3.042	11.35	2.00	1.00	69.05
Varilla #6 longitudinal 10.90 m		6	2.235	10.90	1.00	1.00	24.36
Varilla #7 longitudinal 8.55 m		7	3.042	8.55	4.00	1.00	104.04
Varilla #6 longitudinal 8.45 m		6	2.235	8.45	2.00	1.00	37.77
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	229.00	1.00	289.82
Varilla #7 longitudinal 6.05 m	VIGA VC-02	7	3.042	6.05	4.00	1.00	73.62
Varilla #6 longitudinal 6.00 m		6	2.235	6.00	2.00	1.00	26.82
Varilla #6 longitudinal 10.75 m		6	2.235	10.75	1.00	1.00	24.03
Varilla #7 longitudinal 11.05 m		7	3.042	11.05	2.00	1.00	67.23
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	8.00	1.00	214.16
Varilla #6 longitudinal 8.40 m		6	2.235	8.40	4.00	1.00	75.10
Varilla #6 longitudinal 8.25 m		6	2.235	8.25	4.00	1.00	73.76
Varilla #7 longitudinal 8.50 m		7	3.042	8.50	8.00	1.00	206.86
Varilla #7 longitudinal 11.35 m		7	3.042	11.35	2.00	1.00	69.05
Varilla #6 longitudinal 10.90 m		6	2.235	10.90	1.00	1.00	24.36
Varilla #7 longitudinal 8.55 m		7	3.042	8.55	4.00	1.00	104.04
Varilla #6 longitudinal 8.45 m		6	2.235	8.45	2.00	1.00	37.77
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	231.00	1.00	292.35
					TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 10		1,814.19

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #7 longitudinal 6.05 m	VIGA VC-03	7	3.042	6.05	4.00	1.00	73.62	
Varilla #6 longitudinal 6.00 m		6	2.235	6.00	2.00	1.00	26.82	
Varilla #6 longitudinal 10.75 m		6	2.235	10.75	1.00	1.00	24.03	
Varilla #7 longitudinal 11.05 m		7	3.042	11.05	2.00	1.00	67.23	
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	8.00	1.00	214.16	
Varilla #6 longitudinal 8.40 m		6	2.235	8.40	4.00	1.00	75.10	
Varilla #6 longitudinal 8.25 m		6	2.235	8.25	4.00	1.00	73.76	
Varilla #7 longitudinal 8.50 m		7	3.042	8.50	8.00	1.00	206.86	
Varilla #7 longitudinal 11.35 m		7	3.042	11.35	2.00	1.00	69.05	
Varilla #6 longitudinal 10.90 m		6	2.235	10.90	1.00	1.00	24.36	
Varilla #7 longitudinal 8.55 m		7	3.042	8.55	4.00	1.00	104.04	
Varilla #6 longitudinal 8.45 m		6	2.235	8.45	2.00	1.00	37.77	
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	231.00	1.00	292.35	
Varilla #7 longitudinal 6.05 m	VIGA VC-04	7	3.042	6.05	4.00	1.00	73.62	
Varilla #6 longitudinal 6.00 m		6	2.235	6.00	2.00	1.00	26.82	
Varilla #6 longitudinal 10.75 m		6	2.235	10.75	1.00	1.00	24.03	
Varilla #7 longitudinal 11.05 m		7	3.042	11.05	2.00	1.00	67.23	
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	8.00	1.00	214.16	
Varilla #6 longitudinal 8.40 m		6	2.235	8.40	4.00	1.00	75.10	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 10	1,770.11	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 8.25 m	VIGA VC-04	6	2.235	8.25	4.00	1.00	73.76
Varilla #7 longitudinal 8.50 m		7	3.042	8.50	8.00	1.00	206.86
Varilla #7 longitudinal 11.35 m		7	3.042	11.35	2.00	1.00	69.05
Varilla #6 longitudinal 10.90 m		6	2.235	10.90	1.00	1.00	24.36
Varilla #7 longitudinal 8.55 m		7	3.042	8.55	4.00	1.00	104.04
Varilla #6 longitudinal 8.45 m		6	2.235	8.45	2.00	1.00	37.77
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	231.00	1.00	292.35
Varilla #7 longitudinal 7.05 m	VIGA VC-05	7	3.042	7.05	4.00	1.00	85.78
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	2.00	1.00	31.29
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	1.00	1.00	7.26
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.55	2.00	1.00	21.60
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	4.00	1.00	115.60
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
						TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 10	1,452.08

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #7 longitudinal 7.05 m	VIGA VC-06	7	3.042	7.05	4.00	1.00	85.78
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	2.00	1.00	31.29
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	1.00	1.00	7.26
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.55	2.00	1.00	21.60
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	4.00	1.00	115.60
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
Varilla #7 longitudinal 7.10 m	VIGA VC-07	7	3.042	7.10	2.00	1.00	43.20
Varilla #6 longitudinal 7.05 m		6	2.235	7.05	1.00	1.00	15.76
Varilla #6 longitudinal 3.35 m		6	2.235	3.35	1.00	1.00	7.49
Varilla #7 longitudinal 3.65 m		7	3.042	3.65	2.00	1.00	22.21
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.20 m		6	2.235	9.20	1.00	1.00	20.56
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	1.00	1.00	20.67
Varilla #7 longitudinal 9.45 m		7	3.042	9.45	2.00	1.00	57.49
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	2.00	1.00	57.80
						TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 10	1,050.34

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #7 longitudinal 3.85 m	VIGA VC-07	7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	1.00	1.00	15.65
Varilla #7 longitudinal 7.05 m		7	3.042	7.05	2.00	1.00	42.89
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
Varilla #7 longitudinal 7.10 m	VIGA VC-08	7	3.042	7.10	2.00	1.00	43.20
Varilla #6 longitudinal 7.05 m		6	2.235	7.05	1.00	1.00	15.76
Varilla #6 longitudinal 3.35 m		6	2.235	3.35	1.00	1.00	7.49
Varilla #7 longitudinal 3.65 m		7	3.042	3.65	2.00	1.00	22.21
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.20 m		6	2.235	9.20	1.00	1.00	20.56
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	1.00	1.00	20.67
Varilla #7 longitudinal 9.45 m		7	3.042	9.45	2.00	1.00	57.49
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	2.00	1.00	57.80
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	1.00	1.00	15.65
Varilla #7 longitudinal 7.05 m		7	3.042	7.05	2.00	1.00	42.89
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
					TOTAL CANTIDAD HOJA 7 DE 10		883.01

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #7 longitudinal 7.10 m	VIGA VC-09	7	3.042	7.10	2.00	1.00	43.20
Varilla #6 longitudinal 7.05 m		6	2.235	7.05	1.00	1.00	15.76
Varilla #6 longitudinal 3.35 m		6	2.235	3.35	1.00	1.00	7.49
Varilla #7 longitudinal 3.65 m		7	3.042	3.65	2.00	1.00	22.21
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.20 m		6	2.235	9.20	1.00	1.00	20.56
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	1.00	1.00	20.67
Varilla #7 longitudinal 9.45 m		7	3.042	9.45	2.00	1.00	57.49
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	2.00	1.00	57.80
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	1.00	1.00	15.65
Varilla #7 longitudinal 7.05 m		7	3.042	7.05	2.00	1.00	42.89
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
Varilla #7 longitudinal 7.05 m	VIGA VC-10	7	3.042	7.05	4.00	1.00	85.78
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	2.00	1.00	31.29
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	1.00	1.00	7.26
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.55	2.00	1.00	21.60
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
					TOTAL CANTIDAD HOJA 8 DE 10		951.93

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 9.25 m	VIGA VC-10	6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	4.00	1.00	115.60
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
Varilla #7 longitudinal 7.05 m	VIGA VC-11	7	3.042	7.05	4.00	1.00	85.78
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	2.00	1.00	31.29
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	1.00	1.00	7.26
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.55	2.00	1.00	21.60
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	4.00	1.00	115.60
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
Varilla #7 longitudinal 7.05 m	VIGA VC-12	7	3.042	7.05	4.00	1.00	85.78
Varilla #6 longitudinal 7.00 m		6	2.235	7.00	2.00	1.00	31.29
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	1.00	1.00	7.26
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.55	2.00	1.00	21.60
Varilla #7 longitudinal 9.80 m		7	3.042	9.80	4.00	1.00	119.25
						TOTAL CANTIDAD HOJA 9 DE 10	1,245.76

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 9.40 m	VIGA VC-12	6	2.235	9.40	2.00	1.00	42.02
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35
Varilla #7 longitudinal 9.50 m		7	3.042	9.50	4.00	1.00	115.60
Varilla #7 longitudinal 3.85 m		7	3.042	3.85	4.00	1.00	46.85
Fleje #3 transversal 2.26 m		3	0.560	2.26	105.00	1.00	132.89
Varilla #4 Refuerzo niple 1.50 m	TANQUE AGUA POTABLE	4	0.994	1.50	8.00	4.00	47.71
Varilla #5 Refuerzo Pase elec 1.50 m	VIGA EJE A ENTRE 7 Y 8	5	1.552	1.50	12.00	1.00	27.94
Varilla #4 Refuerzo Pase elec 1.50 m	VIGA EJE 7 ENTRE EJE A Y B	4	0.994	1.50	8.00	1.00	11.93
Varilla #4 Refuerzo Pase elec 1.50 m	TANQUE CUARTO DE MAQUINAS	4	0.994	1.50	8.00	2.00	23.86
Varilla #5 Refuerzo Pase RCI 1.50 m	RCI	5	1.552	1.50	8.00	4.00	74.50
Varilla #4 Refuerzo muro inter 1.50 m	TANQUE AMORTIGUAMIENTO	4	0.994	1.50	8.00	13.00	155.06
Varilla #5 Refuerzo captacion 1.50 m		5	1.552	1.50	8.00	6.00	111.74
Varilla #5 Refuerzo PVC 2.50 m		5	1.552	1.50	8.00	2.00	37.25
Varilla #5 Refuerzo Pase Sanit 1.50 m	VIGAS CIMENTACION	5	1.552	1.50	8.00	4.00	74.50
Varilla #5 Refuerzo Pase ALL 1.50 m		5	1.552	1.50	8.00	12.00	223.49
						TOTAL CANTIDAD HOJA 10 DE 10	1,166.69

ESQUEMA



COLOCAR 2 ESTRIBOS ADICIONALES DE SECCION TIPICA A CADA LADO DEL CRUCE

CORTE A – A

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.02	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CIMIENTOS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
							-

ESQUEMA

RESUMEN CONSOLIDADO ACERO CIMENTACION

TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 10	1,974.68
TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 10	1,565.32
TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 10	1,814.19
TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 10	1,770.11
TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 10	1,452.08
TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 10	1,050.34
TOTAL CANTIDAD HOJA 7 DE 10	883.01
TOTAL CANTIDAD HOJA 8 DE 10	951.93
TOTAL CANTIDAD HOJA 9 DE 10	1,245.76
TOTAL CANTIDAD HOJA 10 DE 10	1,166.69
TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	**13,874.11**

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.03	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.60MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
					0.00	
				TOTAL CANTIDAD	0.00	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.04	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.80MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
				TOTAL CANTIDAD	0.00	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024	
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.			
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3	


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.05	CONCRETO 21 MPa PARA VIGA DE CIMENTACION 0.40X0.85MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
VIGA VC-01 - EJE D	50.10			1.00	50.10
VIGA VC-02 - EJE C	48.30			1.00	48.30
VIGA VC-03 - EJE B	48.30			1.00	48.30
VIGA VC-04 - EJE A	48.30			1.00	48.30
VIGA VC-05 - EJE 1	23.70			1.00	23.70
VIGA VC-06 - EJE 2	23.70			1.00	23.70
VIGA VC-07 - EJE 3	23.80			1.00	23.80
VIGA VC-08 - EJE 4	23.80			1.00	23.80
VIGA VC-09 - EJE 5	23.80			1.00	23.80
VIGA VC-10 - EJE 6	23.70			1.00	23.70
VIGA VC-11 - EJE 7	23.70			1.00	23.70
VIGA VC-12 - EJE 8	23.70			1.00	23.70
VIGA VTC-03	7.10			1.00	7.10
				TOTAL CANTIDAD	392.00

ESQUEMA

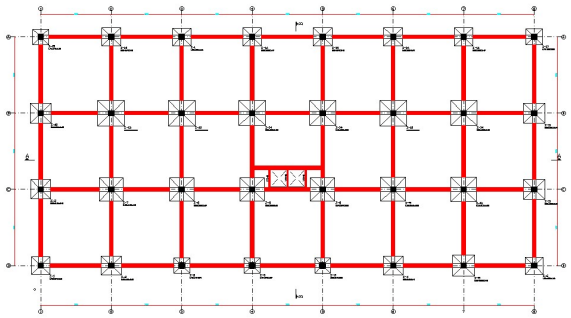

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.06	CONCRETO 21 MPa PARA ZAPATA	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	AREA MAYOR	AREA MENOR	ALTURA	CANTIDAD	
ZAPATA Z-1 (BASE)	3.80		0.25	2.00	1.90
ZAPATA Z-1 (PIRAMIDE)	3.80	0.36	0.15	2.00	0.53
ZAPATA Z-2 (BASE)	4.62		0.25	2.00	2.31
ZAPATA Z-2 (PIRAMIDE)	4.62	0.36	0.20	2.00	0.84
ZAPATA Z-3 (BASE)	2.89		0.25	3.00	2.17
ZAPATA Z-3 (PIRAMIDE)	2.89	0.36	0.05	3.00	0.21
ZAPATA Z-4 (BASE)	4.41		0.25	1.00	1.10
ZAPATA Z-4 (PIRAMIDE)	4.41	0.36	0.15	1.00	0.30
ZAPATA Z-5 (BASE)	5.52		0.25	1.00	1.38
ZAPATA Z-5 (PIRAMIDE)	5.52	0.36	0.20	1.00	0.49
ZAPATA Z-6 (BASE)	3.61		0.25	1.00	0.90
ZAPATA Z-6 (PIRAMIDE)	3.61	0.36	0.15	1.00	0.26
ZAPATA Z-7 (BASE)	6.50		0.25	1.00	1.63
ZAPATA Z-7 (PIRAMIDE)	6.50	0.36	0.25	1.00	0.70
ZAPATA Z-8 (BASE)	6.76		0.25	3.00	5.07
ZAPATA Z-8 (PIRAMIDE)	6.76	0.36	0.25	3.00	2.17
ZAPATA Z-9 (BASE)	7.02		0.25	1.00	1.76
ZAPATA Z-9 (PIRAMIDE)	7.02	0.36	0.30	1.00	0.90
ZAPATA Z-10 (BASE)	7.29		0.25	1.00	1.82
ZAPATA Z-10 (PIRAMIDE)	7.29	0.36	0.30	1.00	0.93
ZAPATA Z-11 (BASE)	5.06		0.25	2.00	2.53
ZAPATA Z-11 (PIRAMIDE)	5.06	0.36	0.20	2.00	0.90
ZAPATA Z-12 (BASE)	4.84		0.25	1.00	1.21
ZAPATA Z-12 (PIRAMIDE)	4.84	0.36	0.20	1.00	0.43
ZAPATA Z-13 (BASE)	8.12		0.25	3.00	6.09
ZAPATA Z-13 (PIRAMIDE)	8.12	0.36	0.35	3.00	3.57
ZAPATA Z-14 (BASE)	7.84		0.30	3.00	7.06
ZAPATA Z-14 (PIRAMIDE)	7.84	0.36	0.25	3.00	2.47
ZAPATA Z-15 (BASE)	2.89		0.25	1.00	0.72
ZAPATA Z-15 (PIRAMIDE)	2.89	0.36	0.10	1.00	0.14
ZAPATA Z-16 (BASE)	4.00		0.25	5.00	5.00
ZAPATA Z-16 (PIRAMIDE)	4.00	0.36	0.15	5.00	1.39
ZAPATA Z-17 (BASE)	3.06		0.25	1.00	0.77
ZAPATA Z-17 (PIRAMIDE)	3.06	0.36	0.10	1.00	0.15
				TOTAL CANTIDAD	59.80

ESQUEMA

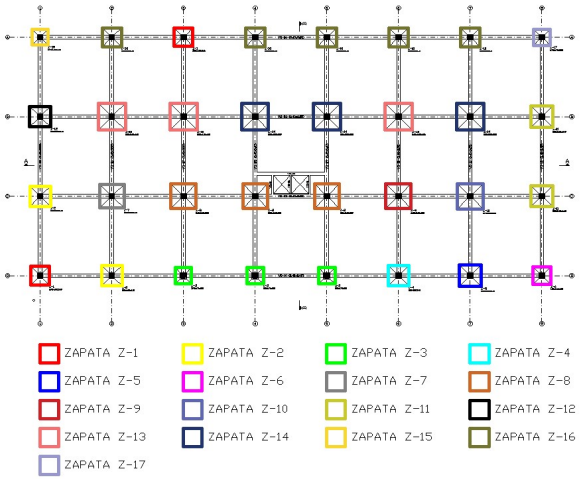

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.07	CONCRETO 21 MPa PARA PEDESTALES	UNIDAD	M3

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
					0.00	

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024	
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.			
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3	

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.08	CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.1MT	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
LOSA DE CONTRAPISO	55.00	28.45		1.00	1564.50
DESCUENTO FOSO ASCENSOR	1.75	1.85		-2.00	-6.48
DESCUENTO COLUMNAS DE 0.60 X 0.60	0.60	0.60		-29.00	-10.44
DESCUENTO COLUMNAS CIRCULARES	0.39			-3.00	-1.16

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.09	CONCRETO 21 Mpa PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0.15MT	UNIDAD	M2

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
				TOTAL CANTIDAD	0.00	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.10	MALLA ELECTROSOLDADA PARA LOSA DE CONTRAPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA MALLA	PESO X M2 MALLA	LONGITUD	CANTIDAD DE MALLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA	LOSA DE CONTRAPISO	6	42.20		145.00	1.00	6,119.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
						TOTAL CANTIDAD	6,119.00

ESQUEMA

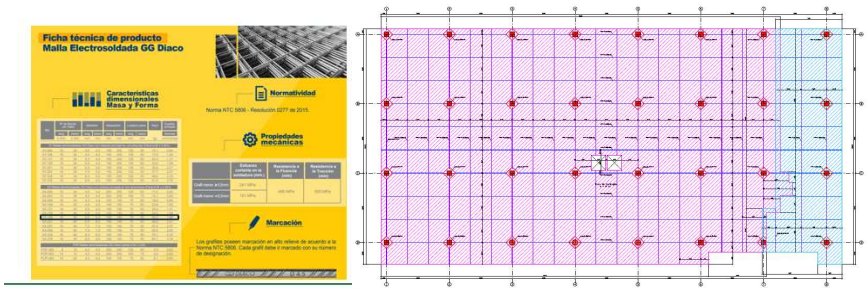

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.11	CORTE Y SELLO DILATACION DE PLACA	UNIDAD	M

DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
JUNTA DE CONSTRUCCION VERTICAL EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B - BYC- C Y D	6.99			24.00	167.76
JUNTA DE CONSTRUCCION VERTICAL EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B -B YC- C Y D	28.80			10.00	288.00
JUNTA DE CONSTRUCCION VERTICAL EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B -B YC- C Y D	27.30			3.00	81.90
JUNTA DE CONSTRUCCION VERTICAL EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B -B YC- C Y D	5.30			1.00	5.30
JUNTA DE CONSTRUCCION VERTICAL EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B -B YC- C Y D	1.92			7.00	13.44
JUNTA DE CONSTRUCCION VERTICAL EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B -B YC- C Y D	0.42			6.00	2.52
JUNTA DE CONSTRUCCION HORIZONTAL -EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B - BYC- C Y D	6.03			28.00	168.84
JUNTA DE CONSTRUCCION HORIZONTAL -EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B - BYC- C Y D	55.00			6.00	330.00
JUNTA DE CONSTRUCCION HORIZONTAL -EJE 1-2-3-4-5-6-7-8 ENTRE A Y B - BYC- C Y D	1.12			4.00	4.48
COLUMNAS DE 60 X 60	4.27			32.00	136.64
				TOTAL CANTIDAD	1,198.88

ESQUEMA

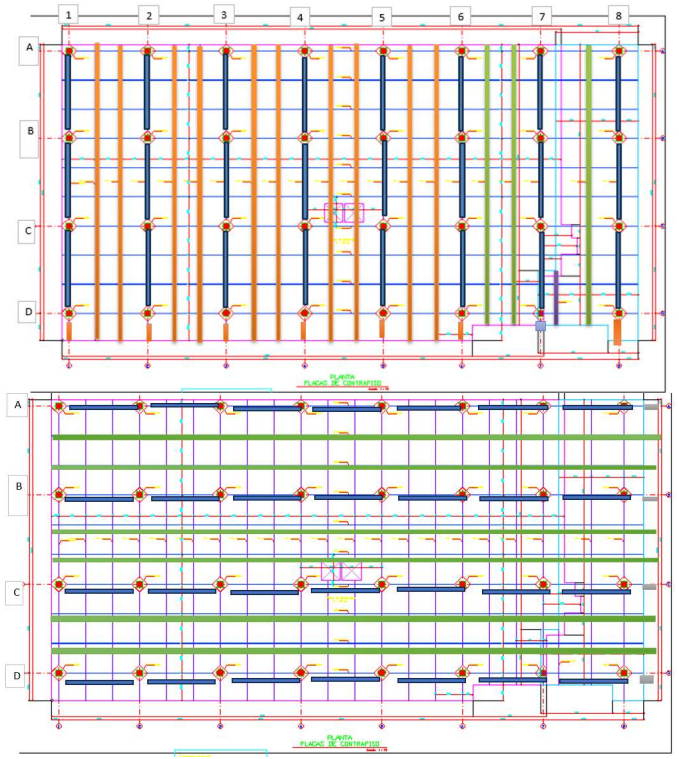

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.01 - CIMIENTOS

ITEM	3.01.12	EXCAVACION MANUAL (ENTRE 0 Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD) INCLUYE RETIRO	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATA Z-1	1.95	1.95	1.15	2.00	8.75
ZAPATA Z-2	2.15	2.15	1.15	2.00	10.63
ZAPATA Z-3	1.70	1.70	1.15	3.00	9.97
ZAPATA Z-4	2.10	2.10	1.15	1.00	5.07
ZAPATA Z-5	2.35	2.35	1.15	1.00	6.35
ZAPATA Z-6	1.90	1.90	1.15	1.00	4.15
ZAPATA Z-7	2.55	2.55	1.15	1.00	7.48
ZAPATA Z-8	2.60	2.60	1.15	3.00	23.32
ZAPATA Z-9	2.65	2.65	1.15	1.00	8.08
ZAPATA Z-10	2.70	2.70	1.15	1.00	8.38
ZAPATA Z-11	2.25	2.25	1.15	2.00	11.64
ZAPATA Z-12	2.20	2.20	1.15	1.00	5.57
ZAPATA Z-13	2.85	2.85	1.15	3.00	28.02
ZAPATA Z-14	2.80	2.80	1.15	3.00	27.05
ZAPATA Z-15	1.70	1.70	1.15	1.00	3.32
ZAPATA Z-16	2.00	2.00	1.15	5.00	23.00
ZAPATA Z-17	1.75	1.75	1.15	1.00	3.52
VIGA VC-01 - EJE D	38.88	0.40	0.70	1.00	10.89
VIGA VC-02 - EJE C	34.60	0.40	0.70	1.00	9.69
VIGA VC-03 - EJE B	33.33	0.40	0.70	1.00	9.33
VIGA VC-04 - EJE A	38.83	0.40	0.70	1.00	10.87
VIGA VC-05 - EJE 1	19.33	0.40	0.70	1.00	5.41
VIGA VC-06 - EJE 2	18.03	0.40	0.70	1.00	5.05
VIGA VC-07 - EJE 3	18.23	0.40	0.70	1.00	5.10
VIGA VC-08 - EJE 4	18.25	0.40	0.70	1.00	5.11
VIGA VC-09 - EJE 5	18.25	0.40	0.70	1.00	5.11
VIGA VC-10 - EJE 6	17.95	0.40	0.70	1.00	5.03
VIGA VC-11 - EJE 7	17.83	0.40	0.70	1.00	4.99
VIGA VC-12 - EJE 8	19.18	0.40	0.70	1.00	5.37
VIGA VTC-01	2.00	0.20	0.70	2.00	0.56
VIGA VTC-02	2.00	0.15	0.70	1.00	0.21
VIGA VTC-03	7.10	0.40	0.70	1.00	1.99
				TOTAL CANTIDAD	279.01

ESQUEMA

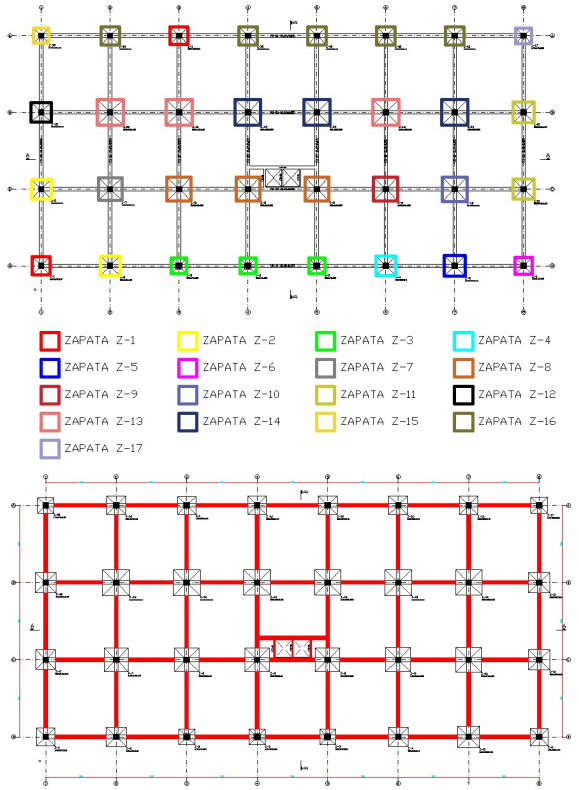

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 8.70 m	COLUMNA TIPO C1 (A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - C3 - C5)	6	2.235	8.70	8.00	13.00	2,022.23
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	13.00	755.43
Varilla #4 longitudinal 4.10 m		4	0.994	4.10	16.00	13.00	847.68
Varilla #5 longitudinal 3.95 m		5	1.552	3.95	8.00	13.00	637.56
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	13.00	1,258.98
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	132.00	13.00	711.11
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	66.00	13.00	1,052.25
Varilla #6 longitudinal 8.70 m	COLUMNA TIPO C1-A (C2 - C6 - D1 - D2)	6	2.235	8.70	8.00	4.00	622.22
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	4.00	232.44
Varilla #5 longitudinal 4.30 m		5	1.552	4.30	16.00	4.00	427.11
Varilla #5 longitudinal 3.95 m		5	1.552	3.95	8.00	4.00	196.17
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	4.00	387.38
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	132.00	4.00	218.80
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	66.00	4.00	323.77
							-
					TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 6		9,693.13

ESQUEMA

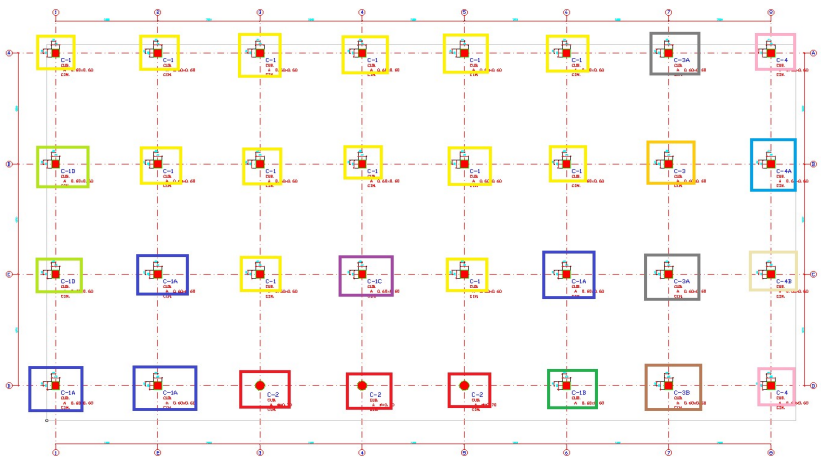

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 8.70 m	COLUMNA TIPO C1-B (D6)	6	2.235	8.70	8.00	1.00	155.56
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	1.00	58.11
Varilla #6 longitudinal 4.50 m		6	2.235	4.50	16.00	1.00	160.92
Varilla #5 longitudinal 3.95 m		5	1.552	3.95	8.00	1.00	49.04
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	1.00	96.84
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	132.00	1.00	54.70
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	66.00	1.00	80.94
Varilla #6 longitudinal 8.70 m	COLUMNA TIPO C1-C (C4)	6	2.235	8.70	8.00	1.00	155.56
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	1.00	58.11
Varilla #4 longitudinal 4.10 m		4	0.994	4.10	16.00	1.00	65.21
Varilla #5 longitudinal 3.95 m		5	1.552	3.95	8.00	1.00	49.04
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	1.00	96.84
Varilla #4 longitudinal 3.30 m		4	0.994	3.30	16.00	1.00	52.48
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	132.00	1.00	54.70
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	66.00	1.00	80.94
					TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 6		1,268.99

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 8.70 m	COLUMNA TIPO C1-D (B1 - C1)	6	2.235	8.70	8.00	2.00	311.11
Varilla #5 longitudinal 3.15 m		5	1.552	3.15	8.00	2.00	78.22
Varilla #5 longitudinal 4.30 m		5	1.552	4.30	16.00	2.00	213.56
Varilla #5 longitudinal 3.95 m		5	1.552	3.95	8.00	2.00	98.09
Varilla #7 longitudinal 8.10 m		7	3.042	8.10	8.00	2.00	394.24
Varilla #5 longitudinal 3.50 m		5	1.552	3.50	16.00	2.00	173.82
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	132.00	2.00	109.40
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	66.00	2.00	161.88
Varilla #6 longitudinal 4.35 m	COLUMNA TIPO C2 (D3 - D4 - D5)	6	2.235	4.35	8.00	3.00	233.33
Varilla #4 longitudinal 7.60 m		6	2.235	7.60	8.00	3.00	407.66
Varilla #5 longitudinal 8.60 m		5	1.552	8.60	8.00	3.00	320.33
Varilla #5 longitudinal 3.15 m		5	1.552	3.15	8.00	3.00	117.33
Varilla #3 longitudinal 0.84 m		3	0.560	0.84	138.00	3.00	194.75
Flejes #3 transversales 2.38 m		3	0.560	2.38	69.00	3.00	275.89
					TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 6		3,089.61

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 9.20 m	COLUMNA TIPO C3 (B7)	6	2.235	9.20	8.00	1.00	164.50
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	1.00	58.11
Varilla #4 longitudinal 4.65 m		4	0.994	4.65	16.00	1.00	73.95
Varilla #5 longitudinal 4.45 m		5	1.552	4.45	8.00	1.00	55.25
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	1.00	96.84
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	140.00	1.00	58.02
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	70.00	1.00	85.85
Varilla #6 longitudinal 9.20 m	COLUMNA TIPO C3 - A (A7 - C7)	6	2.235	9.20	8.00	2.00	328.99
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	2.00	116.22
Varilla #5 longitudinal 4.85 m		5	1.552	4.85	16.00	2.00	240.87
Varilla #5 longitudinal 4.45 m		5	1.552	4.45	8.00	2.00	110.50
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	2.00	193.69
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	140.00	2.00	116.03
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	70.00	2.00	171.70
					TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 6		1,870.52

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 9.20 m	COLUMNA TIPO C3 - B (D7)	6	2.235	9.20	8.00	1.00	164.50
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	1.00	58.11
Varilla #6 longitudinal 5.00 m		6	2.235	5.00	16.00	1.00	178.80
Varilla #5 longitudinal 4.45 m		5	1.552	4.45	8.00	1.00	55.25
Varilla #5 longitudinal 7.80 m		5	1.552	7.80	8.00	1.00	96.84
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	140.00	1.00	58.02
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	70.00	1.00	85.85
Varilla #6 longitudinal 9.20 m	COLUMNA TIPO C4 (D8)	6	2.235	9.20	8.00	2.00	328.99
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	8.00	2.00	116.22
Varilla #4 longitudinal 4.40 m		4	0.994	4.40	16.00	2.00	139.96
Varilla #5 longitudinal 4.20 m		5	1.552	4.20	8.00	2.00	104.29
Varilla #5 longitudinal 8.05 m		5	1.552	8.05	8.00	2.00	199.90
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	140.00	2.00	116.03
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	70.00	2.00	171.70
					TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 6		1,874.46

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 9.20 m	COLUMNA TIPO C4 - A (B8)	6	2.235	9.20	8.00	1.00	164.50
Varilla #5 longitudinal 3.15 m		5	1.552	3.15	8.00	1.00	39.11
Varilla #4 longitudinal 4.40 m		4	0.994	4.40	16.00	1.00	69.98
Varilla #5 longitudinal 3.50 m		5	1.552	3.50	16.00	1.00	86.91
Varilla #7 longitudinal 8.35 m		7	3.042	8.35	8.00	1.00	203.21
Varilla #6 longitudinal 4.20 m		5	1.552	4.20	8.00	1.00	52.15
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	140.00	1.00	58.02
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	70.00	1.00	85.85
Varilla #7 longitudinal 9.45 m	COLUMNA TIPO C4 - B (C8)	7	3.042	9.45	8.00	1.00	229.98
Varilla #5 longitudinal 3.15 m		5	1.552	3.15	8.00	1.00	39.11
Varilla #5 longitudinal 4.55 m		5	1.552	4.55	16.00	1.00	112.99
Varilla #5 longitudinal 4.20 m		5	1.552	4.20	8.00	1.00	52.15
Varilla #7 longitudinal 8.35 m		7	3.042	8.35	8.00	1.00	203.21
Varilla #6 longitudinal 3.50 m		5	1.552	3.50	16.00	1.00	86.91
Varilla #3 longitudinal 0.74 m		3	0.560	0.74	140.00	1.00	58.02
Flejes #3 transversales 2.19 m		3	0.560	2.19	70.00	1.00	85.85
						TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 6	1,627.95

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.02	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 30X40 MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
				TOTAL CANTIDAD	0.00	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.03	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 40X60 MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
				TOTAL CANTIDAD	0.00	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3


3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.04	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS 60X60 MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
COLUMNA TIPO C1			10.15	13.00	131.95
COLUMNA TIPO C1-A			10.15	4.00	40.60
COLUMNA TIPO C1-B			10.15	1.00	10.15
COLUMNA TIPO C-1C			10.15	1.00	10.15
COLUMNA TIPO C1-D			10.15	2.00	20.30
COLUMNA TIPO C3			10.15	1.00	10.15
COLUMNA TIPO C-3A			10.15	2.00	20.30
COLUMNA TIPO C-3B			10.15	1.00	10.15
CULUMNA TIPO C4			10.15	2.00	20.30
COLUMNA TIPO C-4A			10.15	1.00	10.15
COLUMNA TIPO C-4B			10.15	1.00	10.15
				TOTAL CANTIDAD	294.35

ESQUEMA

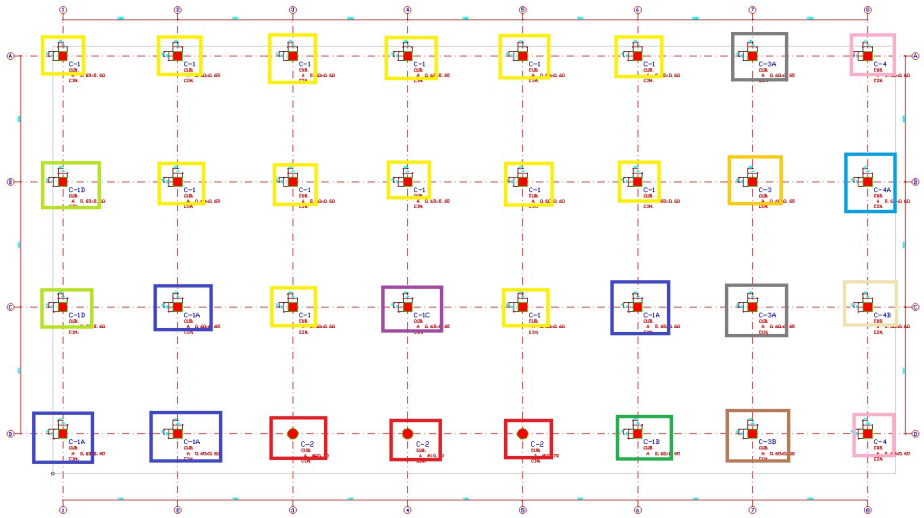

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA


HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024	
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.			
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3	
3.00 EDIFICACION - MODULO A				
3.02 - ESTRUCTURAS				
ITEM	3.02.05	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA PARA COLUMNAS DIAMETRO 0,70 MTS	UNIDAD	ML

DIMENSIONES					TOTAL
DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	
C-2 - (CIRCULAR) - DIAM 70CM			9.30	3.00	27.90
				TOTAL CANTIDAD	27.90

ESQUEMA

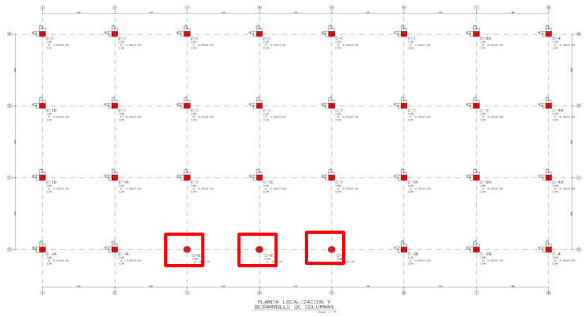

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #7 Longitudinal 8.90m	VIGA-VG-201	7	3.042	8.90	6.00	1.00	162.44
Varilla #8 Longitudinal 4.00m		8	3.973	4.00	3.00	1.00	47.68
Varilla #8 Longitudinal 3.20m		8	3.973	3.20	3.00	1.00	38.14
Varilla #7 Longitudinal 2.75m		7	3.042	2.75	3.00	1.00	25.10
Varilla #7 Longitudinal 2.40m		7	3.042	2.40	3.00	1.00	21.90
Varilla #6 Longitudinal 5.60m		6	2.235	5.60	2.00	1.00	25.03
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	48.00	1.00	54.84
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	48.00	1.00	18.28
Varilla #7 longitudinal 6.55 m	VIGA-VG-201A	7	3.042	6.55	3.00	1.00	59.78
Varilla #7 longitudinal 10.85 m		7	3.042	10.85	3.00	1.00	99.02
Varilla #6 longitudinal 2.70 m		6	2.235	2.70	6.00	1.00	36.21
Varilla #7 longitudinal 5.35 m		7	3.042	5.35	3.00	1.00	48.82
Varilla #6 longitudinal 2.10m		6	2.235	2.10	6.00	1.00	28.16
Varilla #6 longitudinal 3.20m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46
Varilla #4 longitudinal 4.00 m		4	0.994	4.00	2.00	1.00	7.95
Varilla #5 longitudinal 3.60 m		5	1.552	3.60	1.00	1.00	5.59
Varilla #5 longitudinal 10.10 m		5	1.552	10.10	5.00	1.00	78.38
Varilla #5 longitudinal 6.50m		5	1.552	6.50	5.00	1.00	50.44
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	86.00	1.00	98.25
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	86.00	1.00	32.75
						TOTAL CANTIDAD HOJA 1 DE 41	960.22

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #7 longitudinal 6.55 m	VIGA VG-202	7	3.042	6.55	6.00	1.00	119.55	
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	15.00	1.00	401.54	
Varilla #7 longitudinal 10.85m		7	3.042	10.85	3.00	1.00	99.02	
Varilla #8 longitudinal 3.20 m		8	3.973	3.20	6.00	1.00	76.28	
Varilla #8 longitudinal 5.20 m		8	3.973	5.20	9.00	1.00	185.94	
Varilla #7 longitudinal 4.90 m		7	3.042	4.90	6.00	1.00	89.43	
Varilla #10 longitudinal 6.45m		10	6.404	6.45	3.00	1.00	123.92	
Varilla #8 longitudinal 2.60 m		8	3.973	2.60	6.00	1.00	61.98	
Varilla #8 longitudinal 3.70 m		8	3.973	3.70	3.00	1.00	44.10	
Varilla #7 longitudinal 3.40 m		7	3.042	3.40	12.00	1.00	124.11	
Varilla #7 longitudinal 3.10 m		7	3.042	3.10	2.00	1.00	18.86	
Varilla #5 longitudinal 1.80 m		5	1.552	1.80	2.00	1.00	5.59	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	2.00	1.00	12.96	
Varilla #6 longitudinal 5.60 m		6	2.235	5.60	3.00	1.00	37.55	
Varilla #6 longitudinal 3.80 m		6	2.235	3.80	6.00	1.00	50.96	
Varilla #6 longitudinal 5.60 m		6	2.235	5.60	3.00	1.00	37.55	
Varilla #7 longitudinal 10.55m		7	3.042	10.55	3.00	1.00	96.28	
Varilla #7 longitudinal 8.50 m		7	3.042	8.50	15.00	1.00	387.86	
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	301.00	1.00	343.86	
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	301.00	1.00	114.62	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 2 DE 41	2,431.96	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #7 longitudinal 7.20 m	VIGA VG-203	7	3.042	7.20	3.00	1.00	65.71	
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	15.00	1.00	401.54	
Varilla #7 longitudinal 11.20 m		7	3.042	11.20	3.00	1.00	102.21	
Varilla #8 longitudinal 3.85 m		8	3.973	3.85	3.00	1.00	45.89	
Varilla #10 longitudinal 6.45 m		10	6.404	6.45	6.00	1.00	247.83	
Varilla #10 longitudinal 6.90 m		10	6.404	6.90	6.00	1.00	265.13	
Varilla #10 longitudinal 6.00 m		10	6.404	6.00	6.00	1.00	230.54	
Varilla #8 longitudinal 3.55 m		8	3.973	3.55	3.00	1.00	42.31	
Varilla #8 longitudinal 3.25 m		8	3.973	3.25	3.00	1.00	38.74	
Varilla #7 longitudinal 3.70 m		7	3.042	3.70	12.00	1.00	135.06	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	6.00	1.00	38.89	
Varilla #7 longitudinal 2.75 m		7	3.042	2.75	3.00	1.00	25.10	
Varilla #6 longitudinal 2.45 m		6	2.235	2.45	4.00	1.00	21.90	
Varilla #6 longitudinal 2.90m		6	2.235	2.90	8.00	1.00	51.85	
Varilla #6 longitudinal 2.00 m		6	2.235	2.00	4.00	1.00	17.88	
Varilla #6 longitudinal 5.15m		6	2.235	5.15	6.00	1.00	69.06	
Varilla #6 longitudinal 4.70m		6	2.235	4.70	12.00	1.00	126.05	
Varilla #6 longitudinal 4.25m		6	2.235	4.25	2.00	1.00	19.00	
Varilla #7 longitudinal 11.20m		7	3.042	11.20	3.00	1.00	102.21	
Varilla #7 longitudinal 8.50m		7	3.042	8.50	15.00	1.00	387.86	
Varilla #7 longitudinal 6.90m		7	3.042	6.90	3.00	1.00	62.97	
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	362.00	1.00	413.55	
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	362.00	1.00	137.85	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 3 DE 41	3,049.13	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #7 longitudinal 7.20 m	VIGA VG-204	7	3.042	7.20	3.00	1.00	65.71	
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	15.00	1.00	401.54	
Varilla #7 longitudinal 11.20 m		7	3.042	11.20	3.00	1.00	102.21	
Varilla #6 longitudinal 3.35 m		6	2.235	3.35	3.00	1.00	22.46	
Varilla #6 longitudinal 4.40 m		6	2.235	4.40	18.00	1.00	177.01	
Varilla #6 longitudinal 3.05m		6	2.235	3.05	3.00	1.00	20.45	
Varilla #5 longitudinal 2.60 m		5	1.552	2.60	2.00	1.00	8.07	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	2.00	1.00	12.96	
Varilla #5 longitudinal 2.30 m		5	1.552	2.30	8.00	1.00	28.56	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #5 longitudinal 2.00 m		5	1.552	2.00	2.00	1.00	6.21	
Varilla #5 longitudinal 10.75 m		5	1.552	10.75	5.00	1.00	83.42	
Varilla #5 longitudinal 8.10 m		5	1.552	8.10	25.00	1.00	314.28	
Varilla #5 longitudinal 3.60 m		5	1.552	3.60	1.00	1.00	5.59	
Varilla #5 longitudinal 6.85m		5	1.552	6.85	5.00	1.00	53.16	
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	314.00	1.00	358.71	
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	314.00	1.00	119.57	
Varilla #6 longitudinal 9.80m	VIGA VG-205	6	2.235	9.80	3.00	1.00	65.71	
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	6.00	1.00	126.05	
Varilla #6 longitudinal 3.45m		6	2.235	3.45	3.00	1.00	23.13	
Varilla #6 longitudinal 4.50 m		6	2.235	4.50	3.00	1.00	30.17	
Varilla #6 longitudinal 5.35 m		6	2.235	5.35	3.00	1.00	35.87	
					TOTAL CANTIDAD HOJA 4 DE 41		2,082.30	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #6 longitudinal 5.80 m	VIGA VG-205	6	2.235	5.80	3.00	1.00	38.89	
Varilla #6 longitudinal 3.75m		6	2.235	3.75	3.00	1.00	25.14	
Varilla #6 longitudinal 3.30 m		6	2.235	3.30	2.00	1.00	14.75	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	2.00	1.00	14.30	
Varilla #6 longitudinal 3.50 m		6	2.235	3.50	3.00	1.00	23.47	
Varilla #6 longitudinal 2.65m		6	2.235	2.65	2.00	1.00	11.85	
Varilla #5 longitudinal 4.00 m		5	1.552	4.00	2.00	1.00	12.42	
Varilla #5 longitudinal 4.85 m		5	1.552	4.85	2.00	1.00	15.05	
Varilla #5 longitudinal 4.40 m		5	1.552	4.40	2.00	1.00	13.66	
Varilla #5 longitudinal 4.35m		5	1.552	4.35	2.00	1.00	13.50	
Varilla #6 longitudinal 5.05m		6	2.235	5.05	3.00	1.00	33.86	
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	6.00	1.00	124.04	
Varilla #6 longitudinal 8.05 m		6	2.235	8.05	3.00	1.00	53.98	
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	156.00	1.00	160.74	
Varilla #6 longitudinal 8.35 m	VIGA VG-206	6	2.235	8.35	**3.00**	1.00	55.99	
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	**6.00**	1.00	126.05	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	**3.00**	1.00	19.44	
Varilla #6 longitudinal 4.50m		6	2.235	4.50	**3.00**	1.00	30.17	
Varilla #6 longitudinal 5.35m		6	2.235	5.35	**6.00**	1.00	71.74	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	**3.00**	1.00	21.46	
Varilla #6 longitudinal 2.95 m		6	2.235	2.95	2.00	1.00	13.19	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 5 DE 41	893.69	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024	
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.			
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023			
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023			
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3	

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #6 longitudinal 3.50 m	VIGA VG-206	6	2.235	3.50	6.00	1.00	46.94	
Varilla #6 longitudinal 2.10 m		6	2.235	2.10	3.00	1.00	14.08	
Varilla #4 longitudinal 3.40 m		4	0.994	3.40	2.00	1.00	6.76	
Varilla #4 longitudinal 3.30 m		4	0.994	3.30	1.00	1.00	3.28	
Varilla #5 longitudinal 3.80 m		5	1.552	3.80	1.00	1.00	5.90	
Varilla #5 longitudinal 3.45 m		5	1.552	3.45	1.00	1.00	5.35	
Varilla #5 longitudinal 9.10 m		5	1.552	9.10	2.00	1.00	28.25	
Varilla #5 longitudinal 7.50 m		5	1.552	7.50	1.00	1.00	11.64	
Varilla #6 longitudinal 3.60 m		6	2.235	3.60	3.00	1.00	24.14	
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	6.00	1.00	124.04	
Varilla #6 longitudinal 7.50 m		6	2.235	7.50	3.00	1.00	50.29	
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	138.00	1.00	142.20	
Varilla #6 longitudinal 10.25 m	VIGA VG-207	6	2.235	10.25	3.00	1.00	68.73	
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	3.00	1.00	63.03	
Varilla #6 longitudinal 2.90m		6	2.235	2.90	3.00	1.00	19.44	
Varilla #7 longitudinal 6.00 m		7	3.042	6.00	3.00	1.00	54.76	
Varilla #6 longitudinal 5.35 m		6	2.235	5.35	3.00	1.00	35.87	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	3.00	1.00	19.44	
Varilla #6 longitudinal 3.50 m		6	2.235	3.50	3.00	1.00	23.47	
Varilla #6 longitudinal 2.10m		6	2.235	2.10	2.00	1.00	9.39	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 6 DE 41	778.46	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #4 longitudinal 3.75 m	VIGA VG-207	4	0.994	3.75	1.00	1.00	3.73	
Varilla #4 longitudinal 4.20 m		4	0.994	4.20	1.00	1.00	4.17	
Varilla #5 longitudinal 4.25m		5	1.552	4.25	1.00	1.00	6.60	
Varilla #5 longitudinal 5.35m		5	1.552	5.35	1.00	1.00	8.30	
Varilla #5 longitudinal 9.10 m		5	1.552	9.10	1.00	1.00	14.12	
Varilla #5 longitudinal 7.50 m		5	1.552	7.50	1.00	1.00	11.64	
Varilla #6 longitudinal 5.50 m		6	2.235	5.50	2.00	1.00	24.59	
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35	
Varilla #6 longitudinal 7.50 m		6	2.235	7.50	2.00	1.000	33.53	
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	104.00	1.00	107.16	
Varilla #6 longitudinal 10.25 m	VIGA VG-208	6	2.235	10.25	3.00	1.00	68.73	
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	3.00	1.00	63.03	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	3.00	1.00	19.44	
Varilla #8 longitudinal 5.85 m		8	3.973	5.85	3.00	1.00	69.73	
Varilla #6 longitudinal 5.35 m		6	2.235	5.35	3.00	1.00	35.87	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #7 longitudinal 3.40 m		7	3.042	3.40	3.00	1.00	31.03	
Varilla #6 longitudinal 3.50 m		6	2.235	3.50	3.00	1.00	23.47	
Varilla #6 longitudinal 2.10 m		6	2.235	2.10	2.00	1.00	9.39	
Varilla #5 longitudinal 2.40m		5	1.552	2.40	2.00	1.00	7.45	
Varilla #5 longitudinal 4.15m		5	1.552	4.15	2.00	1.00	12.88	
Varilla #5 longitudinal 4.25 m		5	1.552	4.25	1.00	1.00	6.60	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 7 DE 41	624.27	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #5 longitudinal 5.35 m	VIGA VG-208	5	1.552	5.35	1.00	1.00	8.30	
Varilla #5 longitudinal 9.10m		5	1.552	9.10	1.00	1.00	14.12	
Varilla #5 longitudinal 7.50 m		5	1.552	7.50	1.00	1.00	11.64	
Varilla #6 longitudinal 5.50 m		6	2.235	5.50	2.00	1.00	24.59	
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35	
Varilla #6 longitudinal 7.50 m		6	2.235	7.50	2.00	1.00	33.53	
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	106.00	1.00	109.22	
Varilla #6 longitudinal 10.25 m	VIGA VG-209	6	2.235	10.25	3.00	1.00	68.73	
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	3.00	1.00	63.03	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	3.00	1.00	19.44	
Varilla #8 longitudinal 5.85 m		8	3.973	5.85	3.00	1.00	69.73	
Varilla #6 longitudinal 5.35 m		6	2.235	5.35	3.00	1.00	35.87	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #7 longitudinal 3.40 m		7	3.042	3.40	3.00	1.00	31.03	
Varilla #6 longitudinal 3.80 m		6	2.235	3.80	3.00	1.00	25.48	
Varilla #6 longitudinal 2.10 m		6	2.235	2.10	2.00	1.00	9.39	
Varilla #5 longitudinal 2.70 m		5	1.552	2.70	2.00	1.00	8.38	
Varilla #5 longitudinal 4.15 m		5	1.552	4.15	2.00	1.00	12.88	
Varilla #5 longitudinal 4.25 m		5	1.552	4.25	1.00	1.00	6.60	
Varilla #5 longitudinal 5.35m		5	1.552	5.35	1.00	1.00	8.30	
Varilla #5 longitudinal 9.10 m		5	1.552	9.10	1.00	1.00	14.12	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 8 DE 41	637.19	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #5 longitudinal 7.50 m	VIGA VG-209	5	1.552	7.50	1.00	1.00	11.64	
Varilla #6 longitudinal 5.50 m		6	2.235	5.50	2.00	1.00	24.59	
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	2.00	1.00	41.35	
Varilla #6 longitudinal 7.50 m		6	2.235	7.50	2.00	1.00	33.53	
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	108.00	1.00	111.28	
Varilla #6 longitudinal 8.35 m	VIGA VG-210	6	2.235	8.35	3.00	1.00	55.99	
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	6.00	1.00	126.05	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	3.00	1.00	19.44	
Varilla #7 longitudinal 4.80 m		7	3.042	4.80	3.00	1.00	43.80	
Varilla #8 longitudinal 6.60 m		8	3.973	6.60	3.00	1.00	78.67	
Varilla #6 longitudinal 5.35 m		6	2.235	5.35	3.00	1.00	35.87	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.550	3.00	1.00	32.40	
Varilla #7 longitudinal 3.40 m		7	3.042	3.40	3.00	1.00	31.03	
Varilla #6 longitudinal 3.50 m		6	2.235	3.50	3.00	1.00	23.47	
Varilla #6 longitudinal 2.10 m		6	2.235	2.10	3.00	1.00	14.08	
Varilla #6 longitudinal 4.35m		6	2.235	4.35	3.00	1.00	29.17	
Varilla #5 longitudinal 7.95m		5	1.552	7.95	1.00	1.00	12.34	
Varilla #6 longitudinal 3.60m		6	2.235	3.60	3.00	1.00	24.14	
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	6.00	1.00	124.04	
Varilla #6 longitudinal 7.50 m		6	2.235	7.50	3.00	1.00	50.29	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 9 DE 41	944.63	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Fleje #3 Transversal 1.84m	VIGA VG-210	3	0.560	1.84	146.00	1.00	150.44
Varilla #6 longitudinal 8.35m	VIGA VG-211	6	2.235	8.35	3.00	1.00	55.99
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	6.00	1.00	126.05
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	3.00	1.00	21.79
Varilla #7 longitudinal 4.80 m		7	3.042	4.80	3.00	1.00	43.80
Varilla #8 longitudinal 6.60 m		8	3.973	6.60	3.00	1.00	78.67
Varilla #7 longitudinal 6.30 m		7	3.042	6.30	3.00	1.00	57.49
Varilla #6 longitudinal 4.00 m		6	2.235	4.00	3.00	1.00	26.82
Varilla #7 longitudinal 3.55 m		7	3.042	3.55	3.00	1.00	32.40
Varilla #7 longitudinal 3.40 m		7	3.042	3.40	3.00	1.00	31.03
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	2.00	1.00	12.96
Varilla #6 longitudinal 2.75 m		6	2.235	2.75	3.00	1.00	18.44
Varilla #6 longitudinal 6.90m		6	2.235	6.90	2.00	1.00	30.84
Varilla #4 longitudinal 4.20m		4	0.994	4.20	1.00	1.00	4.17
Varilla #4 longitudinal 4.50m		4	0.994	4.50	2.00	1.00	8.95
Varilla #6 longitudinal 3.60m		6	2.235	3.60	3.00	1.00	24.14
Varilla #6 longitudinal 9.25 m		6	2.235	9.25	6.00	1.00	124.04
Varilla #6 longitudinal 7.85m		6	2.235	7.85	3.00	1.00	52.63
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	149.00	1.00	153.53
						TOTAL CANTIDAD HOJA 10 DE 41	1,054.18

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 8.35 m	VIGA VG-212	6	2.235	8.35	3.00	1.00	55.99
Varilla #6 longitudinal 9.40 m		6	2.235	9.40	6.00	1.00	126.05
Varilla #6 longitudinal 3.25 m		6	2.235	3.25	3.00	1.00	21.79
Varilla #6 longitudinal 4.50m		6	2.235	4.50	3.00	1.00	30.17
Varilla #6 longitudinal 5.35 m		6	2.235	5.35	6.00	1.00	71.74
Varilla #6 longitudinal 3.55m		6	2.235	3.55	3.00	1.00	23.80
Varilla #6 longitudinal 2.95 m		6	2.235	2.95	2.00	1.00	13.19
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	4.00	1.00	28.61
Varilla #6 longitudinal 2.45 m		6	2.235	2.45	2.00	1.00	10.95
Varilla #4 longitudinal 3.85m		4	0.994	3.85	2.00	1.00	7.65
Varilla #5 longitudinal 3.80m		5	1.552	3.80	1.00	1.00	5.90
Varilla #4 longitudinal 4.20m		4	0.994	4.20	1.00	1.00	4.17
Varilla #5 longitudinal 4.15 m		5	1.552	4.15	2.00	1.00	12.88
Varilla #6 longitudinal 3.60 m		6	2.235	3.60	3.00	1.00	24.14
Varilla #6 longitudinal 9.25m		6	2.235	9.25	6.00	1.00	124.04
Varilla #6 longitudinal 7.85 m		6	2.235	7.85	3.00	1.00	52.63
Fleje #3 Transversal 1.84m		3	0.560	1.84	143.00	1.00	147.35
Varilla #3 longitudinal 9.15 m	VIGUETA VT-201	3	0.560	9.15	2.00	1.00	10.25
Varilla #4 longitudinal 7.70 m		4	0.994	7.70	2.00	1.00	15.31
Varilla #4 longitudinal 9.20 m		4	0.994	9.20	2.00	1.00	18.29
Fleje #2 Transversal 1.34m		2	0.249	1.34	24.00	1.00	8.01
						TOTAL CANTIDAD HOJA 11 DE 41	812.91

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #4 longitudinal 3.90 m	VIGUETA VT-202	4	0.994	3.90	4.00	1.00	15.51
Fleje #2 Transversal 1.34m		2	0.249	1.34	15.00	1.00	5.00
Varilla #4 longitudinal 2.90 m	VIGUETA VT-203	4	0.994	2.90	4.00	1.00	11.53
Fleje #2 Transversal 1.34m		2	0.249	1.34	12.00	1.00	4.00
Varilla #3 longitudinal 8.15 m	VIGUETA VT-204	3	0.560	8.15	2.00	1.00	9.13
Varilla #6 longitudinal 5.30 m		6	2.235	5.30	2.00	1.00	23.69
Varilla #3 longitudinal 4.35m		3	0.560	4.35	2.00	1.00	4.87
Varilla #7 longitudinal 5.90m		7	3.042	5.90	2.00	1.00	35.90
Varilla #3 longitudinal 7.25m		3	0.560	7.25	2.00	1.00	8.12
Varilla #6 longitudinal 3.40m		6	2.235	3.40	2.00	1.00	15.20
Varilla #5 longitudinal 2.80m		5	1.552	2.80	2.00	1.00	8.69
Varilla #6 longitudinal 6.10m		6	2.235	6.10	2.00	1.00	27.27
Varilla #4 longitudinal 4.45m		4	0.994	4.45	2.00	1.00	8.85
Varilla #6 longitudinal 6.40m		6	2.235	6.40	2.00	1.00	28.61
Varilla #6 longitudinal 10.25 m		6	2.235	10.25	2.00	1.00	45.82
Varilla #4 longitudinal 9.10m		4	0.994	9.10	2.00	1.00	18.09
Varilla #6 longitudinal 9.35 m		6	2.235	9.35	2.00	1.00	41.79
Fleje #2 Transversal 1.44m		2	0.249	1.44	89.00	1.00	31.91
Varilla #3 longitudinal 2.95 m	VIGUETA VT-205	3	0.560	2.95	2.00	1.00	3.30
Varilla #4 longitudinal 3.00 m		4	0.994	3.00	2.00	1.00	5.96
Fleje #2 Transversal 1.34m		2	0.249	1.34	10.00	1.00	3.34
					TOTAL CANTIDAD HOJA 12 DE 41		356.58

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #4 longitudinal 3.45 m	VIGUETA VT-206	4	0.994	3.45	4.00	1.00	13.72	
Fleje #2 Transversal 1.34m		2	0.249	1.34	16.00	1.00	5.34	
Varilla #3 longitudinal 9.55 m	VIGUETA VT-207	3	0.560	9.55	2.00	1.00	10.70	
Varilla #6 longitudinal 5.30 m		6	2.235	5.30	2.00	1.00	23.69	
Varilla #3 longitudinal 4.35 m		3	0.560	4.35	2.00	1.00	4.87	
Varilla #7 longitudinal 5.90 m		7	3.042	5.90	2.00	1.00	35.90	
Varilla #3 longitudinal 7.25 m		3	0.560	7.25	2.00	1.00	8.12	
Varilla #4 longitudinal 2.90m		4	0.994	2.90	2.00	1.00	5.77	
Varilla #6 longitudinal 3.40m		6	2.235	3.40	2.00	1.00	15.20	
Varilla #6 longitudinal 3.10m		6	2.235	3.10	2.00	1.00	13.86	
Varilla #5 longitudinal 5.60m		5	1.552	5.60	2.00	1.00	17.38	
Varilla #4 longitudinal 4.45 m		4	0.994	4.45	2.00	1.00	8.85	
Varilla #6 longitudinal 6.10 m		6	2.235	6.10	2.00	1.00	27.27	
Varilla #6 longitudinal 11.65 m		6	2.235	11.65	2.00	1.00	52.08	
Varilla #4 longitudinal 9.10 m		4	0.994	9.10	2.00	1.00	18.09	
Varilla #6 longitudinal 9.35 m		6	2.235	9.35	2.00	1.00	41.79	
Fleje #2 Transversal 1.44m		2	0.249	1.44	92.00	1.00	32.99	
Varilla #6 longitudinal 5.20m	VIGUETA VT-208	6	2.235	5.20	2.00	1.00	23.24	
Varilla #3 longitudinal 5.30 m		3	0.560	5.30	2.00	1.00	5.94	
Varilla #6 longitudinal 4.85 m		6	2.235	4.85	2.00	1.00	21.68	
Varilla #3 longitudinal 4.80 m		3	0.560	4.80	2.00	1.00	5.38	
Varilla #7 longitudinal 5.90 m		7	3.042	5.90	2.00	1.00	35.90	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 13 DE 41	427.76	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #3 longitudinal 7.25 m	VIGUETA VT-208	3	0.560	7.25	2.00	1.00	8.12	
Varilla #5 longitudinal 2.80 m		5	1.552	2.80	4.00	1.00	17.38	
Varilla #6 longitudinal 3.10m		6	2.235	3.10	2.00	1.00	13.86	
Varilla #5 longitudinal 4.65 m		5	1.552	4.65	2.00	1.00	14.43	
Varilla #3 longitudinal 3.90 m		3	0.560	3.90	2.00	1.00	4.37	
Varilla #6 longitudinal 6.40m		6	2.235	6.40	2.00	1.00	28.61	
Varilla #5 longitudinal 11.60m		5	1.552	11.60	2.00	1.00	36.01	
Varilla #5 longitudinal 9.20m		5	1.552	9.20	2.00	1.00	28.56	
Varilla #6 longitudinal 9.35m		6	2.235	9.35	2.00	1.00	41.79	
Fleje #2 Transversal 1.44m		2	0.249	1.44	91.00	1.00	32.63	
Varilla #3 longitudinal 6.75 m	VIGUETA VT-209	3	0.560	6.75	4.00	6.00	90.72	
Varilla #7 longitudinal 6.40 m		7	3.042	6.40	2.00	6.00	233.63	
Varilla #7 longitudinal 4.60 m		7	3.042	4.60	2.00	6.00	167.92	
Varilla #6 longitudinal 5.60 m		6	2.235	5.60	4.00	6.00	300.38	
Varilla #6 longitudinal 9.35 m		6	2.235	9.35	4.00	6.00	501.53	
Fleje #2 Transversal 1.44m		2	0.249	1.44	58.00	6.00	124.78	
Varilla #3 longitudinal 3.45 m	VIGUETA VT-210	3	0.560	3.45	2.00	2.00	7.73	
Varilla #3 longitudinal 1.90 m		3	0.560	1.90	2.00	2.00	4.26	
Varilla #4 longitudinal 3.50 m		4	0.994	3.50	2.00	2.00	13.92	
Fleje #2 Transversal 1.44m		2	0.249	1.44	12.00	2.00	8.61	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 14 DE 41	1,679.24	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #3 longitudinal 3.45 m	VIGUETA VT-211	3	0.560	3.45	2.00	4.00	15.46
Varilla #4 longitudinal 3.50 m		4	0.994	3.50	2.00	4.00	27.83
Fleje #2 Transversal 1.44m		2	0.249	1.44	12.00	4.00	17.21
Varilla #4 longitudinal 8.10 m	VIGUETA VT-212	4	0.994	8.10	2.00	1.00	16.10
Varilla #4 longitudinal 4.80 m		4	0.994	4.80	2.00	1.00	9.54
Varilla #6 longitudinal 8.25 m		6	2.235	8.25	2.00	1.00	36.88
Fleje #3 transversal 1.64 m		3	0.560	1.64	22.00	1.00	20.20
Varilla #5 longitudinal 5.60m	VIGUETA VT-213	5	1.552	5.60	2.00	6.00	104.29
Varilla #3 longitudinal 4.80m		3	0.560	4.80	2.00	6.00	32.26
Varilla #7 longitudinal 5.90m		7	3.042	5.90	2.00	6.00	215.37
Varilla #3 longitudinal 7.25m		3	0.560	7.25	2.00	6.00	48.72
Varilla #5 longitudinal 3.10 m		5	1.552	3.10	2.00	6.00	57.73
Varilla #6 longitudinal 3.10 m		6	2.235	3.10	2.00	6.00	83.14
Varilla #4 longitudinal 2.10 m		4	0.994	2.10	2.00	6.00	25.05
Varilla #4 longitudinal 4.45 m		4	0.994	4.45	2.00	6.00	53.08
Varilla #6 longitudinal 6.10 m		6	2.235	6.10	2.00	6.00	163.60
Varilla #4 longitudinal 3.50 m		4	0.994	3.50	2.00	6.00	41.75
Varilla #5 longitudinal 9.20m		5	1.552	9.20	2.00	6.00	171.34
Varilla #6 longitudinal 9.35 m		6	2.235	9.35	2.00	6.00	250.77
Fleje #3 transversal 1.44 m		3	0.560	1.44	67.00	6.00	324.17
					TOTAL CANTIDAD HOJA 15 DE 41		1,714.49

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #3 longitudinal 4.00 m	VIGUETA VT-214	3	0.560	4.00	2.00	2.00	8.96	
Varilla #7 longitudinal 6.25 m		7	3.042	6.25	2.00	2.00	76.05	
Varilla #3 longitudinal 7.25m		3	0.560	7.25	2.00	2.00	16.24	
Varilla #5 longitudinal 2.80m		5	1.552	2.80	2.00	2.00	17.38	
Varilla #3 longitudinal 4.05m		3	0.560	4.05	2.00	2.00	9.07	
Varilla #6 longitudinal 6.10m		6	2.235	6.10	2.00	2.00	54.53	
Varilla #4 longitudinal 6.75 m		4	0.994	6.75	2.00	2.00	26.84	
Varilla #6 longitudinal 9.35 m		6	2.235	9.35	2.00	2.00	83.59	
Fleje #2 Transversal 1.44 m		2	0.249	1.44	49.00	2.00	35.14	
Varilla #3 longitudinal 2.90 m	VIGUETA VT-215	3	0.560	2.90	2.00	4.00	12.99	
Varilla #4 longitudinal 2.95m		4	0.994	2.95	2.00	4.00	23.46	
Fleje #2 transversal 1.34 m		2	0.249	1.34	9.00	4.00	12.01	
Varilla #3 longitudinal 9.25m	VIGUETA VT-216	3	0.560	9.25	2.00	1.00	10.36	
Varilla #6 longitudinal 5.65m		6	2.235	5.65	2.00	1.00	25.26	
Varilla #3 longitudinal 7.25m		3	0.560	7.25	2.00	1.00	8.12	
Varilla #3 longitudinal 2.30m		3	0.560	2.30	2.00	1.00	2.58	
Varilla #6 longitudinal 3.40 m		6	2.235	3.40	2.00	1.00	15.20	
Varilla #3 longitudinal 2.70m		3	0.560	2.70	2.00	1.00	3.02	
Varilla #6 longitudinal 6.40 m		6	2.235	6.40	2.00	1.00	28.61	
Varilla #4 longitudinal 5.90 m		4	0.994	5.90	2.00	1.00	11.73	
Varilla #4 longitudinal 6.80m		4	0.994	6.80	2.00	1.00	13.52	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 16 DE 41	494.66	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #6 longitudinal 9.35 m	VIGUETA VT-216	6	2.235	9.35	2.00	1.00	41.79
Fleje #2 transversal 1.44 m		2	0.249	1.44	61.00	1.00	21.87
Fleje #2 transversal 1.34 m		2	0.249	1.34	9.00	1.00	3.00
Varilla #4 longitudinal 8.10m	VIGUETA VT-217	4	0.994	8.10	2.00	1.00	16.10
Varilla #7 longitudinal 6.20 m		7	3.042	6.20	2.00	1.00	37.72
Varilla #7 longitudinal 7.40 m		7	3.042	7.40	2.00	1.00	45.02
Varilla #7 longitudinal 8.35m		7	3.042	8.35	2.00	1.00	50.80
Fleje #3 transversal 1.64 m		3	0.560	1.64	22.00	1.00	20.20
Varilla #4 longitudinal 8.10m	VIGUETA VT-218	4	0.994	8.10	2.00	1.00	16.10
Varilla #5 longitudinal 5.60 m		5	1.552	5.60	2.00	1.00	17.38
Varilla #7 longitudinal 8.35 m		7	3.042	8.35	2.00	1.00	50.80
Fleje #3 transversal 1.64 m		3	0.560	1.64	22.00	1.00	20.20
Varilla #3 longitudinal 7.05 m	VIGUETA VT-219	3	0.560	7.05	2.00	3.00	23.69
Varilla #3 longitudinal 1.95m		3	0.560	1.95	2.00	3.00	6.55
Varilla #4 longitudinal 4.10m		4	0.994	4.10	2.00	3.00	24.45
Varilla #5 longitudinal 7.20m		5	1.552	7.20	2.00	3.00	67.05
Fleje #2 transversal 1.44 m		2	0.249	1.44	24.00	3.00	25.82
						TOTAL CANTIDAD HOJA 17 DE 41	488.54

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #4 longitudinal 8.10m	VIGUETA VT-220	4	0.994	8.10	2.00	1.00	16.10	
Varilla #5 longitudinal 3.95m		5	1.552	3.95	2.00	1.00	12.26	
Varilla #7 longitudinal 5.75m		7	3.042	5.75	2.00	1.00	34.98	
Varilla #8 longitudinal 7.60m		8	3.973	7.60	2.00	1.00	60.39	
Varilla #8 longitudinal 8.45 m		8	3.973	8.45	2.00	1.00	67.14	
Fleje #3 transversal 1.64 m		3	0.560	1.64	23.00	1.00	21.12	
Varilla #3 longitudinal 8.15m	VIGUETA VT-221	3	0.560	8.15	2.00	3.00	27.38	
Varilla #6 longitudinal 5.30 m		6	2.235	5.30	2.00	3.00	71.07	
Varilla #3 longitudinal 4.35 m		3	0.560	4.35	2.00	3.00	14.62	
Varilla #7 longitudinal 5.90m		7	3.042	5.90	2.00	3.00	107.69	
Varilla #3 longitudinal 7.65m		3	0.560	7.65	2.00	3.00	25.70	
Varilla #3 longitudinal 1.95m		3	0.560	1.95	2.00	3.00	6.55	
Varilla #6 longitudinal 3.40m		6	2.235	3.40	2.00	3.00	45.59	
Varilla #5 longitudinal 2.80m		5	1.552	2.80	2.00	3.00	26.07	
Varilla #6 longitudinal 6.10m		6	2.235	6.10	4.00	3.00	163.60	
Varilla #4 longitudinal 4.45m		4	0.994	4.45	2.00	3.00	26.54	
Varilla #6 longitudinal 10.25m		6	2.235	10.25	2.00	3.00	137.45	
Varilla #4 longitudinal 9.10m		4	0.994	9.10	2.00	3.00	54.27	
Varilla #6 longitudinal 9.75m		6	2.235	9.75	2.00	3.00	130.75	
Fleje #2 transversal 1.44 m		2	0.249	1.44	91.00	3.00	97.89	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 18 DE 41	1,147.16	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #3 longitudinal 9.95m	VIGUETA VT-222	3	0.560	9.95	2.00	1.00	11.14
Varilla #3 longitudinal 6.20m		3	0.560	6.20	2.00	1.00	6.94
Varilla #4 longitudinal 10.00m		4	0.994	10.00	2.00	1.00	19.88
Fleje #2 transversal 1.34 m		2	0.249	1.34	32.00	1.00	10.68
Varilla #3 longitudinal 1.90m	RIOSTRA EJE A - 1	3	0.560	1.90	2.00	1.00	2.13
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	5.00	1.00	0.83
Varilla #3 longitudinal 9.55m	RIOSTRA EJE A ENTRE 7 - 8	3	0.560	9.55	2.00	1.00	10.70
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	30.00	1.00	5.00
Varilla #3 longitudinal 12.00m	RIOSTRA ENTRE EJE A - B, 1 - 8	3	0.560	12.00	8.00	1.00	53.76
Varilla #3 longitudinal 8.00m		3	0.560	8.00	2.00	1.00	8.96
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	173.00	1.00	28.86
Varilla #3 longitudinal 12.00m	RIOSTRA ENTRE EJE B - C, 1 - 8	3	0.560	12.00	8.00	1.00	53.76
Varilla #3 longitudinal 6.90m		3	0.560	6.90	2.00	1.00	7.73
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	168.00	1.00	28.03
Varilla #3 longitudinal 3.95m	RIOSTRAS VACIO ENTRE EJE B - C, 2	3	0.560	3.95	2.00	1.00	4.42
Varilla #3 longitudinal 2.23m		3	0.560	2.23	2.00	1.00	2.50
Varilla #3 longitudinal 2.13m		3	0.560	2.13	2.00	1.00	2.39
Varilla #3 longitudinal 0.50m		3	0.560	0.50	2.00	1.00	0.56
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	26.00	1.00	4.34
Varilla #3 longitudinal 2.13m	RIOSTRAS VACIO ENTRE EJE B - C, 7	3	0.560	2.13	4.00	1.00	4.77
Varilla #3 longitudinal 0.50m		3	0.560	0.50	2.00	1.00	0.56
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	14.00	1.00	2.34
Varilla #3 longitudinal 7.90m	RIOSTRA ENTRE EJE C - D, 1 - 2	3	0.560	7.90	2.00	1.00	8.85
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	24.00	1.00	4.00
					TOTAL CANTIDAD HOJA 19 DE 41		283.13

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #3 longitudinal 7.90m	RIOSTRA ENTRE EJE C - D, 6 - 7	3	0.560	7.90	2.00	1.00	8.85	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	24.00	1.00	4.00	
Varilla #3 longitudinal 7.80m	RIOSTRA ENTRE EJE C - D, 7 - 8	3	0.560	7.80	2.00	1.00	8.74	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	24.00	1.00	4.00	
Varilla #3 longitudinal 1.50m	RIOSTRAS VANO ENTRE EJE C, 3 Y 6	3	0.560	1.50	2.00	2.00	3.36	
Varilla #3 longitudinal 1.65m		3	0.560	1.65	2.00	2.00	3.70	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	9.00	2.00	3.00	
Varilla #3 longitudinal 7.80m	RIOSTRA ENTRE EJE C - D, 3 - 4 Y 5 - 6	3	0.560	7.80	2.00	2.00	17.47	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	24.00	2.00	8.01	
Varilla #3 longitudinal 5.05m	RIOSTRA ENTRE EJE D, 1 - 2	3	0.560	7.80	2.00	1.00	8.74	
Varilla #3 longitudinal 0.95m		3	0.560	0.95	2.00	1.00	1.06	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	18.00	1.00	3.00	
Varilla #3 longitudinal 12.00m	RIOSTRA ENTRE EJE D, 6 - 8	3	0.560	12.00	2.00	1.00	13.44	
Varilla #3 longitudinal 4.00m		3	0.560	4.00	2.00	1.00	4.48	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	48.00	1.00	8.01	
Varilla #3 longitudinal 0.75m	RIOSTRA ENTRE EJE B, 8	3	0.560	0.75	2.00	1.00	0.84	
flejes #2 longitudinal 0.67 m		2	0.249	0.67	2.00	1.00	0.33	
Varilla #3 longitudinal 1.05m	RIOSTRA SOBREANCHO ENTRE EJE A, 1	3	0.560	1.05	2.00	1.00	1.18	
Varilla #2 longitudinal 0.92m		2	0.249	0.92	3.00	1.00	0.69	
Varilla #3 longitudinal 4.95m	RIOSTRA SOBREANCHO ENTRE EJE C, 4 - 5	3	0.560	4.95	2.00	1.00	5.54	
Varilla #2 longitudinal 0.92m		2	0.249	0.92	16.00	1.00	3.67	
Varilla #3 longitudinal 10.75m	RIOSTRA SOBREANCHO ENTRE EJE B - D, 8	3	0.560	10.75	2.00	1.00	12.04	
Varilla #2 longitudinal 0.92m		2	0.249	0.92	37.00	1.00	8.48	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 20 DE 41	132.63	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #3 longitudinal 9.30m	RIOSTRA SOBREANCHO ENTRE EJE C - D, 2 - 3	3	0.560	9.30	2.00	1.00	10.42
Varilla #3 longitudinal 4.80m		3	0.560	4.80	2.00	1.00	5.38
Varilla #3 longitudinal 0.77m		3	0.560	0.77	2.00	1.00	0.86
Varilla #3 longitudinal 1.15m		3	0.560	1.15	2.00	1.00	1.29
Varilla #2 longitudinal 0.92m		2	0.249	0.92	54.00	1.00	12.37
Varilla #3 longitudinal 6.60m	RIOSTRA SOBREANCHO ENTRE EJE C - D, 6 - 7	3	0.560	6.60	2.00	1.00	7.39
Varilla #3 longitudinal 1.15m		3	0.560	1.15	2.00	1.00	1.29
Varilla #3 longitudinal 0.77m		3	0.560	0.77	2.00	1.00	0.86
Varilla #3 longitudinal 5.20m		3	0.560	5.20	2.00	1.00	5.82
Varilla #3 longitudinal 3.20m		3	0.560	3.20	2.00	1.00	3.58
Varilla #2 longitudinal 0.92m		2	0.249	0.92	58.00	1.00	13.29
Varilla #3 longitudinal 1.35m	RIOSTRA SOBREANCHO ENTRE EJE D, 8	3	0.560	1.35	2.00	1.00	1.51
Varilla #2 longitudinal 0.92m		2	0.249	0.92	4.00	1.00	0.92
					TOTAL CANTIDAD HOJA 21 DE 41		64.98

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #5 longitudinal 6.85 m	VIGA VG-301	5	1.552	6.85	5.00	1.00	53.16	
Varilla #5 longitudinal 8.25 m		5	1.552	8.25	5.00	1.00	64.02	
Varilla #5 longitudinal 8.30 m		5	1.552	8.30	20.00	1.00	257.63	
Varilla #5 longitudinal 8.35 m		5	1.552	8.35	5.00	1.00	64.80	
Varilla #5 longitudinal 3.85 m		5	1.552	3.85	5.00	1.00	29.88	
Varilla #6 longitudinal 2.75 m		6	2.235	2.75	2.00	1.00	12.29	
Varilla #7 longitudinal 4.60 m		7	3.042	4.60	3.00	1.00	41.98	
Varilla #6 longitudinal 4.20 m		6	2.235	4.20	6.00	1.00	56.32	
Varilla #6 longitudinal 3.90 m		6	2.235	3.90	3.00	1.00	26.15	
Varilla #6 longitudinal 4.10 m		6	2.235	4.10	3.00	1.00	27.49	
Varilla #6 longitudinal 4.40 m		6	2.235	4.40	3.00	1.00	29.50	
Varilla #6 longitudinal 3.50 m		6	2.235	3.50	3.00	1.00	23.47	
Varilla #6 longitudinal 2.45 m		6	2.235	2.45	2.00	1.00	10.95	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	5.00	1.00	32.41	
Varilla #6 longitudinal 3.00 m		6	2.235	3.00	2.00	1.00	13.41	
Varilla #6 longitudinal 2.70 m		6	2.235	2.70	2.00	1.00	12.07	
Varilla #6 longitudinal 3.30 m		6	2.235	3.30	2.00	1.00	14.75	
Varilla #5 longitudinal 2.60 m		5	1.552	2.60	3.00	1.00	12.11	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #5 longitudinal 2.70 m		5	1.552	2.70	14.00	1.00	58.67	
Varilla #5 longitudinal 10.45 m		5	1.552	10.45	5.00	1.00	81.09	
Varilla #5 longitudinal 8.15 m		5	1.552	8.15	5.00	1.00	63.24	
Varilla #5 longitudinal 8.10 m		5	1.552	8.10	15.00	1.00	188.57	
Varilla #5 longitudinal 8.05 m		5	1.552	8.05	5.00	1.00	62.47	
					TOTAL CANTIDAD HOJA 22 DE 41		1,257.89	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL
Varilla #5 longitudinal 7.55 m	VIGA VG-301	5	1.552	7.55	5.00	1.00	58.59
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	316.00	1.00	361.00
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	316.00	1.00	120.33
Varilla #7 longitudinal 6.90 m	VIGA VG-302	7	3.042	6.90	3.00	1.00	62.97
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	18.00	1.00	481.85
Varilla #7 longitudinal 4.40 m		7	3.042	4.40	3.00	1.00	40.15
Varilla #6 longitudinal 2.75 m		6	2.235	2.75	3.00	1.00	18.44
Varilla #7 longitudinal 4.90 m		7	3.042	4.90	12.00	1.00	178.87
Varilla #6 longitudinal 3.80 m		6	2.235	3.80	6.00	1.00	50.96
Varilla #7 longitudinal 3.75 m		7	3.042	3.75	3.00	1.00	34.22
Varilla #6 longitudinal 2.15 m		6	2.235	2.15	2.00	1.00	9.61
Varilla #7 longitudinal 3.40 m		7	3.042	3.40	6.00	1.00	62.06
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	9.00	1.00	58.33
Varilla #6 longitudinal 2.60 m		6	2.235	2.60	6.00	1.00	34.87
Varilla #5 longitudinal 2.25 m		5	1.552	2.25	2.00	1.00	6.98
Varilla #5 longitudinal 1.80 m		5	1.552	1.80	4.00	1.00	11.17
Varilla #4 longitudinal 2.50 m		4	0.994	2.50	2.00	1.00	4.97
Varilla #4 longitudinal 1.60 m		4	0.994	1.60	2.00	1.00	3.18
Varilla #5 longitudinal 2.70 m		5	1.552	2.70	4.00	1.00	16.76
Varilla #5 longitudinal 4.05 m		5	1.552	4.05	4.00	1.00	25.14
Varilla #5 longitudinal 3.60 m		5	1.552	3.60	8.00	1.00	44.70
Varilla #5 longitudinal 10.45 m		5	1.552	10.45	5.00	1.00	81.09
Varilla #5 longitudinal 8.10 m		5	1.552	8.10	25.00	1.00	314.28
						TOTAL CANTIDAD HOJA 23 DE 41	2,080.52

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CANTIDADES

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #5 longitudinal 7.55 m	VIGA VG-302	5	1.552	7.55	5.00	1.00	58.59	
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	318.00	1.00	363.28	
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	318.00	1.00	121.09	
Varilla #7 longitudinal 6.90 m	VIGA VG-303	7	3.042	6.90	3.00	1.00	62.97	
Varilla #7 longitudinal 8.80 m		7	3.042	8.80	18.00	1.00	481.85	
Varilla #7 longitudinal 4.40 m		7	3.042	4.40	3.00	1.00	40.15	
Varilla #6 longitudinal 2.75 m		6	2.235	2.75	3.00	1.00	18.44	
Varilla #7 longitudinal 4.90 m		7	3.042	4.90	15.00	1.00	223.59	
Varilla #7 longitudinal 4.60 m		7	3.042	4.60	3.00	1.00	41.98	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	3.00	1.00	21.46	
Varilla #6 longitudinal 2.45 m		6	2.235	2.45	3.00	1.00	16.43	
Varilla #7 longitudinal 3.70 m		7	3.042	3.70	3.00	1.00	33.77	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	12.00	1.00	85.82	
Varilla #5 longitudinal 2.30 m		5	1.552	2.30	6.00	1.00	21.42	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	2.00	1.00	12.96	
Varilla #4 longitudinal 1.60 m		4	0.994	1.60	2.00	1.00	3.18	
Varilla #5 longitudinal 1.80 m		5	1.552	1.80	6.00	1.00	16.76	
Varilla #5 longitudinal 2.70 m		5	1.552	2.70	2.00	1.00	8.38	
Varilla #6 longitudinal 4.70 m		6	2.235	4.70	2.00	1.00	21.01	
Varilla #6 longitudinal 3.80 m		6	2.235	3.80	8.00	1.00	67.94	
Varilla #5 longitudinal 3.60 m		5	1.552	3.60	2.00	1.00	11.17	
Varilla #6 longitudinal 2.90 m		6	2.235	2.90	2.00	1.00	12.96	
Varilla #5 longitudinal 10.45 m		5	1.552	10.45	5.00	1.00	81.09	
						TOTAL CANTIDAD HOJA 24 DE 41	1,826.29	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

MEMORIA DE CANTIDADES

Consorcio Edificaciones ARL

SOPORTE DEL	BALANCE No. 01	FECHA	23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CESAR.		
CONTRATO DE OBRA No.	LIC-4-2023		
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES ARL	NIT	901.765.933-8
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CM-2-2023		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	JVM CONSTRUCIONES S.A.S. BIC	NIT	901.489.956-3

3.00 EDIFICACION - MODULO A

3.02 - ESTRUCTURAS

ITEM	3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO	UNIDAD	KG

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	No. DE LA VARILLA	PESO X ML VARILLA	LONGITUD VARILLA	CANTIDAD DE VARILLAS	CANTIDAD DE ELEMENTOS	TOTAL	ESQUEMA
Varilla #5 longitudinal 8.10 m	VIGA VG-303	5	1.552	8.10	25.00	1.00	314.28	
Varilla #5 longitudinal 7.55 m		5	1.552	7.55	5.00	1.00	58.59	
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	318.00	1.00	363.28	
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	318.00	1.00	121.09	
Varilla #5 longitudinal 6.85 m	VIGA VG-304	5	1.552	6.85	5.00	1.00	53.16	
Varilla #5 longitudinal 8.30 m		5	1.552	8.30	30.00	1.00	386.45	
Varilla #5 longitudinal 3.85 m		5	1.552	3.85	5.00	1.00	29.88	
Varilla #6 longitudinal 2.45 m		6	2.235	2.45	2.00	1.00	10.95	
Varilla #6 longitudinal 3.80 m		6	2.235	3.80	2.00	1.00	16.99	
Varilla #5 longitudinal 3.50 m		5	1.552	3.50	8.00	1.00	43.46	
Varilla #6 longitudinal 3.20 m		6	2.235	3.20	2.00	1.00	14.30	
Varilla #5 longitudinal 2.30 m		5	1.552	2.30	3.00	1.00	10.71	
Varilla #5 longitudinal 2.60 m		5	1.552	2.60	6.00	1.00	24.21	
Varilla #5 longitudinal 2.90 m		5	1.552	2.90	2.00	1.00	9.00	
Varilla #5 longitudinal 10.45 m		5	1.552	10.45	5.00	1.00	81.09	
Varilla #5 longitudinal 8.10 m		5	1.552	8.10	25.00	1.00	314.28	
Varilla #5 longitudinal 7.55 m		5	1.552	7.55	5.00	1.00	58.59	
Fleje #3 Transversal 2.04m		3	0.560	2.04	318.00	1.00	363.28	
Gancho #3 Transversal 0.68m		3	0.560	0.68	318.00	1.00	121.09	
					TOTAL CANTIDAD HOJA 25 DE 41		2,394.68	

OBSERVACIONES:

JUAN CARLOS GARZON ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
