INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º **1617-2023** MINISTERIO – MUNICIPIO DE **VILLA RICA - CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **SEPTIEMBRE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 2ª, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	CALLE 18 – CARRERA 4A – ESQUINA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.909.216.663
	APORTES MIN – FONSECON		$2.909.216.663
	APORTES MUNICIPIO		$70.811.762
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.980.028.425
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	ÓSCAR ALBERTO BELALCÁZAR COLONIA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	DIEGO LUIS CHARÁ NORIEGA	27/06/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.660-47-994000024641	28 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	29 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN: El Municipio aporta recursos por un valor de $ 70.811.762 M/L. • El valor total del Convenio $2.980.028.425 M/L		FECHA: 28/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**PÓLIZA INICIAL**: (No. No. 660-47- 994000024641)	FECHA: 28/06/2025
	VIGENCIA DEL AMPARO: 29/05/2025	
	PÓLIZA 1RA PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024
	VIGENCIA DEL AMPARO: 28/08/2025	
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.537.549.163	
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$290.922.000	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 70.811.762	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Suscripción del acta de inicio 2. Aprobación de póliza	NO APLICA	18/07/2023	$1.309.147.498
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor	30%		$533.356.388
TERCER DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Evidencia de del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	70%		$533.356.388
ULTIMO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	100%		$533.356.289

	3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Entrega de la certificación RETIE y7o RETILAP 5. Entrega al ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON (anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.309.147.498
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	581.843.333	28/06/2023	29/05/2025

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ANEXO: 1

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	596.005.685,00	28/06/2023	28/08/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N° 486-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA	$2.537.549.163,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	5/07/2024	$ 70.811.762,06
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE	
Fecha de Acta de inicio del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

Prorroga, suspensión y reinicio	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	14/02/2024	CAMBIO DE RERPRESENTANTE LEGAL
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2	5/03/2024	ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	UN (01) MES
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	04/06/2024	UN (01) MES
	ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	N/A
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3	5/07/2024	ADICION EN RECURSO ($ 70.811.762,06)
	CONTRATO MODIFICATORIO No	13/09/2024	ADICION EN TIEMPO
Fecha de terminación del Contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.608.360.925,06
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A

CONTRATO DERIVADO	MODIFICACIONES	FECHA FIRMA	No POLIZA	FECHA EXP.	POLIZAS
CO-486 DE 2023 - ESTUDIO, DISEÑO Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**			
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	11-44-101212980	30/11/2023	CUMPLIMIENTO - ANEXO 0
			11-40-101057648	30/11/2023	RESPONSABILIDAD - ANEXO 0
			11-44-101212980	26/02/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
			11-40-101057648	26/02/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 2
	CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (CAMBIO RL)	14/02/2024			SIN POLIZA
					SIN POLIZA
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2 (OBJETO)	5/03/2024	11-44-101212980	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
			11-40-101057648	7/03/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 3
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	11-40-101057648	10/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 4
			11-44-101212980	14/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5
			11-40-101057648	15/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 5
			11-44-101212980	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	11-40-101057648	12/06/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 6
			11-44-101212980	13/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8

	ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	11-40-101057648	4/07/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 7
			11-44-101212980	4/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 9
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3 (ADICION)	5/07/2024	11-44-101212980	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 10
	CONTRATO MODIFICATORIO No 4 (ADICION)	13/09/2024			

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y BALANCE.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO PPAL		$2.537.549.163,00
VALOR ADICION	$ 70.811.762,06	$ 70.811.762,06
VALOR EJECUTADO ACTA No 1	$ 199.641.480,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No 2	$ 211.075.461,53	
VALOR EJECUTADO ACTA No 3		
VALOR A PAGAR ACTA No 1	$ 199.641.480,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ $2.197.643.983,53	
SUMAS IGUALES	**$ 2.608.360.925,06**	**$ 2.608.360.925,06**

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° 485-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$290.922.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	03/05/2024	ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
	SUSPENSION	03/05/2024	UN (01) MES
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	04/06/2024	UN (01) MES
	REINICIO No 1	04/07/2024	N/A

	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	13/09/2024	ADICION EN TIEMPO
Fecha de terminación del Contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$290.922.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		

CO-485 DE 2023 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**			
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	430-47-994000063904	28/11/2023	CUMPLIMIENTO - ANEXO 0
			430-47-994000063904	8/02/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 1
	CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (OBJETO)	6/03/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
			430-47-994000063904	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 4
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	430-47-994000063904	12/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5
	REINICIO No 1	4/07/2024	430-47-994000063904	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2 (OBJETO)	13/09/2024	430-47-994000063904	07/10/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 7

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: **SI** **NO**

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**AGOSTO**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		**X**
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**X**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (13.95 %)**
INFORME	**14**
ESTADO	**EN EJECUCION**
RECURSOS GIRADOS	**$1.309.147.498**
PENDIENTE POR GIRAR	**$2.909.216.663**
AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑO	**10 %**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**1,80%**
% EJECUTADO DE OBRA	**8,21%**

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	12,15%	16,67%	-4,52%
Durante el periodo	1,80%	8,21%	-6,41%
Acumulado Actual	13,95%	24,88%	-10,93%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,21%	24,88%
Valor de la Obra Programada	$ 197.755.866,44	$ 599.289.397,93

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,80%	13,95%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 43.356.950,01	$ 336.016.362,59

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS CONVENIO 1617-2023

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la secretaria de hacienda	**SEPTIEMBRE /2024**
TOTAL, DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 1.309.147.498,00**
TOTAL, PAGOS REALIZADOS	**$ 357.339.428,56**
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$ 6.782.153,18**
TOTAL, DE DEVOLUCIONES RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 6.782.153,18**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO	**958.590.22,62**

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actuaciones:

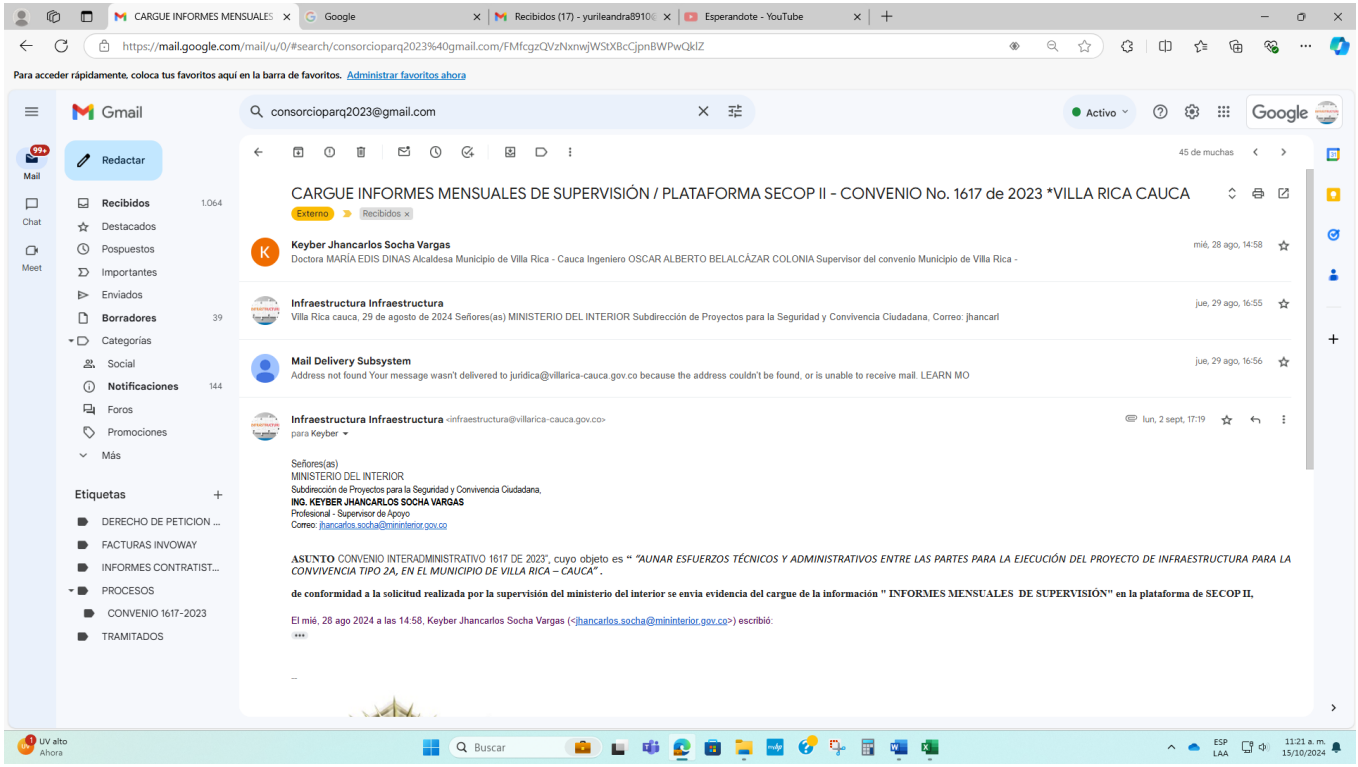
La secretaria de infraestructura se permite dar respuestas a las siguientes solicitudes realizadas por la supervisión del convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023 de acuerdo con lo consagrado en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

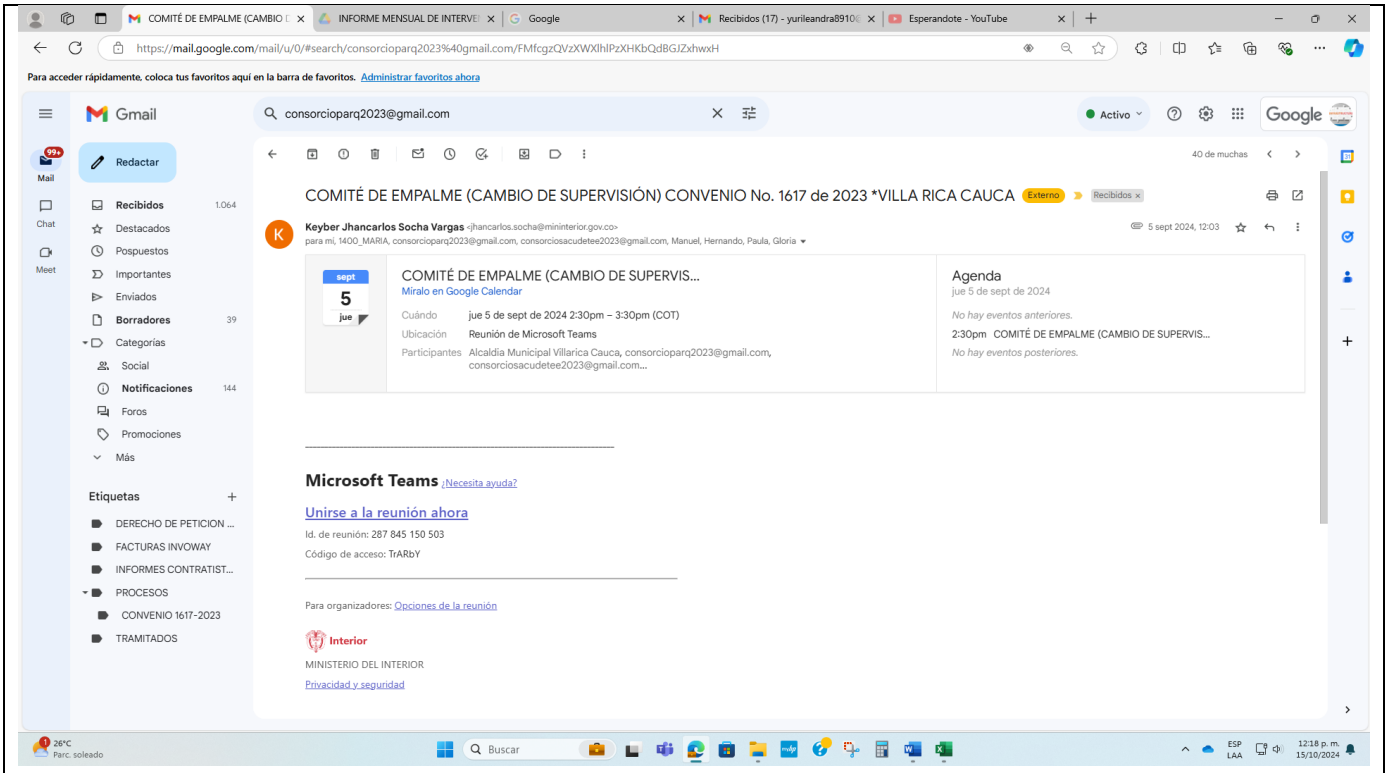
- De acuerdo con la solicitud realizada el día 28 de agosto de 2024 vía correo electrónico por la supervisión del ministerio del interior, la secretaria de infraestructura se permite dar respuesta el día 29 de agosto y remite evidencia del cargue de la información en la plataforma del secop II el día 02 de septiembre 2024
- El día 02 de septiembre de 2024 se envía oficio a la oficina de jurídica del municipio de villa rica en aras de que se realicen los tramites correspondiente ante la aseguradora, las cuales permitan la asignación del día, fecha y hora de la audiencia de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.
- Se lleva a cabo el día 4 de septiembre 2024 comité de emplame para el día 5 de septiembre del 2024 hora 2:30 pm. (cambio de supervisión del convenio No 1617 de 2023), en coordinación de las partes interesadas, CONTRTISTA DE OBRA, INTERVENTORIA, MUNICIPIO y MINISTERIO DEL INTERIOR
- El día 05 de septiembre 2024, la interventoría del contrato de obra autoriza el pago del acta parcial numero 2 por un valor de $ 211.075.461,53
- El día 9 de septiembre 2024 la interventoría del proyecto 486/2023 remite solicitud de prorroga en cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto.
- Se lleva a cabo el día 10 de septiembre 2024 comité de seguimiento del convenio No 1617 de 2023, en aras de revisar los avances realizados durante el periodo, de acuerdo con el cronograma establecido en el convenio interadministrativo 2023.
- El día 13 de septiembre 2024 la administración municipal procede con la aceptación y realización del contrato modificatorio, adición en tiempo, nueva fecha de terminación de los contratos derivados 15 de diciembre de 2023.
- De acuerdo con el seguimiento realizado por la supervisión de la secretaria de infraestructura, en cumplimiento de sus funciones el día 18 y 20 de septiembre 2024, se permite solicita al contratista de interventoría garantizar la calidad y la estabilidad de los elementos estructurales construidos en obras ejecutadas.
- La secretaria de infraestructura envía el día 23 de septiembre 2024 por vía correo electrónico, se realiza citación a reunión al representante legal del contrato de interventoría 485 de 2023, en cumplimiento del NUMERAL 1.2.1 de los documentos soporte del proceso de contratación.
- El día 30 de septiembre la interventoría del contrato de obra se permite compartir el concepto de técnico avalado por un especialista en estructuras del equipo de trabajo del contratista de obra Consorcio Sacúdete en el cual se avala el procedimiento constructivo de las columnas de la zona de la edificación.

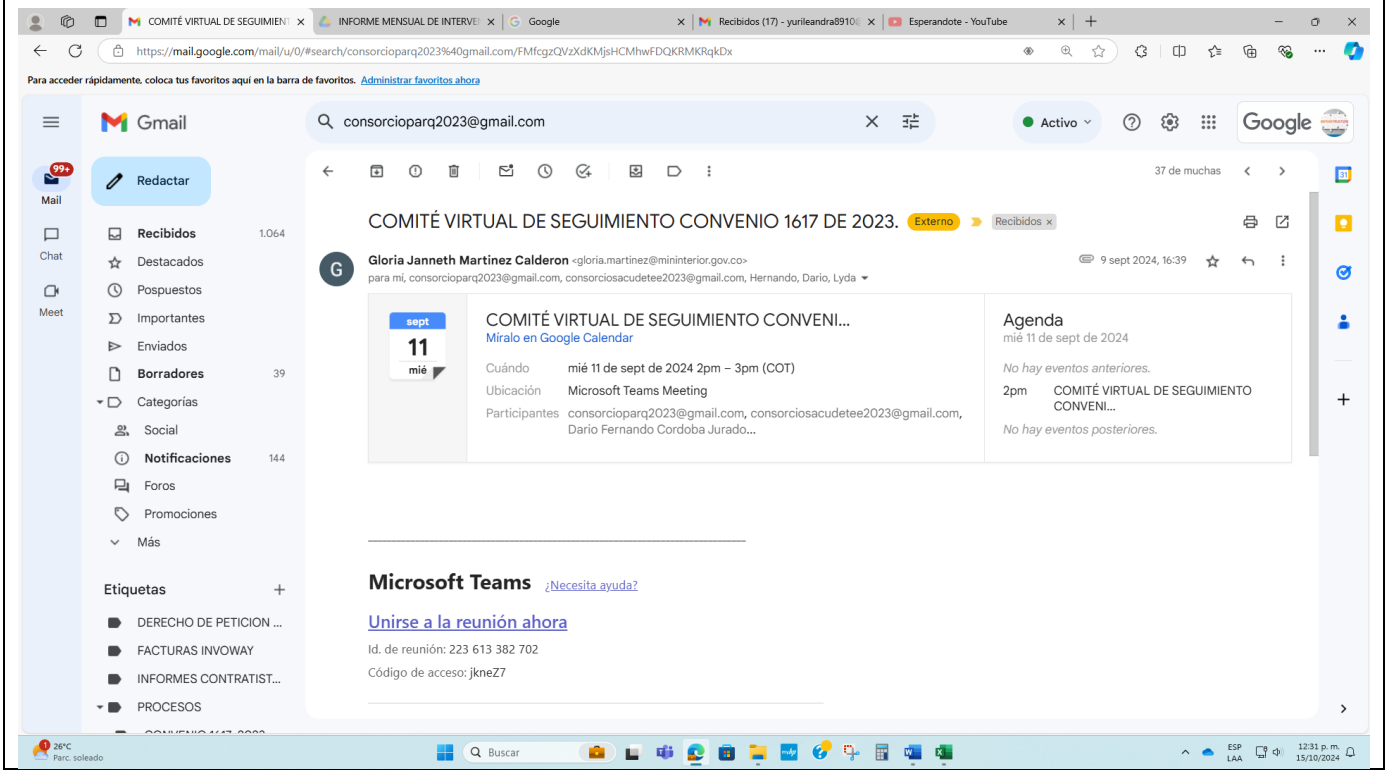
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

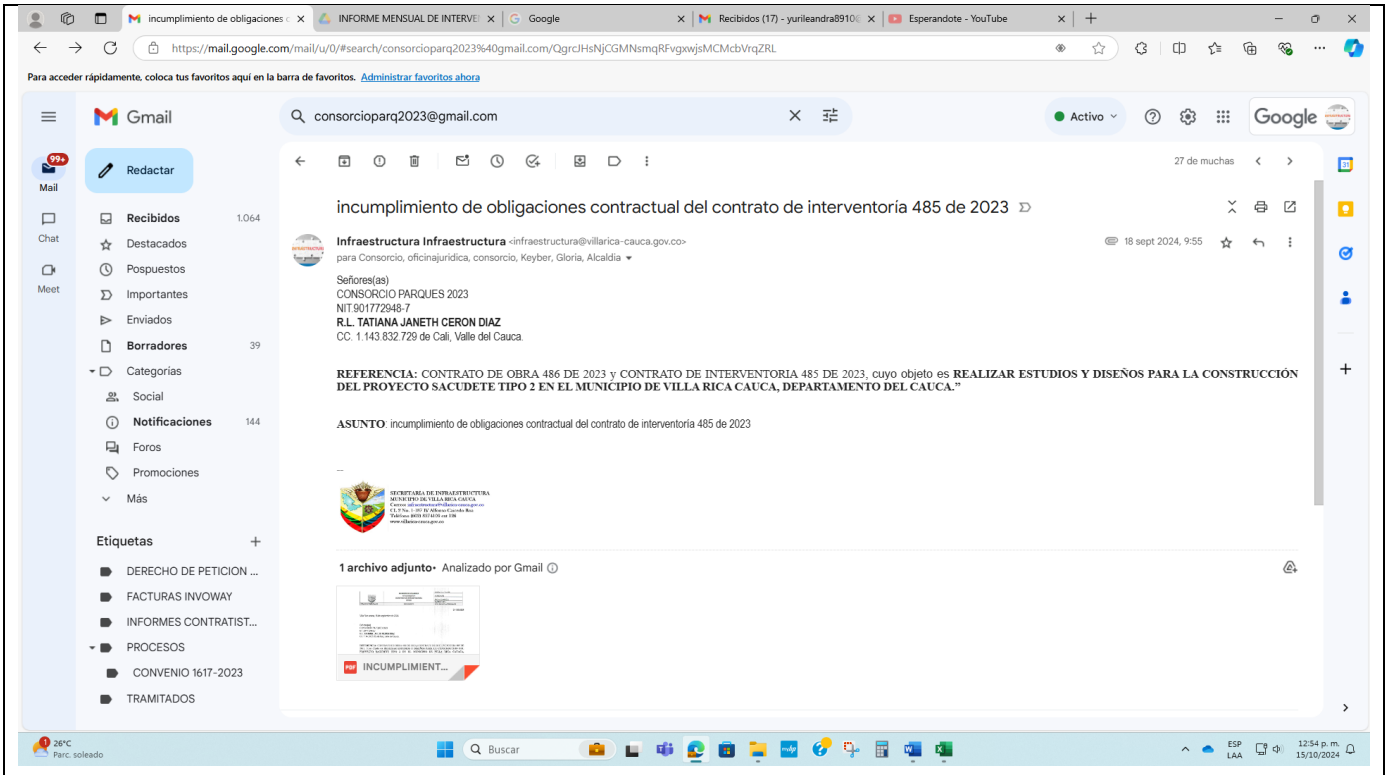
15/02/02024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

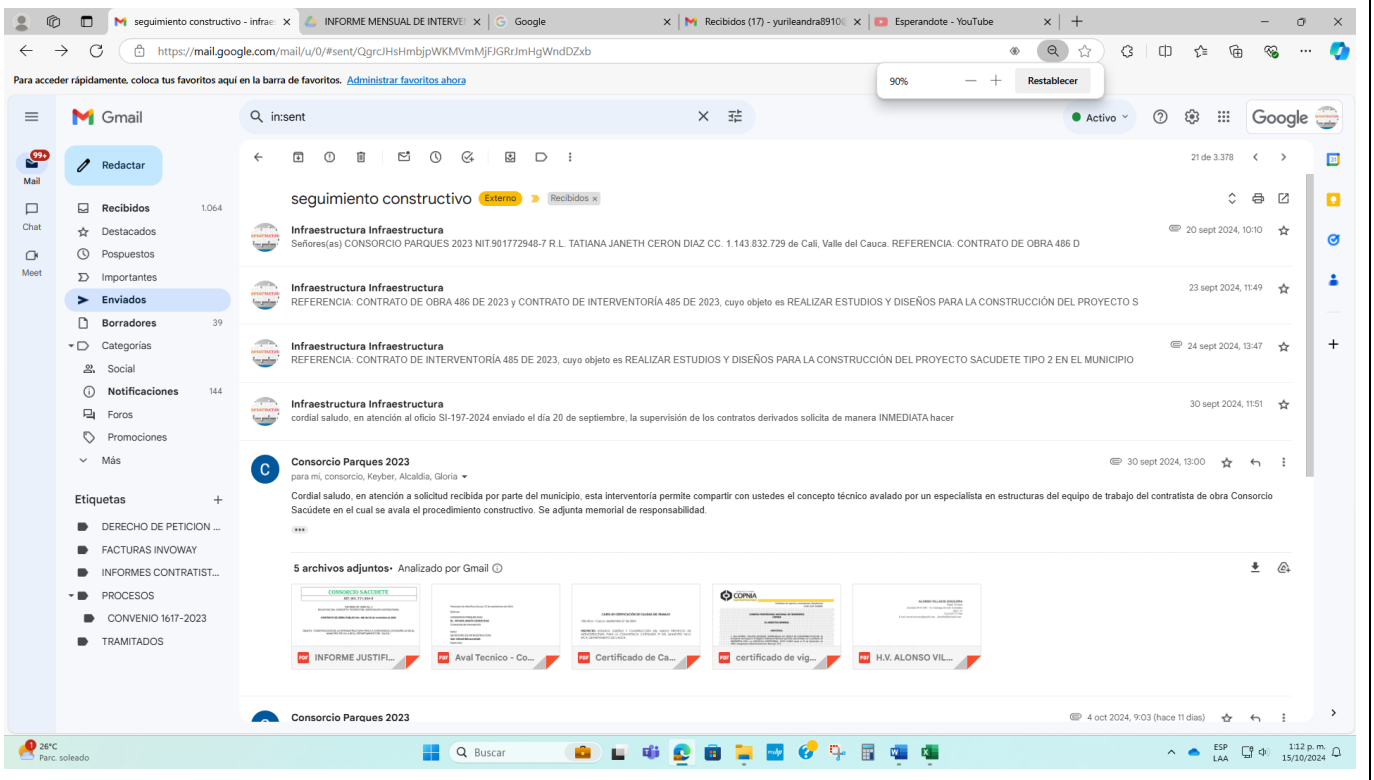
8. REGISTRO FOTOGRAFICO




COMITÉ DE EMPALME (CAMBIO DE SUPERVISIÓN) CONVENIO No. 1617 de 2023 *VILLA RICA CAUCA
Keyber Jhancarlos Socha Vargas
COMITÉ DE EMPALME (CAMBIO DE SUPERVIS...
Agenda
Microsoft Teams
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 287 845 150 503
Código de acceso: TrARbY


COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO CONVENIO 1617 DE 2023.
Gloria Janneth Martinez Calderon
COMITÉ VIRTUAL DE SEGUIMIENTO CONVENI...
Agenda
Microsoft Teams
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 223 613 382 702
Código de acceso: jkneZ7


incumplimiento de obligaciones contractual del contrato de interventoría 485 de 2023
Infraestructura Infraestructura
Señores(as)
CONSORCIO PARQUES 2023
NIT.901772948-7
R.L. TATIANA JANETH CERON DIAZ
CC. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca.
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 485 DE 2023, cuyo objeto es REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
ASUNTO: incumplimiento de obligaciones contractual del contrato de interventoría 485 de 2023
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
INCUMPLIMIENT...


seguimiento constructivo
Infraestructura Infraestructura
Señores(as) CONSORCIO PARQUES 2023 NIT.901772948-7 R.L. TATIANA JANETH CERON DIAZ CC. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca. REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 486 D
Infraestructura Infraestructura
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023 y CONTRATO DE INTERVENTORÍA 485 DE 2023, cuyo objeto es REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO S
Infraestructura Infraestructura
REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 485 DE 2023, cuyo objeto es REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO
Infraestructura Infraestructura
cordial saludo, en atención al oficio SI-197-2024 enviado el día 20 de septiembre, la supervisión de los contratos derivados solicita de manera INMEDIATA hacer
Consorcio Parques 2023
Cordial saludo, en atención a solicitud recibida por parte del municipio, esta interventoría permite compartir con ustedes el concepto técnico avalado por un especialista en estructuras del equipo de trabajo del contratista de obra Consorcio Sacúdete en el cual se avala el procedimiento constructivo. Se adjunta memorial de responsabilidad.
5 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
INFORME JUSTIFI...
Aval Tecnico - Co...
Certificado de Ca...
certificado de vig...
H.V. ALONSO VIL...
Consorcio Parques 2023

Villa Rica cauca, 20 de septiembre de 2024

Señores(as)
CONSORCIO PARQUES 2023
NIT.901772946-7
R.L. TATIANA JANETH CERON DIAZ
CC. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 485 DE 2023, cuyo objeto es **REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUACA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."**

ASUNTO: seguimiento constructivo.

Cordial Saludo

En atención a las obligaciones contractuales contraídas, la supervisión de los contratos derivados se permite solicitar al contratista de interventoría 485 de 2023 emitir acta sobre lo especifico en el informe de ejecución del procedimiento constructivo de las columnas estructurales de la zona de edificación. De acuerdo con la NSR 10 y dando normatividad vigente, Una vez iniciada la colocación del concreto, este debe efectuarse en una operación continua hasta que se termine el llenado del panel o sección, definida por sus límites o juntas predeterminadas, excepto en lo permitido o prohibido por C.6.4. Las juntas de construcción deben localizarse y ubicarse de manera que no perjudiquen la resistencia de la estructura. Deben tomarse medidas para la transferencia apropiada de los esfuerzos cortantes y de otras fuerzas a través de las juntas de construcción. En este sentido se solicita a la interventoría de la obra y el especialista en estructura, remitir concepto técnico y se recomienda chequear el elemento estructural, en caso de existir una junta fría en la zona de confinamiento las posibles soluciones y/o recomendaciones del procedimiento adecuado

Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,

ING. OSCAR A. BELALCAZAR SALDAÑA
Secretario de Infraestructura

Villa Rica cauca, 16 de septiembre de 2024

Señores(as)
CONSORCIO PARQUES 2023
NIT.901772946-7
R.L. TATIANA JANETH CERON DIAZ
CC. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 486 DE 2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 485 DE 2023, cuyo objeto es **REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUACA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."**

ASUNTO: incumplimiento de obligaciones contractual del contrato de interventoria 485 de 2023

Cordial Saludo

En atención a las obligaciones contractuales contraídas en el contrato de interventoría 485 de 2023, la administración municipal se permite a informar que a pesar de las acciones realizada para lograr el cumplimiento del objeto contractual continuo incumplimiento del mismo, realizada la visita a obra no se evidencia el personal propuesto en obra de acuerdo al NUMERAL 1.2.1- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Siendo así las cosas nos permitimos informar a la interventoría del proyecto se sirva de notificar las acciones realizadas para garantizar la estabilidad y calidad de la obra. Exigimos un informe detallado de las acciones a tomar, respaldado de un concepto del especialista frente al proceso que se debe seguir para el caso.

En atención al proceso constructivo la supervisión del presente proyecto les recuerda que es importante cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas constructivas.

Se anexa registro fotográfico.

Cordialmente,

ING. OSCAR A. BELALCAZAR SALDAÑA
Secretario de Infraestructura

REGISTRO FOTOGRAFICO













SUPERVISOR MUNICIPIO

Oscar Belalcazar

DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2024

_ ORDEN DE PAGO RESERVA *_*

ORDEN DE PAGO No.	2024.CEN.01.000021	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	RESERVA No.	2024.CEN.01.000027	02 DE ENERO DEL 2024

PAGARÁ A FAVOR DE: CONSORCIO SACUDETE **NIT:** 901.771.924

POR CONCEPTO DE: REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA

POR VALOR DE: $ 177.740.902,62

VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DETALLE DE LA FUENTE	VALOR ORDENADO
2.3.2.02.02.009.04.19-430100900-1604-1.0-1.3.1.1.07-1-Actual	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIV	96 - 1.3.1.1.07 - TRANSFERENCI	211.075.461,53
TOTALES			**$ 211.075.461,53**

DEDUCCIONES/DESCUENTOS

DEDUCCIÓN	%	BASE LIQUIDACIÓN	VALOR DEDUCCIÓN	CUENTA CONTABLE
0018 - RETENCION CONTRATOS DE OBRA	2,000	209.260.785,62	4.185.215,71	243626 - CONTRATOS DE OBRA
0022 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4,000	209.260.785,62	8.370.000,00	24072201 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
0023 - ESTAMPILLA PROCULTURA	0,500	209.260.785,62	1.046.000,00	24072202 - ESTAMPILLA PROCULTURA
0024 - TASA PRODEPORTES	1,000	209.260.785,62	2.093.000,00	24072203 - TASA PRODEPORTES
0025 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,000	209.260.785,62	4.185.000,00	24072204 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR
0030 - DEDUCCION DE ICA POR ACTIVIDADES CON	0,800	209.260.785,62	1.674.000,00	24072206 - RETENCION DE ICA PRATICADAS
0032 - RETENCION DE I.V.A. POR BIENES	15,000	1.814.675,91	272.000,00	243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CO
0072 - CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA NACI	5,000	209.260.785,62	10.463.039,28	24072207 - SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL FONSECON
0073 - ESTAMILLA PRO UNICAUCA	0,500	209.260.785,62	1.046.303,92	24072210 - ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD DEL CAUCA .5%
TOTALES			**$ 33.334.558,91**	

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
55050690 - ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	901771924 - CONSORCIO SACUDETE	211.075.461,53	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	901771924 - CONSORCIO SACUDETE	0,00	211.075.461,53
TOTALES		**$ 211.075.461,53**	**$ 211.075.461,53**

VALORES DE ORDEN DE PAGO

VALOR BRUTO	$ 211.075.461,53	TOTAL DEDUCCIONES	$ 33.334.558,91	VALOR NETO	$ 177.740.902,62

FIRMAS RESPONSABLES

CARABALI PIZARRO JOSE ALBERTO
CONTADOR

ELABORÓ: CPOSSU

IMPRIMIÓ: **ENAVARRETE**

RECIBÍ

C.C. o NIT.:

NOMBRE DEL REPORTE: **SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC**

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**9**	**5**

$ 177.740.902,62

Páguese a: CONSORCIO SACUDETE Nit: 901.771.924

La Suma de: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 043-86812-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a002514d23a043-86812-4c0

Firma

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.002024

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 817002675

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.05.2024
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SACUDETE Nit. 901.771.924
POR CONCEPTO DE:	ACTA PARCIAL N. 2 CONT OBRA 286/2023 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 177.740.902,62
VALOR EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 043-86812-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CONVENIO N. 1617/2023 I

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
240101 - BIENES Y SERVICIOS	901771924 - CONSORCIO SACUDETE	**$ 211.075.461,53**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 21 - Reserva 27			
243626 - CONTRATOS DE OBRA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	**$ 0,00**	**$ 4.185.215,71**
DETALLE DEL PAGO: RETENCION CONTRATOS DE OBRA			
24072201 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 8.370.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			
24072202 - ESTAMPILLA PROCULTURA	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 1.046.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24072203 - TASA PRODEPORTES	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 2.093.000,00**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTES			
24072204 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMIL	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 4.185.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			
24072206 - RETENCION DE ICA PRATICADAS	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 1.674.000,00**
DETALLE DEL PAGO: DEDUCCION DE ICA POR ACTIVIDADES CON TARIFA DEL 8%			
243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PEND	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	**$ 0,00**	**$ 272.000,00**
DETALLE DEL PAGO: RETENCION DE I.V.A. POR BIENES			
24072207 - SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL F	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	**$ 0,00**	**$ 10.463.039,28**
DETALLE DEL PAGO: CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL 5%			
24072210 - ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD DEL C	891580016 - Departamento del Cauca	**$ 0,00**	**$ 1.046.303,92**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMILLA PRO UNICAUCA			
1110060227 - 043-86812-4 - CONVENIO N. 1617/	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 177.740.902,62**

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

VIAFARA POSSU MARYORY
TESORERA

Aprobado por:

DINAS MARIA EDIS
ALCALDE

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Calle 2 esq 1 – 187 Teléfonos 8274109
Email: tesoreria@villarica-cauca.gov.co

CONVENIO 1617 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

INFORME FINANCIERO DEL AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

PROYECTO (S): PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

CUENTA (AHORROS) No.043-86812-4 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

VALOR CONVENIO **$ 2.909.216.663,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.909.216.663,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	18/07/2023	GIRO 1	**$ 1.309.147.498,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	**$**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	**$**
		GIRO 4	**$**
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.309.147.498,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.309.147.498,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
486	CONSORCIO SACUDETE	$ 2.537.549.163,00	$ 0,00	$ 2.537.549.163,00	$ 2.537.549.163,00
485	CONSORCIO PARQUES 2023	$ 290.922.000,00	$ 0,00	$ 290.922.000,00	$ 290.922.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 2.828.471.163,00**	**$ 2.828.471.163,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
486	ACTA PARCIAL N. 1 CONTRATO 486 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA	2024.CEN.01.000009 1	2024.CEN.01.000656	19/04/2024	$ 199.641.480,00	$ 0,00	$ 169.696.525,94
	TRASLADO RECURSOS POR DESCUENTO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ACTA No 01 - CONTRATO 486 DE 2023	2024.CEN.1.53	2024.CEN.1.53	27/08/2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.922.000,00
486	ACTA PARCIAL N. 2 CONTRATO 486 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA	2024.CEN.01.00021	2024.CEN.01.002024	8/09/2024	$ 211.075.461,53	$ 0,00	$ 177.740.902,62
	TRASLADO RECURSO POR DESCUENTO ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE ACTA No 01 - CONTRATO 486 DE 2023	2024.CEN.1.63	2024.CEN.1.63	3/09/2023	$ 1.980.000,00	$ 0,00	$ 1.980.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 412.696.941,53**	**$ 0,00**	**$ 357.339.428,56**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	$ 376.654,37
31/08/2023	$ 834.406,10
30/09/2023	$ 646.358,27
31/10/2023	$ 668.238,50
30/11/2023	$ 647.006,71
31/12/2023	$ 557.401,17
30/01/2024	$ 556.114,04
29/02/2024	$ 520.448,94
31/03/2024	$ 556.570,02
30/04/2024	$ 255.483,55
31/05/2024	$ 242.491,78
30/06/2024	$ 234.718,36
31/07/2023	$ 242.592,84
31/08/2024	$ 242.373,64
30/09/2024	$ 201.294,89
TOTAL (3)	**$ 6.782.153,18**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.309.147.498,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 357.339.428,56**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 6.782.153,18
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 6.782.153,18**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 958.590.222,62**

OBSERVACIONES

FIRMA

Secretaria de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**9**	**5**

$ 177.740.902,62

Páguese a: CONSORCIO SACUDETE Nit: 901.771.924

La Suma de: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 043-86812-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a002514d23a043-86812-4c0

Firma

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.002024

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 817002675

FECHA DE EXPEDICIÓN:	SEPT.05.2024
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SACUDETE Nit. 901.771.924
POR CONCEPTO DE:	ACTA PARCIAL N. 2 CONT OBRA 286/2023 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 177.740.902,62
VALOR EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 043-86812-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CONVENIO N. 1617/2023 I

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
DETALLE DEL PAGO: CONVENIO N. 1617/2023 INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO			
TOTALES		**$ 211.075.461,53**	**$ 211.075.461,53**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0018 - RETENCION CONTRATOS DE OBRA	2	243626 - CONTRATOS DE OBRA	$ 209.260.785,62	$ 4.185.215,71
0022 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	24072201 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$ 209.260.785,62	$ 8.370.000,00
0023 - ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5	24072202 - ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 209.260.785,62	$ 1.046.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

VIAFARA POSSU MARYORY
TESORERA

Aprobado por:

DINAS MARIA EDIS
ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Calle 2 esq 1 – 187 Teléfonos 8274109
Email: tesoreria@villarica-cauca.gov.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

AUNAR ESFUERZ TECNICOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJ
CL 2 CR 2 ESQUINA C A M
VILLA RICA - CAUCA

EBU018010

CUENTA No. 043-86812-4
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,138,109,830.35
+ 30 CREDITOS	201,294.89
- 2 DEBITOS	179,720,902.62
SALDO ACTUAL	958,590,222.62
SALDO PROMEDIO	982,316,720.32

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A417236	0.00	7,773.97	1,138,117,604.32
03	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A039359	1,980,000.00	0.00	1,136,137,604.32
03	INTERESES LIQUIDADOS	A042104	0.00	7,774.03	1,136,145,378.35
04	INTERESES LIQUIDADOS	A872670	0.00	7,760.56	1,136,153,138.91
05	TRANSFERENCIA AL BANCO AVVILLAS DESDE OCCIRED		177,740,902.62	0.00	958,412,236.29
05	INTERESES LIQUIDADOS	A693193	0.00	7,760.61	958,419,996.90
06	INTERESES LIQUIDADOS	A751060	0.00	6,546.58	958,426,543.48
09	INTERESES LIQUIDADOS	A354660	0.00	6,546.63	958,433,090.11
09	INTERESES LIQUIDADOS	A344474	0.00	6,546.67	958,439,636.78
09	INTERESES LIQUIDADOS	A337617	0.00	6,546.72	958,446,183.50
10	INTERESES LIQUIDADOS	A568147	0.00	6,546.76	958,452,730.26
11	INTERESES LIQUIDADOS	A325278	0.00	6,546.81	958,459,277.07
12	INTERESES LIQUIDADOS	A046990	0.00	6,546.85	958,465,823.92
13	INTERESES LIQUIDADOS	A693955	0.00	6,546.90	958,472,370.82
16	INTERESES LIQUIDADOS	A586045	0.00	6,546.94	958,478,917.76
16	INTERESES LIQUIDADOS	A589877	0.00	6,546.99	958,485,464.75
16	INTERESES LIQUIDADOS	A576556	0.00	6,547.03	958,492,011.78
17	INTERESES LIQUIDADOS	A919721	0.00	6,547.08	958,498,558.86
18	INTERESES LIQUIDADOS	A578501	0.00	6,547.12	958,505,105.98
19	INTERESES LIQUIDADOS	A219504	0.00	6,547.17	958,511,653.15
20	INTERESES LIQUIDADOS	A930132	0.00	6,547.21	958,518,200.36
23	INTERESES LIQUIDADOS	A576085	0.00	6,547.26	958,524,747.62
23	INTERESES LIQUIDADOS	A575911	0.00	6,547.30	958,531,294.92
23	INTERESES LIQUIDADOS	A576967	0.00	6,547.34	958,537,842.26
24	INTERESES LIQUIDADOS	A734312	0.00	6,547.39	958,544,389.65
25	INTERESES LIQUIDADOS	A458659	0.00	6,547.43	958,550,937.08
26	INTERESES LIQUIDADOS	A273934	0.00	6,547.48	958,557,484.56
27	INTERESES LIQUIDADOS	A978694	0.00	6,547.52	958,564,032.08
30	INTERESES LIQUIDADOS	A799442	0.00	6,547.57	958,570,579.65
30	INTERESES LIQUIDADOS	A836920	0.00	6,547.61	958,577,127.26
30	INTERESES LIQUIDADOS	A813591	0.00	6,547.66	958,583,674.92
30	INTERESES LIQUIDADOS	A541927	0.00	6,547.70	958,590,222.62

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**9**	**5**

$ 177.740.902,62

Páguese a: CONSORCIO SACUDETE Nit: 901.771.924

La Suma de: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 043-86812-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a002514d23a043-86812-4c0

Firma

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.002024

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 817002675

FECHA DE EXPEDICIÓN: SEPT.05.2024
BENEFICIARIO: CONSORCIO SACUDETE Nit. 901.771.924
POR CONCEPTO DE: ACTA PARCIAL N. 2 CONT OBRA 286/2023 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA
CUENTA BANCARIA DESTINO: ******
POR VALOR DE: $ 177.740.902,62
VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 043-86812-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CONVENIO N. 1617/2023 I

0024 - TASA PRODEPORTES	1	24072203 - TASA PRODEPORTES	$ 209.260.785,62	$ 2.093.000,00
0025 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	24072204 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 209.260.785,62	$ 4.185.000,00
0030 - DEDUCCION DE ICA POR ACTIVIDADES CON TARIFA DEL 8%	0,8	24072206 - RETENCION DE ICA PRATICADAS	$ 209.260.785,62	$ 1.674.000,00
0032 - RETENCION DE I.V.A. POR BIENES	15	243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	$ 1.814.675,91	$ 272.000,00
0072 - CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL 5%	5	24072207 - SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL FONSECON	$ 209.260.785,62	$ 10.463.039,28
0073 - ESTAMILLA PRO UNICAUCA	0,5	24072210 - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA .5%	$ 209.260.785,62	$ 1.046.303,92

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

VIAFARA POSSU MARYORY
TESORERA

Aprobado por:

DINAS MARIA EDIS
ALCALDE

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Calle 2 esq 1 – 187 Teléfonos 8274109
Email: tesoreria@villarica-cauca.gov.co
