Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 06

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	05 de mayo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**2,56%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**3,42%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos Peralta
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

2. Objeto del comité técnico.

Acta de comité técnico No.6

3. Verificación de cumplimiento de compromisos pactados según acta anterior.

El contratista envía la topografía inicial, sin embargo, continua pendiente enviar la topografía actual.

La interventoría realizó una segunda evaluación del sistema de gestión y seguridad entregado por el contratista, dicho sistema continua incompleto, y carece de varios procedimientos, se programará otra revisión para el día 11 de mayo.

El contratista ya realizó las correcciones del PMA y su presupuesto, el mismo ya fue avalado por la interventoría.
El contratista ya entregó los procesos constructivos y especificaciones técnicas del periodo.

las planillas del personal de CAT construcciones ya fueron enviadas, por otro lado, la entrega de epp´s (botas) no se ha realizado.

Ya fueron enviadas las actas de vecindad.

La señalización de la obra va en un 90%, se le solicita al contratista terminar de realizar esta actividad.

4. Temas tratados en la presente acta.

4.1 Tema No. 1 VISITA DE OBRA:

Se realiza un recorrido de revisión por la obra con el equipo del contratista de obra y el equipo de interventoría, para verificar actividades ejecudas a la fecha.

4.2 Tema No. 2 REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Se da inicio a la reunión siendo 2:00 p.m. con participación del contratista de obra y interventoría, con el orden ya establecido.

4.2.1 RESUMEN DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

Se continua con excavaciones mecánicas para zapatas, se continua con armado de acero para zapatas, y se fundieron zapatas en concreto.

4.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

En la ejecución de las actividades de esta semana no surgieron dudas ni temas técnicos a tratar.

4.2.3 INFORME FISICO FINANCIERO Y PROGRAMACIÓN

a la fecha la obra se ejecuta de acuerdo a la programación, sin ningún atraso presentado, al contrario se tiene una diferencia positiva del 0.86%.

4.2.4 OBSERVACIONES A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Hasta la fecha se han girado $465.264.142 pesos de anticipo

4.2.5 INFORME DE PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTADAS PRÓXIMA SEMANA OBRA

continuar con el armado de aceros y la fundida de zapatas.

4.2.6 INFORME EJECUCIÓN DE ANTICIPO

Se continua solo con los primeros pagos de aceros y concretos de zapatas para cimentación

4.2.7 OBSERVACIONES ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista ya realizó las correcciones del PMA y su presupuesto, el mismo ya fue avalado por la interventoría.

4.2.8 OBSERVACIONES GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La interventoría realizó una segunda evaluación del sistema de gestión y seguridad entregado por el contratista, dicho sistema continua incompleto, y carece de varios procedimientos, se programará otra revisión para el día 11 de mayo y el contratista se compromete a entregarlo completo para el día 09 de mayo.

La interventoría solicita la implementación del kit de rescate y rescatista.

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	E.S.E SANTIAGO DE TUNJA	Código: GA-FR-0030
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	Versión: 1
	FORMATO	Página 1 de 3

5. Compromisos pactados y fecha.

Descripción	Responsable
enviar la topografía actual para el martes 09 de mayo de 2023. Terminar de señalizar la obra para el martes 09 de mayo de 2023. Entregar el sistema de gestión y seguridad Realizar la entrega de epp´s (botas) por parte del subcontratista CAT construcciones para el día 09 de mayo.	Contratista
Realizar evaluación del sistema de gestión y seguridad para el 11 de mayo de 2023. Seguimiento a la conformación de la veeduría.	Interventoría
N/A	Supervisión


6. Próximo comité técnico.

Fecha estimada	Día	Mes	Año	
	11	Mayo	2023	2:00 p. m.

7. Citados (personas que se citan al próximo comité para un tema especial o decisión particular)

Los citados son las mismas personas que participaron en este comité
N/A
N/A
N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del día, en Tunja, a los: 05 días del mes de Mayo del año 2023.

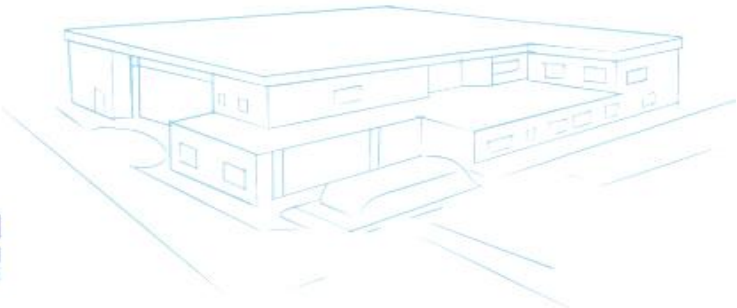

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 07

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	11 de mayo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**3,63%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**3,72%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos P.
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	Laura Camila Cuervo.
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 08

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	19 de mayo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**4,61%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**4,25%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos P.
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	Laura Camila Cuervo.
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 09

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	26 de mayo de 2023
Acumulado obra programada (%)	**4,94%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**5,89%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos P.
Ing. Laura Camila Cuervo	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner

Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	**E.S.E SANTIAGO DE TUNJA**	**Código: GA-FR-0030**
	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	**Versión: 1**
	FORMATO	**Página 1 de 3**

ACTA DE COMITÉ No. 10

No. Contrato de Obra	Contrato De Obra No. CP-086-2023 de 2023
Objeto del contrato de Obra:	CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA.
No. Contrato de Interventoría	Contrato de Interventoría No. CP-087-2023 de 2023
Objeto del contrato de interventoría:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES: CP-001-2023 CONTRATO DE OBRA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE HOSPITALARIA Y DE APOYO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA – BOYACA
FECHA	01 de junio de 2023
Acumulado obra programada (%)	**5,50%**
Acumulado obra ejecutada (%)	**6,35%**

1. Asistentes.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
Ing. Jorge Alberto Boada	Director de Obra	
Anayr Torres Rodriguez	Residente de Obra	
Ing. Juanita Castillo Rodríguez	Residente de apoyo de obra	
Ing. Juan Ricardo Torres Ortiz	Representa legal - profesional en gesitión de proyectos interventoría	
Noé Dalberto Correa Ramirez	Director de Interventoría	
Vanessa Padilla Veloza	Supervisora SST de obra	
Zuleima Yulieth Lagos Peralta	Coordinador HSEQ	Zuleima Lagos P.
Arq. Paola Corredor Manrrique	Residente de Interventoría	
Yesica Natalia sierra	Profesional SST Interventoría	
Arq. Angie Stefany Velandia	Profesional de apoyo interventoria	

1.2 Invitados.

Participantes	**Cargo**	**Firma de los Asistentes**
N/A	Comité de contratación	**N/A**
N/A	Asesor jurídico	**N/A**

Alcaldía Mayor de Tunja
Tunja La Capital que nos UNE
Powered by CamScanner
