FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: ___ de #

UNIDAD EJECUTORA:	AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL Rionegro Antioquia COLOMBIA			**FECHA:**	16/11/2024
Semana No	**1**	**Del :**	10/11/2024	AL:	15/11/2024
Plazo Total		90	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		16	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		17,78%			
Nombre del Supervisor :	ALVARO HERNAN RESTREPO				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA.

INTERVENTORIA: REALIZAR INTERVENTORÍA PARA REALIZAR PARA CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

MONTELIBANO

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,48%**	**0,48%**	**(%) Ejecutado**	**0,00%**	**0,00%**
Valor programado ($)	**$ 6.656.608,91**	**$ 6.656.608,91**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**-0,48%**
				Valor Adelanto	**-$ 6.656.608,91**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	REINGENIERIA INTEGRAL SAS	**Contratista:**	EPSILON CORDOBA
Contrato No:	24001044 H4	**Contrato No:**	24001120 H3
Valor Inicial:	$ 1.399.254.929,00	**Valor Inicial:**	$ 142.761.914
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	31/12/2024	**Plazo inicial:**	31/12/2024
Plazo actualizado:	15/11/2024	**Plazo actualizado:**	15/11/2024
Fecha de iniciación:	10-nov-24	**Fecha de iniciación:**	10-nov-24
Fecha de vencimiento:	74 dias	**Fecha de vencimiento:**	74 dias
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 1.399.254.929	**Valor total actual del contrato**	$ 142.761.914

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

***Martes 12/11/24**
Se realiza inspeccion de los puntos donde se va a acopiar el material para la construccion con el ingeniero residente el ingeniero Mauricio Jimenes

***Miercoles 13/11/24**
Se recibe por parte de la areonautica civil los planos para localizacion de predio e identificacion de linderos, en busca de los puntos posibles de inicio de obra
Se recibe por parte del contratista las hojas de vida de su grupo de trabajo al igual que la programacion y Apus del presupuesto oficial, para revision y aporbacion de las mismas por parte de interventoria

***Jueves 14/11/24**
Se determino con el ingeniero residente el punto posible de inicio y se relaciono en documento a la areocivil para aprobacion del mismo
Se solicito a funcionarios de la areocivil, la carta catastral del predio con el fin de identificar los linderos exactos del predio

***Viernes 15/11/24**
El contratista realizo la averiguacion de canteras cercanas a la zona y trajo a obra la muestra de los materiales de estas canteras para analisis granulometrico y determinar la cantera a trabajar

AVANCE DE OBRA

AVANCE FISICO:

* A la semana 2 la obra no peresenta avances fisicos

* A la semana 2, según programacion de contratista reporta un porcentaje de avance fisico programado o esperado del 6%

AVANCE FINANCIERO:

* A la semana No 2 se reporta un avance financiero asi:

ITEM	PRESUPUESTO		DIFERENCIA		INVERSIÓN		CONTRATADO	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%	$	%
Directos	$ 1,102,209,475.00	$ 1,102,209,475.00	$ 5,243,488.70	0.48%	$ 5,243,488.70	0.48%	$ 0.00	0.00%
Indirectos	$ 297,045,454.00	$ 297,045,454.00	$ 1,413,120.21	0.48%	$ 1,413,120.21	0.48%	$ 0.00	0.00%
SUBTOTAL	$ 1,399,254,929.00	$ 1,399,254,929.00	$ 6,656,608.91	0.48%	$ 6,656,608.91	0.48%	$ 0.00	0.00%
Adicionales	$ 0.00	$ 0.00	0.00		$ 0.00		$ 0.00	
Reajustes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	
TOTAL	$ 1,399,254,929	$ 1,399,254,929	$ 6,656,608.91		$ 6,656,608.91	0.48%	$ 0.00	0.00%

* En donde se aprecia que el contratista no ha iniciado labores en cuanto a avance fisico se refiere ni puestas de material en la obra

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: ___ de #**

COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades desarrolladas:

jueves 7/11/2024
En la reunion con la parte administrativa y operativo del aeropuerto el pindo, se toco el tema, sobre la disposicion del escombro que se va a generar por parte de la contratista Reingenieria Integral SAS
al igual el tema de poda de algunos arboles, dejando claro que deben pedir un permiso a las entidades ambientales, cuando se pasa de una altura del arbol

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividades desarrolladas:

Martes 12/11/2024
Se comienza la jornada con la presentacion del el ingeniero tecnico de la contratista con el ing residente de interventoria y parte Siso
Se realizo conversacion con el componente de SST de la contratista Reingenieria Integral temas de la parte ambiental y de seguridad como el manejo de escombros, vertimientos de residuos de concreto, señalizaciones, Formato de ingresos y seguridad social de todo el personal, que ingresara para la realizacion del encerramiento del aeropuerto el pindo

Miercoles 13/11/2024
se realiza recorrido y acompañamiento por parte de la interventoria, con el ingeniero tecnico y de seguridad de la contratista, en todo el perimetro del Aeropuerto el Pindo
Se hace acompañamiento para definir el lugar donde se construira la bodega provisional y taller de tareas de soldadura, se toman evidencias fotograficas del lugar escogido
Se recibe autorizacion via correo para realizarnos el examen medico ocupacional


Jueves 14/11/2024
Se le informa al ingeniero tecnico y a la Siso sobre un instructivo de dotacion de la Aeronautica Civil, para tener en cuenta en la compra de la dotacion, del personal
Se pide el instructivo de Dotacion y se le hace llegar via whatsapp al ingeniero tecnico y a la de seguridad para tener en cuenta los requerimientos para la dotacion
Se evidencia por parte de la contratista la llegada de las muestras de material a utilizar en la construcion de muros, las cuales seran enviadas al laboratorio
Se toman evidencias de la carpeta fisica que se tendra en la oficina para la documentacion requerida por la aerocivil

Viernes 15/11/2024
Se inicia la jornada solicitando a la contratista Reingenieria Integral SAS, por correo la seguridad social integral, y el Formato de Ingreso a Estaciones Aeronauticas, de todo el personal civil que ingresaran la proxima semana, para la construcion perimetral del Aeropuerto el Pindo
Se envia correspondencia recordatoria de la llegada de la dotacion para el ingeniero residente y componente de seguridad


Sabado 16/11/2024
Se inicia la jornada tomando fotografias del perimetro donde se iniciara el encerramiento
Se termina el informe semanal para ser enviado y se suben evidencias al drive de la semana 2

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	**3**
Personal del Contratista	**3**
Total Personal en Obra	**6**

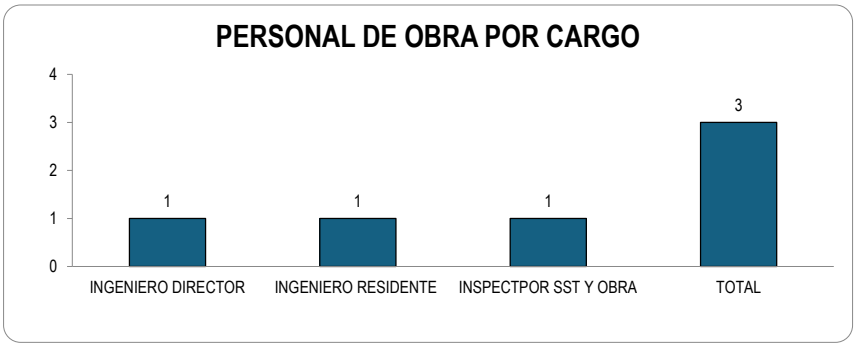

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

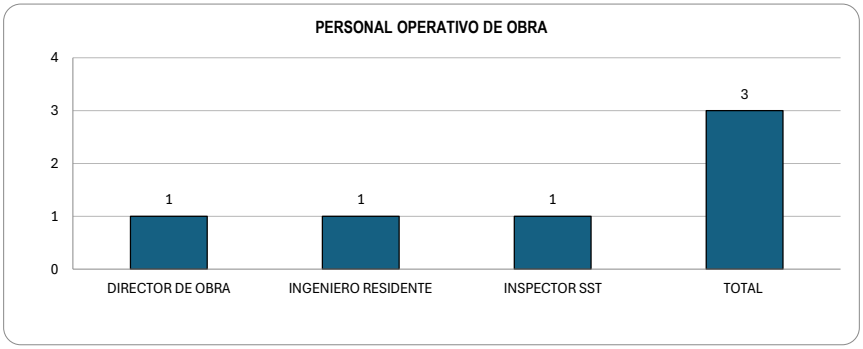

En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO				
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**			
Principio de Procedencia: 4602.375	**Clave: GSAP 1.0-12-028**	**Versión:** 01	**Fecha:** 01/MARZO/2020	**Página: ___ de #**

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Total Maquinaria			

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.399.254.929,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Total Acumulado					

Valor Total Contrato interventoría
$ 142.761.914,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	ORGINAL FIRMADO C.E.C.
	Ing. Edgar Rene Urrea
