INFORME ACTA PAGO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 247 de 2024

"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
NIT: 901.890.919-9
RL. GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CC. 1.049.615.222

PLAZO DE EJECUCIÓN
HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025

PERIODO DEL PRESENTE INFORME:
24 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 17 DE FEBRERO DE 2025

MUNICIPIO DE MIRAFLORES - BOYACÁ
17 DE FEBRERO DE 2025.

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **4**

2. OBJETO **5**

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO **5**

2. LOCALIZACIÓN **6**

2.1. Localización del Municipio de Miraflores *6*
2.1.1. Descripción Física: 6

2.2 Localización del proyecto *7*

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA **10**

3.1. Generalidades *10*

3.2. Avance físico de la obra terminado. *12*

3.3. Avance en el tiempo *12*

3.4. Avance financiero *12*

4. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA **12**

4.1. Información financiera del contrato actualizado *12*

Descripción de las Actividades ejecutadas *23*

4.2 Seguridad social y parafiscal *45*
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA 46

4.3. Aspectos logísticos *46*
4.5.1. Informe de planilla de seguridad, con el siguiente número: 46

Informe de personal *47*
4.5.2. Equipo 47

ANEXOS **48**

ANEXO 1 ..... **49**

SABANA DE OBRA *49*

CANTIDADES DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO *49*

ANEXO 2 ..... **50**

SEGURIDAD SOCIAL ..... ***¡Error! Marcador no definido.***

ANEXO 3 ..... **51**

FACTURA DE VENTA *51*

RUT *51*

CERTIFIACACION BANCARIA *51*

ANEXO 4.....¡Error! Marcador no definido.

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES..... ***¡Error! Marcador no definido.***

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Miraflores - Boyacá mediante la modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía se suscribió el contrato de obra No. 247 de 2024, con UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024 identificado con NIT. No. 901.890.919-9 cuyo representante legal es GONZALO RIVERA BALLESTEROS identificado con C.C 1.049.615.222 de Tunja, cuyo objeto es: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

El presente informe registra un condensado de las características y desarrollo del contrato de obra pública No. 247 de 2024, para el acta de pago final de obra comprendido entre el 24 de diciembre de 2024 al 17 de febrero de 2025.

De manera general se trabajó un sistema de recolección de aguas lluvias e implementación de la recolección de las aguas lluvias, así mismo el sistema de alcantarillado sanitario.

El sistema de alcantarillado adoptado como un servicio de infraestructura indispensable para toda comunidad civilizada, debe garantizar cobertura y buen funcionamiento para el desarrollo y la calidad de vida de las sociedades; identificar la importancia de una correcta evacuación y disposición de las aguas residuales y su incidencia sobre la salud publica conduce a la necesidad gubernamental de asegurar su óptimo funcionamiento.

De la misma manera, las redes existentes de alcantarillado advierten sobre una fundamental y constante valoración a fin de eludir considerables dificultades por deterioro o por posible insuficiencia en la capacidad de recolección y conducción de aguas lluvias y servidas, por un crecimiento poblacional entre otros factores.

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

2. OBJETO

Describir y poner en su conocimiento las distintas actividades ejecutadas en el proyecto, las cuales se llevan a cabo en el municipio de Miraflores departamento de Boyacá, cumpliendo con las especificaciones técnicas, de seguridad y salud en el trabajo, características de materiales y equipos empleados.

Objetivo Específico:

- Identificar la zona de intervención de la carrera 5ta Entre calles 5ta y 7ta A del Barrio el Rayo, revisar la intervención de la calle 1ª entre carrera 1B-1B y carrera 1B-1C Barrio Villa Isabel del municipio de Miraflores Boyacá en su infraestructura de alcantarillado Pluvial y Sanitario
- Recopilar y organizar información secundaria relacionada con el sistema de alcantarillado a intervenir en el Barrio el rayo y el Barrio Villa Isabel.
- Evaluar el comportamiento hidráulico de la red de alcantarillado, desde su actual sistema de evacuación.
- Elaborar un diagnóstico del sistema de alcantarillado de la zona de estudio, con base a las condiciones de operación, para identificar acciones que puedan mitigar posibles problemas actuales y tendenciales.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Entre los suscritos LEDYS SORAYA VERA MONROY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 23.754.651 expedida en Miraflores – Boyacá, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Miraflores - Boyacá, identificado con el N.I.T.: 800.029.660-1 en su calidad de Alcaldesa, calidad que se prueba con base en el acta de posesión del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) realizada ante el notario único del circuito de Miraflores, facultado para celebrar contratos conforme a lo establecido en el literal b del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 136 de 1994, y quien para todos los efectos del presente contrato en adelante se denominará MUNICIPIO o contratante, por una parte; y por la otra; y por la otra, UNION TEMPORAL AL-MIR 2024, identificado con NIT. No. 901.890.919-9, cuyo representante legal es GONZALO RIVERA BALLESTEROS C.C. 1.049.615.222 de Tunja - Boyacá, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA

Que mediante resolución No 941 del 31 de octubre de 2024, la entidad adjudica el proceso de contratación número MC-013-2024 cuyo contrato tiene por número 247 de 2024 con el fin de contratar "REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

2. LOCALIZACIÓN


2.1. Localización del Municipio de Miraflores

2.1.1. Descripción Física:

Miraflores limita por el oriente con Berbeo; por el sur con Campohermoso; por el suroriente con Páez; por el norte con Zetaquirá y por el occidente con Chinavita y Garagoa
El territorio es montañoso y hace parte de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. Los principales ríos son el Lengupá y sus afluentes, El Rusa y El Tunjita. Se encuentran algunas lagunas, como La del Morro, ubicada en la Vereda de Morro Arriba y la del Ramo, ubicada en la Vereda de Hato, y varias quebradas como la de Suna, Ramo, La Laja, La Mocacía, La Arrayanera, La Sucia, La Potrerana, El Morro, Quebrada honda, Quebrada del Medio y Quebrada honda en Tunjita, y cascadas como las de La Mocacía, El Hombligo, Las Guacamayas, y Agua Blanca. En la parte alta están las reservas naturales del cerro Mama Pacha y de la cuchilla de Sucuncuca.
El Municipio está situado al sur Oriente del Departamento de Boyacá, a 1.432 m s. n. m., en la región Andina de Colombia, y comprende zonas predominantemente montañosas que forman parte de la Cordillera Oriental y del piedemonte llanero boyacense. Esta posición hace que el clima varíe entre los 15-32 grados; su clima promedio es de 24 grados en el casco urbano; en la zona rural es muy variado ya que cuenta con cuatro pisos térmicos: Páramo, frío, medio cálido, temperatura mínima 13 grados en las partes altas de montaña Máxima de 35 grados en las costas y valles del río Lengupá.
La temporada de lluvia es de abril a principios de agosto, normalmente. Por estar en la cordillera oriental, chocan contra la región las nubes provenientes del Atlántico, traídas por los vientos alisios. Por esta razón, la época de lluvia puede ser muy intensa. Esto hace que el recurso hídrico permanezca durante todo el año y a su vez la flora y la fauna sean abundantes.

2.2 Localización del proyecto

Barrio el Rayo.

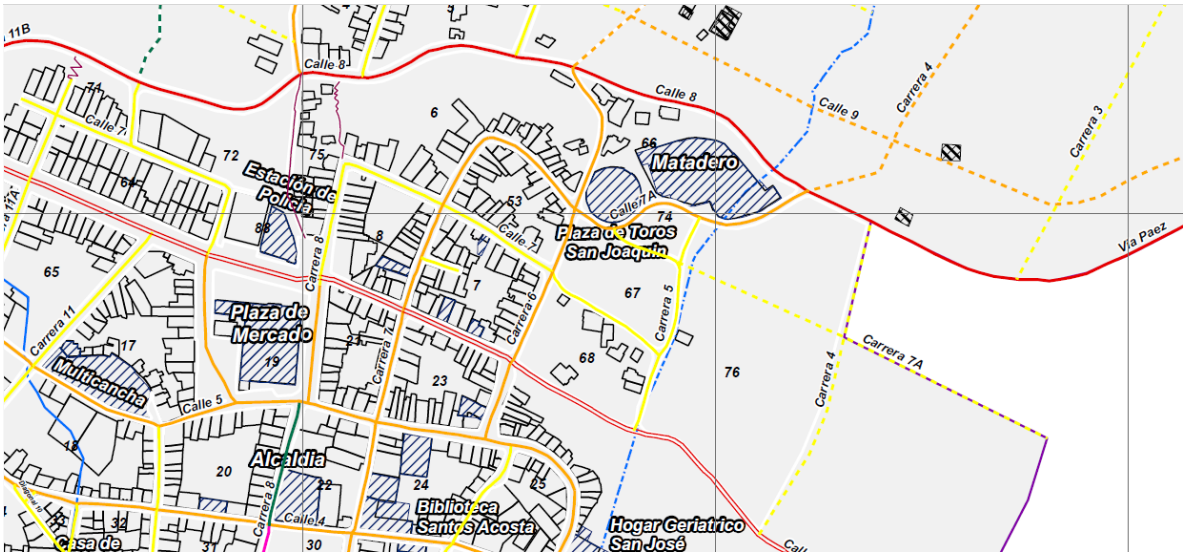

Fuente: Plan Vial Urbano del Municipio de Miraflores Boyacá (PBOT)

Intervención de Alcantarillado Pluvial y Sanitario Barrio El Rayo.



Fuente: Sector de Intervención de Obra (Google Earth)


Plano Record de Alcantarillado Barrio el Rayo



Fuente: Plano de Localización de las obras ejecutadas (PROPIA)


Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

Barrio Villa Isabel

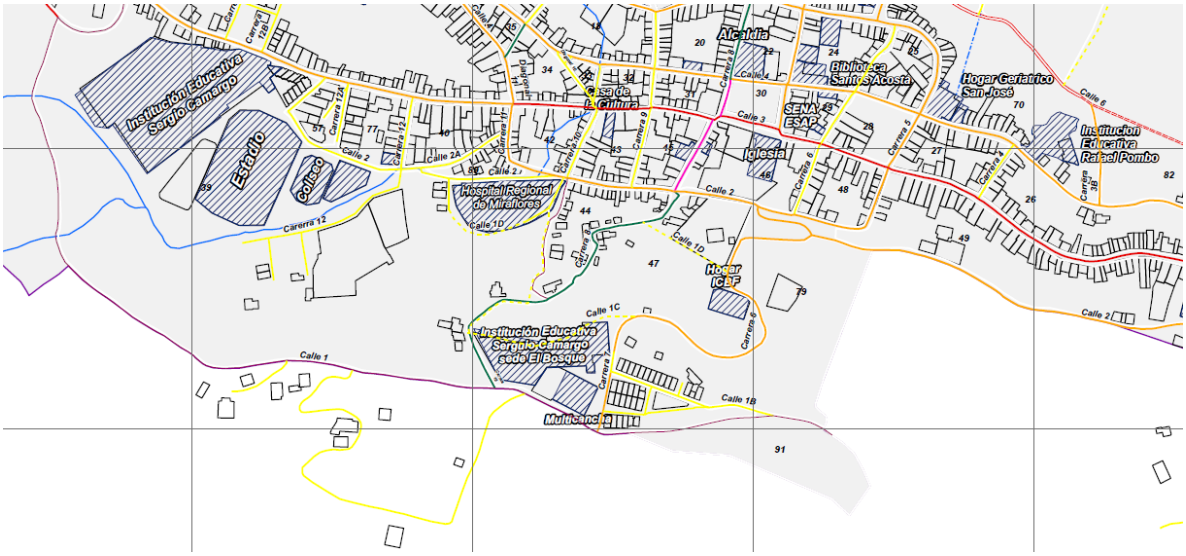

Fuente: Plan Vial Urbano del Municipio de Miraflores Boyacá (PBOT)

Intervención de Alcantarillado Pluvial y Sanitario Barrio Villa Isabel

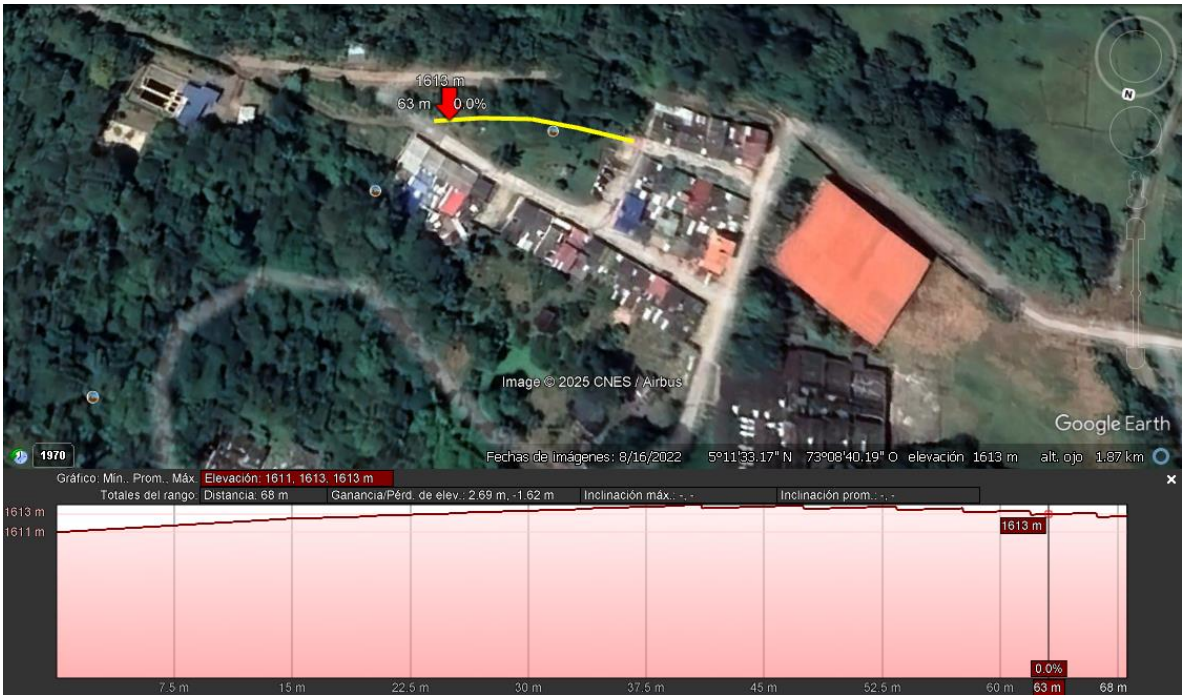

Fuente: Sector de Intervención de Obra (Google Earth)

Plano Record de Alcantarillado Barrio el Rayo



Fuente: Plano de Localización de las obras ejecutadas (PROPIA)

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Generalidades

CONTRATO DE OBRA No.	247 de 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE M IRAFLORES (BOYACÁ)
NIT	800.029.660-1
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AL-MIR 2024
NIT No.	901.890.919-9
CONTRATISTA	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C. No.	1.049.615.222 de Tunja
OBJETO	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($ 278.007.999,30)
VALOR ADICIONAL	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOSMIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 42.362.312,68)
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS

	ONCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 320.370.311,98)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCION FINAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE PAGO No. 01	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 01	16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 01	17 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 01	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSION No. 02	31 DE ENERO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 02	07 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 02	07 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 02	HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE ENTREGA Y/O TERMINACION Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	17 DE FEBRERO DE 2025

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3.2. Avance físico de la obra terminado.

AVANCE FÍSICO A LA FECHA	100 %

3.3. Avance en el tiempo

TIEMPO TOTAL TRASCURRIDO	100 %

3.4. Avance financiero

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FINAL		
	$	**%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 278.007.999,30	86,78%
ANTICIPO	$ -	0,00%
VALOR ADICIONAL NO 01	$ 42.362.312,68	13,22%
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	**$ 320.370.311,98**	**100,00%**
VALOR PAGADO ACTA No. 01	$ 224.553.132,92	70,09%
VALOR PAGADO ACTA FINAL	$ 95.817.179,06	29,91%
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 320.370.311,98**	**100,00%**

4. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA

4.1. Información financiera del contrato actualizado

- **Información Consolidada de lo contrato Inicial**

ITEM		DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VAL. UNITARIO	VALOR TOTAL
ITEM GOBER.	©					
1	**ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A**					
2,01,05	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	50,33	$ 1.023,94	$ 51.534,90

3,13,09	1,2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	28,00	$ 48.128,54	$ 1.347.599,12
1,02,15	1,3	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	133,37	$ 25.449,98	$ 3.394.263,83
1,02,17	1,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	2,52	$ 51.096,28	$ 128.762,63
3,13,37	1,5	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	22,00	$ 97.149,01	$ 2.137.278,22
2,05,54	1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	50,33	$ 229.102,47	$ 11.530.727,31
2,05,05	1,7	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	2,00	$ 2.770.255,53	$ 5.540.511,06
3,03,15	1,8	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	97,39	$ 90.637,80	$ 8.827.215,34
3,12,03	1,9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	1.111,99	$ 2.294,00	$ 2.550.905,06
2,01,11	1,10	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	10,07	$ 95.360,86	$ 960.283,86
3,05,02	1,11	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	100,66	$ 5.198,69	$ 523.300,13
3,13,16	1,12	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	20,13	$ 264.352,93	$ 5.321.424,48
3,05,01	1,13	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	80,53	$ 918.482,75	$ 73.965.415,86
3	**ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL**					
2,01,05	3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	70,00	$ 1.023,94	$ 71.675,80
3,13,09	3,2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	28,00	$ 48.128,54	$ 1.347.599,12
3,05,02	3,3	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	58,90	$ 5.198,69	$ 306.202,84
3,13,16	3,4	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	4,42	$ 264.352,93	$ 1.168.439,95
1,02,15	3,5	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	109,20	$ 25.449,98	$ 2.779.137,82
1,02,17	3,6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,00	$ 51.096,28	$ -
2,05,05	3,7	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	2,00	$ 2.770.255,53	$ 5.540.511,06
2,05,54	3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	70,00	$ 229.102,47	$ 16.037.172,90
3,13,37	3,10	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	30,05	$ 97.149,01	$ 2.919.327,75
3,03,15	3,11	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	74,20	$ 90.637,80	$ 6.725.324,76

2,01,11	3,12	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	5,89	$ 95.360,86	$ 561.675,46
3,05,01	3,13	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	4,42	$ 918.482,75	$ 4.059.693,75
3,12,03	3,14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	925,19	$ 2.294,00	$ 2.122.385,86
4	**ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL**					
2,01,05	4,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	60,00	$ 1.023,94	$ 61.436,40
3,13,09	4,2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	28,00	$ 48.128,54	$ 1.347.599,12
3,05,02	4,3	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	12,00	$ 5.198,69	$ 62.384,28
3,13,16	4,4	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	M3	0,99	$ 264.352,93	$ 261.709,40
1,02,15	4,5	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	72,00	$ 25.449,98	$ 1.832.398,56
1,02,17	4,6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	39,00	$ 51.096,28	$ 1.992.754,92
2,05,59	4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	60,00	$ 96.901,78	$ 5.814.106,80
INP-01	4,8	ENCAMISADO EN CONCRETO PARA TUBERIA DE 8" (INCLUYE REFUERZO)	ML	60,00	$ 207.133,99	$ 12.428.039,40
1,02,31	4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	66,00	$ 67.768,53	$ 4.472.722,98
INP-02	4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 200x160mm	UND	11,00	$ 177.378,93	$ 1.951.168,23
2,05,05	4,11	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	2,00	$ 2.770.255,53	$ 5.540.511,06
3,03,15	4,12	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	99,42	$ 90.637,80	$ 9.011.210,08
3,12,03	4,13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	835,13	$ 2.294,00	$ 1.915.788,22
2,01,11	4,14	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	1,98	$ 95.360,86	$ 188.814,50
3,05,01	4,15	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	7,20	$ 918.482,75	$ 6.613.075,80
1,02,04	4,17	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	11,00	$ 40.019,88	$ 440.218,68

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

COSTO DIRECTO		**$ 213.852.307,30**
ADMINISTRACION	**22%**	$ 47.047.507,61
IMPREVISTOS	**3%**	$ 6.415.569,22
UTILIDAD	**5%**	$ 10.692.615,37
COSTO INDIRECTO AIU (30%) REDONDEADO AL PESO		**$ 64.155.692,00**
TOTAL COSTO OBRA		**$ 278.007.999,30**

- **Balance financiero No. 02**

CONDICIONES BALANCE No. 01							(+ & -)	BALANCE No. 02		CANTIDADES FINALES	
ITEM	ITEM GOB.	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR
1	CAP:	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A									
1,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	$ 1.023,94	157,70	$ 161.475,34	=	0,00	$ -	157,70	$ 161.475,34
1,2	3,13,09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	$ 48.128,54	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
1,3	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 25.449,98	687,81	$ 17.504.750,74	=	0,00	$ -	687,81	$ 17.504.750,74
1,4	1,02,17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.096,28	10,33	$ 527.824,57	=	0,00	$ -	10,33	$ 527.824,57
1,5	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO,	M3	$ 97.149,01	79,09	$ 7.683.515,20	=	0,00	$ -	79,09	$ 7.683.515,20

		EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)									
1,6	2,05,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 229.102,47	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
1,7	2,05,05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	$ 2.770.255,53	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
1,8	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	$ 90.637,80	577,62	$ 52.354.206,04	=	0,00	$ -	577,62	$ 52.354.206,04
1,9	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3 - km	$ 2.294,00	2298,49	$ 5.272.736,06	=	0,00	$ -	2.298,49	$ 5.272.736,06
1,10	2,01,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 95.360,86	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
1,11	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	$ 5.198,69	154,15	$ 801.378,06	=	0,00	$ -	154,15	$ 801.378,06
1,12	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	$ 264.352,93	23,89	$ 6.315.821,06	+	0,10	$ 26.005,72	23,99	$ 6.341.826,78
1,13	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	$ 918.482,75	6,81	$ 6.254.867,53	+	2,41	$ 2.213.543,43	9,22	$ 8.468.410,96
SUB TOTAL						$ 96.876.574,60			$ 2.239.549,15		$ 99.116.123,75

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

INP 1	SUBCAP:	ITEMS NO PREVISTOS CAP 01									
1,14	NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 20	ML	$ 485.681,64	154,50	$ 75.037.813,19	=	0,00	$ -	154,50	$ 75.037.813,19
1,15	2,06,15	POZO DE INSPECCION D=1.20 M H 2.50 M	UND	$ 3.537.044,23	2,00	$ 7.074.088,47	=	0,00	$ -	2,00	$ 7.074.088,47
1,16	NVO 04	SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA NATURAL POROSA DE LAJA SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 202.622,17		$ -	+	137,90	$ 27.941.597,73	137,90	$ 27.941.597,73
1,17	3,04,06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	$ 136.320,39		$ -	+	16,55	$ 2.256.102,39	16,55	$ 2.256.102,39
1,18	3,12,02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3 - km	$ 1.850,00		$ -	+	71,00	$ 131.350,00	71,00	$ 131.350,00
1,19	NVO 05	DILATACIONES EN LADRILLO	M	$ 9.707,52		$ -	+	88,40	$ 858.145,20	88,40	$ 858.145,20
SUB TOTAL						$ 82.111.901,66			$ 31.187.195,32		$ 113.299.096,98
2	CAP:	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL									
2,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	$ 1.023,94	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,2	3,13,09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	$ 48.128,54	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,3	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	$ 5.198,69	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -

2,4	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	$ 264.352,93	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,5	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 25.449,98	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,6	1,02,17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.096,28	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,7	2,05,05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	$ 2.770.255,53	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,8	2,05,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 229.102,47	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,9	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 97.149,01	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,10	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	$ 90.637,80	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,11	2,01,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 95.360,86	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
2,12	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	$ 918.482,75	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

2,13	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3 - km	$ 2.294,00	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
SUB TOTAL						$ -			$ -		$ -
INP 2	SUBCAP:	ITEMS NO PREVISTOS CAP 02									
2,14	2,06,21	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	$ 1.237.609,35	1,00	$ 1.237.609,35	-	-1,00	$ (1.237.609,35)	-	$ -
2,15	1,11,26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	$ 93.110,08		$ -	+	5,40	$ 502.794,43	5,40	$ 502.794,43
2,16	6,04,03	MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS	M2	$ 128.770,62		$ -	+	3,64	$ 468.725,05	3,64	$ 468.725,05
2,17	1,05,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	$ 34.781,99		$ -	+	3,64	$ 126.606,44	3,64	$ 126.606,44
2,18	NVO 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE TRAFICO PESADO	UND	$ 448.505,77		$ -	+	6,00	$ 2.691.034,62	6,00	$ 2.691.034,62
2,19	1,02,01	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	$ 40.939,98		$ -	+	5,40	$ 221.075,88	5,40	$ 221.075,88
SUB TOTAL						$ 1.237.609,35			$ 2.772.627,07		$ 4.010.236,42
3	CAP:	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL									
3,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	$ 1.023,94	116,00	$ 118.777,04	-	-22,40	$ (22.936,26)	93,60	$ 95.840,78
3,2	3,13,09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	$ 48.128,54	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
3,3	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML	$ 5.198,69	21,40	$ 111.251,97	-	-12,90	$ (67.063,10)	8,50	$ 44.188,87

		HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)									
3,4	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	M3	$ 264.352,93	1,93	$ 509.143,74	-	-1,62	$ (427.194,33)	0,31	$ 81.949,41
3,5	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 25.449,98	101,79	$ 2.590.553,46	+	107,40	$ 2.733.327,85	209,19	$ 5.323.881,32
3,6	1,02,17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.096,28	24,00	$ 1.226.310,72	-	-24,00	$ (1.226.310,72)	-	$ -
3,7	2,05,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	$ 96.901,78	77,00	$ 7.461.437,06	-	-19,50	$ (1.889.584,71)	57,50	$ 5.571.852,35
3,8	INP-01	ENCAMISADO EN CONCRETO PARA TUBERIA DE 8" (INCLUYE REFUERZO)	ML	$ 207.133,99	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
3,9	1,02,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	$ 67.768,53	39,00	$ 2.642.972,67	-	-2,30	$ (155.867,62)	36,70	$ 2.487.105,05
3,10	INP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 200x160mm	UND	$ 177.378,93	6,00	$ 1.064.273,58	=	0,00	$ -	6,00	$ 1.064.273,58
3,11	2,05,05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	$ 2.770.255,53	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
3,12	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	$ 90.637,80	84,99	$ 7.703.306,62	-	-47,06	$ (4.265.414,87)	37,93	$ 3.437.891,75
3,13	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO	M3 - km	$ 2.294,00	500,42	$ 1.147.955,27000	-	-115,96	$ (266.004,03)	384,46	$ 881.951,24

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

		SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).									
3,14	2,01,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 95.360,86	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
3,15	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	$ 918.482,75	1,93	$ 1.772.671,71	-	-1,62	$ (1.487.942,06)	0,31	$ 284.729,65
3,16	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	$ 40.019,88	0,00	$ -	=	0,00	$ -	-	$ -
SUB TOTAL						$ 26.348.653,84			$ (7.074.989,84)		$ 19.273.664,00
INP 3	SUBCAP:	ITEMS NO PREVISTOS CAP 03									
3,17	3,13,36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 115.320,06	30,09	$ 3.470.095,92	-	-30,09	$ (3.470.095,92)	-	$ -
3,18	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	$ 348.737,56	6,00	$ 2.092.425,36	+	1,00	$ 348.737,56	7,00	$ 2.441.162,92
3,19	2,06,12	POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M	UND	$ 1.715.046,57	1,00	$ 1.715.046,57	=	0,00	$ -	1,00	$ 1.715.046,57
3,20	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 97.274,42		$ -	+	24,84	$ 2.416.296,47	24,84	$ 2.416.296,47
3,21	1,11,26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	$ 93.110,08		$ -	+	3,24	$ 301.676,66	3,24	$ 301.676,66
3,22	2,05,02	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5	M3	$ 857.412,69		$ -	+	0,57	$ 488.725,23	0,57	$ 488.725,23

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

		MPa - (2500 PSI									
3,23	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	$ 5.013,50		$ -	+	411,92	$ 2.065.160,92	411,92	$ 2.065.160,92
3,24	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	$ 91.714,13		$ -	+	14,30	$ 1.311.512,06	14,30	$ 1.311.512,06
SUB TOTAL						$ 7.277.567,85			$ 3.462.012,98		$ 10.739.580,83
VALOR COSTO DIRECTO						$ 213.852.307,30			$ 32.586.394,68		$ 246.438.701,98
ADMINISTRACION				22%		$ 47.047.507,61			$ 7.169.006,83		$ 54.216.514,44
IMPREVISTOS				3%		$ 6.415.569,22			$ 977.591,84		$ 7.393.161,06
UTILIDADES				5%		$ 10.692.615,37			$ 1.629.319,73		$ 12.321.935,10
COSTO INDIRECTO AIU (30%)						$ 64.155.692,00			$ 9.775.918,00		$ 73.931.610,00
VALOR TOTAL						$ 278.007.999,30			$ 42.362.312,68		$ 320.370.311,98

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

Descripción de las Actividades ejecutadas

A la fecha de corte del presente informe se ejecutaron las siguientes actividades, correspondiente al informe de obra para Pago Final:

Actividades Ejecutadas:

CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 02							PAGO FINAL		CANTIDADES FINALES	
ITEM	ITEM GOB.	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PAGADO	CANT	VALOR
1	CAP:	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A								
1,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	$ 1.023,94	157,70	$ 161.475,34	0,00	$ -	157,70	$ 161.475,34
1,2	3,13,09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	$ 48.128,54	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1,3	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 25.449,98	687,81	$ 17.504.750,74	0,00	$ -	687,81	$ 17.504.750,74
1,4	1,02,17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.096,28	10,33	$ 527.824,57	0,00	$ -	10,33	$ 527.824,57
1,5	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 97.149,01	79,09	$ 7.683.515,20	0,00	$ -	79,09	$ 7.683.515,20
1,6	2,05,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 229.102,47	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1,7	2,05,05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	$ 2.770.255,53	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1,8	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	$ 90.637,80	577,62	$ 52.354.206,04	0,00	$ -	577,62	$ 52.354.206,04

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

1,9	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	$ 2.294,00	2.298,49	$ 5.272.736,06	0,00	$ -	2.298,49	$ 5.272.736,06
1,10	2,01,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 95.360,86	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
1,11	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	$ 5.198,69	154,15	$ 801.378,06	0,00	$ -	154,15	$ 801.378,06
1,12	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3	$ 264.352,93	23,99	$ 6.341.826,78	0,10	$ 26.435,29	23,99	$ 6.341.826,78
1,13	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	$ 918.482,75	9,22	$ 8.468.410,96	9,22	$ 8.468.410,96	9,22	$ 8.468.410,96
SUB TOTAL						$ 99.116.123,75		$ 8.494.846,01		$ 99.116.123,75
IN P1	SUBCAP:	ITEMS NO PREVISTOS CAP 01								
1,14	NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 20	ML	$ 485.681,64	154,50	$ 75.037.813,19	0,00	$ -	154,50	$ 75.037.813,19
1,15	2,06,15	POZO DE INSPECCION D=1.20 M H 2.50 M	UND	$ 3.537.044,23	2,00	$ 7.074.088,47	0,00	$ -	2,00	$ 7.074.088,47
1,16	NVO 04	SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA NATURAL POROSA DE LAJA SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 202.622,17	137,90	$ 27.941.597,73	137,90	$ 27.941.597,73	137,90	$ 27.941.597,73
1,17	3,04,06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	$ 136.320,39	16,55	$ 2.256.102,39	16,55	$ 2.256.102,39	16,55	$ 2.256.102,39
1,18	3,12,02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-k	$ 1.850,00	71,00	$ 131.350,00	71,00	$ 131.350,00	71,00	$ 131.350,00

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

			m							
1,19	NVO 05	DILATACIONES EN LADRILLO	M	$ 9.707,52	88,40	$ 858.145,20	88,40	$ 858.145,20	88,40	$ 858.145,20
SUB TOTAL						$ 113.299.096,98		$ 31.187.195,09		$ 113.299.096,98
2	CAP:	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL								
2,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	$ 1.023,94	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,2	3,13,09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	$ 48.128,54	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,3	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	$ 5.198,69	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,4	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)	M3	$ 264.352,93	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,5	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 25.449,98	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,6	1,02,17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.096,28	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,7	2,05,05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	$ 2.770.255,53	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,8	2,05,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	$ 229.102,47	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,9	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 97.149,01	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,10	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	$ 90.637,80	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -

2,11	2,01,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 95.360,86	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,12	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	$ 918.482,75	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,13	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	$ 2.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
SUB TOTAL						$ -		$ -		$ -
IN P2	SUBCAP:	ITEMS NO PREVISTOS CAP 02								
2,14	2,06,21	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	$ 1.237.609,35	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,15	1,11,26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	$ 93.110,08	5,40	$ 502.794,43	5,40	$ 502.794,43	5,40	$ 502.794,43
2,16	6,04,03	MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS	M2	$ 128.770,62	3,64	$ 468.725,05	3,64	$ 468.725,05	3,64	$ 468.725,05
2,17	1,05,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	$ 34.781,99	3,64	$ 126.606,44	3,64	$ 126.606,44	3,64	$ 126.606,44
2,18	NVO 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE TRAFICO PESADO	UND	$ 448.505,77	6,00	$ 2.691.034,62	6,00	$ 2.691.034,62	6,00	$ 2.691.034,62
2,19	1,02,01	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	$ 40.939,98	5,40	$ 221.075,88	5,40	$ 221.075,88	5,40	$ 221.075,88
SUB TOTAL						$ 4.010.236,42		$ 4.010.236,42		$ 4.010.236,42
3	CAP:	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL								
3,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	$ 1.023,94	93,60	$ 95.840,78	93,60	$ 95.840,78	93,60	$ 95.840,78
3,2	3,13,09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M. DISTANCIA ENTRE	ML	$ 48.128,54	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -

		POSTES 2 M								
3,3	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	$ 5.198,69	8,50	$ 44.188,87	8,50	$ 44.188,87	8,50	$ 44.188,87
3,4	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	M3	$ 264.352,93	0,31	$ 81.949,41	0,31	$ 81.949,41	0,31	$ 81.949,41
3,5	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	$ 25.449,98	209,19	$ 5.323.881,32	209,19	$ 5.323.881,32	209,19	$ 5.323.881,32
3,6	1,02,17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.096,28	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,7	2,05,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	$ 96.901,78	57,50	$ 5.571.852,35	57,50	$ 5.571.852,35	57,50	$ 5.571.852,35
3,8	INP-01	ENCAMISADO EN CONCRETO PARA TUBERIA DE 8" (INCLUYE REFUERZO)	ML	$ 207.133,99	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,9	1,02,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	$ 67.768,53	36,70	$ 2.487.105,05	36,70	$ 2.487.105,05	36,70	$ 2.487.105,05
3,10	INP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 200x160mm	UND	$ 177.378,93	6,00	$ 1.064.273,58	6,00	$ 1.064.273,58	6,00	$ 1.064.273,58
3,11	2,05,05	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	$ 2.770.255,53	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,12	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	$ 90.637,80	37,93	$ 3.437.891,75	37,93	$ 3.437.891,75	37,93	$ 3.437.891,75
3,13	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km	$ 2.294,00	384,46	$ 881.951,24	384,46	$ 881.951,24	384,46	$ 881.951,24
3,14	2,01,11	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 95.360,86	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,15	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3	$ 918.482,75	0,31	$ 284.729,65	0,31	$ 284.729,65	0,31	$ 284.729,65
3,16	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	$ 40.019,88	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
SUB TOTAL						$ 19.273.664,00		$ 19.273.664,00		$ 19.273.664,00
INP3	SUBCAP:	ITEMS NO PREVISTOS CAP 03								
3,17	3,13,36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 115.320,06	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,18	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	$ 348.737,56	7,00	$ 2.441.162,92	7,00	$ 2.441.162,92	7,00	$ 2.441.162,92
3,19	2,06,12	POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M	UND	$ 1.715.046,57	1,00	$ 1.715.046,57	1,00	$ 1.715.046,57	1,00	$ 1.715.046,57
3,20	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 97.274,42	24,84	$ 2.416.296,47	24,84	$ 2.416.296,47	24,84	$ 2.416.296,47
3,21	1,11,26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	$ 93.110,08	3,24	$ 301.676,66	3,24	$ 301.676,66	3,24	$ 301.676,66
3,22	2,05,02	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI	M3	$ 857.412,69	0,57	$ 488.725,23	0,57	$ 488.725,23	0,57	$ 488.725,23
3,23	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	$ 5.013,50	411,92	$ 2.065.160,92	411,92	$ 2.065.160,92	411,92	$ 2.065.160,92
3,24	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	$ 91.714,13	14,30	$ 1.311.512,06	14,30	$ 1.311.512,06	14,30	$ 1.311.512,06
SUB TOTAL						$ 10.739.580,83		$ 10.739.580,83		$ 10.739.580,83

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

VALOR COSTO DIRECTO		$ 246.438.701,98		$ 73.705.522,35	$ 246.438.701,98
ADMINISTRACION	22%	$ 54.216.514,44		$ 16.215.214,92	$ 54.216.514,44
IMPREVISTOS	3%	$ 7.393.161,06		$ 2.211.165,67	$ 7.393.161,06
UTILIDADES	5%	$ 12.321.935,10		$ 3.685.276,12	$ 12.321.935,10
COSTO INDIRECTO AIU (30%)		$ 73.931.610,00		$ 22.111.656,71	$ 73.931.610,00
VALOR TOTAL		$ 320.370.311,98		$ 95.817.179,06	$ 320.370.311,98

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FINAL			
	$		%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	278.007.999,30	86,78%
ANTICIPO	$	-	0,00%
VALOR ADICIONAL NO 01	$	42.362.312,68	13,22%
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	$	320.370.311,98	100,00%
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$	224.553.132,92	70,09%
VALOR POR EJECUTAR	$	95.817.179,06	29,91%
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$	95.817.179,06	29,91%
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	320.370.311,98	100,00%

Descripción de Actividades Ejecutadas:

1,12	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3

S realizo la demolición de una sección de loza en piedra laja que se encontraba fracturada.



DEMOLICION DE CONCRETO (FOTO PROPIA)

1,13	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3

Se realizó el mezclado, fundido para la reposición de la estructura que se retiró para el cambio del alcantarillado pluvial del Barrio El Rayo.



CONCRETO HIDRAULICO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

1,16	NVO 04	SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA NATURAL POROSA DE LAJA SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI	M2

Se realizó el mezclado, fundido para la reposición de la estructura que se retiró para el cambio del alcantarillado pluvial del Barrio El Rayo



INSTALACION DE PIEDRA LAJA Y CONCRETO (FOTO PROPIA)

1,17	3,04,06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3

Se realiza el suministro y la compactación con equipos tipo rana y canguro del material de Base para fundir la capa de rodadura de concreto hidráulico y de la piedra laja.



MATERIAL DE BASE COMPACTADO(FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

1,18	3,12,02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-km

Se realiza el transporte de material granular de cantera a sitio de la obra.



TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

1,19	NVO 05	DILATACIONES EN LADRILLO	M

Se realizaron las respectivas dilataciones en la zona de reposición de concreto con rodadura en piedra laja.



DILATACION EN LADRILLO (FOTO PROPIA)

2,15	1,11,26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2

Se realiza la placa base para el cárcamo de recolección de aguas lluvias.



PLACA EN CONCRETO PARA CARCAMO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

2,16	6,04,03	MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS	M2

Se realiza la construcción de las paredes del cárcamo en ladrillo tolete común.



MURO EN TOLETE COMUN PARA SUMIDERO (FOTO PROPIA)

2,17	1,05,08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2

Se realizó el pañete impermeabilizado para el cárcamo de recolección de aguas lluvias.



PAÑETE PARA CARCAMO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

2,18	NVO 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE TRAFICO PESADO	UND

Se instalaron las rejillas de tráfico pesado para el cárcamo de recolección de aguas lluvias.



INSTALACION DE REJILLAS TRAFICO PESADO PARA CARCAMO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

2,19	1,02,01	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2

Se realizó la base en concreto pobre de limpieza para el cárcamo de recolección de aguas lluvias.



BASE EN CONCRETO DE LIMPIEZA (FOTO PROPIA)

3,1	2,01,05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML

Se realizó la localización y replanteo para la red de alcantarillado sanitario del barrio Villa Isabel



NIVELACION Y DEMARCACION DE OBRA (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,3	3,05,02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML

Se realizó el corte de la placa en concreto con pulidora y cortadora de concreto.



CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO (FOTO PROPIA)

3,4	3,13,16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	M3

Se realiza la demolición de placas de concreto con martillo demoledor, barras y almádenas.



ROPTURA DE PAVIEMNTO HIDRAULICO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,5	1,02,15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3

Se realiza la excavación de zanja con retroexcavadora a profundidad indicada en el diseño, según niveles de terreno y conexiones de acometidas a las casas.



EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA (FOTO PROPIA)

3,7	2,05,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML

Se realiza la instalación de tubería PVC de alcantarillado de Diámetro de 8 pulgadas con campana y empaque en caucho como red principal.



INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE 8" (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,9	1,02,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML

Se realiza la instalación de tubería PVC de alcantarillado de Diámetro de 6 pulgadas con campana y empaque en caucho como redes de recolección acometidas de casas.



INSTALACION DE TUBERIA DE 6" (FOTO PROPIA)

3,10	INP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 200x160mm	UND

Se realiza la instalación de las sillas Yee de alcantarillado de 6 pulgadas a 8 pulgadas para conexión de acometidas a la red principal de recolección.



INSTALACION DE SILLA YEE (FOTO PROPIA)

3,12	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3

Se realiza el tape de tubería con material de afirmado seleccionado compactado en capas con vibrocompatador tipo canguro.



INSTALACION DE TAPE DE TUBERIA CON MATERIAL DE AFIRMADO (FOTO PROPIA)

3,13	3,12,03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-km

Se realiza el transporte de material de afirmado y granular de cantera a sitio de la obra.



SUMINSITRO DE MATERIAL GRANULAR Y DE AFIRMADO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,15	3,05,01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	M3

Se realizó el mezclado, fundido para la reposición de la estructura que se retiró para el cambio del alcantarillado pluvial del Barrio Villa Isabel.



REPOCISION DE CONCRETO HIDRAULICO (FOTO PROPIA)

3,18	1,02,04	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND

Se realizaron las cajas de inspección de recolección de aguas servidas de las casas proyectadas en el Barrio Villa Isabel.



CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION SANITARIA PARA 7 VIVIENDAS (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,19	2,06,12	POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M	UND

Se realizó la construcción de un pozo de inspección en ladrillo Diámetro interno de 1.20 altura entre 1 m y 1.5 m, pañetados internamente, cañuela en concreto y aro tapa en hierro fundido.



CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION SANITARIO (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,20	3,13,37	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3

Se instala capa de gravilla para la cama y tape de tubería



INSTALACION DE TAPE CON GRAVILLA PARA TUBERIA (FOTO PROPIA)

3,21	1,11,26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2

Se realizó la base en concreto pobre de limpieza para el pozo de inspección de alcantarillado sanitario.



FUNIDIDA DE PLACA BASE PARA POZO DE INSPECCION (FOTO PROPIA)

3,22	2,05,02	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI	M3

Se realizó la base en cañuela para el pozo de inspección y cajas de inspección en concreto.



CONCRETO PARA CAÑUELAS DE POZO Y CAJAS DE INSPECCION (FOTO PROPIA)

3,23	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3

Se realizó la base en cañuela para el pozo de inspección y cajas de inspección en concreto.



CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE Y DE EXCAVACIONES (FOTO PROPIA)

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

3,24	3,03,11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3

Se realiza replanteo manual y con equipos tipo taladro y cortadoras en zanja y cajas para poder realizar las construcciones e instalación respectivas.



EXCAVACION MANUAL EN PIEDRA PARA ACOMETIDAS Y CAJAS DE INSPECCION (FOTO PROPIA)

4.2 Seguridad social y parafiscal

El personal que laboró está debidamente afiliado a su vez se realizaron los aportes correspondientes al sistema de seguridad social tal como se evidencia en el **ANEXO SEGURIDAD SOCIAL.**

El tema de pago de parafiscales se evidencia con los certificados como se evidencia en el **ANEXO PARAFISCALES**.

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA

Se ha instalado cintas refractivas y vallas para señalización al termino de labores.



SEÑALIZACION DE OBRA (FOTO PROPIA

4.3. Aspectos logísticos

4.5.1. Informe de planilla de seguridad, con el siguiente número:

PLANILLA DE COMPENSAR:

MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE CON No. 82866019 DE 2024

MES DE DICIEMBRE - ENERO CON No. 82866602 DE 2024

MES DE ENERO - FEBRERO CON No. 84321879 DE 2025

MES DE FEBRERO - MARZO CON No. 84322007 DE 2025

Informe de personal

PERSONAL OPERATIVO		
Cargo	**Nombre**	**% de dedicación**
1. Oficial de Obra	LIRIO MANUEL ALFONSO ALFONSO C.C. 74.346.468	100
2. Ayudante de Obra	OSCAR IVAN SANABRIA SANABRIA C.C. 1.002.732.928	100
3. Ayudante de Obra	HECTOR MAURICIO BARRETO BARRETO C.C. 1.057.410.351	100
4. Residente de Obra	DIEGO FERNANDO RIVERA ZAMUDIO C.C. 1.048.848.711	100
5. Director de Obra	RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS C.C. 7.173.489	20

4.5.2. Equipo

Durante este periodo, se utilizó el siguiente equipo.

EQUIPO	MARCA	CANTIDAD
HERRAMIENTA MENOR	HERRAGRO, ETC	-
PULIDORA ELECTRICA	BOCH	2
TALADRO ELÉCTRICO	BOCH	2
MEZCLADORA DE CONCRETO	-	1
VIBRO DE CONCRETO	-	1
MARTILLO DEMOLEDOR	MAKITA	1
RETROEXCAVADORA	CAT 420	1

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
NIT 901.890.919-9
R/L GONZALO RIVERA BALLESTEROS

ANEXOS

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

ANEXO 1

SABANA DE COBRO FINAL

CANTIDADES DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

ITEMS NO PREVISTOS CAP 01

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A						
ITEM	1,12	DESCRIPCION	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO lIBRE 5 Km.)			UND	M3
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	
TRAMO 3 SECCION DE POZOS			0,80	0,82	0,15		0,10



TOTAL	0,10

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A						
ITEM	1,13	DESCRIPCION	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS			UND	M3
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	
TRAMO 1 SECCION 01			7,60	1,90	0,18		2,59
TRAMO 1 SECCION 02			1,40	1,00	0,18		0,25
TRAMO 1 SECCION 03			11,20	1,51	0,18		3,04
TRAMO 1 SECCION 04			1,40	1,10	0,18		0,28
TRAMO 1 SECCION 05			5,30	1,33	0,18		1,27
TRAMO 1 SECCION 06			7,00	0,96	0,18		1,21
TRAMO 1 SECCION 07			2,10	1,51	0,18		0,57







TOTAL	9,22

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A						
ITEM	1,16	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INTALACION DE PIEDRA NATURAL POROSA DE LAJA SOBRE CONCRETO DE 3000 PSI			UND	M2
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	
						DESCUENTO	
TRAMO 2 SECCION 01			5,40	1,08			5,83
TRAMO 2 SECCION 02			6,80	0,90			6,12
TRAMO 2 SECCION 03			8,20	1,37			11,21
TRAMO 2 SECCION 04			5,00	1,82			9,08
TRAMO 2 SECCION 05			17,50	1,35			23,63
TRAMO 2 A 3 SECCION POZZO			3,80	2,08		1,13	6,79
TRAMO 3 SECCION 01			8,60	1,90			16,34
TRAMO 3 SECCION 02			7,50	2,45			18,38
TRAMO 3 SECCION 03			5,00	1,88			9,42
TRAMO 3 SECCION 04			2,60	1,85			4,81
TRAMO 3 SECCION LATERAL			2,40	0,69			1,65
TRAMO 3 A 4 SECCION POZZOS			4,00	3,50		2,26	11,74
TRAMO 4 SEGÚN PLANO			3,40	3,80			12,92








TOTAL	137,90

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A				
ITEM	1,17	DESCRIPCION	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA DESCU		
TRAMO 2 SECCION 01	5,40	1,08	0,12		1	0,70
TRAMO 2 SECCION 02	6,80	0,90	0,12		1	0,73
TRAMO 2 SECCION 03	8,20	1,37	0,12		1	1,34
TRAMO 2 SECCION 04	5,00	1,82	0,12		1	1,09
TRAMO 2 SECCION 05	17,50	1,35	0,12		1	2,84
TRAMO 2 A 3 SECCION POZZO	3,80	2,08	0,12	0,14	1	0,81
TRAMO 3 SECCION 01	8,60	1,90	0,12		1	1,96
TRAMO 3 SECCION 02	7,50	2,45	0,12		1	2,21
TRAMO 3 SECCION 03	5,00	1,88	0,12		1	1,13
TRAMO 3 SECCION 04	2,60	1,85	0,12		1	0,58
TRAMO 3 SECCION LATERAL	2,40	0,69	0,12		1	0,20
TRAMO 3 A 4 SECCION POZZOS	4,00	3,50	0,12	0,27	1	1,41
TRAMO 4 SEGÚN PLANO	3,40	3,80	0,12		1	1,55







TOTAL	16,55

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

ALCALDÍA DE **MIRAFLORES**

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A				
ITEM	1,18	DESCRIPCION	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	UND	M3-km

DETALLE	DIMENCIONES			N° ELEMENTOS	TOTAL
	VOLUMEN	KILOMETRO	COEFICIENTE		
SUMINISTRO DE MATERIAL SUELTO PARA BASE	16,55	3,30	1,30		71,00





TOTAL	71,00

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A						
ITEM	1,19	DESCRIPCION	DILATACIONES EN LADRILLO			UND	M
DETALLE		DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA		
TRAMO 2		37,85				1	37,85
TRAMO 3		36,95				1	36,95
TRAMO 4		13,60				1	13,60






TOTAL	88,40

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

ITEMS NO PREVISTOS CAP 02

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL							
ITEM	2,15	DESCRIPCION	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI				UND	M2
DETALLE			**DIMENCIONES**				**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**		
CARCAMO VILLA ISABEL			6,00	0,90				5,40



TOTAL	5,40

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL				
ITEM	2,16	DESCRIPCION	MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS	UND	M2

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA		
CARCAMO VILLA ISABEL LADO ALRGO D	5,56		0,35		1	1,95
CARCAMO VILLA ISABEL LADO LARGO I	5,56		0,25		1	1,39
CARCAMO VILLA ISABEL LADO CORTO D	0,51		0,35		1	0,18
CARCAMO VILLA ISABEL LADO CORTO I	0,51		0,25		1	0,13





TOTAL	3,64

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL				
ITEM	2,17	DESCRIPCION	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	UND	M2

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA		
CARCAMO VILLA ISABEL LADO ALRGO D	5,56		0,35		1	1,95
CARCAMO VILLA ISABEL LADO LARGO I	5,56		0,25		1	1,39
CARCAMO VILLA ISABEL LADO CORTO D	0,51		0,35		1	0,18
CARCAMO VILLA ISABEL LADO CORTO I	0,51		0,25		1	0,13





TOTAL	3,64

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL							
ITEM	2,18	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE TRAFICO PESADO				UND	UND
DETALLE			**DIMENCIONES**				**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**		
CARCAMO VILLA ISABEL							6	6,00









TOTAL	6,00

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO PLUVIAL VILLA ISABEL						
ITEM	2,19	DESCRIPCION	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)			UND	M2
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	
CARCAMO VILLA ISABEL			6,00	0,90			5,40





TOTAL	5,40

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

ITEMS NO PREVISTOS CAP 03

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,1	DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	UND	ML

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
TRAMO SANITARIO VILLA ISABEL	57,50				1	57,50
ACOMETIDA CAJA 1	4,70				1	4,70
ACOMETIDA CAJA 2	5,00				1	5,00
ACOMETIDA CAJA 3	5,00				1	5,00
ACOMETIDA CAJA 4	5,80				1	5,80
ACOMETIDA CAJA 5	6,00				1	6,00
ACOMETIDA CAJA 6	5,70				1	5,70
ACOMETIDA CAJA 7	3,90				1	3,90





TOTAL	93,60

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,3	DESCRIPCION	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)			UND	ML
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**PESO**	
TRAMO SANITARIO VILLA ISABEL			4,25				2	8,50







TOTAL	8,50

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,4	DESCRIPCION	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)			UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
TRAMO SANITARIO VILLA ISABEL	4,25	0,40	0,18		1	0,31





TOTAL	0,31

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,5	DESCRIPCION	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM			UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
TRAMO SANITARIO VILLA ISABEL	57,50	0,80	1,15		1	52,90
CARCAMO TRANSVERSAL	6,00	0,90	0,45		1	2,43
POZO DE INSPECCION	2,10	2,10	1,55		1	6,84
MOVIMIENTO DE PIEDRA Y ESCOMBRO ACCESO VIAL CORTE PARA REPLANTEO DE LA VIA	11,80	4,45	2,80		1	147,03











TOTAL	209,19

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,7	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"			UND	ML
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**PESO**	
RED PRINCIPAL SANITARIA			57,50				57,50







TOTAL	57,50

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR


ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,9	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	UND	ML

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
ACOMETIDA CAJA 1	4,70					4,70
ACOMETIDA CAJA 2	5,00					5,00
ACOMETIDA CAJA 3	5,00					5,00
ACOMETIDA CAJA 4	5,80					5,80
ACOMETIDA CAJA 5	6,00					6,00
ACOMETIDA CAJA 6	5,70					5,70
ACOMETIDA CAJA 7	3,90					3,90
ACOMETIDA CARMACO RECOLECTOR	0,60					0,60

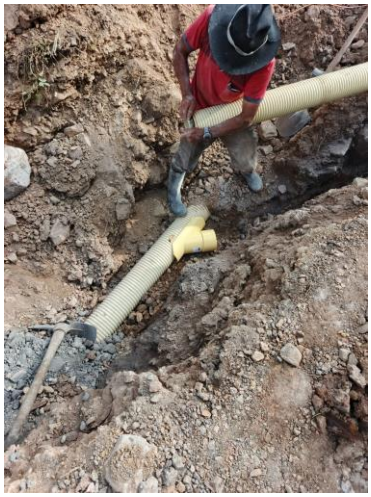





TOTAL	36,70

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,10	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE 200x160mm			UND	UND
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**PESO**	
ACOMETIDAS						6	6,00







TOTAL	6,00

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,12	DESCRIPCION	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOL POZO -		
ACOMETIDA CAJA 1	4,70	0,35	0,20		1	0,33
ACOMETIDA CAJA 2	5,00	0,35	0,30		1	0,53
ACOMETIDA CAJA 3	5,00	0,35	0,40		1	0,70
ACOMETIDA CAJA 4	5,80	0,35	0,50		1	1,02
ACOMETIDA CAJA 5	6,00	0,35	0,60		1	1,26
ACOMETIDA CAJA 6	5,70	0,35	0,70		1	1,40
ACOMETIDA CAJA 7	5,60	0,35	0,10		1	0,20
TUBERIA PRINCIPAL DE 8"	57,30	0,80	0,60		1	27,50
RELLENO DE POZO	2,20	2,20	1,35	1,53	1	5,00







TOTAL	37,93

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,13	DESCRIPCION	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	UND	M3-km

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	VOLUMEN	KILOMETRO	ALTO	PESO ESPECIFICO		
AFIRMADO	37,93	4,20		1,3		207,10
GRAVILLA	24,84	4,20		1,7		177,36






TOTAL	384,46

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,15	DESCRIPCION	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS			UND	M3
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTOS**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**PESO**	
RED PRINCIPAL TUBERIA DE 8"			4,25	0,40	0,18		1	0,31







TOTAL	0,31

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,18	DESCRIPCION	CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	UND

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENT(	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
CAJAS DE INSPECCION DE LOS 7 LOTES SEGÚN PLANO DE SUBDIVISION ALCALDIA					7	7,00








TOTAL	7,00

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,19	DESCRIPCION	POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M			UND	UND
DETALLE		DIMENCIONES				N° ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
RED PRINCIPAL						1	1,00











TOTAL	1,00

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,20	DESCRIPCION	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLU TUBO -		
ACOMETIDA CAJA 1	4,70	0,35	0,40	0,09	1	0,57
ACOMETIDA CAJA 2	5,00	0,35	0,40	0,09	1	0,61
ACOMETIDA CAJA 3	5,00	0,35	0,40	0,09	1	0,61
ACOMETIDA CAJA 4	5,80	0,35	0,40	0,11	1	0,70
ACOMETIDA CAJA 5	6,00	0,35	0,40	0,11	1	0,73
ACOMETIDA CAJA 6	5,70	0,35	0,40	0,11	1	0,69
ACOMETIDA CAJA 7	5,60	0,35	0,40	0,11	1	0,67
TUBERIA PRINCIPAL DE 8"	57,30	0,70	0,55	1,8	1	20,26









TOTAL	24,84

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,21	DESCRIPCION	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI			UND	M2
DETALLE			**DIMENCIONES**			**N° ELEMENTO**	**TOTAL**
			LONGITUD	**ANCHO**	**ALTO**	**PESO**	
POZO DE INSPECCION			1,80	1,80			3,24







TOTAL	3,24

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL						
ITEM	3,22	DESCRIPCION	BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI			UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENT(	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
POZO DE INSPECCION	1,20	1,20	0,18		1	0,26
CAJAS DE INSPECCION	0,80	0,80	0,07		7	0,31







TOTAL	0,57

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,23	DESCRIPCION	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTO	TOTAL
	VOLUMEN	ANCHO	ALTO	PESO		
TRAMO SANITARIO VILLA ISABEL	55,20			1,8		99,36
CARCAMO TRANSVERSAL	3,30			1,8		5,94
POZO DE INSPECCION	7,50			1,8		13,50
MOVIMIENTO DE PIEDRA Y ESCOMBRO ACCESO VIAL CORTE PARA REPLANTEO DE LA VIA	147,03			1,8		264,65
ACOMETIDAS Y CAJAS DE INSPECCION	15,82			1,8		28,47











TOTAL	411,92

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

MUNICIPIO DE MIRAFLORES-BOYACA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA (PAGO FINAL)

CAPITULO	ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA ISABEL				
ITEM	3,24	DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UND	M3

DETALLE	DIMENCIONES				N° ELEMENTOS	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO		
ACOMETIDA CAJA 1	4,70	0,35	0,60		1	0,99
ACOMETIDA CAJA 2	5,00	0,35	0,70		1	1,23
ACOMETIDA CAJA 3	5,00	0,35	0,80		1	1,40
ACOMETIDA CAJA 4	5,80	0,35	0,90		1	1,83
ACOMETIDA CAJA 5	6,00	0,35	1,00		1	2,10
ACOMETIDA CAJA 6	5,70	0,35	1,10		1	2,19
ACOMETIDA CAJA 7	5,60	0,35	0,50		1	0,98
CAJAS DE INSPECCION	0,80	0,80	0,80		7	3,58








TOTAL	14,30

UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
RL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CONTRATISTA

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ING VICTOR AVILA
APOYO PROFESIONAL SECRETARIA DE PLANEACION
APOYO A LA SUPERVICION

ANEXO 2

SABANA DE OBRA FINAL

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

ANEXO 3

FACTURA DE VENTA

RUT CONTRATISTA

CERTIFICACION BANCARIA

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL ALMIR 2024
NIT 901.890.919-9
CR 12 2 15
Tel: (601) 3108671851
Miraflores - Colombia
g2.riveraconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ALC 2

Señores	MUNICIPIO DE MIRAFLORES		
NIT	800.029.660-1	**Teléfono**	(608) 7331390 - Ext. 000
Dirección	CALLE 4 No 7 - 42	**Ciudad**	Miraflores - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2025, 11:28
Expedición	15/02/2025, 11:28
Vencimiento	15/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES7 Y 7A, Y ALCANTARILLAD	1.00	73,705,522.35

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y cinco millones ochocientos diecisiete mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 95,817,179.06

Total Bruto	73,705,522.35
Administración 22.00%	16,215,214.92
Imprevistos 3.00%	2,211,165.67
Utilidad 5.00%	3,685,276.12
Total a Pagar	95,817,179.06

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085709797 aprobado en 20241218 prefijo ALC desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 8b36ed6076ed7ff3450e5f43ffe47728ede832f777b602bf30b8b30ebeaa2afd6c10ab0dcc13cf22001c0fa0f12a416c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BANCO DAVIVIENDA SA

CERTIFICA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **UNION TEMPORAL AL-MIR 2024** identificada con Nit **901890919-9**, posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número:	1768 0007 9483
Fecha de apertura:	26 12 2024

La presente certificación se expide a solicitud del cliente el día 26 de Diciembre del 2024.

Cordialmente,

DAVIVIENDA
1768 - OFICINA MIRAFLORES

FIRMA AUTORIZADA
BANCO DAVIVIENDA S.A

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141144321521

(415)7707212489984(8020) 000014114432152 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 0 9 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: UNION TEMPORAL AL-MIR 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Miraflores 4 5 5

41. Dirección principal: CR 12 2 15

42. Correo electrónico: g2.riveraconstrucciones@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 6 7 1 8 5 1	3 1 0 2 1 3 2 5 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 2 4 1 0 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 11 - 20 / 15 : 27: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RIVERA BALLESTEROS GONZALO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144321521

(415)7707212489984(8020) **000014114432152 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 0 9 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144321521

(415)7707212489984(8020) **000014114432152 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 0 9 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 1 5 2 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIVERA	BALLESTEROS	GONZALO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 8 8 4 9 5 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	QUINTERO	MARIA	CRISTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144321521

(415)7707212489984(8020) **000014114432152 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 0 0 9 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 4 9 6 1 5 2 2 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RIVERA	BALLESTEROS	GONZALO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 5	2 0 2 4 1 0 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 2 3 0 0 2	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 5	2 0 2 4 1 0 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ANEXO 4

SEGURIDAD SOCIAL

PARAFISCALES

Dirección de Oficina: Cra 12 No 2-15 Miraflores Boyacá
E- mail: g2.riveraconstrucciones@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 – 310 213 2557

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024	CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MIRAFLORES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	23/12/2024	82866019	$351.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.700	0		0		0	18	300	0	22.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	32.500	0		0		0	18	400	0	32.900	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	54.200	0		0		0	18	700	0	54.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	41.600	0	0	0	0	18	500	0	42.100	1
231001	Colfondos	800227940-6	69.400	0	0	0	0	18	900	0	70.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	27.800	0	0	0	0	18	400	0	28.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	21.300				21.300	18	300	21.600			213	21.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	34.800	18	500	35.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
17.400	18	300	17.700	3
ICBF				
26.200	18	400	26.600	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	108.400	109.800
Pensión	3	138.800	140.600
Riesgos Laborales	1	21.300	21.600
CCF	1	34.800	35.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	26.200	26.600
MEN	0	0	0
SENA	1	17.400	17.700
TOTALES	10	346.900	351.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024		CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MIRAFLORES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	23/12/2024	82866019	$351.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002732928	SANABRIA SANABRIA OSCAR IVAN	1	0			N	X																230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	32.500	14-4	260.000	3	6.400	CCF10	260.000	10.400	260.000	5.200	7.800	0	0
2	CC	1048848711	RIVERA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			N	X																231001	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	54.200	14-4	433.334	3	10.600	CCF10	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
3	CC	7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	1	0			N	X																25-14	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS005	173.334	21.700	14-4	173.334	3	4.300	CCF10	173.334	7.000	173.334	3.500	5.300	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024	CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MIRAFLORES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	20/02/2025	84321879	$1.023.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	35.600	0		0		0	14	400	0	36.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	142.400	0		0		0	14	1.400	0	143.800	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	124.600	0		0		0	14	1.200	0	125.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	114.000	0	0	0	0	14	1.100	0	115.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	113.900	0	0	0	0	14	1.100	0	115.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	113.900	0	0	0	0	14	1.100	0	115.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	45.600	0	0	0	0	14	500	0	46.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	105.400				105.400	14	1.000	106.400			1.054	106.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	96.900	14	1.000	97.900	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
48.600	14	500	49.100	5
ICBF				
72.900	14	700	73.600	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	302.600	305.600
Pensión	4	387.400	391.200
Riesgos Laborales	1	105.400	106.400
CCF	1	96.900	97.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	72.900	73.600
MEN	0	0	0
SENA	1	48.600	49.100
TOTALES	11	1.013.800	1.023.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024		CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MIRAFLORES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	20/02/2025	84321879	$1.023.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002732928	SANABRIA SANABRIA OSCAR IVAN	1	0			N	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	89.000	14-4	711.750	4	31.000	CCF10	711.750	28.500	711.750	14.300	21.400	0	0
2	CC	1048848711	RIVERA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			N	X																231001	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	89.000	14-4	711.750	4	31.000	CCF10	711.750	28.500	711.750	14.300	21.400	0	0
3	CC	1057410351	BARRETO BARRETO HECTOR MAURICIO	1	0			N	X																230201	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS041	284.700	35.600	14-4	284.700	4	12.400	CCF10	284.700	11.400	284.700	5.700	8.600	0	0
4	CC	7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	1	0			N	X																25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS005	284.700	35.600	14-4	284.700	4	12.400	CCF10	284.700	11.400	284.700	5.700	8.600	0	0
5	CC	74346468	ALFONSO ALFONSO LIRIO MANUEL	1	0			N	X																230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS037	427.050	53.400	14-4	427.050	4	18.600	CCF10	427.050	17.100	427.050	8.600	12.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024	CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MIRAFLORES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	23/12/2024	82866602	$1.281.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	48.800	0		0		0	0	0	0	48.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	135.500	0		0		0	0	0	0	135.500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	216.700	0		0		0	0	0	0	216.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	138.800	0	0	0	0	0	0		138.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	104.000	0	0	0	0	0	0		104.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	62.400	0	0	0	0	0	0		62.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	78.400				78.400	0	0	78.400			784	78.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	128.400	0	0	128.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
64.200	0	0	64.200	5
ICBF				
96.400	0	0	96.400	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	401.000	401.000
Pensión	4	513.200	513.200
Riesgos Laborales	1	78.400	78.400
CCF	1	128.400	128.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	96.400	96.400
MEN	0	0	0
SENA	1	64.200	64.200
TOTALES	11	1.281.600	1.281.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024		CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MIRAFLORES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	23/12/2024	82866602	$1.281.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002732928	SANABRIA SANABRIA OSCAR IVAN	1	0			N		X															230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS037	650.000	81.300	14-4	650.000	3	15.900	CCF10	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
2	CC	1048848711	RIVERA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			N		X															231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
3	CC	1057410351	BARRETO BARRETO HECTOR MAURICIO	1	0			N		X															230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	54.200	14-4	433.334	3	10.600	CCF10	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
4	CC	7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	1	0			N		X															25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS005	390.000	48.800	14-4	390.000	3	9.600	CCF10	390.000	15.600	390.000	7.800	11.700	0	0
5	CC	74346468	ALFONSO ALFONSO LIRIO MANUEL	1	0			N		X															230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS037	433.334	54.200	14-4	433.334	3	10.600	CCF10	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024	CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MIRAFLORES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	20/02/2025	84322007	$656.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	29.700	0		0		0	0	0	0	29.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	106.900	0		0		0	0	0	0	106.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	59.400	0		0		0	0	0	0	59.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	60.800	0	0	0	0	0	0		60.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	76.000	0	0	0	0	0	0		76.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	76.000	0	0	0	0	0	0		76.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	38.000	0	0	0	0	0	0		38.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	68.400				68.400	0	0	68.400			684	68.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	62.700	0	0	62.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
31.400	0	0	31.400	4
ICBF				
47.200	0	0	47.200	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	196.000	196.000
Pensión	4	250.800	250.800
Riesgos Laborales	1	68.400	68.400
CCF	1	62.700	62.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	47.200	47.200
MEN	0	0	0
SENA	1	31.400	31.400
TOTALES	11	656.500	656.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901890919-9	UNION TEMPORAL AL MIR 2024		CARRERA 12 N 2 - 15	7500208	g2.riveraconstrucciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MIRAFLORES	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	20/02/2025	84322007	$656.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002732928	SANABRIA SANABRIA OSCAR IVAN	1	0			N		X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	59.400	14-4	474.500	4	20.700	CCF10	474.500	19.000	474.500	9.500	14.300	0	0
2	CC	1048848711	RIVERA ZAMUDIO DIEGO FERNANDO	1	0			N		X															231001	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS041	474.500	59.400	14-4	474.500	4	20.700	CCF10	474.500	19.000	474.500	9.500	14.300	0	0
3	CC	7173489	MORENO ROJAS RAFAEL EDUARDO	1	0			N		X															25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS005	237.250	29.700	14-4	237.250	4	10.400	CCF10	237.250	9.500	237.250	4.800	7.200	0	0
4	CC	74346468	ALFONSO ALFONSO LIRIO MANUEL	1	0			N		X															230201	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS037	379.600	47.500	14-4	379.600	4	16.600	CCF10	379.600	15.200	379.600	7.600	11.400	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	**TUNJA**	**39**	**39-44-101166843**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	**02**	**2025**	**21**	**11**	**2024**	**00:00**	**17**	**02**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNION TEMPORAL AL-MIR 2024	**NIT: 901.890.919-9**	CR 12 NRO. 2 - 15	MIRAFLORES, BOYACA	3108671851

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MUNICIPIO DE MIRAFLORES	**NIT: 800.029.660-1**	CALLE 4 N 7 42	MIRAFLORES, BOYACA	7330237

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 247 de 2024, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**21/11/2024**	**08/07/2025**	**$64,074,062.40**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**21/11/2024**	**05/03/2028**	**$32,037,031.20**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**21/11/2024**	**08/07/2025**	**$64,074,062.40**	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**17/02/2025**	**17/02/2030**	**$32,037,031.20**	**$32,037,031.20**

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 17/02/2025 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******192,222,187.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NINY JOHANNA DIAZ AGUDELO	174053	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101166843

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101166843	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	02	2025	21	11	2024	00:00	17	02	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL AL-MIR 2024		**NIT: 901.890.919-9**
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 2 - 15	**CIUDAD:** MIRAFLORES, BOYACA	**TELÉFONO:**	3108671851

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE MIRAFLORES		**NIT: 800.029.660-1**
DIRECCIÓN: CALLE 4 N 7 42	**CIUDAD:** MIRAFLORES, BOYACA	**TELÉFONO:**	7330237

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
RIVERA BALLESTEROS GONZALO	1049615222	85.00
MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S	901823002-5	15.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101166843

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ALEXANDRASAENZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social UNION TEMPORAL AL - MIR identificado con el NIT 901890919 por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CONTRATO DE OBRA No 247 DE 2024	REHABILITAC ALCANTARILL MIRAFLORES	MIRAFLORES	863,000	2025-01	24-FEB-2025	134583398
		Total	863,000			

Expedido por el SENA, a los venticuatro (24) dias del mes de Febrero de 202**5**

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-02-24

Generado por : Leidy JazmÃn Diaz Melo

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3440768115 - 324108

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efecto la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.


4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa UNION TEMPORAL AL - MIR 2024 con nit 901890919 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
23/12/2024	82866019	3	129,600	202411	129,600	$3,900,000	$3,900,000
23/12/2024	82866602	5	128,400	202412	128,400	$3,206,000	$3,206,000
TOTALES:			$ 258,000		$ 258,000	$7,106,000	$ 7,106,000

FECHA DE EXPEDICION: 24/02/2025

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | versión 2 | 13/09/2018
certificación de aportes 2024 Afil.:05438 NIT:901890919
