MUNICIPIO DE SANTA ROSA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
¡Hagamos Una Mejor Historia!



INFORME DE OBRA CONTRATO ADICIONAL

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 00-15 DE 2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC 00-07 DE 2024: " CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR"

PERIODO: 02 DE DICIEMBRE de 2024 – 17 DE DICIEMBRE de 2024

CINCO - II Ingeniería S.A.S.
Cra 85 #26 A - 38
Cartagena-Bolívar

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION. 3
2. CONTRATO DE OBRA CIVIL. 4
2.1. Contrato De Obra Civil. 5
2.2. Presentación. 6
3. OBJETIVOS 7
3.1. Objetivo General. 7
3.2. Objetivos Específicos. 7
4. ALCANCE 8
5. LOCALIZACIÓN 9
5.1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 9
6. ACTIVIDADES REALIZADAS 10
7. CONTROL DE OBRA. 11
7.1. Observaciones Del Contratista. 11
7.2. Resumen Del Contrato No. CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 00-15 DE 2024 Derivado Del Proceso SAMC 00-07 DE 2024 11
7.3. Avance De La Obra. 11
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

1. INTRODUCCION.

El presente informe de Obra CONTRATO ADICIONAL contiene la relación y rendición de cuentas de las actividades realizadas por la empresa CINCO II – INGENIERIA S.A.S en desarrollo del contrato adicional de obra que tiene por objeto: **“CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR”**

La Supervisión para este contrato está siendo ejecuta por la Secretaria de Planeación e Infraestructura **BERTHA LOMBANA TUÑON**, quien hizo el seguimiento permanente a cada una de las actividades desarrolladas en el periodo 02 DE DICIEMBRE de 2024 a 17 DE DICIEMBRE de 2024 por el contratista.

2. CONTRATO DE OBRA CIVIL.

En el presente informe muestran las principales acciones que se han llevado a cabo en este contrato.

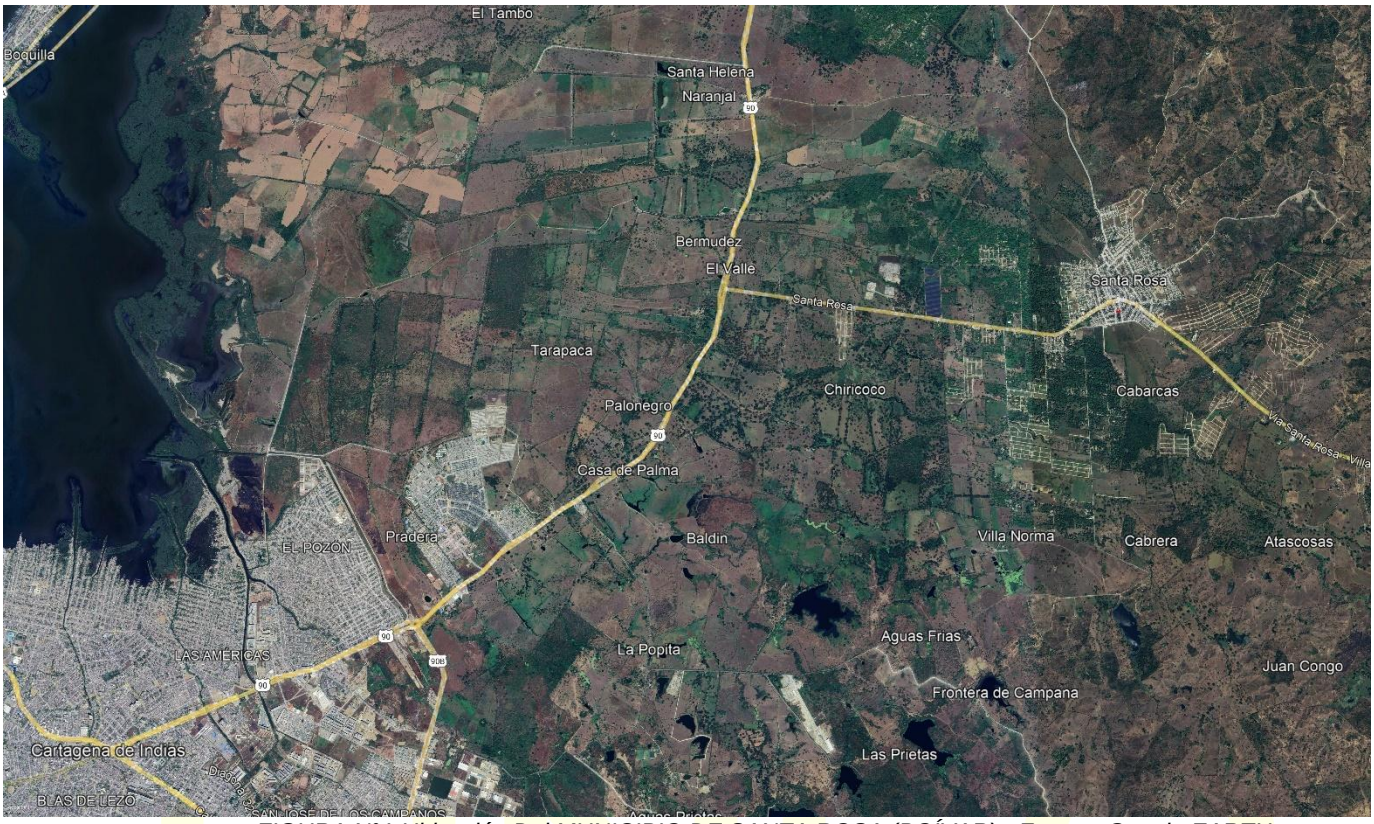


FIGURA N°1 Ubicación Del MUNICIPIO DE SANTA ROSA (BOÍVAR) - Fuente: Google EARTH

2.1. Contrato De Obra Civil.

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 00-15 DE 2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC 00-07 DE 2024
FECHA DE CELEBRACION	VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2024
CLASE O TIPOLOGIA	OBRA CIVIL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CINCO II – INGENIERIA S.A.S
NIT	901.562.621 – 3
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ENRIQUE VALDELAMAR MARTINEZ
CC	1.143.401.188
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR
LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO SANTA ROSA, BOLÍVAR.
SUPERVISOR:	BERTHA LOMBANA TUÑON
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	2195 – 2196
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	2968
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DOS (02) DE DICIEMBRE de 2024
N° DE POLIZA CUMPLIMIENTO	CRC-100020525
FECHA DE EXPEDICION POLIZA	VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2024
N° DE POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CRC-100006459
FECHA DE EXPEDICION POLIZA	VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será DOS (02) MESES, Contados A Partir Del Acta De Inicio
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 363.681.132,00)
VALOR ADICIONAL	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 180.000.000,00),
VALOR TOTAL	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 543.681.132,00)
FECHA DE INICIO	02 DE OCTUBRE de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2024

A continuación, se describen los hechos destacados en el desarrollo de este contrato en ejecución:

2.2. Presentación.

Uno de los pilares para la gestión pública es la contratación estatal, además de la existencia de una partida presupuestal, es menester la celebración de un contrato de obra pública que garantice la escogencia de un buen contratista, capaz de prestar el servicio para el cual es contratado y servir a los fines del estado, para este caso a través de la entidad municipal se selecciona la empresa **CINCO II – INGENIERIA S.A.S**, que ha demostrado a través de su larga trayectoria la capacidad para satisfacer una necesidad establecidas a través de los diferentes estudios que dieron origen a este proceso y que se materializa con la firma del contrato entre dicha persona jurídica y el municipio de Santa Rosa.

Con este mejoramiento a la infraestructura de la estación de policía se fortalecerá la seguridad en el municipio de **Santa Rosa** el Contrato de Obra Pública N° **CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 00-15 DE 2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC 00-07 DE 2024** con la empresa **CINCO II – INGENIERIA S.A.S** el cual tiene como objeto el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR** El presente documento contiene el INFORME DE OBRA CONTRATO ADICIONAL. Conforme con lo establecido en la Cláusulas del contrato.

3. OBJETIVOS.

3.1. Objetivo General.

Rendir cuentas al municipio de Santa Rosa, Bolívar, a través de Informe de obras de acuerdo a lo establecido en la Cláusulas del Contrato de Obra Pública N° **CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 00-15 DE 2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC 00-07 DE 2024** el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA NORTE, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**

3.2. Objetivos Específicos.

- Describir las condiciones encontradas en el sitio de la obra.
- Describir las actividades realizadas por el Contratista en el periodo comprendido entre la fecha 02 DE DICIEMBRE de 2024 y 17 DE DICIEMBRE de 2024.
- Mostrar y hacer entrega al Supervisor de las obras ejecutadas

4. ALCANCE

El alcance de este proyecto incluye la ejecución de trabajos relacionados con el suministro e instalación de malla electrosoldada de 6 mm, la perfilación y nivelación del terreno, y rellenos con materiales granulares y seleccionados compactados al 95% según el Proctor Modificado. Además, se realizarán excavaciones con maquinaria, transporte de materiales provenientes de estas excavaciones y el descapote con retiro de material. Como parte de las obras en concreto, se ejecutarán placas de 3,000 psi con aditivos especiales, incluyendo corte y sellado de juntas, y la aplicación de pintura de tráfico alto para pisos exteriores. Todas las actividades serán realizadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas, garantizando calidad y cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

Todo lo presentado en este informe fue posible gracias al uso del personal calificado para dichos fines, quienes siguiendo las especificaciones técnicas y orientados por los profesionales idóneos, llevan y llevaran a cabo la MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO de estos espacios, también al aporte comunitario con la disposición a realizar las respectivas sugerencias a que hubiese lugar para el normal desarrollo de la obra.

5. LOCALIZACIÓN

5.1. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR

El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Santa Rosa, en el departamento de Bolívar, en la ubicación mostrada a continuación, ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA (10°26'29.06"N, 75°22'29.13"O).

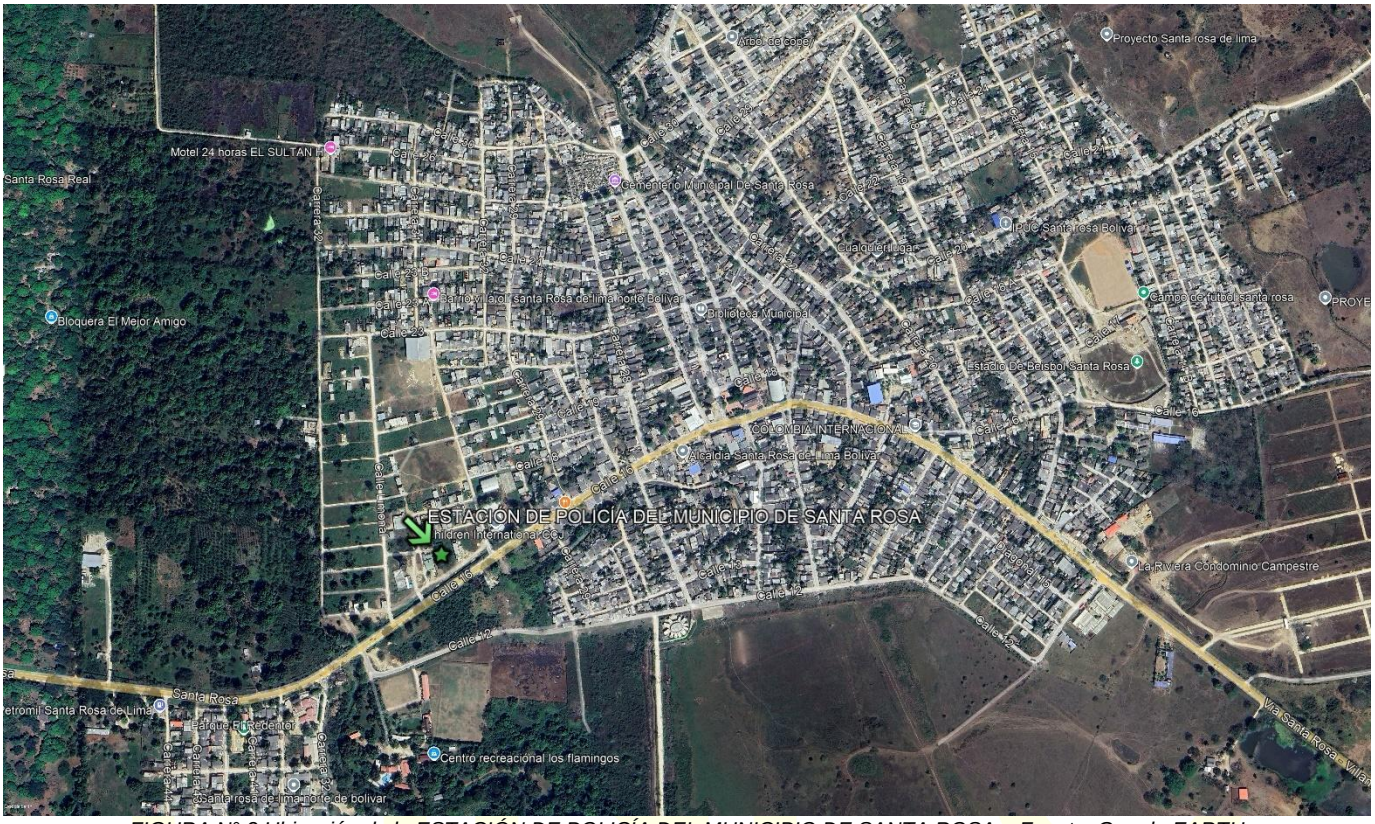


FIGURA N° 2 Ubicación de la ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA – Fuente: Google EARTH

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el periodo comprendido entre el 02 DE DICIEMBRE de 2024 y 17 DE DICIEMBRE de 2024 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
4	**PISOS Y ENCHAPES**		
4.8	Suministrar e instalar malla electrosoldada de 6 mm	KG	1329,55
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**		
NP1	PERFILACION Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	667,04
NP2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO - SUBBASE TIPO C ESPESOR	M3	100,06
NP3	RELLENO EN MATERIAL EN MODALIDAD DE SELECCIONADOS SEGÚN INVIAS COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO	M3	100,06
NP5	EXCAVACIONES CON MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	200,11
NP6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES	M3	200,11
NP7	Placas en concreto de 3,000 psi, con aditivo impermeabilizante y acelerado a 8 días e=0,1 m (Incluye corte y sellado de junta)	M2	377,71
NP8	Descapote (Incluye retiro de material)	M2	667,03
NP9	Pintura Trafico Alto para Pisos exterioress	M2	377,71

7. CONTROL DE OBRA.

7.1. Observaciones Del Contratista.


En este periodo comprendido entre el 02 DE DICIEMBRE de 2024 y 17 DE DICIEMBRE de 2024 cabe anotar, que se presentaron lluvias, pero a una adecuada planeación y estar en un espacio cerrado se pudieron ejecutar las actividades con normalidad.

7.2. Resumen Del Contrato No. CONTRATO DE OBRA CIVIL Nº 00-15 DE 2024 Derivado Del Proceso SAMC 00-07 DE 2024

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS	%
VALOR CONTRATO	$ 363.681.132,00		0
ANTICIPO	$ 145.472.452,80		40,00
ADICIONAL	$ 180.000.000,0		0
ACTA PARCIAL Nº 1		$ 129.071.169,32	23,74
ACTA PARCIAL N° 2		$ 234.609.962,68	43,15
ACTA CONTRATO ADICIONAL		$ 180.000.000,0	33,11
TOTAL, FACTURACION		**$ 543.681.132,00**	100
SALDO POR FACTURAR			
SUMAS IGUALES	**$ 543.681.132,00**	**$ 543.681.132,00**	**100**

7.3. Avance De La Obra.

El avance general de la obra a la fecha es de **100%**, lo cual corresponde a **$ 543.681.132,00** de los cuales a la fecha se presentó facturar por valor **$ 180.000.000,0** a la fecha de este informe.



DAVID VALDELAMAR MARTINEZ
CINCO II – INGENIERIA S.A.S
Representante Legal

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CINCO - II Ingeniería S.A.S.
Cra 85 #26 A - 38
Cartagena-Bolívar



CINCO - II Ingeniería S.A.S.
Cra 85 #26 A - 38
Cartagena-Bolívar






CINCO - II Ingeniería S.A.S.

Cra 85 #26 A - 38

Cartagena-Bolívar

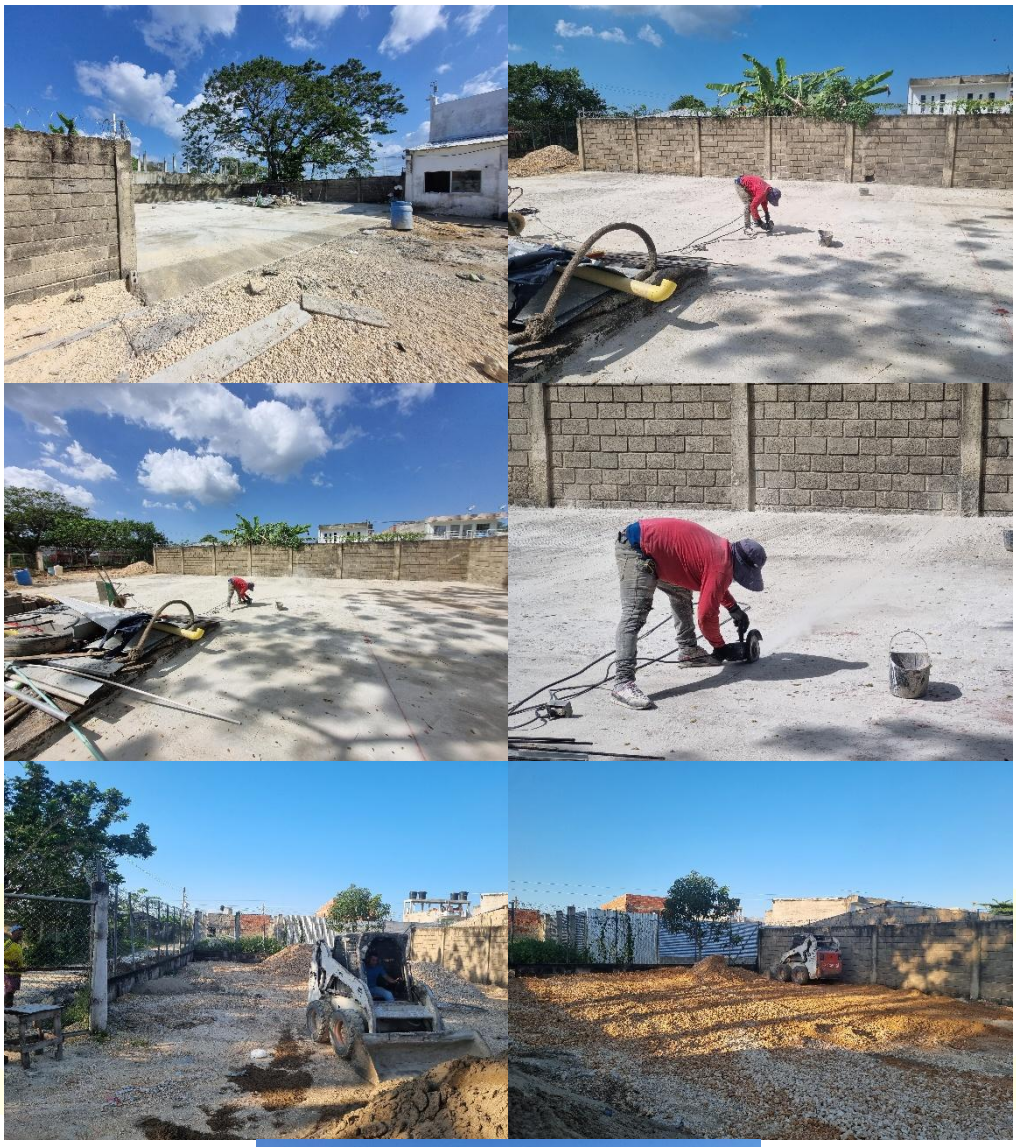

CINCO - II Ingeniería S.A.S.
Cra 85 #26 A - 38
Cartagena-Bolívar

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
4	**PISOS Y ENCHAPES**		
4.8	Suministrar e instalar malla electrosoldada de 6 mm	KG	1329,55
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**		
NP1	PERFILACION Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	667,04
NP2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO - SUBBASE TIPO C ESPESOR	M3	100,06
NP3	RELLENO EN MATERIAL EN MODALIDAD DE SELECCIONADOS SEGÚN INVIAS COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO	M3	100,06
NP4	RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO CON CAL	M3	0,00
NP5	EXCAVACIONES CON MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	200,11
NP6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES	M3	200,11
NP7	Placas en concreto de 3,000 psi, con aditivo impermeabilizante y acelerado a 8 días e=0,1 m (Incluye corte y sellado de junta)	M2	377,71
NP8	Descapote (Incluye retiro de material)	M2	667,03
NP9	Pintura Trafico Alto para Pisos exterioress	M2	377,71

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

MEMORIA DE CANTIDADES - CONTRATO ADICIONAL

4.8	Suministrar e instalar malla electrosoldada de 6 mm									*KG*
Descripción		**DIMENSIONES**					**Masa (Kg/M2)**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Menos (M2)**	**Parcial (M2)**			
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36	334,01	3,52	1,00	1175,72
Rampa		1,00	10,10	10,10		10,10	3,52	1,00	35,55
Callejon		0,95	10,13	9,62		9,62	3,52	1,00	33,87
Pasillo		1,92	10,30	19,78		19,78	3,52	1,00	69,63
		1,20	2,00	2,40		2,40	3,52	1,00	8,45
		1,00	1,80	1,80		1,80	3,52	1,00	6,34
Total									**1329,55**

NP1	PERFILACION Y NIVELACION DEL TERRENO								*M2*
Descripción		**DIMENSIONES**					**Sub Total**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Menos (M2)**				
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36		334,01	1,00	334,01
Rampa		1,00	10,10	10,10			10,10	1,00	10,10
Pasillo		1,92	10,30	19,78			19,78	1,00	19,78
		1,20	2,00	2,40			2,40	1,00	2,40
		1,00	1,80	1,80			1,80	1,00	1,80
Entrada		10,10	11,85	119,69			119,69	1,00	119,69
Patio Izquierdo		13,95	12,85	179,26			179,26	1,00	179,26
Total									**667,04**

NP2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO - SUBBASE TIPO C ESPESOR								*M3*
Descripción		**DIMENSIONES**					**Volumen (M3)**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Menos (M2)**	**Espesor (M)**			
Ubicación		**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36	0,15	50,10	1,00	50,10
Rampa		1,00	10,10	10,10		0,15	1,52	1,00	1,52
Pasillo		1,92	10,30	19,78		0,15	2,97	1,00	2,97
		1,20	2,00	2,40		0,15	0,36	1,00	0,36
		1,00	1,80	1,80		0,15	0,27	1,00	0,27
Entrada		10,10	11,85	119,69		0,15	17,95	1,00	17,95
Patio Izquierdo		13,95	12,85	179,26		0,15	26,89	1,00	26,89
Total									**100,06**

NP3	RELLENO EN MATERIAL EN MODALIDAD DE SELECCIONADOS SEGÚN INVIAS COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO								*M3*
Descripción		**DIMENSIONES**					**Volumen (M3)**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Menos (M2)**	**Espesor (M)**			
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36	0,15	50,10	1,00	50,10
Rampa		1,00	10,10	10,10		0,15	1,52	1,00	1,52
Pasillo		1,92	10,30	19,78		0,15	2,97	1,00	2,97
		1,20	2,00	2,40		0,15	0,36	1,00	0,36
		1,00	1,80	1,80		0,15	0,27	1,00	0,27
Entrada		10,10	11,85	119,69		0,15	17,95	1,00	17,95
Patio Izquierdo		13,95	12,85	179,26		0,15	26,89	1,00	26,89
Total									**100,06**

NP5	EXCAVACIONES CON MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES								*M3*
Descripción		**DIMENSIONES**					**Volumen (M3)**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Menos (M2)**	**Espesor (M)**			
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36	0,30	100,20	1,00	100,20
Rampa		1,00	10,10	10,10		0,30	3,03	1,00	3,03
Pasillo		1,92	10,30	19,78		0,30	5,93	1,00	5,93
		1,20	2,00	2,40		0,30	0,72	1,00	0,72
		1,00	1,80	1,80		0,30	0,54	1,00	0,54
Entrada		10,10	11,85	119,69		0,30	35,91	1,00	35,91
Patio Izquierdo		13,95	12,85	179,26		0,30	53,78	1,00	53,78
Total									**200,11**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

MEMORIA DE CANTIDADES - CONTRATO ADICIONAL

NP6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES								***M3***
Descripción		**DIMENSIONES**					**Sub Total**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Altura (M)**	**Volumen (M3)**			
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36	0,30	100,20	1,00	100,20
Rampa		1,00	10,10	10,10		0,30	3,03	1,00	3,03
Pasillo		1,92	10,30	19,78		0,30	5,93	1,00	5,93
		1,20	2,00	2,40		0,30	0,72	1,00	0,72
		1,00	1,80	1,80		0,30	0,54	1,00	0,54
Entrada		10,10	11,85	119,69		0,30	35,91	1,00	35,91
Patio Izquierdo		13,95	12,85	179,26		0,30	53,78	1,00	53,78
Total									**200,11**

NP7	Placas en concreto de 3,000 psi, con aditivo impermeabilizante y acelerado a 8 días e=0,1 m (Incluye corte y sellado de junta)							***M2***
Descripción		**DIMENSIONES**					**Parcial**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Menos (M2)**				
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36		334,01	1,00	334,01
Rampa		1,00	10,10	10,10			10,10	1,00	10,10
Callejon		0,95	10,13	9,62			9,62	1,00	9,62
Pasillo		1,92	10,30	19,78			19,78	1,00	19,78
		1,20	2,00	2,40			2,40	1,00	2,40
		1,00	1,80	1,80			1,80	1,00	1,80
Total									**377,71**

NP8	Descapote (Incluye retiro de material)								***M2***
Descripción		**DIMENSIONES**					**Sub Total**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Altura (M)**	**Volumen (M3)**			
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36		334,01	1,00	334,01
Rampa		1,00	10,10	10,10			10,10	1,00	10,10
Pasillo		1,92	10,30	19,78			19,78	1,00	19,78
		1,20	2,00	2,40			2,40	1,00	2,40
		1,00	1,80	1,80			1,80	1,00	1,80
Entrada		10,10	11,85	119,69			119,69	1,00	119,69
Patio Izquierdo		13,95	12,85	179,26			179,26	1,00	179,26
Total									**667,03**

NP9	Pintura Trafico Alto para Pisos exterioress								***M2***
Descripción		**DIMENSIONES**					**Sub Total**	**Cantidad**	**Total**
		Sección		**Area (M2)**	**Altura (M)**	**Volumen (M3)**			
Ubicación	**Detalles**	**Dim 1 (M)**	**Dim 2 (M)**						
Alberca		16,70	21,10	352,37	18,36		334,01	1,00	334,01
Rampa		1,00	10,10	10,10			10,10	1,00	10,10
Callejon		0,95	10,13	9,62			9,62	1,00	9,62
Pasillo		1,92	10,30	19,78			19,78	1,00	19,78
		1,20	2,00	2,40			2,40	1,00	2,40
		1,00	1,80	1,80			1,80	1,00	1,80
Total									**377,71**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 363.681.132,00	**FECHA CONTRATO:**	24 de septiembre de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE SANTA ROSA BOLIVAR	**VALOR ADICIONAL:**	$ 180.000.000	**PLAZO TOTAL:**	Dos (02) Meses Y Quince (15) Dias
CONTRATISTA:	CINCO – II INGENIERIA SAS	**NUEVO VALOR CONTRATO:**	$ 543.681.132	**FECHA TERMINACION NUEVO CONTRATO:**	17 de diciembre de 2024
SUPERVISOR DE LA OBRA:	BERTHA LOMBANA TUÑON	**FECHA INICIO CONTRATO:**	2 de octubre de 2024	**FECHA ACTA:**	17 de diciembre de 2024

A los diesiciete (17) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **DAVID ENRRIQUE VALDELAMAR MARTINEZ**, Representante Legal de **CINCO – II INGENIERIA SAS**, en su calidad de Contratista de Obra, **BERTHA LOMBANA TUÑON** como Supervisor de la Obra, con el objeto de suscribir el **ACTA PARCIAL FINAL**, debido a las cantidades ejecutadas:

CONDICIONES BALANCE DE OBRA No 2						Acta Parcial N°1		Acta Parcial N°2		Acta Final		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**				**$ 10.635.992,61**		**$ 4.146.242,94**		**$ 6.489.749,67**				**$ -**
1.1	Demoler Muros Existentes. Incluye retiro de escombros.	M2	11,77	$ 14.376	$ 169.234,27		$ -	11,77	$ 169.234			-	$ -
1.3	Desmontar cubiertas (Retiro de sobrantes)	M2	236,08	$ 20.013	$ 4.724.709,07		$ -	236,08	$ 4.724.709			-	$ -
1.5	Desmontar caretas de protección en las puertas (Inc. Retiro)	UN	1,00	$ 38.759	$ 38.759,00		$ -	1,00	$ 38.759			-	$ -
1.6	Desmontar de careta de protección	M2	-	$ 19.380	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
1.7	Desmontar luminarias y Abanicos (inc. Retiro)	UN	63,00	$ 15.350	$ 967.050,00	39,00	$ 598.650	24,00	$ 368.400			-	$ -
1.12	Desmontar Cielo Raso	M2	271,09	$ 8.289	$ 2.247.082,42	222,24	$ 1.842.147	48,85	$ 404.935			-	$ -
1.14	Demoler Viga Culata. Incluye retiro de escombros.	M	50,54	$ 19.177	$ 969.205,58	50,54	$ 969.206	-	$ -			-	$ -
1.17	Demoler baldosa Cerámica	M2	45,24	$ 14.397	$ 651.320,28		$ -	45,24	$ 651.320			-	$ -
1.20	Desmonte de sanitario	UN	4,00	$ 33.098	$ 132.392,00		$ -	4,00	$ 132.392			-	$ -
1.21	Desmonte de orinal	UN	-	$ 27.582	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
1.22	Desmonte de Reflectores	UN	16,00	$ 46.015	$ 736.240,00	16,00	$ 736.240	-	$ -			-	$ -
2	**CIMENTACIONES**				**$ 1.064.834,08**		**$ -**		**$ 1.064.834,08**				**$ -**
2.1	Excavación manual sobre terreno. (Incluye retiro de Obra)	M3	19,20	$ 55.450	$ 1.064.834,08		$ -	19,20	$ 1.064.834			-	$ -
3	**ESTRUCTURA**				**$ 10.586.690,04**		**$ -**		**$ 10.586.690,04**				**$ -**
3.6	Suministrar acero de refuerzo 60000 psi	KG	712,57	$ 11.745	$ 8.369.134,65		$ -	712,57	$ 8.369.135			-	$ -
3.8	Muro en concreto de 3000 PSI	M3	0,76	$ 1.654.503	$ 1.258.249,53		$ -	0,76	$ 1.258.250			-	$ -
3.9	Placa en Concreto de 3000 PSI	M3	0,58	$ 1.652.551	$ 959.305,86		$ -	0,58	$ 959.306			-	$ -
4	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 24.632.699,93**		**$ -**		**$ 12.145.612,32**		**$ 12.487.087,61**		**$ -**
4.1	Suministrar e instalar baldosa cerámica antideslizante. Incluye Zócalo	M2	50,41	$ 120.440	$ 6.070.988,97		$ -	50,41	$ 6.070.989			-	$ -
4.6	Suministrar e instalar baldosa cerámica.	M2	18,47	$ 109.640	$ 2.025.160,44		$ -	18,47	$ 2.025.160			-	$ -
4.7	Emplantillar en concreto de 3,000 psi. Esp 0,07	M2	14,59	$ 80.586	$ 1.175.951,21		$ -	14,59	$ 1.175.951			-	$ -
4.8	Suministrar e instalar malla electrosoldada de 6 mm	KG	1.635,50	$ 9.392	$ 15.360.599,31		$ -	305,95	$ 2.873.512	1329,55	$ 12.487.088	-	$ -
5	**MUROS**				**$ 14.933.438,80**		**$ -**		**$ 14.933.438,80**				**$ -**
5.2	Pañetar Allanado muro. Mortero 1:4	M2	113,92	$ 38.267	$ 4.359.491,44		$ -	113,92	$ 4.359.491			-	$ -
5.3	Pañetar filos y dilataciones	M	12,06	$ 11.048	$ 133.238,88		$ -	12,06	$ 133.239			-	$ -
5.6	Levantar muro reforzado en block # 6. Mortero 1:4, relleno en concreto de 3000 PSI (No incluye acero)	M2	37,74	$ 276.685	$ 10.440.708,48		$ -	37,74	$ 10.440.708			-	$ -
6	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 1.395.489,00**		**$ -**		**$ 1.395.489,00**				**$ -**
6.9	Suministro e instalación de puerta en aluminio	UN	1,00	$ 1.395.489	$ 1.395.489,00		$ -	1,00	$ 1.395.489			-	$ -
6.10	Suministro e Instaacion de Careta Metalica	M2	-	$ 532.745	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
7	**REDES ELECTRICAS**				**$ 25.626.602,00**		**$ 18.235.423,00**		**$ 7.391.179,00**				**$ -**
7.8	Suministrar e instalar luminaria Panel Led redondo 18W 120-240V de incrustar. Incluye accesorios. (Interiores)	UN	64,00	$ 108.611	$ 6.951.104,00	39,00	$ 4.235.829	25,00	$ 2.715.275			-	$ -
7.26	Suministo e instalacion de reflectores LED de 200w - Con panel solar	UN	14,00	$ 999.971	$ 13.999.594,00	14,00	$ 13.999.594	-	$ -			-	$ -
7.27	Suministrar e instalar salida de luces. Incluye interruptor sencillo	UN	64,00	$ 73.061	$ 4.675.904,00		$ -	64,00	$ 4.675.904			-	$ -
8	**ACABADOS**				**$ 43.013.363,70**		**$ 30.796.323,84**		**$ 12.217.039,86**				**$ -**
8.2	Suministrar e instalar pintura vinilo tipo 1, interiores tres manos	M2	583,98	$ 11.120	$ 6.493.896,52	300,00	$ 3.336.000	283,98	$ 3.157.897			-	$ -
8.3	Suministrar e instalar pintura Exteriores tipo 1, tres manos	M2	410,11	$ 15.860	$ 6.504.359,58	180,00	$ 2.854.800	230,11	$ 3.649.560			-	$ -
8.4	Suministrar e instalar cielo Raso en PVC	M2	271,10	$ 110.716	$ 30.015.107,60	222,24	$ 24.605.524	48,86	$ 5.409.584			-	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 363.681.132,00	**FECHA CONTRATO:**	24 de septiembre de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE SANTA ROSA BOLIVAR	**VALOR ADICIONAL:**	$ 180.000.000	**PLAZO TOTAL:**	Dos (02) Meses Y Quince (15) Dias
CONTRATISTA:	CINCO – II INGENIERIA SAS	**NUEVO VALOR CONTRATO:**	$ 543.681.132	**FECHA TERMINACION NUEVO CONTRATO:**	17 de diciembre de 2024
SUPERVISOR DE LA OBRA:	BERTHA LOMBANA TUÑON	**FECHA INICIO CONTRATO:**	2 de octubre de 2024	**FECHA ACTA:**	17 de diciembre de 2024

A los diesiciete (17) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **DAVID ENRRIQUE VALDELAMAR MARTINEZ**, Representante Legal de **CINCO – II INGENIERIA SAS**, en su calidad de Contratista de Obra, **BERTHA LOMBANA TUÑON** como Supervisor de la Obra, con el objeto de suscribir el **ACTA PARCIAL FINAL**, debido a las cantidades ejecutadas:

CONDICIONES BALANCE DE OBRA No 2						Acta Parcial N°1		Acta Parcial N°2		Acta Final		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
9	**CUBIERTA**				**$ 64.553.450,16**		**$ 43.868.002,19**		**$ 20.685.447,97**				**$ -**
9.1	Suministrar e instalar estructura metálica para cubiertas. Norma nsr10 titulo f. Perfilería astm a572 gr50 y astm a37 (Perfil galvanizado en C). Soldadura e70xx. Inc tensores, anclajes y accesorios, limpieza sspc-sp3, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte alquidico 3 mils	Kg	1.163,39	$ 21.614	$ 25.145.554,69	369,17	$ 7.979.284	794,22	$ 17.166.271			-	$ -
9.2	Suministrar e instalar cubierta arquitectónica galvanizada esp. 0,60mm tipo trapezoidal, incluye elementos de amarre	M2	236,08	$ 115.809	$ 27.340.420,34	236,08	$ 27.340.420	-	$ -			-	$ -
9.3	Mantenimiento de Estructura Metálica	Kg	798,88	$ 11.677	$ 9.328.503,08	497,50	$ 5.809.326	301,38	$ 3.519.177			-	$ -
9.4	Coronación Lateral Galvanizado	M	6,02	$ 46.789	$ 281.669,78	6,02	$ 281.670	-	$ -			-	$ -
9.5	Faldón Trasero Galvanizado	M	12,10	$ 46.789	$ 566.146,90	12,10	$ 566.147	-	$ -			-	$ -
9.6	Coronación Trasera Galvanizado	M	-	$ 46.789	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
9.7	Suministrar e instalar caballete para teja cubierta arquitectónica tipo trapezoida. Incluye elementos de fijación	M	12,00	$ 31.188	$ 374.256,00	12,00	$ 374.256	-	$ -			-	$ -
9.8	Faldón Lateral Galvanizado	M	32,42	$ 46.789	$ 1.516.899,38	32,42	$ 1.516.899	-	$ -			-	$ -
11	**REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 9.767.133,00**		**$ -**		**$ 9.767.133,00**				**$ -**
11.1	Suministrar e instalar punto hidraúlico de 1/2"	UN	7,00	$ 26.304	$ 184.128,00		$ -	7,00	$ 184.128			-	$ -
11.2	Suministrar e instalar red hidraúlica de 1/2" PVC	M	29,00	$ 12.230	$ 354.670,00		$ -	29,00	$ 354.670			-	$ -
11.4	Suministrar e instalar llave de control de 1/2". Incluye tapa registro de 0,20 x 0,20	UN	2,00	$ 32.409	$ 64.818,00		$ -	2,00	$ 64.818			-	$ -
11.5	Suministrar e instalar electrobomba llenado de tanque elevado de 1 hp.	UN	1,00	$ 779.904	$ 779.904,00		$ -	1,00	$ 779.904			-	$ -
11.7	Suministrar e instalar tanque elevado de 2000 litros	UN	1,00	$ 1.892.077	$ 1.892.077,00		$ -	1,00	$ 1.892.077			-	$ -
11.8	Suministro e instalacion de ducha	UN	3,00	$ 249.930	$ 749.790,00		$ -	3,00	$ 749.790			-	$ -
11.10	Suministro e instalacion de sanitario acero inoxidable	UN	2,00	$ 1.999.977	$ 3.999.954,00		$ -	2,00	$ 3.999.954			-	$ -
11.11	Suministro e instalacion de orinal acero inoxidable	UN	-	$ 499.989	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
11.12	Suministrar e instalar llave de control de 1". Incluye tapa registro de 0,20 x 0,20	UN	-	$ 199.960	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
11.13	Suministrar e instalar red Sanitaria de 4" PVC	M	17,00	$ 84.938	$ 1.443.946,00		$ -	17,00	$ 1.443.946			-	$ -
11.14	Suministrar e instalar red Sanitaria de 4" PVC	M	-	$ 84.938	$ -		$ -	-	$ -			-	$ -
11.15	Suministrar e instalar punto Sanitaria de 4"	UN	3,00	$ 49.980	$ 149.940,00		$ -	3,00	$ 149.940			-	$ -
11.16	Suministrar e instalar punto Sanitaria de 2"	UN	3,00	$ 49.302	$ 147.906,00		$ -	3,00	$ 147.906			-	$ -
12	**Otros**				**$ 5.108.190,00**		**$ -**		**$ 5.108.190,00**				**$ -**
12.1	Suministro e Instalacion de concertina	M	123,00	$ 41.530	$ 5.108.190,00		$ -	123,00	$ 5.108.190			-	$ -
NP	**OBRAS NO PREVISTAS**				**$ 197.464.922,70**		**$ -**		**$ 74.613.664,45**		**$ 122.851.258,25**		**$ -**
NP1	PERFILACION Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	739,37	$ 9.807	$ 7.251.083,66		$ -	72,33	$ 709.313	667,04	$ 6.541.771	-	$ -
NP2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO - SUBBASE TIPO C ESPESOR	M3	100,06	$ 216.719	$ 21.684.004,04		$ -	-	$ -	100,06	$ 21.684.004	-	$ -
NP3	RELLENO EN MATERIAL EN MODALIDAD DE SELECCIONADOS SEGÚN INVIAS COMPACTADO AL 95% SEGUN PROCTOR MODIFICADO	M3	110,90	$ 101.053	$ 11.207.261,60		$ -	10,85	$ 1.096.313	100,06	$ 10.110.949	-	$ -
NP4	RELLENO CON MATERIAL ESTABILIZADO CON CAL	M3	-	$ 206.765	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
NP5	EXCAVACIONES CON MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	200,11	$ 30.169	$ 6.037.225,83		$ -	-	$ -	200,11	$ 6.037.226	-	$ -
NP6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES	M3	200,11	$ 37.001	$ 7.404.408,21		$ -	-	$ -	200,11	$ 7.404.408	-	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 363.681.132,00	**FECHA CONTRATO:**	24 de septiembre de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE SANTA ROSA BOLIVAR	**VALOR ADICIONAL:**	$ 180.000.000	**PLAZO TOTAL:**	Dos (02) Meses Y Quince (15) Dias
CONTRATISTA:	CINCO – II INGENIERIA SAS	**NUEVO VALOR CONTRATO:**	$ 543.681.132	**FECHA TERMINACION NUEVO CONTRATO:**	17 de diciembre de 2024
SUPERVISOR DE LA OBRA:	BERTHA LOMBANA TUÑON	**FECHA INICIO CONTRATO:**	2 de octubre de 2024	**FECHA ACTA:**	17 de diciembre de 2024

A los diesiciete (17) días del mes de Diciembre de 2024, se reunieron las siguientes personas: **DAVID ENRRIQUE VALDELAMAR MARTINEZ**, Representante Legal de **CINCO – II INGENIERIA SAS**, en su calidad de Contratista de Obra, **BERTHA LOMBANA TUÑON** como Supervisor de la Obra, con el objeto de suscribir el **ACTA PARCIAL FINAL**, debido a las cantidades ejecutadas:

CONDICIONES BALANCE DE OBRA No 2						**Acta Parcial N°1**		**Acta Parcial N°2**		**Acta Final**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**	**CANT**	**V. PARCIAL**
NP7	Placas en concreto de 3,000 psi, con aditivo impermeabilizante y acelerado a 8 días e=0,1 m (Incluye corte y sellado de junta)	M2	450,03	$ 136.687	$ 61.513.870,65		$ -	72,33	$ 9.886.043	377,71	$ 51.627.828	-	$ -
NP8	Descapote (Incluye retiro de material)	M2	739,35	$ 5.843	$ 4.319.678,67		$ -	72,33	$ 422.565	667,03	$ 3.897.114	-	$ -
NP9	Pintura Trafico Alto para Pisos exterioress	M2	514,78	$ 41.164	$ 21.190.555,28		$ -	137,08	$ 5.642.596	377,71	$ 15.547.959	-	$ -
NP10	Mantenimiento de Caretas o Protectores Metálicos Para Ventana	M2	14,77	$ 190.500	$ 2.813.323,05		$ -	14,77	$ 2.813.323			-	$ -
NP11	Mantenimiento de Puerta Metálica	M2	28,88	$ 381.000	$ 11.003.280,00		$ -	28,88	$ 11.003.280			-	$ -
NP12	Suministrar e instalar estuco	M2	678,83	$ 28.500	$ 19.346.555,25		$ -	678,83	$ 19.346.555			-	$ -
NP13	Suministro e instalación de Ventana en aluminio	UN	1,00	$ 1.395.489	$ 1.395.489,00		$ -	1,00	$ 1.395.489			-	$ -
NP14	Raqueteo de Muro	M2	575,24	$ 2.560	$ 1.472.623,36		$ -	575,24	$ 1.472.623			-	$ -
NP15	Impermebilizar Pisos	M2	115,77	$ 39.095	$ 4.526.125,89		$ -	115,77	$ 4.526.126			-	$ -
NP16	Kit Sanitario Lavamanos	UN	1,00	$ 298.889	$ 298.889,00		$ -	1,00	$ 298.889			-	$ -
NP17	Kit Sanitario Inodoro	UN	1,00	$ 504.899	$ 504.899,00		$ -	1,00	$ 504.899			-	$ -
NP18	Suministrar e instalar interruptor Doble o Triple	UN	20,00	$ 36.000	$ 720.000,00		$ -	20,00	$ 720.000			-	$ -
NP19	Suministrar e instalar tomacorriente de 110 v	UN	38,00	$ 36.000	$ 1.368.000,00		$ -	38,00	$ 1.368.000			-	$ -
NP20	Manteniminto de Cielo Raso en Draywall	M2	98,64	$ 49.360	$ 4.868.870,40		$ -	98,64	$ 4.868.870			-	$ -
NP21	Graniplast Exterior	M2	149,80	$ 57.000	$ 8.538.779,81		$ -	149,80	$ 8.538.780			-	$ -
COSTO DIRECTO					**$ 408.782.806,01**		**$ 97.045.991,97**		**$ 176.398.468,18**		**$ 135.338.345,86**		**$ -**
			A.I.U.	33%	$ 134.898.325,98		$ 32.025.177,35		$ 58.211.494,50		$ 44.661.654,14		$ -
TOTAL COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS					**$ 543.681.132,00**		**$ 129.071.169,32**		**$ 234.609.962,68**		**$ 180.000.000,00**		**$ -**

DAVID ENRRIQUE VALDELAMAR MARTINEZ
CINCO – II INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

BERTHA LOMBANA TUÑON
Secretaria de Planeación e Infraestructura
ALCALDIA DE SANTA ROSA (BOLIVAR)

CINCO II INGENIERIA SAS
NIT 901.562.621-3
BRR LOS CIRUELOS CR 85 26 A 38
Tel: (605) 3162843459
Cartagena - Colombia
cincoingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEE 24

Señores	MUNICIPIO DE SANTA ROSA		
NIT	890.481.343-3	**Teléfono**	(605) 3013181400 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 27 71 PLAZA PPAL	**Ciudad**	Santa Rosa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/01/2025, 13:56
Expedición	14/01/2025, 13:56
Vencimiento	14/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	135,338,345.87	0.00	135,338,345.87

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento ochenta millones de pesos m/cte con cero cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-14 $ 180,000,000.00 por

Total Bruto	135,338,345.87
Administración 27.00%	36,541,353.39
Imprevistos 3.00%	4,060,150.38
Utilidad 3.00%	4,060,150.37
Total a Pagar	180,000,000.00

Observaciones: ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076704967 aprobado en 20240807 prefijo FEE desde el número 18 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.8
CUFE: 07d87d09f91b328b8212ccbb42239ec5b0ef5ec477cbd0df1251e2b437d20a4b3516780f7b750d763ddbdc0f8586b01b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901562621	3	CINCO - II INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CINCO II	RR LOS CIRUELOS CR 85 26 A 38	CARTAGENA-BOLIVAR	6900000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1222178808	9480853171	E	2025/01/08	2025/01/27	RAPPIPAY		$862,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$555,000	$0	$561,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$444,000	$0	$449,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$111,000	$0	$112,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$18,500	$0	$18,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$18,500	$0	$18,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$139,000	$0	$140,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$139,000	$0	$140,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$139,000	$0	$141,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$27,800	$0	$28,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$27,800	$0	$28,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$27,800	$0	$28,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$27,800	$0	$28,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$27,800	$0	$28,200
TOTAL				5	$851,500	$0	$862,200
