INFORME CONTRATISTA					
No. DE CONTRATO	Contrato Prestación de Servicio 025-2025	**PERIODO DEL INFORME**			
		DESDE (dd/mm/año)	**HASTA (dd/mm/año)**		
		01/02/2025	28/02/2024		
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE				
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS				
No. DE IDENTIFICACIÓN	31.714.327	**EXPEDIDA EN**	CALI		
SUPERVISOR	LENYTH CATHERIN MONTAÑEZ ANGEL				
CDP No.	23 DE 03/01/2025	**RP No.**	25 del 13/01/2025		
FORMA DE PAGO	Cuatro (4) cuota	**PAGO No.**	2/4		
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000				
PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1.600.000	**PERIODO COTIZADO**	Febrero 2025		
EPS	SURAMERICANA	**VALOR PAGADO**	$200.000		
ARL	SURA	**VALOR PAGADO**	$111.400		
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$256.000		
VALOR TOTAL PLANILLA	$567.400	**PLANILLA No.**	**76353940**		
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**		**NO**	**X**
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. NOR1ESE-CAU-02- 2023 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA- CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD NACIONAL.					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
GENERALES: a) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del presente contrato, comprometiéndose a realizar las actividades derivadas del contrato con calidad y oportunidad. b) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el contratante para realizar sus					

actividades.

c) Toda información o formatos generados por el contratista son propiedad de la E.S.E Norte 1 de buenos aires Cauca.

d) Cumplir con la política de seguridad de la información, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad.

e) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión Documental.

f) Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la información y los recursos informáticos del contratante.

g) Actuar con lealtad y buena fe en las diversas etapas contractuales, evitando las dilataciones, trabas y obstáculos que por su causa pudieren presentarse.

h) Informar oportunamente al Supervisor las irregularidades o dificultades que se presenten en el desarrollo de las actividades.

i) Cargar el informe de actividades con sus respectivos soportes a la plataforma SECOP 2

ANEXA SOPORTE.

j) Presentar mensualmente informes sobre el desarrollo de las actividades pactadas

ESPECÍFICAS:

a) Realizar un seguimiento y control permanente de los avances de la interventoría, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

ASUNTO	FECHA RADICADO	OBSERVACIÓN
Oficio IHT-085 solicitud de pólizas actualizadas por modificatorio No.2	10/02/2025	Remitido a la supervisión por correo electrónico por la interventoría.
Comité de Seguimiento MSPS, gerencia, contratista C23, consorcio IHT	20/02/2025	Comité virtual
Solicitud de documentos soportes de consignación rendimientos financieros	25/02/2025	Remitido al administrador Ese Norte 1 por correo electrónico
Solicitud de revisión y firma de acta comité	25/02/2025	Remitido a ing Didier golondrino supervisor de la secretaria de salud departamental
Solicitud de programación de comité de ingenierías	25/02/2025	Remitido a la Interventoria por correo electrónico

Oficio IHT-086 Seguimiento avance de obra y solicitud plan de contingencia	25/02/2025	Remitido por interventoría a través de correo electrónico.
Oficio IHT-087 Programación de comités con especialista	25/02/2025	Remitido por interventoría a través de correo electrónico y reenviado a gerente ese norte 1, Ing. milena biomédica.

OBSERVACIONES DE OBRA:

Para este periodo se trabajaron en los bloques 1,2 y 4 a pesar que persisten las situaciones de orden público el contratista implementa permanentemente plan de contingencia que permita mantener la programación de obra, los avances por bloque son así : Bloque 1 Instalación de mamposteria,Instalación de redes eléctricas, Bloque 2 Instalación de mampostería, instalación de tendido para vigas aéreas de segundo nivel, figurado de acero de vigas aéreas, Bloque 4 se retira los tendidos y formaletas de vigas aéreas, En la zona perimetral se funden las columnetas de confinamiento del muro perimetral, excavación para la cimentación del muro de contención del acceso de la Cra 5a. para este periodo la interventoría reporta un atraso aproximado del 3,78% esto sustentando en las situaciones de orden público en las zonas aledañas a las obras que atrasa la entrega oportuna de materiales, además del retiro de la mano de obra calificada y no calificada, dificultando el desarrollo de la planificación. El 6 de febrero se llevó a cabo comité de veeduría. El día 29 de enero se lleva a cabo comité de seguimiento por parte del supervisor el Ing. Yauri Ivan Diaz. Del Ministerio de salud y protección Social. En el comité se sugiere al contratista celeridad con el balance de obra que permite conocer el estado financiero de la obra y su alcance para poder tramitar los recursos necesarios.

Desde la supervisión de la ESE NORTE 1 informa que a la fecha se encuentra cargado en pisis los informes del contrato, para este periodo. La interventoría y contratista de obra radicaron las actas 5 pero aún no se han cancelado por parte de la ESE NORTE 1 teniendo en cuenta que las actas 3 y 4 de interventoría se radicaron el 9 de enero 2025 y el acta 5 se radicaron el 7 de febrero a la fecha está pendiente apertura de presupuesto.

Se recomienda al contratista de obra consorcio TC-23:

Informar de los cambios o situaciones inmediatamente a la interventoría para que pueda tener información clara y precisa para la supervisión.

Radicar los informes de manera oportuna a la interventoría para lograr radicar a tiempo la información a plataforma.

Presentar los soportes aprobados de interventoría para el cambio del tipo de bloque de mampostería que se está instalando en bloque 1.

Sugiere programación de comité de veeduría.

Solicita coordinar programación de comités de especialistas con el fin de revisar avances, ajustar observaciones. Para estos comités se invita la Dra. Beatriz Bohórquez Salinas Gerente Ese Norte 1, la Ing. Milena Delgado Gómez Biomédica de la ESE NORTE, Ing. Didier Golondrino supervisor secretaria de salud departamental.

Se solicita el balance de obra para determinar el alcance del proyecto y la Gerente en representación de la ESE NORTE pueda realizar las gestiones necesarias para la consecución de recursos

Se recomienda a la interventoría consorcio IHT:

Solicitar cumplimiento al contratista de la entrega del informe de obra

Radicar de manera paralela las actas de cobro con los cortes de obra

Radicar la aprobación de cambio de bloque de mampostería en el bloque 1

Solicita reportar las situaciones de orden público permanente por correo electrónico

Radicar el plan de contingencia para los atrasos presentados durante el periodo.

El día 21 de febrero en la ciudad de Popayán la supervisión asiste al 1 foro de infraestructura y dotación en salud pública, se tuvo la oportunidad de conocer al Arq. David coordinador del área de proyectos al cual se le manifestó la necesidad de adicionar recursos para la culminación del centro de salud y programación de comité en Bogotá para el tema.



Imagen 1. Contacto Arquitecto David coordinador de Infraestructura Salud MSPS

PENDIENTES ESE NORTE 1.

- Reportar al pisis la relación de rendimientos y las consignaciones de los mismos y certificados bancarios.
- Pagos de las actas 3 y 4 del contrato de interventoría radicadas en el mes de enero 2025.
- Pago de las actas 5 del contrato de obra e interventoría.

PARA ESTE PERIODO LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

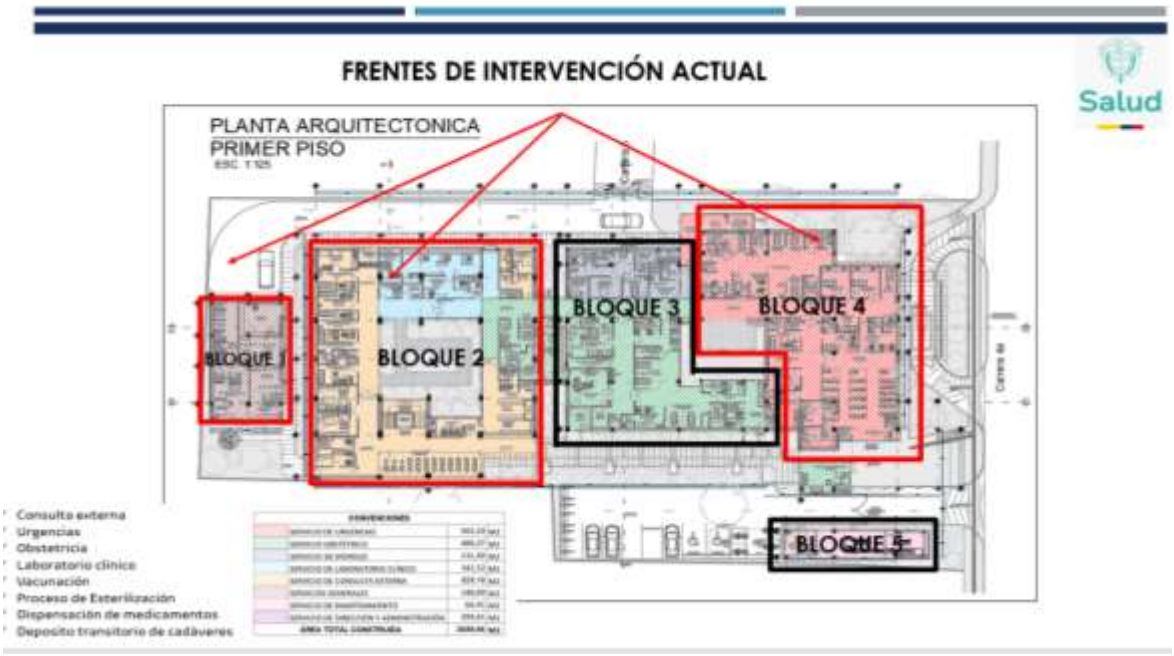


Imagen 2. Avances de obra por Bloque

AVANCE DE OBRA



Imagen 3. Culminación de cubierta Bloque 1



Imagen 4. Mampostería Bloque 1



Imagen 5. Mampostería estructural Bloque 2



Imagen 6. Fundición de columnas Bloque 2




Imagen 7. Armado de tendido soporte y amarre de acero Vigas aéreas Bloque 2




Imagen 8. Fundición vigas aéreas Bloque 4




Imagen 9. Fundición Columnetas perimetrales

Respecto a la situación social actual del territorio, en el mes de Febrero se presentó un incremento en las alteraciones de orden publico en los alrededores, generando limitaciones en el flujo vehicular e instaurando pancartas alusivas a los grupos al margen de la ley de la zona, lo que ocasionó situaciones de miedo, incertidumbre, peligro e inseguridad para el personal en obra además de dificultades en el suministro de materiales para la obra y atrasos en la programación de actividades, para este mes se present la renuncia de personal calificado y no calificado. A continuación, se relacionan algunos de los hechos presentados:



Imagen 10 Relación de situaciones de orden público registradas

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Contrato N.º:	NOR1ESE-CAU-01-2023
Contratista:	CONSORCIO T-C 23
Plazo Inicial:	16 MESES
Plazo Adicional 1:	6 MESES
Plazo Final:	22 MESES
Fecha de Inicio:	5 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación inicial:	27 DE ENERO DE 2025
Fecha de suspensión 1	4 DE JUNIO DE 2024
Fecha reinicio 1	19 DE JULIO DE 2025
Fecha Terminación modificatorio 1	8 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Valor Inicial:	$ 12.170.175.042,00
Valor Adición 1 Modificatorio 1	$ 21.902.122,00
Valor Total	$ 12.192.077.164,00
Valor Anticipo: 40%	$ 4.868.070.017,00
Forma de Pago	PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

Avance del Proyecto de obra:



Imagen 11 Avance de Obra

a corte del presente informe y los periodos mensuales acumulados de obra ejecutada, se tiene al mes de Febrero un atraso de obra ejecutada acumulada vs programada acumulada del 3.78% en función del valor total del contrato, el cual considera la reciente adición por RETIE y RETILAP por un valor de $21.902.122 para un valor total de $ 12.192.077.164.

En el periodo actual además de la coyuntura social, la cual no cesa y repercute directamente en el corregimiento de Timba y demás zonas aledañas, se han generado atrasos en la programación de actividades en obra debido a las alteraciones de orden público por las mismas festividades y los enfrentamientos ocasionados por grupos al margen de la ley, que han desencadenado en limitaciones y bloqueos al suministro y traslado de materiales a obra por los corredores viales del territorio. Así mismo es importante mencionar que tras la estigmatización de la zona, donde la inseguridad, vulnerabilidad y riesgo destacan entre la población, ha conllevado a la aminoración en la disponibilidad de mano de obra calificada, pese a la alta demanda que tiene el consorcio para incrementar el personal en obra.

En un análisis a la programación de obra vigente, con el consorcio contratista se ha optado por dar inicio a actividades complementarias mientras se suplen las complicaciones presentadas con la estructura en concreto reforzado de vigas aéreas de segundo piso, las cuales, , adicionalmente, con el propósito de contrarrestar los atrasos presentados y dar cumplimiento a

los indicadores mensuales se efectúa actividades complementarias como la fundicion de columnestas del cerramiento perimetral, la cimentacion del muro de contencioin por el acceso a la cra 5. Se inician las instalciones de redes hidraulicas, electrica, sanitarias, aires acondicionado, por lo cual se solicito a la interventoria la planificacion de un cronograma de comites de especialidades para tartar avances e identificar situaciones ajustar.

Lo anterior, evidencia la necesidad de incrementar la ejecución en los diferentes frentes de obra y de igual manera el personal de mano de obra tanto calificado como no calificado para dar cumplimiento a la proyección de actividades y trabajar de forma eficiente. Por ende, esta supervisión manifiesta su preocupación por la disponibilidad de personal para el rendimiento adecuado en las actividades propuestas y resalta la importancia de evaluar técnica y financieramente la posibilidad de incorporación de trabajadores de otras zonas del departamento. De igual manera, se le recuerda al contratista que la vinculación de personal y/o subcontratación deberá ser reportado ante esta supervisión.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Año	Concepto	Avance Financiero					Avance en Fisico %		
		Avance Mensual Programado	Acumulado Programado	Avance Ejecutado	Acumulado Ejectado	% Programado	Acumulado Programado	% Ejecutado	Acumulado Total
2023	OCTUBRE	$ 242.156.835,00	$ 242.156.835,00	$ 240.000.000,00	$ 240.000.000,00	1,99%	1,99%	1,97%	1,97%
	NOVIEMBRE	$ 279.531.551,00	$ 521.688.386,00	$ 264.530.254,00	$ 504.530.254,00	2,30%	4,29%	2,17%	4,15%
	DICIEMBRE	$ 365.671.132,00	$ 887.359.518,00	$ 395.469.746,00	$ 900.000.000,00	3,00%	7,29%	3,25%	7,40%
2024	ENERO	$ 672.057.436,00	$ 1.559.416.954,00	$ 462.181.567,00	$ 1.362.181.567,00	5,52%	12,81%	3,80%	11,19%
	FEBRERO	$ 1.014.975.312,00	$ 2.386.378.158,00	$ 266.870.410,00	$ 1.629.052.160,00	8,34%	21,15%	2,19%	13,39%
	MARZO	$ 93.575.767,00	$ 2.479.953.925,00	$ 852.002.494,00	$ 2.481.054.654,00	0,77%	20,38%	7,00%	20,39%
	ABRIL	$ 288.583.278,00	$ 2.768.537.203,00	$ 112.091.702,00	$ 2.593.146.356,00	2,37%	22,75%	0,92%	21,31%
	MAYO	$ 483.232.753,00	$ 3.251.769.956,00	$ 97.590.304,00	$ 2.690.736.660,00	3,97%	26,72%	0,80%	22,11%
	JUNIO		$ 3.251.769.956,00	$ -	$ 2.690.736.660,00	0,00%	26,72%	0,00%	22,11%
	JULIO		$ 3.251.769.956,00	$ -	$ 2.690.736.660,00	0,00%	26,72%	0,00%	22,11%
	AGOSTO	$ 825.228.795,00	$ 4.076.998.751,00	$ 990.208.508,00	$ 3.680.945.168,00	6,78%	33,50%	8,14%	30,25%
	SEPTIEMBRE	$ 369.615.958,00	$ 4.446.614.709,00	$ 1.013.043.550,00	$ 4.693.988.718,00	3,04%	36,54%	8,32%	38,57%
	OCTUBRE	$ 539.626.270,00	$ 4.986.240.979,00	$ 310.387.259,00	$ 5.004.375.977,00	4,43%	40,97%	2,55%	41,12%
	NOVIEMBRE	$ 729.259.241,00	$ 5.715.500.220,00	$ 495.720.265,00	$ 5.500.096.242,00	5,99%	46,96%	4,07%	45,19%
	DICIEMBRE	$ 452.081.486,00	$ 6.167.581.706,00	$ 599.595.489,00	$ 6.099.691.731,00	3,71%	50,68%	4,93%	50,12%
2025	ENERO	$ 774.587.031,00	$ 6.942.168.737,00	$ 603.512.294,00	$ 6.703.204.025,00	6,35%	56,94%	4,95%	54,98%
	FEBRERO	$ 859.541.440,06	$ 7.801.710.177,06	$ 637.645.635,68	$ 7.340.849.660,68	7,05%	63,99%	5,23%	60,21%

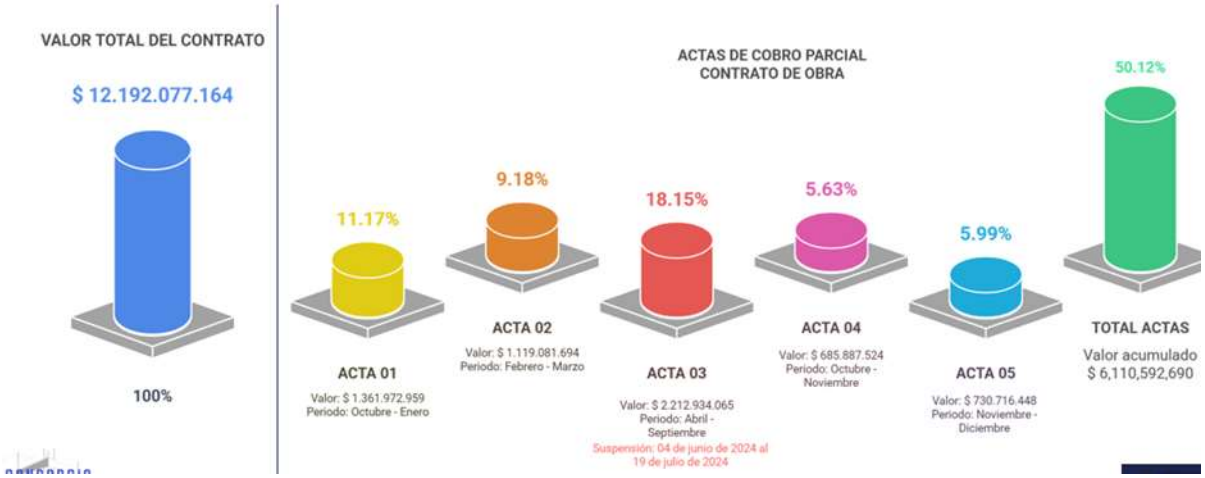


Imagen 12 Actas de pago

ESTADO DEL CONTRATO			OBSERVACIÓN
DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	% AVANCE	
ACTA PARCIAL 1	$ 1.361.972.959,00	11,17%	PAGADA
ACTA PARCIAL 2	$ 1.119.081.694,00	9,18%	PAGADA
ACTA PARCIAL 3	$ 2.212.934.065,00	18.15%	PAGADA
ACTA PARCIAL 4	$ 685.887.524,00	5.63%	PAGADO
ACTA PARCIAL 5	$ 730.716.448,00	5.99%	PENDIENTE PAGO
VALOR TOTAL	$ 6.110.592.690,00	50.12%	

ESTADO AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
ANTICIPO	$	4.868.070.017
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1	$	544.789.184
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 2	$	447.632.678
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 3	$	885.173.626
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 4	$	274.355.010
AMORTIZACION ACTA PARCIAL 5	$	292.286.579
TOTAL, AMORTIZADO	$	2.444.217.077
SALDO POR AMORTIZAR	$	2.425.852.940



Imagen 12 Amortización del Anticipo

SEGUIMIENTO AL AVANCE INTERVENTORIA

Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Contrato N.º:	NOR1ESE-CAU-02-2023
Contratista:	CONSORCIO IHT
Plazo Inicial:	16 MESES
Modificatorio No. 1 Plazo Adicional 2:	6 MESES
Plazo Final:	23 MESES
Fecha de Inicio:	05 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación inicial:	26 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de suspensión No.1	04 DE JUNIO DE 2024
Fecha reinicio No.1	19 DE JULIO DE 2025
Fecha Terminación modificatorio No.2	08 DE OCTUBRE DE 2025
Modificatorio No. 2	16 de enero de 2024. Cambio de representante legal
Valor Inicial:	$ 626.859.801

Avance Financiero de contrato interventoría NOR1ESE-CAU-01-2023 CONSORCIO IHT.

Forma de pago de Interventoría			
Valor Interventoría		$626.859.801	
Forma de Pago			
Avance Obra Física	70%	$438.801.861	mensual
Cuota mensual 17 cuotas	20%	$125.371.960	$ 7.374.821
Liquidación	10%	$62.685.980,00	

Detalle de forma de pago de interventoría inicial

Forma de pago de Interventoría			
Valor Interventoría		$626.859.801	
Forma de Pago			
Avance Obra Física	70%	$438.801.861	
Cuota mensual 17 cuotas	20%	$125.371.960	
Valor Pagado Mensual a la fecha		$95.872.673	Mensual
Saldo distribuir en los 6 meses		$29.499.287	$ 2.949.929
Liquidación	10%	$62.685.980,00	

Detalle de forma de pago de interventoría Modificatorio No. 2

Es importante precisar que el contrato e interventoria en el mes de enero se realizo una modificacion 2 se realiza una prorroga del contrato por 6 meses mas lo cual no genera costos lo cual varia los pagos mensuales asi :

En el presente mes de ejecución la interventoría presenta un avance mensual asi:

CONTRATO DE INTERVENTORIA NOR1ESE-CAU-02-2023								
Año	Concepto	Avance Financiero						
		Avance Mensual Programado	% ejecutada obra	Avance Ejecutado obra mes	Avance mes interventoría	Acumulado Ejectado interventoría	% avance interventoría mes	% avance interventoría mes acumulado
2025	FEBRERO	$ 2.949.928,70	5,23%	$ 22.949.337,00	$ 25.899.265,70	$366.370.206,40	4,13%	58,45%

A corte del presente informe se han presentado las siguientes actas parciales, correspondientes a la ejecución del contrato de interventoría:

DESCRIPCIÓN	AVANCE MENSUAL (%)	% AVANCE INTERVENTORIA	ESTADO
ACTA 1	$ 78.601.214,00	12,54%	PAGADA
ACTA 2	$ 55.119.412,00	8,79%	PAGADA
ACTA 3	$ 109.287.748,00	17,43%	PENDIENTE PAGO
ACTA 4	$ 43.814.260,00	6,99%	PENDIENTE PAGO
ACTA 5	$ 28.993.542,00	4,63%	PENDIENTE PAGO
TOTAL	$ $315.816.176,00	50,38%	

A la fecha del presente informe la interventoría el CONSORCIO IHT radico en ESE NORTE 1 las actas 5 y el contratista también para pago, el acta 5 tiene corte de avance hasta el 31 de diciembre de 2024.

b) Identificar y reportar oportunamente cualquier incumplimiento por parte del interventor.

Para este periodo la interventoría no ha entregado informe y seguridad social.

c) Brindar asesoría técnica a la entidad contratante para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto.

- Para este periodo se realizaron los correspondientes reportes al ministerio de salud y

protección social y demás acciones necesarias para el cumplimiento.

- Participacion del 1 foro de infraestructura y dotación informar al MSPS la necesidad de adición de recursos, programación de comité en Bogotá con el balance que realiza el consorcio TC23.

d) Realizar reuniones periódicas con el contratista de obra y el inventor para determina el avance de las metas del proyecto, levantando actas de lo concertado.

Comité de seguimiento MSPS, Dra. Beatriz Bohorquez Salina, Contratistas,Interventoria , Supervision.



Imagen 12 Comité de obra 20 Febrero 2025

e) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan afectar el normal desarrollo del contrato de obra.

Dentro de esta actividad se realizaron las siguientes actividades:

ASUNTO	FECHA RADICADO	OBSERVACIÓN
Informe de situaciones de orden público que afectan el normal desarrollo de la obra	01/02/2025	Remitido por correo electrónico a la Gerencia de la Ese Norte 1
Formato de seguimiento para reporte MSPS	05/022025	Remitido por correo electrónico secretaria de salud departamento y copia a la gerencia.
Información enviada a la oficina de sistemas de la ESE para cargue en pisis	06/02/2025	Remitido por correo electrónico MSPS radicado 2025423000360852

Informe Centro de Salud enero 2025 MSPS	06/02/2025	Remitido por correo electrónico
Programación semanal	10/02/2025	Remitido por correo electrónico por consorcio TC23
Informe de seguimiento ejecución del proyecto virtual con el supervisor MSPS	25/02/2025	Remitido por correo electrónico
Envió de información cargue al pisis. Soporte del área sistemas de la ESE NORTE 1	27/02/2025	Remitido por correo electrónico

- Se solicita al contratista e interventoría la entrega de informes el día 25 de cada mes con el fin de cumplir con las fechas establecida por la secretaria de salud departamental y poder cumplir con el informe de supervisión para el día 29 de cada mes y reportar la información al PISIS por parte del ingeniero de sistemas.

A la fecha de este informa se encuentran al día toda la información en PISIS y radicación de informes.

f) Asistir a las reuniones programadas por la veeduría ciudadana o por la comunidad en general relacionadas con el contrato de obra y/o interventoría.

Se realiza el día 5 de febrero de 2025 en la junta comunal de timba cauca asistentes Gerente Ese Norte 1, Integrantes de la Veeduría, Representante Consorcio TC23 contratista, consorcio IHT interventoría. Se reviso los avances de obra, dificultades, se programa un comité de obra donde se invitara las diferentes entidades la alcaldía, consejo municipal, personería, gobernación para revisar avances y manifestar las situación de la necesidad de adición de recursos, y las obras externas a la infraestructura del municipio para la armonización del centro de salud tales como alcantarillado, acueducto y vías.



Imagen 13 Comité de veeduría

g) Notificar a la entidad de cualquier situación que pueda afectar la ejecución normal del contrato de obra y/o interventoría.

A la fecha se reportan la continuidad de situaciones de orden público que han afectado la oportuna entrega de materiales, equipos y renuncia de profesionales del proyecto demás necesarios para el desarrollo normal de la obra, a pesar de ello el contratista plantea planes de contingencia que permitan ir afrontando los atrasos y poder continuar con el proceso.

h) Revisar las planillas de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.


Las planillas de pagos a la seguridad social tanto del contratista e interventoría son parte del anexo del informe de interventoría**.**

Para este periodo las planillas remitidas por la interventoría son:

No. Planilla	Planilla
9480360331	Interventoría
9479299494	Interventoría
9480551737	Interventoría
75693714	Interventoría

l) Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

Solicitar al administrador de la ESE NORTE 1 realizar las transferencias de rendimientos financieros a la cuenta estimulada por el ministerio para ello, relacionar y reportar a la supervisión para que el Ing. sistema realice el cargue al pisis.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Planilla de seguridad social 76353940 2. Recibo de pago de la seguridad social. 3. Factura FEVD-210 4. Cargue secop II 5. Documentos del proceso de seguimiento	
Dado en la ciudad de buenos Aires Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2025	
FIRMA CONTRATISTA 	

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No.933 DE 2023

Informe No.	**16**
Fecha	**28 de febrero de 2025**
Departamento	**CAUCA**
Municipio	**TIMBA**
Entidad Beneficiaria	**ESE NORTE 1**
Objeto del Proyecto:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA – CAUCA QUE SE EJECUTARÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD NACIONAL".**

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	$ 12.822.328.154,00	Incluye valor de obra e interventoria			
Fecha de Presentación Proyecto	26 DE SEPTIMBRE DE 2022				
Fecha de aprobación Proyecto	30 DE ENERO DE 2023				
COFINANCIACION	**MSPS**	**ESE**	**Municipio**	**Departamento**	**TOTAL**
Valor Aporte Cofinanciación	$ 12.822.328.154,00			XXXXX	$ -
Acto Administrativo de asignación	933 de 2023				
Valor Inicial	$ 12.822.328.154,00				
Adicional 1 Modificatorio 1 29/11/2024	$ 21.902.122,00				**$ 12.844.230.276,00**
Valor Total:	**$ 12.844.230.276,00**		$ -	**$ -**	
Fecha de giro proyecto Inicial	29 de junio de 2023				
Plazo Inicial de Ejecución:	16 MESES				
Plazo Prorrogá 1	6 MESES				
Plazo de Ejecución Final:	22 MESES				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe Nº 16 | Periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2025 | y el 28 de Febrero de 2025

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1	Contratante:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Contrato Nº:	NOR1ESE-CAU-01-2023	Contrato Nº:	NOR1ESE-CAU-02-2023
Contratista:	CONSORCIO T-C 23	Contratista:	CONSORCIO IHT
Plazo Inicial:	16 MESES	Plazo Inicial:	17 MESES
Plazo Adicional 1:	6 MESES	Plazo Adicional 1:	6 MESES
Plazo Final:	22 MESES	Plazo Final:	23 MESES
Fecha de Inicio:	5 DE OCTUBRE DE 2023	Fecha de Inicio:	5 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación inicial :	27 DE ENERO DE 2025	Fecha de terminación inicial :	26 DE FEBRERO DE 2025
Fecha terminacion Modificatorio 1	26 DE JULIO DE 2025	Fecha terminacion Modificatorio 1	25 DE AGOSTO DE 2025
Valor Inicial:	$ 12.170.175.042,00	Valor Inicial:	$ 626.859.801,00
	$ 21.902.122,00	Valor Anticipo:	
	$ 12.192.077.164,00	Forma de Pago	CUOTAS MENSUALES DE IGUAL VALOR Y ACORDE AVANCE DE OBRA
Valor Anticipo: 40%	$ 4.868.070.017,00	Valor pagado:	$ -
	PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	Nombre Interventor:	CARLOS ANDRES PACHON AVILA
Valor pagado:	$ -		
Nombre del Supervisor	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº NOR1ESE-CAU-01-2023

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO	VALOR NETO AMORTIZANDO ANT	%
Anticipo del 40%	13/10/2023	$ 4.868.070.017,00	$ -	
Acta Parcial 1	31/01/2024	$ 817.183.775,00	$ 544.789.184,00	11,19%
Acta Parcial 2	23/03/2024	$ 671.449.016,00	$ 447.632.678,00	20,39%
Acta Parcial 3	12/10/2024	$ 1.327.760.439,00	$ 885.173.626,00	38,57%
Acta Parcial 4	15/11/2024	$ 411.532.514,00	$ 274.355.010,00	44,21%
Acta Parcial 5	Pendiente de Pago	$ 438.429.869,00	$ 292.286.579,00	50,12%
			$ -	
			$ -	
			$ -	
			$ -	
TOTAL PAGADO OBRA		**$ 3.227.925.744,00**	$ 2.151.950.498,00	
SALDO POR EJECUTAR		**$ 8.942.249.298,00**	**$ 2.716.119.519,00**	

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº NOR1ESE-CAU-02-2023

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	$	$ -
Acta Parcial 1		$ 78.601.214,00
Acta Parcial 2		$ 55.119.412,00
Acta Parcial 3 Pendiente Pago- radicado a la ESE NORTE 1	$ 109.287.748,00	
Acta Parcial 4 Pendiente Pago- radicado a la ESE NORTE 1	$ 43.814.250,00	
Acta Parcial 5 Pendiente Pago- radicado a la ESE NORTE 1	$ 28.993.542,00	
TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA		$ 133.720.626,00
SALDO POR EJECUTAR		**$ 493.139.175,00**

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	56,94%	7,05%	63,99%
% Ejecutado	54,98%	5,23%	60,21%
Diferencia	**-1,96%**	**1,82%**	**-3,78%**

AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	59,74%	7,33%	67,07%
% Ejecutado	58,98%	4,23%	63,21%
Diferencia	**-0,760%**	**-3,10%**	**-3,86%**

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

30/09/2024 por valor de $26.957.077,21 mes Enero -Agosto 2024, a la fecha la administraccion de la ESE NORTE no entrega soportes de pago de rendimientos a la supervision.

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Para este periodo se trabajaron en los bloques 1,2 y 4 a pesar que persisten las situaciones de orden publico el contratista implementa permanentemente plan de contingencia que permita mantener la programación de obra, los avances por bloque son asi : Bloque 1 Instalación de mamposteria,Instalación de redes elecricas, Bloque 2 Instalacion de manposteria, instalacion de tendido para vigas aereas de segundo nivel, figurado de acero de vigas aereas, Bloque 4 se retira los tendidos y formaletas de vigas aereas, En la zona perimetral se funden las columnetas de confinamiento del muro perimetral, excavacion para la cimentación del muro de contención del acceso de la cra 5a. para este periodo la interventoria reporta un atraso aproximado del 3,78% esto sustentando en las situaciones de orden publico en las zonas aledañas a las obras que atrasa la entrega oportuna de materiales, ademas del retiro de la mano de obra calificada y no calificada, dificultando el desarrollo de la planificación. El 6 de febrero se llevo a acabo comite de veeduria.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





Avances Bloque 1 Instalacion de mamposteria y redes electricas



Comite de Veeduria







Avances Bloque 2 Se continúa mamposteria primer piso, Instalación de tomas e interruptores eléctricos instalacion de cerchas, gatos y tijeras para tendido. instalación de acero de refuerzo principal y estribos de vigas aéreas. fijado de acero de losa técnica de bloque 2 segundo piso.







Fundicion de Columnetas de muro perimetral | **Avances Bloque 4 Retiro de formaleta y tendido de vigas aereas** | **Excavacion de para cimentación muro de contención de acceso**

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No.933 DE 2023

Informe No.	**16**
Fecha	**28 de febrero de 2025**
Departamento	**CAUCA**
Municipio	**TIMBA**
Entidad Beneficiaria	**ESE NORTE 1**
Objeto del Proyecto:	**CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUNTO DE ATENCIÓN TIMBA – CAUCA QUE SE EJECUTARÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD NACIONAL".**

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	$ 12.822.328.154,00	incluye valor de obra e interventoria			
Fecha de Presentación Proyecto	26 DE SEPTIMBRE DE 2022				
Fecha de aprobación Proyecto	30 DE ENERO DE 2023				
COFINANCIACION	**MSPS**	**ESE**	**Municipio**	**Departamento**	**TOTAL**
Valor Aporte Cofinanciación	$ 12.822.328.154,00			XXXXX	$ -
Acto Administrativo de asignación	933 de 2023				
Valor Inicial	$ 12.822.328.154,00				
Adicional 1 Modificatorio 1 29/11/2024	$ 21.902.122,00				**$ 12.844.230.276,00**
Valor Total:	**$ 12.844.230.276,00**		$ -	**$ -**	
Fecha de giro proyecto Inicial	29 de junio de 2023				
Plazo Inicial de Ejecución:	16 MESES				
Plazo Prorrogá 1	6 MESES				
Plazo de Ejecución Final:	22 MESES				

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Se recomienda a los Contratistas de obra e interventoria y la supervision implementar un plan de contingencia para evitar un atraso en el desarrollo del proyecto.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Se realizara el seguimiento a las actividades que se vienen desarrollando en la ejecucion del proyecto, de acuerdo a la programacion establecida.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos	**31/03/2024**	**5**	**Acta parcial de obra**	**28/12/2024**	**9**	**Consignación recursos no ejecutados**	
Lineamientos tecnicoejecución de recursos	**31/05/2024**	**6**	**Informes**	**7/02/2025**	**10**	**Relacion de rendimientos**	**30/09/2024**
Contratos	**31/01/2025**	**7**	**Acta liquidación**		**11**	**Consignacion de reintegro rendimientos**	**30/09/2024**
Polizas	**31/01/2025**	**8**	**Reintegro de recursos no ejecutados**		**12**	**Comunicaciones**	**31/01/2025**

Elaborado por:	Revisador por:		
Nombre: **DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS**	Nombre: **YAURY IVAN DIAZ LOPEZ**		Fecha de Elaboración: 25/02/2025
Cargo: SUPERVISOR	Cargo: PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO MINSALUD		Pag. 1

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2025-02-27, 08:24:09 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 76353940

Periodo Cotización: febrero de 2025

Periodo Servicio: febrero de 2025

PAGADO 27/02/2025

Datos del Aportante

Razón Social	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		
Documento	CC31714327	**Dirección**	AV. CALLE 77 NORTE #3 N - 35 CIUDADELA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4330701
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 111.400	$ 0	$ 111.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
Total Pagado				$ 567.400	$ 0	$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-02-27, 08:15:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 31714327
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76353940
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1295418697
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 567.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 111.400	$ 0
		SubTotales:		$ 567.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 567.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante

de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: DIANA CAROLINA MUÑOZ ROJAS

Nro. de recibo: 76353940

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: CC

Razón Social: 31714327

Fecha y hora de la transacción: Jueves 27 de Febrero de 2025 08:16:50 AM

Nro. de comprobante: 0000062204

Valor pagado: $ 567,400.00

Producto: *******8415

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIANA MUÑOZ ROJAS INGENIERA CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52d2ed1aacf2a7c66ef822286cc536f9b0feaa52483bf680aff597c8aa9c19504f290cbd30fb92925dbec40f7ad0e4bc

Número de Factura: FEVD-210
Fecha de Emisión: 26/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ ROJAS DIANA CAROLINA
Nombre Comercial: MUÑOZ ROJAS DIANA CAROLINA
Nit del Emisor: 31714327
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112;9319

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 77 3 N 35 BRR FLORALIA
Teléfono / Móvil: 3116433720
Correo: dianarojas.ingcivil@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9001460106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Buenos Aires
Dirección: CALLE PRINCIPAL BUENOS AIRES CAUCA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: administracion@esenorte1.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	80101706	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 025 2025 COMO INGENIERA CIVIL PARA LA SUPERVISION A L CONTRATO DE INTEERV ENTORIA No NOR1ESECA U 02 2023 INT TECNICA A DMINISTRATIVA Y FINAN CIERA JURIDICA Y CONT ABLE CONST CENTRO SAL UD TIMBA	NIU	1,00	$ 4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: Pago Mes de Febrero 2025

Datos Totales

Documento generado el:
26/02/2025 17:27:23
Documento validado por la DIAN:
26/02/2025 17:27:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074799828 Rango desde: 201 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-07-10

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Fwd: FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

6 mensajes

Vivian Anyeli Rivera Corrales <vivian.rivera@cauca.gov.co> 5 de febrero de 2025, 9:13 p.m.
Para: gerencia gerencia <gerencia@esetimbio.gov.co>, "SECRETARIA.GERENCIA.ESE.TIMBIO" <secretariagerenciaesetimbio@gmail.com>, supervisión técnica hospital Timbio <supervisionhospitaltimbio@gmail.com>, Supervision Obra Quilisalud <supervisionobraquilisalud@gmail.com>, contactenos@quilisalud.gov.co, gerencia Hospital <gerencia@hospitalsanjose.gov.co>, planeacion Hospital <planeacion@hospitalsanjose.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>, consorcioevolet@gmail.com, michelleproano@yahoo.com
CC: Didier Iván Golondrino Leon <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>

Atento saludo.

Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, remito para su conocimiento el nuevo formato del informe de ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria que están en desarrollo, deben diligenciarlos a partir de ahora y cargarlos en PISIS en las fechas establecidas.

Cordialmente.

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

Por lo anterior agradezco su atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Andres Felipe Sossa Caballero
Profesional
asossa@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305043 Ext. 1774
Subdirección de Infraestructura en Salud
Carrera 13 N° 32 – 76 Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co
Antes de imprimir este mensaje piensa bien si es necesario hacerlo.

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

FORMATO SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBD. INFRAESTRUCTURA EN SALUD (1).xlsx
33K

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 5 de febrero de 2025, 9:34 p.m.
Para: Vivian Anyeli Rivera Corrales <vivian.rivera@cauca.gov.co>
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo.

Espero este bien, informarle que el nuevo formato enviado a su email desde la Ese Norte 1 se implementó desde el mes de diciembre por ello le envíe copia de los dos meses ya se encuentran validados por el supervisor Ing Yauri Diaz.

Gracias por su atención.

El mié, 5 feb 2025 a la(s) 9:14 p.m., Vivian Anyeli Rivera Corrales (vivian.rivera@cauca.gov.co) escribió:

> Atento saludo.
>
> Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, remito para su conocimiento el nuevo formato del informe de ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria que están en desarrollo, deben diligenciarlos a partir de ahora y cargarlos en PISIS en las fechas establecidas.
>
> Cordialmente.

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

Por lo anterior agradezco su atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Andres Felipe Sossa Caballero
Profesional
asossa@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305043 Ext. 1774
Subdirección de Infraestructura en Salud
Carrera 13 N° 32 – 76 Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co

Antes de imprimir este mensaje piensa bien si es necesario hacerlo.

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

Vivian Anyeli Rivera Corrales <vivian.rivera@cauca.gov.co> 5 de febrero de 2025, 9:47 p.m.
Para: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Muchas gracias por la claridad.

Feliz noche

El mié, 5 feb 2025 a las 21:35, construccionhtimba (<construccionhtimba@gmail.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Espero este bien, informarle que el nuevo formato enviado a su email desde la Ese Norte 1 se implementó desde el mes de diciembre por ello le envíe copia de los dos meses ya se encuentran validados por el supervisor Ing Yauri Diaz.
>
> Gracias por su atención.
>
> El mié, 5 feb 2025 a la(s) 9:14 p.m., Vivian Anyeli Rivera Corrales (vivian.rivera@cauca.gov.co) escribió:
>
> > Atento saludo.
> >
> > Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, remito para su conocimiento el nuevo formato del informe de ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria que están en desarrollo, deben diligenciarlos a partir de ahora y cargarlos en PISIS en las fechas establecidas.
> >
> > Cordialmente.

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

Por lo anterior agradezco su atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Andres Felipe Sossa Caballero
Profesional
asossa@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305043 Ext. 1774
Subdirección de Infraestructura en Salud
Carrera 13 N° 32 – 76 Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co

Antes de imprimir este mensaje piensa bien si es necesario hacerlo.

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

---

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 7:12 a.m.
Para: martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>, CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta el correo adjunto de la secretaria de salud solicito comedidamente no bajar la guardia con la entrega oportuna de los informes en especial de obra para que interventoria pueda entregar todo debidamente soportado y a su vez la supervisión cargar toda la información en pisis la cual la realiza el encargado de la Sistemas de la ESE .

Tener presente que el informe que se carga en pisis es el de interventoria con anexos.

Informe que se radica en ventanilla es sin anexos.

Relaciono a continuacion las fechas de corte de informes. Gracias

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

---------- Forwarded message ---------
De: **Vivian Anyeli Rivera Corrales** <vivian.rivera@cauca.gov.co>
Date: mié, 5 de feb de 2025, 9:14 p. m.

Subject: Fwd: FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
To: gerencia gerencia <gerencia@esetimbio.gov.co>, SECRETARIA.GERENCIA.ESE.TIMBIO <secretariagerenciaesetimbio@gmail.com>, supervisión técnica hospital Timbio <supervisionhospitaltimbio@gmail.com>, Supervision Obra Quilisalud <supervisionobraquilisalud@gmail.com>, <contactenos@quilisalud.gov.co>, gerencia Hospital <gerencia@hospitalsanjose.gov.co>, planeacion Hospital <planeacion@hospitalsanjose.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>, <consorcioevolet@gmail.com>, <michelleproano@yahoo.com>
Cc: Didier Iván Golondrino Leon <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>

Atento saludo.

Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, remito para su conocimiento el nuevo formato del informe de ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria que están en desarrollo, deben diligenciarlos a partir de ahora y cargarlos en PISIS en las fechas establecidas.

Cordialmente.

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

Por lo anterior agradezco su atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Andres Felipe Sossa Caballero
Profesional
asossa@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305043 Ext. 1774
Subdirección de Infraestructura en Salud
Carrera 13 N° 32 – 76 Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co
Antes de imprimir este mensaje piensa bien si es necesario hacerlo.

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

FORMATO SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBD. INFRAESTRUCTURA EN SALUD (1).xlsx
33K

Contactenos EseNorte1 <contactenos@esenorte1.gov.co> 6 de febrero de 2025, 7:42 a.m.
Para: construccionhtimba@gmail.com

Cordialmente;

Luisa Marcela Diaz A.
Secretaria Ejecutiva
ESE Norte 1

---------- Forwarded message ---------
De: **gerencia gerencia** <gerencia@esenorte1.gov.co>
Date: mié, 5 feb 2025 a las 21:21

Subject: Fwd: FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
To: Contactenos EseNorte1 <contactenos@esenorte1.gov.co>

Luisa
Por favor le reenvías este correo a la ingeniera Diana, supervisora d ella obra de Timba.
Gracias

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
Gerente
ESE NORTE 1

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Vivian Anyeli Rivera Corrales** <vivian.rivera@cauca.gov.co>
Fecha: El mié, 5 feb. 2025 a la(s) 9:14 p.m.
Asunto: Fwd: FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Para: gerencia gerencia <gerencia@esetimbio.gov.co>, SECRETARIA.GERENCIA.ESE.TIMBIO <secretariagerenciaesetimbio@gmail.com>, supervisión técnica hospital Timbio <supervisionhospitaltimbio@gmail.com>, Supervision Obra Quilisalud <supervisionobraquilisalud@gmail.com>, <contactenos@quilisalud.gov.co>, gerencia Hospital <gerencia@hospitalsanjose.gov.co>, planeacion Hospital <planeacion@hospitalsanjose.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>, <consorcioevolet@gmail.com>, <michelleproano@yahoo.com>
Cc: Didier Iván Golondrino Leon <didiergolondrino.salud@cauca.gov.co>

Atento saludo.

Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, remito para su conocimiento el nuevo formato del informe de ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria que están en desarrollo, deben diligenciarlos a partir de ahora y cargarlos en PISIS en las fechas establecidas.

Cordialmente.

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

Por lo anterior agradezco su atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Andres Felipe Sossa Caballero
Profesional
asossa@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305043 Ext. 1774
Subdirección de Infraestructura en Salud
Carrera 13 N° 32 – 76 Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co
Antes de imprimir este mensaje piensa bien si es necesario hacerlo.

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

FORMATO SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBD. INFRAESTRUCTURA EN SALUD (1).xlsx
33K

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 7:48 a.m.
Para: contactenos@esenorte1.gov.co

Cordial saludo.

Espero este bien, informarle que el nuevo formato desde la Ese Norte 1 se implementó desde el mes de diciembre por ello le envíe copia de los dos meses a la secretaria de salud. A la señora Vivian Anyeli Rivera Corrales

Gracias por su atención.

---------- Forwarded message ---------
De: **construccionhtimba** <construccionhtimba@gmail.com>
Date: mié, 5 de feb de 2025, 9:34 p. m.
Subject: Re: FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
To: Vivian Anyeli Rivera Corrales <vivian.rivera@cauca.gov.co>
Cc: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo.

Espero este bien, informarle que el nuevo formato enviado a su email desde la Ese Norte 1 se implementó desde el mes de diciembre por ello le envíe copia de los dos meses ya se encuentran validados por el supervisor Ing Yauri Diaz.

Gracias por su atención.

El mié, 5 feb 2025 a la(s) 9:14 p.m., Vivian Anyeli Rivera Corrales (vivian.rivera@cauca.gov.co) escribió:

> Atento saludo.
>
> Siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud, remito para su conocimiento el nuevo formato del informe de ejecución de los proyectos de infraestructura hospitalaria que están en desarrollo, deben diligenciarlos a partir de ahora y cargarlos en PISIS en las fechas establecidas.
>
> Cordialmente.

Cordial saludo.

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de enviar el formato actualizado de informe de ejecución de proyectos de infraestructura que son financiados con recursos del Ministerio de Salud y Protección Social, es importante citar que a partir del próximo informe el plazo máximo para enviar dichos informes en formato de Excel para la revisión por parte del Ministerios es hasta el día 25 de cada mes, por lo anterior las actividades de ejecución serán en los periodos entre el 26 al 25.

Por lo anterior agradezco su atención prestada.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ing. Andres Felipe Sossa Caballero
Profesional
asossa@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305043 Ext. 1774
Subdirección de Infraestructura en Salud
Carrera 13 N° 32 – 76 Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co
Antes de imprimir este mensaje piensa bien si es necesario hacerlo.

--

Gobernación del CAUCA

Vivian Anyeli Rivera Corrales
Líder de Programa
Proceso Gestión de la Provisión de Servicios Individuales
Email: vivian.rivera@cauca.gov.co
Dirección: Calle 1N 2-80
Popayán- Cauca
www.cauca.gov.co

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - Confirmación de Radicación IdControl: 550518

1 mensaje

Notificaciones SGDEA <notificaciones_sgdea@minsalud.gov.co> 6 de febrero de 2025, 2:09 p.m.
Para: "construccionhtimba@gmail.com" <construccionhtimba@gmail.com>

Hemos recibido su correo electrónico, le informamos que los datos de su radicado son los siguientes:

Documento con IdControl:
550518

Radicado:
2025423000360852

Detalle:
INFORME CENTRO DE SALUD TIMBA CAUCA ENERO 2025

Código de verificación:
Y9ORL

Fecha Radicado:
06/02/2025

Podrá consultar el estado de su documento dando click Aquí

Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

¡Este correo fue generado automáticamente por el sistema SGDEA ControlDoc!

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

IHT 085 SOLICTUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS POR MODIFICATORIO NO. 2

1 mensaje

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 10 de febrero de 2025, 9:28 a.m.
Para: CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>
CC: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Cordial saludo
Señores
Consorcio TC23

Por medio del presente correo remito oficio IHT 085, para su conocimiento y oportuna gestión.
Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente:
Consorcio IHT
Interventoría Timba

IHT-085 SOLICITUD DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS POR MOD NO. 2.pdf
82K

Timba, febrero 10 del 2024

Señora
Lorny Yargot Sandoval Dominguez
Representante Legal IHT- 085
Consorcio TC 23

Referencia: Proyecto "Construcción Del Centro De Salud Punto De AtenciónTimba-Cauca"
Contrato de Interventoría NOR 1 ESE-CAU-02-2023

Asunto: Solicitud de pólizas actualizadas por modificatorio No. 2

Cordial saludo,

En atención al modificatorio No. 2 del 16 de enero de 2024 efectuado por la Empresa Social del Estado ESE Norte 1 al contrato de obra NOR1ESE-CAU-01-2023 referente a la cesión parcial del mismo; en donde el integrante del CONSORCIO T-C 23, a saber, CRISTIAN FERNANDO SAMBONÍ VELASCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.706.791, cedió su porcentaje de participación del 20%; quedando como cesionaria la empresa ANVAL ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS con NIT 901720532-4 y así mismo a partir de la fecha represente legal del consorcio TC-23 en cabeza de LORNY YARGOT SANDOVAL DOMINGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 34.566.969. En ese sentido, se le solicita la entrega de las pólizas actualizadas que amparan el contrato NOR1ESE-CAU-01-2023 en los términos del modificatorio no. 2 siendo una obligación de usted como contratista.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y su respuesta con la documentación requerida en la mayor brevedad.

Atentamente,



Carlos Andrés Pachón Ávila
Representante Legal Consorcio IHT

Cra 112 No. 44-21 conjunto Palmeras de Brocha
consorcioiht@gmail.com
3232987807

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

SOLICITUD PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEMANA 10-15 DE FEBRERO

2 mensajes

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 10 de febrero de 2025, 8:13 a.m.
Para: CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>
CC: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Señores
Consorcio TC 23

Por medio del presente correo, solicito muy amablemente la programación de actividades para esta semana del 10-15 de febrero de tal manera que se pueda efectuar el seguimiento requerido a cada una de las actividades en ejecución y establecer las liberaciones de campo pertinentes.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y su pronta respuesta.
Atentamente:
INTERVENTORIA
Consorcio IHT

CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com> 10 de febrero de 2025, 10:13 a.m.
Para: Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com>
CC: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Arquitecto
CARLOS ANDRÉS PACHÓN ÁVILA
RL. CONSORCIO IHT

Cordial saludo.

Remito la relación de las actividades programadas para la semana comprendida entre el 10 al 715 de febrero del presente año, para su conocimiento y fines pertinentes.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2025

	NOMBRE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DURACION (DIAS)
	BLOQUE 1			
	MAMPOSTERÍA			
9.1	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO10X23X40	**10/02/2025**	**12/02/2025**	**2**
9.3	ANCLAJES PARA DOVELAS			**0**
	BLOQUE 2			
3.2	**VIGAS AÉREAS N 7,70M**			
4.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
	MAMPOSTERÍA			**0**
9.1	MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO10X23X40	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
9.3	ANCLAJES PARA DOVELAS	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2	**RED SANITARIA.**			**0**
5.2.1	TUBERIA PVC 2" SANI	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.2	TUBERIA PVC 3" SANI	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.3	TUBERIA PVC 4" SANI	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.4	TUBERIA PVC 6" SANI	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.9	CODO 90° 2" CC	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.10	CODO 45° 2" CC	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.11	YEE SANITARIA SENCILLA 2"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.12	TAPÓN SANITARIO 2"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.13	CODO 90° 3"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.14	CODO 3"X45 CC	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.15	YEE SANITARIA SENCILLA 3"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.16	YEE SANITARIA REDUCIDA 3X2"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**

5.2.17	TAPON SANITARIO 3"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.18	CODO 4"X45 CC	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.19	CODO 4" X 90	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.20	YEE SANITARIA SENCILLA 4"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.21	TAPON SANITARIO 4"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.22	UNION 4" SANIT	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.23	YEE SANITARIA SENCILLA 4X2"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.24	YEE SANITARIA SENCILLA 4X3"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.25	BUJE SAN PVC 4X3"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.26	BUJE SAN PVC 4X2"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.27	YEE SANITARIA SENCILLA 6X4"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.28	UNION 6" SANIT	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.30	BUJE SAN PVC 6X4"	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.31	SIFON SANITARIO PVC 3" INCLUYE REJILLA	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
5.2.32	SIFON SANITARIO PVC 4" INCLUYE REJILLA	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
8.4	**CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE**			
8.4.1	CONDUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24.	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
8.4.2	AISLAMIENTO DE CONDUCTOS EN YUMBOLON.	**10/02/2025**	**15/02/2025**	**5**
		10/02/2025	**15/02/2025**	**5**
		10/02/2025	**15/02/2025**	**5**
		10/02/2025	**15/02/2025**	**5**

Fecha inicio	10/02/2025
Fecha fin	15/02/2025
Fecha actual	10/02/2025

Sin otro particular, gracias por su atención.
Cordialmente,

CONSORCIO TC-23
[Texto citado oculto]

PROGRAMACIÓN SEMANA 61-TIMBA.xlsx
22K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

SEGUIMIENTO A AVANCE DE OBRA Y SOLICITU DE PLAN DE CONTINGENCIA

1 mensaje

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 4:53 p.m.
Para: CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>
CC: construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Señores,
Consorcio TC 23

Por medio de la presente, me permito remitir oficio IHT 086 para su conocimiento y pronta respuesta.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Atentamente:
CONSORCIO IHT
Interventoría Timba.

IHT-086 AVANCE DE OBRA.pdf
81K

Timba, febrero 25 del 2025

Señora,

Lorny Yargot Sandoval Dominguez
Representante Legal IHT- 086
Consorcio TC 23

Referencia: Proyecto "Construcción Del Centro De Salud Punto De AtenciónTimba-Cauca"
Contrato de Interventoría NOR 1 ESE-CAU-02-2023

Asunto: Seguimiento a avance de obra y solicitud de Plan de Contingencia.

Cordial saludo,

En atención al estado físico actual de la obra con relación a la programación vigente, esta interventoría en el ejercicio de sus funciones ha evidenciado un atraso en ejecución que alcanza el 3% según los indicadores mensuales para el presente periodo que establecen un programado del 63.99%, por lo cual, conforme al desempeño a la fecha, la ejecución no tiende a superar la curva de programación para la fecha de corte del mes de febrero, siendo una obligación de usted como contratista dar estricto cumplimiento al cronograma de obra y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, según lo establecido en el contrato de obra NOR1ESE-CAU-01-2023.

En ese sentido, la interventoría reitera su preocupación por el alcance de las metas físicas considerando que para el periodo actual en función de la programación de obra vigente las actividades del capítulo 2. *ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO* deberían estar concluidas y así mismo posibilitar la culminación de las obras en *CUBIERTA* que corresponden a la construcción y montaje de estructura metálica, suministro e instalación de teja, alfagías, canales y demás. Por otra parte, se debe contar con la planificación e integración adecuada para dar inicio a las ingenierías que comprenden: red hidráulica, red de aire acondicionado, red contraincendios y red eléctrica.

De tal manera que, se le solicita al consorcio contratista formalizar la entrega en un documento digital del **plan de contingencia** a implementar en obra desde el mes de marzo ante las situaciones presentadas actualmente y en concordancia con las necesidades del proyecto que

permitan dar alcance de manera asertiva a los índices presupuestales mensuales; de no lograr contrarrestar los efectos en materia de ejecución, esta interventoría evaluará objetivamente cada una de las causas que han conllevado a tal situación, tal como se ha realizado en el transcurso del proyecto, a fin de velar por los intereses de la entidad contratante y tomar las decisiones y correctivos pertinentes.

Atentamente,



Carlos Andrés Pachón Ávila
Representante Legal Consorcio IHT

Gmail **construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>**

OFICIO IHT 087 PROGRAMACIÓN DE COMITÉS CON ESPECIALISTAS

1 mensaje

Interventoría Timba <interventoria.timba@gmail.com> 26 de febrero de 2025, 6:08 a.m.
Para: CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>, construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Señores,
Consorcio TC-23

Por medio de la presente remito oficio IHT 087 relacionado con la solicitud de programación de comités con especialistas de ingenierías.

Agradezco su oportuna respuesta. Quedo atento a sus confirmaciones y cualquier observación y/o modificación en la programación.

Atentamente:
Consorcio IHT
Interventoría.

IHT-087 COMITÉS CON ESPECIALIDADES.pdf
83K

Timba, febrero 26 del 2025

Señora,
Lorny Yargot Sandoval Domínguez
Representante Legal IHT- 087
Consorcio TC 23

Referencia: Proyecto "Construcción Del Centro De Salud Punto De AtenciónTimba-Cauca"
Contrato de Interventoría NOR 1 ESE-CAU-02-2023

Asunto: Programación de comités con especialistas de ingenierías.

Cordial saludo,

En aras de articular el trabajo colaborativo entre las partes involucradas y en atención a las necesidades actuales de la obra enfocadas en dar alcance a los requerimientos técnicos para la adecuada integración de las diferentes redes que componen el proyecto, como lo son, aire acondicionado, hidrosanitaria, contraincendios, eléctrica y gases medicinales; esta interventoría solicita al consorcio contratista la realización de comités con cada uno de los especialistas responsables, a fin de revisar, analizar y/o ajustar los detalles constructivos necesarios para la correcta implementación en obra. Se le recuerda al consorcio contratista que toda actividad debe ser validada primero por esta interventoría antes de ejecutarse en obra.

Siendo así, se propone la siguiente programación de comités:

Componente	Fecha
Aire Acondicionado	Viernes 28 de febrero de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Hidrosanitaria y Contraincendios	Viernes 07 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Eléctrica	Viernes 14 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Gases Medicinales	Viernes 21 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Arquitectura	Viernes 28 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.

Se agradece la confirmación de asistencia por parte de los interesados y en caso de presentarse alguna objeción y/o modificación en las fechas estipuladas informar pertinentemente.

Sin otro particular,

Atentamente



Carlos Andrés Pachón Ávila
Representante Legal Consorcio IHT

Cra 112 No. 44-21 conjunto Palmeras de Brocha
consorcioiht@gmail.com
3232987807

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Información de situación de orden público centro Salud Timba.

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 4 de febrero de 2025, 5:28 p.m.
Para: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>, ydiazl@minsalud.gov.co, martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>, didiergolondrino.salud@cauca.gov.co

Cordial saludo.

La presente es con el fin de reportar las situaciones de orden público que se han venido presentando en la obra.

1. Enfrentamientos cercanos a la obra.
2. Instalación de vallas de grupos al margen de ley.
3. Panfletos digitales sobre la movilización de la comunidad en la zona.

Gracias por au atención.

Atentamente

Diana muñoz
Supervisora



IMG-20250204-WA0055.jpg
156K

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORME DE SEGUIMIENTO CENTRO SALUD TIMBA CAUCA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 5 de febrero de 2025, 9:26 a.m.
Para: didiergolondrino.salud@cauca.gov.co, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>, vivian.rivera@cauca.gov.co

Cordial saludo , adjunto informe de seguimiento de la obra de la referencia

Formato de Seguimiento Proyecto Timba Cauca Enero 2025.xlsx

Atentamente

Diana Carolina Muño Rojas
Supervisor

FORMATO SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBD. INFRAESTRUCTURA EN SALUD diciembre.xlsx
11710K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORME CENTRO DE SALUD TIMBA CAUCA ENERO 2025

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 12:22 p.m.
Para: Correo <correo@minsalud.gov.co>
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, ydiazl@minsalud.gov.co, martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>

Cordial saludo.

Adjunto informe del proyecto de referencia.

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

2 archivos adjuntos

INFORME_INTERVENTORÍA_ENERO 2025.pdf
3033K

Formato de Seguimiento Proyecto Timba Cauca - Enero 2025.pdf
336K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Información Cargue en Pisis Centro Salud Timba

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 6 de febrero de 2025, 12:47 p.m.
Para: "Ing. Rodrigo Gómez G." <sistemas@esenorte1.gov.co>
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo.Ing

Adjunto información ajustado por favor para cargue en el PISIS así:

Carpeta #6 -2025 -Febrero

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1mUXAYQ1bBwglTaUoDMCcZ6l17Sx0BX7-

gracias por su atención

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Solicitud de prgramación de Comite de Ingenierias Centro Salud Timba Cauca

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 8:00 a.m.
Para: martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>
CC: CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo .

Solicito comedidamente la programación de comités de obra de cada una de las ingenierías teniendo en cuenta el inicio de instalación de redes con el fin de revisar avances por parte del contratista y validaciones realizadas por parte de la interventoría. Es de vital importancia para los comités contar con los profesionales de la ESE NORTE 1 y de la Secretaría de Salud si es necesario y los profesionales pares de cada ingeniería.

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

SOLICITUD REVISION Y FIRMA ACTA COMITE CENTRO SALUD TIMBA CAUCA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 8:00 a.m.
Para: didiergolondrino.salud@cauca.gov.co
CC: martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>

Cordial saludo. Ing Didier.

La presente adjunto el acta de comité de la obra de referencia por favor para su revisión y aprobación y firma.

Atentamente.

Diana Carolina Muñoz Rojas
Suprevisor Ese Norte 1

1. ACTA COMITE CON MINISTERIO 2-10-2024 firma ingeniero didier.pdf
688K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Solicitud Informes Obra Centro de Salud Timba Cauca

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 8:00 a.m.
Para: martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>, CONSORCIO TC23 <consorciot.c23@gmail.com>
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo.

La presente para recordarle el compromiso de entrega oportuna de los informes de obra e interventoría con el fin de realizar el cargue a la plataforma Pisis en los tiempos correspondientes.

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor ESE NORTE 1

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

INFORME DE SEGUIMIENTO FEBRERO CENTRO DE SALUD TIMBA CAUCA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 8:00 a.m.
Para: ydiazl@minsalud.gov.co
CC: Vivian Anyeli Rivera Corrales <vivian.rivera@cauca.gov.co>, didiergolondrino.salud@cauca.gov.co, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, contactenos@esenorte1.gov.co

Cordial saludo. Ing Yauri

Adjunta formato de seguimiento de la obra de referencia para trámite pertinente. gracias

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

Formato de Seguimiento Proyecto Timba Cauca Febrero 2025.xlsx
14431K

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Solicitud Rendimientos financiero Obra Centro Salud Timba Cauca

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 25 de febrero de 2025, 8:00 a.m.
Para: administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>, gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>

Cordial saludo,

Don Diego para recordarle por favor que me apoye con la relación de rendimientos financieros, soportes de pago a la cuenta del MSPS. y los extractos bancarios.

Gracias

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

Gmail construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

PROGRAMACIÓN COMITÉS VIRTUAL ESPECIALISTAS CENTRO DE SALUD TIMBA

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 26 de febrero de 2025, 9:35 a.m.
Para: milenadelgo@hotmail.com, proyectosbiomec@gmail.com
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, contactenos@esenorte1.gov.co, administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>, martin morillo <Interventoria.timba@gmail.com>, didiergolondrino.salud@cauca.gov.co

Cordial saludo.

La presente es con el fin de extender la invitación a participar de los comités de obra de cada una de las especialidades con el fin de ir avanzando de la experiencia de cada par de profesionales en esta etapa de instalación de redes.

Adjunto oficio de programación de comités para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco su valiosa participación.

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor

IHT-087 COMITÉS CON ESPECIALIDADES.pdf
83K

Timba, febrero 26 del 2025

Señora,
Lorny Yargot Sandoval Domínguez
Representante Legal IHT- 087
Consorcio TC 23

Referencia: Proyecto "Construcción Del Centro De Salud Punto De AtenciónTimba-Cauca"
Contrato de Interventoría NOR 1 ESE-CAU-02-2023

Asunto: Programación de comités con especialistas de ingenierías.

Cordial saludo,

En aras de articular el trabajo colaborativo entre las partes involucradas y en atención a las necesidades actuales de la obra enfocadas en dar alcance a los requerimientos técnicos para la adecuada integración de las diferentes redes que componen el proyecto, como lo son, aire acondicionado, hidrosanitaria, contraincendios, eléctrica y gases medicinales; esta interventoría solicita al consorcio contratista la realización de comités con cada uno de los especialistas responsables, a fin de revisar, analizar y/o ajustar los detalles constructivos necesarios para la correcta implementación en obra. Se le recuerda al consorcio contratista que toda actividad debe ser validada primero por esta interventoría antes de ejecutarse en obra.

Siendo así, se propone la siguiente programación de comités:

Componente	Fecha
Aire Acondicionado	Viernes 28 de febrero de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Hidrosanitaria y Contraincendios	Viernes 07 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Eléctrica	Viernes 14 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Gases Medicinales	Viernes 21 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.
Arquitectura	Viernes 28 de marzo de 2025. Hora: 8:00 a.m.

Se agradece la confirmación de asistencia por parte de los interesados y en caso de presentarse alguna objeción y/o modificación en las fechas estipuladas informar pertinentemente.

Sin otro particular,

Atentamente



Carlos Andrés Pachón Ávila
Representante Legal Consorcio IHT

Cra 112 No. 44-21 conjunto Palmeras de Brocha
consorcioiht@gmail.com
3232987807

Gmail

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com>

Información Cargue en Pisis Centro Salud Timba

1 mensaje

construccionhtimba <construccionhtimba@gmail.com> 27 de febrero de 2025, 11:37 a.m.
Para: "Ing. Rodrigo Gómez G." <sistemas@esenorte1.gov.co>
CC: gerencia gerencia <gerencia@esenorte1.gov.co>, administracion administracion <administracion@esenorte1.gov.co>, contactenos@esenorte1.gov.co

Adjunto información ajustado por favor para cargue en el PISIS así:

Carpeta #5 -2025 -Febrero Acta Parcial de Obra No. 4
Carpeta #6 -2025 -Febrero -Febrero Formato de Seguimiento Proyecto Timba Cauca Febrero 2025

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1mUXAYQ1bBwglTaUoDMCcZ6l17Sx0BX7-

gracias por su atención

Atentamente

Diana Carolina Muñoz Rojas
Supervisor
