
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbanizarte


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 1499	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

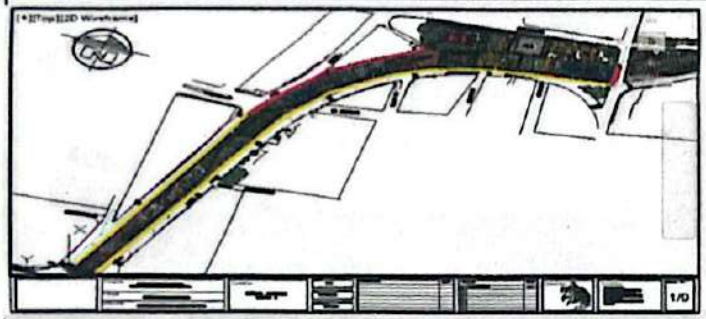

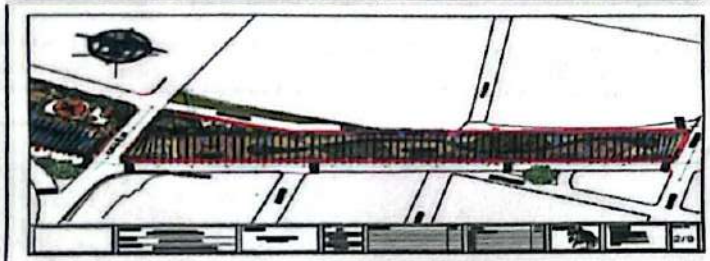

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V77 -V102	68.76	1.00		M2	1.00		68.76	
CARRERA 24	V-139	20.00	1.00		M2	1.00		20.00	
TRAMO 2									
CALLE 24	VIG 140	20.00	1.00		M2	1.00		20.00	
COSTADO DERECHO	V140 - V213	211.87	1.00		M2	1.00		211.87	
COSTADO IZQUIERDO	DIAGONAL V149 - VIG 170	68.17	1.00		M2	1.00		68.17	
	VIG 181- VIG 213	94.32	1.00		M2	1.00		94.32	
CALLE 21	VIG 213	20.00	1.00		M2	1.00		20.00	

CANTIDAD CONTRACTUAL	4549.00	*
ACUMULADO ANTERIOR	608.85	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1111.97	
OBRA A EJECUTAR	3437.03	

TOTAL PRESENTE ACTA:	503.12

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	AD-04	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

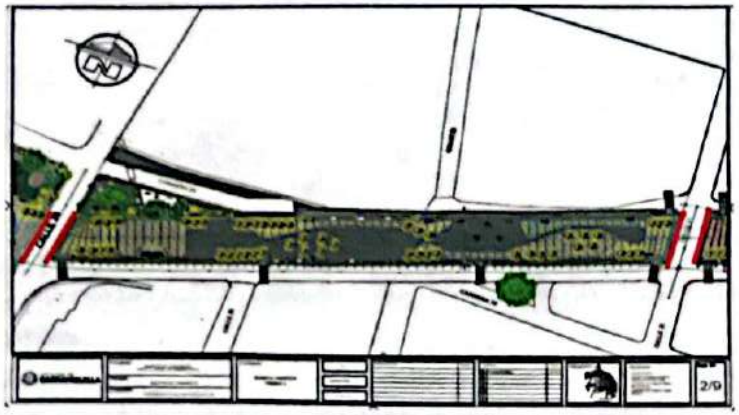

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
COSTADO IZQUIERDO								
V99-V102	9.00	0.30		ML	1.00	9.00		
TRAMO 2								
CALLE 24	20.00	0.30		ML	1.00	20.00		
CALLE 24	0.80	0.30		ML	1.00	0.80		
CALLE 21	20.00	0.30		ML	1.00	20.00		
CALLE 21	0.80	0.30		ML	1.00	0.80		

CANTIDAD CONTRACTUAL	356.00
ACUMULADO ANTERIOR	18.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	68.60
OBRA A EJECUTAR	287.40

TOTAL PRESENTE ACTA: 80.60

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 857	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

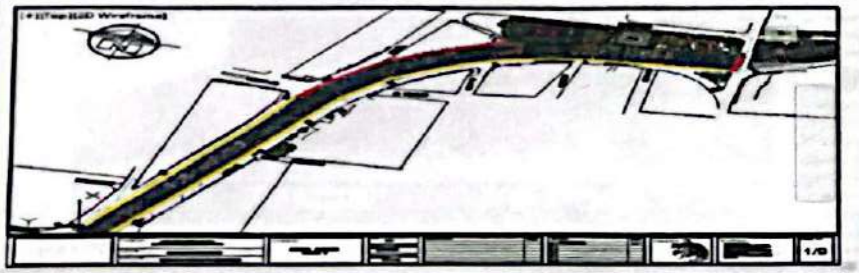



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V77 -V102	68.76			ML	68.76	68.76		
CARRERA 24	V-139	20.00			ML	20.00	20.00		
TRAMO 2									
CALLE 24	VIG 140	20.00			ML	20.00	20.00		
COSTADO DERECHO	V140 - V213	211.87			ML	211.87	211.87		
COSTADO IZQUIERDO	DIAGONAL V149 - VIG 170	68.17			ML	68.17	68.17		
	VIG 181- VIG 213	94.32			ML	94.32	94.32		
CALLE 21	VIG 213	20.00			ML	20.00	20.00		

CANTIDAD CONTRACTUAL	3133.00
ACUMULADO ANTERIOR	643.15
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1146.27
OBRA A EJECUTAR	1986.73

TOTAL PRESENTE ACTA: 803.12

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — Nuestra Carrera 54

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES + MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 1.27	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

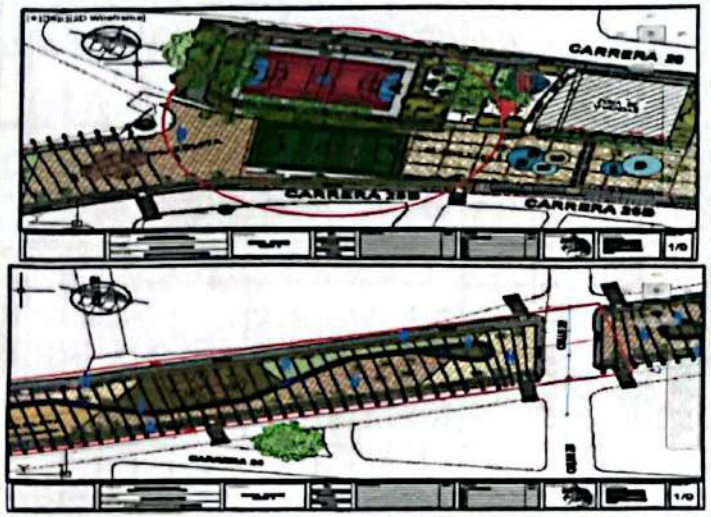

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
LEVANTAMIENTO CANCHAS				M2	1250.00		1250.00	
TRAMO 2								
VIG 161- VIG 213				M2	3361.26		3361.26	
LEVANTAMIENTO CALLE 21				M2	332.00		332.00	

CANTIDAD CONTRACTUAL	41156.00
ACUMULADO ANTERIOR	11193.86
ACUMULADO PRESENTE ACTA	16137.12
OBRA A EJECUTAR	25018.88

TOTAL PRESENTE ACTA: 4.943,26

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

CARTERA LEVANTAMIENTO ZONAS MALECON				
PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DETALLE
1	4.889.080	9.445.390	105.180	D5
2	5.077.170	8.538.070	98.120	
3	4.868.320	10.009.330	106.820	MALECON
4	5.034.020	9.984.890	115.150	MALECON
5	5.034.030	9.984.900	106.150	MALECON
6	5.369.030	9.968.000	101.630	DEL
7	5.227.750	9.839.580	100.790	ANDEN
8	5.247.360	9.835.120	100.360	ANDEN
9	5.265.670	10.005.890	102.560	ANDEN
10	5.118.490	10.040.630	101.200	ANDEN
11	5.123.220	10.057.080	101.160	ANDEN
12	5.276.820	10.020.330	102.870	ANDEN
13	5.329.420	10.241.210	104.770	ANDEN
14	5.339.290	10.238.750	104.250	ANDEN
15	5.348.740	10.420.210	106.490	ANDEN
16	5.367.470	10.412.650	106.020	ANDEN
17	5.378.660	10.409.030	105.790	BOV
18	5.458.130	10.897.640	110.210	ANDEN
19	5.463.600	10.921.320	110.550	ANDEN
20	5.478.120	10.935.410	110.410	ANDEN
21	5.497.890	10.927.410	110.290	ANDEN
22	5.495.330	10.916.200	110.270	ANDEN
23	5.493.510	10.915.810	110.320	ANDEN
24	5.481.920	10.910.970	110.290	ANDEN
25	5.306.580	10.269.300	104.600	ZRECIDEN
26	5.316.060	10.264.950	104.680	ZRECIDEN
27	5.329.340	10.241.370	104.750	ZRECIDEN
28	5.276.770	10.020.210	102.980	ZRECIDEN
29	5.069.710	10.069.530	106.750	ZRECIDEN
30	5.508.850	10.947.730	108.400	DEL
31	5.334.320	9.854.110	98.820	VIA
32	5.256.110	9.872.710	98.680	VIA
33	5.408.360	10.176.810	101.860	VIA
34	5.427.860	10.223.270	102.110	VIA
35	5.440.500	10.230.260	102.120	VIA
36	5.456.200	10.232.470	101.910	VIA
37	5.467.440	10.245.300	101.970	VIA
38	5.490.280	10.238.870	101.860	VIA
39	5.492.190	10.301.940	102.320	VIA
40	5.457.930	10.324.630	102.960	VIA
41	5.451.830	10.335.530	103.130	VIA
42	5.449.110	10.347.850	103.310	VIA
43	5.452.590	10.368.770	103.530	VIA
44	5.548.010	10.785.920	107.590	VIA
45	5.555.850	10.800.170	107.560	VIA

Scanned with CamScanner

46	5.584.940	10.815.810	107.420	VIA
47	5.604.770	10.818.660	107.450	VIA
48	5.687.840	10.793.990	106.880	VIA
49	5.732.820	10.842.650	106.630	VIA
50	5.612.720	10.879.180	107.810	VIA
51	5.587.070	10.919.940	108.340	VIA
52	5.583.930	10.929.930	108.430	VIA
53	5.585.650	10.951.840	108.570	VIA
54	5.598.330	11.008.450	109.030	VIA
55	5.518.400	11.017.710	108.800	VIA
56	5.404.280	10.518.740	104.790	VIA
57	5.232.970	10.307.190	102.760	ZRECIDEN
58	5.118.760	10.334.030	107.570	ZRECIDEN
59	5.165.180	10.610.210	108.710	CANCHAM
60	5.339.520	10.570.480	109.880	CANCHAM
61	5.413.020	10.886.800	110.440	CANCHAM
62	5.238.550	10.926.960	108.750	CANCHAM
63	5.119.510	10.576.610	111.020	CANCHA C
64	5.149.500	10.842.050	115.050	CANCHA C
65	5.028.570	10.856.600	115.620	CANCHA C
66	4.971.840	10.593.110	111.690	CANCHA C
67	5.161.970	10.841.080	112.960	MALECON
68	5.172.100	10.872.930	113.570	MALECON
69	5.381.440	10.938.150	109.970	AND
70	5.385.140	10.955.800	110.100	AND
71	5.252.470	11.029.510	108.650	LP
72	5.481.130	10.948.900	110.500	LP
73	5.502.730	11.054.360	110.950	LP
74	1.056.455	525.997	10.890	PARQ
75	1.054.805	523.599	10.850	PARQ
76	1.050.949	522.805	10.837	PARQ
77	1.053.281	512.526	10.871	PARQ
78	1.055.685	512.680	10.899	PARQ
79	1.057.381	512.960	10.914	PARQ
80	1.057.698	512.008	10.923	PARQ
81	1.059.182	497.081	11.186	CANCH
82	1.057.569	511.965	11.101	CANCH
83	1.057.400	512.974	10.847	LOSA
84	1.067.879	513.234	10.943	LOSA
85	1.071.688	513.735	11.039	LOSA
86	1.076.055	514.371	11.042	LOSA
87	1.079.037	514.900	11.119	LOSA
88	1.081.486	515.402	11.181	LOSA
89	1.084.079	516.162	11.213	LOSA
90	1.084.074	516.169	11.208	ESCALA
91	1.084.033	516.678	11.186	ESCALA
92	1.084.016	516.683	11.075	ESCALA

Scanned with CamScanner

93	1.083.939	517.170	11.063	ESCALA
94	1.083.943	517.171	10.935	ANDE
95	1.083.830	518.587	10.927	ANDE
96	1.087.168	517.034	11.387	PARQ
97	1.087.288	517.164	11.256	ESCALA
98	1.087.120	517.689	11.245	ESCALA
99	1.087.115	517.672	11.135	ESCALA
100	1.087.007	518.161	11.131	ESCALA
101	1.087.014	518.155	11.010	ANDE
102	1.086.773	519.184	10.966	ANDE
103	1.086.487	521.740	10.856	ARB
104	1.083.334	520.594	10.891	ARB
105	1.079.490	519.532	10.811	ARB
106	1.075.557	518.679	10.775	ARB
107	1.071.622	517.914	10.804	ARB
108	1.067.555	516.915	10.810	ARB
109	1.064.254	515.991	10.824	ARB
110	1.059.716	515.064	10.960	ARB
111	1.066.449	513.997	10.866	ARB
112	1.070.409	514.417	10.817	ARB
113	1.074.140	514.913	10.800	ARB
114	1.078.974	515.467	11.380	ALUMBRADO
115	1.062.670	513.842	11.217	ALUMBRADO
116	1.053.459	513.146	11.224	ALUMBRADO
117	1.052.433	516.279	10.804	REGISTRO
118	1.052.602	515.589	10.824	REGISTRO
119	1.053.295	515.757	10.833	REGISTRO
120	1.053.827	513.650	10.841	REGISTRO
121	1.053.944	512.962	10.859	REGISTRO
122	1.054.528	513.771	10.856	REGISTRO
123	1.063.089	514.891	10.894	REGISTRO
124	1.062.455	514.100	10.827	REGISTRO
125	1.062.453	514.100	10.820	REGISTRO
126	1.063.162	514.177	10.833	REGISTRO
127	1.078.298	516.885	10.787	REGISTRO
128	1.079.003	517.103	10.767	REGISTRO
129	1.078.738	517.824	10.825	REGISTRO
130	1.052.222	517.601	10.787	ZONAV
131	1.052.443	516.599	10.774	ZONAV
132	1.053.498	515.834	10.834	ZONAV
133	1.058.071	514.303	10.903	ZONAV
134	1.060.936	514.677	11.243	ZONAV
135	1.060.997	516.479	11.433	ZONAV
136	1.057.037	533.869	11.435	CANCHA
137	1.061.013	516.469	11.418	CANCHA
138	1.092.627	523.804	12.211	CANCHA
139	1.087.303	517.136	11.278	LOSA

Scanned with CamScanner

140	1.089.141	517.528	11.304	LOSA
141	1.089.596	517.417	11.156	MOJON
142	1.090.442	517.802	11.163	MOJON
143	1.090.193	518.227	11.166	MOJON
144	1.087.827	517.447	11.134	MOJON
145	1.087.863	517.275	11.126	MOJON
146	1.090.342	518.172	11.645	MURO
147	1.090.383	518.083	11.645	MURO
148	1.094.710	520.149	11.775	MURO
149	1.097.443	521.525	11.871	MURO
150	1.099.785	522.757	11.978	MURO
151	1.095.659	524.027	10.864	PN
152	1.098.031	521.884	10.774	PN
153	1.094.259	520.005	10.833	PN
154	1.092.564	523.651	10.867	PN
155	1.089.188	522.911	10.840	PN
156	1.091.009	518.525	10.855	PN
157	1.087.036	518.204	10.828	PN
158	1.086.027	522.031	10.877	PN
159	1.082.464	521.321	10.911	PN
160	1.083.977	516.176	10.617	PN
161	1.078.449	514.800	10.739	PN
162	1.077.011	520.043	10.834	PN
163	1.073.664	519.264	10.830	PN
164	1.073.920	514.376	10.771	PN
165	1.069.596	513.498	10.835	PN
166	1.068.278	517.998	10.810	PN
167	1.065.196	517.117	10.811	PN
168	1.065.476	513.251	10.873	PN
169	1.061.878	513.168	10.827	PN
170	1.083.707	520.068	10.929	ANDEN
171	1.086.458	520.628	10.963	ANDEN
172	1.093.981	524.715	10.858	ANDEN
173	1.095.612	524.660	10.825	ANDEN
174	1.095.549	528.682	10.917	ANDEN
175	1.094.045	523.977	10.848	Registro
176	1.093.360	523.849	10.852	Registro
177	1.093.906	524.670	10.860	Registro
178	1.093.468	524.777	11.021	ALUMBRADO
179	1.092.671	523.797	10.927	CANCHA
180	1.084.277	514.907	11.524	CANCHA
181	928.136	504.645	10.867	ESTR
182	927.218	506.106	10.828	ESTR
183	926.118	507.942	10.814	ESTR
184	922.644	508.850	10.381	ESTR
185	923.861	511.398	9.650	ESTR
186	927.132	510.599	9.895	ESTR

Scanned with CamScanner

187	927.484	510.610	9.902	ESTR
188	928.874	511.226	9.918	ESTR
189	929.897	513.948	9.920	ESTR
190	933.425	513.946	10.146	ESTR
191	939.299	510.895	10.204	ESTR
192	941.404	501.364	10.381	ESTR
193	1.085.986	500.106	11.679	ESTR
194	1.086.528	495.659	11.515	ESTR
195	1.076.539	496.398	11.302	ESTR
196	1.066.141	496.683	11.134	ESTR
197	1.059.250	496.420	11.083	ESTR
198	1.055.804	496.227	11.073	ESTR
199	1.053.811	496.113	11.055	ESTR
200	1.046.858	495.533	10.972	ESTR
201	1.042.444	494.994	10.947	ESTR
202	1.037.844	494.301	10.908	ESTR
203	1.032.217	493.376	10.874	ESTR
204	1.017.787	490.431	10.782	ESTR
205	1.001.061	487.033	10.740	ESTR
206	998.630	503.611	10.702	ESTR
207	998.286	505.039	10.708	ESTR
208	1.006.770	506.751	10.765	ESTR
209	1.007.871	502.151	10.738	ESTR
210	1.009.287	501.358	10.804	ESTR
211	1.034.249	506.429	11.030	ESTR
212	1.034.967	507.429	10.919	ESTR
213	1.034.401	510.446	12.067	ESTR
214	1.039.842	511.265	10.920	ESTR
215	1.043.623	511.713	10.933	ESTR
216	1.045.635	511.961	10.963	ESTR
217	1.056.071	512.734	10.999	ESTR
218	1.057.247	512.954	11.006	ESTR
219	1.057.568	512.003	11.017	ESTR
220	1.059.174	497.060	11.091	ESTR
221	1.003.988	512.002	11.325	ESTR
222	984.341	507.659	11.277	ESTR
223	983.277	512.391	10.109	ESTR
224	977.606	517.722	10.076	ESTR
225	977.826	518.210	10.032	ESTR
226	982.221	521.460	10.064	ESTR
227	983.508	520.727	10.069	ESTR
228	989.236	522.063	10.106	ESTR
229	990.873	523.322	10.152	ESTR
230	990.632	524.301	10.155	ESTR
231	993.082	524.868	10.214	ESTR
232	993.522	522.743	10.196	ESTR
233	995.964	523.307	10.216	ESTR

Scanned with CamScanner

234	995.539	525.412	10.232	ESTR
235	999.684	526.391	10.223	ESTR
236	1.002.288	515.258	10.142	ESTR
237	1.003.184	515.472	10.113	ESTR
238	1.047.419	512.242	10.822	ESTR
239	1.044.914	523.036	10.735	ESTR
240	1.043.799	523.759	10.706	ESTR
241	1.043.123	526.885	10.705	ESTR
242	1.043.752	527.977	10.734	ESTR
243	1.042.530	533.387	10.795	ESTR
244	1.042.162	534.851	10.639	ESTR
245	1.047.693	536.145	10.671	ESTR
246	1.048.232	533.877	10.887	ESTR
247	1.053.122	512.652	10.862	ESTR


Scanned with CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 5124	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

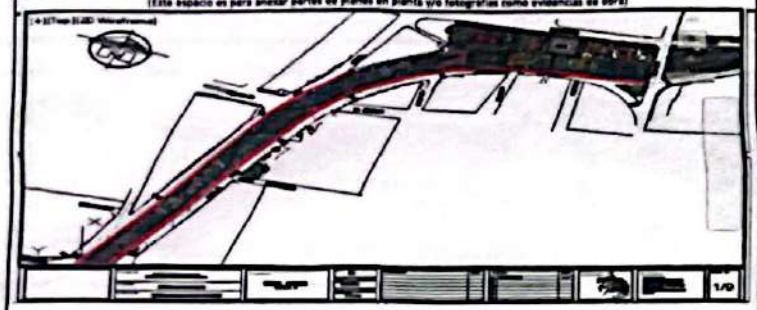

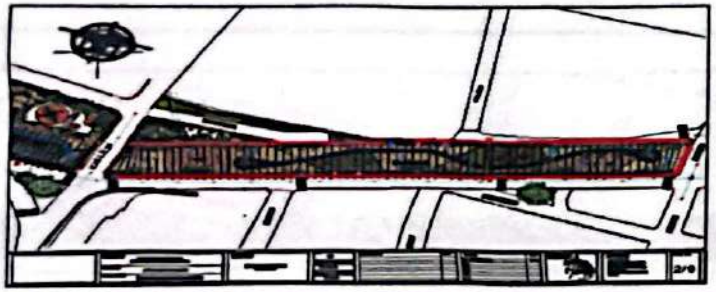

REGISTRO FOTOGRAFICO



	LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
	TRAMO 1								
COSIADO DERECHO	CARRERA 23	20.00	1.00	0.10	M3	2.00			2.00
	V1 - V10	21.30	1.00	0.10	M3	2.13			2.13
	V12 - V13	3.17	3.92	0.10	M3	1.24			1.24
	V13 - V21	26.02	1.00	0.10	M3	2.60			2.60
	V22	3.11	3.00	0.10	M3	0.93			0.93
	V23 - V51	84.56	1.00	0.10	M3	8.46			8.46
	V54 - V55	2.96	3.00	0.10	M3	0.89			0.89
	V55 - V66	36.682	1.00	0.10	M3	3.67			3.67
	V67	3.17	2.97	0.10	M3	0.94			0.94
	V68 - V98	78.57	1.00	0.10	M3	7.86			7.86
	V96 - V97	4.60	2.68	0.10	M3	1.23			1.23
	V98 - V112	40.30	1.00	0.10	M3	4.03			4.03
	V112	3.30	3.00	0.10	M3	0.99			0.99
	V113 - V121	23.78	1.00	0.10	M3	2.38			2.38
	V122 - CANCHA SINTETICA	58.17	1.00	0.10	M3	5.82			5.82
	Cancha sintetica existente Trama 1 hasta la V-138	81.32	1.00	0.10	M3	8.13			8.13
COSIADO IZQUIERDO	V1 - V4	47.96		0.10	M3	4.80			4.80
	V5 - V16	33.19	1.00	0.10	M3	3.32			3.32
	V17	13.58	1.00	0.10	M3	1.36			1.36
	V18 - V30	37.51	1.00	0.10	M3	3.75			3.75
	V30 - V31	4.30	2.64	0.10	M3	1.14			1.14
	V32 - V67	110	1.00	0.10	M3	11.0			11.00
	V68 - V89	68.94	1.00	0.10	M3	6.89			6.89
	V94 - V102	89.6	1.00	0.10	M3	8.96			8.96
	TRAMO 2								
COSIADO DERECHO	VIG 142- VIG 163	66.10	1.00	0.10	M3	6.6			6.61
	VIG 165- VIG 188	69.78	1.00	0.10	M3	7.0			6.98
	VIG 190- VIG 213	32.37	1.00	0.10	M3	3.2			3.24
COSIADO IZQUIERDO	VIG 149- VIG 170	19.71	1.00	0.10	M3	2.0			1.97
	CANTIDAD CONTRACTUAL			486.00					
	ACUMULADO ANTERIOR			0.00					
	ACUMULADO PRESENTE ACTA			113.31					
	OBRA A EJECUTAR			372.69					
	TOTAL PRESENTE ACTA:								113.31

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 2142	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

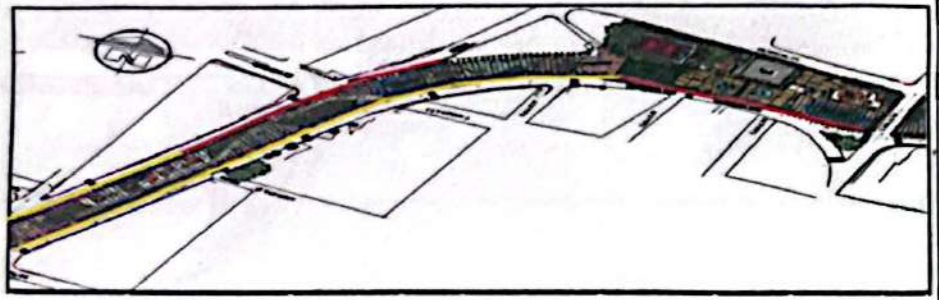


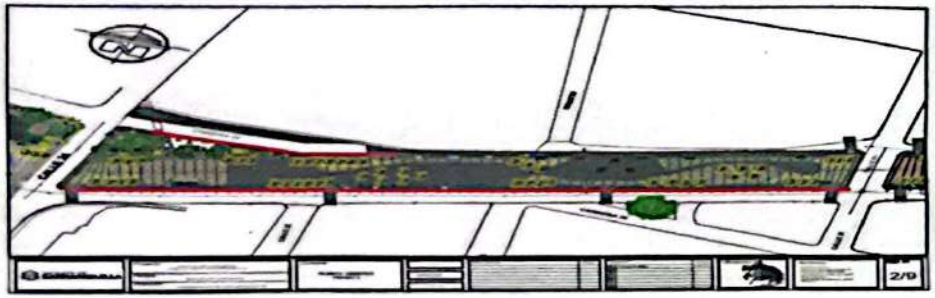

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO DERECHO									
INTERNO	CALLE 26- VIG 124	51,93	0,15	0,20	ML		51,93		
	V126 - V137	30,98	0,15	0,20	ML		30,98		
COSTADO IZQUIERDO									
INTERNO	VIG 5- VIG 17	41,65	0,15	0,20	ML		41,65		
	VIG 18-VIG30	37,50	0,15	0,20	ML		37,50		
	VIG31- VIG 32	4,84	0,15	0,20	ML		4,84		
	VIG 33- VIG 67	103,46	0,15	0,20	ML		103,46		
	VIG 71- VIG 76	19,47	0,15	0,20	ML		19,47		
	VIG 78- VIG 87	31,13	0,15	0,20	ML		31,13		
	VIG 93- VIG 101	28,75	0,15	0,20	ML		28,75		
EXTERNO	VIG 1- VIG 31	83,50	0,15	0,20	ML		83,50		
	VIG 34- VIG 67	97,65	0,15	0,20	ML		97,65		
	VIG 71- VIG 74	15,85	0,15	0,20	ML		15,85		
	VIG76- VIG 88	41,70	0,15	0,20	ML		41,70		
	VIG 94- VIG 101	23,96	0,15	0,20	ML		23,96		
	VIG 101- VIG 102	6,45	0,15	0,20	ML		6,45		
CARRERA 23									
INTERNO	VIG 1	16,19	0,15	0,20	ML		16,19		
EXTERNO	CARRERA 23	30,20	0,15	0,20	ML		30,20		
TRAMO 2									
COSTADO DERECHO									
INTERNO	VIG 143- VIG 165	67,22	0,15	0,20	ML		67,22		
	VIG 166- VIG 177	34,04	0,15	0,20	ML		34,04		
	VIG 179- VIG 201	68,69	0,15	0,20	ML		68,69		
	VIG 202- VIG 210	21,77	0,15	0,20	ML		21,77		
XO	VIG 142- VIG 163	66,10	0,15	0,20	ML		66,10		

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

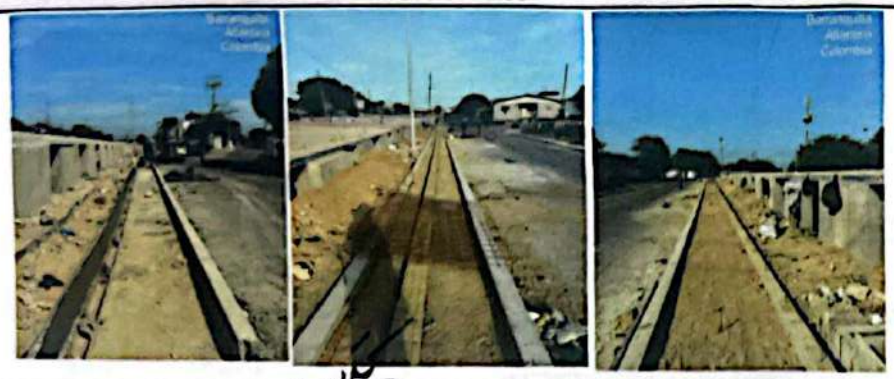

EXTERN	VIG 165- VIG 188	69,78	0,15	0,20	ML		69,78		
	VIG 190- VIG 213	32,37	0,15	0,20	ML		32,37		
COSTADO IZQUIERDO									
INTERNO	VIG 149- VIG 170	19,71	0,15	0,20	ML		19,71		
EXTERNO	VIG 149- VIG 170	19,71	0,15	0,20	ML		19,71		

CANTIDAD CONTRACTUAL	2504,67
ACUMULADO ANTERIOR	728,35
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1792,95
OBRA A EJECUTAR	711,72

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.064,60

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

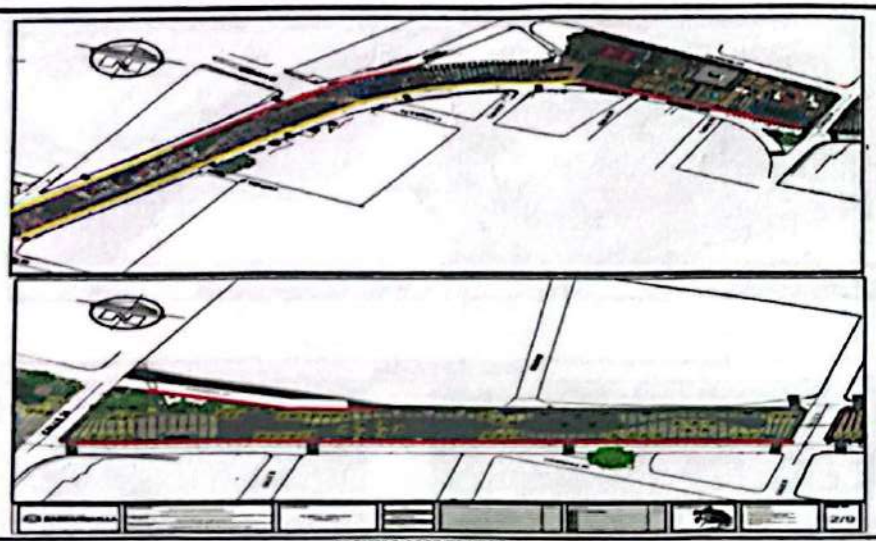

REGISTRO FOTOGRAFICO

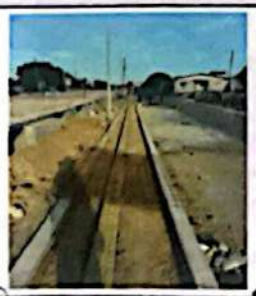

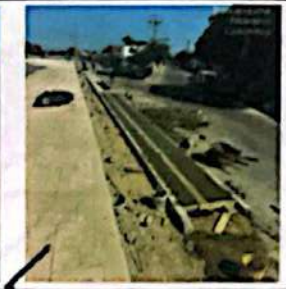

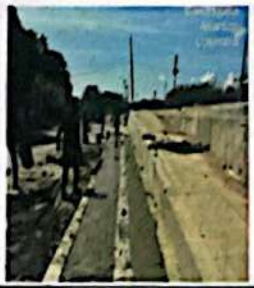

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO I									
COSTADO DERECHO	PARQUE EXISTENTE- VIG 138	77,35	1,00	0,10	M2			77,35	
COSTADO IZQUIERDO	VIG 55- VIG 67	28,28	1,00	0,10	M2			28,28	
	VIG 71- VIG 74	5,98	1,00	0,10	M2			5,98	
	VIG 76- VIG 88	43,79	1,00	0,10	M2			43,79	
	VIG 93- VIG 100	25,97	1,00	0,10	M2			25,97	
	VIG 100- VIG 102	6,39	3,39	0,10	M2			21,66	
TRAMO 2									
COSTADO DERECHO	VIG 142- VIG 163	66,10	1,00	0,10	M2			66,10	
	VIG 165- VIG 188	69,78	1,00	0,10	M2			69,78	
	VIG 190- VIG 213	32,37	1,00	0,10	M2			32,37	
COSTADO IZQUIERDO	VIG 149- VIG 170	19,71	1,00	0,10	M2			19,71	

CANTIDAD CONTRACTUAL	3976,00
ACUMULADO ANTERIOR	644,54
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1035,54
OBRA A EJECUTAR	2940,47
TOTAL PRESENTE ACTA:	390,99

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (PASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 7038	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

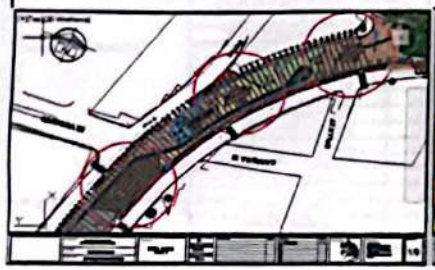

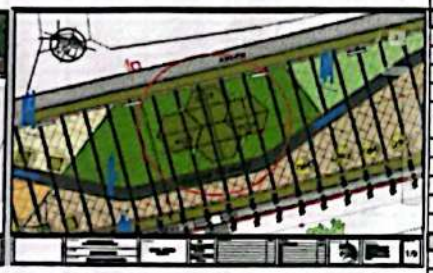

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	KG
TRAMO 1								
ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V72 - V77				KG	4338,75			4.338,75
ESTRUCTURA METALICA MODULO DE SERVICIO V98-V103				KG	4128,61			4.128,61
ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V119- V123				KG	4338,75			4.338,75
TRAMO 2								
ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V188- V193				KG	4338,75			4.338,75

CANTIDAD CONTRACTUAL	26400.00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	17144,86
OBRA A EJECUTAR	9255,14

TOTAL PRESENTE ACTA: 17.144,86

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLAS

LOCALIZACION	ELEMENTO	TIPO ACERO	DIMENSIONES								TOTALES			
			LONG (MM)	ANCHO (MM)	ALTO	ESPESOR (MM)	UND	CANT X ELEMENTOS	CANT DE ELEMENTOS	PESO KG/M3	KG	M2	M3	ACTA
MODULO TIPO PERGOLA	PLACA BASE	A 36	0,25	0,25		0,0120	KG	1,0	16,0	7850,00	74,575			3
	RIGIDIZADOR	A 36	0,067	0,10		0,0064	KG	4,0	16,0	7850,00	21,543			3
	COLUMNA 4"	A36	2,90			0,004	KG	1,0	12,0	11,06	384,89			3
	COLUMNA 4"	A36	3,30			0,004	KG	1,0	4,0	11,06	145,99			3
	COLUMNA 4"	A36	0,25			0,004	KG	1,0	6,0	11,06	16,59			3
	PLATINA UNION	A36	0,25	0,08		0,00475	KG	1,0	16,0	7850,00	11,69			3
	PLATINA UNION	A36	0,30	0,08		0,00475	KG	1,0	8,0	7850,00	7,16			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	5,63	100,00	150,00	0,004	KG	1,0	4,0	15,46	348,16			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	6,0	4,0	15,46	1113,12			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	-1,0	1,0	15,46	-46,38			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,44	90,00	50,00	0,0025	KG	30,0	4,0	5,37	1572,34			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,19	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	188,16			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,82	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	156,37			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,50	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	128,88			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,14	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	97,95			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,80	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	68,74			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,45	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	38,66			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,12	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	10,31			3
										SUBTOTAL	4338,75			
MODULO DE SERVICIO	PLACA BASE	A 36	0,25	0,25		0,0120	KG	1,0	16,0	7850,00	74,575			3
	RIGIDIZADOR	A 36	0,067	0,10		0,0064	KG	4,0	16,0	7850,00	21,543			3
	COLUMNA 4"	A36	2,90			0,004	KG	1,0	10,0	11,06	320,74			3
	COLUMNA 4"	A36	0,25			0,004	KG	1,0	6,0	11,06	16,59			3
	PLATINA UNION	A36	0,25	0,08		0,00475	KG	1,0	16,0	7850,00	11,69			3
	PLATINA UNION	A36	0,30	0,08		0,00475	KG	1,0	8,0	7850,00	7,16			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	5,63	100,00	150,00	0,004	KG	1,0	4,0	15,46	348,16			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	6,0	4,0	15,46	1113,12			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	-1,0	1,0	15,46	-46,38			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,44	90,00	50,00	0,0025	KG	30,0	4,0	5,37	1572,34			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,19	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	188,16			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,82	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	156,37			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,50	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	128,88			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,14	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	97,95			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,80	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	68,74			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,45	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	38,66			3
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,12	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	10,31			3
										SUBTOTAL	4128,61			

OBSERVACIÓN: KG DE ESTUCTURA DE CUBIERTA NO ESTAN INCLUIDOS

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 78	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

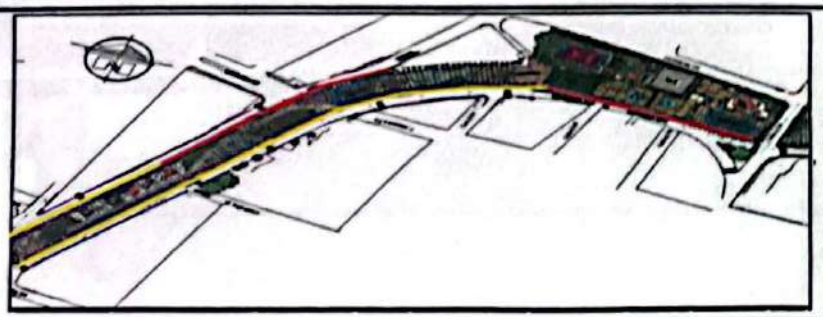

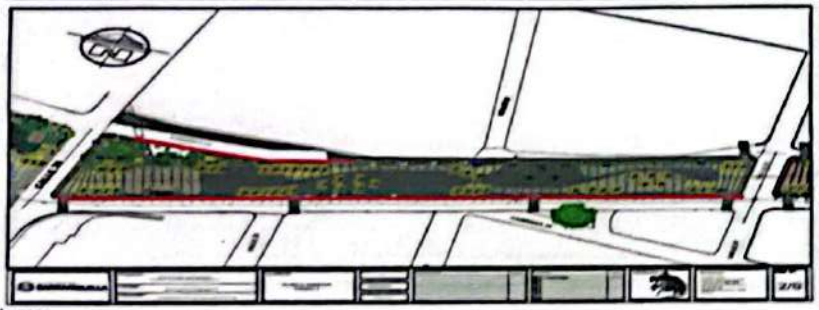

Peso total barras
1/4" =0,45 kg

Lista de barras 1/4"

0.25	4	1/4"	0.25	0.25	[1 En PEDESTALES BARANDAS]
h: b=0.10 h=0.22 g=0.08 / D	1	1/4"	0.8	0.20	[1 En PEDESTALES BARANDAS]


LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	KG
TRAMO 1								
COSTADO DERECHO								
SOPORTES DE BARANDAS V1 - V139				KG	103,500			103,5
COSTADO IZQUIERDO								
SOPORTES DE BARANDAS V1 - V139				KG	103,500			103,5
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V73- VIG 78				KG	37,92			37,92
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V119 -VIG 123				KG	37,92			37,92
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA MODULO DE SERVICIO V97 -VIG 102				KG	23,70			23,70
TRAMO 2								
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V188 -VIG 192				KG	37,92			37,92

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO





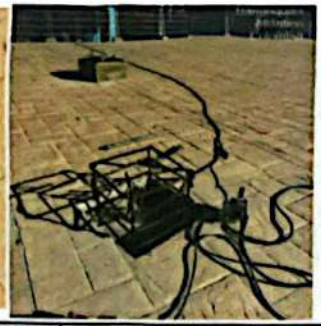

CANTIDAD CONTRACTUAL	3999,20
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	344,46
OBRA A EJECUTAR	3654,74

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 344,46


OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

PEDESTALES DE BARANDAS

Peso total barras
1/4" =0,45 kg

Lista de barras 1/4"




LOCALIZACIÓN	CANTIDAD KG X PEDESTAL	CANT DE PEDESTALES	CANT KG PEDESTALES	UNIDAD
TRAMO 1				
COSTADO DERECHO				
SOPORTES DE BARANDAS V1 - V139	0,45	230,00	103,50	KG
COSTADO IZQUIERDO				
SOPORTES DE BARANDAS V1 - V139	0,45	230,00	103,50	KG

Scanned with CamScanner

PEDESTALES DE ESTRUCTURA METALICA ASOLEADEROS

Peso total por pedestal
2,37 KG

	Cantidad de barras	Diametro de barras	Longitud	Peso (KG)
 L=0,4 mts	4	#3	1,6	0,90
	2	#4	1,48	1,47

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD KG X PEDESTAL	CANT DE PEDESTALES	CANT KG PEDESTALES	UNIDAD
TRAMO 1				
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V73- VIG 78	2,37	16,00	37,92	KG
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V119 -VIG 123	2,37	16,00	37,92	KG
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA MODULO DE SERVICIO V97 -VIG 102	2,37	10,00	23,70	KG
TRAMO 2				
PEDESTALES ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V188 -VIG 192	2,37	16,00	37,92	KG

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	844	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

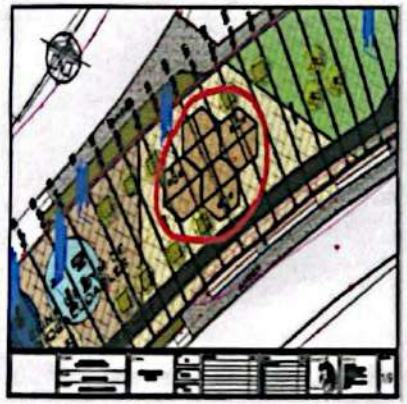

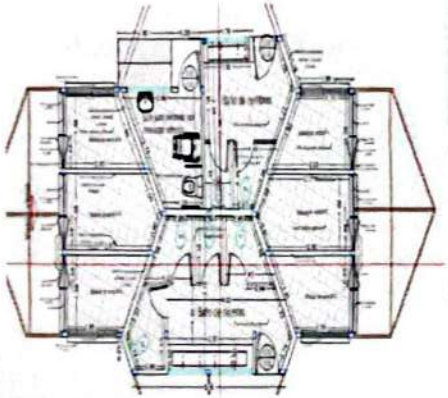

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
MODULO DE SERVICIOS TRAMO 1								
VENTANAS								
PUERTAS M.V.	14,70			ML	1,00	14,70		
VENTANA FRONTAL M.V.	11,22			ML	1,00	11,22		
M.V. 1	1,94			ML	1,00	1,94		
M.V. 1-3-4-6	7,00			ML	1,00	7,00		
BAÑO MUJERES	3,15			ML	1,00	3,15		

CANTIDAD CONTRACTUAL	500,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	38,01
OBRA A EJECUTAR	461,99

TOTAL PRESENTE ACTA:	38,01

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capitulo - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM: 344	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

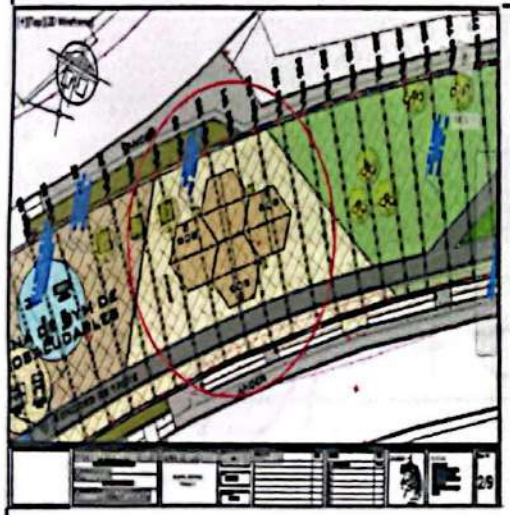

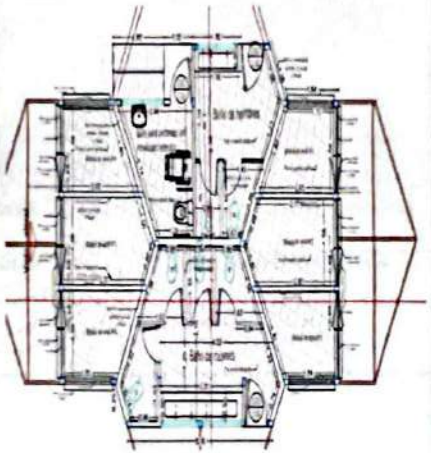

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIOS TRAMO 1							281,00	

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO







CANTIDAD CONTRACTUAL	843.20
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	281.00
OBRA A EJECUTAR	562.20

TOTAL PRESENTE ACTA: 281.00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 1752	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

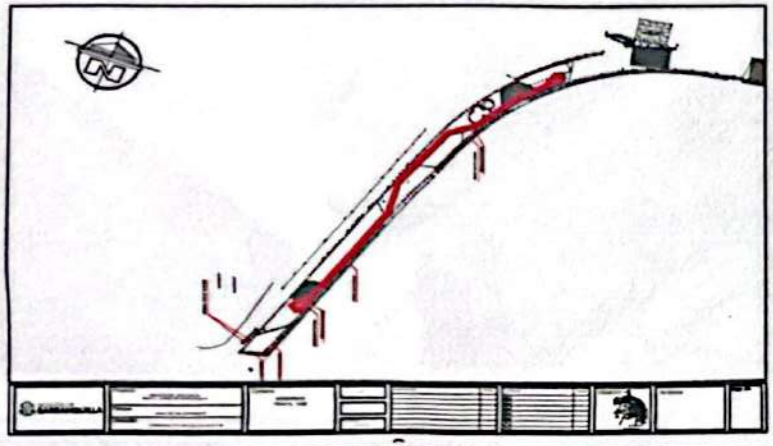

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	AREA M2	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
SENDERO DE TROTE	983.79				1.00	983.79		

CANTIDAD CONTRACTUAL	2200.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	983.79
OBRA A EJECUTAR	1216.21

TOTAL PRESENTE ACTA: 983,79

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1


urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (PASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: AD-18	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE PISO)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

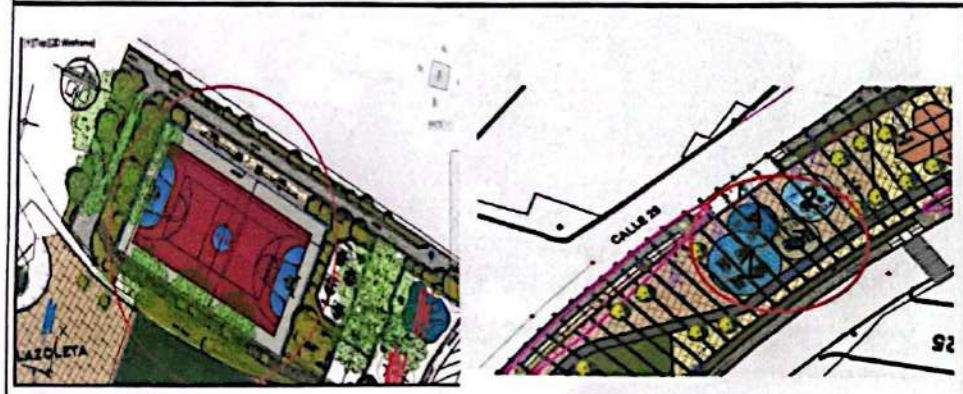

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	AREA M2	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA MULTIPLE	32,00	19,00	608,00	M2	1,00		608,00	
GYM BIOSALUDABLE VIG 87- VIG 94								
CIRCULO 1			86,42	M2	1,00		86,42	
CIRCULO 2			30,23	M2	1,00		30,23	
CIRCULO 3			40,22	M2	1,00		40,22	
CIRCULO 4			23,41	M2	1,00		23,41	

CANTIDAD CONTRACTUAL	1410,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	788,28
OBRA A EJECUTAR	621,72

TOTAL PRESENTE ACTA: 788,28

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1


urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: AD-19	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA EPOXICO SINTÉTICO (PARA PISTA DE PITINAJE Y CANCHA DE HOCKEY)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

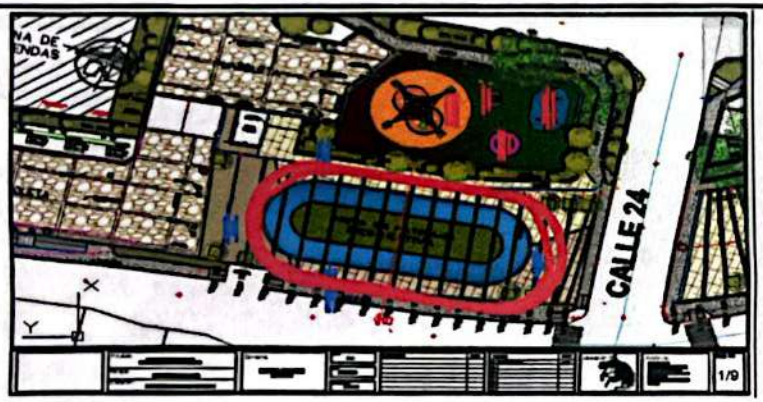

REGISTRO FOTOGRAFICO

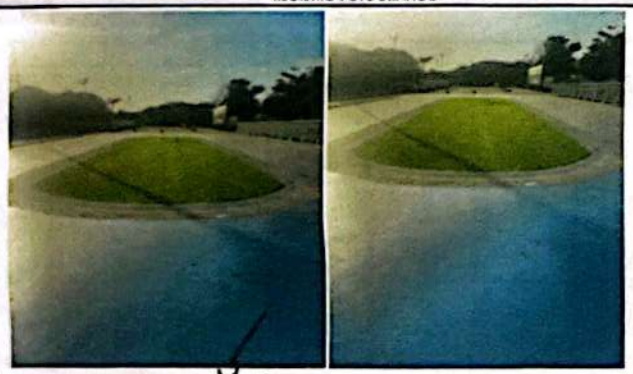

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
AREA DE PISTA					197,82		197,82	

CANTIDAD CONTRACTUAL	230,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	197,82
OBRA A EJECUTAR	32,18

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 197,82

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — NIT 890102018-1 — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: AD-19	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA EPOXICO SINTÉTICO (PARA PISTA DE PITINAJE Y CANCHA DE HOCKEY)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO

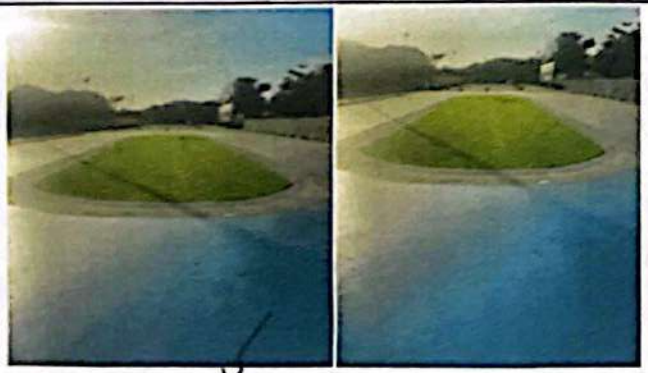

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
AREA DE PISTA					197,82		197,82	

CANTIDAD CONTRACTUAL	230,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	197,82
OBRA A EJECUTAR	32,18

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 197,82

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capitulo - INSTALACIONES	CÓDIGO DEL ITEM: 282	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PUNTO DE AGUA EN PVC DE 1/2"

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

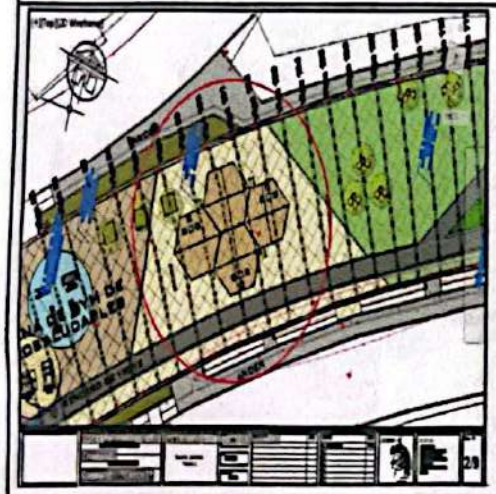

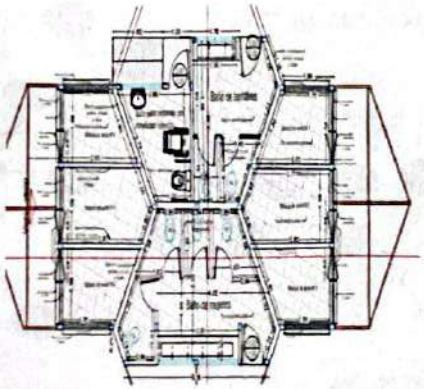

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIO				UN	19.00			


CANTIDAD CONTRACTUAL	51.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	19.00
OBRA A EJECUTAR	32.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 19.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

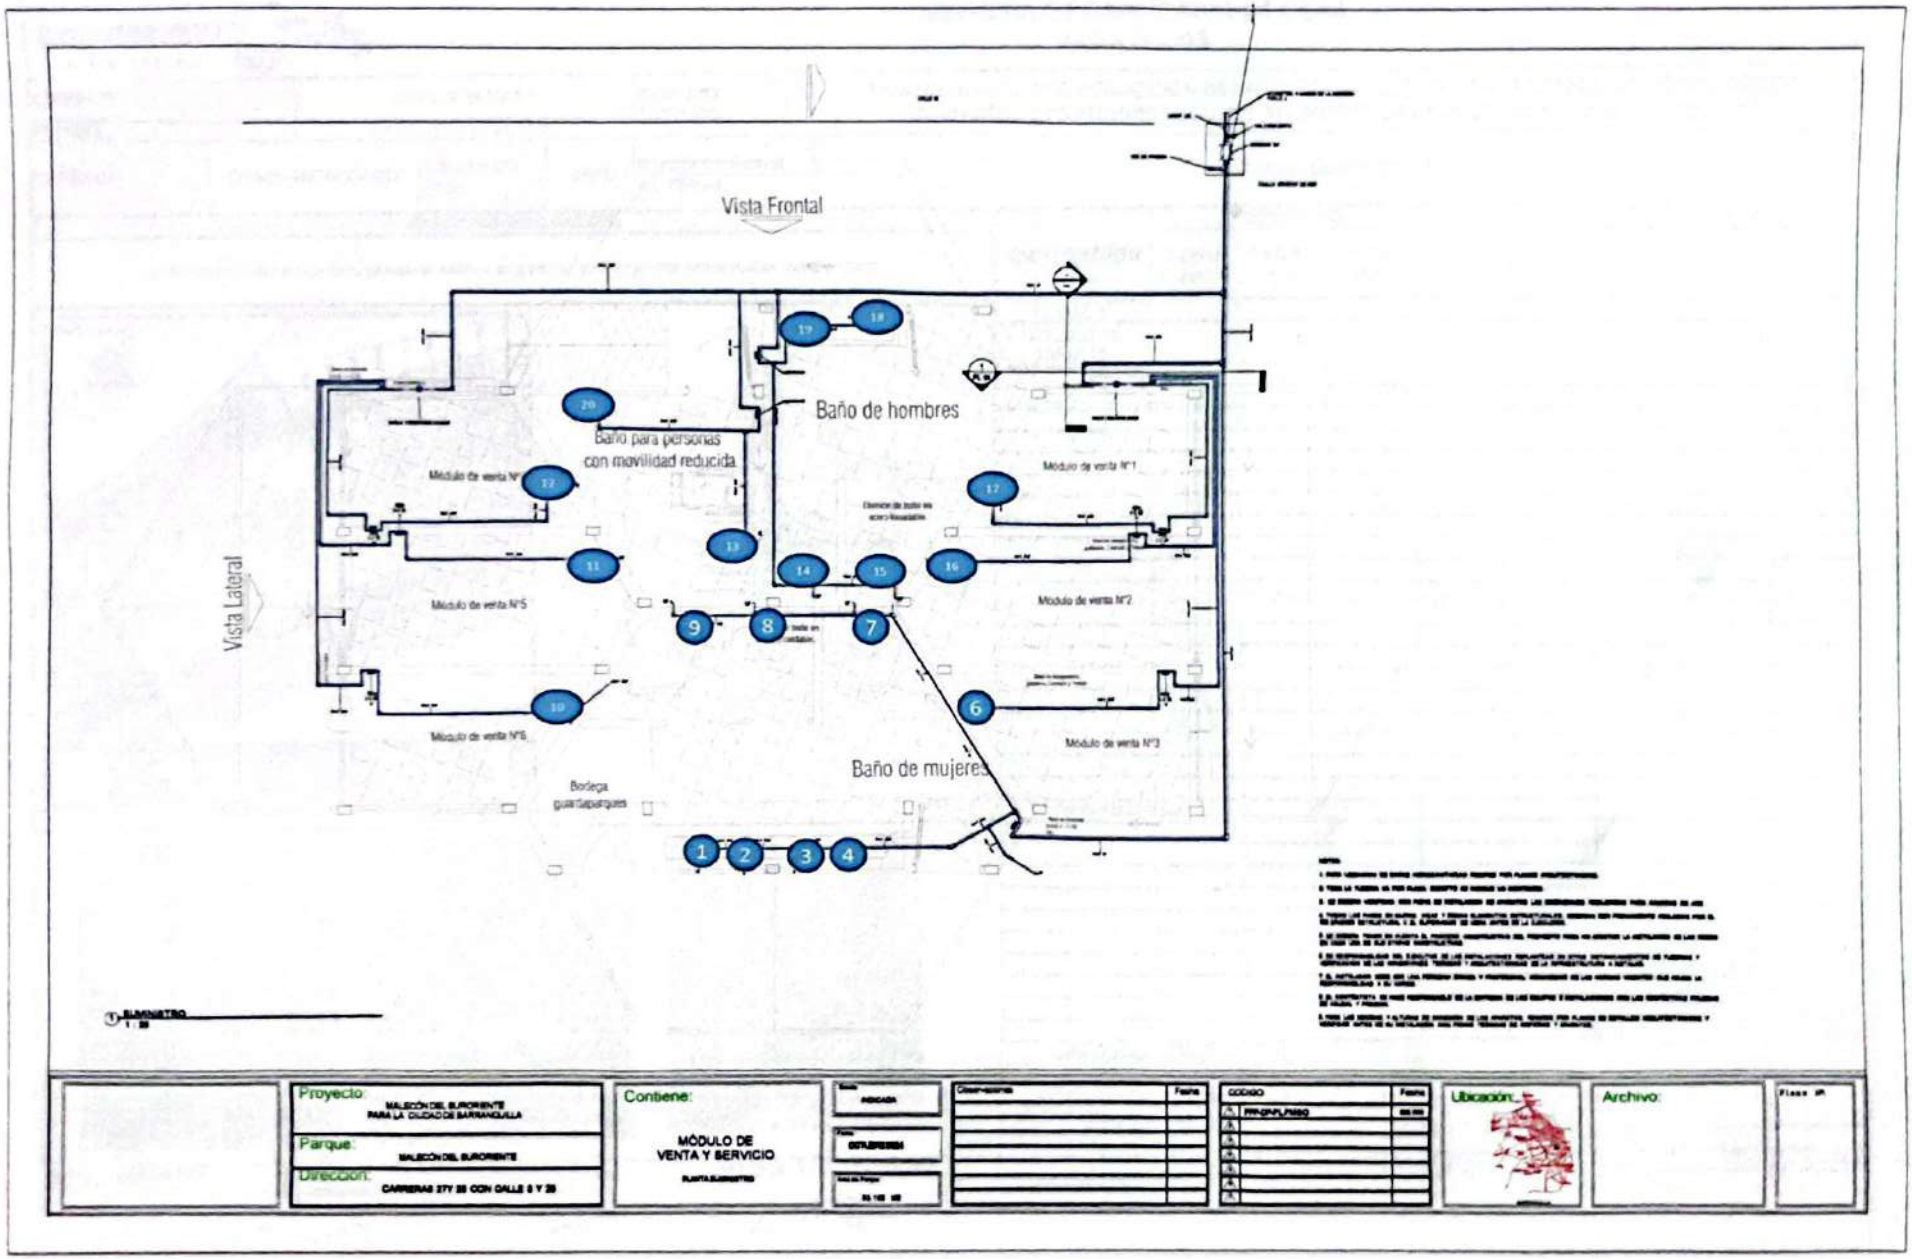
Vista Frontal
Vista Lateral
Baño de hombres
Baño para personas con movilidad reducida
Baño de mujeres
Bodega guardaparques
Módulo de venta N°1
Módulo de venta N°2
Módulo de venta N°3
Módulo de venta N°4
Módulo de venta N°5
Módulo de venta N°6
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUMINISTRO
Proyecto:
MALECÓN DEL SURORIENTE
PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Parque:
MALECÓN DEL SURORIENTE
Dirección:
CARRERAS 27Y 30 CON CALLE 8 Y 39
Contiene:
MÓDULO DE
VENTA Y SERVICIO
Ubicación:
Archivo:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - INSTALACIONES	CÓDIGO DEL ITEM: 6686	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PUNTO SANITARIO 2"

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

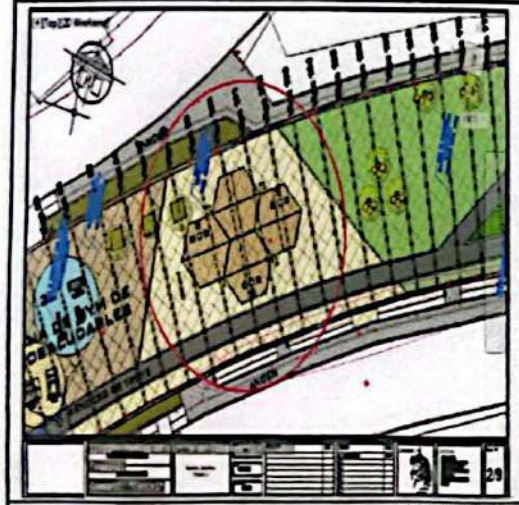

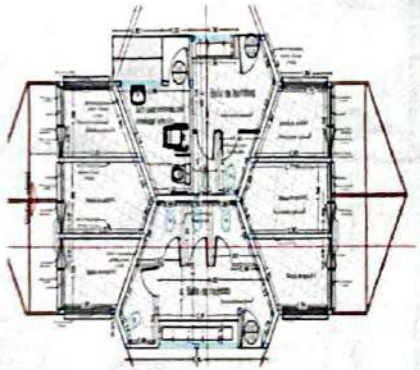

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIO				UN	14,00			


CANTIDAD CONTRACTUAL	30.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	14,00
OBRA A EJECUTAR	16.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 14,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

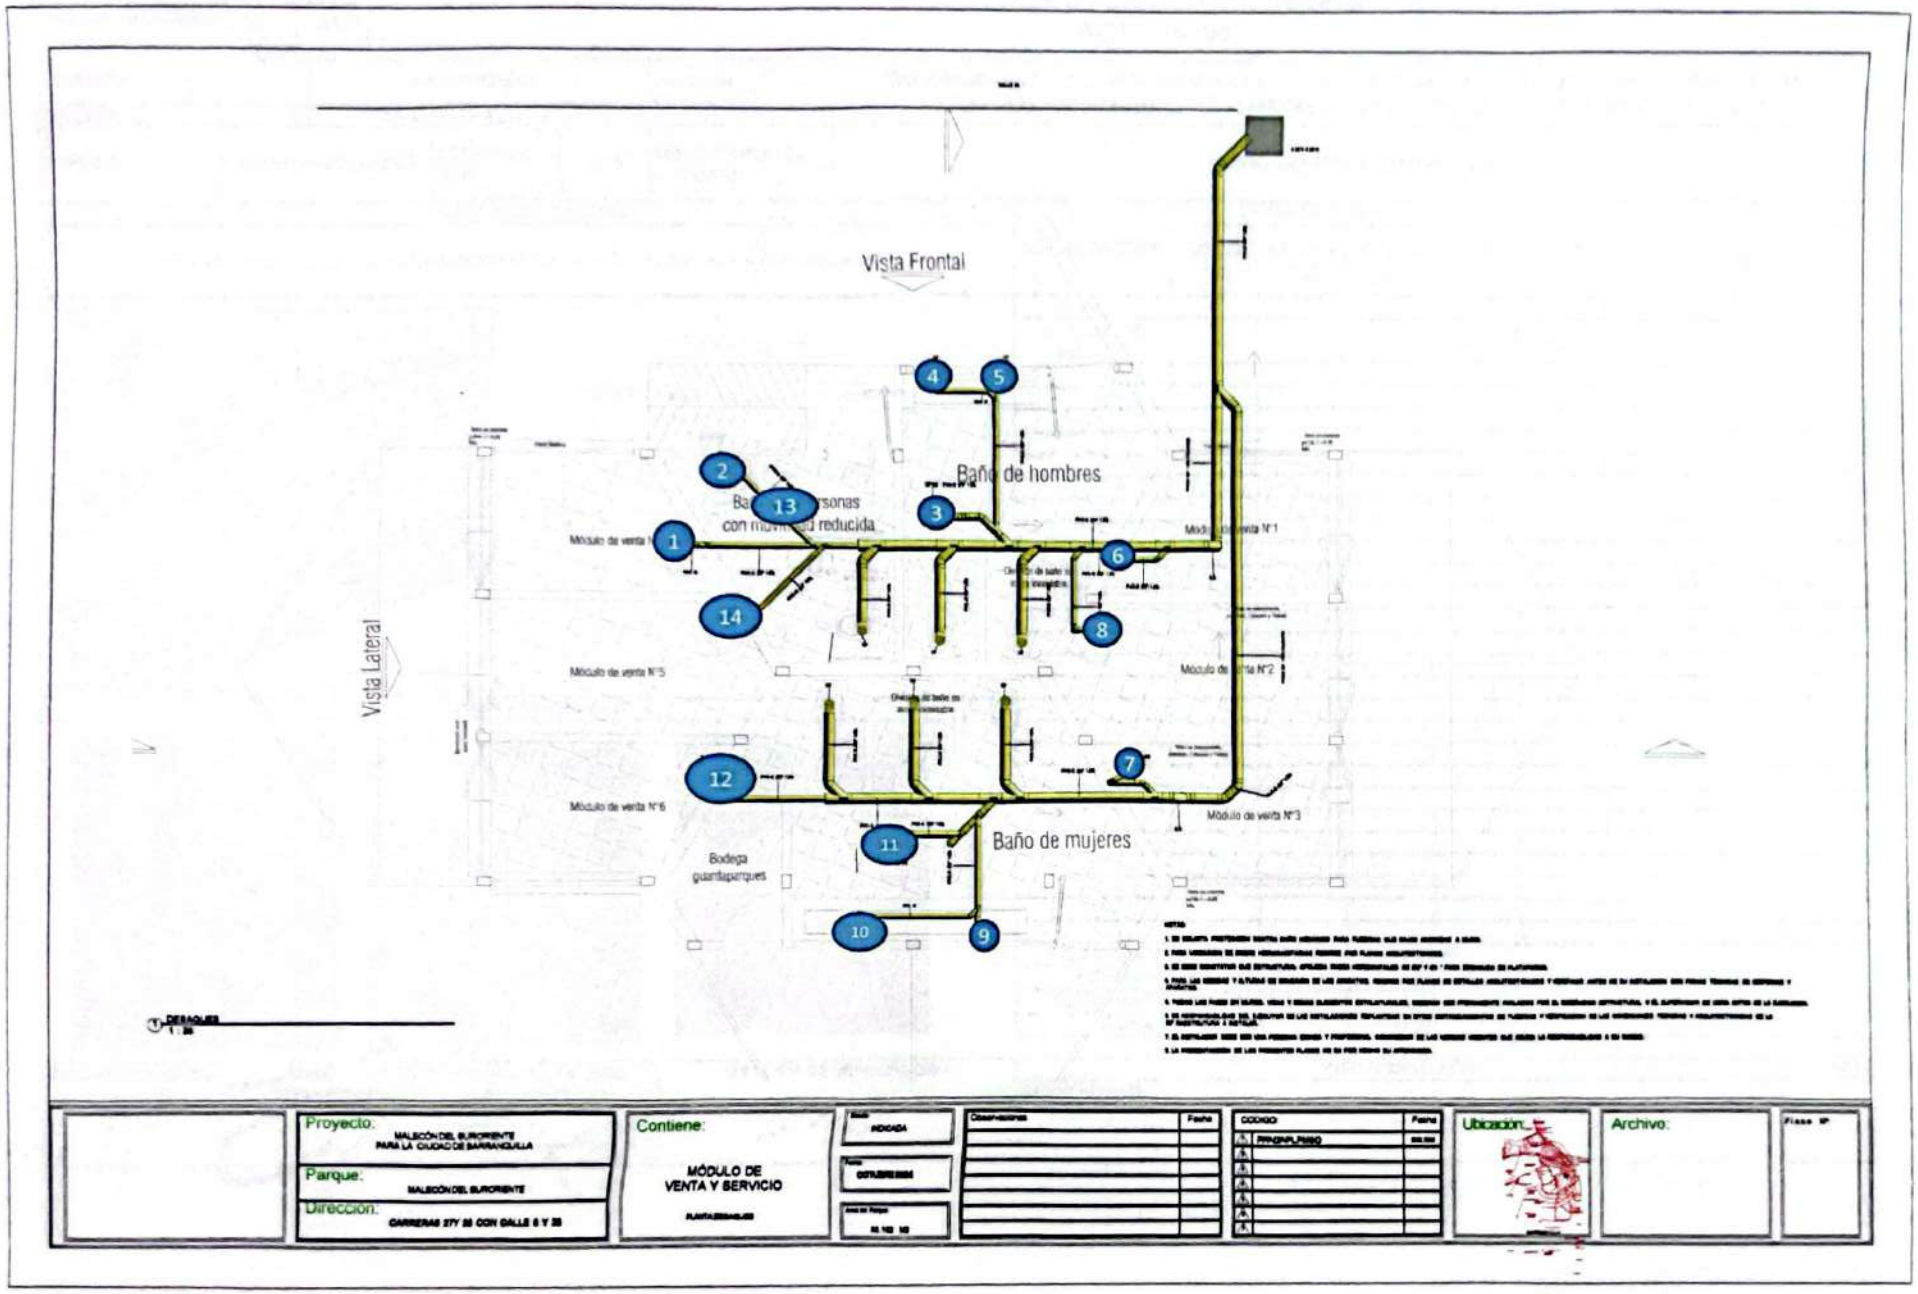
Vista Frontal
Vista Lateral
Baño de hombres
Baño de mujeres
Módulo de venta N°1
Módulo de venta N°2
Módulo de venta N°3
Módulo de venta N°5
Módulo de venta N°6
Bodega guardaparques
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DETALLES
Proyecto:
MALECÓN DEL SURORIENTE PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Parque:
MALECÓN DEL SURORIENTE
Dirección:
CARRERAS 37Y 38 CON CALLE 6 Y 35
Contiene:
MÓDULO DE VENTA Y SERVICIO
Observaciones
Fecha
CODIGO
Ubicación:
Archivo:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capitulo - INSTALACIONES	CÓDIGO DEL ITEM: 293	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4"

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

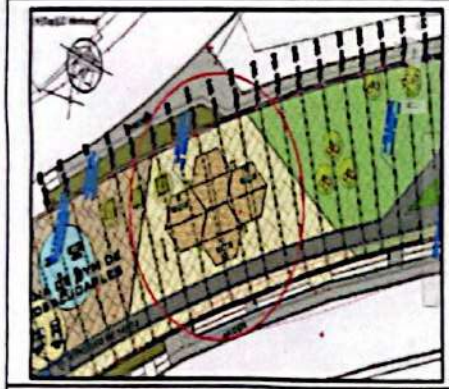

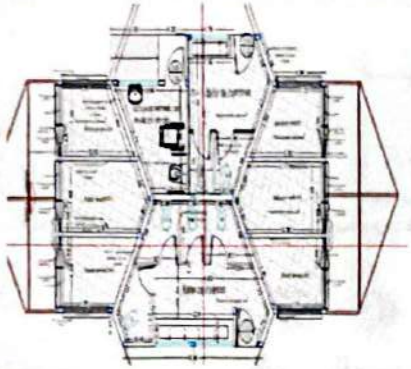

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIO				UN	6,00			


CANTIDAD CONTRACTUAL	18,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	6,00
OBRA A EJECUTAR	12,00

TOTAL PRESENTE ACTA: 6,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

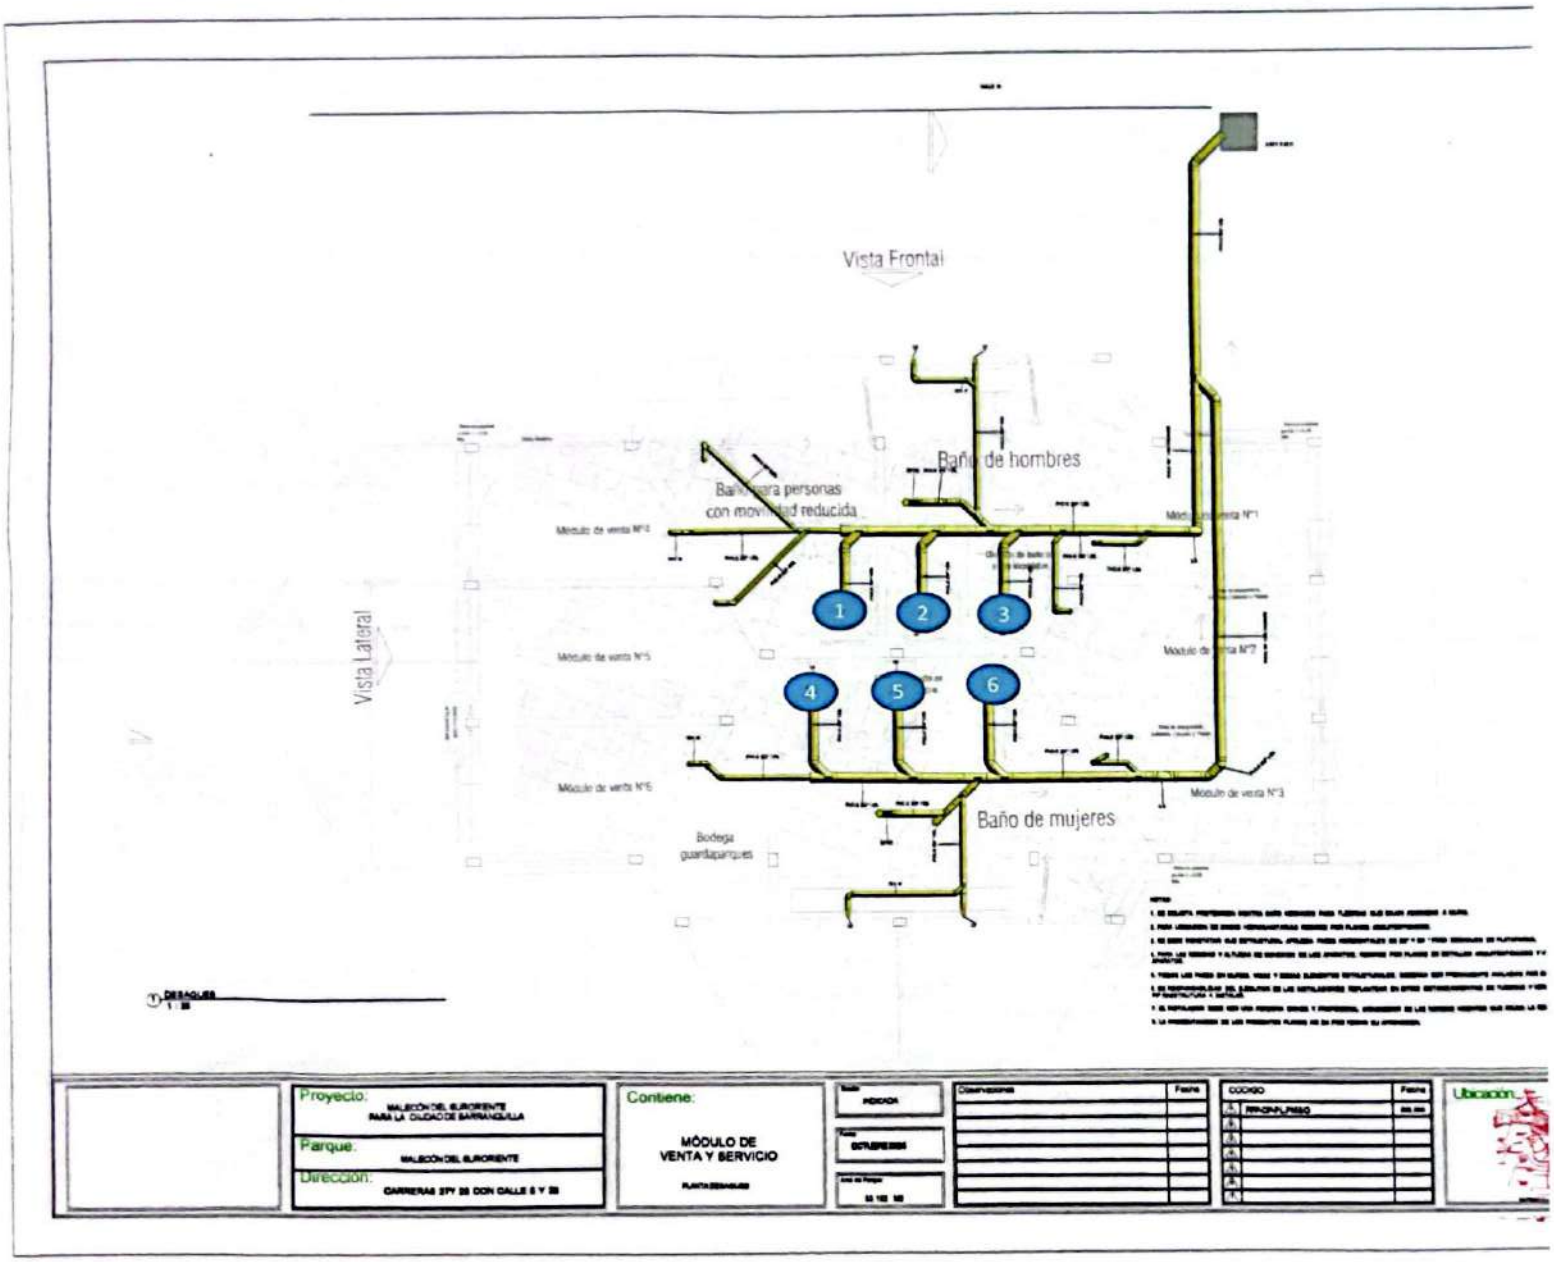

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — Barranquilla 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO ADHERIDA, DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN CAUCHO, GRAMA Y SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA OBRA PARA ACABADOS DE PISOS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

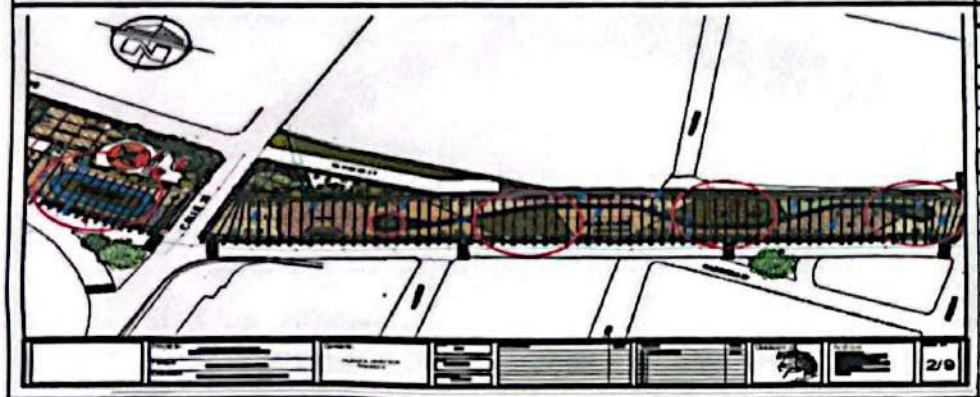

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
AREA DE GRAMA PISTA DE PATINAJE					98,90		98,90	
TRAMO 2								
V183 - V195	ETAPA 2			M2	319,00		319,00	
EJE 156-159 GOTA	ETAPA 2			M2	23,00		23,00	
EJE 206-209 GOTA	ETAPA 2			M2	22,33		22,33	

CANTIDAD CONTRACTUAL	3479,00
ACUMULADO ANTERIOR	2187,57
ACUMULADO PRESENTE ACTA	2650,80
OBRA A EJECUTAR	828,20

TOTAL PRESENTE ACTA: 443,23

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Scanned with CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (PASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 01/12/24				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA GUÍA Y TÁCTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

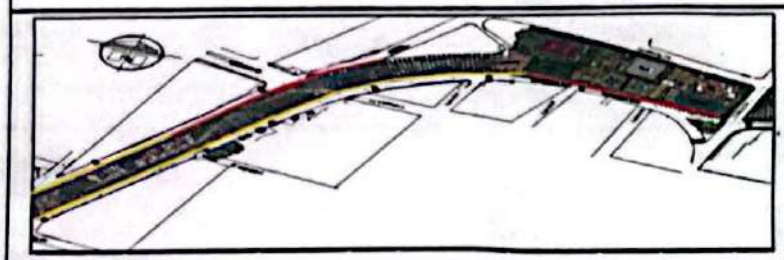



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
TRAMO1									
COSTADO DERECHO	PARQUE EXISTENTE- VIG 138	77.38	0.20	0.10	ML		77.38		
COSTADO IZQUIERDO	VIG 65- VIG 67	28.28	0.20	0.10	ML		28.28		
	VIG 71- VIG 74	5.98	0.20	0.10	ML		5.98		
	VIG 76- VIG 88	42.29	0.20	0.10	ML		42.29		
	VIG 93- VIG 101	25.97	0.20	0.10	ML		25.97		
	VIG 101- VIG 102	6.39	0.20	0.10	ML		6.39		
TRAMO 2									
COSTADO DERECHO	VIG 142- VIG 163	66.10	0.20	0.10	ML		66.10		
	VIG 165- VIG 188	69.78	0.20	0.10	ML		69.78		
	VIG 190- VIG 213	32.37	0.20	0.10	ML		32.37		
	VIG 149- VIG 170	19.71	0.20	0.10	ML		19.71		

CANTIDAD CONTRACTUAL	2024.00
ACUMULADO ANTERIOR	536.82
ACUMULADO PRESENTE ACTA	911.04
OBRA A EJECUTAR	1112.96

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 874.33

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		


CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

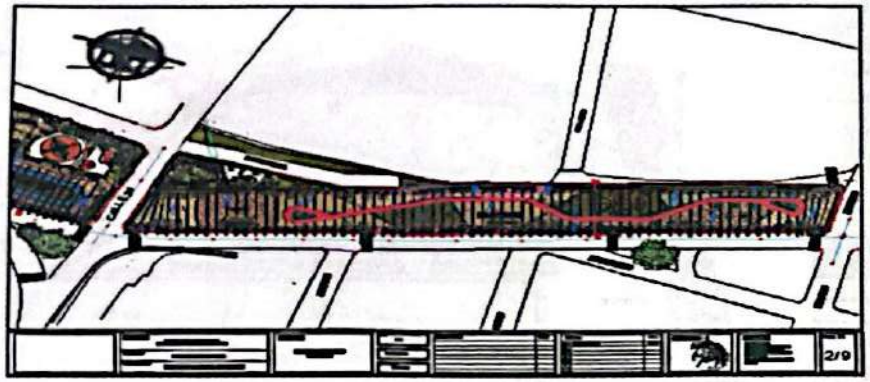

REGISTRO FOTOGRAFICO

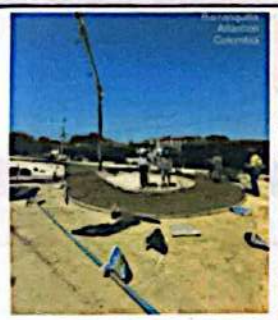

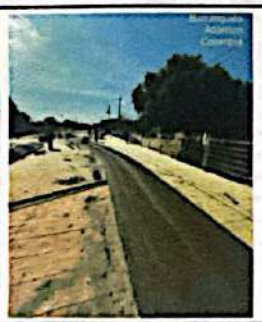

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 2								
V156 - V209				M2	1		331,00	

CANTIDAD CONTRACTUAL	1108,47
ACUMULADO ANTERIOR	398,98
ACUMULADO PRESENTE ACTA	729,98
OBRA A EJECUTAR	378,49
TOTAL PRESENTE ACTA:	331,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE 6 MM PARA SEPARACIÓN, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

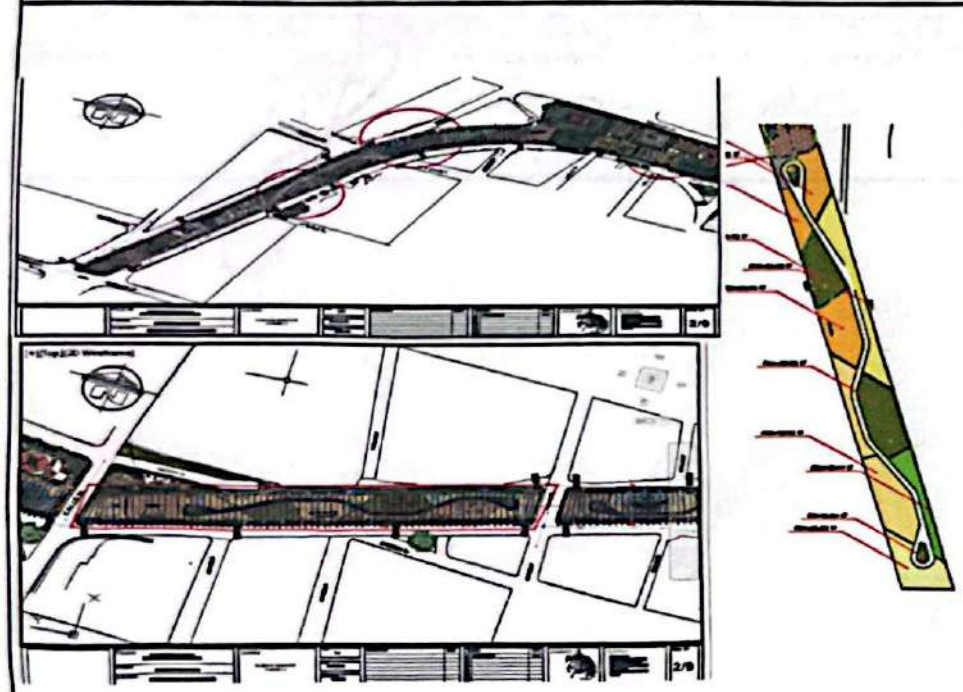


LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
VIG 22- VIG 23- VERDE ACCESO RAMPA 1, COSTADO IZQ				M2	1.00		3.00	
VIG 60- VIG 61- NARANJA ACCESO RAMPA 2, COSTADO DERECHO				M2	1.00		3.00	
VIG 82 - COQUINNA- ACCESO RAMPA 2 COSTADO IZQ				M2	1.00		7.00	
VIG 95- VIG 100				M2	1.00		107.85	
VIGAS ESPECIALES				M2	1.00		70.20	
EMPALME PISOS ESTAMPADOS CON PARQUE EXISTENTE				M2	1.00		76.63	
TRAMO 2								
V155 - V167 NARANJA				M2	1.00		343.00	
V161 - V186 AMARILLO				M2	1.00		321.42	
V173 - V183 NARANJA				M2	1.00		282.53	
V181 - V206 COQUINA				M2	1.00		484.70	
V194 - V209 VERDE				M2	1.00		158.16	
V203 - V213 AMARILLO				M2	1.00		238.05	
VIG 168 ACCESO RAMPA VERDE COST DER				M2	1.00		3.00	
VIG 172- ACCESO RAMPA AMARILLO COSTADO IZQ				M2	1.00		3.00	

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

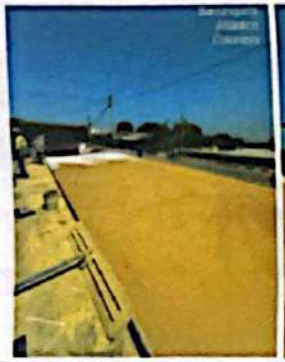



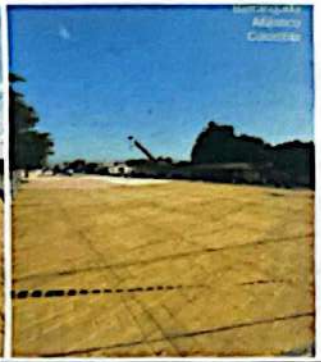

CANTIDAD CONTRACTUAL	8965,17
ACUMULADO ANTERIOR	4137,40
ACUMULADO PRESENTE ACTA	6238,94
OBRA A EJECUTAR	2726,23

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	2.101,84

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE DE PISOS EN CONCRETO, PISOS EN CONCRETO DE NIVELACIÓN Y SEGÚN REQUERIMIENTOS OBRA QUE NO ESTÉN DIRECTAMENTE EXPUESTOS AL TRAFICO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

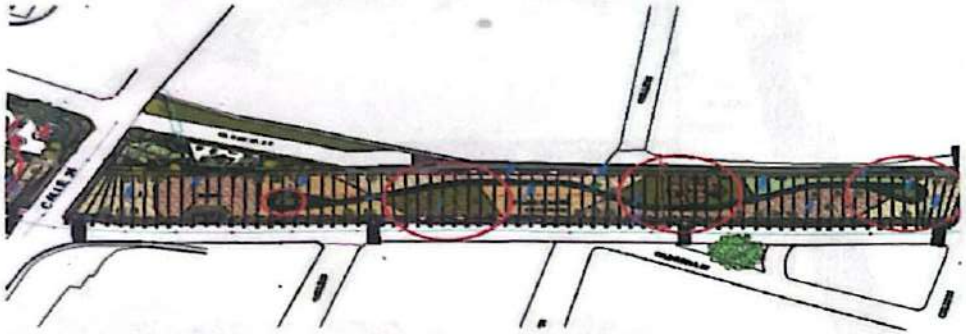

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
TRAMO 2								
PISO DE NIVELACIÓN	319,00				1,00	319,00		
EJE 156-159 GOTA	23,00				1,00	23,00		
EJE 206-209 GOTA	22,33				1,00	22,33		

CANTIDAD CONTRACTUAL	4532,95
ACUMULADO ANTERIOR	1431,16
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1795,49
OBRA A EJECUTAR	2737,46

TOTAL PRESENTE ACTA:	364,33

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON SELLO, PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

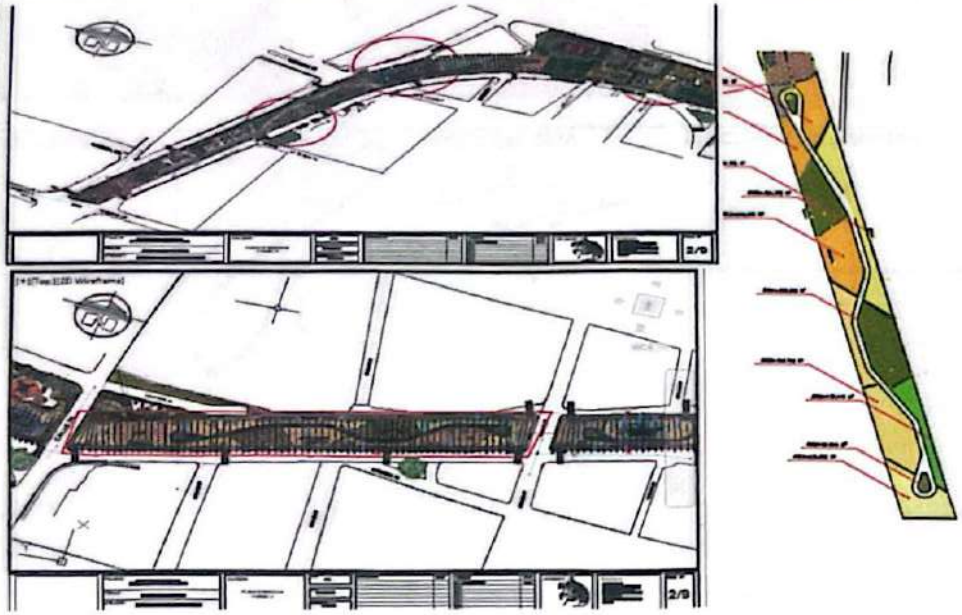


LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA MULTIPLE	400,00			ML	1,00	400		
ZONA DE PATINAJE EXT	510,00			ML	1,00	510,00		
PISTA DE PATINAJE	260,33			ML	1,00	260,33		
TRAMO 2								
AMARILLO VIGA 140- VIG147	18,94			ML	1,00	18,94		
COQUINA VIG 147-VIG155	412,85			ML	1,00	412,85		
NARANJA VIG 155-VIG 167	621,54			ML	1,00	621,54		
PISTA DE TROTE	595,85			ML	1,00	595,85		
VERDE VIG 194- VIG 209	667,47			ML	1,00	667,47		
AMARILLO VIGA 161- VIG180	191,94			ML	1,00	191,94		
NARANJA VIG 173-VIG 183	324,46			ML	1,00	324,46		
COQUINA VIG 180-VIG206	399,80			ML	1,00	399,80		
AMARILLO VIGA 203- VIG213	191,94			ML	1,00	191,94		
SELLO PISTA DE TROTE BORDES	1159,70			ML	1,00	1159,70		

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO



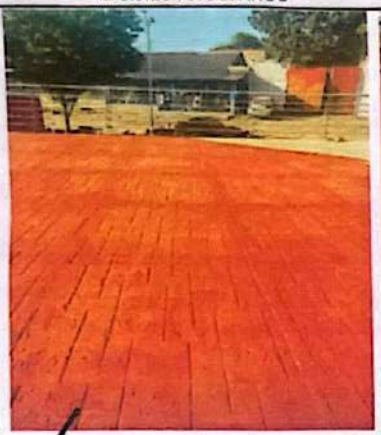



CANTIDAD CONTRACTUAL	20131,67
ACUMULADO ANTERIOR	5398,91
ACUMULADO PRESENTE ACTA	11153,73
OBRA A EJECUTAR	8977,94

TOTAL PRESENTE ACTA:	5.754,82

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPESOR ENTRE 3/8", INCLUYE PERFORACIÓN Y EPOXICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

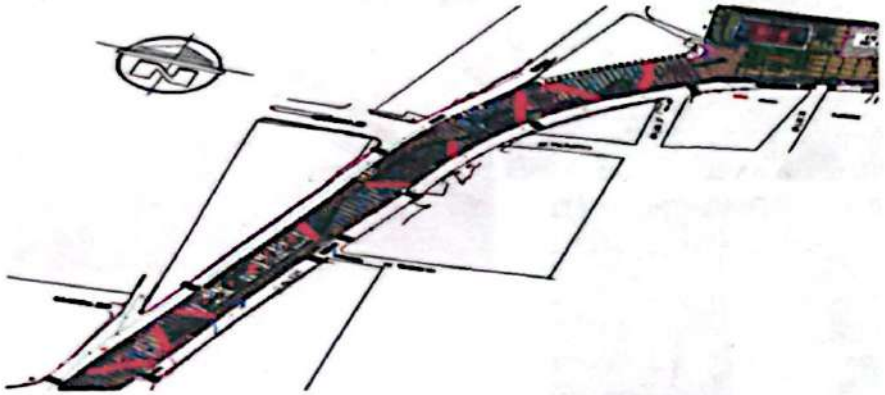

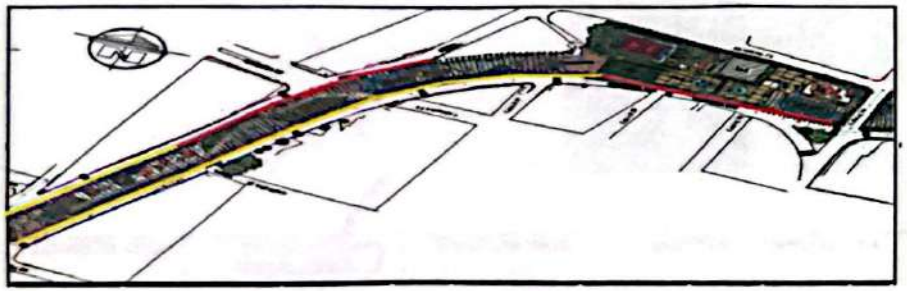



LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
LOSA	VIG 7-VIG 14	25,66			UN	86			
	VIG 18-VIG 21	25,33			UN	84			
	VIG 19-V22 INT	9,74			UN	32			
	VIG 19-VIG 24 EXT	29,66			UN	99			
	VIG 24-VIG 41 EXT	51,00			UN	170			
	VIG 22-VIG 62 INT	122,00			UN	407			
	VIG 26-VIG 28	12,00			UN	40			
	VIG 52-VIG 54	11,08			UN	37			
	VIG 19- VIG 61 DER	129,05			UN	430			
	VIG 23- VIG 62 IZQ	112,50			UN	375			
	VIG 68-VIG 71	14,57			UN	49			
	VIG 81-VIG 83	14,92			UN	50			
	VIG 61-VIG 87 DER	76,16			UN	254			
	VIG 61-VIG 87 IZQ	77,45			UN	258			
	VIG 87-VIG 108 DER	59,48			UN	198			
	VIG 87-VIG 108 IZQ	60,44			UN	201			
	VIG 108- VIG 114 INTERNO	24,00			UN	80			
	VIG 108- VIG 114 EXTERNO	28,80			UN	96			
	VIG 114-VIG 117	23,77			UN	79			
	VIG ESPECIALES (UNIÓN DE PISOS)	17,22			UN	57			
	VIG 125- VIG 126	4,50			UN	15			
	VIG 126- VIG127	2,86			UN	10			
	VIG 136- VIG139	7,50			UN	25			
COSTADO DERECHO									
INTERNO	CALLE 26- VIG 124	51,93			UN	173			
	V126 - V137	30,98			UN	103			
COSTADO IZQUIERDO									
	VIG 5- VIG 17	41,65			UN	139			

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPESOR ENTRE 3/8", INCLUYE PERFORACIÓN Y EPOXICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

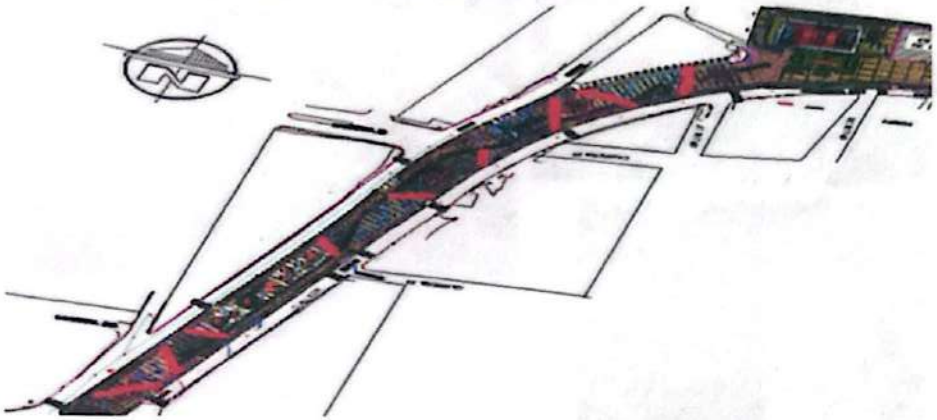


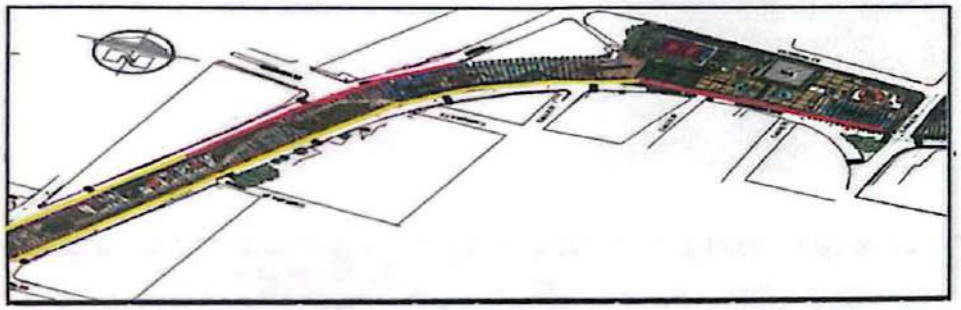



LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
LOSA	VIG 7-VIG 14	25,66			UN	86			
	VIG 18-VIG 21	25,33			UN	84			
	VIG 19-V22 INT	9,74			UN	32			
	VIG 19-VIG 24 EXT	29,66			UN	99			
	VIG 24-VIG 41 EXT	51,00			UN	170			
	VIG 22-VIG 62 INT	122,00			UN	407			
	VIG 26-VIG 28	12,00			UN	40			
	VIG 52-VIG 54	11,08			UN	37			
	VIG 19- VIG 61 DER	129,05			UN	430			
	VIG 23- VIG 62 IZQ	112,50			UN	375			
	VIG 68-VIG 71	14,57			UN	49			
	VIG 81-VIG 83	14,92			UN	50			
	VIG 61-VIG 87 DER	76,16			UN	254			
	VIG 61-VIG 87 IZQ	77,45			UN	258			
	VIG 87-VIG 108 DER	59,48			UN	198			
	VIG 87-VIG 108 IZQ	60,44			UN	201			
	VIG 108- VIG 114 INTERNO	24,00			UN	80			
	VIG 108- VIG 114 EXTERNO	28,80			UN	96			
	VIG 114-VIG 117	23,77			UN	79			
	VIG ESPECIALES (UNIÓN DE PISOS)	17,22			UN	57			
	VIG 125- VIG 126	4,50			UN	15			
	VIG 126- VIG127	2,86			UN	10			
	VIG 136- VIG139	7,50			UN	25			
COSTADO DERECHO									
INTERNO	CALLE 26- VIG 124	51,93			UN	173			
	V126 - V137	30,98			UN	103			
COSTADO IZQUIERDO									
	VIG 5- VIG 17	41,65			UN	139			

Scanned with CamScanner



REGISTRO FOTOGRAFICO







INTERNO	VIG 18-VIG30	37,50			UN	125				
	VIG31- VIG 32	4,84			UN	16				
	VIG 33- VIG 67	103,46			UN	345				
	VIG 71- VIG 76	19,47			UN	65				
	VIG 78- VIG 87	31,13			UN	104				
	VIG 93- VIG 101	28,75			UN	96				
EXTERNO	VIG 1- VIG 31	83,50			UN	278				
	VIG 34- VIG 67	97,65			UN	326				
	VIG 71- VIG 74	15,85			UN	53				
	VIG76- VIG 88	41,70			UN	139				
	VIG 94- VIG 101	23,96			UN	80				
	VIG 101- VIG 102	6,45			UN	22				
CARRERA 23										
INTERNO	VIG 1	16,19			UN	54				
EXTERNO	CARRERA 23	30,20			UN	101				
TRAMO 2										
LOSA	VIG 147	18,23			UN	61				
	VIG 155	17,98			UN	60				
	VIG 161- VIG 164	15,22			UN	51				
	VIG 164- VIG 167	10,54			UN	35				
	VIG 173- VIG 175	13,7			UN	46				
	VIG 180- VIG 183	10,78			UN	36				
	VIG 183- VIG 186	11,77			UN	39				
	VIG 194- VIG 195	8,6			UN	29				
	VIG 203- VIG 206	11,76			UN	39				
	VIG 207- VIG 209	3,3			UN	11				
	(EXTERNO PISTA)	386,4			UN	1288				
	PERIMERIMETRO	40			UN	133				
COSTADO DERECHO										
INTERNO	VIG 143- VIG 165	67,22			UN	224				
	VIG 166- VIG 177	34,04			UN	113				
	VIG 179- VIG 201	68,69			UN	229				
	VIG 202- VIG 210	21,77			UN	73				
EXTERNO	VIG 142- VIG 163	66,10			UN	220				
	VIG 165- VIG 188	69,78			UN	233				
	VIG 190- VIG 213	32,37			UN	108				
	VIG 149- VIG 170	19,71			UN	66				

CANTIDAD CONTRACTUAL	30771,00	
ACUMULADO ANTERIOR	2427,83	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	10870,70	
OBRA A EJECUTAR	19900,30	
TOTAL PRESENTE ACTA:		**8.442,86**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTO DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SSUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLORPLATEADOTIPO BUQUE. SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

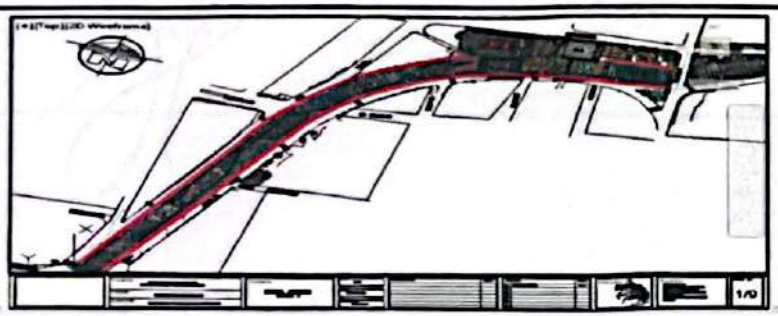

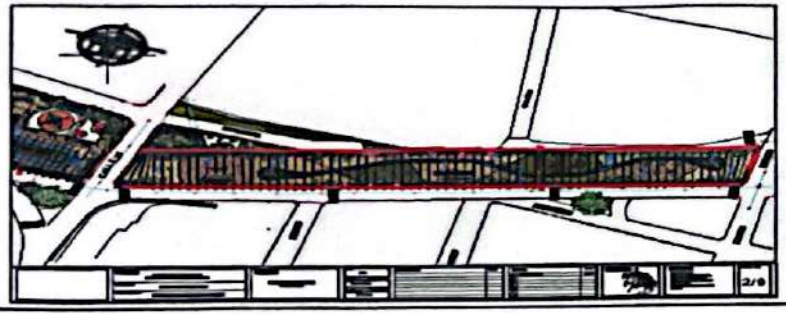

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
COSTADO DERECHO								
V117 - V137	163,99			ML	1,00	163,994		
COSTADO IZQUIERDO								
VIG 117- VIG 123	43,60			ML	1,00	43,6		
VIG 124- VIG 138	42,41			ML	1,00	42,41		
TRAMO 2								
COSTADO DERECHO								
V143 - V168	80,436			ML	1,00	80,436		
V169 - 210	124,61			ML	1,00	124,61		
COSTADO IZQUIERDO								
V169 - 210	161,61			ML	1,00	161,611		
CALLE 21								
VIG 213	17,00			ML	1,00	17		

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO





CANTIDAD CONTRACTUAL	2318.00
ACUMULADO ANTERIOR	600.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1233.66
OBRA A EJECUTAR	1084.34

TOTAL PRESENTE ACTA:	633.66

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

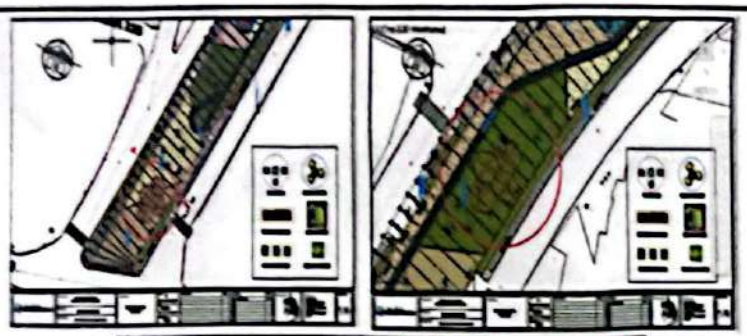

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	4.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	20.00
ACUMULADO ANTERIOR	5.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	9.00
OBRA A EJECUTAR	11.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 4.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

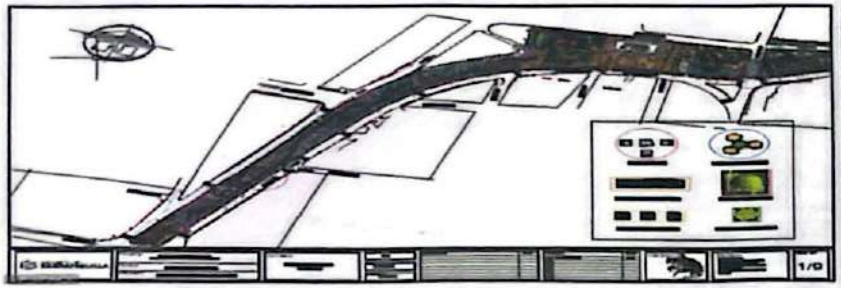

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	5.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	25.00
ACUMULADO ANTERIOR	10.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	15.00
OBRA A EJECUTAR	10.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 5.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.15	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

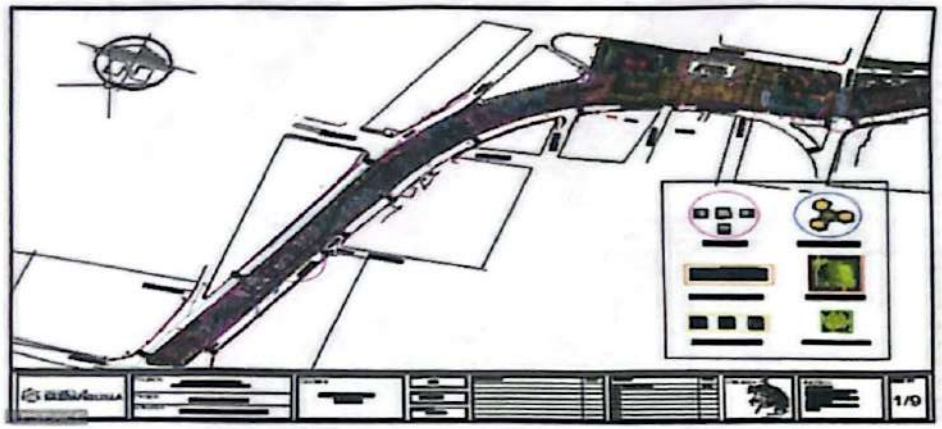

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	9,00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	90,00
ACUMULADO ANTERIOR	12,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	21,00
OBRA A EJECUTAR	69,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	9,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.20	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

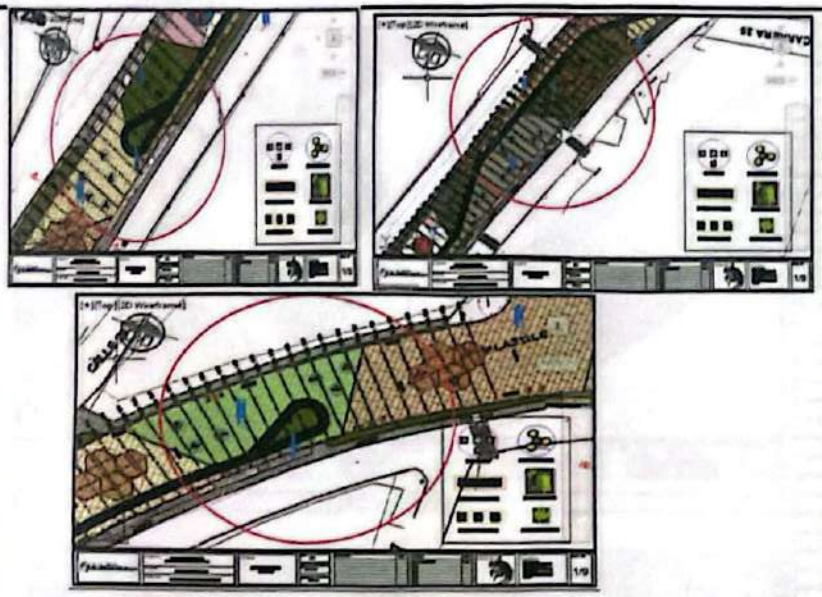

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	12.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	70.00
ACUMULADO ANTERIOR	31.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	43.00
OBRA A EJECUTAR	27.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 12.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.24	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

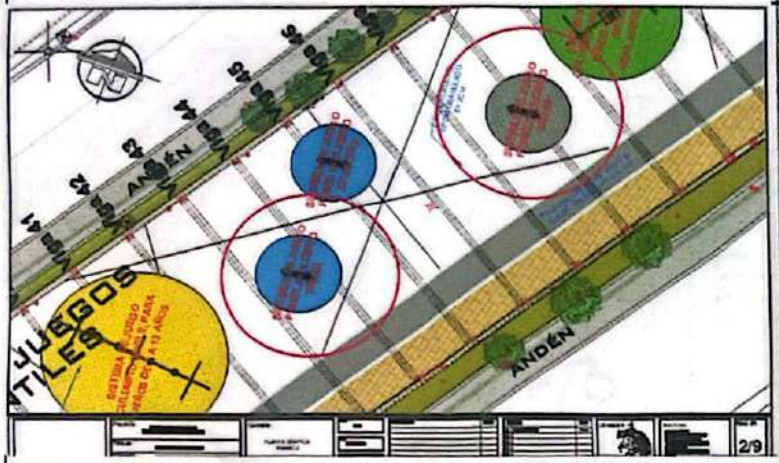

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	2.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	3.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	2.00
OBRA A EJECUTAR	1.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	2.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTO DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Scanned with CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.27	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

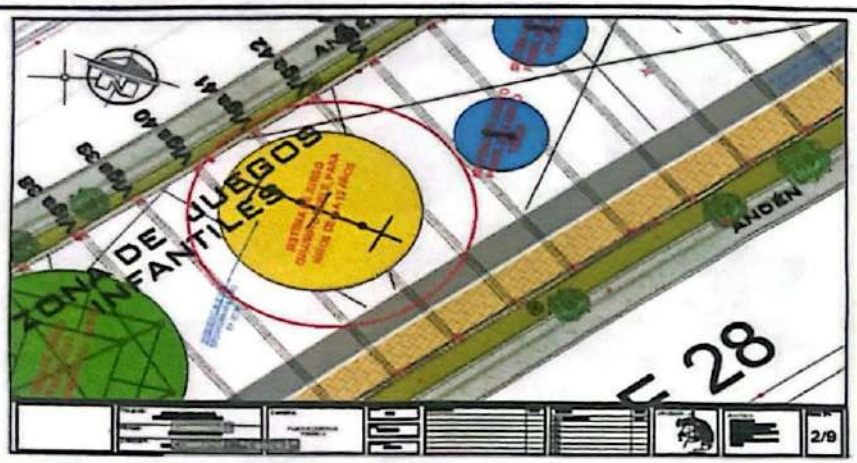

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	1.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1.00
OBRA A EJECUTAR	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTO DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.30	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

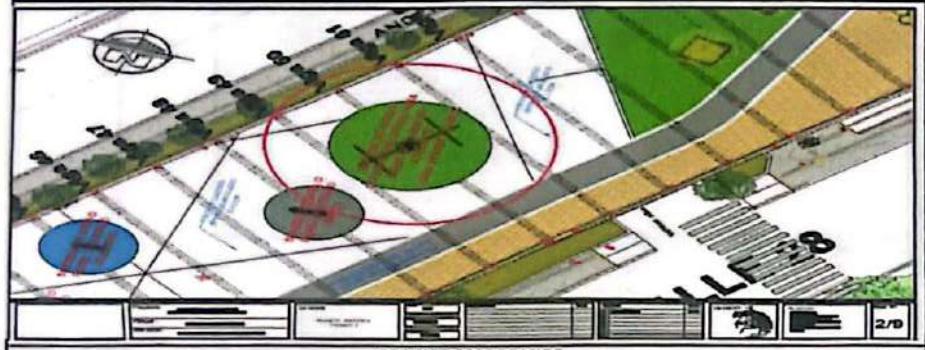

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	1,00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1,00
OBRA A EJECUTAR	0,00

TOTAL PRESENTE ACTA: 1,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTO DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbaCaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.48	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPEROR ENTRE 1/4", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

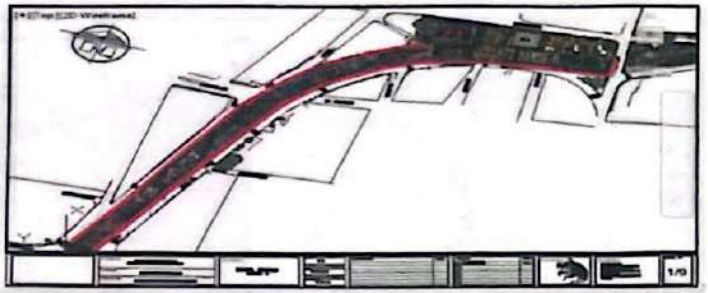

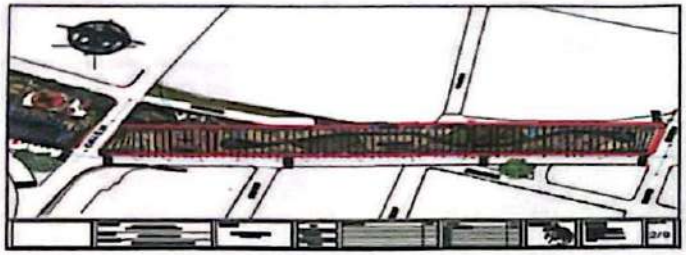

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	CANT	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
COSTADO DERECHO								
VIG 5 - VIG 137			10.00	UND	920.00			
COSTADO IZQUIERDO								
VIG 5- VIG ESPECIALES			10.00	UND	720.00			
VIG 124- VIG 137			10.00	UND	88.00			
TRAMO 2								
COSTADO DERECHO								
V143 - V168			10.00	UND	176.00			
V169 - 210			10.00	UND	220.00			
COSTADO IZQUIERDO								
V169 - 210			10.00	UND	280.00			
CALLE 21								
VIG 213			10.00	UND	36.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	4440.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	2440.00
OBRA A EJECUTAR	2000.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 2,440.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.48	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOBRE PISO EN BLOQUE DE ARCILLA DE 15 CM DE ANCHO, PARA REALCE DE PISOS EN ZONAS DE SERVICIOS Y ZONA DE TEATRINO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA VIGUETAS, Y MANO DE OBRA. LA MALLA ELECTROSOLDADA SE COBRARÁ EN EL ÍTEM CONTRACTUAL.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

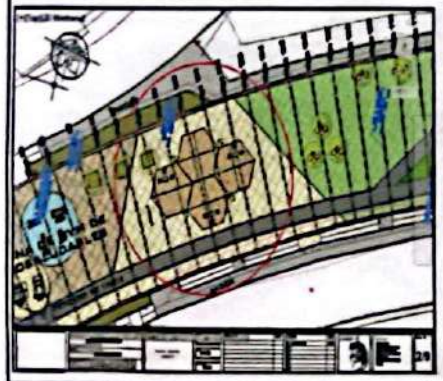

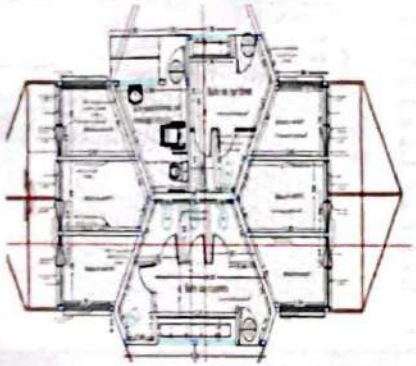

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	CANT	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIO			1.00	M2	55.0		55.00	

CANTIDAD CONTRACTUAL	100.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	55.00
OBRA A EJECUTAR	45.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 55.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbanizacaribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.47	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
ACTA DE APERTURA				UND	89,00			
ACTA DE CIERRE				UND	0,00			
TRAMO 2								
ACTA DE APERTURA				UND	71,00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 3								
ACTA DE APERTURA				UND	11,00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 4								
ACTA DE APERTURA				UND	0,00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 5								
ACTA DE APERTURA				UND	1,00			
ACTA DE CIERRE								

CANTIDAD CONTRACTUAL	250,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	172,00
OBRA A EJECUTAR	78,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	172,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.48	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SERVICIO DE GALVANIZADO EN CALIENTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

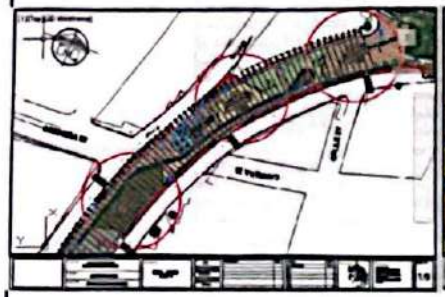

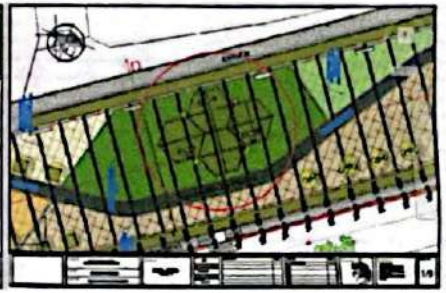

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	KG
TRAMO 1								
ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V72 - V77				KG	4338.75			4.338.75
ESTRUCTURA METALICA MODULO DE SERVICIO V98-V103				KG	4128.61			4.128.61
ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V119- V123				KG	4338.75			4.338.75
TRAMO 2								
ESTRUCTURA METALICA ASOLEADERO V188- V193				KG	4338.75			4.338.75

CANTIDAD CONTRACTUAL	26400.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	17144.86
OBRA A EJECUTAR	9255.14

TOTAL PRESENTE ACTA:	17.144.86

OBSERVACIONES: KG CUBIERTA DE LOS MODULOS NO ESTA INCLUIDO

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ESTRUCTURA METALICA PARA PERGOLAS

LOCALIZACION	ELEMENTO	TIPO ACERO	DIMENSIONES								TOTALES			
			LONG (MM)	ANCHO (MM)	ALTO	ESPESOR (MM)	UND	CANT X ELEMENTOS	CANT DE ELEMENTOS	PESO KG/M3	KG	M2	M3	ACTA
MODULO TIPO PERGOLA	PLACA BASE	A 36	0,25	0,25		0,0120	KG	1,0	16,0	7850,00	74,575			1
	RIGIDIZADOR	A 36	0,067	0,10		0,0064	KG	4,0	16,0	7850,00	21,543			1
	COLUMNA 4"	A36	2,90			0,004	KG	1,0	12,0	11,06	384,89			1
	COLUMNA 4"	A36	3,30			0,004	KG	1,0	4,0	11,06	145,99			1
	COLUMNA 4"	A36	0,25			0,004	KG	1,0	6,0	11,06	16,59			1
	PLATINA UNION	A36	0,25	0,08		0,00475	KG	1,0	16,0	7850,00	11,69			1
	PLATINA UNION	A36	0,30	0,08		0,00475	KG	1,0	8,0	7850,00	7,16			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	5,63	100,00	150,00	0,004	KG	1,0	4,0	15,46	348,16			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	6,0	4,0	15,46	1113,12			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	-1,0	1,0	15,46	-46,38			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,44	90,00	50,00	0,0025	KG	30,0	4,0	5,37	1572,34			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,19	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	188,16			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,82	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	156,37			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,50	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	128,88			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,14	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	97,95			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,80	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	68,74			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,45	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	38,66			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,12	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	10,31			1
										SUBTOTAL	4338,78			
MODULO DE SERVICIO	PLACA BASE	A 36	0,25	0,25		0,0120	KG	1,0	16,0	7850,00	74,575			1
	RIGIDIZADOR	A 36	0,067	0,10		0,0064	KG	4,0	16,0	7850,00	21,543			1
	COLUMNA 4"	A36	2,90			0,004	KG	1,0	10,0	11,06	320,74			1
	COLUMNA 4"	A36	0,25			0,004	KG	1,0	6,0	11,06	16,59			1
	PLATINA UNION	A36	0,25	0,08		0,00475	KG	1,0	16,0	7850,00	11,69			1
	PLATINA UNION	A36	0,30	0,08		0,00475	KG	1,0	8,0	7850,00	7,16			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	5,63	100,00	150,00	0,004	KG	1,0	4,0	15,46	348,16			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	6,0	4,0	15,46	1113,12			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	3,00	100,00	150,00	0,004	KG	-1,0	1,0	15,46	-46,38			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,44	90,00	50,00	0,0025	KG	30,0	4,0	5,37	1572,34			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	2,19	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	188,16			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,82	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	156,37			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,50	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	128,88			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	1,14	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	97,95			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,80	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	68,74			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,45	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	38,66			1
	TUBO RECTANGULAR	A36	0,12	90,00	50,00	0,0025	KG	4,0	4,0	5,37	10,31			1
										SUBTOTAL	4128,61			
OBSERVACIÓN: KG DE ESTUCTURA DE CUBIERTA NO ESTAN INCLUIDOS														

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — Barranquilla Caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.88	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES EN CONCRETO PARA BARANDAS DE 30*15 Y ALTO 10CM, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NO ANCLAJES

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
COSTADO DERECHO								
VIG 5 - VIG 137			10.00	UND	230.00			
COSTADO IZQUIERDO								
VIG 5- VIG ESPECIALES			10.00	UND	180.00			
VIG 124- VIG 137			10.00	UND	22.00			
TRAMO 2								
COSTADO DERECHO								
V143 - V168			10.00	UND	44.00			
V169 - 210			10.00	UND	55.00			
COSTADO IZQUIERDO								
V169 - 210			10.00	UND	70.00			
CALLE 21								
VIG 213			10.00	UND	9.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1800.00	
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	610	
OBRA A EJECUTAR	1190.00	

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 610

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RETIRO DE BARANDA EXISTENTE

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

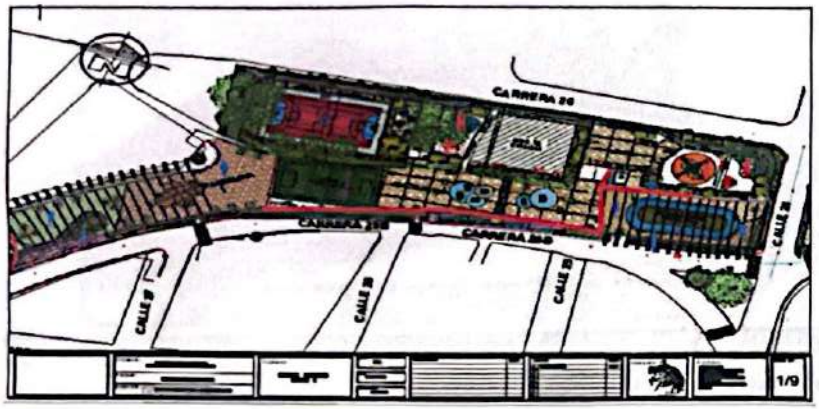

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
ANTES DE LA CANCHA DE FURBOL SINTETICA	142.70			ML	142.70	142.70		

CANTIDAD CONTRACTUAL	150.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	142.70
OBRA A EJECUTAR	7.30

TOTAL PRESENTE ACTA:	142.70

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — NIT 890102018-1 — urbe caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.86	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DISEÑO ELECTRICO DE MODULOS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

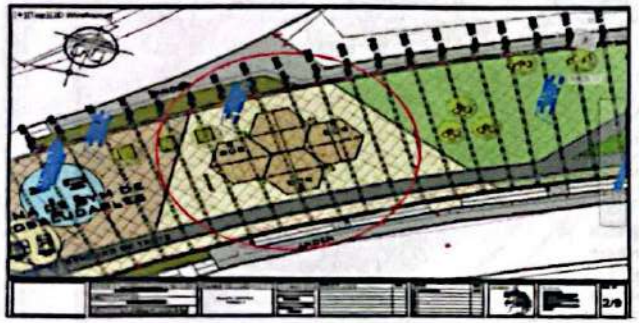

REGISTRO FOTOGRAFICO

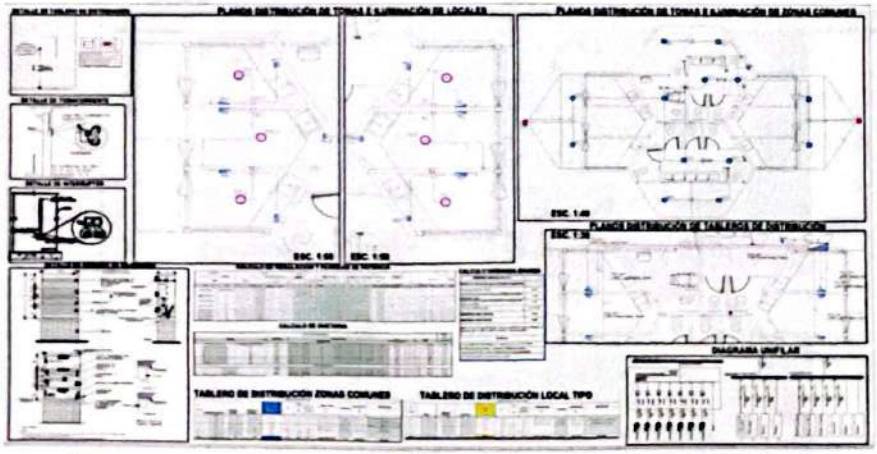

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
					1,00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1,00
OBRA A EJECUTAR	0,00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 1,00

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbanizadora caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.75	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MC-105

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

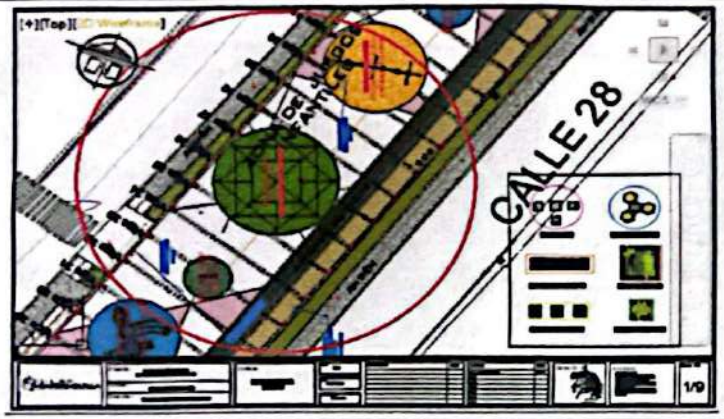

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	1.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1.00
OBRA A EJECUTAR	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 1.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTO DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.88	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE PATINAJE, NO ADHERIDA, DE 18 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE PATINAJE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
AREA DE PISTA					197,82		197,82	

CANTIDAD CONTRACTUAL	200,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	197,82
OBRA A EJECUTAR	2,18

TOTAL PRESENTE ACTA: 197,82

OBSERVACIONES: CANTIDAD DE CUNETA 53,16ML, SE COBRA EN OTRO NP.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — barrio caribe


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.83	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE CORDON EN CONCRETO ENTRE PISOS DE 15 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNA VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS EN 3/8 CADA 30 CM

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

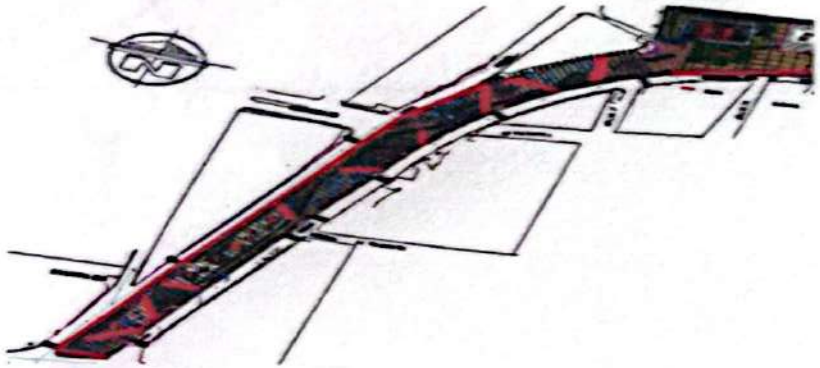

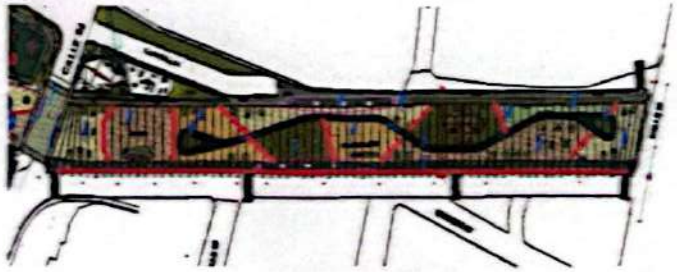

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES
TRAMO 1						
VIG 7-VIG 14	25.66				1	25.66
VIG 18-VIG 21	25.33				1	25.33
VIG 19-V22 INT	9.74				1	9.74
VIG 19-VIG 24 EXT	29.66				1	29.66
VIG 24-VIG 41 EXT	51.00				1	51.00
VIG 22-VIG 62 INT	122.00				1	122.00
VIG 26-VIG 28	12.00				1	12.00
VIG 52-VIG 54	11.08				1	11.08
VIG 19- VIG 61 DER	129.05				1	129.05
VIG 25- VIG 62 IZQ	112.50				1	112.50
VIG 68-VIG 71	14.57				1	14.57
VIG 81-VIG 85	14.92				1	14.92
VIG 61-VIG 87 DER	76.19				1	76.19
VIG 61-VIG 87 IZQ	77.45				1	77.45
VIG 87-VIG 108 DER	59.48				1	59.48
VIG 87-VIG 108 IZQ	60.44				1	60.44
VIG 108- VIG 114 INTERNO	24.00				1	24.00
VIG 108- VIG 114 EXTERNO	28.80				1	28.80
VIG 114-VIG 117	23.77				1	23.77
VIG ESPECIALES (UNIÓN DE PISOS)	17.22				1	17.22
VIG 125- VIG 126	4.50				1	4.50
VIG 126- VIG127	2.86				1	2.86
VIG 136- VIG139	7.50				1	7.50
TRAMO 2						
VIG 147	18.25				1	18.25
VIG 155	17.98				1	17.98
VIG 161- VIG 164	15.22				1	15.22
VIG 164- VIG 167	10.34				1	10.34
VIG 175- VIG 178	13.7				1	13.70
VIG 180- VIG 183	10.78				1	10.78
VIG 183- VIG 186	11.77				1	11.77
VIG 194- VIG 195	8.6				1	8.60
VIG 203- VIG 206	11.76				1	11.76
VIG 207- VIG 209	3.3				1	3.30
VIG 156- VIG 209 (EXTERNO PISTA)	386.4				1	386.40

Scanned with CamScanner





PISTA PERIMERIMETRO RETORNO	40				1	40.00		

CANTIDAD CONTRACTUAL	2815.00	
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1487.97	
OBRA A EJECUTAR	1327.03	

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.487,97

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		


CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.84	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DISEÑO HIDROSANITARIO DE MODULOS DE SERVICIOS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

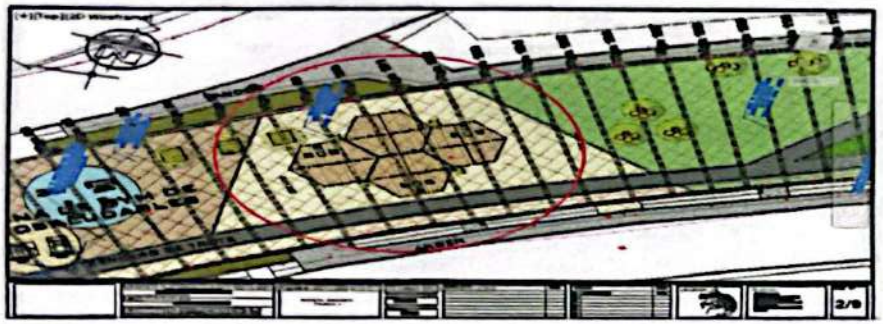

REGISTRO FOTOGRAFICO

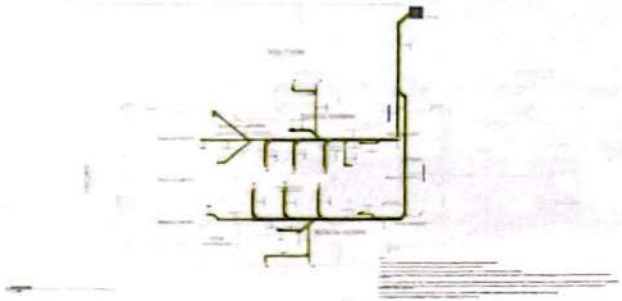

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
					1.00			


CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1.00
OBRA A EJECUTAR	0.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.00


OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Scanned with CamScanner




① CORTE A-A
1 : 50



③ FRONTAL
1 : 50




② CORTE B-B
1 : 50




④ LATERAL
1 : 50

	Proyecto: SOLUCIÓN DEL SURORIENTE PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Parque: SOLUCIÓN DEL SURORIENTE Dirección: CARRERAS 27V 30 CON CALLE 0 Y 30	Contiene: MÓDULO DE VENTA Y SERVICIO	Escala: INDICADA	Observaciones / Fecha	CÓDIGO: / Fecha	Ubicación:	Archivo:	Plano N°: PL 03

Scanned with CamScanner

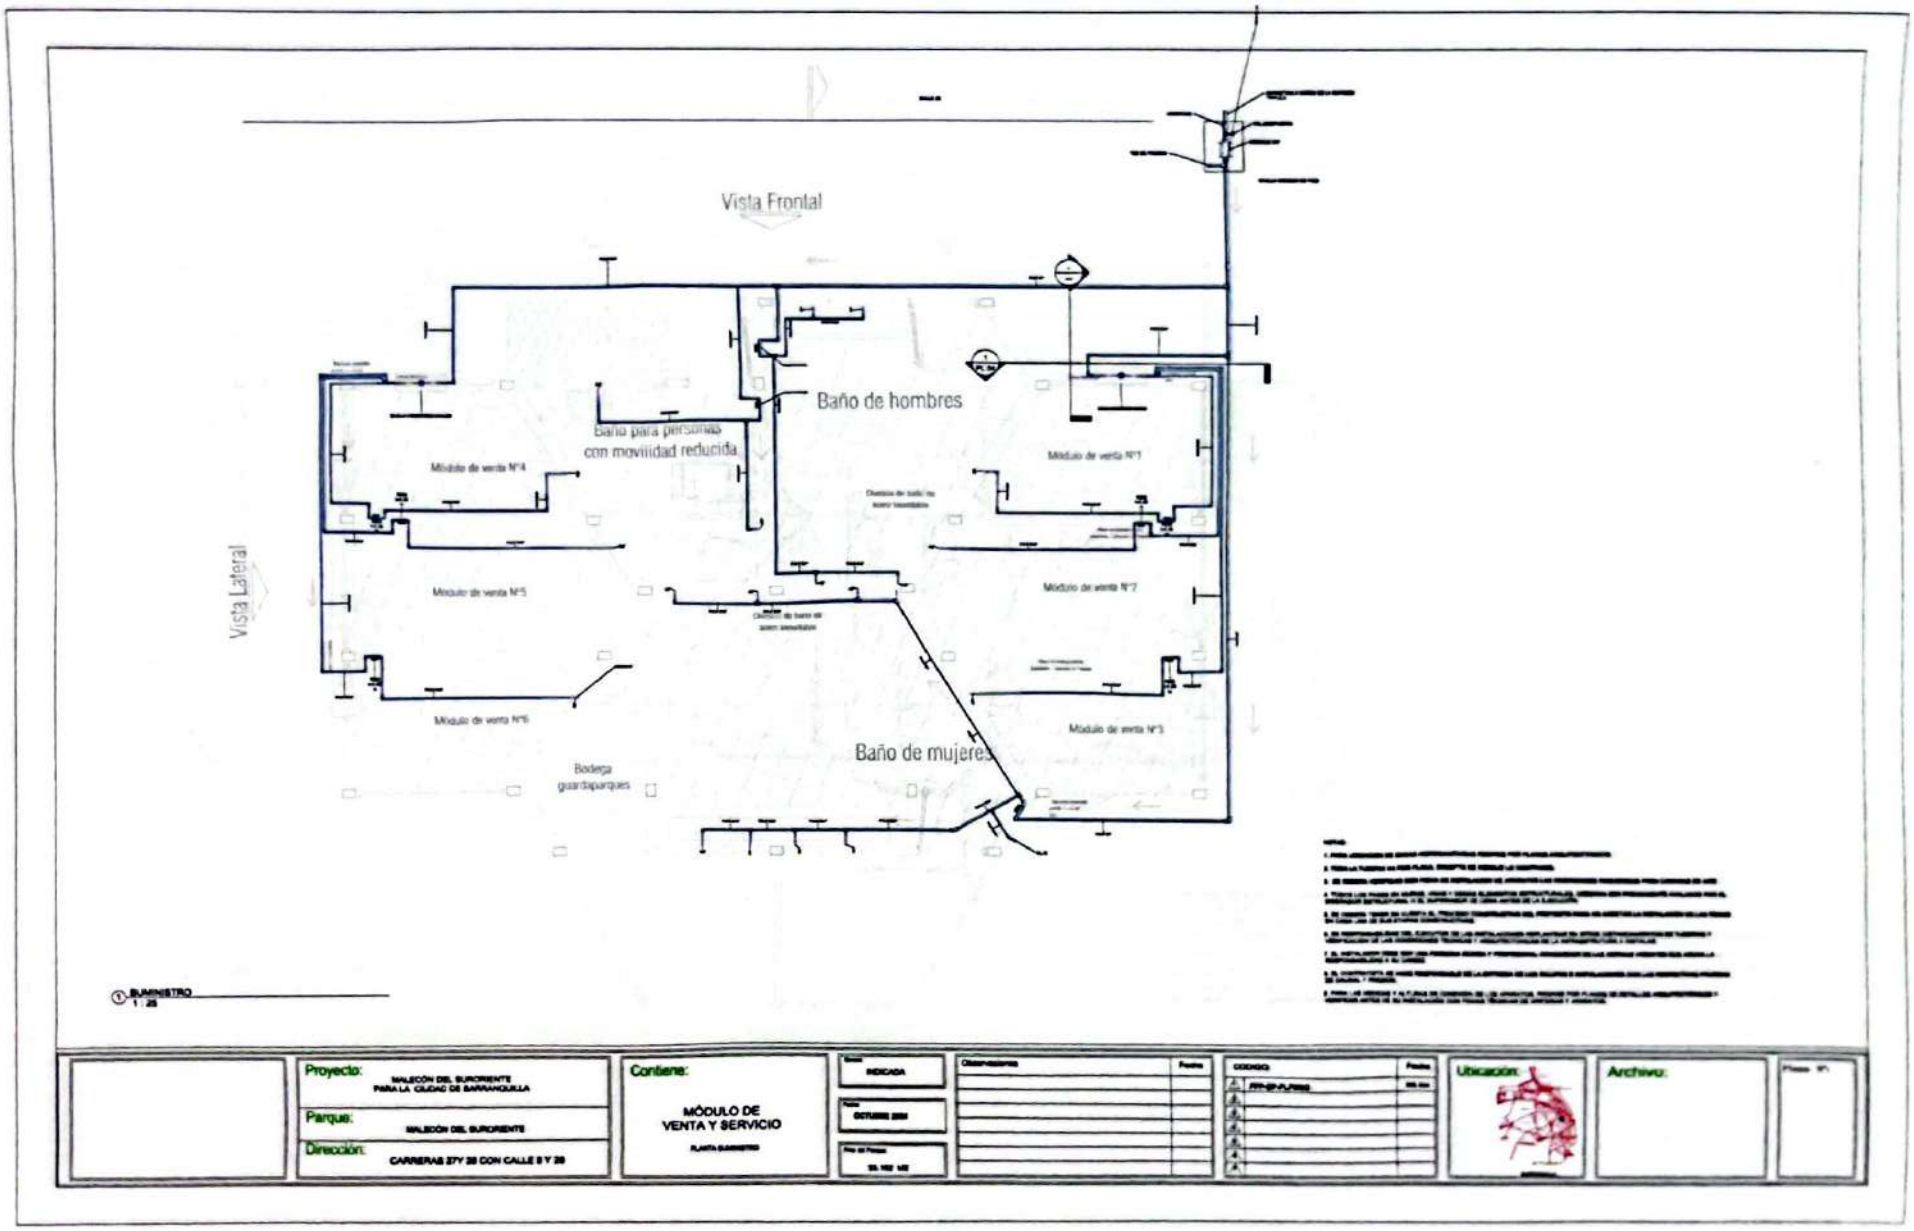

Scanned with CamScanner

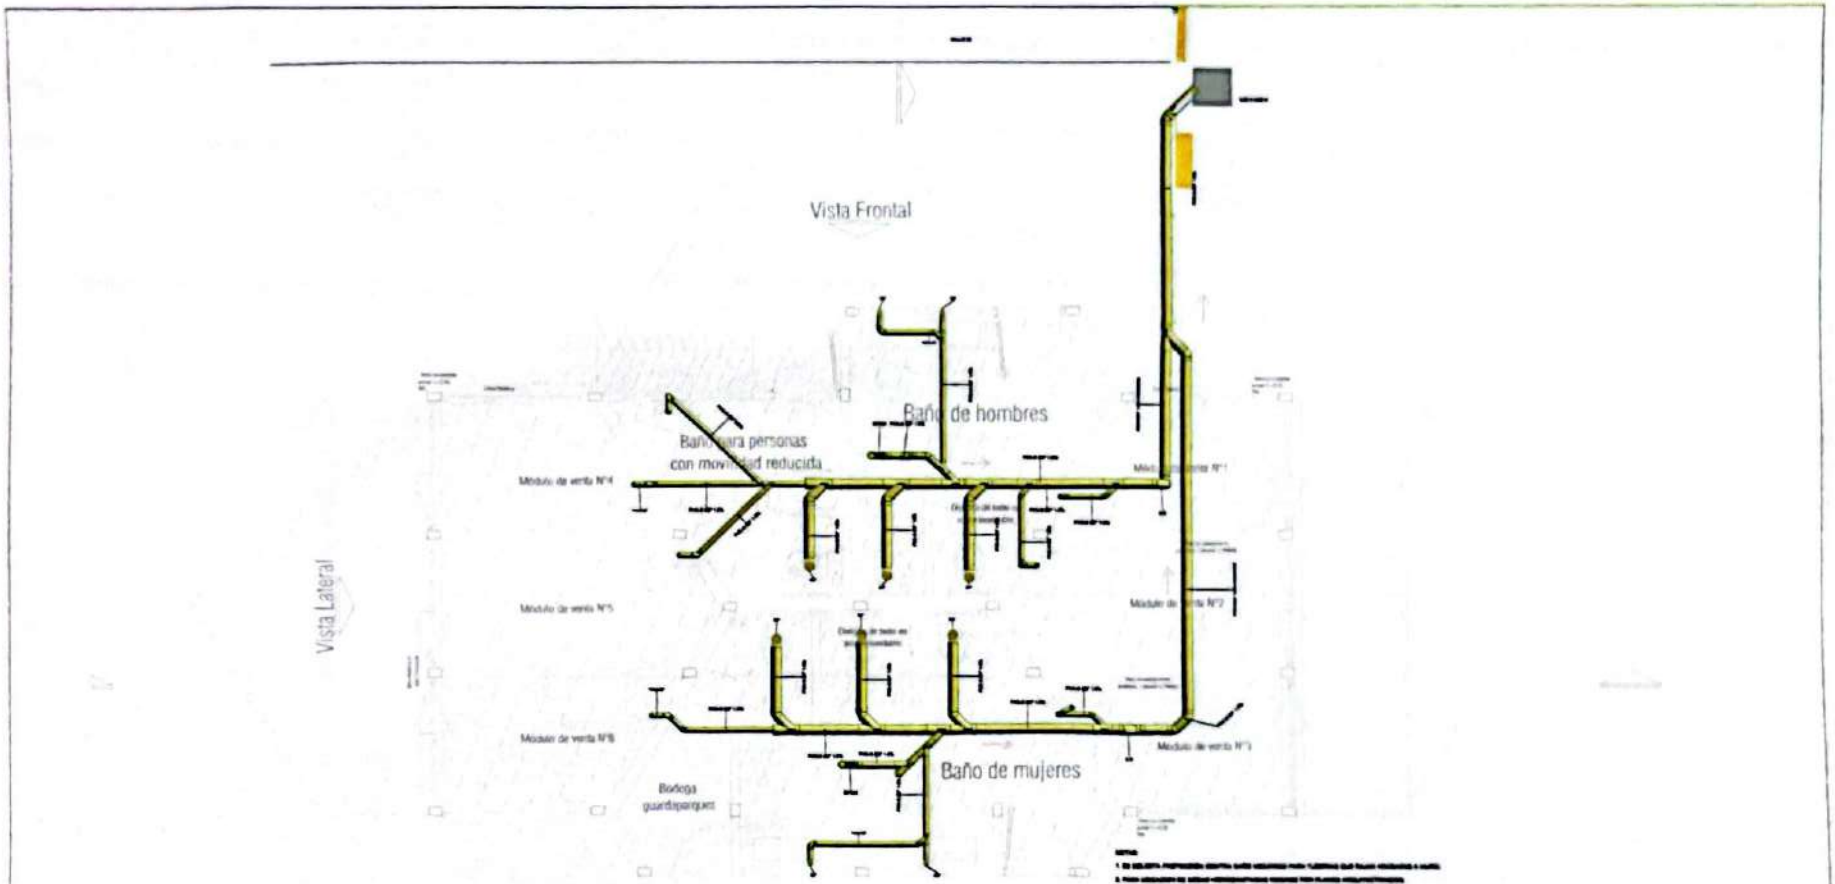
Vista Frontal
Vista Lateral
Baño de hombres
Baño para personas con movilidad reducida
Baño de mujeres
Bodega guardaparques
Modulo de venta N°4
Modulo de venta N°5
Modulo de venta N°6
Modulo de venta N°3
Modulo de venta N°2
Modulo de venta N°1
DESAGUES
1 : 25
Proyecto:
MALECÓN DEL SURORIENTE PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Parque:
MALECÓN DEL SURORIENTE
Dirección:
CARRERAS 27V 29 CON CALLE 6 Y 28
Contiene:
MÓDULO DE VENTA Y SERVICIO
PLANTA DESAGUES
INDICADA
OCTUBRE 2020
Observaciones
Fecha
CODIGO
Fecha
Ubicación:
Archivo:


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.88	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA VERTICAL DE 1,20 DE ALTURA, ANCHO DE 60*60 E INFERIOR 40*40, EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

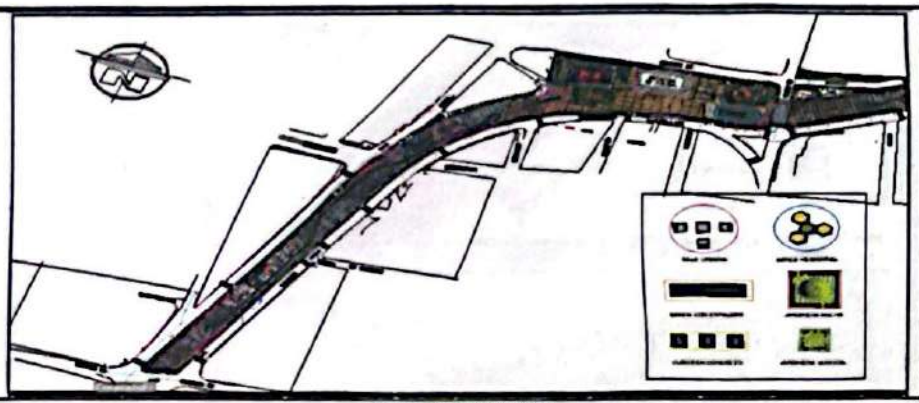

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
	0.40	0.40	1.20	UNF	12.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	36.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	12.00
OBRA A EJECUTAR	24.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 12.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.80	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA DE 1.2MT*1.2*0.80M DE ALTURA, FABIRCADA EN FIBRA DE VIDRIO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



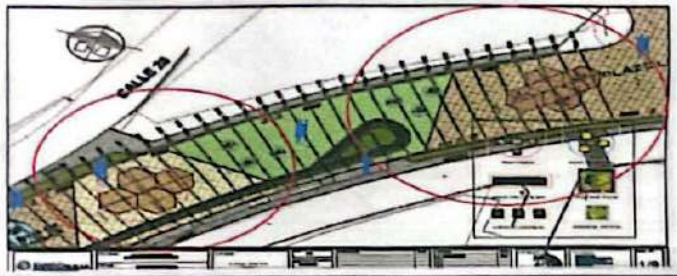

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
	1.00	1.00	0.80		16.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	56.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	16.00
OBRA A EJECUTAR	40.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 16.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 03

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.91	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PREPARACION DE SUPERFICIE, INCLUYE PULIDA DEL PISO EXISTENTE, RETIRO DE RECUBRIMIENTO, GENERACION PERFIL DE ANCLAJE E HIDROLAVADO. (INCLUYE PIULIDORA DE PISO, ACIDOS, HIDROLAVADORAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

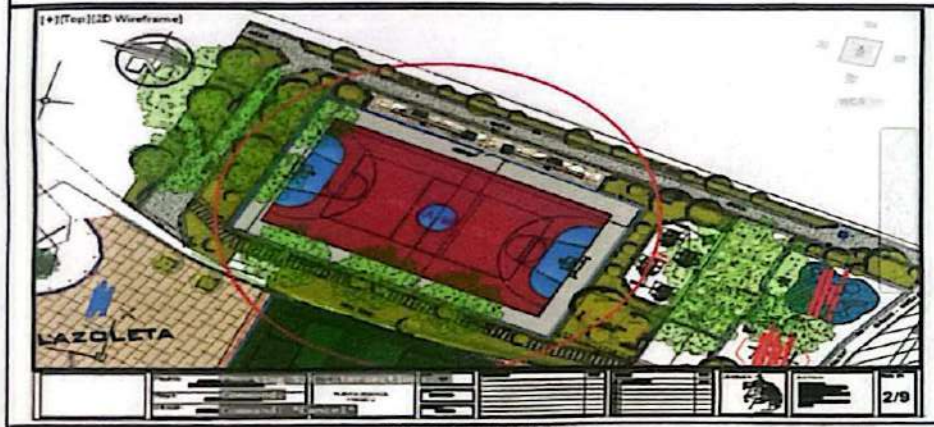

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA MULTIPLE	31.2	19.00					593	

CANTIDAD CONTRACTUAL	593.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	593
OBRA A EJECUTAR	0.0

TOTAL PRESENTE ACTA:	593

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner
