Yopal, 05 septiembre de 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Atn. Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ LOZANO
Director Territorial Casanare (E)
Calle 40 # 21 – 75
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Yopal – Casanare

Referencia: ***Contrato No. 1873 de 2024***
"Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2, Lote 2 (Tramo: Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya")

Asunto: INFORME TAPA HUECOS DEL 28 DE AGOSTO AL 29 AGOSTO DEL 2024, RUTA 6514.

Cordial Saludo,

En atención al mal estado que presentan las ruta 6514 PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA y las constates quejas de los usuarios en la vía se realizó la actividad de tapa huecos el día:

FECHA 28-08-2024,

- En el PR 19+0000 AL PR 31+0500, mano de obra de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARENAS DEL CASANARE (toda la cooperativa)

FECHA 29-08-2024,

- En el PR 31+0500 AL PR 40+0150, mano de obra de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARENAS DEL CASANARE (toda la cooperativa)

Esta intervención se realiza con el fin de mitigar las condiciones de riesgo de los usuarios ante el mal estado de la capa de rodadura, mejorar la seguridad de los usuarios de la vía y evitar posibles demandas al Instituto Nacional de Vías por accidentalidad.
Para la ejecución de estas actividades, se utilizaron los siguientes materiales y recursos:

- **Mezcla asfáltica:** Proporcionado por el CONTRATO 2335/2024 (14 m3) para la ruta 6514.

- **Maquinaria y equipo:** Proporcionados por COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARENAS DEL CASANARE.

MEZCLA ASFÁLTICA ENTREGADA RUTA 6514

MEZCLA ASFALTICA SUM CTO 2335/2024							
FECHA	PLACA VEHICULO	CANTIDAD(M3)	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	PR INICIO	PR FINAL	AVANCE M/V
28/08/2024	AEC294	7	6:57 a. m.	8:30 a. m.	19+0000	31+0500	12500
29/08/2024	AEC294	7	8:45 a. m.	10:00 a. m.	31+0500	40+0150	8650

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES RUTA 6514



FOTO 1: PR 19+0100 ANTES



FOTO 2:PR 19+0100 DURANTE

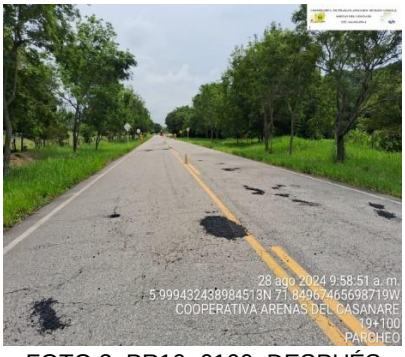


FOTO 3: PR19+0100 DESPUÉS



FOTO 4: PR 20+0370 ANTES



FOTO 5:PR 20+0370 DURANTE



FOTO 6: PR 20+0370 DESPUÉS



FOTO 7: PR 21+0550 ANTES



FOTO 8:PR 21+0550 DURANTE



FOTO 9: PR 21+0550 DESPUÉS



FOTO 10: PR 28+0380 ANTES



FOTO 11:PR 28+0380 DURANTE



FOTO 12: PR 28+0380 DESPUÉS



FOTO 13: PR 31+0500 ANTES



FOTO 14:PR 31+0500 DURANTE



FOTO 15: PR 31+0500 DESPUÉS



ENTREGA O RECIBIDO DE MATERIALES

RECIBO N° 23997

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: 28 - 08 - 2024 PLACA: AEC294

DESTINO: Arq Carolina Reyes Invias

	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TRITURADO ¾		
2.	TRITURADO 1		
3.	TRITURADO 1 ½		
4.	ARENA TRITURADA		
5.	ARENA TRITURADA LAVADA		
6.	BASE TRITURADA 1 ½" TIPO INVÍAS		
7.	SUB BASE TRITURADA 2" TIPO INVÍAS		
8.	SUB BASE TRITURADA PETROLERA T.MAX. 4"		
9.	SUB BASE CLASIFICADA T.MAX. 4"		
10.	CRUDO DE RIO		
11.	CRUDO DE RIO STOCK		
12.	PIEDRA FILTRO DE ¾ A 4" LIMPIA		
13.	PIEDRA BOLO		
14.	MATERIAL MEZCLADO		
15.	MEZCLA ASFÁLTICA — PESO INICIAL 7100 — PESO FINAL 19580 — P. ASF. N°1 X TIPO MDC 19 — TEMPERATURA 148 — HORA SALIDA 6:59 — P. ASF. N°2	m3	6,81
16.			

DESPACHO

DESPACHADO POR: Nombre: Sandra M

RECIBIDO POR: Nombre: Hato cacho C.C. N°: 1033661040

FOTO 16: RECIBO DE DESPACHO



ENTREGA O RECIBIDO DE MATERIALES

RECIBO N° 24161

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA: PLACA: AEC294

DESTINO: Arq Carolina Reyes - Hato Corozal

	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TRITURADO ¾		
2.	TRITURADO 1		
3.	TRITURADO 1 ½		
4.	ARENA TRITURADA		
5.	ARENA TRITURADA LAVADA		
6.	BASE TRITURADA 1 ½" TIPO INVÍAS		
7.	SUB BASE TRITURADA 2" TIPO INVÍAS		
8.	SUB BASE TRITURADA PETROLERA T.MAX. 4"		
9.	SUB BASE CLASIFICADA T.MAX. 4"		
10.	CRUDO DE RIO		
11.	CRUDO DE RIO STOCK		
12.	PIEDRA FILTRO DE ¾ A 4" LIMPIA		
13.	PIEDRA BOLO		
14.	MATERIAL MEZCLADO		
15.	MEZCLA ASFÁLTICA — PESO INICIAL 7060 — PESO FINAL 19870 — P. ASF. N°1 TIPO MDC 19 — TEMPERATURA 150 — HORA SALIDA 8:45 — P. ASF. N°2 X	m3	7,
16.			

DESPACHO

Recibido Arq. Ana Basilia Arroyo del Cacique


DESPACHADO POR: Nombre: Sandra M

RECIBIDO POR: Nombre: Hato cacho C.C. N°: 1033661040

FOTO 17: RECIBO DE DESPACHO

Las actividades de tapa huecos realizadas resultaron en una mejora significativa en la superficie de la vía, mitigando los peligros potenciales asociados con los huecos y mejorando la transitabilidad.

Atentamente,



CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ing. Residente AMV-G2

C.C.: Archivo
Anexo: Informe tapa huecos- Folios (5)
Elaboro: L.Y.S.D
Reviso: C.M.H.F.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PREACTA No. 1 - CANTIDADES DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA

LOCALIZACIÓN: 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

CONTRATO No:	2335-2024
Objeto :	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIA CASANARE
Fecha :	02 septiembre 2024
Período :	16 agosto 2024 DE 31 agosto 2024
Interventoría :	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Contratista :	CAROLINA REYES PEÑA

En YOPAL - CASANARE , a los DOS (2) días del mes de septiembre del año 2024, se reunieron:
En representación del Interventor: CLAUDIA MARITZA HURTADO
En representación del Contratista: CAROLINA REYES PEÑA
La reunión tiene como propósito efectuar la entrega y recibo parcial de las siguientes obras:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla.	M3	14,00	$ 982.411,00	$ 13.753.754,00
			BASICO	$ 13.753.754,00
			IVA	$ 2.613.213,00
			TOTAL	$ 16.366.967,00

CAROLINA REYES PEÑA
C.C No. 46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CLAUDIA MARITZA HURTADO
Residente de amv2
MP 19202-77236 CAU

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PREACTA No. 1 - CANTIDADES DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA

LOCALIZACIÓN: 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

ACTIVIDAD	Suministro de mezcla densa en caliente MDC-19 (suelta), incluye cemento asfaltico, transporte de mezcla, riego de liga, suministro de equipos de compactación, cortadora de pavimento, retiro de sobrantes, no incluye mano de obra instalación mezcla.	UNIDAD	M3

No.	LOCALIZACION	CARRIL	LONGITUD 1 (M)	LONGITUD 2 (M)	ESPESOR (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACION
1	PR 19+0000 AL PR 31+0500 - RUTA 6514	DER - IZQ	BACHEO - TAPAHUECOS			7,00	
2	PR 31+0500 AL PR 40+0150 - RUTA 6514	DER - IZQ				7,00	
						-	
						-	
					TOTAL - SUMINISTRO	**14,00**	

CAROLINA REYES PEÑA
C.C No. 46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CLAUDIA MARITZA HURTADO
Residente de amv2
MP 19202-77236 CAU

PR 19+0000 - RUTA 6514 - VIA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA





PR 23+0600 - RUTA 6514 - VIA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA





MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PREACTA No. 1 - CANTIDADES DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA

LOCALIZACIÓN: 6405 SACAMA - LA CABUYA, 6512 MONTERREY - YOPAL (PASO URBANO YOPAL), 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO y 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

PR 27+0500 AL PR 31+0500 - RUTA 6514 - VIA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA





PR 19+0000 AL PR 31+0500 - RUTA 6514 - VIA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA





PR 31+0500 AL PR 40+0150 - RUTA 6514 - VIA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA



