INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1775 No. 2024 MUNICIPIO ARATOCA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA - SANTANDER		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 4a # 4 - 32		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ARATOCA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$3.488.878.023,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$615.684.357,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$4.104.562.380,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	08/07/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	07/11/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MANUEL ANTONIO LINARES DONATO	08/07/2024	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARIA PAULA SUAREZ SERRANO	08/07/2024	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 37824	28/06/2024	10/12/2024
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 370101	06/04/2024	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AB000683	08/07/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	08/07/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 08/07/2026		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA			
VALOR INTERVENTORÍA			
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.221.107.309), contra entrega de los siguientes productos: contra entrega de los siguientes productos: A. Requisitos de legalización del convenio B. Soporte de incorporación de los recursos del convenio al presupuesto del Municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución.	N/A	DD/MM/AAAA	$1.221.107.309
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.221.107.307), contra entrega de los siguientes productos: A. Acta de inicio contratos derivados B. Informe de adecuación del predio. C. Certificación bancaria donde se evidencie la incorporación del recurso correspondiente a la cofinanciación apartada por el Municipio	N/A	DD/MM/AAAA	$1.221.107.307
TERCER DESEMBOLSO	UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($523.331.704) contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$523.331.704
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 523.331.703) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.	100%	DD/MM/AAAA	$ 523.331.703
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.221.107.309
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AB000683	Cumplimiento	$ 820.912.476.00	08/07/2024	08/07/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	STUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: AGOSTO 2024	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
Componente Técnico:

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna actividad, dado que el convenio se encuentra en la fase inicial del proceso de publicación y selección de contratistas tanto obra como Interventoría.

Componente Administrativo:

Durante el periodo de noviembre de 2024 se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones especificas consignadas en la minuta 1775 de 2024
El día 01 de noviembre de 2024 Se realizó visita por parte de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. para definir punto para hincar poste de concreto para el retiro de redes de media y baja tensión que pasan sobre el Palacio Municipal de Aratoca el día 16 de octubre de 2024 y se otorgó la autorización para la instalación del poste de energía en el espacio público dentro del parque principal del Municipio de Aratoca.

El 15 de noviembre de 2024 mediante correo electrónico se realizó citación a comité de diseños presencial del convenio 1775 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aratoca. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo jueves 21 de noviembre de 2024, a las 10:00am en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aratoca - Santander (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

“(…) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)”

"(…) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (…)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

El 21 de noviembre de 2024 se llevó a cabo el primer comité de seguimiento relacionado con la ejecución del convenio 1775 de 2024, en el cual se revisaron los compromisos adquiridos por las partes involucradas. En este comité, uno de los puntos clave era evaluar los avances correspondientes a los estudios y diseños que el Municipio de Aratoca, en el departamento de Santander, había asumido como responsabilidad. Según lo estipulado en el cronograma del convenio, el municipio debía presentar la primera entrega de avances relacionados con los estudios y diseños previstos como parte de las actividades programadas.

Sin embargo, durante la sesión se evidenció que no se realizó la entrega de los documentos o informes asociados a los avances esperados en esta etapa. Asimismo, no se presentaron evidencias que permitieran verificar el cumplimiento parcial o total del hito establecido en relación con los estudios y diseños. Esta situación generó inquietudes respecto al cumplimiento de los plazos y las responsabilidades pactadas en el marco del convenio, por lo que se recomendó establecer medidas correctivas y un seguimiento más riguroso en futuros comités para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.

El 25 de noviembre de 2024 mediante correo electrónico se realizó citación a comité de diseños presencial del convenio 1775 de 2024 suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aratoca. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo jueves 28 de noviembre de 2024, a las 10:00am en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aratoca - Santander (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

"(…) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)"

"(…) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (…)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

El 28 de noviembre de 2024 se llevó a cabo segundo comité de diseños.

Componente Jurídico:
A la fecha no se han realizado actuaciones jurídicas al convenio 1405 de 2024

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

29/08/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
/DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio No. 1775 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**MARIA PAULA SUAREZ SERRANO** Apoyo a la Gestión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

Re: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1775 DE 2024 ARATOCA - SANTANDER

Organizer	Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Jue 21/11/2024, 'de' 10:00 a 11:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	ID21623, planeacion@aratoca-santander.gov.co, Manuel Antonio Linares Donato
Mensaje enviado	Jue 21/11/2024 9:14

1 archivo adjunto (11 KB)
PROYECCIÓN DE LISTA DE ASISTENTES-FINDETER-MUNICIPIOS-25092024.xlsx;

El jue, 21 nov 2024, 9:12 a. m., planeacion planeacion <planeacion@aratoca-santander.gov.co> escribió:

> Saludos.
>
> Adjunto el listado por parte de los funcionarios del municipio de aratoca para ingreso al Min Interior.
>
> Gracias.
>
> El vie, 15 nov 2024, 1:12 p. m., Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co> escribió:
>
> > Doctor
> > **Alexander Galvis Ramírez**
> > Alcalde
> > Municipio de Aratoca
> > Departamento de Santander
> >
> > Ingeniero
> > **Gerson Caballero Lizarazo**
> > Secretaría de Planeación e Infraestructura
> > Municipio de Aratoca

Asunto: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1775 DE 2024 ARATOCA - SANTANDER

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 1775 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aratoca. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo jueves 21 de noviembre de 2024, a las 10:00am en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aguazul - Casanare (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)"

"(...) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (...)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

Por último, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran. Pueden contactarme directamente al número de teléfono celular 3046622592 o 3102319756, y formalmente a través de los correos electrónicos manuel.linares@mininterior.gov.co y mariap.suarez@mininterior.gov.co.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 253 119 217 809

Código de acceso: ihPohb

Para organizadores: Opciones de la reunión

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

Re: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1775 DE 2024 ARATOCA - SANTANDER

Organizer	Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Jue 28/11/2024, 'de' 8:00 a 10:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	ID21623, planeacion@aratoca-santander.gov.co, Gonzalo Antonio Flórez Peña, Manuel Antonio Linares Donato
Mensaje enviado	Jue 28/11/2024 7:10

3 archivos adjuntos (2 MB)

DOC-20241121-WA0007..xlsx; Autorizacion Arq Hugo Badillo Comite CAM.pdf; OFICIO 003 2024 + CITACIÓN.pdf;

Saludos,

Adjunto excel de las personas que van a ingresar al comité el día de hoy según lo reportado a la secretaría de planeación e infraestructura municipal.

AVISO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Usted ha recibido el presente correo electrónico (junto con sus archivos anexos) por alguna de las siguientes razones: i) en alguna oportunidad ha tenido relación con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARATOCA; ii) porque su correo es de uso profesional, comercial o

institucional; iii) porque el contenido de la presente comunicación se enmarca en cualquiera de las funciones legales municipales establecidas en el Artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. Si ha recibido este correo por error por favor elimínelo de su sistema y dé aviso al remitente mediante contestación a su dirección electrónica. Así mismo, le informamos que tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, a ser informado sobre el uso que se les ha dado a sus datos personales, a acceder en forma gratuita a los mismos, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley de protección de datos personales y/o a solicitar la supresión de dichos datos (en los casos en que, por ley, sea procedente). Le invitamos a consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por la Alcaldía y que está publicada en el enlace http://www.aratoca-santander.gov.co/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-de-datos-personales-809935. Este mensaje, y los archivos adjuntos, son confidenciales y se dirigen exclusivamente a su destinatario. Recuerde que está prohibida su utilización, copia, reimpresión y reenvío de la información contenida a menos que su remitente haya autorizado expresamente realizar estas acciones, o estas estén autorizadas por la ley. Así mismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus y, en su caso, eliminarlos.

El lun, 25 nov 2024 a las 16:57, Maria Paula Suarez Serrano (<mariap.suarez@mininterior.gov.co>) escribió:

> Doctor
> **Alexander Galvis Ramírez**
> Alcalde
> Municipio de Aratoca
> Departamento de Santander
>
> Ingeniero
> **Gerson Caballero Lizarazo**
> Secretaría de Planeación e Infraestructura
> Municipio de Aratoca
>
> Asunto: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1775 DE 2024 ARATOCA - SANTANDER
>
> Cordial saludo,
>
> Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 1775 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aratoca. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo jueves 28 de noviembre de 2024, a las 8:00 am en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
>
> Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aguazul - Casanare (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:
>
> ***"(...) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)"***

"(...) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (...)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

Lo anterior, según los compromisos acordados en el pasado comité el día 21 de noviembre.

Por último, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran. Pueden contactarme directamente al número de teléfono celular 3046622592 o 3102319756, y formalmente a través de los correos electrónicos manuel.linares@mininterior.gov.co y mariap.suarez@mininterior.gov.co.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 247 375 476 381

Passcode: s9Wy9Sb3

For organizers: Meeting options

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacy and security

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1775 de 2024 **MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE** DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio, **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER CALLE 4A # 4-32/38/46 Barrio El Centro		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO - FONSECON**		**$ 3.488.878.023**
	APORTES MUNICIPIO DE ARATOCA		**$ 615.684.357**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$ 4.104.562.380**
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	07/NOV/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.24-06017	24/06/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	08 DE JULIO DE 2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	08 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	N/A		FECHA: N/A
	N/A		FECHA: N/A
	N/A		FECHA: N/A
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO	N/A		FECHA: N/A
	N/A		FECHA: N/A
	N/A		FECHA: N/A
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 3.754.328.788,98 MCTE		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 350.000.000,00 MCTE		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

· **Convenio interadministrativo/ Contrato** (*adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA ESTIMADA DE PAGO*	VALOR	OBSERVACIONES
PRIMER DESEMBOLSO	A. Requisitos de legalización del convenio B. Soporte de incorporación de los recursos del convenio al presupuesto del Municipio. C. Aprobación del cronograma de ejecución.	0.00%	08/JUL/2024	$1.221.107.309,00	El Ministerio del Interior en cumplimiento de la Cláusula 6 del Convenio Interadministrativo No.1775 de 2024 realizó el primer desembolso el día 28/08/2024
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acta de inicio contratos derivados B. Informe de adecuación del predio. C. Certificación bancaria donde se evidencie la incorporación del recurso correspondiente a la cofinanciación apartada por el Municipio.	0.00%	29/NOV/2024	$1.221.107.307,00	-
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	30/MAYO/2024	$523.331.704,00	-
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo	100%	31/OCT/2025	$523.331.703,00	-

	26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.				

TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME	$ 1.221.107.309,00
TOTAL. DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE OBRA	$0.00
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$0.00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME *(según información de contratación derivada)*	$ 0,00

(*) – Fecha estimada de pago según el cronograma de actividades aprobado por el Ministerio del Interior.

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **EQUIDAD SEGUROS**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
AB000683	Cumplimiento	$ 820.912.47,00	08/07/2024	08/07/2026

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
400- 47- 994000103426	Cumplimiento	$ 175.000.000,00	28/10/2024	13/09/2030

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Nombre Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
96 – 40 – 01068403	Responsabilidad civil Extracontractual	$ 520.000.000,00	28/10/2024	12/09/2025
96 – 44 - 101193061	Seguro de Cumplimiento	$ 2.628.030.152,30	28/10/2024	12/09/2030

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

• Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
LP-001-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL	

Contrato de Obra Pública No. 164 de 2024	MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024.	$ 3.754.328.788,98 MCTE
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	**UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024** NIT. 901.885.086-9 **R/L SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO** CC: 37.946.883 de Socorro	
Fecha de Acta de inicio del contrato	EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE GARANTÌAS CONTRACTUALES	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 3.754.328.788,98
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
PÓLIZA No.	96 – 44 - 101193061	
FECHA DE LA PÓLIZA	28/10/2024	

- **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
CMA-001-2024 **Contrato de Interventoría No.161 de 2024**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024	$ 350.000.000,00 MCTE
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	**RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ** CC: 13.874.688 de Bucaramanga Dirección: CRA 7#0-30 Barrio San Rafael - Aratoca	
Fecha de Acta de inicio del contrato	EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DE GARANTÌAS CONTRACTUALES	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$350.000.000,00
COMPAÑÍA SEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA	
PÓLIZA No.	400- 47- 994000103426	
FECHA DE LA PÓLIZA	28/10/2024	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	FECHA/OTROS	OBSERVACIÓN
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SEPTIEMBRE 2024	Informe Mensual 3
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	-	En proceso de legalización del contrato
INFORME FINANCIERO	OCTUBRE 2024	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	OCTUBRE 2024	$ 334.843.950,14
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	OCTUBRE 2024	$1.221.649.585,83
OTROS	-	-

6. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- En este periodo de tiempo la entidad procedió a decretar días hábiles para efecto de términos de la contratación estatal en el Municipio mediante el decreto No. 048 de 2024 y se publicaron: el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación de propuestas presentadas, el informe definitivo, Resolución de Adjudicación Nro. 256 (octubre 17 de 2024) y el Contrato en el portal del Secop relacionados con ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024". El proceso se adjudica al proponente Unión Temporal CAM (Palacio Municipal) Aratoca Santander 2024 mediante la resolución Nro. 256 y se suscribe el contrato de obra pública No. 164 de 2024 celebrado entre el Municipio de Aratoca y Unión Temporal CAM (Palacio Municipal) Aratoca Santander 2024. (Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-47624).

- Se generó y publicó los documentos precontractuales y contractuales (Pliego de condiciones, Estudios previos, aviso convocatorias, Estudios del sector, respuesta de observaciones, Resolución de Apertura Nro. 248 (octubre 10 de 2024), pliego de condiciones definitivo, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Mipymes, adendas, acta de cierre, Informe de evaluación, Resolución de Adjudicación Nro. 262 (octubre 28 de 2024), Contrato, el Registro Presupuestal, designación supervisor) en el portal del Secop relacionados con el proceso CMA-001-2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024". por un valor de $350.226.267,00. El proceso se adjudica al proponente Ricardo Andrés Serrano Rodríguez mediante la resolución Nro. 262 y se suscribe el contrato de interventoría No. 161 de 2024 celebrado entre el Municipio de Aratoca y Ricardo Andrés Serrano Rodríguez. (link:https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-14191944).

- Se publicó la Resolución Nro. 246 (octubre 08 de 2024) autorizando la cesión de derechos económicos solicitada y presentada por Cooperativa Prestadora de Servicios Con Seguridad y Seriedad de Trabajo Asociado para del Contrato de Obra no. 116-2024, Numero de proceso MC-INV-020-2024 cuyo objeto es "DEMOLICIÓN Y EXPLANACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARATOCA, SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION No.1775 DE 2024". (Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-13-14135791).

- Se realizó visita por parte de la ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. para definir punto para hincar poste de concreto para el retiro de redes de media y baja tensión que pasan sobre el Palacio Municipal de Aratoca el día 16 de octubre de 2024 y se otorgó la autorización para la instalación del poste de energía en el espacio público dentro del parque principal del Municipio de Aratoca, estos trabajos están programados por parte de la empresa prestadora del servicio para el día 01 de noviembre de 2024.

- Se culmina el proceso de desalojo del bien inmueble del actual Palacio Municipal y se inicia el proceso de desmonte de la carpintería (puertas y ventanas) del inmueble, con el fin de, llevar a cabo la demolición del edificio conforme al proceso contractual LP-001-2024.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

7. INFORME FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

FECHA	MOTIVO	REALIZADA POR
29/08/2024	Verificación de las condiciones y/o limitantes del predio donde se va a construir el nuevo CAM	Arq. Manuel Antonio Linares Donato (Supervisor Ministerio Int. CV No.1775-2024)
30/08/2024	Verificación de las condiciones y/o limitantes del predio donde se va a construir el nuevo CAM	Arq. Manuel Antonio Linares Donato (Supervisor Ministerio Int. CV No.1775-2024)
20/09/2024	Audiencia de Visita de obra y la Audiencia de Asignación de Riesgos y Aclaración de Pliegos	Oferentes interesados del proceso de Licitación Pública No. LP-001-2024

GERSON CABALLERO LIZARAZO
Supervisor Municipio Convenio No. 1775 de 2024
Municipio de Aratoca, Santander

Elaboró: Ing. Mary Alexandra Maldonado / Profesional Sec. Planeación e Infraestructura
Revisó: Ing. Gerson Caballero Lizarazo / Secretario de Planeación e Infraestructura
Aprobó: Ing. Gerson Caballero Lizarazo / Secretario de Planeación e Infraestructura

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1775 DE 2024
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER

INFORME FINANCIERO DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MUNICIPIO DE ARATOCA

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL (CENTRO ADMINISTRATIVO) DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUENTA (AHORROS) No.: 665-80508-1 DEL BANCO: OCCIDENTE

CUENTA (AHORROS) No.: 665-80510-7 DEL BANCO: OCCIDENTE

VALOR CONVENIO **$ 4.104.562.380,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.488.878.023,00**

VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 615.684.357,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	28/08/2024	GIRO 1	$ 1.221.107.309,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE ARATOCA	25/07/2024	GIRO 1	$ 334.617.596,10
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR- MUNICIPIO DE ARATOCA	**$ 1.555.724.905,10**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 665-80508-1 A LA FECHA **$ 1.221.107.309,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 665-80510-7 A LA FECHA **$ 334.617.596,10**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
COTRATO 161 -2024	RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ	350.000.000,00		$ 350.000.000,00
COTRATO 164 -2024	UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024	3.754.328.788,98		$ 3.754.328.788,98
TOTAL CONTRATADO				**$ 4.104.328.788,98**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
							$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	CUENTA BANCARIA
31/07/2024	$ 15.999,80	665-80510-7
31/08/2024	$ 70.865,47	665-80510-7
31/08/2024	$ 33.363,93	665-80508-1
30/09/2024	$ 68.593,78	665-80510-7
30/09/2024	$ 250.258,53	665-80508-1
31/10/2024	$ 70.894,99	665-80510-7
31/10/2024	$ 258.654,37	665-80508-1
TOTAL (3)	**$ 768.630,87**	

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.555.724.905,10**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 768.630,87

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 768.630,87**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.556.493.535,97**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 1.556.493.535,97**

OBSERVACIONES

FIRMA

SANDRA MARCELA JIMENEZ URIBE

Secretaria de Hacienda y del Tesoro

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICI
CL 4 # 4 - 38
ARATOCA - SANTANDER

EBR601886

CUENTA No. 665-80508-1
FECHA DE CORTE: 31/10/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,221,390,931.46
+ 31 CREDITOS	258,654.37
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,221,649,585.83
SALDO PROMEDIO	1,221,512,314.20

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A995497	0.00	8,342.83	1,221,399,274.29
03	INTERESES LIQUIDADOS	A680368	0.00	8,342.89	1,221,407,617.18
04	INTERESES LIQUIDADOS	A479953	0.00	8,342.95	1,221,415,960.13
07	INTERESES LIQUIDADOS	A878363	0.00	8,343.01	1,221,424,303.14
07	INTERESES LIQUIDADOS	A878296	0.00	8,343.06	1,221,432,646.20
07	INTERESES LIQUIDADOS	A878209	0.00	8,343.12	1,221,440,989.32
08	INTERESES LIQUIDADOS	A606536	0.00	8,343.18	1,221,449,332.50
09	INTERESES LIQUIDADOS	A611330	0.00	8,343.23	1,221,457,675.73
10	INTERESES LIQUIDADOS	A518114	0.00	8,343.29	1,221,466,019.02
11	INTERESES LIQUIDADOS	A207894	0.00	8,343.35	1,221,474,362.37
15	INTERESES LIQUIDADOS	A152582	0.00	8,343.40	1,221,482,705.77
15	INTERESES LIQUIDADOS	A153701	0.00	8,343.46	1,221,491,049.23
15	INTERESES LIQUIDADOS	A153446	0.00	8,343.52	1,221,499,392.75
15	INTERESES LIQUIDADOS	A152403	0.00	8,343.58	1,221,507,736.33
16	INTERESES LIQUIDADOS	A644795	0.00	8,343.63	1,221,516,079.96
17	INTERESES LIQUIDADOS	A353152	0.00	8,343.69	1,221,524,423.65
18	INTERESES LIQUIDADOS	A279284	0.00	8,343.75	1,221,532,767.40
21	INTERESES LIQUIDADOS	A132976	0.00	8,343.80	1,221,541,111.20
21	INTERESES LIQUIDADOS	A131571	0.00	8,343.86	1,221,549,455.06
21	INTERESES LIQUIDADOS	A131455	0.00	8,343.92	1,221,557,798.98
22	INTERESES LIQUIDADOS	A234892	0.00	8,343.97	1,221,566,142.95
23	INTERESES LIQUIDADOS	A888627	0.00	8,344.03	1,221,574,486.98
24	INTERESES LIQUIDADOS	A761044	0.00	8,344.09	1,221,582,831.07
25	INTERESES LIQUIDADOS	A245259	0.00	8,344.15	1,221,591,175.22
28	INTERESES LIQUIDADOS	A153429	0.00	8,344.20	1,221,599,519.42
28	INTERESES LIQUIDADOS	A153226	0.00	8,344.26	1,221,607,863.68
28	INTERESES LIQUIDADOS	A151227	0.00	8,344.32	1,221,616,208.00
29	INTERESES LIQUIDADOS	A352647	0.00	8,344.37	1,221,624,552.37
30	INTERESES LIQUIDADOS	A084913	0.00	8,344.43	1,221,632,896.80
31	INTERESES LIQUIDADOS	A538761	0.00	8,344.49	1,221,641,241.29
31	INTERESES LIQUIDADOS	A515230	0.00	8,344.54	1,221,649,585.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICI
CL 4 # 4 - 38
ARATOCA - SANTANDER

EBR601886

CUENTA No. 665-80510-7
FECHA DE CORTE: 31/10/2024

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	334,773,055.15
+ 31 CREDITOS	70,894.99
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	334,843,950.14
SALDO PROMEDIO	334,806,325.14

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A995492	0.00	2,286.70	334,775,341.85
03	INTERESES LIQUIDADOS	A680360	0.00	2,286.72	334,777,628.57
04	INTERESES LIQUIDADOS	A479950	0.00	2,286.73	334,779,915.30
07	INTERESES LIQUIDADOS	A878368	0.00	2,286.75	334,782,202.05
07	INTERESES LIQUIDADOS	A878306	0.00	2,286.76	334,784,488.81
07	INTERESES LIQUIDADOS	A878214	0.00	2,286.78	334,786,775.59
08	INTERESES LIQUIDADOS	A606533	0.00	2,286.79	334,789,062.38
09	INTERESES LIQUIDADOS	A611328	0.00	2,286.81	334,791,349.19
10	INTERESES LIQUIDADOS	A518109	0.00	2,286.83	334,793,636.02
11	INTERESES LIQUIDADOS	A207885	0.00	2,286.84	334,795,922.86
15	INTERESES LIQUIDADOS	A152578	0.00	2,286.86	334,798,209.72
15	INTERESES LIQUIDADOS	A153691	0.00	2,286.87	334,800,496.59
15	INTERESES LIQUIDADOS	A153442	0.00	2,286.89	334,802,783.48
15	INTERESES LIQUIDADOS	A152396	0.00	2,286.90	334,805,070.38
16	INTERESES LIQUIDADOS	A644792	0.00	2,286.92	334,807,357.30
17	INTERESES LIQUIDADOS	A353142	0.00	2,286.94	334,809,644.24
18	INTERESES LIQUIDADOS	A279282	0.00	2,286.95	334,811,931.19
21	INTERESES LIQUIDADOS	A132928	0.00	2,286.97	334,814,218.16
21	INTERESES LIQUIDADOS	A131554	0.00	2,286.98	334,816,505.14
21	INTERESES LIQUIDADOS	A131443	0.00	2,287.00	334,818,792.14
22	INTERESES LIQUIDADOS	A234890	0.00	2,287.01	334,821,079.15
23	INTERESES LIQUIDADOS	A888625	0.00	2,287.03	334,823,366.18
24	INTERESES LIQUIDADOS	A761040	0.00	2,287.04	334,825,653.22
25	INTERESES LIQUIDADOS	A245265	0.00	2,287.06	334,827,940.28
28	INTERESES LIQUIDADOS	A153424	0.00	2,287.08	334,830,227.36
28	INTERESES LIQUIDADOS	A153205	0.00	2,287.09	334,832,514.45
28	INTERESES LIQUIDADOS	A151217	0.00	2,287.11	334,834,801.56
29	INTERESES LIQUIDADOS	A352645	0.00	2,287.12	334,837,088.68
30	INTERESES LIQUIDADOS	A084910	0.00	2,287.14	334,839,375.82
31	INTERESES LIQUIDADOS	A538837	0.00	2,287.15	334,841,662.97
31	INTERESES LIQUIDADOS	A515234	0.00	2,287.17	334,843,950.14

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO	INFORME
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	No.18

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No:	No. 1775 DE 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER		
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER		
VALOR DEL PROYECTO:	$ 4,104,562,380.00	**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:**	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL (meses):	16 MESES	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA INICIAL:**	SIN FECHA DEFINIDA
PRORROGA No. 1 (meses):	N/A	**FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADO:**	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 2 (meses):	N/A	**FECHA DE PERIODO DEL INFORME:**	28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO (meses):	16 MESES		

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJECUTOR EN EL PERIODO:

1- SE ADJUDICA EL PROCESO AL PROPONENTE UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024 MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nro. 256 Y SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 164 de 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARATOCA Y UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024 Y SE PUBLICARON EN EL PORTAL DEL SECOP DEL PROCESO LP-001-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1775 DE 2024". (LINK: DETALLE DEL PROCESO: LP-001-2024 (CONTRATOS.GOV.CO))

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Contrato	CONTRATO	PDF	6.32 MB	2	01-11-2024 07:14 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION	PDF	302 KB	1	31-10-2024 07:00 PM

Alcaldía de ARATOCA
NIT.890205334-5

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 164 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER Y UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024

OBJETO	**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024.**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE ARATOCA –SANTANDER.** Nit. 890.205.334-5 Representado Legalmente por: **ALEXANDER GALVIS RAMIREZ** C.C. 91.452.162 expedida en Aratoca Alcalde Municipal
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024,** NIT: 901.885.086-9 R/L **SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO** CC: N° 37.946.883 De Socorro
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
VALOR INICIAL	TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.754.328.788,98),
PLAZO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA	28 DE OCTUBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber, **ALEXANDER GALVIS RAMIREZ** mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Aratoca (Santander), identificado con cédula de ciudadanía No. 91.452.162 expedida en Aratoca, autorizado para la suscripción del presente Contrato por el Numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Política, el Parágrafo 4 del Artículo 18 y el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, facultada por las disposiciones vigente de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo a lo señalado en el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado emitido el 11 de marzo de 2015, Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE ARATOCA entidad Estatal, con Nit. 890.205.334-5 quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por la otra; proponente **UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024,** identificada con Nit, 901.885.086-9representado legalmente por **SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 37.946.883 De Socorro, quien declara que se halla legalmente capacitado para ejecutar el presente contrato, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad ni en ninguna de las prohibiciones especiales para contratar o demás causas señaladas en la Ley que le impidan suscribir y ejecutar el contrato de conformidad con la ley 80 de 1993, 617 de 2000, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas aplicables, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: **1.** Que el municipio de ARATOCA por intermedio de la Secretaria de Planeación Municipal elaboró e inscribió ante el banco de programas y proyectos de inversión del municipio, el proyecto denominado "**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024**", con número BPIN 2024680510001, según constancia que se adjunta a la presente. **2.** Que en virtud de lo anterior se requirió adelantar un proceso contractual a través de la modalidad de Licitación de Obra Pública, la cual se identificó con el número LP-001-2024 de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y las disposiciones generales de Ley 80 de 1993, y demás normas que las modifiquen o complementen. **3.** Que el Municipio cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 24-08025 del 16 de Agosto de 2024, por valor de $ 3.754.328.788,98, vigencia fiscal 2024, expedido por la Oficina de Presupuesto. 4. Que el referido proceso se adelantó y desarrollo de acuerdo a la cronología, etapas y actuaciones que se describen en el acto de adjudicación del contrato, el cual hace parte integral

Alcaldía de ARATOCA
NIT.890205334-5

RESOLUCIÓN NÚMERO 256
(17 de octubre de 2024)

Por medio de la cual se adjudica el proceso de LICITACION PUBLICA No. LP-001-2024.

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ARATOCA, SANTANDER, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Veintinueve (29) de agosto de 2024 la Alcaldía municipal de Aratoca publicó en el SECOP I, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-21-47624 (i) el aviso de convocatoria pública; (ii) el estudio de mercado; (iii) los estudios previos; (iv) el proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos y apéndices del Proceso de Contratación de Licitación Pública No. LP-001-2024, cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024"**

Que el Municipio de Aratoca – Santander expidió la Resolución No. 229 del 17 de septiembre de 2024, que ordenó la apertura del Proceso de Contratación de Licitación Publica Cuantía No. LP-001-2024.

Que la entidad estableció que, por la naturaleza del contrato, el procedimiento para llevarse a cabo es el de Licitación Pública, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y Decreto reglamentario 1082 de 2015.

Que hasta el día treinta (30) de septiembre de 2024, término establecido en el pliego de condiciones para la presentación de propuestas, se presentaron los siguientes oferentes:

PROPONENTE UNICO:

Nro.	Nombre del proponente	Fecha y hora de la radicación.	Poliza de seriedad de la oferta	Folios
1	UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024 R/L SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 37.946.883 de Socorro	RADICADO: 30/09/2024 A LAS 08:20 A.M	N° 96-44-101192016 Expedición: 24/09/2024 Vigencia: 30/09/2024 hasta 30/01/2025 Valor asegurado: $ 375.433.611,30 SEGUROS DEL ESTADO	SIN FOLIAR

Que la única propuesta presentada por UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024, Representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 37.946.883 de Socorro, fue evaluada por el Comité Evaluador de Propuestas, quien verifico la documentación aportada para el cumplimiento de la capacidad jurídica, capacidad financiera y de contratación, requisitos legales, requisitos técnicos y experiencia, de acuerdo a los lineamientos del Pliego de Condiciones Definitivo, constatando que NO CUMPLÍA con la totalidad de los requisitos habilitantes exigidos, por lo cual debía subsanar dentro del término de traslado so pena de rechazo.

Que una vez verificado los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones, se dio traslado al informe de evaluación, dando cumplimiento de la normativa correspondiente, y frente a dicho informe no se presentaron observaciones pero se allegaron las respectivas subsanaciones profiriendo el informe de evaluación definitivo en el cual se indicó que el oferente UNIÓN TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER 2024, Representada legalmente por SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO CC: 37.946.883 de Socorro, cumplía con la totalidad de los requisitos.

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO	INFORME
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	No.18

2- SE ADJUDICA EL PROCESO AL PROPONENTE RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nro. 262 Y SE SUSCRIBE EL CONTRATO DE INTERVENTORIS No. 161 de 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARATOCA Y RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SERRANO Y SE PUBLICARON JUNTO CON LA PROPUESTA PRESENTADA, DESIGNACION DEL SUPERVISOR, EL REGISTRO PRESUPUESTAL, DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN Y EL ACUERDO DE VIGENCIAS FUTURAS EN EL PORTAL DEL SECOP DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024". (LINK: Detalle del proceso: CMA-001-2024 (contratos.gov.co))

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACUERDO VIGENCIAS FUTURAS	PDF	4.19 MB	1	01-11-2024 09:27 AM
Documento Adicional	DOCUMENTOS DE SUBSANACION	PDF	10.61 MB	1	31-10-2024 06:51 PM
Documento Adicional	RP	PDF	164 KB	1	31-10-2024 06:45 PM
Documento Adicional	DESIGNACION SUPERVISOR	PDF	407 KB	1	31-10-2024 06:45 PM
Documento Adicional	PROPUESTA	PDF	67.28 MB	1	31-10-2024 06:45 PM
Contrato	CONTRATO	PDF	584 KB	1	31-10-2024 06:40 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION	PDF	423 KB	1	28-10-2024 05:47 PM
Documento Adicional	INFORME DE EVALUACION	PDF	2.90 MB	1	28-10-2024 05:47 PM

Alcaldía de ARATOCA
NIT 890205334-5

RESOLUCIÓN NÚMERO 262
(28 de octubre de 2024)

Por medio de la cual se adjudica el proceso de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2024.

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE ARATOCA, SANTANDER, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el veintiocho (2) de octubre de 2024, la Alcaldía municipal de Aratoca publicó en el SECOP I, https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14167990 (i) el aviso de convocatoria pública; (ii) el estudio de mercado; (iii) los estudios previos; (iv) el proyecto de pliego de condiciones junto con sus anexos y apéndices del Proceso de Contratación de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2024, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024.**

Que el Municipio de Aratoca – Santander expidió la Resolución No. 248 del 10 de octubre de 2024, que ordenó la apertura del Proceso de Contratación de Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2024.

Que la entidad estableció que, por la naturaleza del contrato, el procedimiento para llevarse a cabo es el de Concurso de Méritos Abierto, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y Decreto reglamentario 1082 de 2015.

Que hasta el día dieciocho (18) de octubre de 2024, término establecido en el pliego de condiciones para la presentación de propuestas, se presentaron los siguientes oferentes:

PROPONENTES:

Nro.	Nombre del proponente	Fecha y hora de la radicación.	Poliza de seriedad de la oferta	Valor de la Oferta	Folios
1	RICARDO ANDREZ SERRANO RODRIGUEZ CC. 13.874.688 de Bucaramanga	18/10/2024	N° 96-44-101192393 Expedición: 11/10/2024 Vigencia: 18/10/2024 hasta 18/02/2025 Valor asegurado: $ 35.022.626.70 GEGUROS DEL ESTADO	$350.000.000	Sin foliar

Que la propuesta presentada por la empresa **RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ** identificado con la cedula de ciudadanía N° 13.874.688 de Bucaramanga, fue evaluada por el Comité Evaluador, quien verifico la documentación aportada para el cumplimiento de la capacidad jurídica, capacidad financiera y de contratación, requisitos legales, requisitos técnicos y experiencia, de acuerdo a los lineamientos del Pliego de Condiciones Definitivo, determinando que la propuesta no cumplía la totalidad de los requisitos habilitantes y debía realizar la correspondiente subsanación.

Que se dio traslado de la evaluación para que los oferentes allegaran subsanación y/o presentaran observaciones, termino en el cual, se radicaron documentos de subsanación, procediendo a generar el informe de evaluación definitivo, recomendándose por el comité evaluador al ordenador del gasto, adjudicar al oferente **RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SERRANO**, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.874.688 de Bucaramanga, por cumplir con la totalidad de requisitos

Alcaldía de ARATOCA
NIT 890205334-5


CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 161-2024
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARATOCA (SANTANDER) Y RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE ARATOCA**
NIT	**890205334-5**
CONTRATISTA	**RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ**
CEDULA DE CIUDADANIA	**N° 13.874.688 DE BUCARAMANGA**
OBJETO	**"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024.."**
VALOR	**TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 350.000.000) MCTE**
FORMA DE PAGO	**EL MUNICIPIO DE ARATOCA, PAGARÁ EL VALOR DEL PRESENTE PROCESO, MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE PAGO HASTA EL 90% DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA Y EL 10% RESTANTE UNA VEZ EJECUTADO EL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORÍA Y LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**
PLAZO DE EJECUCION	**DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE EXPIDA LA ORDEN DE INICIACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ARATOCA Y LA INTERVENTORÍA**

Entre los suscritos a saber, **ALEXANDER GALVIS RAMIREZ,** mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de Aratoca (Santander), identificada con cédula de ciudadanía No. 91.452.162 expedida en Aratoca, autorizada para la suscripción del presente Contrato por el Numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Política, el Parágrafo 4 del Artículo 18 y el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, facultada por las disposiciones vigente de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo a lo señalado en el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado emitido el 11 de marzo de 2015, Radicado número: 11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE ARATOCA entidad Estatal, con Nit. 890.205.334-5 quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte; y por otra parte **RICARDO ANDRES SERRANO RODRIGUEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía número 13.874.688 de Bucaramanga., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **I** La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. **II.** La administración municipal de Aratoca - Santander en ejecución de su programa de gobierno municipal, busca diseñar una serie de estrategias, objetivos y metas tendientes al cumplimiento de los planes y programas definidos en cada uno de los sectores de inversión y en el mismo funcionamiento de la entidad ha diseñado objetivos que le permitan optimizar los recursos y generar el impacto social vislumbrado en la misión del municipio durante el cuatrienio en ejecución. **III.** Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio están las de administrar los asuntos municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el desarrollo de su territorio, construir las obras que demande el progreso municipal; la promoción de la participación comunitaria, mejoramiento social y cultural de sus habitantes, planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción de conformidad con la ley, solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, deporte, población desplazada, vías, vivienda, cultura, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales, promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del municipio y las demás funciones y competencias que le señale la Constitución y la ley;

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO	INFORME
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	No.18

3- SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA INSTALACIÓN DEL POSTE DE CONCRETO EN EL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, PARA EL RETIRO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN QUE PASAN SOBRE EL PALACIO MUNICIPAL DE ARATOCA.

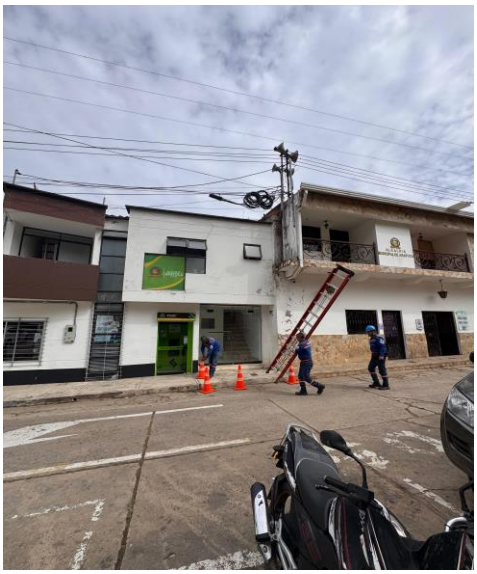










RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL EJECUTOR (ACUMULADOS)

Contratista	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Fecha de inicio del Contrato	Duración (Días)	Valor del contrato

Se firma a los 08 días del mes de noviembre de 2024

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ARATOCA, SANTANDER

Aratoca, 08 de noviembre de 2024 **OFICIO SPL – CAM-017-2024**

Arquitecto:
Manuel Antonio Linares Donato
Supervisor CV No.1775 de 2024
Correo: Manuel.linares@mininterior.gov.co

ASUNTO: Remisión Informe Semanal No.18

OBJETO: *AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER.*

Arquitecto Linares Donato,

Reciba un cordial saludo de parte del Municipio de Aratoca, Santander.

Mediante el presente oficio, me permito remitir el Informe Semanal No.18, correspondiente al período comprendido entre el 28 de octubre al 03 de noviembre de 2024, en el cual se detallan las principales acciones administrativas y de gestión desarrolladas por esta Administración Municipal en el marco del CV No.1775 de 2024.

Agradecemos de antemano su diligente atención y acompañamiento en este proceso, y quedamos atentos a sus observaciones y recomendaciones.

Sin otro particular,

ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO
Supervisor CV No.1775 de 2024
Entidad Territorial

Se adjuntan los siguientes documentos:

- INFORME SEMANAL NO. 18


	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO	INFORME
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	No.19

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No:	No. 1775 DE 2024		
NOMBRE DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER		
EJECUTOR:	MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER		
VALOR DEL PROYECTO:	$ 4,104,562,380.00	**FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:**	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL (meses):	16 MESES	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA INICIAL:**	SIN FECHA DEFINIDA
PRORROGA No. 1 (meses):	N/A	**FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADO:**	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 2 (meses):	N/A	**FECHA DE PERIODO DEL INFORME:**	04 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO (meses):	16 MESES		

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EJECUTOR EN EL PERIODO:

1- SE GENERÓ Y PUBLICÓ EL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24-10102 EN EL PORTAL DEL SECOP DEL PROCESO LP-001-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1775 DE 2024". (LINK: DETALLE DEL PROCESO: LP-001-2024 (CONTRATOS.GOV.CO))

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	RP	PDF	121 KB	1	08-11-2024 04:45 PM
Contrato	CONTRATO	PDF	6.32 MB	2	01-11-2024 07:14 PM

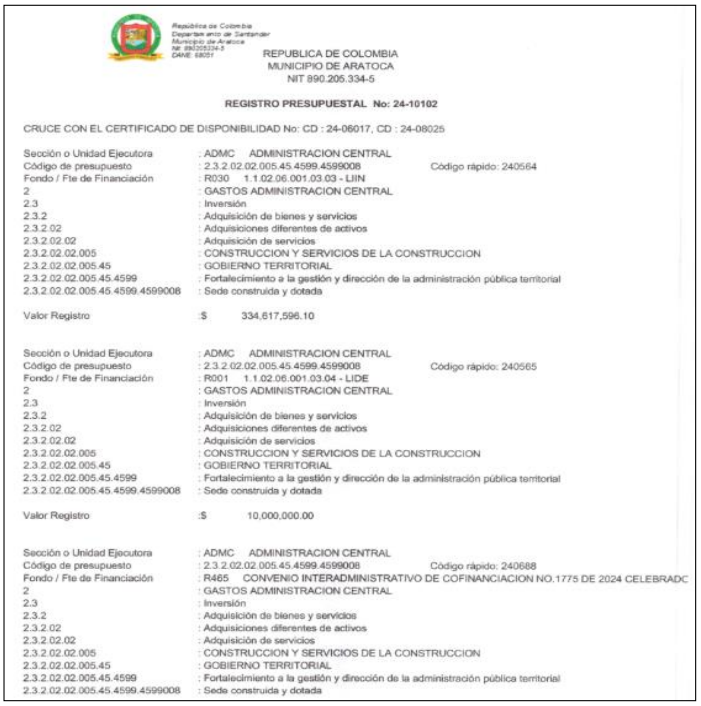

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
NIT 890205334-5
DANE 68051

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ARATOCA
NIT 890.205.334-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-10102

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-06017, CD : 24-08025

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.005.45.4599.4599008 Código rápido: 240564
Fondo / Fte de Financiación	: R030 1.1.02.06.001.03.03 - LIIN
2	: GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.005	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
2.3.2.02.02.005.45	: GOBIERNO TERRITORIAL
2.3.2.02.02.005.45.4599	: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
2.3.2.02.02.005.45.4599.4599008	: Sede construida y dotada

Valor Registro :$ 334,617,596.10

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.005.45.4599.4599008 Código rápido: 240565
Fondo / Fte de Financiación	: R001 1.1.02.06.001.03.04 - LIDE
2	: GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.005	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
2.3.2.02.02.005.45	: GOBIERNO TERRITORIAL
2.3.2.02.02.005.45.4599	: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
2.3.2.02.02.005.45.4599.4599008	: Sede construida y dotada

Valor Registro :$ 10,000,000.00

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.005.45.4599.4599008 Código rápido: 240688
Fondo / Fte de Financiación	: R465 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION NO.1775 DE 2024 CELEBRADC
2	: GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.005	: CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
2.3.2.02.02.005.45	: GOBIERNO TERRITORIAL
2.3.2.02.02.005.45.4599	: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
2.3.2.02.02.005.45.4599.4599008	: Sede construida y dotada



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
NIT 890205334-5
DANE 68051

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ARATOCA
NIT 890.205.334-5

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 24-10102

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 24-06017, CD : 24-08025

Valor Registro :$ 3,179,833,867.88

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.008.45.4599.4599008 Código rápido: 240714
Fondo / Fte de Financiación	: R465 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION NO.1775 DE 2024 CELEBRADC
2	: GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL
2.3	: Inversión
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.008	: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
2.3.2.02.02.008.45	: GOBIERNO TERRITORIAL
2.3.2.02.02.008.45.4599	: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
2.3.2.02.02.008.45.4599.4599008	: Sede construida y dotada

Valor Registro :$ 229,877,325.00

Para : CONTRATO 164 - 2024 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA - SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No 1775 DE 2024.

NIT: 00901885086 - 9 UNION TEMPORAL CAM (PALACIO MUNICIPAL) ARATOCA SANTANDER2024

Por la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS********** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO***** CENTAVOS m/cte. ($3.754.328.788,98)**********

Dado en el día Octubre 31 de 2024

Elaboró: SMJU

Secretario(a) de Hacienda

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE PROYECTO	INFORME
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	No.19

2- SE APRUEBA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Nro. 400-47-994000103426, EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA, EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE ARATOCA Y EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 161 - 2024 Y SE PUBLICA EN EL PORTAL DEL SECOP DEL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS No. CMA-001-2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024". (LINK: Detalle del proceso: CMA-001-2024 (contratos.gov.co))

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	APROBACIÓN DE POLIZAS	PDF	284 KB	1	07-11-2024 08:22 AM
Documento Adicional	ACUERDO VIGENCIAS FUTURAS	PDF	4.19 MB	1	01-11-2024 09:27 AM
Documento Adicional	DOCUMENTOS DE SUBSANACION	PDF	10.61 MB	1	31-10-2024 06:51 PM

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 161-2024 presentada para el proceso de Selección de Concurso de Méritos No. CMA-001-2024, contratista: RICARDO ANDRÉS SERRANO RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 13.874.688 de Bucaramanga

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DELMUNICIPIO DE ARATOCA-SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 de 2024."

El 6 de Noviembre de 2024

1. Se procede a revisar y aprobar la Garantía única de Cumplimiento Nro. 400-47-994000103426, y expedida por Aseguradora Solidaria, en favor del Municipio de Aratoca y en virtud del contrato en referencia.

CRITERIO	VERIFICACIÓN (Para que la póliza sea aprobada debe responder y escribir SI en las siguientes casillas. Cuando se trate de amparos no exigidos para el contrato se suprime esa casilla)			
La póliza tiene como asegurado y beneficiario al de MUNICIPIO DE ARATOCA, identificado correctamente con su NIT.	SI			
La póliza tiene como tomador al contratista, debidamente identificado con nombre, cédula cc.	SI			
La póliza corresponde al objeto del contrato	SI			
La póliza se encuentra firmada por el tomador	SI			
REQUISITO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**	**CUMPLE**
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Hasta la liquidación del contrato, en los términos del numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015. Veinte por ciento (20%) del valor del contrato.	28/11/2024	12/01/2026	$ 70.000.000,00	SI
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de esta garantía debe ser del Diez (10%) del valor del contrato, (según el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015.	28/10/2024	12/09/2028	$ 35.000.000,00	SI
CALIDAD DEL SERVICIO. Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. Se constituirá por un valor equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia de cinco (05) años más contados a partir del acta de recibo final de la obra	27/09/2024	27/10/2027	$ 70.000.000,00	SI

En consideración de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la Garantía única de Cumplimiento Nro. 400-47-994000103426, y expedida por Aseguradora Solidaria, en favor del Municipio de Aratoca y en virtud del contrato en referencia: citada en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos por el MUNICIPIO DE ARATOCA, de acuerdo con el **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 161-2024 del 28 de octubre de 2024.**

SEGUNDO: El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de las garantías a partir de la suscripción del acta de inicio, así como a ampliar el valor de la misma o su vigencia, en el evento en que se suspenda, reinicie, aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

WILMER JOSÉ RODRÍGUEZ MUÑOZ
Secretario General y de Gobierno

PROYECTÓ: Janeyra Ortiz Badillo
ABOGADA OFICINA DE CONTRATACIÓN

REVISÓ ASPECTOS JURÍDICOS: FREDY RIAÑO SALINAS -Asesor Jurídico Planeación

RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL EJECUTOR (ACUMULADOS)

Contratista	Objeto del Contrato	Tipo de contrato	Fecha de inicio del Contrato	Duración (Días)	Valor del contrato

Se firma a los 14 días del mes de noviembre de 2024

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ARATOCA, SANTANDER

Aratoca, 14 de noviembre de 2024 **OFICIO SPL – CAM-018-2024**

Arquitecto:
Manuel Antonio Linares Donato
Supervisor CV No.1775 de 2024
Correo: Manuel.linares@mininterior.gov.co

ASUNTO: Remisión Informe Semanal No.19 / Informe Mensual Octubre

OBJETO: *AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARATOCA – SANTANDER.*

Arquitecto Linares Donato,

Reciba un cordial saludo de parte del Municipio de Aratoca, Santander.

Mediante el presente oficio, me permito remitir el Informe Semanal No.19, correspondiente al período comprendido entre el 04 de noviembre al 10 de noviembre de 2024 y el Informe Mensual del mes de Octubre 2024, en los cuales se detallan las principales acciones administrativas y de gestión desarrolladas por esta Administración Municipal en el marco del CV No.1775 de 2024.

Agradecemos de antemano su diligente atención y acompañamiento en este proceso, y quedamos atentos a sus observaciones y recomendaciones.

Sin otro particular,

ING.GERSON CABALLERO LIZARAZO
Supervisor CV No.1775 de 2024
Entidad Territorial

Se adjuntan los siguientes documentos:

- INFORME SEMANAL NO. 19
- INFORME MENSUAL OCTUBRE

Outlook

Accepted: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1405 DE 2024 @ mié 13 de nov de 2024 2:30pm - 3:30pm (COT) (Maria Paula Suarez Serrano)

Organizer	Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Mié 13/11/2024, 'de' 14:30 a 15:30)
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	NELSON CAMACHO CAICEDO, obraspublicas aguazul-casanare, Manuel Antonio Linares Donato
Asistentes opcionales	Jessica Garcia
Mensaje enviado	Mar 12/11/2024 16:25

1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

No suele recibir correo electrónico de siajessicag@gmail.com. Por qué es esto importante

Jessica Garcia has accepted this invitation.

Attachments



Bogotá D.C

Doctor Nelson Enrique Camacho Caicedo
Alcalde Municipio Aguazul - Casanare
despacho@aguazul-casanare.gov.co

Ingeniero Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Supervisor - Convenio Municipio Aguazul - Casanare
obras@aguazul-casanare.gov.co

Asunto: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1405 DE 2024 AGUAZUL - CASANARE

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aguazul. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo miércoles 13 de noviembre de 2024, a las 2:30pm en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aguazul - Casanare (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

“(…) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)”

“(…) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (…)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

Por último, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran. Pueden contactarme directamente al número de teléfono celular 3046622592 o 3102319756, y formalmente a través de los correos electrónicos manuel.linares@mininterior.gov.co y mariap.suarez@mininterior.gov.co.

When

miercoles 13 de nov de 2024 · 2:30pm – 3:30pm (Hora estandar de Colombia)

Guests

Maria Paula Suarez Serrano - organizer
Jessica Garcia - creator
manuel.linares@mininterior.gov.co
despacho@aguazul-casanare.gov.co
obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co

View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event. To stop receiving future updates for this event, decline this event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

Outlook

CITACION ENTREGA DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1405 DE 2024

Organizer	Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 4 semanas (Jue 21/11/2024, 'de' 14:30 a 16:30)
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	NELSON CAMACHO CAICEDO, obraspublicas aguazul-casanare, Manuel Antonio Linares Donato
Mensaje enviado	Mié 13/11/2024 17:25

Bogotá D.C

Doctor Nelson Enrique Camacho Caicedo
Alcalde Municipio Aguazul - Casanare
despacho@aguazul-casanare.gov.co

Ingeniero Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Supervisor - Convenio Municipio Aguazul - Casanare
obras@aguazul-casanare.gov.co

Asunto: CITACION ENTREGA DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1405 DE 2024 AGUAZUL - CASANARE

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aguazul. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo lunes 25 de noviembre de 2024, a las 2:00pm en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aguazul - Casanare (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)"

“(…) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (…)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

Por último, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran. Pueden contactarme directamente al número de teléfono celular 3102319756, y formalmente a través del correo electrónico manuel.linares@mininterior.gov.co.

Outlook

CITACION ENTREGA DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1405 DE 2024 AGUAZUL - CASANARE

Organizer	Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 3 semanas (Mié 27/11/2024, 'de' 8:00 a 16:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	ID26136, obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co, Karen Daniela Ramirez Mosquera, Manuel Antonio Linares Donato
Mensaje enviado	Lun 25/11/2024 17:47

1 archivo adjunto (11 KB)
PROYECCIÓN DE LISTA DE ASISTENTES.xlsx;

Bogotá D.C

Doctor Nelson Enrique Camacho Caicedo
Alcalde Municipio Aguazul - Casanare
despacho@aguazul-casanare.gov.co

Ingeniero Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Supervisor - Convenio Municipio Aguazul - Casanare
obras@aguazul-casanare.gov.co

Asunto: CITACION COMITE DISEÑOS PRESENCIAL CONVENIO 1405 DE 2024 AGUAZUL - CASANARE

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aguazul. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el proximo 27 Y 28 de noviembre de 2024, a las 9:00am, en las instalaciones del Ministerio del Interior, ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la Cra 8 #12b-31, Edificio Bancol, piso 10, Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aguazul - Casanare (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de

carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)"

"(...) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (...)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

Lo anterior con el fin de recibir por parte del Municipio los entregables mínimos correspondientes al componente de estudios y diseños.

Por último, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran. Pueden contactarme directamente al número de teléfono celular 3046622592 o 3102319756, y formalmente a través de los correos electrónicos manuel.linares@mininterior.gov.co y mariap.suarez@mininterior.gov.co. Asimismo, le solicito una respuesta formal a esta comunicación, adjuntando el listado con los nombres completos, roles en el departamento, convenio o contrato derivado; números de documento y números de contacto de las personas que asistirán a este encuentro (se anexa archivo de diligenciamiento "Proyección de lista de asistentes.xlsx"). Este requerimiento debe ser cumplido con un plazo no menor a dos días hábiles antes de la citación, con el fin de atender las cuestiones logísticas relacionadas con la autorización de acceso al edificio.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 297 095 759 141

Código de acceso: Xo3Di6FD

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

Accepted: CITACION COMITE DISEÑOS VIRTUAL CONVENIO 1405 DE 2024 @ vie 8 de nov de 2024 10am - 11am (COT) (Maria Paula Suarez Serrano)

Organizer	Maria Paula Suarez Serrano <mariap.suarez@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 08/11/2024, 'de' 10:00 a 11:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	NELSON CAMACHO CAICEDO, obraspublicas aguazul-casanare, Manuel Antonio Linares Donato
Asistentes opcionales	Jessica Garcia
Mensaje enviado	Jue 07/11/2024 8:58

1 archivo adjunto (6 KB)

invite.ics;

Jessica Garcia has accepted this invitation.

Bogotá D.C

Doctor Nelson Enrique Camacho Caicedo
Alcalde Municipio Aguazul - Casanare
despacho@aguazul-casanare.gov.co

Ingeniero Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Supervisor - Convenio Municipio Aguazul - Casanare
obras@aguazul-casanare.gov.co

Asunto: CITACION COMITE DISEÑOS VIRTUAL CONVENIO 1405 DE 2024 AGUAZUL - CASANARE

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 1405 de 2024, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de Aguazul. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, deseamos convocar a todas las partes interesadas el próximo viernes 8 de noviembre de 2024, a las 10:00am.

Es imperativo contar con la asistencia mínima de los representantes del Municipio de Aguazul - Casanare (representante legal, supervisores y apoyos a la supervisión). Esta condición es de carácter indelegable e inaplazable, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio, las cuales detallo a continuación:

“(…) CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL MUNICIPIO (...)”

“(…) 28b. b. Participar a través del representante legal del ENTE TERRITORIAL y/o supervisor designado por este para el convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO (…)"

Se solicita por parte del Ministerio del Interior, convocar al Representante legal del contrato de estudios, diseños, obra, así como el representante legal de la interventoría.

Por último, quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que requieran. Pueden contactarme directamente al número de teléfono celular 3046622592 o 3102319756, y formalmente a través de los correos electrónicos manuel.linares@mininterior.gov.co y mariap.suarez@mininterior.gov.co.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 295 343 338 470
Código de acceso: BMwKNq

Para organizadores: Opciones de la reunión
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

When

viernes 8 de nov de 2024 · 10am – 11am (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

Maria Paula Suarez Serrano - organizer
Jessica Garcia - creator
manuel.linares@mininterior.gov.co
despacho@aguazul-casanare.gov.co
obraspublicas@aguazul-casanare.gov.co
View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event. To stop receiving future updates for this event, decline this event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

150.34.35 _____

Aguazul, 05 de noviembre del 2024

Arquitecto
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del convenio 1405 de 2024
Ministerio del interior
Manuel.linares@mininterior.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO Nº 1405-2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

Asunto: Remisión de documentación, INFORME No. 07 PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cordial saludo, Arquitecto Linares,

A través de la presente me permito hacer entrega del informe mensual No. 07, alusivo a las actividades realizadas por el municipio de Aguazul, estipuladas en el convenio 1405 de 2024 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".**

Atentamente,

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura.

Proyecto:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional contratado SIA

CC: Mariap.suarez@mininterior.gov.co

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO No. 1405 DE 2024, MUNICIPIO DE AGUAZUL -CASANARE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE** DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE Calle 11 N 11-35 Barrio las Ferias		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**		**$ 5.289.859.889,67**
	APORTES MUNICIPIO DE AGUAZUL		**$ 933.504.686,41**
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		**$ 6.223.364.576,08**
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2025 11:59 PM		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON	10/09/2024	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.202400297	22/03/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	01/02/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/04/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA:
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 5,784,981,922.06	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 438,382,654.02	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

☐ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** *(adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza, Cronograma de ejecución del Convenio.	NO APLICA		
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.	NO APLICA		
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%		
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP y certificación de conexión a servicios públicos C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. D. Todos los informes de interventoría, informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual junto con las actas de designación de supervisión del municipio.	100%		

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME	$ 0,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS *FECHA*	*FECHA*
605-47-994000105956	Cumplimiento	$ 1.244.672.915,20	15/04/2024	01/02/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

☐ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
MA-SI-LP-005-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	**$ 5.784.981.922,06 COP**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	**CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL**	**Representante Legal:** Deyder Eufranio Cocunbo Vargas
Fecha de Acta de inicio del contrato	**11 de Octubre del 2024**	

Fecha de terminación del contrato	**10 de Mayo del 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$5.777.609.266,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS Nit. 860.002.527-9	
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO No. 400057195	
FECHA DE LA PÓLIZA	05/08/2024	

☐ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra (ADJUDICADO)***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
MA-CMA-SI-008-2024	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	**$438.382.652,96 COP**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
Nombre contratista	**CONSORCIO INTERVENTORIA CAM**	**Representante Legal:** Andrea Viviana Castellanos Pinto
Fecha de Acta de inicio del contrato	**11 de Octubre del 2024**	
Fecha de terminación del contrato	**10 de Mayo del 2025**	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:		**$438.382.652,96**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No.	CUMPLIEMIENTO No.57-44101005773	
FECHA DE LA PÓLIZA	03/10/2024	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	**SI**	**NO**	**DESCRIPICION**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	X		SEPTIEMBRE-2024
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X		
INFORME FINANCIERO	X		
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	X		$ 233.893.575,31
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	X		$ 11.063,42
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X		
OTROS		X	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:

AVANCE CTO 474 DE 2024 SEGUN ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
PROGRAMADO %	43%	$102.852.430
EJECUTADO %	20%	$ 47.621.430

AVANCE CTO 474 DE 2024 PORCENTAJE GENERAL DEL PROYECTO	
PROGRAMADO %	1.78%
EJECUTADO %	0.82%

Los anteriores datos muestran un atraso en la ejecucion del contrato por lo cual se solicita al contratista un Plan de Contingencia con el fin de superar el atraso y cumplir con el objeto contractual a cabalidad.

COMPONENTE TÉCNICO.

OBRA

En el municipio de Aguazul Casanare se realiza el Convenio No. 1405 DE 2024, en el cual la Alcaldia de Aguazul es el ente ejecutor, se realiza el seguimiento al proceso contractual MA-SI-LP-005-2024 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE, el cual se encuentra adjudicado en la pagina de SECOP II, se anexa link con el respectivo proceso: *https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6208205*

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de obra publica No 0474 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
NIT	891855200-9
CONTRATO No.	474 DE 2 DE AGOSTO DE 2024
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA No MA-SI -LP-005-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL
NIT	901.851-802-1
R/L	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
OBJETO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
VALOR INICIAL	$ 5.777.609.266,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES

FECHA DE TERMINACION FINAL:	10 DE MAYO DEL 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA I: Estudios y diseños

Para el periodo comprendido 11 de octubre al 31 octubre del 2024 del presente informe el Contratista de Obra adelanto la ejecución de la Etapa I ; Estudios y diseños, en el cual se adelanron la revisión de los siguientes productos:

PRODUCTO 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: Se revisan las carteras topográficas, planos del levantamiento topográfico, se inspecciona registro fotográfico presentado como parte de las actividades realizadas para el levantamiento de la información requerida, con los respectivos certicados de calibración de equipos vigentes a la fecha de la diligencia, la presente muestra las áreas de intervención y nos muestra una pendiente mínima para la implantación del proyecto.

PRODUCTO 2. ESTUDIO DE SUELOS: El informe presentado describe las condiciones del terreno para conocer las propiedades geomecánicas de las capas y la posición y caracteristicas del nivel freatico se realizaron tres(03) exploraciones mediante excavación manual y cono dinamico hasta encontrar una profundidad máxima de 6.00 metros. El perfil estratigráfico generalizado es una sucesión de limo de baja plasticidad arenoso, las características son buenas, el tipo de perfil de suelo es D, se recomienda que el sistema de cimentación supuerficial sea tipo Zapata individual amarrada en dos direcciones mediante viga de amarre, cumpliendo con los chequeos estructurales a volcamiento.

Productos que fueron entregados a la interventoria y radicados en la entidad contratante para su verificación y aprobación.

INTERVENTORIA

El municipio de Aguazul Casanare se lleva a cabo el contrato de interventoria **MA-CMA-SI-008-2024** cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE". Asdjudicado a el CONSORCIO INTERVENTORIA CAM cuyo representante legal es ANDREA VIVIANA CASTELLANOS identificada con cedula de ciudadanía 33.645.882 de Aguazul,
Se anexa link del proceso:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.6691878&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedurePublicMessageDisplay%2fIndex%3fid%3d6847792%26contractNoticeUniqueIdentifier%3dCO1.NTC.6691878

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

Ficha técnica del contrato de interventoria No 0735 del 2024

INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

NIT	891855200-9
CONTRATO No.	735 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No MA-CMA-SI-008-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM
NIT	901-875-652-5
R/L	ANDREA VIVIANA CASTELLANOS PINTO
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE ".
VALOR INICIAL	$ 438.382.653.00 M/CTE
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
PLAZO ACTUALIZADO	SIETE (7) MESES
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCION ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Diseños

Para el periodo comprendido entre el 11 de octubre del 2024 y el 31 de octubre del 2024 la interventoria efectua el acompañamiento a la revisión detallada de los productos 1 y 2 entregados que hacen parte de la etapa I : Estudios y diseños. Dado que la interventoria tiene como objeto supervisar, verificar y aprobar con el fin de que se cumplan con las especificaciones y normas técnicas, actividades administrativas, técnicas, financieras, contables, ambientales, legales, fiscales y de control para verificar, controlar e intervenir la revisión de planos y demás estudios según lo establecido en el Clausulado del contrato.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

ACTAS GENERASAS CONTRATO No 474 DEL 2024:

A la fecha de corte del 31 de octubre del 2024 se han generado las siguientes Actas del contrato:

Legales:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses
No 03 ANTICIPO	23 / Octubre / 2024	$2.022.163.243,10

El contrato No 474 del 2024 dio inicio el dia 11 de octubre del presente año se realizo la suscripción de la Acta No 1 – ACTA DE INICIO, en la presente intervino el Supervisior el Ing. Juan Miguel Sandoval Secretario de Infraestructura y Deider Eufranio Cocunubo representante legal del Consorcio Centro Administrativo Aguazul, en la misma se expresa que el Plazo de ejecucion es de Once (11) Meses, tiempo que estaría por fuera del plazo del convenio Interadministrativo de Cofinanciacion No. 1405 de 2024.

Se realiza comité técnico el dia 11 de octubre del 2024 de Analisis para la viabilidad de Modificatorio No 01 Al Clausulado Contrato de Obra CO1.PCCNTR.6523569 con numero interno 0474 de Fecha 02 de Agosto de 2024 dentro del proceso de Licitacion Publica No. MA-SI-LP-005-2024 Suscrito entre el Municipio de Aguazul y R/L Deyder Eufranio Cocunubo Vargas del Consorcio Centro Administrativo Aguazul, adjunto se realiza el concepto técnico que contiene las causas de la modificacion en tiempo que se le realiza al contrato de obra.

Se emite el Modificatorio No 01 al Clausulado contrato de obra publica CO1.PCCNTR.6523569 con numero interno 0474 de fecha 02 de agosto de 2024 dentro del proceso de licitación publica no. MA-SI-LP-005-2024 suscrito entre el Municipio de Aguazul y el Consorcio Centro Administrativo Aguazul. R/L Deyder Eufranio Cocunubo Vargas, donde se ajusta el tiempo de ejecucion de la siguente manera:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS	PLAZO DE EJECUCION	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños	1.5 meses	7 MESES
ETAPA II: Ejecucion de obra	5 Meses y 15 dias	
ETAPA III: Puesta en Marcha	Quince (15) dias	

El dia 23 de Octubre del 2024 se suscribe el Acta No 02 – Aclaratorio No 01 Al Acta de Inicio No. 01 del 11 de octubre de 2024 en la cual se aclara que se modifico el plazo contractual inicialmente pactado, adicionalmente por un error involuntario de digitación no se incluyo a el contratista interventor.

ACTAS GENERASAS CONTRATO DE CONSULTORIA No 735 DEL 2024:

A la fecha de corte del 31 de octubre del 2024 se han generado las siguientes Actas del contrato:

LEGALES:

ACTA	FECHA	OBSERVACION
No 01 INICIO	11/ Octubre / 2024	N.A
No 02 ACLARATORIA No 01 AL ACTA DE INICIO No 01 del 11 de Octubre de 2024	23 / Octubre / 2024	7 meses

COMITES Y/O REUNIONES

No	DESCRIPCION	FECHA	ENTIDAD	LUGAR	OBSERVACION
1	Acta de comite	10/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria y Supervision Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Alcaldia de Aguazul	Acta de inicio – Aprobacion y verificación de profesionales

2	Acta de comite	11/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria y Supervision Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Alcaldia de Aguazul	Analisis para Viabilidad de Modificatorio No 01 al Clausulado del contrato de Obra.
3	Acta de comite	11/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria y Supervision Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Alcaldia de Aguazul	Analisis para Viabilidad de Modificatorio No 01 al Clausulado del contrato de Interventoria.
4	Acta de comite	15/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria, Supervision Alcaldia y Supervision Ministerio del Interior.	Ministerio del Interior – Bogota D.C	Comite diseños presencial convenio 1405 de 2024 aguazul – Casanare.
5	Acta de comite	21/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria y Supervision Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Alcaldia de Aguazul	Seguimiento a el Contrato No 735 Etapa 1 Estudios y Diseños, Producto No. 01 Levantamiento topográfico y Producto No 02 Estudio de Suelos
6	Acta de comite	23/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria, Supervision Alcaldia y Supervision Ministerio del Interior.	Virtual	Segundo comite estudios y diseños - Aguazul Casanare (CAM)
7	Acta de comite	24/ Octubre / 2024	Obra, Interventoria y Supervision Alcaldia.	Secretaria de Infraestructura – Alcaldia de Aguazul	Seguimiento a el Contrato No 735 Etapa 1 Estudios y Diseños, Producto No. 03 Diseño Arquitectonico.
8	Acta de comite	31/ Octubre /2024	Obra, Interventoria, Supervision Alcaldia y Supervision Ministerio del Interior.	Ministerio del Interior – Bogota D.C	Citacion tercer comite diseños presencial convenio 1405 de 2024 Aguazul - Casanare

PERSONAL CONTRATO OBRA No 0474 DEL 2024:

ETAPA I : ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL OBRA	NOMBRES Y APELLIDOSS
1	Arquitecto Especialista	Luis Manuel Rojas Gil
2	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	Deyder Eufranio Cocunubo Vargas
3	Ingeniero Geotecnista	Diego Fernando Venegas Rivera
4	Ingeniero Hidrosanitario	Leonardo Arcos Avilez
5	Ingeniero Ambiental	Leydi Johanna Bahamon Trigos
6	Ingeniero Electromecanico	Gloria Stefany Lagos Tiria

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA No 0735 DEL 2024:

ETAPA I : INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ITEM	PERSONAL PROFESIONAL INTERVENTORIA	NOMBRES Y APELLIDOSS
1	Director Ingeniero Civil Especialista	Joan Sebastian Galindo Valderde
2	Residente Ingeniero Civil Especialista	Luis Ernesto Acuña Camargo
3	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras	Andres Felipe Goez Garcia

COMPONENTE FINANCIERO.

OBRA:

En el mes de octubre el municipio de Aguazul, suscribió el Acta No. 03 del 23 de Octubre de 2024 **ACTA DE ANTICIPO** del contrato de obra No 0474 de 2024-08-02 la cual se adjunta con todos sus soportes, se emite la Orden de Pago No 202402764 anticipo del 35% del contrato 0474 de 2024.

A continuación se relaciona el giro de anticipo del 35% efectuado por la entidad contratante de egreso No 1200.65.202403179 de fecha 23 de Octubre del 2024, en la cual el CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL suscribio el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACION Y PAGO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS, Celebrada entre FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA y BG INGENIERIA S.A.S, GEMINIS CG S.A.S, SOUL INGENIERIA CO S.A.S.

BALANCE FINANCIERO CTO DE OBRA			
Valor inicial del contrato	$5.777.609.266,00		
Valor anticipo 35%		$2.022.163.243,10	

Valor pendiente por amortizar			$2.022.163.243,10
Valor pendiente por pagar		$3.755.446.022,90	$3.755.446.022,90
Totales	**$5.777.609.266,00**	**$5.777.609.266,00**	**$5.777.609.266,00**

Se adjunta los estractos de las dos cuentas bancarias en las cuales se encuentra el deposito del dinero del covenio.

Cuenta Aperturada para aporte del Ministerio del Interior:
Numero de cuenta: 001300770200001753
Fecha de corte: 31-10-2024
Saldo: $11.063,42

Cuenta Aperturada para aporte del Municipio:
Numero de cuenta: 001300770200002023
Fecha de corte: 31-10-2024
Saldo: $ 233.893.575,31

COMPONENTE JURÍDICO.

En el mes de Octubre se realizo el Modificatorio No. 01 Al Clausulado Contrato De Obra Publica CO1.PCCNTR.6523569 con Numero Interno 0474 de fecha 02 De Agosto De 2024 dentro del proceso De Licitación Publica No. MA-SI-LP-005-2024 suscrito entre El Municipio De Aguazul Y El Consorcio Centro Administrativo Aguazul. R/L Deyder Eufranio Cocunubo Vargas, con el fin de ajustar el plazo del contrato.

Adicionalmente se efectúo el Modificatorio No. 01 Al Clausulado Contrato De Interventoría CO1.PCCNTR.6523569 con Numero Interno 0735 de fecha 02 De Octubre De 2024 Dentro del proceso De Selección No. MA-CMA-SI-008-2024 Suscrito entre el Municipio De Aguazul Y El Consorcio Interventoría Cam. R/L Andrea Viviana Castellanos Pinto, ajuste en el tiempo de ejecucion del contrato de interventoria.

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE:

A la fecha del presente informe se da por terminada la etapa de Contratacion donde el ente territorial luego de publicar los procesos de selección de los contratistas conforme al estatuto general de contratación adjudico los procesos MA-SI-LP-005-2024 Y MA-CMA-SI-008-2024, los cuales se encuentran publicados en la pagina de SECOP II.

Se da inicio de manera simultanea a los contratos de de obra (Estudios, diseños y construcción) e Interventoria el dia 11 de Octubre del 2024, con la aprobacion de las hojas de vida de los profesionales que participaran en el desarrollo de las actividades del proyecto.

A la fecha del presente informe se inicio con la Etapa I: Estudios y Diseños, realizando la revisión, verificación y aprobación del Producto 1: Levantamiento topográfico y el producto 2: Estudio de Suelos, los cuales se han completado según lo indicado en el Clausulado del contrato, ajustando cada una de las correcciones y recomendaciones realizadas por la entidad contratante. Adicionalmente en el transcurso del mes se adelanto el Producto 3: Diseño Arquitectonico, el cual ha sido revisado en los diferentes comités técnicos, marcando una zonificacion clara que cumple con los m2 propuestos para el convenio interadministrativo, la distribución se encuentra revisada y aprobada por la entidad a la espera de que se entregue el producto completo para continuar asi con

la revisión de los otros componentes, esto con el fin de dar inicio en los tiempos establecidos a la ejecucion de la obra, y no generar inconveniente y atrasos en la entrega del proyecto final.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

22/05/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVALGUTIERREZ
Supervisor Municipio Convenio No. 1405-2024
Municipio de Aguazul Casanare

Proyecto: Jessica Fernanda Garcia Garzon
Profesional Contratado SIA

150.34.35 _____

Aguazul, 26 de noviembre del 2024

Arquitecto
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Supervisor del convenio 1405 de 2024
Ministerio del interior
Manuel.linares@mininterior.gov.co
Bogotá D.C.

Ingeniera
Maria Paula Suarez Serrano
Apoyo a la Supervisión
Ministerio del Interior

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO Nº 1405-2024 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"

Asunto: Reprogramación del desembolso de los recursos

Cordial saludo,

A través de la presente me permito solicitar cordialmente reprogramación de los recursos a la ejecución del convenio interadministrativo 1405 de 2024 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE"** por un periodo de 18 meses y la reprogramación del desembolso de recursos para ser ejecutados durante las vigencias 2025 y 2026 teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 12 de abril del 2024, el Ministerio del Interior y el Municipio de Aguazul suscribieron el Convenio interadministrativo 1405 de 2024, por un valor de Seis mil doscientos veintitrés millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y seis con ocho centavos M/CTE $ ($**6.223.364.576,08),** con el objeto de **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE**

AGUAZUL CASANARE" con un plazo inicial de ejecución de trece (13) meses, hasta el 15 de mayo del 2025.

2. Que se suscribe el acta de inicio del convenio interadministrativo el día 17 de abril del 2024.
3. Que el proceso de contratación de interventoria tuvo atrasos debido a que el proceso de licitación MA-CMA-SI-007-2024 fue de declarado desierto mediante la RESOLUCION No. 026 DEL 03 DE JULIO DE 2024 "por medio de la cual se declara desierto el proceso bajo la modalidad de selección de concursos de méritos abierto No, MA-CMA-SI-007-2024" cuyo objeto contractual es: INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
4. Que el municipio de Aguazul expide el acta No 01 de inicio de los contratos de obra y de interventoria el día 11 de octubre del 2024 con un plazo de 11 Meses según lo expuesto en los pliegos de condiciones.
5. Se expide el día 11 de octubre el acta modificatoria para realizar el ajuste al plazo de los contratos de obra e interventoria con el fin de que los mismos encuentren dentro de los términos del Convenio Interadministrativo.
6. Que expidió la Acta No 2 Aclaratorio No 1 al Acta de Inicio No 01 del 11 de octubre de 2024 por medio de la cual se modifico el plazo contractual inicialmente pactado y se adiciona la firma del contratista interventor.
7. Que teniendo en cuenta el cronograma de ejecución del convenio y la recomendación de la interventoria, las actividades se están viendo afectadas por el atraso debido a los inconvenientes que sucedieron en la etapa de contratación de Estudios y diseños inicialmente era de 2 meses y se finalizo en 5 meses debido a la adjudicación de la interventoria, lo anterior atrasando el inicio de las actividades para cumplir con el objeto contractual a cabalidad.
8. Que la revisión técnica de los estudios y diseños aportados por el Contratista al Municipio de Aguazul dentro del convenio no ha sido terminada a la fecha, por lo cual no se puede realizar el segundo desembolso de recursos por parte del Ministerio del Interior.

Los hechos expuestos con anterioridad evidencian la necesidad de realizar la reprogramación de recursos, pues solo con esa modificación se garantizara el presupuesto para la culminación de las etapas contractuales y cumplir con el objetivo de realizar los "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

Los recursos comprometidos en el convenio que se encuentran pendientes de ejecución como lo es el segundo desembolso corresponden a la vigencia 2024, lo que indica que respecto de estos es posible aplicar la figura de reprogramación de vigencias futuras ordinaria en ejecución de contratos, según lo estipulado en el convenio interadministrativo

> "(…).2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.322.464.972,42) M/CTE, contra entrega

de los siguientes productos A. La entrega de los Estudios y diseños al Ministerio del Interior por parte del Municipio, previamente avalados por la interventoría y supervisor designado por parte del municipio. B. Plan de inversión y ejecución de obra avalados por el interventor y supervisor del municipio.

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, del Decreto 4836 de 2011 y el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015, se solicita autorizar la reprogramación presupuestal del segundo desembolso, recursos de la vigencia 2024, comprometidos en el convenio, equivalente a la suma de $1.322.464.972,42 para que puedan ser ejecutados durante las vigencias 2025 y 2026, hasta la culminación del plazo de dicho convenio.

Atentamente,

NELSON ENRIQUE CAMACHO CAICEDO
CC 74.183.343 de Sogamoso
Alcalde del Municipio de Aguazul

Reviso:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura.

Proyecto:
JESSICA FERNANDA GARCIA GARZON
Profesional contratado SIA
