CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	Planilla No.	Mes de aporte	Fecha de pago	Valor pagado
Pensión	**32209812**	**Enero**	**10-01-2025**	**235.200**
Salud	**32209812**	**Enero**	**10-01-2025**	**183.800**
Riesgo	**32209812**	**Enero**	**10-01-2025**	**7.700**

No	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
1.	Prestar los servicios profesionales en el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios con alcance de Proyectos de Infraestructura a cargo de la SPDE.	- Seguimiento de Actividades, Proyección Documentos Acta de Reinicio y Prorroga No 1, Convenio Solidario No 004 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Sinaí para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo Palestina – Sinaí)". - Seguimiento de Actividades, Proyección Documentos Acta de Reinicio y Prorroga No 1, Convenio Solidario No 005 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Betania para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo Betania – La Esmeralda)". - Seguimiento de Actividades, Proyección Documentos Acta de Reinicio y Prorroga No 1, Convenio Solidario No 006 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo San Isidro – Silencio)". - Seguimiento de Actividades, Proyección Documentos Acta de Reinicio y Prorroga No 1, Convenio Solidario No 007 de 2024 "Aunar

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY	**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA		
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Silencio para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (Alcantarilla Vereda El Silencio)".

OBSERVACIONES Y ANEXO

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — Versión No. 1.0 — Página 1 de 6

ACTA DE REINICIO No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 004 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI, R/L NUMAR ENRIQUE SAMBONI

CONVENIO SOLIDARIO No.	004 DE 2024		
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA		
NIT:	891.102.764-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI		
NIT:	900.036.276-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	NUMAR ENRIQUE SAMBONI		
IDENTIFICACIÓN/ CC:	83.161.024 expedida en Palestina		
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (TRAMO PALESTINA – SINAI)".		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA		
CERTIFICADO CDP:	2024000667 del 26 de Noviembre de 2024		
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción		
FUENTE:	001- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría		
CODIGO BPIN:	2024415300030		
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024	Aseguradora	Seguros Mundial
		Póliza Cumplimiento No	C-100088306
		Póliza Resp. Civil No	C-100023415
		Fecha Expedición	05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($29.471.408,30) MCTE.		
APORTE JAC SINAI	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) MCTE. REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS, (MANO DE OBRA NO CALIFICADA ACTIVIDADES		

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — Versión No. 1.0 — Página 1 de 6

OTROSÍ DE PRORROGA No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 004 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI, R/L NUMAR ENRIQUE SAMBONI

CONVENIO SOLIDARIO No.	004 DE 2024		
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA		
NIT:	891.102.764-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI		
NIT:	900.036.276-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	NUMAR ENRIQUE SAMBONI		
IDENTIFICACIÓN/ CC:	83.161.024 expedida en Palestina		
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SINAI PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (TRAMO PALESTINA – SINAI)".		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA		
CERTIFICADO CDP:	2024000667 del 26 de Noviembre de 2024		
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción		
FUENTE:	001- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría		
CODIGO BPIN:	2024415300030		
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024	Aseguradora	Seguros Mundial
		Póliza Cumplimiento No	C-100088306
		Póliza Resp. Civil No	C-100023415
		Fecha Expedición	05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($29.471.408,30) MCTE.		
APORTE JAC SINAI	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) MCTE. REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS; (MANO DE OBRA NO CALIFICADA ACTIVIDADES		

Proyeccion Acta de Reinicio y Prorroga del Convenio Solidario No 004 de 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — Versión No. 1.0 — Página 1 de 6

ACTA DE REINICIO No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 005 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA, R/L ANGELA AZUCENA ROJAS MARTINEZ

CONVENIO SOLIDARIO No.	005 DE 2024		
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA		
NIT:	891.102.764-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA		
NIT:	813.011.296-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA AZUCENA ROJAS MARTINEZ		
IDENTIFICACIÓN/ CC:	26.524.869 expedida en Palestina		
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (TRAMO BETANIA – LA ESMERALDA)".		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA		
CERTIFICADO CDP:	2024000669 del 26 de Noviembre de 2024		
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción		
FUENTE:	001- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría		
CODIGO BPIN:	2024415300030		
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024	Aseguradora	Seguros Mundial
		Póliza Cumplimiento No	C-100088406
		Póliza Resp. Civil No	C-100023430
		Fecha Expedición	05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($31.597.038,70) MCTE.		
APORTE JAC BETANIA	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.750.000,00) MCTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS, MANO DE OBRA NO CALIFICADA		

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 6

OTROSÍ DE PRORROGA No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 005 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA, R/L ANGELA AZUCENA ROJAS MARTINEZ

CONVENIO SOLIDARIO No.	005 DE 2024		
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA		
NIT:	891.102.764-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA		
NIT:	813.011.296-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA AZUCENA ROJAS MARTINEZ		
IDENTIFICACIÓN/ CC:	26.524.869 expedida en Palestina		
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (TRAMO BETANIA – LA ESMERALDA)".		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA		
CERTIFICADO CDP:	2024000669 del 26 de Noviembre de 2024		
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción		
FUENTE:	001- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría		
CODIGO BPIN:	2024415300030		
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024	Aseguradora	Seguros Mundial
		Póliza Cumplimiento No	C-100088406
		Póliza Resp. Civil No	C-100023430
		Fecha Expedición	05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($31.597.038,70) MCTE.		
APORTE JAC BETANIA	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.750.000,00) MCTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS, MANO DE OBRA NO CALIFICADA		

Proyeccion Acta de Reinicio y Prorroga del Convenio Solidario No 005 de 2024

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY	**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA		
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — Versión No. 1.0 — Página 1 de 8

ACTA DE REINICIO No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 006 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO, R/L LUZ MARY ANDRADE OSORIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	006 DE 2024
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA
NIT:	891.102.764-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO
NIT:	900.002.358-5
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ MARY ANDRADE OSORIO
IDENTIFICACIÓN/ CC:	52.277.634 expedida en Bogota D.C
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (TRAMO SAN ISIDRO - SILENCIO)".
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
CERTIFICADO CDP:	2024000670 del 26 de Noviembre de 2024
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción
FUENTE:	00IL- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría
CODIGO BPIN:	2024415300030
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024 — Aseguradora: Seguros Mundial; Póliza Cumplimiento No: C-100088411; Póliza Resp. Civil No: C-100023425; Fecha Expedición: 05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($21.907.803,70) MCTE
APORTE JAC SAN ISIDRO	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.250.000,00) MCTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 8

OTROSÍ DE PRORROGA No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 006 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO, R/L LUZ MARY ANDRADE OSORIO

CONVENIO SOLIDARIO No.	006 DE 2024
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA
NIT:	891.102.764-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO
NIT:	900.002.358-5
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ MARY ANDRADE OSORIO
IDENTIFICACIÓN/ CC:	52.277.634 expedida en Bogota D.C
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (TRAMO SAN ISIDRO - SILENCIO)".
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
CERTIFICADO CDP:	2024000670 del 26 de Noviembre de 2024
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción
FUENTE:	00IL- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría
CODIGO BPIN:	2024415300030
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024 — Aseguradora: Seguros Mundial; Póliza Cumplimiento No: C-100088411; Póliza Resp. Civil No: C-100023425; Fecha Expedición: 05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($21.907.803,70) MCTE
APORTE JAC SAN ISIDRO	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.250.000,00) MCTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS; MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Proyeccion Acta de Reinicio y Prorroga del Convenio Solidario No 006 de 2024

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 8

ACTA DE REINICIO No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 007 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO, R/L ADIEL CABANZO PINZON

CONVENIO SOLIDARIO No.	007 DE 2024
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA
NIT:	891.102.764-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO
NIT:	900.038.267-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ADIEL CABANZO PINZON
IDENTIFICACIÓN/ CC:	1.081.696.152 expedida en Palestina Huila
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (ALCANTARILLA VEREDA EL SILENCIO)".
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
CERTIFICADO CDP:	2024000668 del 26 de Noviembre de 2024
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción
FUENTE:	00IL- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría
CODIGO BPIN:	2024415300030
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024 — Aseguradora: Seguros Mundial; Póliza Cumplimiento No: C-100088418; Póliza Resp. Civil No: C-100023427; Fecha Expedición: 05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($20.736.751,40) MCTE.
APORTE JAC EL SILENCIO	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.250.000,00) MCTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS; MANO DE OBRA NO CALIFICADA

ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA — versión no. 1.0 — Página 1 de 8

OTROSÍ DE PRORROGA No 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No 007 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO, R/L ADIEL CABANZO PINZON

CONVENIO SOLIDARIO No.	007 DE 2024
SUSCRIPCION CONVENIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALESTINA
NIT:	891.102.764-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN /CC:	1.081.701.116 de Palestina - Huila
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO
NIT:	900.038.267-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ADIEL CABANZO PINZON
IDENTIFICACIÓN/ CC:	1.081.696.152 expedida en Palestina Huila
OBJETO DEL CONVENIO:	"AUNAR ESFUERZOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SILENCIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA (ALCANTARILLA VEREDA EL SILENCIO)".
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
CERTIFICADO CDP:	2024000668 del 26 de Noviembre de 2024
RUBRO:	2.3.2.02.02.005- Construcción y servicios de la construcción
FUENTE:	00IL- Asignación para la inversión local según NBI y cuarta, quinta y sexta categoría
CODIGO BPIN:	2024415300030
FECHA APROBACION POLIZAS INICIALES:	05 de Diciembre de 2024 — Aseguradora: Seguros Mundial; Póliza Cumplimiento No: C-100088418; Póliza Resp. Civil No: C-100023427; Fecha Expedición: 05/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($20.736.751,40) MCTE.
APORTE JAC EL SILENCIO	UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.250.000,00) MCTE, REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS; MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Proyeccion Acta de Reinicio y Prorroga del Convenio Solidario No 007 de 2024


	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
2.	Asistir a las reuniones técnicas a las cuales sea convocado y en las que se discutan asuntos relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura a cargo de la SPDE.	- Acompañamiento a comité Técnico Virtual sobre avances de obras que se desarrollan en sedes educativas rurales del Municipio de Palestina por parte del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES


CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

		- Comité técnico según visita de verificación del estado y funcionamiento de la PTAP del Municipio con funcionarios de Aguas del Huila, Contratista, Interventoría, Secretario de Planeación y Secretaria de Protección social Municipal - Acompañamiento a comité Técnico Virtual sobre Formulación del PGR de los prestadores de Acueducto y Alcantarillado según invitación de Aguas del Huila S.A E.S.P.

OBSERVACIONES Y ANEXO

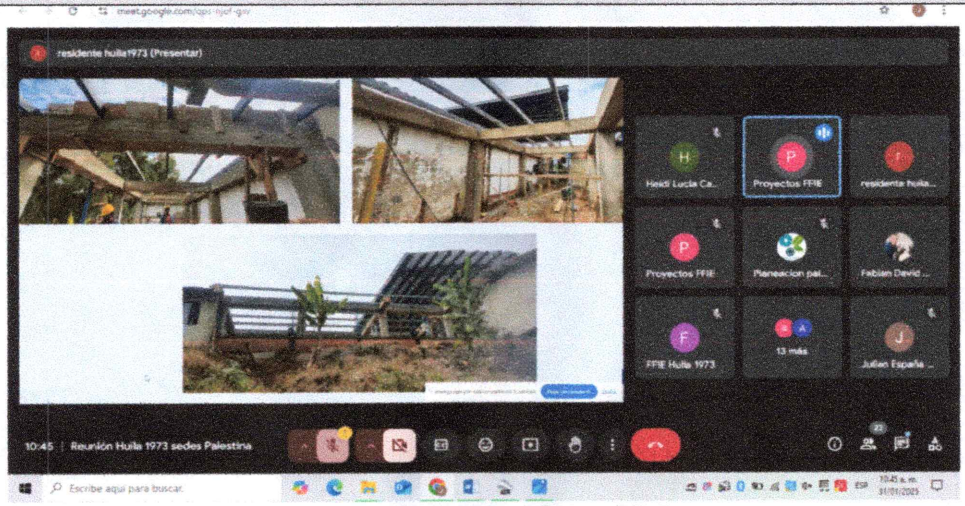

Comité Técnico Virtual Obras FFIE

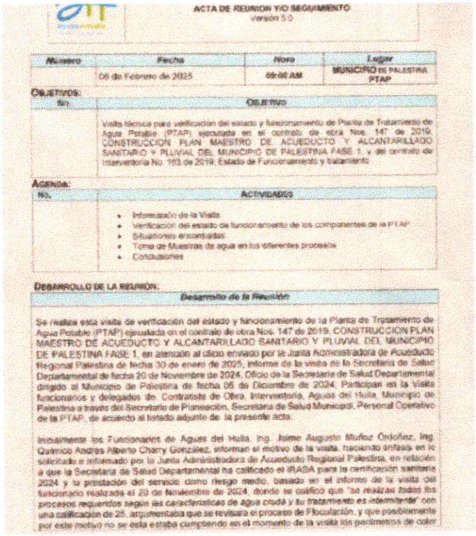

ACTA DE REUNION Y/O SEGUIMIENTO
Versión 5.0

Numero	Fecha	Hora	Lugar
	06 de Febrero de 2025	09:00 AM	MUNICIPIO DE PALESTINA PTAP

OBJETIVOS:

No.	OBJETIVO
	Visita técnica para verificación del estado y funcionamiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ejecutada en el contrato de obra Nos. 147 de 2019, CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA FASE 1, y del contrato de interventoria No. 183 de 2019, Estado de Funcionamiento y tratamiento

AGENDA:

No.	ACTIVIDADES
	• Información de la Visita • Verificación del estado de funcionamiento de los componentes de la PTAP • Situaciones encontradas • Toma de Muestras de agua en los diferentes procesos • Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNION:

Desarrollo de la Reunión

Se realiza esta visita de verificación del estado y funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ejecutada en el contrato de obra Nos. 147 de 2019, CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA FASE 1, en atención al oficio enviado por la Junta Administradora de Acueducto Regional Palestina de fecha 30 de enero de 2025, informe de la visita de la Secretaria de Salud Departamental de fecha 20 de Noviembre de 2024, Oficio de la Secretaria de Salud Departamental dirigido al Municipio de Palestina de fecha 05 de Diciembre de 2024. Participan en la Visita funcionarios y delegados de Contratista de Obra, Interventoría, Aguas del Huila, Municipio de Palestina a través del Secretario de Planeación, Secretaria de Salud Municipal, Personal Operativo de la PTAP, de acuerdo al listado adjunto de la presente acta.


Inicialmente los Funcionarios de Aguas del Huila, Ing. Jaime Augusto Muñoz Ordoñez, Ing. Químico Andres Alberto Charry Gonzalez, informan el motivo de la visita, haciendo énfasis en lo solicitado e informado por la Junta Administradora de Acueducto Regional Palestina, en relación a que la Secretaria de Salud Departamental ha calificado el IRABA para la certificación sanitaria 2024 y la prestación del servicio como riesgo medio, basado en el informe de la visita del funcionario realizada el 20 de Noviembre de 2024, donde se calificó que "se realizan todos los procesos requeridos según las características de agua cruda y su tratamiento es intermitente" con una calificación de 25, argumentada que se revisaría el proceso de Floculación, y que posiblemente por este motivo no se está cumpliendo en el momento de la visita los parámetros de color



Acta de Visita y Comité Técnico Instalaciones PTAP

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES


CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

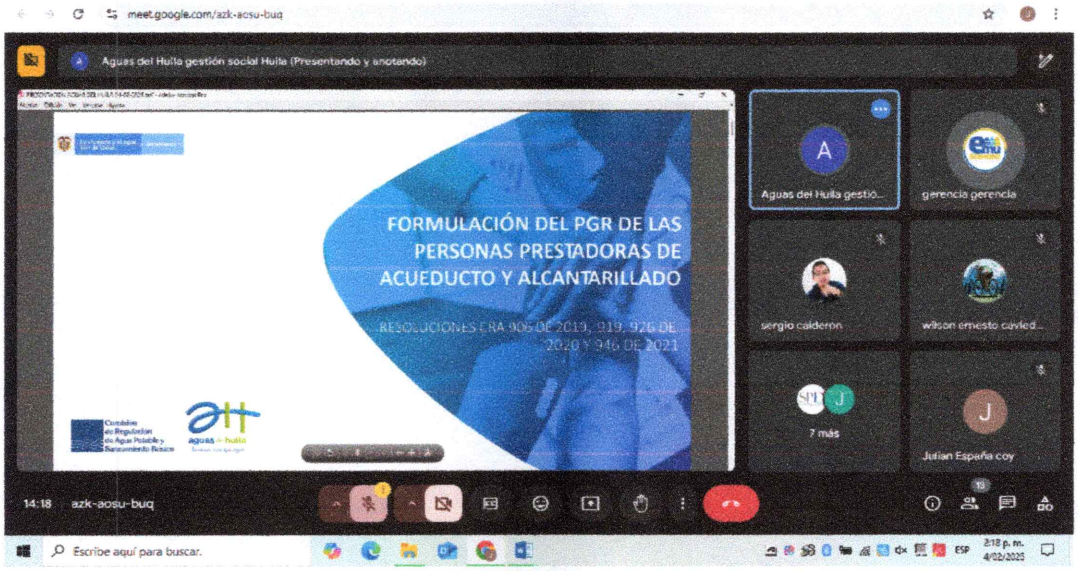


Comité Técnico Virtual Aguas del Huila

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
3.	Realizar visitas técnicas a proyectos de infraestructura a cargo de la SPDE.	- Visita Técnica de Diagnóstico Preliminar para el Proyecto "Construcción Obras de Drenaje en vías terciarias del Municipio de Palestina, Departamento del Huila" En conjunto con Representantes del Comité de Cafeteros. - Visita Técnica a tramo Vial El Jordán – El Roble- La Mensura a cargo del INVIAS, debido a asentamientos en un costado de la banca y erosión del Talud

OBSERVACIONES Y ANEXO

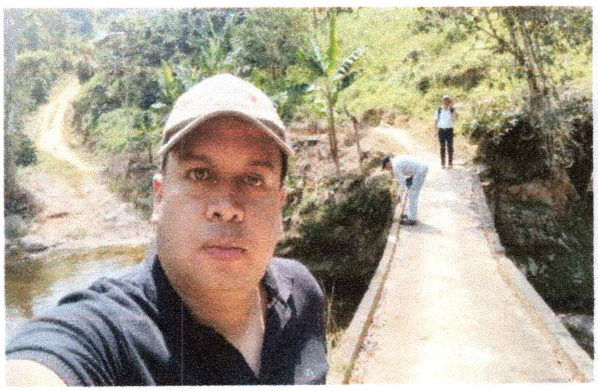

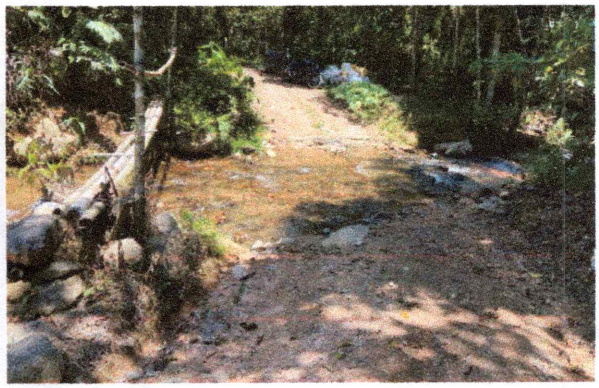


Visita Técnica Proyecto Obras de Drenaje

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	




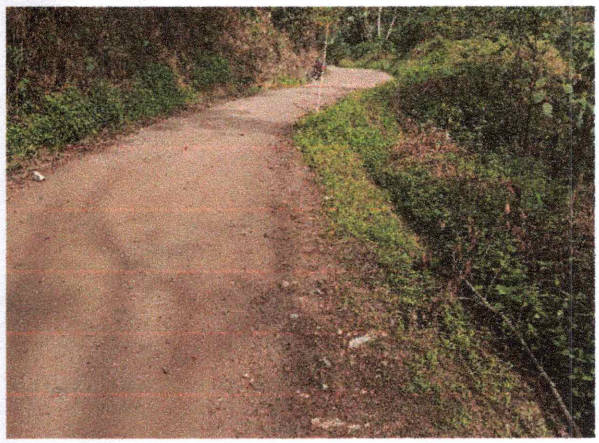

Visita Técnica Asentamiento de banca en un costado de la vía en la vereda el Jordán

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
4.	Rendir y elaborar informes que se le soliciten en el desarrollo del contrato, según el alcance de las obligaciones específicas, en los que se consignen los resultados de cada una de esas actividades	- Elaboración de Informe Diagnóstico Preliminar para el Proyecto "Construcción Obras de Drenaje en vías terciarias del Municipio de Palestina, Departamento del Huila". - Elaboración de Informe Diagnostico preliminar Afectación tramo Vial El Jordán – El Roble- La Mensura a cargo del INVIAS. - Apoyo en Elaboración Informe de Gestión vigencia 2024 Secretaria de Planeación.

OBSERVACIONES Y ANEXO



ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 37


INFORME VISITA PRELIMINAR, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE OBRAS DE DRENAJE

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

PALESTINA - HUILA

2025

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co

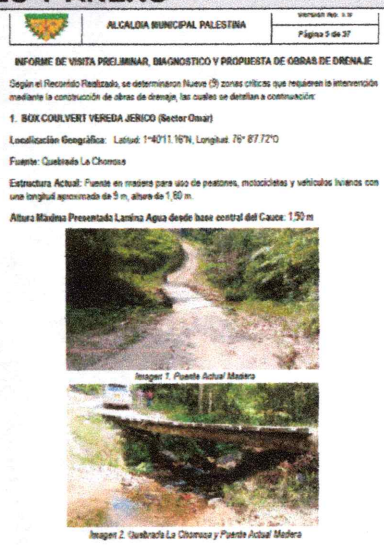

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 5 de 37

INFORME DE VISITA PRELIMINAR, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE OBRAS DE DRENAJE

Según el Recorrido Realizado, se determinaron Nueve (9) zonas críticas que requieren la intervención mediante la construcción de obras de drenaje, las cuales se detallan a continuación:

1. BOX COULVERT VEREDA JERICO (Sector Omar)

Localización Geográfica: Latitud: 1°40'11.16"N, Longitud: 76° 87'72"O

Fuente: Quebrada La Chorrosa

Estructura Actual: Puente en madera para uso de peatones, motocicletas y vehículos livianos con una longitud aproximada de 9 m, altura de 1,80 m.

Altura Máxima Presentada Lamina Agua desde base central del Cauce: 1.50 m


Imagen 1. Puente Actual Madera

Imagen 2. Quebrada La Chorrosa y Puente Actual Madera

Elaboración Informe Diagnostico preliminar Proyecto Obras de Drenaje

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

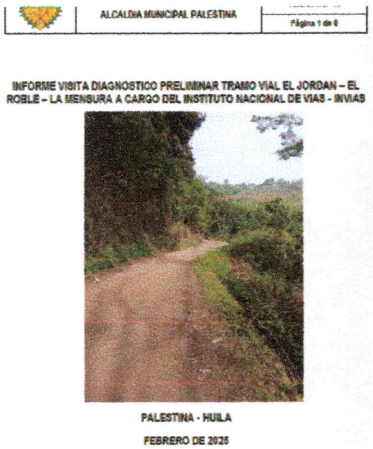


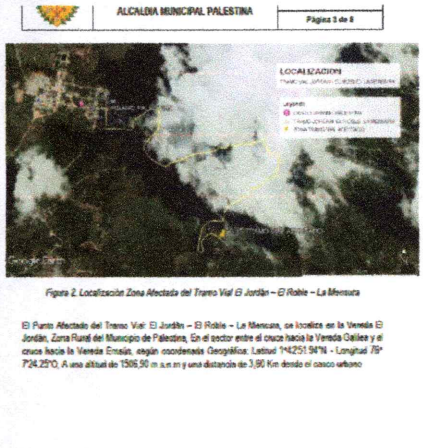


Figura 2. Localización Zona Afectada del Tramo Vial El Jordán – El Roble – La Mensura

El Punto Afectado del Tramo Vial El Jordán – El Roble – La Mensura, se localiza en la Vereda El Jordán, Zona Rural del Municipio de Palestina, En el sector entre el cruce hacia la Vereda Galilea y el cruce hacia la Vereda Emaús, según coordenadas Geográficas: Latitud 1°42'51.94"N - Longitud 75° 7'24.22"O, A una altitud de 1506,90 m.s.n.m y una distancia de 3,90 Km desde el casco urbano

Elaboración Informe Diagnostico preliminar Visita Tramo Vial El Jordán – El Roble – La Mensura





Apoyo en Elaboración Informe de Gestión vigencia 2024 Secretaria de Planeación


ACTIVIDADES ESPECIFICAS		GESTION DESARROLLADA
5.	Responsable del concepto estructural en la revisión de licencias de construcción en sus diferentes tipos y modalidades según la normatividad municipal y	- Reporte y Diligenciamiento del Formulario Electrónico en el Aplicativo Web del DANE Sobre Licencias de Construcción Ejecutoriadas (ELIC) en el Municipio de Palestina, correspondiente al mes de Enero de 2025. - Sensibilización Virtual por parte del Dane sobre el Diligenciamiento del Formulario Elic.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

	nacional, así como Responsable de su expedición.	- Revisión Documentación, Elaboración de Acta de Observaciones y Proyección de licencia de Construcción en Modalidad de Demolición Parcial y Ampliación con destinación Residencial – Bifamiliar a Nombre de José Octavio Hoyos. - Revisión Documentación, Elaboración de Acta de Observaciones y Notificación Valla Amarilla a solicitud de licencia de Construcción en Modalidad de Obra Nueva con destinación Residencial – Multifamiliar a Nombre de Yamile Samboni Gaviria.

OBSERVACIONES Y ANEXO


30/1/25, 11:12 a.m. Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción - ELIC -

DANE Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción - ELIC

Mes de Referencia: Enero - 2025

Certificado de No Movimiento | Licencias Ampliadas | Reiniciadas

Cambiar Clave | Manual Usuario | F0241530-0 | Finalizar Sesión

Oficina de Planeación - Certificado de no movimiento


Codigo Departamento:	41	Departamento:	Huila
Codigo Municipio:	532	Municipio:	Palestina
Codigo Territorio:	0	Territorio:	Urbano
Curaduria u oficina encargada	Oficina	Fecha de Aprobación:	Mes: Año: 2025

Certifico que durante este periodo no se aprobaron licencias relevantes a la investigación Estadísticas de Edificación Licencias de Construcción - ELIC, debido a lo siguiente:

NO SE EVIDENCIA MOVIMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION ESTRUCTURADAS EN NINGUNA DE SUS MODALIDADES DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025 EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA - HUILA

Fecha de Envio: 2025-01-30


Diligenciamiento Formulario Electronico Aplicativo Web DANE, Licencias de construccion ejecutoriadas en el mes de Enero de 2025 (ELIC)

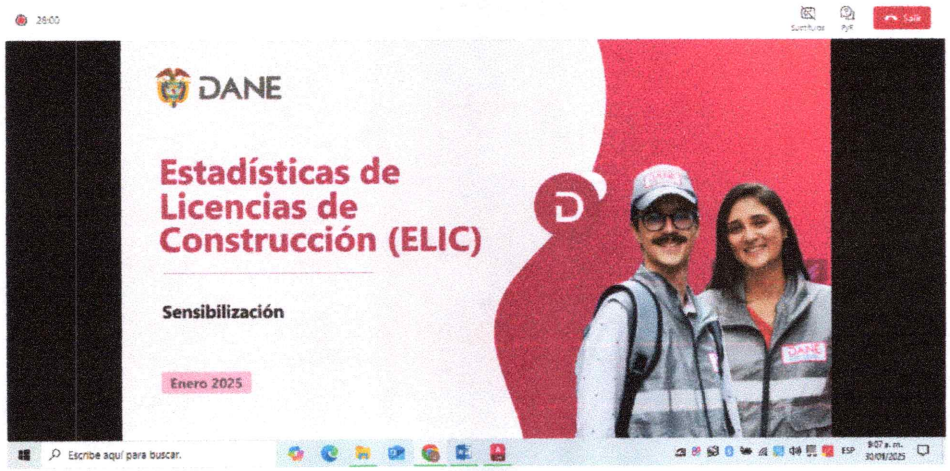

Sensibilizacion Virtual por parte del DANE – Diligenciamiento ELIC

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY	**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA		
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

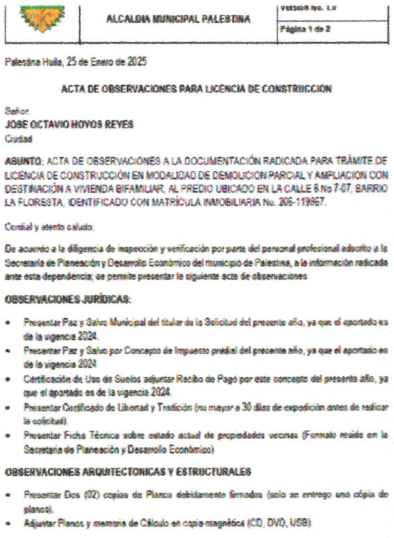

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Versión No. 1.0 — Página 1 de 2

Palestina Huila, 25 de Enero de 2025

ACTA DE OBSERVACIONES PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION

Señor
JOSE OCTAVIO HOYOS REYES
Ciudad

ASUNTO: ACTA DE OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN RADICADA PARA TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN MODALIDAD DE DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION CON DESTINACIÓN A VIVIENDA BIFAMILIAR, AL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 6 No 7-07, BARRIO LA FLORESTA, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 206-119867.

Cordial y atento saludo.


De acuerdo a la diligencia de inspección y verificación por parte del personal profesional adscrito a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Palestina, a la información radicada ante esta dependencia; se permite presentar la siguiente acta de observaciones

OBSERVACIONES JURÍDICAS:

- Presentar Paz y Salvo Municipal del titular de la Solicitud del presente año, ya que el aportado es de la vigencia 2024.
- Presentar Paz y Salvo por Concepto de Impuesto predial del presente año, ya que el aportado es de la vigencia 2024
- Certificación de Uso de Suelos adjuntar Recibo de Pago por este concepto del presente año, ya que el aportado es de la vigencia 2024.
- Presentar Certificado de Libertad y Tradición (no mayor a 30 días de expedición antes de radicar la solicitud).
- Presentar Ficha Técnica sobre estado actual de propiedades vecinas (Formato revisado en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico)

OBSERVACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES

- Presentar Dos (02) copias de Planos debidamente firmados (solo se entrego una copia de planos).
- Adjuntar Planos y memoria de Cálculo en copia magnética (CD, DVD, USB).

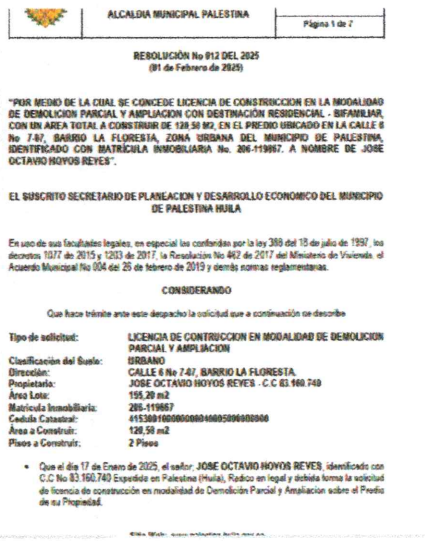

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 7

RESOLUCIÓN No 012 DEL 2025
(01 de Febrero de 2025)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION CON DESTINACIÓN RESIDENCIAL - BIFAMILIAR, CON UN AREA TOTAL A CONSTRUIR DE 128,58 M2, EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 6 No 7-07, BARRIO LA FLORESTA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 206-119867. A NOMBRE DE JOSE OCTAVIO HOYOS REYES".

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la ley 388 del 18 de julio de 1997, los decretos 1077 de 2015 y 1203 de 2017, la Resolución No 462 de 2017 del Ministerio de Vivienda, el Acuerdo Municipal No 004 de 25 de febrero de 2019 y demás normas reglamentarias.


CONSIDERANDO

Que hace trámite ante este despacho la solicitud que a continuación se describe

Tipo de solicitud:	**LICENCIA DE CONTRUCCION EN MODALIDAD DE DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION**
Clasificación del Suelo:	**URBANO**
Dirección:	**CALLE 6 No 7-07, BARRIO LA FLORESTA.**
Propietario:	**JOSE OCTAVIO HOYOS REYES .C.C 83.160.740**
Área Lote:	**195,20 m2**
Matrícula Inmobiliaria:	**206-119867**
Cedula Catastral:	**41530010000000080160050000000**
Área a Construir:	**128,58 m2**
Pisos a Construir:	**2 Piso**

- Que el día 17 de Enero de 2025, el señor; **JOSE OCTAVIO HOYOS REYES**, identificado con C.C No 83.160.740 Expedida en Palestina (Huila), Radico en legal y debida forma la solicitud de licencia de construcción en modalidad de Demolición Parcial y Ampliación sobre el Predio de su Propiedad.

Acta de Observaciones y Resolucion Licencia de Construccion, Jose Octavio Hoyos.

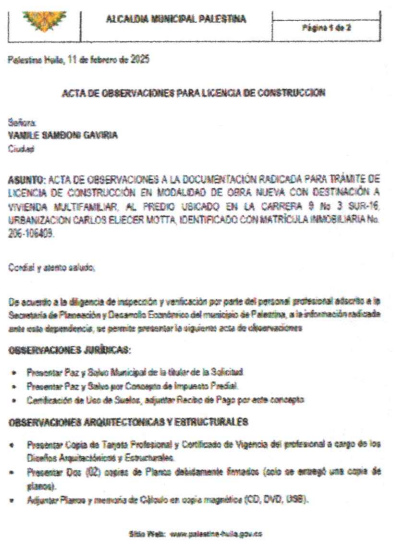

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 2

Palestina Huila, 11 de febrero de 2025

ACTA DE OBSERVACIONES PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION

Señora
YAMILE SAMBONI GAVIRIA
Ciudad

ASUNTO: ACTA DE OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN RADICADA PARA TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN MODALIDAD DE OBRA NUEVA CON DESTINACIÓN A VIVIENDA MULTIFAMILIAR, AL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 9 No 3 SUR-16, URBANIZACION CARLOS ELIECER MOTTA, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 206-106409.

Cordial y atento saludo,

De acuerdo a la diligencia de inspección y verificación por parte del personal profesional adscrito a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Palestina, a la información radicada ante esta dependencia; se permite presentar la siguiente acta de observaciones


OBSERVACIONES JURÍDICAS:

- Presentar Paz y Salvo Municipal de la titular de la Solicitud
- Presentar Paz y Salvo por Concepto de Impuesto Predial.
- Certificación de Uso de Suelos, adjuntar Recibo de Pago por este concepto

OBSERVACIONES ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES

- Presentar Copia de Tarjeta Profesional y Certificado de Vigencia del profesional a cargo de los Diseños Arquitectónicos y Estructurales.
- Presentar Dos (02) copias de Planos debidamente firmados (solo se entregó una copia de planos).
- Adjuntar Planos y memoria de Cálculo en copia magnética (CD, DVD, USB).

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.co

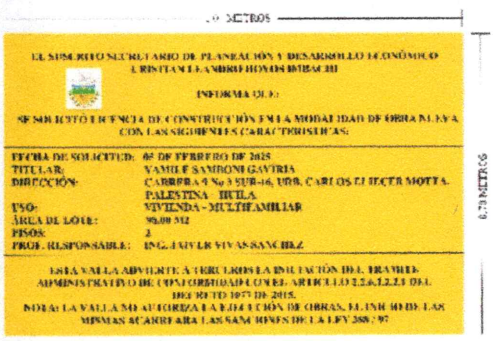

Acta de Observaciones y Notificacion Valla Amarilla, Yamile Samboni Gaviria

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		GESTION DESARROLLADA
6.	Apoyo en la Estructuración y seguimiento de convocatorias públicas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

OBSERVACIONES Y ANEXO

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
7.	Apoyo en la elaboración de Diseños y Presupuestos para la Estructuración de proyectos de infraestructura de baja escala	- Elaboración de Diseños y Presupuesto del proyecto: "Construcción Obras de Drenaje en vías terciarias del Municipio de Palestina, Departamento del Huila".

OBSERVACIONES Y ANEXO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT, ALCANTARILLAS DE 36" EN CONCRETO REFORZADO Y PUENTE VEHICULAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (APU)	V. TOTAL
Capitulo I: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GUARAPAS SECTOR BAJO TABOR - DELICIAS					
1,0	Preliminares				
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	185,40	$ 3.886	$ 720.464
1.2	Manejo de Agua a todo factor	Und	1,00	$ 15.500.000	$ 15.500.000
2	Explanaciones y movimientos de tierra				$ -
2.1	Excavaciones varias sin clasificar. Todo Factor.	m³	816,06	$ 52.644	$ 42.960.794
3	Concretos				$ -
3,1	Concreto de baja resistencia f'c=140 kgf/cm2 (2.000 psi) para solados.	m³	4,20	$ 728.796	$ 3.060.943
3,2	Concreto estructural f'c=280 kgf/cm2 (28 Mpa=4000 psi)	m³	47,62	$ 1.195.000	$ 56.905.900
3,3	Concreto estructural f'c=246 kgf/cm2 (24 Mpa=3500 psi)	m³	165,15	$ 987.400	$ 163.069.110
3,4	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	kg	24069,30	$ 7.918	$ 190.580.717
4	Barandas y Apoyos				
4,1	Apoyo elastomerico	und	4,00	$ 879.200	$ 3.516.800
4,2	Baranda Metalica	ml	36,00	$ 498.500	$ 17.946.000
5,0	Rellenos				$ -
5,4	Relleno con material proveniente de la misma excavación.	m³	286,70	$ 24.944	$ 7.151.445
5,2	Relleno en recebo seleccionado compactado.	m³	188,50	$ 186.731	$ 35.198.794
				COSTOS DIRECTOS CAPITULO II:	$ 536.610.968

Capitulo II: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36" (VEREDA LOS OLIVOS (1) Y FUNDADOR (2)					
1,0	PRELIMINARES				
1,1	Trazado, localización y replanteo	m²	38,19	$ 3.886	$ 148.406
2,0	EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ -
2,1	Excavaciones varias sin clasificar. Todo factor	m³	132	$ 52.644	$ 6.949.008
3,0	DRENAJE				$ -
3,1	Concreto de baja resistencia f'c=140 kgf/cm2 (2.000 psi) para solados.	m³	1,6	$ 728.796	$ 1.166.074
3,4	Concreto estructural f'c=246 kgf/cm2 (24 Mpa=3500 psi)	m³	15,6	$ 987.400	$ 15.403.440
3,2	Acero de refuerzo A60000 psi	kilo	2345,22	$ 7.918	$ 18.569.452
3,3	Tuvo de 36" PVC alcantarillado	ml	19	$ 720.000	$ 13.680.000
4	RELLENOS				$ -
4,1	Relleno con material proveniente de la misma excavación.	m³	76,8	$ 24.944	$ 1.915.699
4,2	Relleno en recebo seleccionado compactado.	m³	36	$ 186.731	$ 6.722.316
				COSTOS DIRECTOS CAPITULO III:	$ 64.554.395

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES


CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY	**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA		
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Capitulo III: CONSTRUCCION DE BOX COULVERT (VEREDA JERICO (2), LOS PINOS (2) Y ALTO FUNDADOR (1))						
1,0	PRELIMINARES					
1.1	Trazado, localización y replanteo	m²	162	$	3.886	$ 629.532
2,0	MOVIMIENTOS DE TIERRA / EXCAVACIONES DE CAUCE.					$ -
2.1	Excavación mecanica sin clasificar de explanaciones y canales.	m³	159	$	52.644	$ 8.370.396
3,0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO					$ -
3,1	Concreto simple f'c=140 kgf/cm2 (2000 psi), para solados de estructuras.	m³	12,8	$	728.796	$ 9.328.589
3,2	Concreto estructural f'c=246 kgf/cm2 (24 Mpa=3500 psi)	m³	138,98	$	987.400	$ 137.228.852
3,3	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi)	kg	15966,17	$	7.918	$ 126.420.134
4,0	RELLENOS					$ -
4,1	Relleno compacto material de misma excavacion.	m³	312,00	$	24.944	$ 7.782.528
4,1	Relleno material seleccionado compacto	m³	108,00	$	186.731	$ 20.166.948
	COSTOS DIRECTOS CAPITULO III:					$ 309.926.979
COSTOS COMPLEMENTARIOS DELPROYECTO:						
* Vallas del Proyecto		Und	4	$	700.000	$ 2.800.000
* Control Laboratorio		Gl	1	$	6.000.000	$ 6.000.000
	COSTOS DIRECTOS CAPITULO COSTOS COMPLEMENTARIOS:					$ 8.800.000


COSTOS FINALES DEL PROYECTO:	
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:	$ 919.892.342
Costos Indirectos del Proyecto:	$ 52.400.450
Costo total Obras Civiles	$ 972.292.792

ESTRUCTURA DE COSTOS (Financiación para el proyecto):


1	FEDERACIÓN DE CAFETEROS:	Recursos ley 863/2003.	$ 572.292.792
2	MUNICIPIO DE ACEVEDO	Recursos en efectivo a girar a la FNC	$ 400.000.000
	TOTAL COSTOS DEL PROYECTO		$ 972.292.792

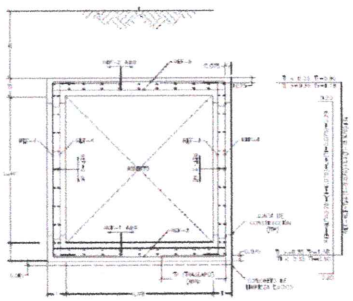


Esquema 13. Sección Transversal Box Coulvert Propuesto

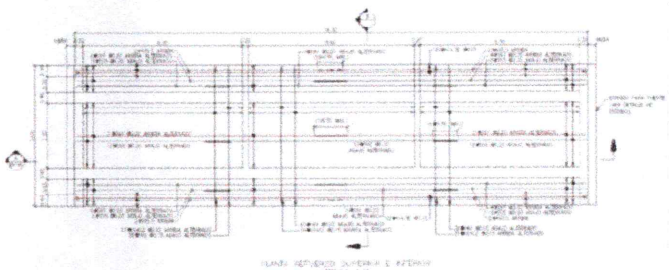

Esquema 20. Planta (Refuerzo) Puente Vehicular

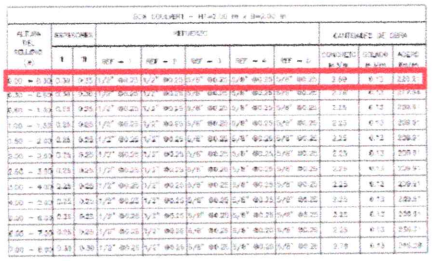



Esquema 21. Sección Longitudinal Puente Vehicular


Presupuesto y Diseño Proyecto Obras de drenaje en vías terciarias

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
8.	Apoyo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico en el área de gestión documental en los diferentes procesos de contratación de la dependencia y en las etapas precontractual, contractual y pos contractual	- Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 004 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Sinaí para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo Palestina – Sinaí)". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 005 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Betania para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo Betania – La Esmeralda)". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 006 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (tramo San Isidro – Silencio)". - Apoyo Gestión Documental del Convenio Solidario No 007 de 2024 "Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Silencio para el mejoramiento de vías en zonas rurales del Municipio de Palestina, Departamento del Huila (Alcantarilla Vereda El Silencio)".

OBSERVACIONES Y ANEXO

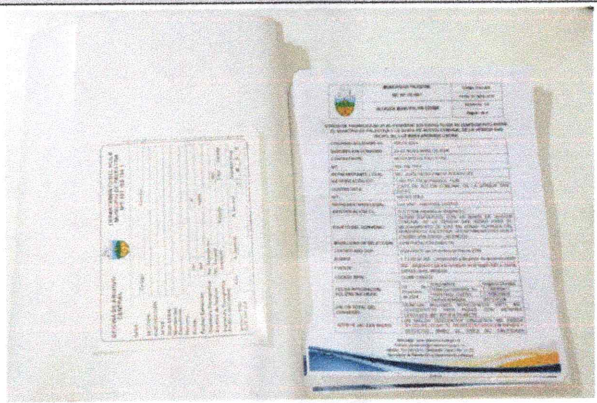

Apoyo Gestión Documental Expedientes Contractuales

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
9.	Brindar apoyo en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, e invitaciones públicas y demás documentos del expediente contractual, para los diferentes procesos de contratación.	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente
OBSERVACIONES Y ANEXO		


ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
10.	Revisión Documental de proyectos presentados adscritos a esta dependencia.	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente
OBSERVACIONES Y ANEXO		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
11.	Apoyo en la elaboración de las evaluaciones de los procedimientos de contratación cuando se requiera.	- No se adelantaron actividades en el presente Periodo, se reprograman para el siguiente
OBSERVACIONES Y ANEXO		

ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**GESTION DESARROLLADA**
12.	Llevar y mantener el archivo del área encargada de forma permanente, organizada y actualizada teniendo en cuenta las tablas de retención documental y la normatividad vigente de archivo	- Se mantiene el archivo del área encargada de forma permanente, organizada y actualizada, según tablas de retención documental y normatividad.
OBSERVACIONES Y ANEXO		

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025		
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY			**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA				
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO		

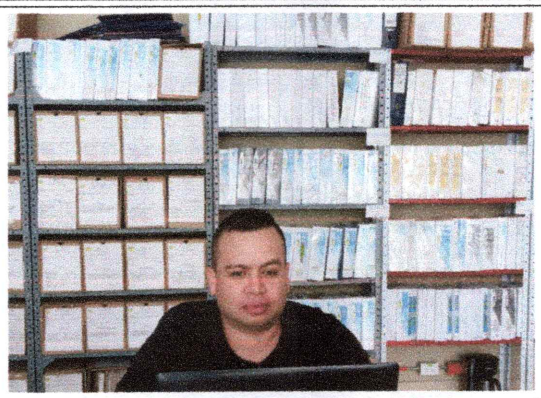

Gestión Documental Expedientes Contractuales

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
13.	Responder por los Bienes del Municipio que por Motivos del Cumplimiento del Contrato queden a su disposición.	- Se responde por los bienes del Municipio utilizados por motivo del cumplimiento del contrato como silla y escritorio.

OBSERVACIONES Y ANEXO



Responder por bienes del Municipio utilizados en labores (Escritorio y silla)

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
14.	Guardar la respectiva confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que se conozca durante la ejecución del servicio, aun después de su terminación y cualquiera sea la causa de esta.	- Se guarda la respectiva confidencialidad y reserva de la información de los documentos.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	


OBSERVACIONES Y ANEXO

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
15.	Brindar apoyo en la reacción y difusión de noticias, eventos, convocarías y servicios a través de los canales de comunicación digitales de la alcaldía del Municipio de palestina.	- Reaccion y Difusion de Noticias, eventos y convocatorias en canales de comunicación digitales de la Alcaldia

OBSERVACIONES Y ANEXO





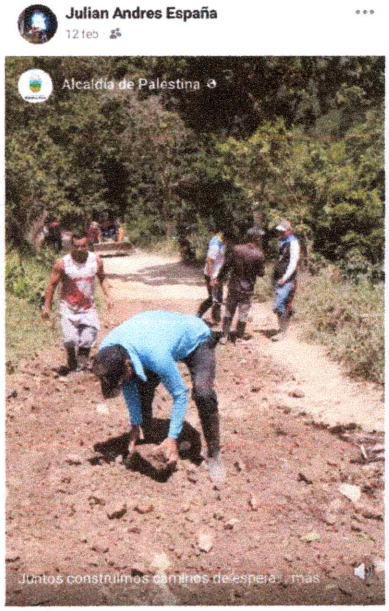

	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	GESTION DESARROLLADA
16.	Las demás que sean inherentes al Objeto Contractual y las que le sean asignadas por el Alcalde y/o el Supervisor del contrato	- Observaciones a las Adecuaciones realizadas y solicitud de garantía y estabilidad de obra al contratista del Contrato de Obra No LP-001 de 2022, derivado del convenio 1804 de 2021. - Proyección de oficio con observaciones a las actividades constructivas que se ejecutan en la Institución Educativa Palestina, Sede Belén, remitido al supervisor delegado del FFIE.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

		- Proyección oficio de respuesta a solicitud remitida por la Personería Municipal, según acompañamiento de visita técnica realizada a un sector de la vía que conduce del casco urbano hacia la Vereda La Esperanza.

OBSERVACIONES Y ANEXO



ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 3

Palestina Huila, 24 de Enero de 2025

Señores:
CONSTRUCTORA SAAVAR SAS
RL RODRIGO SAAVEDRA LASSO
saavarsasupervisor@gmail.com
constructorasaavar.palestina@gmail.com
Celular: 3228538466 - 3232314888
Calle 46 No 16-24
Neiva – Huila


Referencia: Contrato de Obra Pública No LP 001 de 2022, cuyo objeto es "Mejoramiento de vías rurales en el Municipio de Palestina, Departamento del Huila del Programa Colombia Rural Nacional Convenio 1804 de 2021"

Asunto: Observaciones Arreglos Solicitud Garantía y Estabilidad de Obra.

Cordial y atento saludo.

En cumplimiento de las labores de supervisión a cargo de la secretaria de Planeación y desarrollo económico al contrato de la referencia, teniendo en cuenta visita de campo realizada el día 20 de diciembre de 2024 en conjunto con personal de interventoría, se pudo observar la reparación realizada por el contratista de Obra a la estructura del canal (Disipador) localizado en la zona baja del Muro de contención del K7+420 de la vía Palestina – El Silencio, la cual consistió únicamente en el sello de juntas mediante aplicación de mortero en las dilataciones en la superficie de la sección del canal, pero no se pudo evidenciar intervención o mejoramiento de la capa base de la estructura, ya que persiste la socavación a lo largo de la base del canal observada y comunicada el día 07 de Noviembre mediante oficio debido a perdida de la capa de soporte.

Imagen 1 y 2. Reparaciones menores, sello juntas canal (Disipador) realizadas por el Contratista de Obra

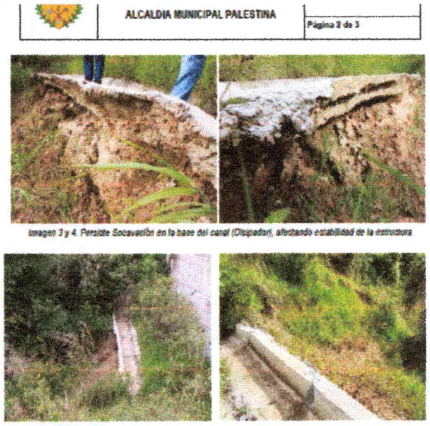

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 2 de 3

Imagen 3 y 4. Persiste Socavación en la base del canal (Disipador), afectando estabilidad de la estructura

Imagen 5 y 6. Inadecuada ubicación del Canal (paralelo al Muro) que afecta estabilidad del Talud Aledaño

Según lo Anterior se concluye que la única reparación realizada por el contratista de obra fue el sello de juntas del canal, pero no hubo intervención a la estructura de soporte del mismo, por lo cual persisten los problemas de socavación de la estructura del canal.
Así mismo debido a la posición del canal (Paralelo al Muro de Contención) y disposición final de las aguas lluvias sobre el talud conlleva a que se presentan erosión en el terreno, lo cual genera inestabilidad en la estructura.

Proyección de oficio de Solicitud de Garantía y estabilidad de Obra remitido al contratista.



ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 3

Palestina Huila, 25 de Enero de 2025

Señores:
FONDO FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Calle 97A No 9A-34, Edificio Santa Clara
Bogotá D.C

Asunto: Afectaciones estructuras existentes y Observaciones Actividades Constructivas en la Institución Educativa Palestina - Sede Belén, del Municipio de Palestina - Huila.

Cordial y atento saludo.

Teniendo en cuenta que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE a través del Consorcio IRAME, adelanta actividades de mejoramiento y construcción de infraestructura en la Sede Educativa: Institución Educativa Palestina - Sede Belén, en el Municipio de Palestina- Huila y en atención a observaciones presentadas y solicitud de acompañamiento por parte del rector de la Institución a la secretaria de Planeación y Desarrollo Económico Municipal, el día 24 de Enero de 2025 se realizó recorrido en conjunto Maestro de Obra, Residente de Obra, Residente de Interventoría, Docente de la sede educativa, Secretario de Planeación Municipal y Comunidad beneficiaria de la vereda Belén, donde se pudo constatar algunas afectaciones a estructuras existentes y observaciones a actividades de construcción las cuales se presentan a continuación:

1. **Afectación Estructura existente:**

Se observa afectación de bordillo en un costado de la Placa de acceso, así mismo Fisuras y asentamiento de la Placa del Polideportivo de la sede educativa en el sitio donde se descargaron los materiales necesarios para la obra, situación presentada por el ingreso de la volqueta hasta la zona central del polideportivo para el suministro de materiales.



ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 2 de 5

Imagen 3 y 4. Afectaciones Placa Polideportivo (Fisuras y Asentamiento) zona de Descargue Materiales

Según lo anterior y teniendo en cuenta que las afectaciones presentadas son responsabilidad del contratista por el ingreso de vehículos pesados sobre las estructuras existentes, comedidamente se solicita previo a la terminación de obra se proceda a realizar las reparaciones correspondientes, realizando la reposición del bordillo afectado en la zona de acceso y el arreglo de la zona afectada de la placa de Polideportivo.

2. **Observaciones Actividades constructivas:**

Respecto a las actividades constructivas, específicamente al refuerzo de las columnas, se expresa preocupación debido a que la sección propuesta de las columnas de concreto es de 30 cm x 30 cm, pero el refuerzo instalado y ya fundido en la base (pedestales), presuntamente no corresponde a la cuantía mínima de acero necesario para el área de la columna según lo estipulado en la NSR-10, ya que los castillos levantados (fundidos hasta el nivel del piso existente) contan únicamente de seis (06) líneas principales de acero corrugado en varilla de 1/2", teniendo en cuenta que la cuantía mínima de acero normalmente varía entre el 1% y el 2% de la sección transversal del elemento en concreto, se tiene lo siguiente:


Área Sección Transversal total Acero Principal (1/2") = 6 x 1,27 = 7,62 cm2
Área Sección Transversal Columna = 30cm x 30cm =900 cm2
Cuantía Actual = 7,62 cm2 / 900 cm2 = 0,847 %

Según lo anterior Actualmente se tendría una cuantía del 0,847 % , por tanto se presume que no se estaría cumpliendo con un parámetro básico en el diseño estructural, aun así sería necesario verificar y aclarar dicha observación por parte de la interventoría y supervisor delegado del FFIE, según los planos, diseños y cálculos estructurales del proyecto, ya que el Municipio de Palestina y la comunidad educativa carecen de dicha información para realizar dicha verificación

Proyección de oficio observaciones actividades constructivas a cargo del FFIE.

CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	CPS-036-2025	**PERIODO**	24 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE FEBRERO DE 2025	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES ESPAÑA COY		**CEDULA.**	1.081.699.223
OBJETO CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	

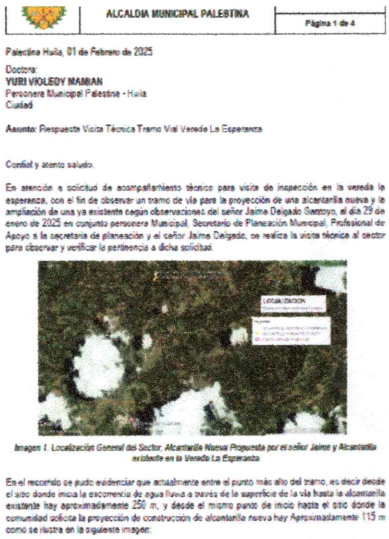

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 1 de 4

Palestina Huila, 01 de Febrero de 2025

Doctora:
YURI VIOLEDY MAMIAN
Personera Municipal Palestina - Huila
Ciudad

Asunto: Respuesta Visita Técnica Tramo Vial Vereda La Esperanza

Cordial y atento saludo.

En atención a solicitud de acompañamiento técnico para visita de inspección en la vereda la esperanza, con el fin de observar un tramo de vía para la proyección de una alcantarilla nueva y la ampliación de una ya existente según observaciones del señor Jaime Delgado Santoyo, el día 29 de enero de 2025 en conjunto personera Municipal, Secretario de Planeación Municipal, Profesional de Apoyo a la secretaria de planeación y el señor Jaime Delgado, se realiza la visita técnica al sector para observar y verificar la pertinencia a dicha solicitud.

Imagen 1. Localización General del Sector, Alcantarilla Nueva Propuesta por el señor Jaime y Alcantarilla existente en la Vereda La Esperanza

En el recorrido se pudo evidenciar que actualmente entre el punto más alto del tramo, es decir desde el sitio donde inicia la escorrentía de agua lluvia a través de la superficie de la vía hasta la alcantarilla existente hay aproximadamente 250 m, y desde el mismo punto de inicio hasta el sitio donde la comunidad solicita la proyección de construcción de alcantarilla nueva hay Aproximadamente 115 m como se ilustra en la siguiente imagen:



ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA — Página 2 de 4

Imagen 2. Localización Específica del Sector, Alcantarilla, Alcantarilla existente y distancia de drenaje agua lluvia

Si bien el punto donde se determina la construcción de la alcantarilla nueva es pertinente con el fin de disminuir el caudal y la energía del agua lluvia que drena a través de la superficie de la vía hasta la alcantarilla existente localizada en la zona más baja actualmente, con el fin de preservar el buen estado de la vía en el tiempo, es necesario tener en cuenta que para la proyección de una estructura de drenaje vial como la alcantarilla Nueva Propuesta por el señor Jaime Delgado, debido a que no hay fuentes o canales receptores aledaños, es necesario disponer del permiso de servidumbre el cual debe ser otorgado por los dueños de los predios por donde hará el recorrido dichas aguas lluvias hasta su disposición final.

Imagen 3. Sector del tramo Vial donde se proyecta la construcción Alcantarilla Nueva

Proyección Oficio Respuesta según solicitud por parte de la Personería Municipal

Julian Andres España

JULIAN ANDRES ESPAÑA COY
Contratista
